

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Und	Cantidad	Duración	Costo	Comienzo	Fin
1		**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CULTURALES A NIVEL NACIONAL, PRIORIZADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL - Construcción del Centro Cultural de Tesalia, Huila**		**0**	**217.63 días?**	**$ 1,398,019,366**	**jue 12/02/26**	**dom 22/11/26**
2		**ACTIVIDADES PRELIMINARES, DESMONTES Y DEMOLICIONES**		**0**	**14.63 días**	**$ 7,991,160**	**jue 12/02/26**	**vie 27/02/26**
3		**Preliminares**		0		$ 0		
4		CERRAMIENTO PROVISIONAL EN TELA VERDE H=2.20 m, Incluye postes en madera rolliza y/o guadua, poli sombra verde y todos los elementos, materiales y mano de obra requeridos para su correcta ejecución	m	98.55	12.38 días	$ 2,241,011	jue 12/02/26	mié 25/02/26
5		LOCALIZACIÓN TRAZADO Y REPLANTEO CON COMISIÓN TOPOGRÁFICA	m2	650	4.38 días	$ 3,002,437	mar 24/02/26	vie 27/02/26
6		RED AGUA PROVISIONAL, longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	1	1 día	$ 635,256	vie 20/02/26	vie 20/02/26
7		RED ELÉCTRICA PROVISIONAL longitud 50 m, incluye trámite de conexión y contador	u	1	3.25 días	$ 2,112,456	mié 25/02/26	vie 27/02/26
8		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**		**0**	**136.88 días**	$ 36,311,776	**lun 23/02/26**	**sáb 1/08/26**
9		CORTE Y/O EXCAVACIÓN MANUAL y/o MECÁNICA DE TERRENO, (Para elementos estructurales, redes, y todos los elementos constructivos que lo requieran, unidad medida en bloque en planos o en terreno, no se reconocerán sobreanchos ni sobre excavaciones) incluye s	m3	167.23	124.88 días	$ 9,687,999	lun 23/02/26	sáb 18/07/26
10		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, compactado al 95%, aplica también para rellenos de redes.	m3	272.78	106.75 días	$ 7,667,492	lun 6/04/26	sáb 1/08/26
11		RELLENO MANUAL CON ARENA DE PEÑA LAVADA, atraque para tuberías (ver diseño de conexiones) Incluye suministro, extendida de manera uniforme.	m3	22.54	50.5 días	$ 6,178,386	lun 11/05/26	sáb 4/07/26
12		RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO GRANULAR TIPO B-200 compactado al 95% según estudio de suelos, incluye suministro del material	m3	145.78	56.75 días	$ 12,777,899	lun 4/05/26	sáb 4/07/26
13		**CIMENTACIÓN**		**0**	**134.63 días**	$ 50,634,648	**mié 4/03/26**	**sáb 8/08/26**
14		SOLADO DE LIMPIEZA e=0.05 m concreto f'c = 2000 psi, según recomendación estudio de suelos y planos estructurales	m2	104.49	113 días	$ 4,249,763	lun 23/03/26	sáb 25/07/26
15		CONCRETO CICLÓPEO (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación), Incluye, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios para la realización de la actividad	m3	19.64	103.88 días	$ 8,534,958	mié 4/03/26	sáb 4/07/26
16		ZAPATAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, F'c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye, formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesarios par	m3	9.68	100.5 días	$ 9,755,044	lun 30/03/26	sáb 18/07/26
17		VIGA DE AMARRE EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO, F'c = 3.000 PSI (Según recomendación de estudio de suelos y diseño de cimentación, no incluye acero de refuerzo), Incluye formaleta, mano de obra, herramienta, suministro de concreto y demás materiales necesari	m3	26.47	100.5 días	$ 28,094,883	lun 20/04/26	sáb 8/08/26
18		**REFUERZO**		**0**	**187.5 días**	$ 201,121,149	**mié 4/03/26**	**dom 8/11/26**
19		Suministro e instalación de Acero De Refuerzo 60.000 PSI (I	kg	17616.79	171.38 días	$ 174,591,620	mié 4/03/26	vie 18/09/26
20		Suministro e instalación de refuerzo en MALLA ELECTROSO	kg	1396.6	72.63 días	$ 14,145,437	lun 20/07/26	dom 8/11/26
21		ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 3/8" PARA PERf	u	444	100.5 días	$ 6,970,013	lun 18/05/26	sáb 5/09/26
22		ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 1/2" PARA PERf	u	139	13 días	$ 2,435,008	lun 24/08/26	sáb 5/09/26
23		ANCLAJE MANUAL EMPLEANDO VARILLA Ø 5/8" PARA PERf	u	152	7.25 días	$ 2,979,071	lun 2/11/26	dom 8/11/26
24		**ESTRUCTURAS EN CONCRETO**		**0**	**152.88 días**	$ 132,116,037	**lun 27/04/26**	**dom 15/11/2**
25		PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO REFORZADO, f´c=20	m2	322.42	74.88 días	$ 52,968,407	lun 20/07/26	mié 11/11/26
26		CORTE EN PLACA PARA DILATACIONES DE PISO, con máqui	m	258.06	78.88 días	$ 2,009,617	lun 20/07/26	dom 15/11/2
27		Suministro y aplicación de sellante elástico de poliuretano	m	258.06	66.38 días	$ 5,969,217	lun 3/08/26	dom 15/11/2
28		COLUMNA DE CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000 P	m3	16.94	94.75 días	$ 21,727,935	lun 27/04/26	dom 9/08/26
29		VIGA AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa (4.000	m3	21.59	50.5 días	$ 29,566,365	lun 15/06/26	sáb 8/08/26
30		LOSA DE ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO REFORZADO f'	m2	9.3	13 días	$ 2,400,370	lun 3/08/26	sáb 15/08/26
31		POYO EN CONCRETO REFORZADO f´c=17,5 Mpa (2500 PSI),	m	20.12	44.25 días	$ 1,348,616	lun 27/07/26	sáb 12/09/26
32		VIGA CANAL AÉREA EN CONCRETO REFORZADO f´c=28 Mpa	m3	13.24	13.5 días	$ 16,125,510	lun 15/06/26	dom 28/06/2
33		**ESTRUCTURA METÁLICA Y MADERA**		**0**	**47.38 días?**	$ 31,216,658	**vie 14/08/26**	**dom 8/11/26**
34		**Estructura Metálica**		0		$ 0		
35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL ASTM A500-GR 50 y/o ASTM A572 GR 50 (NTC 4526), incluye instalación de pernos, soldadura, templetes, contravientos, pintura anticorrosiva, acabado según arquitectura, equipos y todo	kg	337.37	28.88 días	$ 9,195,548	lun 7/09/26	dom 8/11/26
36		PLATINA CORREAS CUBIERTA EN MADERA, CON PLATINA WBO090 (según diseño estructural) incluye la instalación, equipos y todo elemento necesario para la correcta	u	396	28.88 días	$ 10,996,900	lun 7/09/26	dom 8/11/26
37		CONECTOR TODO ROSCA VGS9160 ROTHOBLAAS	u	1000	7.25 días	$ 6,519,045	lun 2/11/26	dom 8/11/26
38		VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 3/8" 0.50m	u	232	22.63 días	$ 3,141,200	lun 14/09/26	dom 8/11/26
39		VARILLA ROSCADA GALVANIZADA 1/2" 0.50m	u	72	10.13 días	$ 1,363,965	jue 22/10/26	dom 1/11/26
40		ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO AMARILLO 80 x 140 mm LAMINADO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según	m	0		$ 0		
41		ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO AMARILLO 2"x 6" (4.1 x 13.8 cm) (+ - 5mm) CEPILLADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento	m	0		$ 0		
42		**REDES HIDRÁULICAS, SANITARIAS, AGUAS DE RECOLECCIÓN Y RCI**		**0**	**152.13 días**	$ 43,496,740	**lun 4/05/26**	**vie 20/11/26**
43		**CAJAS, POZOS, CARCAMOS**		0		$ 0		
44		CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x150 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, paña	u	6	36.75 días	$ 8,549,875	lun 1/06/26	vie 10/07/26
45		CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 80x80x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañet	u	1	6.75 días	$ 951,511	lun 27/07/26	sáb 1/08/26
46		CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60x60x80 cm (a x L x h) medidas internas útiles. Incluye base en concreto f'c=2000 PSI y malla electrosoldada, cañuela, ladrillo tolete recocido común, tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metálico, pañet	u	0		$ 0		
47		CAJAS CON REJILLA PERIMETRAL DE 0.40m*0.60 m, tipo sumidero (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	u	0		$ 0		
48		CUNETA EN CONCRETO PREFABRICADAS TIPO A120 80x30x22 (ver ubicación en planos) Incluye suministro, herramienta, mano de obra y demás materiales necesarios para su correcta instalación.	m	0		$ 0		
49		**REDES SANITARIAS**		0		$ 0		

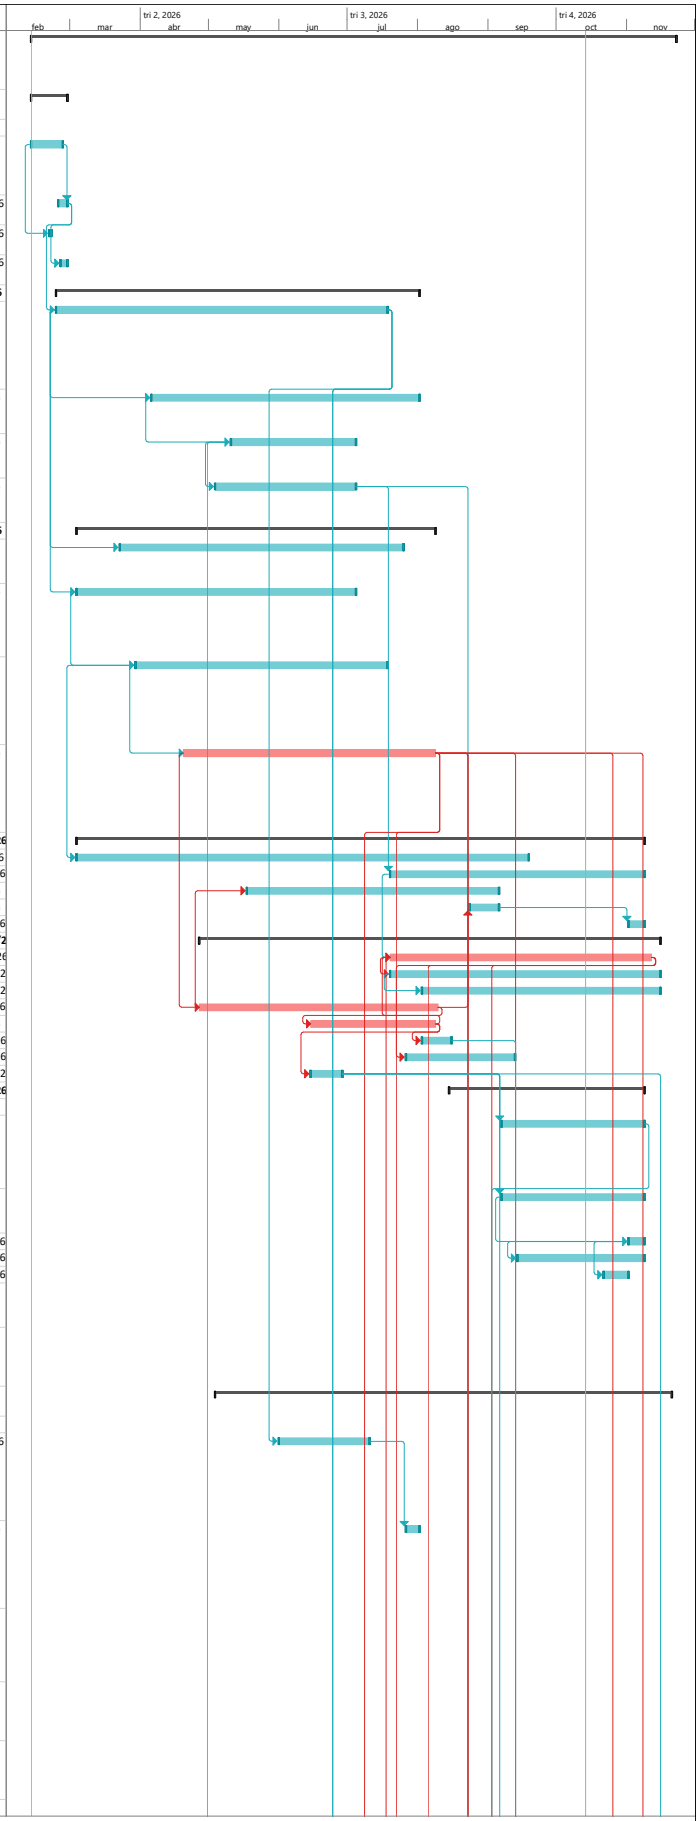

Proyecto: Adecuacion Escenario
Fecha: mié 14/10/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Und	Cantidad	Duración	Costo	Comienzo	Fin
50		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 4" (conexión hacia la acometida y cajas + incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	88.61	141.38 días	$ 5,364,432	lun 4/05/26	dom 8/11/26
51		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC-S ø 2" (Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	7.5	6.75 días	$ 315,170	lun 17/08/26	sáb 22/08/26
52		PUNTO SANITARIO PVCS ø 4" (Incluye 1,5 m de tubería desde la salida hasta la red +accesorios y todo lo necesario para su instalación)	u	2	6.75 días	$ 201,577	lun 1/06/26	sáb 6/06/26
53		PUNTO SANITARIO PVC-S ø 2" (Incluye 1.5 m tubería desde	u	6	6.75 días	$ 329,505	lun 1/06/26	sáb 6/06/26
54		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 4" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta	u	8	99.25 días	$ 1,276,499	lun 1/06/26	vie 18/09/26
55		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIOS Y SIFONES DE PISO 2" (incluye rejillas metálicas de piso y todos los materiales necesarios para su correcta	u	0		$ 0		
56		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 6" o 160 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen	m	63	6.75 días	$ 4,477,000	lun 15/06/26	sáb 20/06/26
57		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA pared estructural ø 4" o 110 mm (tipo NOVAFORT o equivalente de igual calidad o superior). Incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación y buen	m	30.1	63 días	$ 1,522,282	lun 22/06/26	sáb 29/08/26
58		**REDES HIDRÁULICAS**		0		$ 0		
59		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA PVC-P 3/4" RDE 11 (400 psi). Comprende desde punto de salida del medidor hasta la conexión a la red principal. Incluye todos los accesorios (válvulas de corte, caja de medidor,	u	1	6.75 días	$ 1,085,409	lun 24/08/26	sáb 29/08/26
60		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1" RDE 13.5 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	13	38 días	$ 280,717	lun 13/07/26	sáb 22/08/26
61		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 3/4" RDE 11 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	61.75	69.25 días	$ 1,073,551	lun 1/06/26	sáb 15/08/26
62		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC-P 1/2" RDE 9 (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	m	59.28	18 días	$ 903,116	lun 10/08/26	vie 28/08/26
63		PUNTO DE AGUA FRÍA 1" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	4	7.25 días	$ 280,515	lun 2/11/26	lun 9/11/26
64		PUNTO DE AGUA FRÍA 3/4" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	1	7.25 días	$ 55,520	lun 2/11/26	lun 9/11/26
65		PUNTO DE AGUA FRÍA 1/2" (instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, 1,5 m de tubería, accesorios, complementarios, regatas y resanes).	u	8	6.75 días	$ 400,812	lun 1/06/26	sáb 6/06/26
66		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	4	7.25 días	$ 967,003	lun 2/11/26	lun 9/11/26
67		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 3/4" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	3	7.25 días	$ 525,053	lun 2/11/26	lun 9/11/26
68		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA ó REGISTRO R/W DE 1/2" (Incluye todos los accesorios y materiales necesarios para su instalación)	u	5	6.75 días	$ 720,049	lun 27/07/26	sáb 1/08/26
69		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO PESADO PARA MANGUERA.	u	6	3.88 días	$ 415,887	jue 22/10/26	dom 25/10/26
70		**REDES VENTILACIÓN Y AGUAS LLUVIAS**		0		$ 0		
71		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE VENTILACIÓN PVC L ø 2" (incluye accesorios y todo lo necesario para su instalación)	m	8.4	41.38 días	$ 327,612	lun 24/08/26	dom 8/11/26
72		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE CUADRADA (SECCIÓN 62 x 64 mm) PARA CANAL AMAZONAS O SIMILAR (Incluye todos los accesorios y materiales	m	13.6	5.5 días	$ 818,288	lun 16/11/26	vie 20/11/26
73		PUNTO SANITARIO BAJANTE AGUAS LLUVIAS (Incluye tragante metálica 5x4, accesorios de conexión con la bajante y rebose lateral de la canal con accesorios según	u	8	7.25 días	$ 1,925,299	lun 26/10/26	dom 1/11/26
74		**TANQUES Y EQUIPOS**		0		$ 0		
75		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALM	u	1	7.25 días	$ 5,784,948	lun 14/09/26	dom 20/09/2
76		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE PLÁSTICO DE ALM	u	2	7.25 días	$ 4,945,110	lun 14/09/26	dom 20/09/2
77		**INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN**		**0**	**59.13 días**	$ 185,526,797	**lun 17/08/26**	**dom 22/11/2**
78		**EQUIPO DE MEDIDA**		0		$ 0		
79		Suministro e instalación de caja para medidor bifásico 2F+1	u	1	7.25 días	$ 637,153	lun 9/11/26	dom 15/11/2
80		**REDES EXTERIORES EN BAJA TENSIÓN**		0		$ 0		
81		Suministro e instalación de tubo TDP 2" PVC tipo pesado, ir	m	50	7.25 días	$ 2,354,866	lun 9/11/26	dom 15/11/2
82		Suministro de materiales y mano de obra para canalización	m	74	7.25 días	$ 4,342,073	lun 9/11/26	dom 15/11/2
83		Suministro e instalación de cámara de inspección BT CS274	u	4	7.25 días	$ 5,242,221	lun 16/11/26	dom 22/11/2
84		**TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIONES**		0		$ 0		
85		Suministro e instalación de tablero en lámina cold rolled ca	u	1	7.25 días	$ 9,479,511	lun 2/11/26	dom 8/11/26
86		Materiales y mano para la instalación de tablero de distribu	u	1	6.75 días	$ 1,588,658	lun 14/09/26	sáb 19/09/26
87		Materiales y mano para la instalación de tablero de distribu	u	1	6.75 días	$ 551,069	lun 14/09/26	sáb 19/09/26
88		**ACOMETIDAS INTERNAS BAJA TENSIÓN**		0		$ 0		
89		Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F	m	45	7.25 días	$ 9,766,573	lun 9/11/26	dom 15/11/2
90		Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 2F	m	30	7.25 días	$ 2,607,224	lun 9/11/26	dom 15/11/2
91		Suministro e instalación de acometida en cable de cobre 1F	m	30	7.25 días	$ 1,474,643	lun 9/11/26	dom 15/11/2
92		Suministro e instalación de acometida en cable de cobre en	m	10	7.25 días	$ 419,687	lun 9/11/26	dom 15/11/2
93		**RED NORMAL Y REGULADA**		0		$ 0		
94		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación cu	u	19	6.75 días	$ 2,898,018	lun 7/09/26	sáb 12/09/26
95		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación cu	u	2	6.75 días	$ 442,972	lun 7/09/26	sáb 12/09/26
96		Suministro de materiales y mano de obra para instalación cu	u	8	7.25 días	$ 1,472,734	lun 2/11/26	dom 8/11/26
97		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación cu	u	6	7.25 días	$ 918,851	lun 9/11/26	dom 15/11/2
98		Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T	u	6	7.25 días	$ 929,840	lun 2/11/26	dom 8/11/26
99		Suministro de materiales y mano de obra para instalación de salida a 120V para tomacorriente regulada, 1F+N+T	u	2	7.25 días	$ 490,017	lun 2/11/26	dom 8/11/26
100		Suministro e instalación de cable de cobre 1F#12+1N#12+1	m	180	19.75 días	$ 4,257,429	lun 26/10/26	dom 15/11/2
101		**CANALIZACIONES PARA RED NORMAL Y REGULADA**		0		$ 0		
102		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación cm	m	78	6.75 días	$ 2,547,139	lun 24/08/26	sáb 29/08/26
103		**ILUMINACIÓN**		0		$ 0		
104		Suministro de materiales y mano de obra para instalación cu	u	10	7.25 días	$ 1,957,722	lun 9/11/26	dom 15/11/2
105		Suministro de materiales y mano de obra para instalación cu	u	5	7.25 días	$ 1,177,866	lun 9/11/26	dom 15/11/2
106		Suministro de materiales y mano de obra para instalación cu	u	44	13.5 días	$ 9,933,433	lun 2/11/26	dom 15/11/2
107		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación cu	u	22	22.63 días	$ 3,356,004	lun 7/09/26	dom 1/11/26
108		Suministro de materiales y mano de obra para instalación cu	u	9	7.25 días	$ 1,725,991	lun 9/11/26	dom 15/11/2

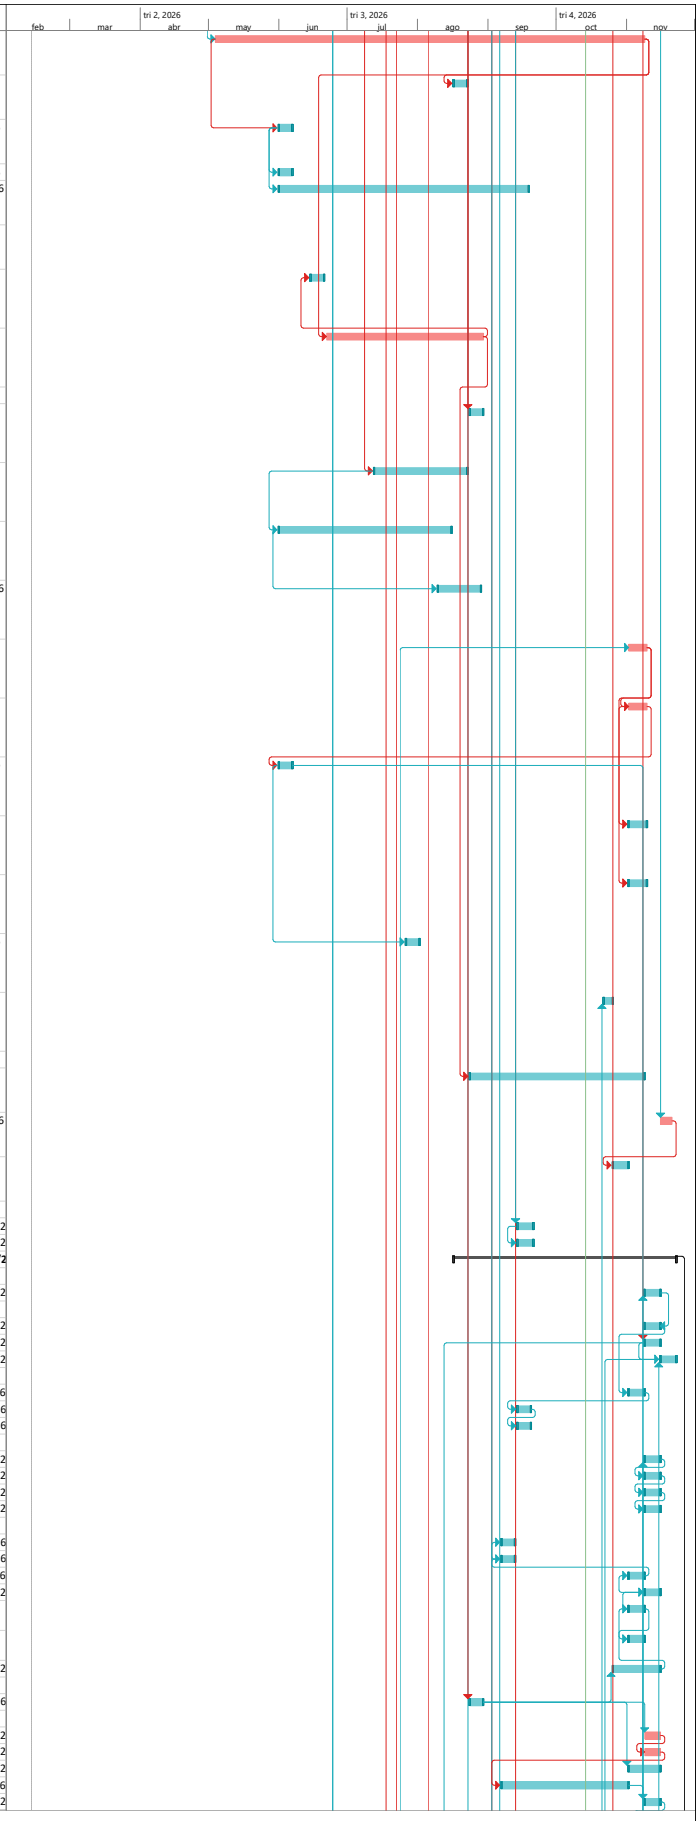

Proyecto: Adecuacion Escenario
Fecha: mié 14/10/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual


Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Und	Cantidad	Duración	Costo	Comienzo	Fin
109		Suministro e instalación de Luminaria tipo panel LED LINEA	u	22	7.25 días	$ 21,403,226	lun 9/11/26	dom 15/11/2
110		Suministro e instalación de luminaria tipo bala LED de sobr	u	7	7.25 días	$ 904,872	lun 9/11/26	dom 15/11/2
111		Suministro e instalación de luminaria hermética de 36W Fl	u	6	6.75 días	$ 1,353,543	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
112		Suministro y montaje de sensor de presencia para control	u	2	7.25 días	$ 636,382	lun 9/11/26	dom 15/11/2
113		Suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo b	u	9	6.75 días	$ 4,901,845	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
114		Suministro e instalación de aviso de salida emergencia led r	u	4	7.25 días	$ 772,737	lun 9/11/26	dom 15/11/2
115		**ILUMINACIÓN EXTERIOR**		0		$ 0		
116		Suministro e instalación de Luminaria Street light 66W Colc	u	4	7.25 días	$ 4,373,577	lun 9/11/26	dom 15/11/2
117		Suministro y montaje de Cajas de inspección de 540x540x4	u	4	3.88 días	$ 2,706,156	jue 22/10/26	dom 25/10/2
118		Suministro de materiales y mano de obra para canalización en baja tensión, incluye excavación y retiro de material sobrante, arena de peña, banda plástica de señalización, compactación de material. Norma técnica del Operador de red, canalización para cone	m	40	7.25 días	$ 2,991,119	lun 26/10/26	dom 1/11/26
119		Suministro e instalación de tubería PVC de 1 1/2" de diáme	m	40	7.25 días	$ 1,306,225	lun 2/11/26	dom 8/11/26
120		Suministro e instalación de Luminaria tipo apique de pared	u	14	7.25 días	$ 2,354,495	lun 9/11/26	dom 15/11/2
121		Suministro e instalación de poste metálico poligonal para il	u	4	7.25 días	$ 5,107,297	lun 2/11/26	dom 8/11/26
122		Suministro e instalación de Luminaria de piso, vida útil mín	u	8	7.25 días	$ 1,571,556	lun 9/11/26	dom 15/11/2
123		Suministro e instalación de luminaria LED SOLAR GARDEN 3	u	2	7.25 días	$ 4,258,209	lun 9/11/26	dom 15/11/2
124		**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**		0		$ 0		
125		Suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº	m	30	3.88 días	$ 2,757,221	jue 22/10/26	dom 25/10/2
126		Suministro y aplicación de soldadura exotérmica de 115 g,	u	10	3.88 días	$ 485,442	jue 22/10/26	dom 25/10/2
127		suministro y montaje de electrodo varilla 100% cobre de 2,	u	4	3.88 días	$ 1,401,291	jue 22/10/26	dom 25/10/2
128		Suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm	u	1	7.25 días	$ 198,909	lun 26/10/26	dom 1/11/26
129		Suministro e instalación de tratamiento artificial	u	4	3.88 días	$ 572,500	jue 22/10/26	dom 25/10/2
130		**APANTALLAMIENTO (SISTEMA DE CAPTACIÓN - BAJANTES**		0		$ 0		
131		suministro e instalación de cable conductor Cu desnudo nº	m	120	6.75 días	$ 9,747,765	lun 7/09/26	sáb 12/09/26
132		Suministro y montaje de varilla 100% cobre de 2,4 m x 5/8"	u	8	6.75 días	$ 2,802,583	lun 14/09/26	sáb 19/09/26
133		Suministro e instalación de caja de inspección de 30x30cm	u	8	6.75 días	$ 1,591,272	lun 14/09/26	sáb 19/09/26
134		Suministro y montaje de terminal de captación en acero in	u	8	5.5 días	$ 1,609,454	lun 16/11/26	vie 20/11/26
135		suministro y montaje de anillo superior para sistema de ca	m	240	5.5 días	$ 14,790,787	lun 16/11/26	vie 20/11/26
136		suministro e instalación de caja plástica para empalme SIP	u	8	6.75 días	$ 1,363,041	lun 14/09/26	sáb 19/09/26
137		**VENTILACIÓN Y EXTRACCIÓN**		0		$ 0		
138		Suministro e instalación salida eléctrica en muro (2,0m apr	u	4	7.25 días	$ 875,277	lun 2/11/26	dom 8/11/26
139		Suministro e instalación de ventilador de pared, mínimo 3	u	4	6.75 días	$ 2,276,511	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
140		**CERTIFICACIONES Y TRAMITES**		0		$ 0		
141		Certificación RETIE expedido por organismo acreditado ant	u	1	7.25 días	$ 5,562,853	lun 16/11/26	dom 22/11/2
142		Certificación RETILAP expedido por organismo acreditado a	u	1	7.25 días	$ 7,105,741	lun 16/11/26	dom 22/11/2
143		Ajuste al diseño eléctrico de acuerdo con las condiciones d	u	1	13 días	$ 4,300,447	lun 17/08/26	sáb 29/08/26
144		Trámites ante el operador de red, incluye solicitar las condi	u	1	11.75 días	$ 2,872,770	lun 9/11/26	vie 20/11/26
145		**REDES ESPECIALES**		**0**	**52.88 días**	$ 26,644,595	**lun 24/08/26**	**sáb 21/11/26**
146		**CABLEADO ESTRUCTURADO (SALIDAS, REDES, CANALETAS**		0		$ 0		
147		Suministro e instalación de salida para datos CAT 6a, Jack C	u	20	13 días	$ 2,687,160	lun 9/11/26	sáb 21/11/26
148		Suministro e instalación de cable UTP CAT 6A LSZH	m	915	7.25 días	$ 11,075,661	lun 9/11/26	dom 15/11/2
149		Suministro e instalación de patch panel de 24 puertos CAT	u	1	6.75 días	$ 1,247,907	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
150		Suministro e instalación de Swicth 24 puertos 10/100/1000	u	1	6.75 días	$ 530,948	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
151		Suministro e instalación de Patch Cord de 1 m CAT 6A, LSZH	u	20	6.75 días	$ 1,017,391	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
152		Suministro e instalación de gabinete de pared de nueve un	u	1	6.75 días	$ 1,240,609	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
153		Suministro e instalación de UPS monofásica de 3KVA, onlin	u	1	6.75 días	$ 3,913,526	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
154		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCES POINT DE USO INTE	u	2	6.75 días	$ 308,384	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
155		Suministro de materiales y mano de obra para instalación c	m	80	6.75 días	$ 1,345,037	lun 24/08/26	sáb 29/08/26
156		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación c	m	36	26 días	$ 1,318,635	lun 24/08/26	lun 5/10/26
157		Suministro de materiales y mano de obra para Instalación c	m	60	7.25 días	$ 1,959,337	lun 2/11/26	dom 8/11/26
158		**MAMPOSTERÍA**		**0**	**65.38 días**	$ 54,945,972	**lun 27/07/26**	**dom 8/11/26**
159		Muros e.=12 cm en ladrillo arcilla bloque No. 5. Incluye mo	m2	78.41	25.5 días	$ 7,069,222	lun 27/07/26	sáb 22/08/26
160		DILATACIONES EN ICOPOR E=20MM ENTRE FACHADA EXIST	m	44	19.25 días	$ 352,005	lun 17/08/26	sáb 5/09/26
161		DINTEL EN CONCRETO REFORZADO a la vista f´c. 3.000 psi	cm	56	7.25 días	$ 7,049,203	lun 2/11/26	dom 8/11/26
162		MORTERO DE INYECCIÓN TIPO GROUTING 3000 PSI PARA LLENADO DE DOVELAS DE MUROS EN BLOQUE	m3	2.97	7.25 días	$ 3,756,174	lun 2/11/26	dom 8/11/26
163		COLUMNETAS EN CONCRETO REFORZADO f´c. 3.000 PSI se	cm	44	19.25 días	$ 5,499,606	lun 17/08/26	sáb 5/09/26
164		MURO EN CONCRETO A LA VISTA DE F´c=20,7 Mpa (3000 PS	m3	4.82	13 días	$ 6,216,706	lun 7/09/26	sáb 19/09/26
165		MURO EN CELOSÍA CUADRADA DE 16x11,5x11cm (L x a x h)	m2	36.37	25.5 días	$ 5,358,360	lun 17/08/26	sáb 12/09/26
166		MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL A LA VISTA POR DOS CA	m2	113.6	25.5 días	$ 19,644,696	lun 10/08/26	sáb 5/09/26
167		**CUBIERTAS Y CIELO RASOS**		**0**	**18.75 días**	$ 132,656,113	**lun 26/10/26**	**dom 15/11/2**
168		**Cubiertas**		0		$ 0		
169		CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO SÁNDWICH DE D	m2	432.04	19.75 días	$ 127,654,136	lun 26/10/26	dom 15/11/2
170		SOLAPA O FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20, de	m	66.15	13.5 días	$ 5,001,977	lun 2/11/26	dom 15/11/2
171		**PAÑETES**		**0**	**25 días**	$ 6,208,433	**lun 24/08/26**	**sáb 19/09/26**
172		PAÑETE LISO EN MORTERO 1:3, incluye filos, dilataciones, c	m2	152.9	25.5 días	$ 6,208,433	lun 24/08/26	sáb 19/09/26
173		**PISOS Y ENCHAPES**		**0**	**34.13 días**	$ 42,472,503	**lun 14/09/26**	**sáb 21/11/26**
174		**Enchapes pisos y paredes**		0		$ 0		
175		ENCHAPE DE PARED CERÁMICA BLANCO (O A DEFINIR) GRA	m2	27.14	7.25 días	$ 3,269,815	lun 2/11/26	dom 8/11/26
176		ACABADO EN CONCRETO ALLANADO, mecánicamente pulido, brillado, sellado. incluye endurecedor de Quarzo, Modulado acorde a planos.	m2	132.57	13.5 días	$ 4,466,492	lun 26/10/26	dom 8/11/26
177		**Guarda escobas y boca puertas**		0		$ 0		
178		ZÓCALO EN MEDIACAÑA Vaciada en granito pulido, incluye	m	10.68	3.88 días	$ 779,193	jue 22/10/26	dom 25/10/2
179		**Pisos en madera**		0		$ 0		
180		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN LISTONES MACHI	m2	77.82	6.75 días	$ 27,508,882	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
181		GUARDA ESCOBA EN MADERA SAPAN (O SIMILAR) INMUNI	m	27.37	6.75 días	$ 2,462,390	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
182		**Varios**		0		$ 0		
183		MESÓN EN CONCRETO REFORZADO f'c = 2500 PSI, fundido	m	6.5	16.38 días	$ 2,624,649	lun 14/09/26	dom 1/11/26
184		LAVAMANOS CORRIDO EN CONCRETO REFORZADO E IMPE	m	2.54	7.25 días	$ 997,658	lun 9/11/26	dom 15/11/2
185		POCETA DE ASEO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO F'C =	u	1	10.13 días	$ 363,424	jue 22/10/26	dom 1/11/26
186		**CARPINTERIA EN MADERA**		**0**	**18.75 días**	$ 34,075,181	**lun 2/11/26**	**sáb 21/11/26**
187		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES FIJOS TIPO PERSIANA EN MADERA PINO AMARILLO O SIMILAR	m2	66.36	19.25 días	$ 29,796,428	lun 2/11/26	sáb 21/11/26
188		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA E	m2	9.9	7.25 días	$ 3,638,219	lun 9/11/26	dom 15/11/2
189		ESTANTERÍA EN TABLERO AGLOMERADO MELAMINA RH CC	m	1.74	7.25 días	$ 640,534	lun 9/11/26	dom 15/11/2
190		**CARPINTERÍA METÁLICA**		**0**	**27.88 días**	$ 84,924,001	**jue 22/10/26**	**sáb 21/11/26**
191		**REJAS Y VENTANAS**		0		$ 0		
192		CERRAMIENTO CON PUERTA EN MALLA EXPANDIDA Cal 18,	m2	129.79	19.25 días	$ 58,681,472	lun 2/11/26	sáb 21/11/26
193		**PUERTAS**		0		$ 0		
194		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA ENTAMBORADA E	m2	12.01	10.13 días	$ 6,248,581	jue 22/10/26	dom 1/11/26
195		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO REJA EN EST	m2	7.26	10.13 días	$ 3,081,847	jue 22/10/26	dom 1/11/26
196		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO REJA EN EST	m2	31.68	13.5 días	$ 16,537,383	lun 26/10/26	dom 8/11/26
197		**VARIOS**		0		$ 0		
198		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCALERA METÁLICA TIPO	u	1	3.88 días	$ 374,718	jue 22/10/26	dom 25/10/2
199		**CERRADURAS**		**0**	**6.25 días**	$ 1,991,862	**lun 9/11/26**	**dom 15/11/2**
200		CERRADURA MANIJA LISA PARA ENTRADA CAPRI CROMAD	u	9	7.25 días	$ 1,991,862	lun 9/11/26	dom 15/11/2
201		**DOTACIÓN DE BAÑOS, GRIFERÍAS Y ACCESORIOS**		**0**	**18.75 días**	$ 8,137,726	**lun 2/11/26**	**dom 22/11/2**
202		**APARATOS SANITARIOS**		0		$ 0		
203		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO DE TANQUE PA	u	1	7.25 días	$ 1,018,401	lun 9/11/26	dom 15/11/2
204		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO ELONGADO DE TA	u	1	7.25 días	$ 1,114,973	lun 9/11/26	dom 15/11/2
205		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL TIPO INSTITUCIÓN	u	1	7.25 días	$ 562,003	lun 9/11/26	dom 15/11/2
206		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPO	u	1	7.25 días	$ 327,117	lun 9/11/26	dom 15/11/2
207		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE SOBREPO	u	3	7.25 días	$ 503,121	lun 9/11/26	dom 15/11/2
208		**GRIFERÍAS**		0		$ 0		
209		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAMAN	u	2	7.25 días	$ 822,434	lun 9/11/26	dom 15/11/2

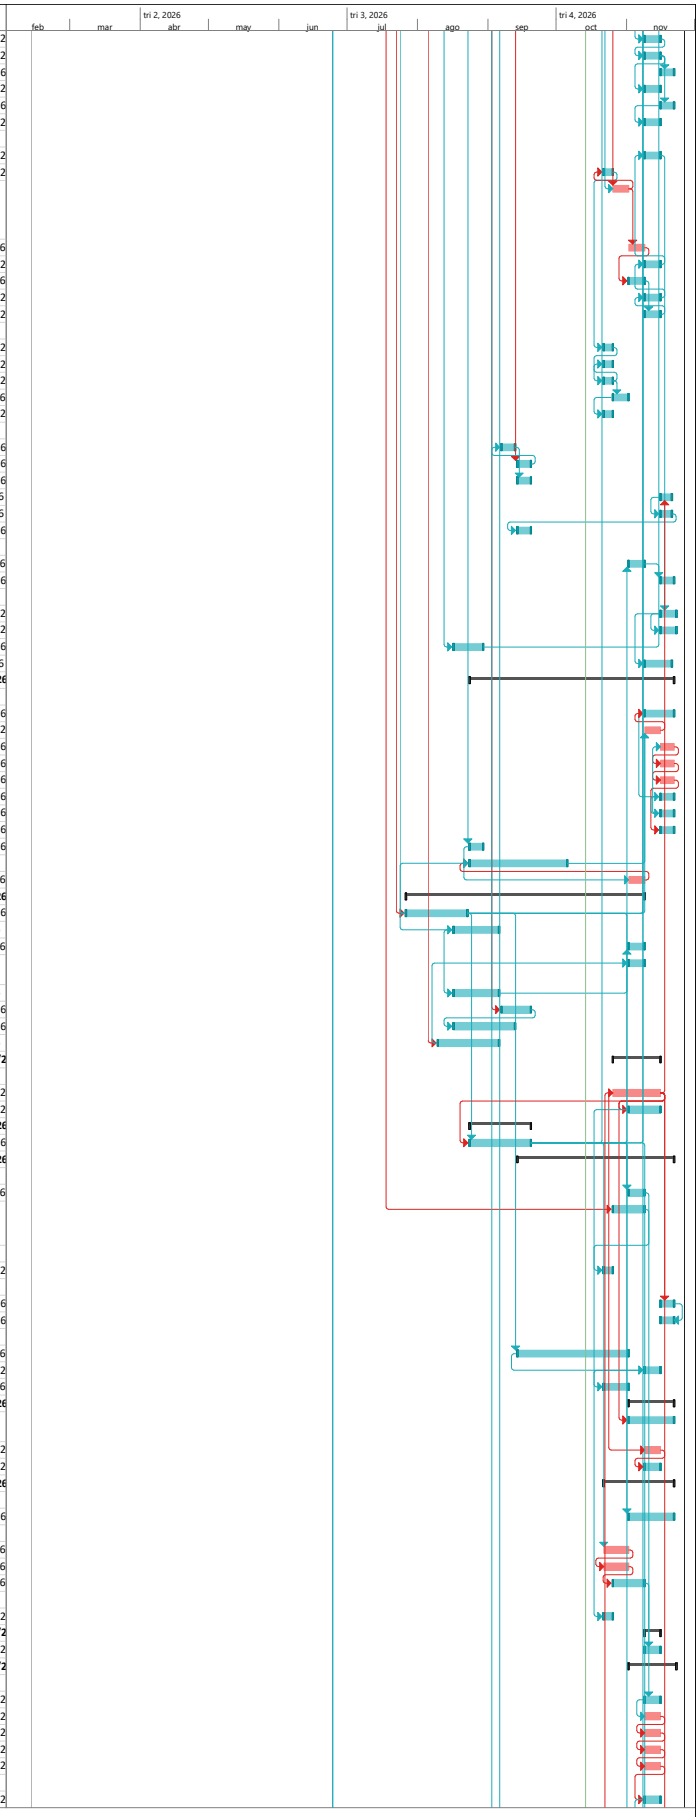

Proyecto: Adecuacion Escenario
Fecha: mié 14/10/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Und	Cantidad	Duración	Costo	Comienzo	Fin
210		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GRIFERÍA PARA ORINAL TIPO	u	1	7.25 días	$ 1,507,843	lun 9/11/26	dom 15/11/2
211		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATI	u	1	6.75 días	$ 221,032	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
212		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TIPO JARDÍN + ACCE	u	1	6.75 días	$ 62,647	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
213		**ACCESORIOS**		0		$ 0		
214		BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN "U" EN ACERO INOXID	u	1	6.75 días	$ 566,636	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
215		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GABINETE PARA TOALLAS DE	u	2	1 día	$ 672,810	dom 22/11/2	dom 22/11/2
216		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE PORTA ROLLO D	u	2	1 día	$ 128,461	dom 22/11/2	dom 22/11/2
217		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN L	u	2	1 día	$ 201,228	dom 22/11/2	dom 22/11/2
218		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA PLÁSTICA PARA REGI	u	12	7.25 días	$ 429,020	lun 2/11/26	dom 8/11/26
219		**PINTURAS**		**0**	**11.75 días**	$ 11,566,837	**lun 9/11/26**	**vie 20/11/26**
220		APLICACIÓN DE TRES MANOS DE PINTURA VINILO EXTERIO	m2	467.17	11.75 días	$ 11,566,837	lun 9/11/26	vie 20/11/26
221		**VIDRIOS Y ESPEJOS**		**0**	**6.25 días**	$ 7,333,225	**lun 16/11/26**	**sáb 21/11/26**
222		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CRISTAL 4 MM CO	m2	14.4	6.75 días	$ 6,289,064	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
223		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO PARA BAÑO DE PE	m2	1	6.75 días	$ 587,761	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
224		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO EN VIDRIO CRUDO	m2	1	6.75 días	$ 456,400	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
225		**EQUIPOS Y OTROS**		**0**	**12.5 días**	$ 2,058,073	**lun 9/11/26**	**sáb 21/11/26**
226		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA PRIMERO	u	3	1.13 días	$ 477,848	sáb 21/11/26	sáb 21/11/26
227		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTINTORES MULTIPROPÓ	u	5	1.13 días	$ 484,714	sáb 21/11/26	sáb 21/11/26
228		Suministro e instalación de equipo de presión preensambla	u	1	7.25 días	$ 1,095,511	lun 9/11/26	dom 15/11/2
229		**OBRAS EXTERIORES**		**0**	**84.13 días**	$ 57,264,572	**lun 20/07/26**	**sáb 21/11/26**
230		ANDENES Y RAMPAS EN CONCRETO ESCOBEADO f'c = 2500	m2	284.96	13.5 días	$ 50,674,463	lun 2/11/26	dom 15/11/2
231		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO	m	0		$ 0		
232		REINSTALACIÓN / SIEMBRA DE CESPEDONES (reservados d	m2	105.37	13 días	$ 4,753,873	lun 9/11/26	sáb 21/11/26
233		SIEMBRA DE ÁRBOL NATIVO DE PORTE MEDIANO (INCLUYE	u	4	0 días	$ 1,836,236	sáb 14/11/26	sáb 14/11/26
234		**SEÑALIZACIÓN**		**0**	**6.25 días**	$ 4,785,893	**lun 16/11/26**	**sáb 21/11/26**
235		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INFORM	u	1	6.75 días	$ 232,524	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
236		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INFORM	u	10	6.75 días	$ 1,847,811	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
237		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN E INFORM	u	2	6.75 días	$ 497,286	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
238		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LETRAS, UBICADO SEGÚN DISEÑ	u	23	6.75 días	$ 2,208,272	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
239		**AISLAMIENTO ACUSTICO**		**0**	**6.25 días**	$ 10,814,393	**lun 16/11/26**	**sáb 21/11/26**
240		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANELES ACÚSTICOS TIPO	m2	20	6.75 días	$ 10,814,393	lun 16/11/26	sáb 21/11/26
241		**ASEO**		**0**	**0 días**	$ 3,651,626	**dom 22/11/2**	**dom 22/11/2**
242		ASEO GENERAL DE OBRA	m2	629.5	1 día	$ 3,651,626	dom 22/11/2	dom 22/11/2
243		**NO PREVISTOS**		**0**	**90.38 días**	$ 220,073,396	**lun 29/06/26**	**dom 8/11/26**
244		Demoliciónl de estructuras existentes enterradas en concreto con taladro demoledor incluye cargue, desalojo de material sobrante a la escombrera autorizada con su respectivo tramite.	M3	4.31	6.75 días	$ 2,469,782	lun 29/06/26	sáb 4/07/26
245		Excavacion manual en roca con taladro demoledor incluye cargue, desalojo de material sobrante a la escombrera autorizada con su respectivo tramite.	M3	35.61	19.25 días	$ 12,713,545	lun 29/06/26	sáb 18/07/26
246		ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO 100 x 140 mm LAMINADO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye suministro e instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	ML	534	28.88 días	$ 83,484,978	lun 7/09/26	dom 8/11/26
247		ESTRUCTURA EN MADERA TIPO PINO 50 x 140 mm) (+ - 5mm) LAMINADA SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, incluye suminstro e instalación de anclajes embebidos, acabado según arquitectura, equipos y todo elemento necesario para la correcta instalación.	ML	903.4	28.88 días	$ 121,405,091	lun 7/09/26	dom 8/11/26

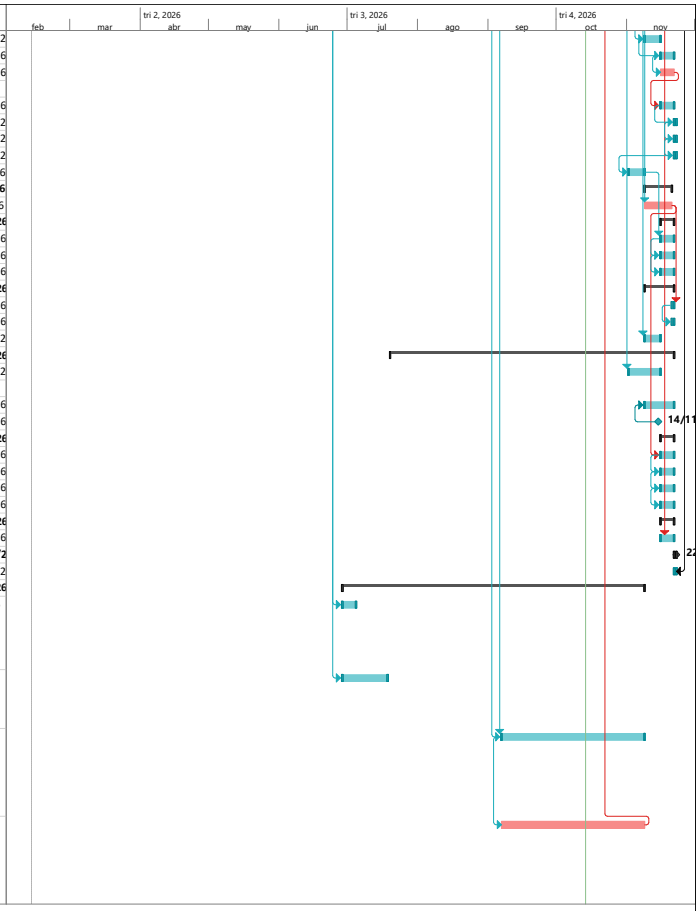

Proyecto: Adecuacion Escenario
Fecha: mié 14/10/26

Tarea | Resumen del proyecto | Tarea manual | solo el comienzo | Fecha límite | Progreso manual
División | Tarea inactiva | solo duración | solo fin | Tareas críticas
Hito | Hito inactivo | Informe de resumen manual | Tareas externas | División crítica
Resumen | Resumen inactivo | Resumen manual | Hito externo | Progreso
