ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	COMUNICACIÓN OFICIAL			Puerto Gaitán
	GESTIÓN DOCUMENTAL			
	Código: GDO-FR-13	**Versión:** 06	**Vigencia:** 30/06/2026	

1090-2138
Puerto Gaitán, 22 de octubre de 2026

SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
Recibido por: Karen P
Fecha 22 OCT 2026
Hora: 2:23 pm

Doctor (a)
ALEJANDRA CASTILLO BLANDÓN
SECRETARIA DE CONTRATACIÓN
Alcaldía Municipal
Puerto Gaitán

REF. Proyecto BPIN 202500000031783 – Contrato de interventoría No. 1701 del 09 de diciembre de 2025, cuyo objeto es: " INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN -META " (Proceso CM-SI-010-2025).

Asunto: Remisión de Documentos de informe mensual de junio de 2026 del contrato en referencia.

Cordial saludo.

Por medio de la presente, me permito remitir a este despacho el informe mensual del contrato en referencia. Además, adjunto el informe de supervisión correspondiente al mes mencionado. Una vez revisada y aprobada la documentación remitida, se solicita adelantar el trámite correspondiente para su publicación en la plataforma SECOP II, en cumplimiento de las disposiciones legales y los procedimientos internos de la Entidad.

Atentamente,

ING. CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Revisó: Ing. Luz Adriana Hernández Cantor - Directora técnica De Seguimiento De Proyectos De Infraestructura
Aprobó: Ing. Christian Julián Fernández Reyes - Secretario De Infraestructura

Escanea este código

Encuesta de Satisfacción

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / WhatsApp 3208632489 - 3117775374
E-mail: atencionalciudadano@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/alcaldiadepuertogaitan

1225

UT INTERPOLICIA 2025

Puerto Gaitán, Meta, 28 de agosto de 2026

Señores
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Atn; CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES
Secretario De Infraestructura

REF. Contrato de obra N°1701 de 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META."

ASUNTO: ENTREGA DEL INFORME MENSUAL N°7 DE INTERVENTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2026.

Respetados señores:

Por medio de la presente, la **UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025**, en calidad de Interventoría, se permite hacer entrega a la Secretaría de Infraestructura del **Informe Mensual N°7 de Interventoría**, correspondiente al período comprendido entre el **1 y el 30 de junio de 2026**, en el marco del Contrato de Interventoría N°1701 de 2025.

El informe contiene el resultado de las actividades de seguimiento, verificación y control desarrolladas por la Interventoría durante el período señalado, incluyendo los aspectos técnicos, administrativos, financieros, de programación, calidad, seguridad y salud en el trabajo, ambientales y demás componentes asociados a la ejecución del contrato.

En consecuencia, se remite el documento para su conocimiento, revisión y fines pertinentes, dejando constancia del seguimiento realizado por esta Interventoría al desarrollo de las obligaciones contractuales durante el período objeto del informe.

Agradecemos la atención prestada y quedamos atentos a cualquier observación, requerimiento o información adicional que se considere necesaria.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente,

28-08-2026

RL. DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
NIT. 902.014.419-5
UTINTERPOLICIA2025@GMAIL.COM

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES MENSUAL DE INTERVENTORIA		
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-77	Version:03	Vigencia:10-01-2025

Ciudad y Fecha: Pto Gaitan, Meta

Contrato de interventoría No.: 1701 DE 2025

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.

Radicado No: Fecha: _____/_____/_____

Periodo del informe: Desde: 01 / 09 / 2026 Hasta: 30 / 09 / 2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
1	***INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO IDE NTERVENTORIA***					
1.01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			Contratista
2	***INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA***					
2.01	**Cuadro de trazabilidad :** 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecución, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			Contratista
3	***INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA***					
3.01	Control de pólizas aprobadas del contrato de interventoria vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			Contratista
4	***INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA***					
4.01	Plan de inversión de anticipo (si aplica)				X	Contratista
4.02	Información de avance financiero de la interventoria	X	X			Contratista
4.03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de la interventoria	X	X			Contratista
4.04	Acta de pago del anticipo de interventoría (si aplica).				X	Contratista
4.05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de interventoría.	X	X			Contratista
4.06	Relación de registros presupuestales de cada contrato de interventoría con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			Contratista
5	***INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA***					
5.01	Generalidades del contrato, localización especifica, región, zona urbana o rural, georreferenciación, descripción del proyecto, expectativas, alcance del contrato, población beneficiada, entre otros (imágenes áreas y/o en detalle de la zona a intervenir).	X	X			Contratista
6	***INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA***					
6.01	**Cuadro de trazabilidad :** 1) Numero del proceso (Etapa pre-contractual), 2) Numero y fecha de suscripción de minuta inicial,3) Objeto del contrato , 4) Numero de Identificación Tributaria (NIT), 5) Representante legal (para personas jurídicas y plurales), 6) Identificación personal del representante legal (para personas jurídicas y plurales), 7) Correo electrónico del contratista (acorde a minuta y RUT), 8) Nombre del contratista (natural, jurídica, plural), 9) Valor del contrato , 10) Plazo de ejecución inicial, 11) Nombre del Supervisor y cargo, 12) Acta de inicio y fecha, 13) Fecha de terminación inicial prevista, 14) Actas de suspensión y/o ampliación de suspensiones, fecha y tiempo (si aplica en orden cronológico), 15) Actas de Reinicio y fecha, indicando el plazo ya ejecutado y el plazo restante de ejecucion, 16) Nueva fecha de terminación del contrato (ajustada por las suspensiones y/o ampliaciones de suspensión), 17) Otros si modificatorios, 18) Contrato(s) adicional(es), fecha y valor, 19) Valor total del contrato, 20) Prorroga(s), 21) Nueva fecha de terminación	X	X			Contratista
7	***INFORMACION LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA***					
7.01	Control de pólizas aprobadas del contrato de obra según vigencias, valor y coberturas exigidas en (minuta, modificatorios, prorrogas, reinicios y todos los actos administrativos que aplique)	X	X			Contratista
8	***INFORMACION FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA***					
8.01	Plan de inversión de anticipo (si aplica)				X	Contratista
8.02	Información de avance financiero de la obra	X	X			Contratista
8.03	Balance financiero indicando anticipos, parciales y amortizaciones de anticipo de la obra	X	X			Contratista
8.04	Acta de pago del anticipo de obra (si aplica).	X	X			Contratista
8.05	Relación de certificados de Disponibilidad Presupuestal de cada contrato de obra	X	X			Contratista
8.06	Relación de registros presupuestales de cada contrato de obra con N° de rubro, fuente de financiación	X	X			Contratista
9	***INFORMACION TECNICA DEL CONTRATO***					
9.01	Grafico avance de programado vs ejecutado de las actividades contratadas. (financiera, por porcentajes)	X	X			Contratista
9.02	Dificultades presentadas durante la ejecución e imprevistos presentados en desarrollo de las actividades (si aplica)	X	X			Contratista
9.03	Informe jurídico del estado de cumplimiento e incumplimiento del contrato y actuaciones realizadas por la interventoria				X	Contratista
10	***INFORMACION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO***					
10.01	Cuadro de relación de personal (administrativo - operativo) de interventoría propuesto vs personal modificado (aval del supervisor cambio de personal) organigrama de personal	X	X			Contratista
10.02	Certificado del representante legal de la interventoría y contador publico y/o revisor fiscal del pago de seguridad social y parafiscales mensuales del personal de obra y de interventoría, avalando el cumplimiento de estas obligaciones (adjuntar matricula y antecedentes de la junta central de contadores vigente) relacionar (nombre, numero de identidad, cargo, N° de planilla, EPS, AFP y ARL).	X	X			Contratista
11	***CUADRO COMPARATIVO DE LABORATORIOS TOMADOS POR LA INTERVENTORIA VS OBRA Y SU CONCEPTO***					
12	***VERIFICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS (CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA)***					
13	***INFORMACION AMBIENTAL DEL CONTRATO***					
13.01	certificación de interventoría, de existencia de permisos y licencias ambientales y prediales para la ejecución total del proyecto y su vigencia cada uno	X	X			Contratista
13.02	Certificación a la disposición de materiales	X	X			Contratista
13.03	Registro fotográfico de actividades ambientales	X	X			Contratista
13.04	Concepto de la interventoría en el cual se hace el seguimiento al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA) o Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) y Plan de Gestión del Riesgo (PGR) firmado por el profesional (si aplica).	X	X			Contratista
14	***ANEXOS***					
14.01	Registro fotográfico del acta de avance con acumulado mes a mes	X	X			Contratista
14.02	verificación de cartera topográfica de obra y concepto (si en el periodo se ejecutaron labores que requiera esta labor)				X	Contratista

	FORMATO LISTA DE CHEQUEO DE INFORMES MENSUAL DE INTERVENTORIA		
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-77	Version:03	Vigencia:10-01-2025

Ciudad y Fecha: Pto Gaitan, Meta

Contrato de Interventoria No.: 1701 DE 2025

Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.

Radicado No: Fecha: _____/_____/_____

Periodo del informe: Desde: 01 / 06 / 2026 Hasta: 30 / 06 / 2026

No.	DOCUMENTO / TRAMITE	ENTREGADO	CUMPLE			RESPONSABLE
			SI	NO	N/A	
14.03	Copia de los ensayos de laboratorio (interventoria)	X	X			Contratista
14.04	Informe de los profesionales y/o especialistas debidamente firmados (topógrafos, estructurales, entre otros)				X	Contratista
14.05	Nominas mensuales debidamente firmadas copia por los trabajadores /profesionales /contador/revisor fiscales, según aplique (copia de las nominas pagadas) y desprendibles de pago a profesionales por prestación de servicios	X	X			Contratista
14.06	Pagos de seguridad social y aportes parafiscales (planillas) según la naturaleza del contratista y pagos de seguridad social para los profesionales contratad por prestación de servicios , mas pago de ARL en todos los casos por las empresas a nivel de riesgo V.	X	X			Contratista
14.07	Informe de inversión y buen manejo del anticipo, y acumulado de interventoria				X	Contratista
14.08	Copia bitácora de obra del periodo	X	X			Contratista
15	CD (CON TODA LA INFORMACIÓN EN FORMATO WORD, PDF, DWG, MPP, EN OTROS.)	X	X			Contratista

NOTA: Se aclara así alguna información de la aquí solicitada no se encuentre en los formatos de MECI - CALIDAD, se hace exigible por la Secretaria de Infraestructura, por tanto se debe adjuntar en el informe en el orden antes descrito. Los informes mensuales y sus soportes tanto de obra como de interventoria, deben allegarse por la interventoria conjuntamente dentro de un plazo máximo de los primeros ocho (8) días del corte del mes; y en caso de devolución deberá corregirse y entregar en un plazo máximo de cinco (5) días.

Revisó

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
R/L interventoria

Aprobó

CHRISTIAN JULIAN FERNÁNDEZ REYES
Secretario de Infraestructura

Nota: se debe paginar los informes

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N°7

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA DE OBRA PUBLICA
(01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 2026)

INTERVENTORÍA

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO:

La interventoría del Contrato de Obra No. 1683 de 2025 se constituye como el mecanismo de control integral para la ejecución del proyecto de construcción, adecuación y mejoramiento de la Estación de Policía del Municipio de Puerto Gaitán – Meta. Su alcance es multidisciplinario, abarcando los componentes técnico, administrativo, ambiental, financiero, contable y jurídico, con el propósito de garantizar la correcta aplicación de la normatividad vigente y la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La interventoría actúa como mecanismo de control y vigilancia permanente del contrato de obra, verificando el cumplimiento de las condiciones de calidad, oportunidad, funcionalidad y correcta inversión de los recursos asignados al proyecto.
Dentro del alcance contractual de la interventoría se incluyen, entre otras, las siguientes actividades:
- Supervisión y control técnico de las actividades ejecutadas en obra.
- Seguimiento al cumplimiento del cronograma físico y financiero.
- Verificación de cantidades de obra ejecutadas.
- Control de calidad de materiales, procesos constructivos y ensayos de laboratorio.
- Seguimiento administrativo, contractual y documental.
- Verificación del cumplimiento de obligaciones ambientales y SST.
- Revisión y trámite de actas, informes y soportes contractuales.
- Control y seguimiento a maquinaria, personal y equipos en obra.
- Emisión de conceptos técnicos, recomendaciones y observaciones a la entidad contratante.

1.1. LOCALIZACIÓN GENERAL

Puerto Gaitán es un municipio ubicado en el departamento de Meta. Incluye una extensa área de estructura plana conocida como las Sabanas de la Altillanura, cuyo eje principal es el río Meta.
El municipio es un rectángulo irregular circunscrito por el río Meta al norte, los ríos Manacacias y Yucao al oeste, el río Iteviare al sur y una línea recta al este. Forma el extremo noreste del departamento de Meta, siendo el municipio más alejado de la capital departamental, Villavicencio. Está a 212 kilómetros al oriente de Villavicencio, Se encuentra en el extremo nororiente del departamento.
Topográficamente hace parte de una extensa zona de estructura plana conocida como la Altillanura, cuyo eje articulador principal es el río Meta, en la cuenca del Orinoco.
Entre las principales actividades económicas del Municipio se pueden encontrar: la Ganadería, Pesca, Explotación de hidrocarburos, Agricultura, Turismo y Recreación.
Límites del municipio:
Puerto Gaitán es el cuarto Municipio más grande de Colombia y segundo del Meta se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas: 3° - 05 y 4° 08' Latitud Norte y 71°- 05 y 72° -30' Latitud Oeste. Tiene una superficie de 17.499 Kilómetros cuadrados y limita por el norte con el Departamento del Casanare; por el sur con los Municipios de Mapiripán y San Martín; por el oriente con el Departamento del Vichada y por el occidente con los Municipios de Puerto López y San Martín.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

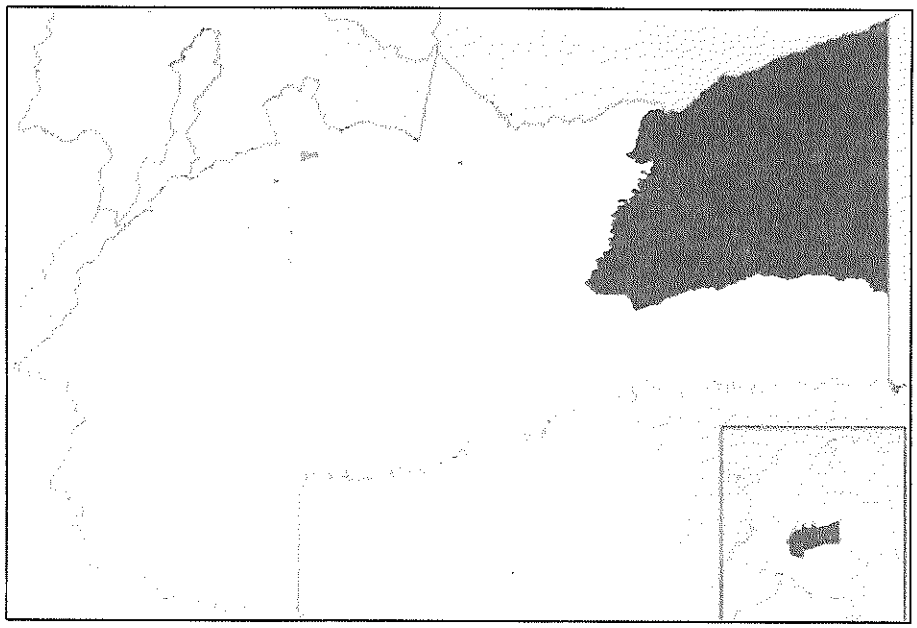


Ilustración 1. Localización de la cabecera municipal de Puerto Gaitán-Meta.

1.2. LOCALIZACIÓN ESPECÍFICA

El proyecto se desarrolla en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la carrera 10 No 16-15ª.



Ilustración 2. Imagen aérea del proyecto.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto objeto de seguimiento por parte de la interventoría corresponde a la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, orientado a fortalecer las condiciones físicas, funcionales y operativas de la infraestructura existente, en atención a las necesidades identificadas mediante los diagnósticos técnicos realizados por la entidad.
De acuerdo con la información técnica revisada, la intervención surge como respuesta a las deficiencias evidenciadas en la infraestructura actual, relacionadas con el deterioro de elementos constructivos, insuficiencia de espacios para el funcionamiento institucional, limitaciones en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal adscrito a la Estación de Policía.
La interventoría deja constancia de que el municipio de Puerto Gaitán presenta una dinámica de crecimiento urbano, poblacional y productivo que incrementa las necesidades institucionales en materia de seguridad, control territorial y capacidad operativa, razón por la cual el proyecto busca consolidar una infraestructura acorde con los requerimientos funcionales y operativos de la Policía Nacional.
En este sentido, el alcance del proyecto contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la adecuación y rehabilitación de la edificación denominada "Casa Blanca" para uso de vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad, actividades orientadas a mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos y fortalecer las condiciones de seguridad física de la infraestructura institucional
Así mismo, la interventoría verifica que el desarrollo del proyecto se encuentra orientado bajo criterios de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia operativa y cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos aplicables, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad institucional y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán – Meta.

1.4. ALCANCE DEL CONTRATO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. CM-SI-010-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.
El contrato de interventoría tiene como alcance realizar el seguimiento integral al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, ejerciendo funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, verificando que la ejecución del proyecto se desarrolle conforme a los estudios y diseños aprobados, especificaciones técnicas, cronograma, presupuesto oficial y normatividad vigente aplicable.
En desarrollo de sus funciones, la interventoría debe garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual mediante actividades permanentes de inspección, revisión, evaluación y control sobre los procesos constructivos, recursos empleados y obligaciones contractuales del contratista de obra.

1.5. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto favorece de forma directa al personal de la Policía Nacional que desempeña funciones en el municipio de Puerto Gaitán, al brindar una infraestructura moderna, funcional y segura que optimiza las condiciones de hospedaje, operación y bienestar laboral. De forma indirecta, la iniciativa repercute favorablemente en la comunidad del municipio, al robustecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, aportando al orden público y al desarrollo social del territorio.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

2 INFORMACION DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BASICA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	CM-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	NIT. 902.014.419-5
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. No. 86.088.145 de Villavicencio
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	UTINTERPOLICIA2025@GMAIL.COM
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026
MODIFICATORIA N.°1:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025 Modificación a la cláusula decima octava del contrato de interventoría.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

3 INFORMACIÓN FINANCIERA

A continuación, se relacionan los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP) y los rubros presupuestales asignados que amparan los recursos financieros del presente contrato de interventoría:

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1.3.3.4.01-R. B CONTRIBUCCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 74.136.286,00	DIS.2025002849	RES.2025004220
	$ 222.176.808,00	DIS.2026000009	RES.2026000003
TOTALES	$ 296.313.094,00		

3.1. VERIFICACIÓN DE POLIZAS

SEGÚN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS N.°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 0	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/12/2025	09/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	09/08/2026	09/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	09/12/2025	09/08/2029	$14,815,654.70	
SEGUROS DEL ESTADO	30-40-101025734 ANEXO 0	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	Aprobada
		DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	
		PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000	
SEGÚN ACTA DE INICIO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	POLIZAS N.°	AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	ESTADO DE LAS POLIZAS
			DESDE	HASTA		
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 2	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70	
SEGÚN MODIFICATORIA No.01						
SEGUROS DEL ESTADO	30-44-101068027 ANEXO 3	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80	Aprobada
		CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80	
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta


4 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

4.1. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA
N/A	$		
N/A	$		
TOTALES	$		
BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
ANTICIPO	$ 00		
PRIMER PAGO PARCIAL		$ 00	$ 00

El Contrato Interventoría No. 1701 de 2025 no cuenta con anticipo.

4.2. INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO DE LA INTERVENTORIA

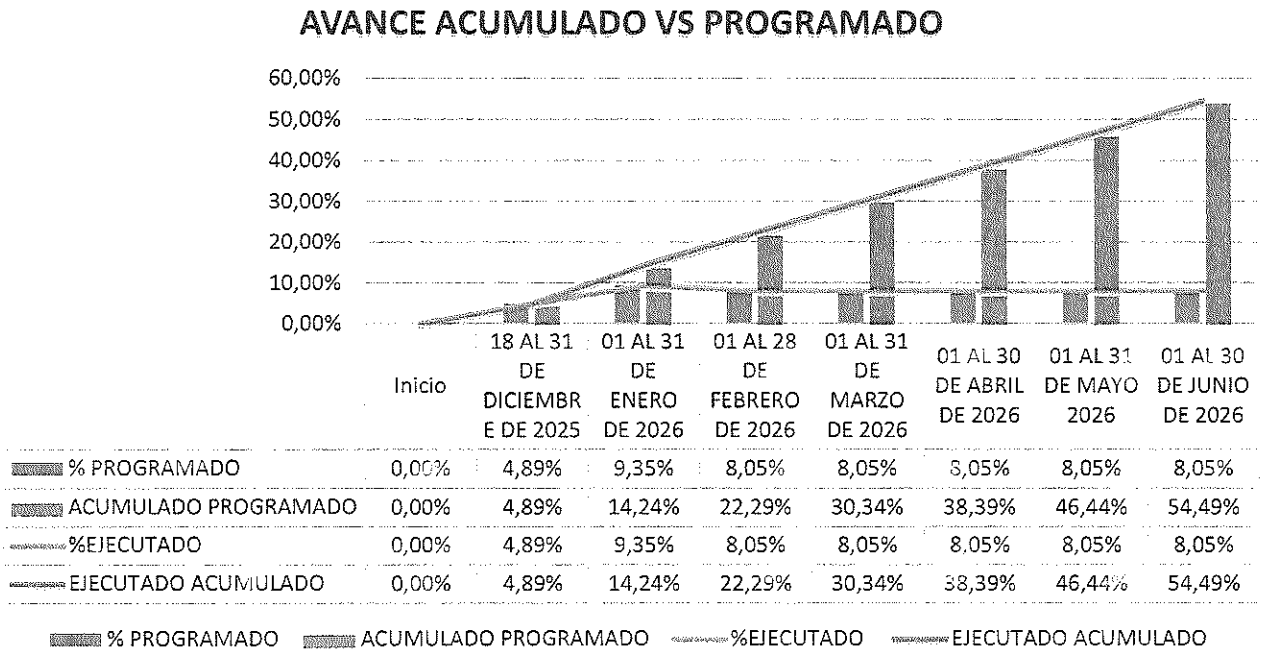

	Inicio	18 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	01 AL 31 DE ENERO DE 2026	01 AL 28 DE FEBRERO DE 2026	01 AL 31 DE MARZO DE 2026	01 AL 30 DE ABRIL DE 2026	01 AL 31 DE MAYO 2026	01 AL 30 DE JUNIO DE 2026
% PROGRAMADO	0,00%	4,89%	9,35%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
ACUMULADO PROGRAMADO	0,00%	4,89%	14,24%	22,29%	30,34%	38,39%	46,44%	54,49%
%EJECUTADO	0,00%	4,89%	9,35%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%	8,05%
EJECUTADO ACUMULADO	0,00%	4,89%	14,24%	22,29%	30,34%	38,39%	46,44%	54,49%

4.3. BALANCE FINANCIERO


DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL	$296.313.094,00
VALOR PROYECTO ACTUALIZADO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO	$ 0,00
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	$ 0,00

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

5 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

PERSONAL (NOMBRE Y IDENTIFICACION)	CARGO
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ C.C 86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
JHONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS C.C 1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FERNANDO ORTIZ FUENTES C.C 80.074.961	ESTRUCTURAL
LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ C.C 1.121.892.054	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
RUBY JOHANNA VILLAREAL C.C 41.952.332	TOPOGRAFA
JUAN DIEGO GARCIA LOZANO C.C 1.121966360	CADENERO
GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ C.C 1.006.874.312	AUXILIAR ADMINISTRATIVA

ORGANIGRAMA DEL PERSONAL

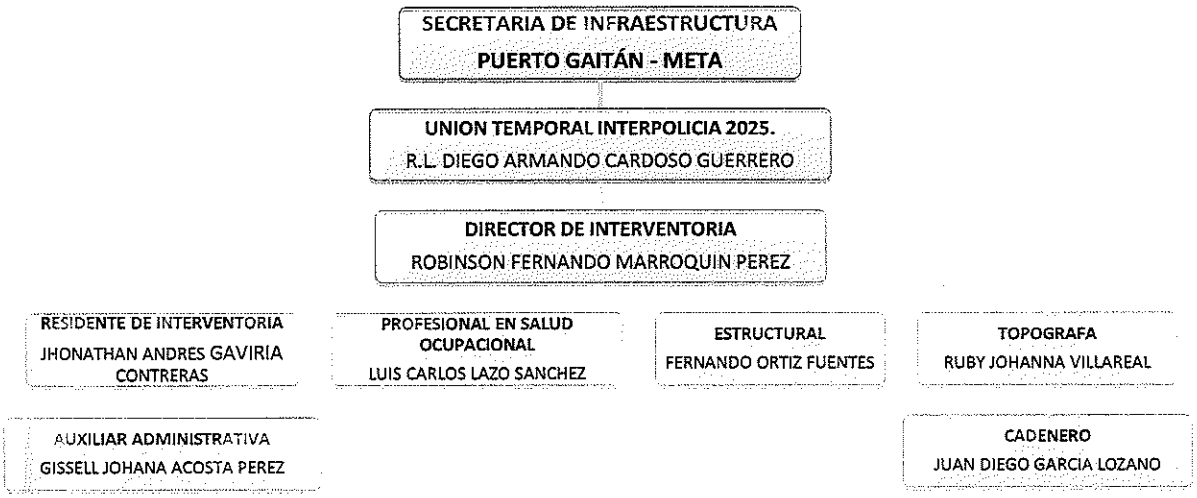

PERSONAL Y SEGURIDAD SOCIAL

Durante el período comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio del 2026, la Interventoría realizó el seguimiento, revisión y verificación del cumplimiento de las obligaciones laborales y parafiscales a cargo del contratista, constatando que se efectuó el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculado al Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

RELACIÓN PLANILLA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA (01/06/2026-30/06/2026)

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1083150848
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1083150848
1.121.844.182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1083150848
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1083150848
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1083150848
1.006.874.312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1083150848

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

OBRA

6 GENERALIDADES DEL CONTRATO:

Considerando que el municipio de Puerto Gaitán – Meta, en su plan de desarrollo "JUNTOS LO HACEMOS POSIBLE 2024-2027", ha viabilizado, priorizado y aprobado proyectos de inversión los cuales se encuentran incluido el programa 4501 "FORTALECIMIENTO DE LA CONVIVENCIA Y LA SEGURIDAD CIUDADANA". Con la finalidad de cumplir con la meta PDM0318 "CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA MANTENER O MEJORAR LAS CONDICIONES OPERATIVAS DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE ORDEN PÚBLICO", fue adjudicado mediante la licitación pública LP-SI-010-2025, que tiene como objeto "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META", con código BPIN 202500000031783 Este proyecto se encuentra suscrito al contrato de obra pública 1683 del día tres (03) de diciembre de 2025, siendo perfeccionado con el acta de inicio de fecha el día dieciocho (18) de diciembre de 2025.

6.1. LOCALIZACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto objeto del contrato 1683 de 2025 se encuentra localizada en el municipio de Puerto Gaitán-Meta. En la siguiente tabla un resumen de la ubicación del municipio.

Puerto Gaitán Meta	
País:	Colombia
Región:	Orinoquía
Departamento:	Meta
Ubicación:	Lat. N. 3° 05' y 4° 08' Log. O. 71° 05' y 72° 30'
Altitud:	149 msnm
Superficie:	17.536 km²
Temperatura media:	27 °C
Fundación:	1932
Población:	46.689 habitantes

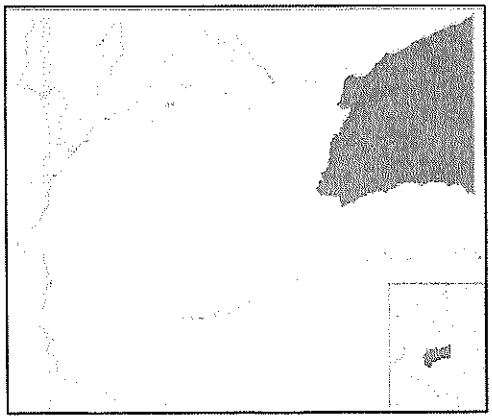


Ilustración 3. Localización de la cabecera municipal de Puerto Gaitán-Meta.

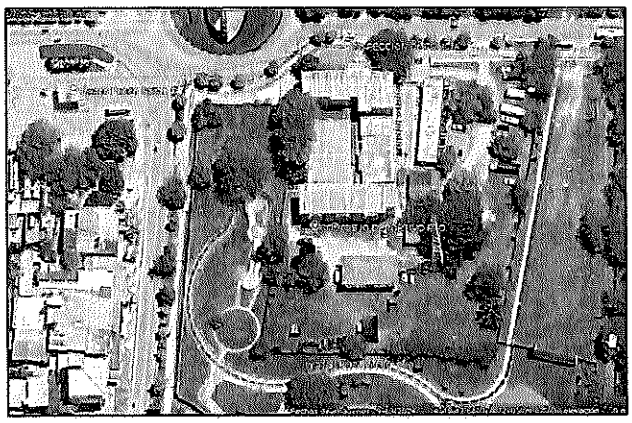


Ilustración 4. Imagen aérea del proyecto

El proyecto se localiza en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la Estación de Policía, ubicada en la Carrera 10 N.° 17-31, barrio Alto Manacacias. Este sector corresponde a un área estratégica del municipio, donde se concentra una parte significativa de la actividad administrativa, comercial y social del territorio.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

6.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEL CONTRATO DE OBRA

El proyecto tiene como objetivo la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, con el fin de superar las deficiencias físicas y funcionales que actualmente limitan el cumplimiento de las funciones misionales de la Policía Nacional. La intervención se fundamenta en un diagnóstico técnico que evidencia deterioro estructural, insuficiencia de espacios, fallas en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal. Puerto Gaitán es un municipio de alta relevancia estratégica debido a su crecimiento demográfico, desarrollo agroindustrial y ubicación cercana a corredores de movilidad interdepartamental, lo cual ha incrementado las exigencias en materia de seguridad y control territorial. En este contexto, el proyecto busca dotar a la institución de una infraestructura moderna, funcional y acorde con las dinámicas urbanas y sociales del territorio.
La propuesta contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la rehabilitación del edificio "Casa Blanca" destinado a vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad. Estas acciones permitirán mejorar las condiciones de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos, fortalecer la seguridad física de la estación y optimizar la capacidad operativa institucional. El proyecto se desarrollará bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia institucional y responsabilidad fiscal, contribuyendo al fortalecimiento de la presencia policial y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán.

6.3. ALCANCE DEL CONTRATO DE OBRA

El Contrato de Obra No. 1683 de 2025 contempla la ejecución de actividades orientadas al fortalecimiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio, mediante la construcción de una edificación de dos (2) niveles destinada a nuevos alojamientos con capacidad para albergar hasta ciento doce (112) personas, la rehabilitación integral del edificio denominado Casa Blanca, con capacidad para cuatro (4) grupos familiares, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable que garantice la continuidad del servicio, y la demolición y posterior construcción de un nuevo cerramiento perimetral, con el propósito de mejorar las condiciones de seguridad y control del recinto policial.
A continuación, se muestra el alcance del contrato el cual consta de 23 capítulos enfocados a satisfacción del objeto contratado.

CAPITULO	DESCRIPCIÓN	VALOR
	PRESUPUESTO ALOJAMIENTOS NUEVOS	
1	PRELIMINARES	$ 4.198.624,00
2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	$ 80.230.348,00
3	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 417.501.889,00
4	RED DE PRESION	$ 10.903.310,00
5	RED SANITARIA	$ 34.354.320,00
6	RED PLUVIAL	$ 11.900.456,00
7	RED CONTRA INCENDIOS	$ 1.014.054,00
8	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 141.083.078,00
9	RED ELECTRICA - APANTALLAMIENTO	$ 13.938.854,00
10	MAMPOSTERIA, PISOS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 565.737.574,00
11	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 46.128.228,00
12	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 378.485.102,00
	PRESUPUESTO MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES EXISTENTES	
13	DEMOLICION Y DESMONTE	$ 41.757.891,00
14	RED ELECTRICA - BAJA TENSION	$ 37.303.929,00
15	ACABADOS ARQUITECTONICOS	$ 223.371.272,00
16	CARPINTERIA METALICA, MADERA Y DE ALUMINIO	$ 144.145.763,00
17	APARATOS SANITARIOS Y PRESION	$ 8.154.912,00
	PRESUPUESTO TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMAMIENTO DE AGUA	
18	PRELIMINARES	$ 714.444,00
19	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACABADOS	$ 57.497.172,00
	PRESUPUESTO CERRAMIENTO	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

20	PRELIMINARES, DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES	$ 34.412.024,00
21	ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	$ 814.593.767,00
	OTROS	
22	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 75.936.264,00
23	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 119.989.209,00
VALOR TOTAL		**$ 4.306.277.668,00**

6.4. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto beneficia de manera directa al personal de la Policía Nacional que presta servicio en el municipio de Puerto Gaitán, al proporcionar una infraestructura moderna, funcional y segura que mejora las condiciones de alojamiento, operación y bienestar laboral. De manera indirecta, la iniciativa impacta positivamente a la comunidad del municipio, al fortalecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, contribuyendo al orden público y al desarrollo social del territorio.

7 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN BASICA

NÚMERO DEL PROCESO (ETAPA PRE-CONTRACTUAL):	LP-SI-010-2025
NÚMERO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE MINUTA INICIAL:	CONTRATO DE OBRA NO. 1683 DEL 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	902.011.453-2
REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES)	INGRID MARYORY GARCÍA FONSECA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL REPRESENTANTE LEGAL (PARA PERSONAS JURÍDICAS Y PLURALES):	C.C. NO. 1.122.120.037 DE ACACIAS - META
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA (ACORDE A MINUTA Y RUT):	UTINGEPOLICIAGAITAN@GMAIL.COM
NOMBRE DEL CONTRATISTA (NATURAL, JURÍDICA, PLURAL):	UNION TEMPORAL INGE POLICÍA GAITAN
VALOR DEL CONTRATO:	CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.306.277.668,00 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	17 DE AGOSTO DE 2026

8 INFORMACIÓN FINACIERA Y INFORMACION DE INVERSION DEL ANTICIPO

A continuación, se relacionan los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP), Registros Presupuestales (RP) y los rubros presupuestales asignados que amparan los recursos financieros del presente contrato de obra:

FUENTE DE FINANCIACION	RECURSOS	CDP	RP
1041-1.3.3.4.01 – R.B. CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA	$ 620.406.812,00	DIS.2025002848	RES.2025004223
	$ 3.685.870.856,00	DIS.2026000007	RES.2026000004
TOTALES	**$ 4.306.277.668,00**		

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

BALANCE FINANCIERO

RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	**VALOR**	**CONCEPTO**	**FECHA**
EGR.2026010031	$1.431.837.324,61	ANTICIPO No. 01 CTO 1683/2025 – 35%	21/01/2026
EGR.2026030507	$24.257.838,20	ANTICIPO No. 02 CTO 1683/2025 – 15%	16/03/2026
EGR.2026030508	$589.386.812,00		16/03/2026
TOTALES	**$ 2.045.481.974,81**		
BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	**VALOR DESEMBOLSO**	**AMORTIZADO**	**SALDO POR AMORTIZAR**
ANTICIPO	**$ 2.045.481.974,81**		
PRIMER PAGO PARCIAL		$ 00	**$ 00**

VERIFICACIÓN DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

SEGUN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**POLIZAS N.°**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO DE LAS POLIZAS**
			DESDE	**HASTA**		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067871 ANEXO 0	Cumplimiento	02/12/2025	02/12/2026	$ 430.627.766,80	APROBADA
		Buen manejo del anticipo	02/12/2025	02/12/2026	$ 2.153.138.834,00	
		Salarios y prestaciones sociales	02/12/2025	02/08/2029	$ 215.313.883,40	
		Estabilidad y calidad	02/12/2025	02/12/2030	$ 430.627.766,80	
SEGÚN ACTA DE INICIO						
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067871 ANEXO 1 Y 2	Cumplimiento	18/12/2025	18/12/2026	$ 430.627.766,80	APROBADA
		Buen manejo del anticipo	18/12/2025	18/12/2026	$ 2.153.138.834,00	
		Salarios y prestaciones sociales	18/12/2025	18/08/2029	$ 215.313 883,40	
		Estabilidad y calidad	18/12/2025	18/12/2030	$ 430.627.766,80	
SEGUN SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO						
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**POLIZAS N°**	**AMPARO**	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**	**ESTADO DE LAS POLIZAS**
			DESDE	**HASTA**		
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-40-101025675 ANEXO 0	Predios labores y operaciones	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	APROBADA
		Daño emergente y lucro cesante	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Perjuicios extrapatrimoniales	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Contratistas y subcontratistas	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Responsabilidad civil patronal	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	


NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

		Vehículos propios y no propios	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00	
SEGÚN ACTA DE INICIO						
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	30-44-101067871	Predios labores y operaciones	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	APROBADA
		Daño emergente y lucro cesante	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Perjuicios extrapatrimoniales	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Contratistas y subcontratistas	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
	ANEXO 1 Y 2	Responsabilidad civil patronal	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	
		Vehículos propios y no propios	18/12/2025	18/08/2026	$ 711.750.000,00	

9 PROGRAMADO VS EJECUTADO (GRAFICAS) AVANCE FINANCIERO


CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025								
No. MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO MENSUAL	% PROGRAMADO ACUMULADO	VR. MENSUAL EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO MENSUAL	% EJECUTADO ACUMULADO
18/12/2025	$0,00	$0,00	0,00%	0,00%	$0,00	$0,00	0,00%	0,00%
31/12/2025	$28.037.949,00	$28.037.949,00	0,65%	0,65%	$22.553.338,67	$22.553.338,67	0,52%	0,52%
31/01/2026	$77.425.939,00	$105.463.888,00	1,80%	2,45%	$34.577.031,67	$57.130.370,33	0,80%	1,33%
28/02/2026	$191.735.345,00	$297.199.233,00	4,45%	6,90%	$121.980.572,67	$179.110.943,00	2,83%	4,16%
31/03/2026	$187.737.987,00	$484.937.220,00	4,36%	11,26%	$104.792.888,84	$283.903.831,84	2,43%	6,59%
30/04/2026	$221.627.087,00	$706.564.307,00	5,15%	16,41%	$95.934.936,12	$379.838.767,96	2,23%	8,82%
31/05/2026	$331.938.505,00	$1.038.502.812,00	7,71%	24,12%	$189.309.686,12	$569.148.454,08	4,40%	13,22%
30/06/2026	$822.518.250,00	$1.861.021.062,00	19,10%	43,22%	$111.043.842,97	$680.192.297,05	2,58%	15,80%

AVANCE FISICO

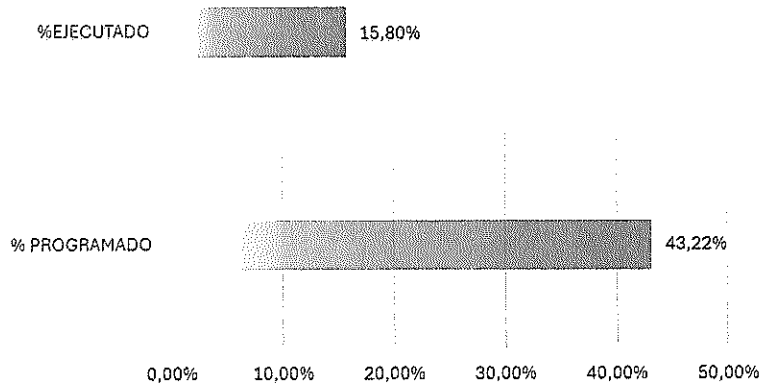

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta


TABLA DE SEGUIMIENTO $

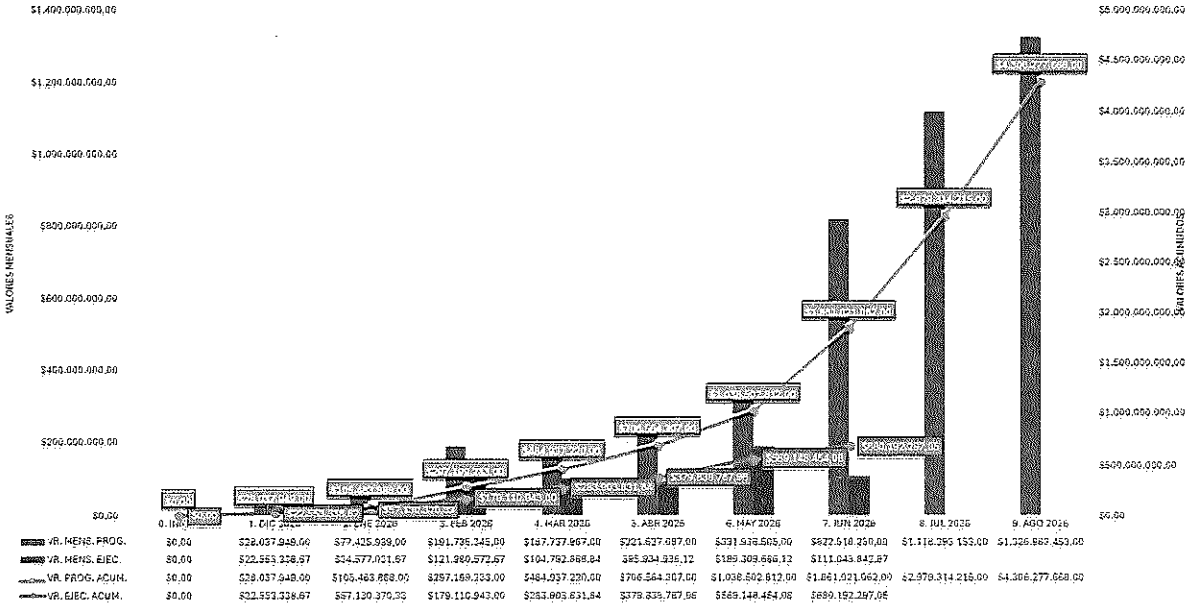

	0. INI	1. DIC 2025	2. ENE 2026	3. FEB 2026	4. MAR 2026	5. ABR 2026	6. MAY 2026	7. JUN 2026	8. JUL 2026	9. AGO 2026
VR. MENS. PROG.	$0,00	$28.037.948,00	$77.425.939,00	$191.735.245,00	$157.737.967,00	$221.627.097,00	$331.938.505,00	$822.518.250,00	$1.116.295.153,00	$1.326.667.453,00
VR. MENS. EJEC.	$0,00	$22.553.338,67	$34.577.021,67	$121.980.572,67	$104.792.868,84	$85.934.935,12	$189.309.666,12	$111.043.847,67		
VR. PROG. ACUM.	$0,00	$28.037.948,00	$105.463.888,00	$297.199.133,00	$454.937.220,00	$706.564.307,00	$1.038.502.812,00	$1.861.021.062,00	$2.979.314.215,00	$4.306.277.668,00
VR. EJEC. ACUM.	$0,00	$22.553.338,67	$57.130.370,33	$179.110.943,00	$283.903.831,84	$369.838.767,96	$559.148.434,08	$670.192.281,75		

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

TABLA DE SEGUIMIENTO %

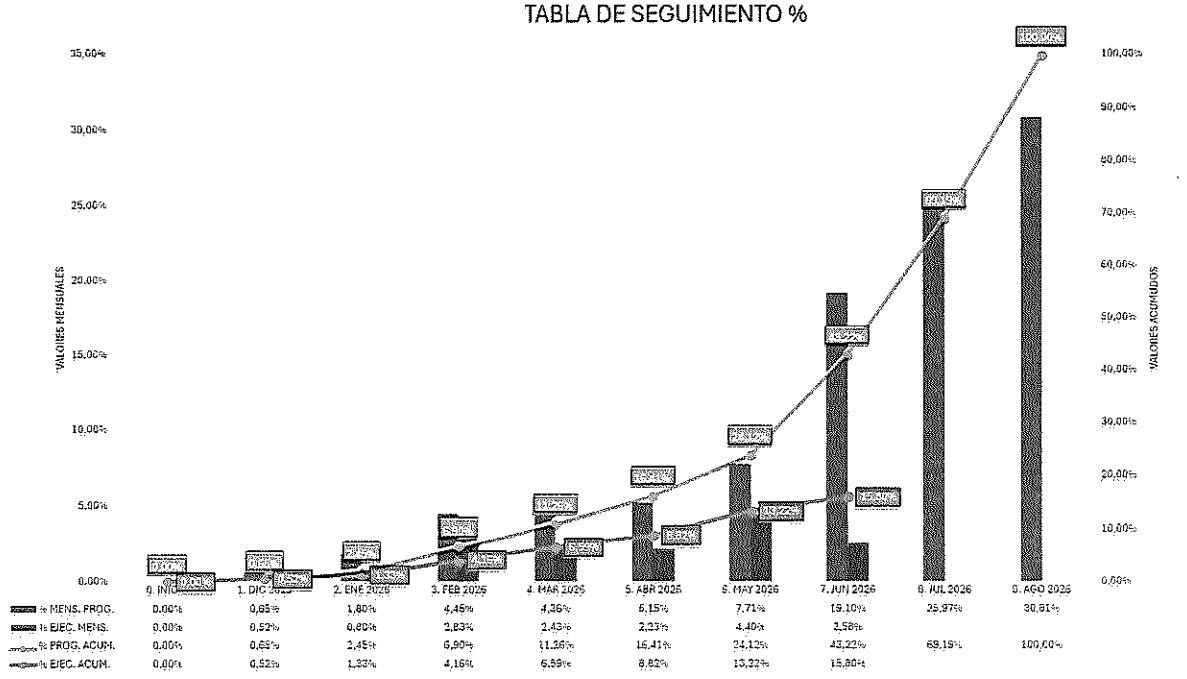

10 EVALUACIÓN DEL AVANCE EJECUTADO VS PROGRAMADO (INCLUYE DIFICULTADES, PROBLEMATICAS E IMPREVISTOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION)

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y supervisión técnica del Contrato de Interventoría, durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, se realizó la revisión, verificación y control de las actividades ejecutadas por el contratista en el marco del proyecto "Construcción, Adecuación y Mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta", evidenciando el desarrollo de los diferentes frentes de obra conforme a las especificaciones técnicas, los diseños aprobados y las obligaciones contractuales vigentes.

La Interventoría verificó los avances registrados en el componente de Alojamientos Nuevos, constatando la correcta ejecución de las actividades estructurales relacionadas con el suministro, figurado, armado y colocación de 1.683 kg de acero de refuerzo FY=420 MPa, así como el suministro e instalación de 270,91 m² de lámina Metaldeck de 2" calibre 22, elementos fundamentales para la conformación de entrepisos y cubiertas del proyecto. De igual manera, se realizó seguimiento a la ejecución de las redes hidrosanitarias y eléctricas, evidenciando la instalación de las tuberías y accesorios correspondientes conforme a las cantidades reportadas y a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato.

Respecto al componente de Mejoramiento de Edificaciones Existentes (Casa Blanca), la Interventoría verificó la ejecución del 100% de las actividades programadas para el período relacionadas con la demolición manual de muros en ladrillo tolete macizo y común, incluyendo las labores de cargue, trasegado y acopio temporal del material resultante, constatando el adecuado manejo de los residuos generados y el cumplimiento de los procedimientos constructivos y ambientales aplicables.

En cuanto a las obras complementarias correspondientes al Tanque Elevado de Agua y al nuevo Cerramiento Perimetral, se evidenció el inicio formal de las actividades preliminares de localización, trazado y replanteo topográfico, las cuales fueron objeto de verificación técnica por parte de la Interventoría, permitiendo garantizar la correcta implantación de las estructuras proyectadas y el cumplimiento de las condiciones geométricas establecidas en los diseños aprobados.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

11 ACTUALIZACIONES DE LA INTERVENTORIA

Durante el período objeto del presente informe, la Interventoría realizó el seguimiento y la verificación de la actualización del personal técnico donde se realizó el retiro de uno de los profesionales que hacía parte del equipo inicialmente aprobado para la ejecución del proyecto. Como parte de las actividades de control administrativo y contractual, se revisó la documentación soporte correspondiente, constatando que la desvinculación fue formalizada conforme a los procedimientos establecidos y que, de manera simultánea, se efectuó su retiro de la planilla de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en cumplimiento de la normatividad laboral vigente.

12 INFORME SISO Y AMBIENTAL GENERAR (ANEXOS)

Como resultado de las actividades de seguimiento, inspección, revisión y verificación realizadas por la interventoría durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, se evidenció que las actividades correspondientes a la instalación de formaleta para vigas aéreas, fundida de placa aérea en concreto, instalación de redes sanitarias y eléctricas, amarre de acero para columnas y demoliciones en el alojamiento denominado "Casa Blanca" fueron ejecutadas bajo la implementación de los controles operacionales definidos en el Sistema de Gestión HSEQ y conforme a los procedimientos establecidos para cada frente de trabajo.

La interventoría verificó el cumplimiento de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), constatando la adecuada identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos inherentes a las actividades desarrolladas, así como la implementación de controles preventivos orientados a mitigar los riesgos asociados a trabajos estructurales, manipulación de acero de refuerzo, fundición de concreto, demoliciones, operación de maquinaria y ejecución de instalaciones hidrosanitarias y eléctricas.

De igual manera, se realizó seguimiento permanente al estado y condiciones de operación de la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas durante el periodo, verificando la ejecución de las inspecciones preoperacionales, el cumplimiento de los programas de mantenimiento, la utilización adecuada de los elementos de protección personal (EPP) y la aplicación de procedimientos seguros de trabajo, evidenciando el cumplimiento de los lineamientos establecidos dentro del Sistema de Gestión HSEQ y de la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el componente ambiental, la interventoría constató la correcta implementación de las medidas de manejo ambiental previstas para el proyecto, verificando la adecuada segregación en la fuente, almacenamiento temporal, control y disposición de los residuos sólidos generados durante las actividades constructivas y de demolición, en concordancia con lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y las obligaciones contractuales aplicables.

Asimismo, la interventoría verificó que, pese a las restricciones operativas derivadas de las condiciones climáticas presentadas durante el periodo, el contratista mantuvo la implementación de las medidas preventivas y de control necesarias para preservar la seguridad del personal, suspendiendo o reprogramando oportunamente aquellas actividades que representaban un incremento en el nivel de riesgo, especialmente las relacionadas con trabajos en altura, fundiciones de concreto y operación de equipos bajo condiciones de lluvia, priorizando en todo momento la protección de los trabajadores y la integridad de las actividades ejecutadas.

13 INFORME DE ESTADO DE TRAMITES DE PERMISOS Y LICENCIAS (AMBIENTALES, CONSTRUCCION ENTRE OTRAS)

Durante el período objeto del presente informe, la Interventoría realizó el seguimiento, revisión documental y verificación del estado de los permisos, licencias y demás instrumentos administrativos requeridos para la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025, constatando el cumplimiento de los requisitos legales, urbanísticos y ambientales aplicables al proyecto de Construcción, Adecuación y Mejoramiento de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta.

Como resultado de la verificación efectuada, se evidenció que el contrato cuenta con la documentación jurídica y técnica que acredita la viabilidad de la intervención, encontrándose vigente y disponible el Certificado de Tradición y Libertad, el certificado predial y la Licencia de Construcción, documentos que respaldan la titularidad

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

del predio, la legalidad de la intervención y el desarrollo de las actividades constructivas conforme a la normatividad urbanística y demás disposiciones legales aplicables.

De igual manera, la Interventoría verificó que el proyecto dispone de la aprobación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) emitida por la autoridad competente, instrumento mediante el cual se establecen las medidas de prevención, mitigación, control, seguimiento y manejo de los impactos ambientales derivados de la ejecución de las obras. Así mismo, se constató que las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado se ejecutaron en concordancia con las obligaciones, programas y medidas contempladas en dicho instrumento ambiental.

Como parte de las labores de control contractual, la Interventoría revisó la vigencia, consistencia y trazabilidad de la documentación soporte relacionada con los permisos y licencias del proyecto, verificando que esta se encuentra debidamente organizada y disponible para efectos de seguimiento, control y eventual inspección por parte de la Entidad Contratante y de las autoridades competentes

14 INFORME DE VERIFICACION DE TOPOGRAFICA DONDE SE COMPARE LA TOPOGRAFIA REALIZADA VS LO PROGRAMADO

N/A

15 CUADRO RESUMEN DE LABORATORIOS Y RESULTADOS DE INTERVENTORIA VS OBRA

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA

Los resultados de laboratorio del contrato de interventoría se encuentran adjuntados en el capítulo de anexos No. 08 del presente informe.

16 ACTAS SUSCRIPTAS

- **ACTA DE INICIO**

17 CUADRO DE CORRESPONDECIA- RELACION

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

18. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental del Contrato de Interventoría, y una vez efectuada la revisión y verificación de la información consignada en el Informe Mensual de Obra correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026 (Periodo 7), esta Interventoría deja constancia de que las actividades ejecutadas por el contratista fueron desarrolladas conforme a las especificaciones técnicas y procedimientos constructivos aplicables, evidenciándose avances significativos en diversos frentes de obra, pese a las limitaciones operativas derivadas de factores climáticos extraordinarios.

Del análisis realizado al avance físico y financiero del contrato, se verificó que el proyecto registra un avance acumulado del 15,80% frente al 43,22% programado en el cronograma contractual, evidenciándose un desfase acumulado del 27,42%. No obstante, la Interventoría concluye que dicho comportamiento obedece principalmente a la incidencia directa de la temporada invernal presentada durante el período evaluado, circunstancia que constituye un factor externo que afectó el normal desarrollo de las actividades constructivas de la ruta crítica, sin que ello sea atribuible a deficiencias en la gestión técnica, administrativa u operativa del contratista.

Así mismo, se verificó la adecuada consolidación de los frentes de trabajo correspondientes a los Alojamientos Nuevos, el Mejoramiento de la edificación denominada Casa Blanca y las Obras Complementarias del Tanque Elevado y el Cerramiento Perimetral, evidenciándose el cumplimiento de las actividades programadas para el período en cuanto al suministro e instalación de materiales estructurales, ejecución de demoliciones controladas y desarrollo de actividades preliminares de replanteo topográfico e implantación de obra, las cuales constituyen hitos fundamentales para la continuidad del proceso constructivo.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

En materia de gestión técnica, ambiental y manejo de materiales, la Interventoría verificó el cumplimiento de las medidas implementadas para el almacenamiento, protección y disposición adecuada de los materiales utilizados en obra, constatando la aplicación de los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y las buenas prácticas constructivas exigidas contractualmente. Se evidenció un adecuado control sobre los materiales susceptibles a afectación por humedad y condiciones climáticas adversas, así como el manejo responsable de los residuos de construcción y demolición generados durante el período.

Por otro lado, la Interventoría revisó e hizo el análisis del avance físico acumulado frente al cronograma contractual evidencia un porcentaje ejecutado del 15,80%, frente a un 43,22% programado, lo que representa un desfase acumulado del 27,42%. En criterio de esta Interventoría, dicho retraso se encuentra asociado principalmente a la incidencia de factores de fuerza mayor derivados de la temporada invernal, así como a condiciones logísticas y operativas propias del proyecto, las cuales afectaron el rendimiento de los frentes de obra y la ejecución de actividades pertenecientes a la ruta crítica.

En consecuencia, la Interventoría deja constancia del estado actual de ejecución del contrato y continuará ejerciendo el seguimiento y control permanente sobre las acciones de recuperación implementadas por el contratista, verificando su efectividad para disminuir el desfase existente y garantizar el cumplimiento del objeto contractual conforme a los principios de calidad, oportunidad y eficiencia.

19. ANEXOS

1. REGISTRO FOTOGRAFICO.
2. COPIA DE BITACORA.
3. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA.
4. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA.
5. NOMINA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA.
6. PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA.
7. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA.
8. RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA.
9. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORIA.
10. CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO.

Ing. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Director de Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025


NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta


ANEXO 1.
REGISTRO FOTOGRAFICO

UT INTERPOLICIA 2026


REGISTRO FOTOGRAFICO DE INTERVENTORIA
INFORME MENSUAL N°7
PERIODO 01/06/2026 AL 30/06/2026


ESTRUCTURAS DE CONCRETO Y ACEROS DE REFUERZO	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	-La interventoría realizó la verificación en campo de las actividades de figurado, armado, colocación y amarre del acero de refuerzo correspondiente a la estructura de la segunda planta de alojamientos, como parte del seguimiento a la ejecución de las obras. -La interventoría realizó el seguimiento y la verificación de la instalación de la placa colaborante tipo Metaldeck, dispuesta como preparación para la posterior fundida de la losa de entrepiso, de acuerdo con el proceso constructivo previsto.

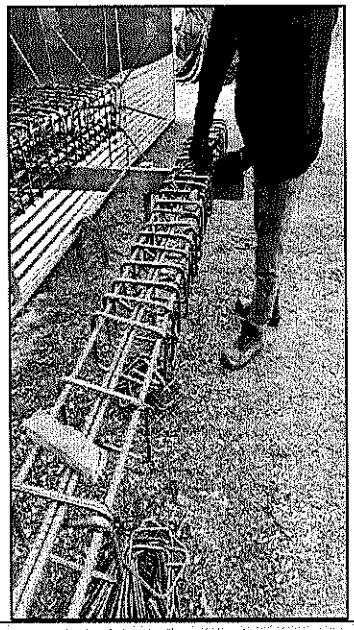

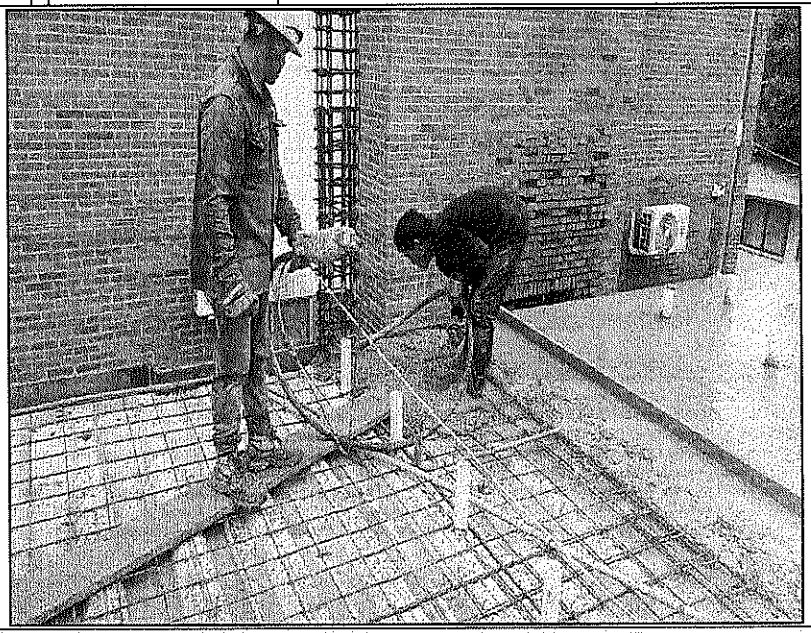


RED DE PRESION	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	-La interventoría realizó el seguimiento y la verificación en campo de las actividades de suministro e instalación de tuberías y accesorios correspondientes a la red de presión, con el fin de constatar el desarrollo de los trabajos conforme a las especificaciones técnicas y los requerimientos del proyecto.

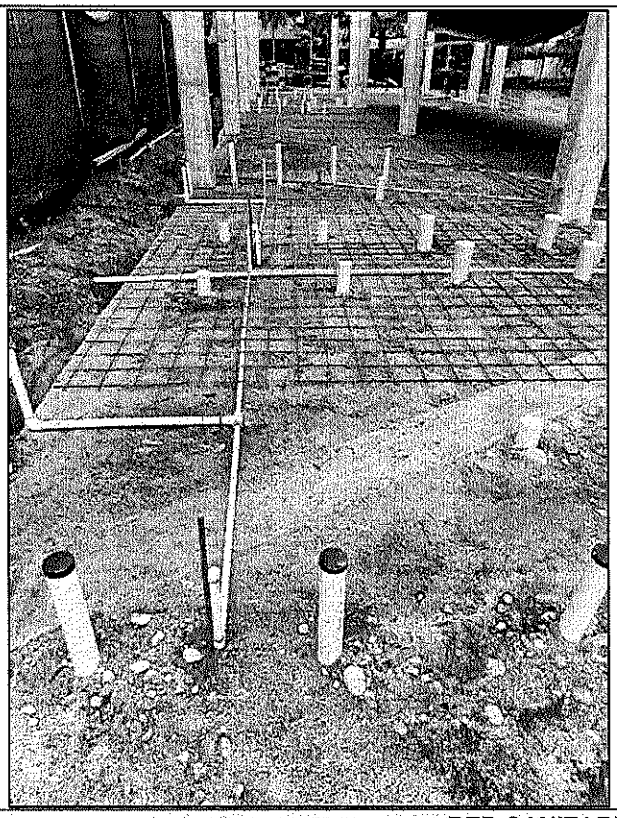


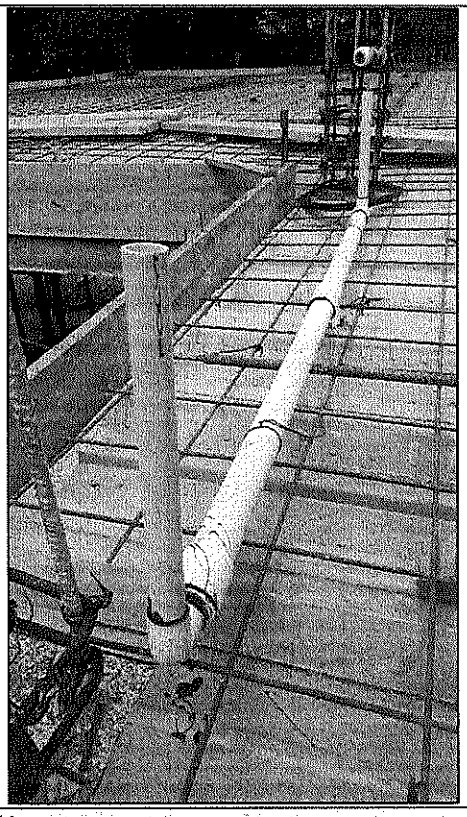



RED SANITARIA	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	-La interventoría realizó el seguimiento y la verificación en campo de las actividades de suministro e instalación de tuberías y accesorios correspondientes a la red sanitaria, con el propósito de verificar el desarrollo de los trabajos de acuerdo con las especificaciones técnicas y los requerimientos establecidos para el proyecto.

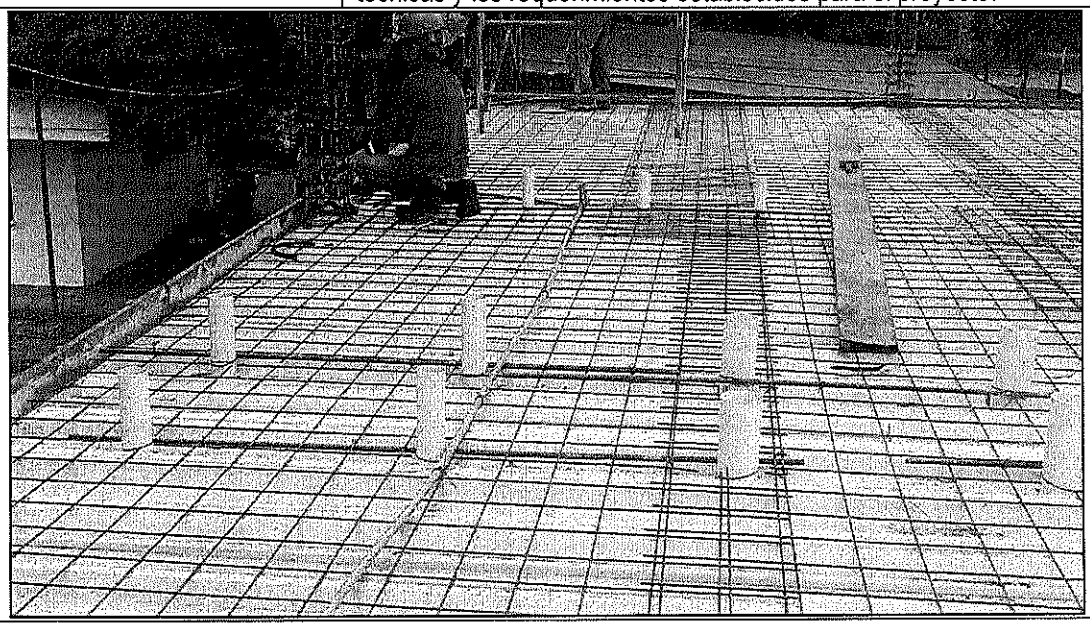


DEMOLICION Y DESMONTE	
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA	-La interventoría realizó el seguimiento y la verificación en campo de las actividades de desmonte del cielo raso en la edificación denominada Casa Blanca, como parte de los trabajos de adecuación y preparación de las áreas intervenidas. -La interventoría efectuó el seguimiento a las actividades de desmonte de diversos elementos de carpintería en Casa Blanca, verificando el desarrollo de los trabajos correspondientes al proceso de intervención de la edificación. -La interventoría realizó la verificación en campo de las actividades de desmonte del piso en baldosa existente en Casa Blanca, como parte de las labores de adecuación y renovación de los espacios. -La interventoría realizó el seguimiento y la verificación de las actividades de demolición manual de muros en Casa Blanca, en el marco de los trabajos de adecuación de la edificación, conforme al alcance previsto para la intervención.

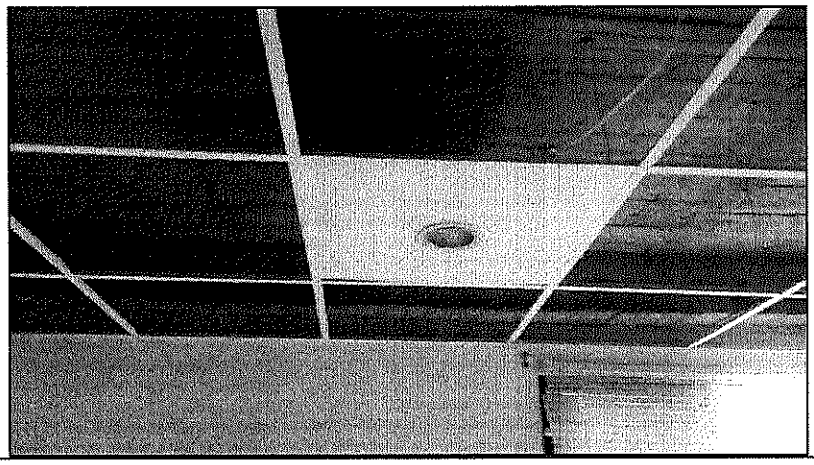

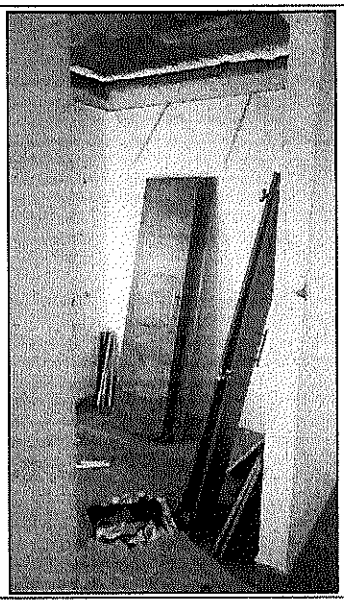

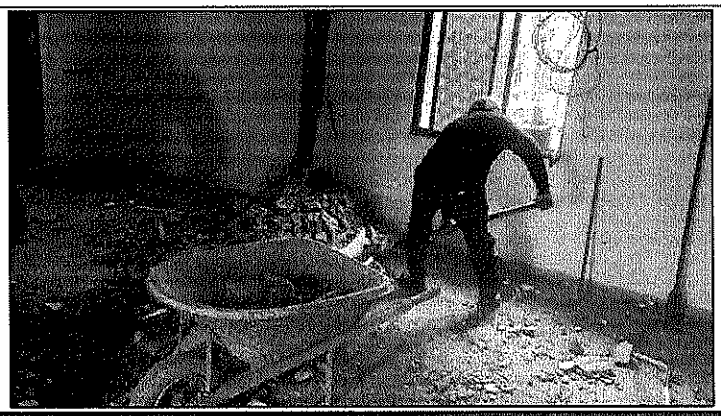

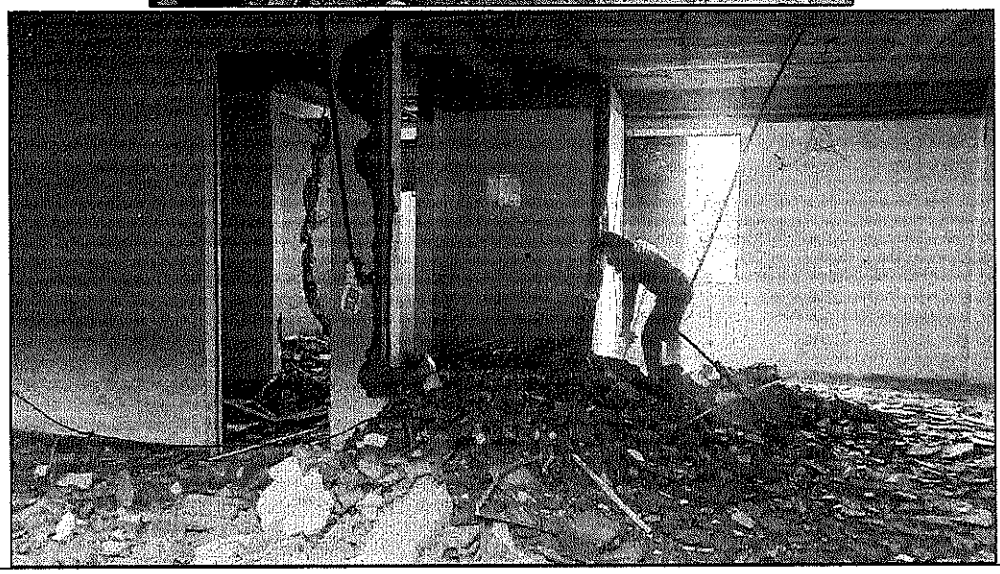

ANEXO 2.
COPIA DE BITACORA

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 01 JUNIO 2026 LUNES	HORAS DE LLUVIA: DIA NUBLADO.
PLAZO ACTUAL: 8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	2			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	1			Guantes	X	
OPERARIO		VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR								
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI	M3	ENTRE EJES A-F Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER R.	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
ALCALDÍA DE PUERTO SANTANDER	Infraestructura			Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY EL CONTRATISTA LLEVA A CABO LA CONFORMACION EN CONCRETO DE LA MITAD DE LA VIGA DE ENTREPISO DESDE EL EJE A-F ENTRE EJES 1-3 SE CONFORMAN LAS VIGAS. EN CONCRETO DE 3.000 PSI CON UNA ALTURA DE 30 cm Y ANCHOS ESPECIFICADOS EN PLANOS Y ACORDE A DISEÑOS APROBADOS POR LA CORRESPONDIENTE INTERVENTORIA.

LAS VIGAS SE CONFORMAN EN SU PRIMERA MITAD HASTA 45 cm POSTERIORES AL EJE F TERMINADO EN 45°

SE TOMAN LOS CORRESPONDIENTES CILINDROS O MUESTRAS DE CONCRETO PARA SER LLEVADAS AL LABORATORIO DE SUELOS.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 02 JUNIO 2026 MARTES	HORAS DE LLUVIA: MAÑANA Y TARDE NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
VIGAS EN CONCRETO 3000 PSI	M3	EJES A-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SE CONTINUA CONFORMANDO EL ENCOFRADO DE LA VIGA ENTRE PISOS DEL EJE 6-K ENTRE LOS EJES 1-3.

SE DESISTALAN TESTEROS INTERNOS DE LA VIGA ENTRE EJES 1-3 Y EJES A-F. SE LIMPIAN Y SE UNTAN A INSTALAR EN LA VIGA ENTRE PISOS ENTRE LOS EJES 6-K Y EJES 1-3.

AUN NO SE INICIAN ACTIVIDADES EN EL SECTOR CASA BLANCA, NO SE AUTORIZA EL INICIO PUES LOS ALOJAMIENTOS ACTUALES ESTAN TODAVIA HABITADOS.

EL CONTRATISTA APLICA AGUA CON MANGUERA A LAS VIGAS CONFORMADAS PARA EL PROCESO DE FRAGUADO.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 03 JUNIO 2026 MIERCOLES	HORAS DE LLUVIA: OIA SOLEADO.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	1			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGA CONCRETO 3.000 PS, ENTREPISO	M3	ENTRE EJES G-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	Puerto Galván

EL CONTRATISTA CONTINUE LLEVANDO A CABO EL ENCOFRADO INTE-RAL DE VIGAS Y VIGAS RIOSTRAS DE VIGA ENTRE PISO ENTRE EL EJE G-K Y EJES 1-3

SE RESTA SUMINISTRO DE MAMPOSTERIA, ESTE SE ALMACENA CON PLASTICO PARA EVITAR EL DAÑO POR FACTORES CLIMATICOS.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 04 JUNIO 2026 JUEVES	HORAS DE LLUVIA: LLUVIAS 4 HORAS.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	3					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
VIGA CONCRETO 3.000PSI ENTREPISO	M3	ENTRE EJES G-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN META	Infraestructura			Puerto Gaitán
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO EL ENCOFRADO DE LOS LATERALES DE LA VIGA ENTRE EJES DE LOS EJES G-K Y ENTRE EJES 1-3. ; A SI MISMO SE CONTINUA INSTALANDO CAMILLA PARA LA CONFORMACION DE LA VIGA

EL ENCOFRADO SE REALIZA CON LA SUPERVICION CONTINUA DE LA INTERVENTORIA Y APROVACION DE LA MISMA.

LAS LLUVIAS FUERTES PRESENTADAS EN HORAS DE LA TARDE OCACIONAN RETRAZOS EN LA ACTIVIDAD

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 05 JUNIO 2026 VIERNES.	HORAS DE LLUVIA: LLUVIA MODERADA 2 HORAS.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos		
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas		
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas		
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes		
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas		
AYUDANTE	8					Alcohol		
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGA EN CONCRETO 3.000 PSI ENTORNO	M3	ENTRE EJES K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA CONFORMACION DEL ENCOFRADO DE LA VIGA ENTREPISO UBICADA ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES G-K, LA MADERA PARA EL ENCOFRADO SE UTILIZA LA MISMA DE LA PRIMERA PARTE DE LA VIGA.

LAS LLUVIAS MODERADAS PRESENTADAS EN HORAS DE LA TARDE HAN OCASIONADO RETRAZOS EN LA ACTIVIDAD.

LA INTERVENTORIA SUPERVISA CONTINUAMENTE LA ACTIVIDAD EJECUTADA Y APROBANDO LA MISMA.

1256

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 6 JUNIO 2026 SABADO	HORAS DE LLUVIA: LLUVIAS FUERTES 4 HORAS.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGA EN CONCRETO 3.000PSI	M3	ENTRE EJES 1-2 Y EJES G-K	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	Puerto Gaitán

SE CONTINUO CON EL ENCOFRADO DE LA VIGA DE ENTRE-PISO ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES G-K, POR LAS FUERTES LLUVIAS PRESENTADAS, LA ACTIVIDAD SE VIO INTERRUMPIDA, LA CUAL DEMANDA DIRECTA OCUPACIÓN ACTIVIDAD EN OBRA

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 07 JUNIO 2026 DOMINGO	HORAS DE LLUVIA: 3 HORAS LLUVIAS CONSTANTES
PLAZO ACTUAL: 8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA				Botas	X	
AYUDANTE	3					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
VIGA CONCRETO 3.000 PSI ENTREPISO	M3	ENTRE EJES E-K Y EJ 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY POR SER DOMINGO NO SE LLEVO A CABO ACTIVIDADES EN OBRA

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 08 JUNIO 2026. LUNES	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VISA EN CONCRETO 3.000 PSI ENTREPISO	M3	ENTRE EJES G-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY ES LUNES FESTIVO, A LO CUAL NO SE LLEVO ACTIVIDADES EN OBRA

SE REALIZO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 9 JUNIO 2026 MARTES.	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	1	X		Botas	X	
AYUDANTE	1					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGA EN CONCRETO 3.000PSI ENTREPISO	M3	ENTRE LOS EJES G-K y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	Puerto Gaitán

EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO EL ENCOFRADO DE LA VIGA DE ENTREPISO UBICADA ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES 6-K, EL DIA DE HOY SE TERMINA EL ENCOFRADO, CON LA SUPERVISION DE LA INTERVENTORIA Y APROBACION DE LA MISMA.

SE REALIZA EL SUMINISTRO DE GRAVA 1/2" Y ARENA DE PLANTA PARA CONFORMAR LA VIGA PARA EL DIA DE MAÑANA.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 10 JUNIO 2026 MIERCOLES	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA SOLEADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	1	X		Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	1	X		Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA				Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGA CONCRETO 3.000 PSI ENTREPISO	M3	ENTRE EJES G-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY CONFORMA UN CONCRETO DE 3.000PSI LAS VIGAS CENTRIFUGAS LOCALIZADAS ENTRE LOS EJES 1-3 Y ENTRE EJES G-K, LA DOSIFICACION UTILIZADA PARA EL CONCRETO SE REALIZO POR LABORATORIO Y APROBADO PREVIAMENTE POR LA INTERVENTORIA

LAS VIGAS CONFORMADAS TIENEN UNA ALTURA DE 30 cm.
EL CONTRATISTA TOMA MUESTRAS DEL CONCRETO MEZCLADO EN OBRA

SE UTILIZO UN ADHERENTE DE CONCRETOS, SIKA DUR PROMIX 32. PARA LAS UNIONES DE LAS VIGAS EN EL EJE G DE 1-3 EJES.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 11 JUNIO 2026 JUEVES	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA SABADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	3					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
VIGA CONCRETO 3.000 PSI ENTRE PISO	M3	ENTRE EJES G-K Y EJES 1-3	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFERRB	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY INICIA EL RETIRO DE FORMALETAS LATERALES DE LAS VIGAS ENTRE EJES CONFORMADAS EL DIA DE AYER, ASI MISMO RETIRA CAMILLAS, CERCHAS Y PUNTALES DE LA VIGAS CONFORMADAS EL 01 DE JUNIO, CON LA PRECAUCION DE APUNTALAR NUEVAMENTE LAS VIGAS Y VOLADIZOS HASTA QUE CUMPLA LOS 14 DIAS.

EL CONTRATISTA CONTINUO HIDRATANDO LOS CONCRETOS DE VIGAS ENTRE EJES PARA LOGRAR EL CORRECTO CURADO.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 12 JUNIO 2026 VIERNES.	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA SOLEADO

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	3					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
DESCONFINADO VIGAS ENTREPISO		EJES 1-3 ENTRE EJE A-C.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA Y TERMINA EL DIA DE HOY EL DESENCOFRADO DE LAS VIGAS CONFORMADAS ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES G-K

ASI MISMO EL DIA DE HOY TERMINO DE APUNTALAR LAS VIGAS CONFORMADAS ENTRE LOS EJES 1-3 Y A-G.

EL CONTRATISTA CONTINUA HIDRATANDO CON AGUA DOS 4-5 VECES EN EL DIA LAS VIGAS ENTRE PISO CONFORMADAS

EL DIA DE HOY LLEGO A LA OBRA LA LAMINA METAL DECK

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN- META	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 13 JUNIO 2026 SABADO	HORAS DE LLUVIA: 2 HORAS LLUVIAS MODERADA
PLAZO ACTUAL: 8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
INSTALACION METALDECK	M2	EJES 1-3 A EJES A-C.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA EL DIA DE HOY INICIO LA INSTALACION DE LA LAMINA METALDECK SOBRE LAS VIGAS DE ENTREPISO LOCALIZADAS ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES A-G.

LA LAMINA SE UBICO 10 cm DEL BORDE EXTERNO DE LAS VIGAS 1 Y 3 Y EN LA VIGA DEL EJE 3 SE TRASLAPA., LA LAMINA SE ASEGURA EN SUS EXTREMOS CON PUNTOLA DE ACERO.

AL DIA DE HOY NO SE HA INTERRUMPIDO CASO BLANCO PUESTO QUE CONTINUAN OCUPADO LOS ALOJAMIENTOS,

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 14 JUNIO 2026 DOMINGO	HORAS DE LLUVIA: 4 Horas lluvia aislados.

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
INSTALACION LAMINA METALDECK	M2	EDIFICIO EJES 1-3 Y A-C.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme

NC: No Conforme

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
RESIDENTE DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY POR SER DOMINGO NO SE REALIZARON ACTIVIDADES EN OBRA.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 15 JUNI 2026 LUNES	HORAS DE LLUVIA:

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
INSTALACION METALDECK	M2	EJES 1-3 A EJES A-C	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY POR SER LUNES FESTIVO NO SE LLEVO A CABO ACTIVIDADES EN OBRA, SE REALIZO ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 16 JUNIO 2026. MARTES.	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA NUBLADO
PLAZO ACTUAL: 8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	1							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
INSTALACION METALDECK	M2	ENTRE EJES 1-3 Y EJE A-E.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DI: BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA LA INSTALACION DE METALDECC EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES A-G, SE INICIA LA INSTALACION DE DUCTOS ELECTRICOS Ø 1/2 Y 3/4", SE INICIA EL MONTAJE DE MALLA ELECTRO SOLDADA. FY 5000 CON TRASLAPO ENTRE MALLAS DE 30cm

EL CONTRATISTA CONTINUA LA HUMECTACION DE LAS VIGAS ENTRE PISOS CON AGUA DE 4 A 5 VECES AL DIA.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA		Puerto Gaitán
	Infraestructura		
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 17 JUNIO 2026 Miercoles	HORAS DE LLUVIA: 4 Horas
PLAZO ACTUAL: 8 meses.	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Malla electrosoldada Fy 5000	Kg	EJES 1-3 A EJES A-E		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER A. BECERRA M.	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	Puerto Gaitán

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA INSTALACION DE MALLA ELECTRO SOLDADA F-Y 5000, SE INSTALAN PUNTOS Ø 4" - Ø 2" SANITARIOS, PREVIA LOCALIZACION ACORDE CON LOS PLANOS DE ARQUITECTURA E HIDRAULICOS

ASI MISMO SE INSTALA DUCTO Ø1"1/4" DE PRESION PARA BAÑOS HOMBRES Y MUJERES EN EL SECTOR EJE 1-3 A EJE A-G.

SE INSTALA FORMALETA MADERA AL PERIMETRO DE LA PLACA.

LAS ANTERIORES ACTIVIDADES SE REALIZARON ACORDE A PLANOS Y DISEÑOS APROBADOS POR LA INTERVENTORIA.

EN HORAS DE LA TARDE SE PRESENTO LLUVIAS FUERTES QUE OCACIONARON RETRAIMIENTOS BAJOS DE LAS ACTIVIDADES EN DESARROLLO

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 18 JUNIO 2026 JUEVES	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA SOLEADO
PLAZO ACTUAL: 8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	2	X		Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	1	X		Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8	PLUMA	1	X		Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
PLACA ENTREPISO 3.000 PSI	M3	EJES 1-3 A EJES A-C.	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:		
C: Conforme	JENNIFER BECERRA	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONFORMA EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3.000 PSI EL TRAMO DE PLACA ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES A-G CON UN ESPESOR DE 10cm

PARA EL PROCESO SE UTILIZO UNA PLUMA PARA IZAR EL CONCRETO 2 MEZCLADORAS DE 1 1/2 BTS.

HASTA EL DIA DE HOY NO SE HAN INICIADO LABORES DE CONSTRUCCIÓN EN CASA BLANCA YA QUE AUN ESTA HABITADA.

EL CONTRATISTA TOMO MUESTRA DEL CONCRETO FABRICADO EN OBRA PARA ANALIZAR LA RESISTENCIA A LA COMPRECION EN EL LABORATORIO

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 19 JUNIO 2026 VIERNES	HORAS DE LLUVIA: 0 Dia NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	0					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Malla electrosoldada 5.000	Kg	Entre ejes 1-3 y ejes G-K	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER B	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA CONTINUA LA INSTALACION DE MALLA ELECTRO SOLDADA EN EL TRAMO PARA CONFORMAR PLACA ENTRE PISO DEL SECTOR UBICADO ENTRE LOS EJE 1-3 Y EJE G-K. A SI MISMO CONTINUA LA INSTALACION DE (PIA) LAMINAS METALDECK EN EL MISMO TRAMO

EL DIA DE HOY SE SUMINISTRO CEMENTO A LA OBRA Y MATERIALES AGREGADOS COMO ARENA DE PEGANTE Y GRAVA. 1/2

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 20 JUNIO 2026 SABADO	HORAS DE LLUVIA: 0 NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD
DIRECTOR OBRA	1
RESIDENTE	2
MAESTRO	1
OFICIAL	1
OPERARIO	0
AYUDANTE	8
TOPOGRAFO	0
INSPECTOR SISO	1
CELADOR	0
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA	

EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO Operación	ESTADO Mantenimiento
RETROEXCAVADORA	0		
COMPACTADOR TIPO RANA	0		
MEZCLADORA DE CONCRETO	0		
VIBRADOR DE CONCRETO	0		
VOLQUETA	0		

ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
Elemento	SI	NO
Cascos	X	
Gafas	X	
Tapabocas	X	
Guantes	X	
Botas	X	
Alcohol	X	

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
INSTALACION METALDECK	M2	ENTRE EJES 1-3 y EJES G-K	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES		

LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES		

LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO
OBSERVACIONES		

SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES		

LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X

SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, ,con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	SEGUIMIENTO FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SE CONTINUA LA INSTALACION DE LAMINA METALDECK PARA PLACA ENTREPISOS DEL TRAMO UBICADO ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES G-K. APOYANDOLA SOBRE LAS VIGAS CONFORMADAS DE ENTREPISO, DICHA LAMINA SE FIJA CON PUNTILLA A 10CM DEL BORDE EXTERNO DE LOS EJES DE VIGAS 1 Y 3 Y EN O SOBRE LA VIGA EJE 2 SE TRASLAPO LA LAMINA.

A SI MISMO SE CONTINUO INSTALANDO MALLA ELECTRO SOLDADA F'y 5000. SOBRE LA PLACA METALICA METALDECK.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN, META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 21 JUNIO 2026 DOMINGO	HORAS DE LLUVIA: LLUVIA ESPACIOS 1 H.
PLAZO ACTUAL: 8 MESES.	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	3					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
LAMINA METALDECK	M2			

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY EL CONTRATISTA NO TUVO A CARGO ACTIVIDADES POR SER DOMINGO.

EL CONTRATISTA REALIZA ACTIVIDADES DE ADMINISTRACION.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 22 JUNIO 2026 LUNES	HORAS DE LLUVIA: 0 DIA SOLEADO

PLAZO ACTUAL	2 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	0	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
Malla electrosoldada 6x 5000	Kg	EJES 1-3 A EJES G-K	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SE CONTINUA REALIZANDO ACTIVIDADES PARA INSTALACION DE METALDECK Y MALLA ELECTRO SOLDADA Fy 5000 QUE SE TRASLAPA 30cm EN CADA SENTIDO

EL CONTRATISTA INSTALA NUMEROS 2 PUNTOS DE Ø 4" Y 2" DE TUBERIA SANITARIA. UBICADOS EN EL SECTOR BAÑOS HOMBRES Y MUJERES.

EL DIA DE HOY SE PERMITE INTERVENIR EL PISO 01 DE EL EDIFICIO CASA BLANCA, EL SEGUNDO NIVEL CONTINUA HABITADO Y UNA VEZ SE TERMINE EL PRIMER NIVEL SE PODRA INICIAR EL SEGUNDO NIVEL.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 23 JUNIO 2026. MARTES	HORAS DE LLUVIA: DIA NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	3					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
DEMOLICION PISO BALDOSA	M2	EDIFICACION EXISTENTE	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforma	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA INICIA EL DIA DE HOY CON EL DESMONTE DE ARMADOS. Y DEMOLICION DE PISOS EN EL EDIFICIO CASA BLANCA.

SE CONTINUA INSTALANDO la malla ELECTROSOLDADA FY 5.000 CON TRASLAPO 30cm UBICADA ENTRE LOS EJES 1-3 Y EJES 6-K.

SE INICIA DESMONTE DE CIELO RAZO EN LA EDIFICACION EXISTENTE (CASA BLANCA) PRIMER PISO.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN- META	OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 24 JUNIO 2026 MIERCOLES	HORAS DE LLUVIA: Dia soleado.

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	1	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	8					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC
Malla electrosoldada C-Y 5000	Kg	EJES 1-3 y EJES 6-K	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme

NC: No Conforme

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
RESIDENTE DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

HOY SE CONTINUA INSTALANDO LA MALLA ELECTROSOLDADA EN LA NUEVA EDIFICACION PARA LA SEGUNDA PARTE DE LA PLACA ENTREPISO ENTRE LOS EJES 1-3 Y ENTRE EJES G-K

ASI MISMO SE INSTALAN EL ENCOFRADO LATERAL DE LA PLACA, SE DEJA INSTALADA LA PUMA PARA EL DIA DE MAÑANA QUE SE PLANTEA CONFORMAR LA PLACA EN CONCRETO.

EL CONTRATISTA CONTINUA CON LA DESINSTALACION DE CIELO RASO, DESMONTE DE ARMARIOS, DEMOLICION DE PISOS EN EL EDIFICIO CASA BLANCA

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 25 JUNIO 2026 JUEVES	HORAS DE LLUVIA: NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES		

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	2	X		Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	1	X		Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10	PLUMA	1	X		Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	9							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD C	CONFORMIDAD NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFORMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO C	SEGUIMIENTO NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY SE CONFORMA LA SEGUNDA MITAD DE LA PLACA ENTRE PISO DEL EJE 1-3 AL EJE 6-K. EN CONCRETO 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO.

LA PLACA SE CONFORMA DE ESPESOR TOTAL 10CM, EN LA CONFORMACION DE DICHA PLACA SE UTILIZA 2 MEZCLADORAS CONCRETO Y UNA PLUMA PARA IZAR EL CONCRETO AL 2DO PISO

POR LA CANTIDAD DE PERSONAL NECESARIO, SE SUSPENDE POR EL DIA DE HOY LAS DEMOLICIONES EN LA EDIFICACION EXISTENTE.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN-META"	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 26 JUNIO 2026 VIERNES	HORAS DE LLUVIA: NUBLADO

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA	0							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
DEMOLICION PISOS.	M3	EDIFICIO EXISTENTE		

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO X	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación Si se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA

SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?	SI		NO	

OBSERVACIONES:

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY NO SE HIZO A CABO ACTIVIDAD DE OBRA POSTERIOR A MEDIO DIA

EN LA MAÑANA SE NOTIFICO ENCONTRADO DE PLACA DE (CONTRAPISO) ENTRESUPISO.

SE CONTINUO CON DEMOLICION DE PISOS Y DESMONTE DE CIELO RAZO EN EL EDIFICIO EXISTENTE.

SE SOLICITO POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL LA SUSPENCION DE LABORES, TEMPORALMENTE HASTA EL DIA 29 JUNIO POR REALIZACION DEL 37° FESTIVAL DE LA COCHAMA, POR HUSO SIGNIFICATIVO DE PERSONAL DENTRO DE LA INSTITUCION QUE AFECTARIA LABORES Y SITUACION DE SEGURIDAD.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 27 JUNIO 2026 SABADO	HORAS DE LLUVIA: lluvia escasas 2

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantas	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY NO SE LABORO, POR SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL DE OBM POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL HASTA EL DIA 30 DE JUNIO REINICIO DE LABORES.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 28 JUNIO 2026 DOMING.	HORAS DE LLUVIA: LLUVIAS AUSENTES 4.
PLAZO ACTUAL: 8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS:	DIAS PENDIENTES:

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA	0							

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO			
		C	NC	FECHA	
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO	
OBSERVACIONES:					

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme

NC: No Conforme

JENNIFER B

JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
RESIDENTE DE OBRA

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY NO SE HIZO A CABO LABORES DE OBRA POR SOLICITUD DE SUSPENSION PROVICIONAL REALIZADA POR LA POLICIA NACIONAL DANDO INICIO EL DIA 30 DE JUNIO

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			Puerto Gaitán
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES
FECHA: 29 JUNIO 2026 LUNES	HORAS DE LLUVIA: 6. LLUVIAS TODO EL DIA

PLAZO ACTUAL	8 meses	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	0			Cascos		
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	0			Gafas		
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas		
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes		
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas		
AYUDANTE	10					Alcohol		
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:	

C: Conforme	JENNIFER B	
NC: No Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL DIA DE HOY NO SE LABORO, POR SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL DE OBRA, REALIZADA POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL, PARA DAR REINICIO HASTA EL DIA 30 JUNIO 2026.

ALCALDÍA DE PUERTO GAITÁN, META

FORMATO LIBRO DE BITÁCORA

Infraestructura

Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025

Puerto Gaitán

SUPERVISIÓN DIARIA DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1701 DE 2025	CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO	OBJETO: "CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
RESIDENTE: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	RESIDENTE: JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES

FECHA:	30 JUNIO 2026 MARTES	HORAS DE LLUVIA:	4. LLUVIAS FUERTE

PLAZO ACTUAL	8 MESES	DIAS TRANSCURRIDOS		DIAS PENDIENTES	

PERSONAL	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL		
				Operación	Mantenimiento	Elemento	SI	NO
DIRECTOR OBRA	1	RETROEXCAVADORA	8			Cascos	X	
RESIDENTE	2	COMPACTADOR TIPO RANA	8			Gafas	X	
MAESTRO	1	MEZCLADORA DE CONCRETO	0			Tapabocas	X	
OFICIAL	2	VIBRADOR DE CONCRETO	0			Guantes	X	
OPERARIO	0	VOLQUETA	0			Botas	X	
AYUDANTE	10					Alcohol	X	
TOPOGRAFO	0							
INSPECTOR SISO	1							
CELADOR	0							
AGREGAR PERSONAL PRESENTE EN LA PROPUESTA								

DESCRIPCION GENERAL DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE SE SUPERVISARON

ACTIVIDAD REALIZADA	UNIDAD	LOCALIZACIÓN	CONFORMIDAD	
			C	NC
ACERO REFUERZO FY 4.200	KG	EDIFICIO ALOJAMIENTO NUEVO NIVEL 02	X	

LAS ACTIVIDADES CORRESPONDEN AL CRONOGRAMA	SI X	NO	LOS SUMINISTROS SE HAN REALIZADO DE ACUERDO AL CRONOGRAMA	SI X	NO
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LOS MATERIALES CUMPLE CON LOS REQUISISTOS DE CALIDAD	SI X	NO	SE SOLICITARON ENSAYOS	SI	NO X
OBSERVACIONES			OBSERVACIONES		
LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS	SI X	NO	SE PRESENTARON ACCIDENTES LABORALES	SI	NO X

Nota: Adjuntar los soporte de la investigación SI se presenta un accidente laboral, con el fin de evitar que se presente nuevamente.

REGISTRO DE NO CONFOMIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

NO CONFORMIDAD	TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD	SEGUIMIENTO		
		C	NC	FECHA
SI SE HAN PRESENTADO INCONFORMIDADES, ESTAS HAN SIDO SUBSANADAS?		SI		NO
OBSERVACIONES:				

ESQUEMA DE OBRA

OBSERVACIONES:

C: Conforme	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES RESIDENTE DE OBRA	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NC: No Conforme		

NOTA: La presente bitacora debe venir impresa a doble cara

	FORMATO LIBRO DE BITÁCORA			
	Infraestructura			
	Codigo:INF-FR-12	Version:04	Vigencia: 10-01-2025	

EL CONTRATISTA REANUDA ACTIVIDADES EL DIA DE HOY POSTERIOR A LA SOLICITUD DE SUSPENSION TEMPORAL REALIZADA POR LA POLICIA NACIONAL DEBIDO AL 37° FESTIVAL DE LA COCHUANA. EN PTO GAITAN.

SE INICIA EL ARMADO, FIGURADO DE ACERO DE REFUERZO PARA COLUMNAS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO NUEVO DE ALOJAMIENTO. LA CONFORMACION DE REFUERZO SE REALIZA CONFORME A LO DISPUESTO EN PLANOS ESTRUCTURALES Y APROBADO POR INTERVENTORIA.

DE IGUA MANERA SE CONTINUA EN EL EDIFICIO EXISTENTE LA DEMOLICION DE PISOS, DESMONTE DE SANITARIOS Y DESMONTE DE CIELO RASO.

ANEXO 3.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-22, 10:22:00 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1082984046

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 14/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN		
Documento	NI902011453	**Dirección**	CL 2 #27 - 116
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal	GARCIA FONSECA INGRID MARYORY	**Identificación**	CC 1121837768
Total Afiliados	21	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																					Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	ICE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006946002	YESID GALINDO GAITAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ [illegible]	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1101450750	DAVID VERBEL SOLIS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121852433	JENNIFER ANDREA BECERRA MORALES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 3.658.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.658.750	$ 142.400	6,960	$ 3.658.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.658.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121863524	JENNY PAOLA FERIA TRIANA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121867537	YONLI YULIETH LOZANO GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1121884993	MAYRA ALEJANDRA CARDENAS LESMES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1124829136	EDGAR RICARDO AMAYA BARRERA	01	00																	0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 350.181	$ 56.100	(EPS1C6) EPS QUAOSALUD	$ 350.181	$ [illegible]	6,960	$ 350.181	$ 24.400	(CCF34) COFREM	$ 350.181	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.700
CC 1124992565	JUAN RAMON GALINDO NARIÑO	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS1C5) EPS MALLAMAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1125004759	RUBEN DARIO GALINDO MARIÑO	01	00	x																0	6	6	6	6	(230301) PORVENIR	$ 350.181	$ 56.100	(EPS1C5) EPS MALLAMAS	$ 350.181	$ [illegible]	6,960	$ 350.181	$ 24.400	(CCF34) COFREM	$ 350.181	$ 14.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.700
CC 1125549456	JUAN MARTIN BOLIVAR GAITAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 1193092733	BRAYAN STEVEN RIVERA MARTINEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 17310424	GONZALO BECERRA MEJIA	01	03																	0	0	30	30	30	(NIN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.100
CC 17340851	MARTIN CAMILO GUTIERREZ VEGA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 74857071	DAGOBERTO CORTES	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPSC34) RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 80166359	MARCOS DIDIER DELGADILLO DELGADILLO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 8192573	VICENTE GAITAN GAITAN	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS1C5) EPS MALLAMAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86068125	AGUSTIN AGUILAR GONZALEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86055645	OSCAR ALEXANDER PATIÑO PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS017) FAMISANAR EPS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 93372770	SEGUNDO [illegible] DA CRUZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ [illegible]	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Pagado: 14/07/2026 | Empresa NI902011453 UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN | Planilla Nro: 1082984046 | Periodo Cotización: junio de 2026 | Periodo Servicio: julio de 2026

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	
PT 1755999	ALVARO LUIS MARTINEZ GIL	01	00	X																	0	0	2	2	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 116.727	$ 4.700	0,960	$ 116.727	$ 8.200	(CCF34) COFREM	$ 116.727	$ 4.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.600
PT 1824421	ROBINSO... GREGORIO MARTINEZ GIL	01	00																		0	0	30	30	(NN-AF) NINGUNA AFP	$ 0	$ 0	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	$ 1.750.905	$ 70.100	0,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.100

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sana	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 30.522.687	$ 34.141.224	$ 34.141.224	$ 34.141.224	$ 4.884.600	$ 1.367.000	$ 2.377.000	$ 1.367.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.995.600	$ 0	$ 9.995.600

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 4.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE OBRA

UNIÓN TEMPORAL
INGE
POLICIA
GAITÁN

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

PERSONA JURIDICA

Los suscritos **INGRID MARYORY GARCIA FONSECA** identificado con la cedula de ciudadanía **1.121.837.768** de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal de la **UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN** identificada con **Nit. 902.011.453-2**, y **CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. 86.071.198 y Tarjeta profesional 187.220-T en mi condición de **CONTADOR PUBLICO**, certificamos que se han realizado los pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo comprendido del 01/06/2026 al 30/06/2026 en concordancia a la fecha de la firma de este certificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio, a los catorce (14) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

R.L. INGRID MARYORY GARCIA FONSECA
UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITAN

CESAR OSWALDO SOTO H.
CONTADOR PUBLICO
T.P 187.220-T.


Puerto Gaitán, Meta



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 86.071.198
SOTO HERNANDEZ
APELLIDOS
CESAR OSWALDO
NOMBRES

FIRMA

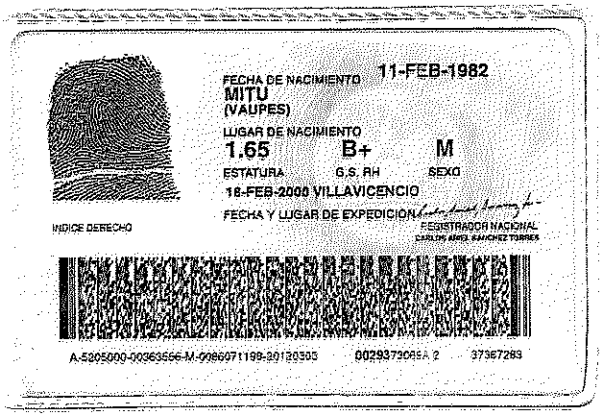

FECHA DE NACIMIENTO 11-FEB-1982
MITU
(VAUPES)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 B+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
16-FEB-2000 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-5205000-00363566-M-0086071198-20120303 0029373065A 2 37367283

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

187220-T



CESAR OSWALDO
SOTO HERNANDEZ
C.C. 86071198
RESOLUCION INSCRIPCION 110 FECHA 26/02/2014
UNIVERSIDAD FCMD. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 199044

187784

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 95 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7 D 0 9 D 2 3 4 E 5 B C A 2 8 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR OSWALDO SOTO HERNANDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 86071198 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 187220-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ANEXO 5.

NOMINA DE PERSONAL DE INTERVENTORIA

NOMINA DE EMPLEADOS - UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

NIT 902.014.419-5

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01-06-2026 AL 30-06-2026

DATOS DEL AFILIADO			NOVEDAD		DIAS TRABAJADOS	SALARIO BASICO	DEVENGADO			DESCUENTOS			TOTAL A PAGAR	FIRMAS
IDENTIFICACION		APELLIDOS Y NOMBRES	I	R			SALARIO	AUX. TRANS.	DEVENGADO	PENSION	SALUD	DEDUCIBLE		
1	CC 1121892054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS			30	3.500.000	3.500.000	-	3.500.000	140.000	140.000	280.000	3.220.000	
2	CC 1121966360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO		X	10	1.750.905	583.635	83.032	666.667	23.345	23.345	46.691	619.976	
3	CC 1121844182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES			30	3.558.750	3.558.750	-	3.558.750	142.350	142.350	284.700	3.274.050	
4	CC 80074961	ORTIZ FUENTES FERNANDO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
5	CC 86053753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
6	CC 1006874312	ACOSTA PEREZ GISELL JOHANNA			30	1.750.905	1.750.905	249.095	2.000.000	70.036	70.036	140.072	1.859.928	
							12.895.100	830.317	13.725.417	515.804	516.804	1.031.608	12.693.809	

PROYECTO:

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180143-T

ELABORO:

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR
T.P 180143-T

APROBO:

DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXO 6.
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORIA

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-07-23, 11:10:50 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1083150848

Periodo Cotización: junio de 2026 **Periodo Servicio:** julio de 2026

PAGADO 23/07/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025		
Documento	NI902014419	**Dirección**	CR 6 #17 - 49
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	3222671101
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	PUERTO GAITAN	**Departamento**	META
Representante Legal	CARDOSO GUERRERO DIEGO ARMANDO	**Identificación**	CC 86088145
Total Afiliados	6	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1006874312	GISSELL JOHANNA ACOSTA PEREZ	01	00																	0	30	30	30		(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429.600
CC 1121644182	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.558.750	$ 569.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 3.558.750	$ 142.400	6,960	$ 3.558.750	$ 247.700	(CCF34) COFREM	$ 3.558.750	$ 142.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.101.900
CC 1121692054	LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 3.500.000	$ 560.000	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 3.500.000	$ 140.000	6,960	$ 3.500.000	$ 243.600	(CCF34) COFREM	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.083.600
CC 1121986360	JUAN DIEGO GARCIA LOZANO	01	00	X																0	10	10	10	10	(230301) PORVENIR	$ 583.635	$ 93.400	(EPS005) EPS SANITAS	$ 583.635	$ 23.400	6,960	$ 583.635	$ 40.700	(CCF34) COFREM	$ 583.635	$ 23.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.900
CC 80074961	FERNANDO CORTEZ FUENTES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300
CC 86053763	ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.750.905	$ 70.100	6,960	$ 1.750.905	$ 121.900	(CCF34) COFREM	$ 1.750.905	$ 70.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 542.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 12.895.100	$ 12.895.100	$ 12.895.100	$ 12.895.100	$ 2.063.400	$ 516.100	$ 785.000	$ 515.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.880.600	$ 48.600	$ 3.929.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegor el medio ambiente está en nuestras manos.

ANEXO 7.
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DE INTERVENTORIA

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

CERTIFICADO DE PARAFISCALES

Los suscritos DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO identificado con la cedula de ciudadanía 86.088.145 de Villavicencio, en mi condición de Representante Legal del UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025 identificado con Nit. 902.014.419-5, y JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.848.323 y Tarjeta profesional 180143-T en mi condición de CONTADOR PUBLICO, certificamos que se han realizado los pagos de seguridad social y parafiscales correspondientes al periodo de junio comprendido del 01/06/2026 al 30/06/2026 en concordancia a la fecha de la firma de este certificado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Villavicencio, a los veintitrés (23) días del mes de julio de 2026.

Atentamente,

R/L DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO
86.088.145 DE VILLAVICENCIO
UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025
NIT: 902.014.419-5

JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS
CONTADOR PUBLICO
T.P 180143-T

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META

CEDULA DE CIUDADANIA

REPÚBLICA DE COLOMBIA

NUIP 1.121.848.323



Apellidos
CASTRO GALVIS

Nombres
JHON ALEXANDER

Nacionalidad: COL
Estatura: 1.70
Sexo: M
Fecha de nacimiento: 15 ENE 1988
G.S.: O+
Lugar de nacimiento
VILLAVICENCIO (META)

Fecha y lugar de expedición
18 ENE 2007, VILLAVICENCIO


Firma

Fecha de inscripción
08 SEPT 2032

,CO

0038845998

REGISTRADOR NACIONAL




ICCOL0038845998520O1<<<<<<<<<<<
8901158M3209088COL1121848323<1
CASTRO<GALVIS<<JHON<ALEXANDER<

UT INTERPOLICIA
2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

180143-T



JHON ALEXANDER
CASTRO CALVIS
C.C. 1121848323
RESOLUCION INSCRIPCION 299 FECHA 04/07/2013
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

PRESIDENTE
LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 101841

100738

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 06 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.jcc.gov.co

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B B C 0 5 C B F 2 0 2 C 0 0 7 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JHON ALEXANDER CASTRO GALVIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1121848323 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 180143-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

ANEXO 8.
RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO DE INTERVENTORIA

LABORATORIO
RAMCODES
INGENIERIA Y ENSAYOS

		I-CON-RAM-005
VERSIÓN	CÓDIGO	FECHA DE VIGENCIA
001	I-CON-001	01-01-17

Villavicencio, 11 de junio del 2026

Señores:
UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
Ciudad.

Ref. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.
Tema: Informe de resistencia a la compresión de concretos.

Cordial saludo,

Atendiendo su solicitud para la realización del ensayo de resistencia a la compresión simple a muestras cilíndricas de concreto elaboradas y transportadas por ustedes. Me permito informar que estas fueron probadas de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana NTC 673-10, con el fin determinar su resistencia a los siete, catorce y veintiocho días de curado.

En virtud de lo anterior entrego los resultados de nueve (09) muestras falladas.

El presente informe consta de dos (02) páginas y no debe reproducirse sin la aprobación por escrito del laboratorio, los resultados contenidos en él se relacionan únicamente con las muestras ensayadas.

Quedo en espera de cualquier inquietud.

Sin otro particular.

INGRID ARANGUREN BEJARANO
Especialista en diseño y construcción de Vías y aeropistas
Especialista en Patología de la Construcción
Especialista en Gerencia Estratégica
Gerente de RAMCODES Ingenieria y Ensayos

LABORATORIO RAMCODES INGENIERÍA Y ENSAYOS	LABORATORIO PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES,CONCRETOS Y PAVIMENTOS	VERSIÓN	001
		CODIGO	F-CON-001
	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	FECHA DE VIGENCIA	1/01/2017
		CON-RAMW-01	
	ESPECIFICACION/NORMA: INVE-410-13 Y NTC 673-10		

PROYECTO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META.				
DIRIGIDO A:	UNIÓN TEMPORAL INTERPOLICIA 2025	NIT:	902014419-5	FECHA DE ENTREGA:	jueves, 11 de junio de 2026
CONTACTO:	ING. MIGUEL CIPAGAUTA	CEL/ULAR:	3183308819	CORREO:	utinterpolicia2025@gmail.com
DESCRIPCION:	MUESTRAS ELABORADAS EN OBRA	MUNICIPIO:	PUERTO GAITÁN	DEPARTAMENTO:	META

No. MUESTRA	DESCRIPCION DE LA MUESTRA	RESISTENCIA DE DISEÑO (PSI)	RESISTENCIA DE DISEÑO (Mpa)	ASENTAMIENTO (cm)	FECHA DE TOMA	DIAS DE CURADO	FECHAS DE ROTURA	DIAMETRO (mm)	MASA (gr)	AREA (mm²)	DENSIDAD (gr/cm³)	CARGA AXIAL (KN)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (PSI)	RESISTENCIA OBTENIDA A LA FECHA (Mpa)	PORCENTAJE CON RESPECTO A f'c	TIPO DE FALLA
RDG-11	PLACA ENTREPISO	f'c 3000 PSI	21	--	4-may.-26	7	11-may-26	104	3839	8496	2260	108.8	1,866	13.1	62.2%	5
						14	18-may-26	105	3787	8659	2158	147.5	2,481	17.4	82.7%	6
						28	1-jun-26	104	3821	8495	2249	181.8	3,118	21.8	103.9%	5
RDG-12	VIGA CIMENTACIÓN	f'c 3000 PSI	21	--	9-may.-26	7	16-may-26	104	3725	8495	2193	110.2	1,890	13.2	63.0%	5
						14	23-may-26	103	3770	8332	2240	138.5	2,421	16.9	80.7%	4
						28	6-jun-26	105	3832	8659	2213	179.7	3,023	21.2	100.8%	4
RDG-13	VIGA AEREA	f'c 3000 PSI	21	--	14-may.-26	7	21-may-26	103	3723	8332	2234	106.0	1,863	13.0	61.8%	6
						14	28-may-26	103	3728	8332	2193	141.7	2,477	17.3	82.6%	5
						28	11-jun-26	105	3840	8659	2195	178.7	3,006	21.0	100.2%	4
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBSERVACIONES: _____


REVISO Y APROBO:

Ing. Ingrid Aranguren Bejarano

Gerente de RAMCODES Ingeniería y Ensayos

*Este informe no es válido, sin la firma y sello original

TIPO DE FALLA

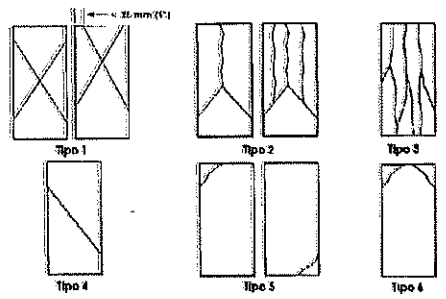

ANEXO 9.
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORIA

UT INTERPOLICIA 2025

INFORME MENSUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°7

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META".

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1701 DE 2025

INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

UT INTERPOLICIA 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION 3
2. OBJETIVOS 3
   2.1. OBJETIVO GENERAL 3
   2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3
3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 4
   3.1. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA 5
4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 7
5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE INTERVENTORIA 8
6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN HSEQ 9
7. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 10
8. CONDICIONES CLIMÁTICAS 10
9. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 10
10. SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 11
11. REGISTRO FOTOGRAFICO 13
CHARLAS E INDUCCIONES 13
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 13
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 14
12. CONCLUSIONES 15

1. INTRODUCCION

El presente informe HSEQ corresponde al periodo comprendido entre el 01 de junio al 30 de junio 2026 y tiene como objetivo presentar el estado de las actividades relacionadas con Seguridad y Salud en el Trabajo, Medio Ambiente y Calidad del proyecto.

Durante este periodo, el proyecto se desarrolló en fase de alistamiento administrativo y técnico, con ejecución de actividades preliminares en campo, tales como el recorrido técnico de inspección de terreno, la localización y replanteo de alojamientos nuevos y el descapote manual en la zona de intervención. Estas labores permitieron avanzar en la verificación de las condiciones iniciales del sitio y en la preparación del área para el inicio de las actividades constructivas.

La Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como propósito fundamental la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de sus actividades laborales, promoviendo entornos de trabajo seguros y saludables. En la actualidad, este enfoque se extiende a todas las profesiones y oficios, buscando que el trabajo se adapte a las capacidades del trabajador y no que el trabajador se exponga a condiciones que afecten su integridad física o mental.

El presente informe se fundamenta en las actividades desarrolladas durante el periodo evaluado, orientadas a la planeación, organización y estructuración del sistema HSEQ, así como a la identificación preliminar de las condiciones de riesgo que podrían presentarse durante la ejecución del proyecto. Lo anterior permite establecer las medidas preventivas necesarias, aplicar buenas prácticas y garantizar condiciones seguras para el personal que será vinculado en las etapas posteriores de la obra.

El principal objetivo del sistema HSEQ es la identificación y control de peligros que puedan afectar tanto a los trabajadores como a personal ajeno a la obra, fortaleciendo el compromiso con la seguridad, la salud y el cumplimiento normativo, y asegurando la correcta implementación del sistema de gestión durante el desarrollo del proyecto.

La Unión Temporal Inge Policía Gaitán mantiene un firme compromiso con la protección de la salud y la seguridad de su población trabajadora, mediante la evaluación continua y la mitigación de los riesgos presentes en las áreas de trabajo, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, reconoce que la participación y el compromiso de los trabajadores son fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Unión Temporal responsable del proyecto, alineado con los requisitos HSEQ establecidos por la interventoría y la normativa vigente, garantizando condiciones seguras y controladas para el personal que será vinculado durante la ejecución del contrato.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
- Promover condiciones de trabajo que favorezcan el bienestar físico y mental de los trabajadores.

- Fomentar la concientización sobre la mitigación de impactos ambientales asociados a las actividades del proyecto.

- Garantizar el control de los impactos ambientales que puedan generarse durante la ejecución de la obra, conforme a los lineamientos del plan ambiental aplicable.

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Municipio ubicado en la región del río Manacacias, es el Cuarto municipio con extensión territorial en Colombia y primero en el departamento del Meta con 17.499 km². Está a 212 kilómetros al oriente de Villavicencio, Se encuentra en el extremo nororiente del departamento.

Topográficamente hace parte de una extensa zona de estructura plana conocida como la Altillanura, cuyo eje articulador principal es el río Meta, en la cuenca del Orinoco.

Entre las principales actividades económicas del Municipio se pueden encontrar: la Ganadería, Pesca, Explotación de hidrocarburos, Agricultura, Turismo y recreación.

Límites del municipio:

Puerto Gaitán es el cuarto Municipio más grande de Colombia y segundo del Meta se encuentra ubicado de las siguientes coordenadas: 3° - 05 y 4° 08' Latitud Norte y 71°- 05 y 72° -30' Latitud Oeste. Tiene una superficie de 17.499 Kilómetros cuadrados y limita por el norte con el Departamento del Casanare; por el sur con los Municipios de Mapiripan y San Martín; por el oriente con el Departamento del Vichada y por el occidente con los Municipios de Puerto López y San Martín.

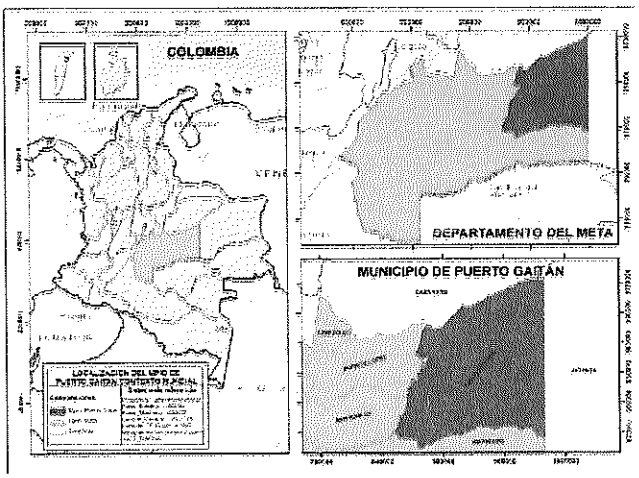


Ilustración 1. Localización Geográfica Municipio de Puerto Gaitan, Dpto. Meta

FUENTE: https://www.researchgate.net/publication/325613809

3.1. LOCALIZACIÓN ESPECIFICA

El proyecto se desarrolla en la zona urbana del municipio de Puerto Gaitán, específicamente en la carrera 10 No 16-15ª.

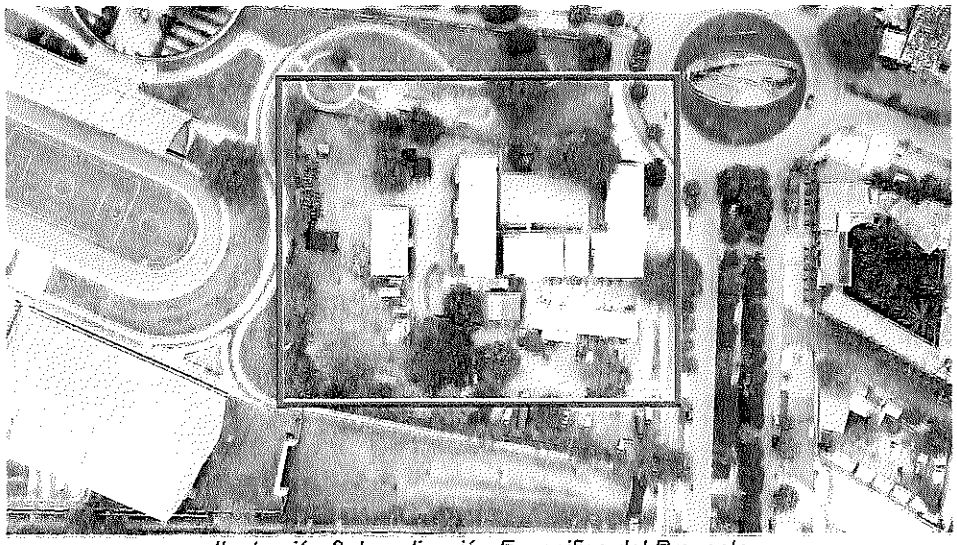


Ilustración 2. Localización Especifica del Proyecto

FUENTE: Elaboración Propia

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto objeto de seguimiento por parte de la interventoría corresponde a la construcción, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de la Estación de Policía del municipio de Puerto Gaitán – Meta, orientado a fortalecer las condiciones físicas, funcionales y operativas de la infraestructura existente, en atención a las necesidades identificadas mediante los diagnósticos técnicos realizados por la entidad.

De acuerdo con la información técnica revisada, la intervención surge como respuesta a las deficiencias evidenciadas en la infraestructura actual, relacionadas con el deterioro de elementos constructivos, insuficiencia de espacios para el funcionamiento institucional, limitaciones en los sistemas de instalaciones técnicas y condiciones inadecuadas para el alojamiento y operación del personal adscrito a la Estación de Policía.

La interventoría deja constancia de que el municipio de Puerto Gaitán presenta una dinámica de crecimiento urbano, poblacional y productivo que incrementa las necesidades institucionales en materia de seguridad, control territorial y capacidad operativa, razón por la cual el proyecto busca consolidar una infraestructura acorde con los requerimientos funcionales y operativos de la Policía Nacional.

En este sentido, el alcance del proyecto contempla una intervención integral que incluye la construcción de nuevos alojamientos para el personal policial, la adecuación y rehabilitación de la edificación denominada "Casa Blanca" para uso de vivienda familiar, la implementación de un sistema elevado de almacenamiento de agua potable y la construcción de un nuevo cerramiento perimetral de seguridad, actividades orientadas a mejorar las condiciones

de habitabilidad, garantizar la continuidad de los servicios básicos y fortalecer las condiciones de seguridad física de la infraestructura institucional.

Así mismo, la interventoría verifica que el desarrollo del proyecto se encuentra orientado bajo criterios de funcionalidad, sostenibilidad, eficiencia operativa y cumplimiento de los lineamientos técnicos y normativos aplicables, contribuyendo al fortalecimiento de la capacidad institucional y al mejoramiento de las condiciones de seguridad y convivencia ciudadana en el municipio de Puerto Gaitán – Meta.

3.3. ALCANCE DEL CONTRATO

El interventor debe ejecutar el contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación No. CM-SI-010-2025 los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El contrato de interventoría tiene como alcance realizar el seguimiento integral al Contrato de Obra No. 1683 de 2025, ejerciendo funciones de control técnico, administrativo, financiero, contable, jurídico, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, verificando que la ejecución del proyecto se desarrolle conforme a los estudios y diseños aprobados, especificaciones técnicas, cronograma, presupuesto oficial y normatividad vigente aplicable.

En desarrollo de sus funciones, la interventoría debe garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual mediante actividades permanentes de inspección, revisión, evaluación y control sobre los procesos constructivos, recursos empleados y obligaciones contractuales del contratista de obra.

3.4. POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto favorece de forma directa al personal de la Policía Nacional que desempeña funciones en el municipio de Puerto Gaitán, al brindar una infraestructura moderna, funcional y segura que optimiza las condiciones de hospedaje, operación y bienestar laboral. De forma indirecta, la iniciativa repercute favorablemente en la comunidad del municipio, al robustecer la capacidad institucional, la presencia policial y la atención oportuna a las necesidades de seguridad ciudadana, aportando al orden público y al desarrollo social del territorio.

UT INTERPOLICIA 2025

4. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

NÚMERO DEL PROCESO	CONCURSO DE MERITOS CM-SI-010-2025
NÚMERO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTEVENTORIA No. 1701 - 2025
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA:	NIT. 902.014.419-5
NOMBRE DEL CONTRATISTA Y REPRESENTANTE LEGAL	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025 DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO C. C No. 86.088.145 de Villavicencio
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA	UTINTERPOLICIA2025@GMAIL.COM
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO:	CHRISTIAN JULIAN FERNANDEZ REYES SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
ACTA DE INICIO Y FECHA:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL PREVISTA:	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026
MODIFICATORIA N.°1:	DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE 2025 Modificación a la cláusula decima octava del contrato de interventoría.

Tabla 1. Información del contrato de interventoría

5. INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA DE INTERVENTORIA

La interventoría cuenta con el personal profesional estipulado y ofertado, los cuales han realizado las actividades correspondientes del periodo en mención. A la fecha el personal vinculado ofertado para el presente periodo según el presupuesto vigente de la interventoría es el siguiente:

ID	NOMBRE COMPLETO	PENSIONES	SALUD	ARL	NO. PLANILLLA
80.074.961	ORTIZ FUENTES FERNANDO	COLPENSIONES	EPS SANITAS	SURA	1083150848
86.053.753	MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO	PROTECCIÓN	EPS SANITAS	SURA	1083150848
1.121.844.182	GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1083150848
1.121.892.054	LAZO SANCHEZ LUIS CARLOS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	SURA	1083150848
1.121.966.360	GARCIA LOZANO JUAN DIEGO	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1083150848
1.006.874.312	GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ	PORVENIR	EPS SANITAS	SURA	1083150848

Tabla 2. Información administrativa de interventoría

6. DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN HSEQ

La Interventoría realizó el seguimiento técnico continuo, la inspección en campo y la revisión documental de las condiciones bajo las cuales se ejecutaron las actividades operativas del período, correspondientes a la ejecución de placa de contrapiso en concreto impermeabilizado, el armado de acero de refuerzo para vigas aéreas y la instalación de redes hidráulicas.

Durante las visitas de verificación realizadas, se constató que la totalidad de las actividades fueron desarrolladas bajo los lineamientos del Sistema de Gestión HSEQ implementado por el contratista, verificando el establecimiento y mantenimiento de condiciones seguras de trabajo en los frentes de obra activos, el control efectivo de los aspectos e impactos ambientales asociados a cada actividad constructiva y el cumplimiento de los criterios de calidad definidos en las especificaciones técnicas del proyecto.

Por otro lado, se realizó la verificación en campo y la revisión documental de cada una de las actividades del Sistema de Gestión HSEQ implementadas por el contratista durante el período de reporte, certificando lo siguiente:

Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos: La Interventoría verificó que la identificación sistemática de los peligros asociados a las actividades ejecutadas en campo, aplicando la metodología de evaluación de riesgos establecida en su Sistema de Gestión HSEQ. Se constató la actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos conforme a las actividades del período, así como la implementación efectiva de los controles operativos definidos para la mitigación de los riesgos identificados, en cumplimiento de la jerarquía de controles establecida por la normativa vigente.

Socialización de Procedimientos Seguros de Trabajo: La Interventoría verificó la realización de las jornadas de socialización de procedimientos seguros de trabajo y medidas preventivas con el personal vinculado a la obra, constatando la existencia de los registros de asistencia y soportes documentales correspondientes.

Verificación del Uso de Elementos de Protección Personal (EPP): La Interventoría realizó inspecciones técnicas en campo orientadas a verificar el suministro, disponibilidad y uso adecuado de los elementos de protección personal por parte de la totalidad del personal en obra, constatando que los EPP utilizados corresponden a los requeridos para cada actividad según la matriz de riesgos vigente, que se encuentran en buen estado de conservación y que su uso es consistente con los procedimientos de seguridad establecidos.

Control y Seguimiento a las Condiciones de Seguridad en Campo: La Interventoría realizó recorridos periódicos de inspección técnica a los frentes de obra activos con el propósito de verificar el mantenimiento de las condiciones de seguridad durante la ejecución de las labores constructivas. Durante dichos recorridos se verificó el estado de las señalizaciones y demarcaciones de las zonas de trabajo, la adecuada instalación de las medidas de protección colectiva requeridas, el orden y aseo de los frentes de trabajo y el cumplimiento de los procedimientos operativos seguros definidos para cada actividad. Las observaciones y hallazgos identificados durante las inspecciones fueron comunicados oportunamente al contratista para su atención y cierre en los términos establecidos.

7. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

Durante el periodo objeto del presente informe, la interventoría realizó el seguimiento, revisión y verificación al control operacional de la maquinaria, equipos y herramientas empleadas en la ejecución de las actividades de localización y replanteo, excavación, relleno y compactación manual, así como en las labores correspondientes a la estructura de concreto y acero de refuerzo, evidenciando el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión HSEQ y la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Como parte de las actividades de supervisión técnica, la interventoría verificó que la maquinaria y equipos movilizados en obra fueron sometidos a las respectivas inspecciones preoperacionales antes de su puesta en funcionamiento, constatando su adecuado estado mecánico y operativo, la funcionalidad de los dispositivos y sistemas de seguridad, así como el cumplimiento de las recomendaciones técnicas y procedimientos establecidos para su utilización segura en las diferentes actividades constructivas.

Asimismo, se realizó seguimiento a la competencia y autorización del personal encargado de la operación de los equipos, verificando que los operadores contaran con las capacitaciones, certificaciones y autorizaciones requeridas para el desarrollo de sus funciones, en concordancia con los procedimientos internos del componente HSEQ y las exigencias contractuales aplicables al proyecto.

La interventoría evidenció la utilización de los equipos y herramientas movilizados durante el periodo, correspondientes a pulidoras de 7 ½" y 4 ½", vibro concreto, mezcladora, planta eléctrica, volqueta sencilla, canguro (compactador tipo martillo) y taladros, verificando que su uso fue acorde con las actividades ejecutadas y que su operación se desarrolló bajo condiciones controladas de seguridad y eficiencia operativa.

De igual manera, se verificó el adecuado control sobre las herramientas menores empleadas en obra, constatando que estas se encontraban en condiciones óptimas de funcionamiento y que su manipulación se realizó bajo prácticas seguras de trabajo, orientadas a la prevención de riesgos mecánicos y a la protección de la integridad física del personal.

8. CONDICIONES CLIMÁTICAS

Durante el periodo objeto de seguimiento, la interventoría realizó actividades de verificación y control sobre las condiciones climáticas y su posible incidencia en la ejecución de las actividades constructivas, en el marco del componente HSEQ del proyecto. Como resultado del seguimiento efectuado, se constató que se presentaron eventos climáticos adversos que generaran afectación, suspensión o disminución en el rendimiento de las actividades programadas en obra.

9. GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la ejecución del contrato 1701 que tiene como objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META", por parte de contratista de obra se realizó la implementación de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), con verificación de interventoría, el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes y de las obligaciones contractuales en esta materia.

En el marco de la gestión realizada, se verificó y avaló la práctica de los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, los cuales fueron ejecutados conforme a la normatividad vigente. Se constató que dichos procedimientos

se ofrecieron como opción voluntaria al trabajador, garantizando el derecho a decidir sobre la valoración médica laboral, sin perjuicio de la obligación contractual del contratista de disponer y ofrecer tales exámenes.

De igual manera, se corroboró la entrega oportuna y adecuada de los Elementos de Protección Personal (EPP), verificando que estos correspondieran a los riesgos identificados en las actividades de obra, cumplieran con las especificaciones técnicas exigidas y fueran suministrados mediante actas de recibido debidamente firmadas por los trabajadores, lo cual asegura trazabilidad documental y cumplimiento normativo.

Se ejerció control sobre la ejecución de charlas de inducción y capacitaciones en salud y seguridad en el trabajo, enfocadas en la prevención de riesgos asociados a labores de mantenimiento vial, manipulación de herramientas, trabajo en campo y prácticas de autocuidado. Dichas actividades fueron soportadas mediante listas de asistencia y registros documentales, los cuales fueron revisados y validados por la interventoría para garantizar su pertinencia y efectividad.

El acompañamiento incluyó la verificación de la implementación de campañas de promoción de la salud y prevención de accidentes, la ejecución de pausas activas y la difusión de protocolos de actuación en caso de emergencias, asegurando la cobertura integral de las obligaciones en materia de SST.

10. SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

Esta Interventoría verificó que el Plan de Manejo de Tránsito implementado por el contratista durante el período de reporte mantiene coherencia con su objetivo técnico fundamental, orientado a la identificación, prevención y mitigación de los impactos generados sobre la movilidad y la seguridad vial como consecuencia de la ejecución de las actividades constructivas, garantizando condiciones adecuadas de seguridad para la totalidad de los usuarios del área de influencia del proyecto. Durante las visitas de inspección realizadas en campo, esta Interventoría constató la continuidad en la implementación efectiva de las medidas contempladas en el plan aprobado, evidenciando un avance progresivo y satisfactorio en el nivel de cumplimiento de las disposiciones establecidas.

- VERIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE TRÁNSITO IMPLEMENTADAS

Señalización Informativa en Vías con Obras (SIO)

La Interventoría realizó la inspección técnica y verificación en campo de la instalación de la señalización informativa en vías con obras (SIO), constatando que los dispositivos instalados cumplen con las especificaciones técnicas de tamaño, color, reflectividad y ubicación establecidas en el Manual de Señalización Vial vigente. Se verificó que la señalización dispuesta provee información oportuna y suficiente a los usuarios viales sobre la presencia de actividades constructivas en el área de influencia del proyecto, contribuyendo efectivamente a la prevención de incidentes de tránsito en el sector intervenido.

Dispositivos de Canalización y Delimitación del Área de Intervención

Esta Interventoría verificó la implementación y el estado de los dispositivos de canalización dispuestos para la delimitación del área de intervención y el control del tránsito interno, incluyendo conos de señalización, cinta de demarcación y demás elementos de control vial. Durante las inspecciones técnicas realizadas, se constató que los dispositivos se encuentran correctamente ubicados conforme al esquema de señalización del PMT aprobado, en

buen estado de conservación y visibilidad, y que su disposición garantiza la separación efectiva entre las zonas de trabajo activo y las áreas de circulación de usuarios, en cumplimiento de los criterios de seguridad vial establecidos.

Control de Ingreso y Salida de Vehículos de Obra

La Interventoría verificó la implementación de los elementos y procedimientos para el control operativo del ingreso y salida de vehículos asociados a la obra, constatando la disponibilidad y uso efectivo de paletas PARE/SIGA por parte del personal operativo y la operación de los equipos de comunicación requeridos para la coordinación del tránsito vehicular en el área de influencia. Se verificó que estos dispositivos y procedimientos fortalecen el control operativo en los puntos críticos de acceso a la obra, reduciendo el riesgo de conflictos entre el tránsito vehicular externo y las maniobras de los vehículos de construcción.

- **VERIFICACIÓN DE LA PRESENCIA Y DESEMPEÑO DEL PERSONAL OPERATIVO VIAL**


Esta Interventoría verificó durante las visitas de campo realizadas en el período de reporte la presencia continua del personal operativo de inspección vial asignado por el contratista para las labores de control, orientación y gestión del tránsito en el área de influencia del proyecto. Se constató que los inspectores viales desarrollaron sus funciones de manera permanente durante los horarios de ejecución de las actividades constructivas, ejerciendo el control direccional del flujo vehicular, orientando a los usuarios viales y garantizando condiciones adecuadas de seguridad en el sector, en cumplimiento de los roles y responsabilidades definidos en el PMT aprobado.

- **VERIFICACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA MOVILIDAD EXTERNA**


Con base en las visitas de inspección técnica realizadas en campo durante el período de reporte, esta Interventoría constató y certifica que la totalidad de las actividades constructivas ejecutadas se desarrollaron al interior del perímetro de las instalaciones de la Estación de Policía, condición que limitó de manera efectiva la generación de interferencias sobre la infraestructura vial externa y la movilidad vehicular del entorno urbano del proyecto. Esta Interventoría verificó que no se registraron afectaciones significativas a la movilidad vehicular externa durante el período evaluado, evidenciando que las medidas de manejo de tránsito implementadas resultaron proporcionales y adecuadas a las condiciones reales de la obra en el período de reporte.

11. REGISTRO FOTOGRAFICO


CHARLAS E INDUCCIONES

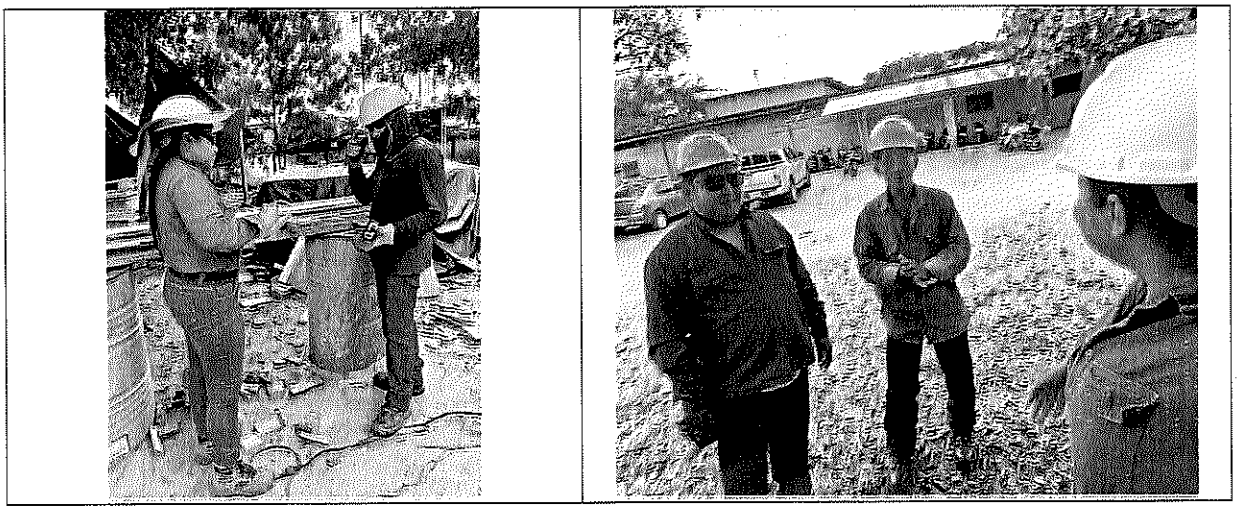


PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

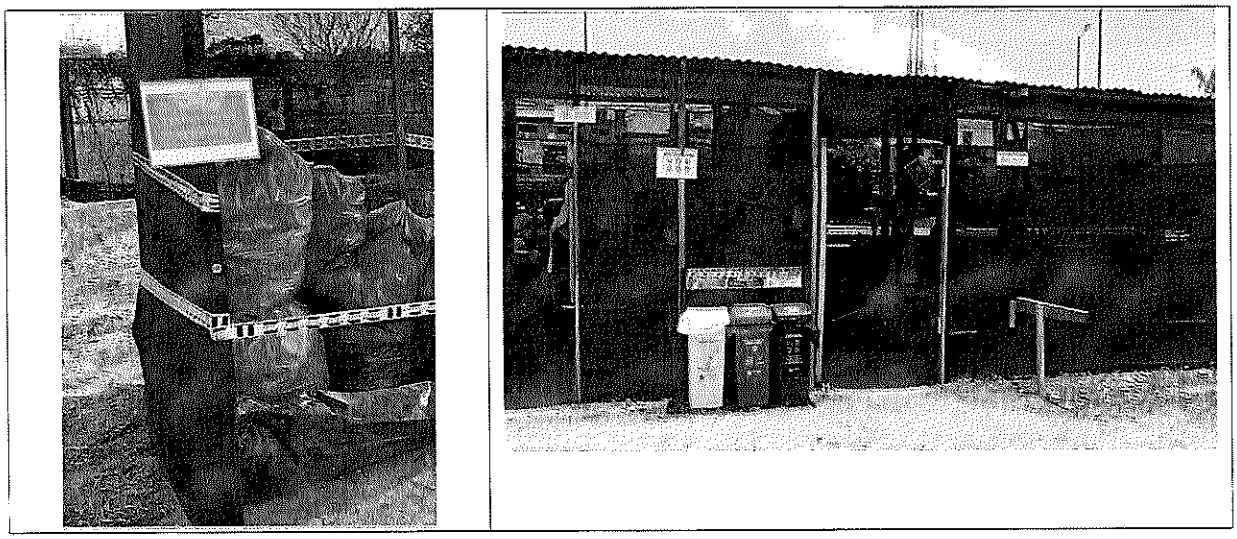

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

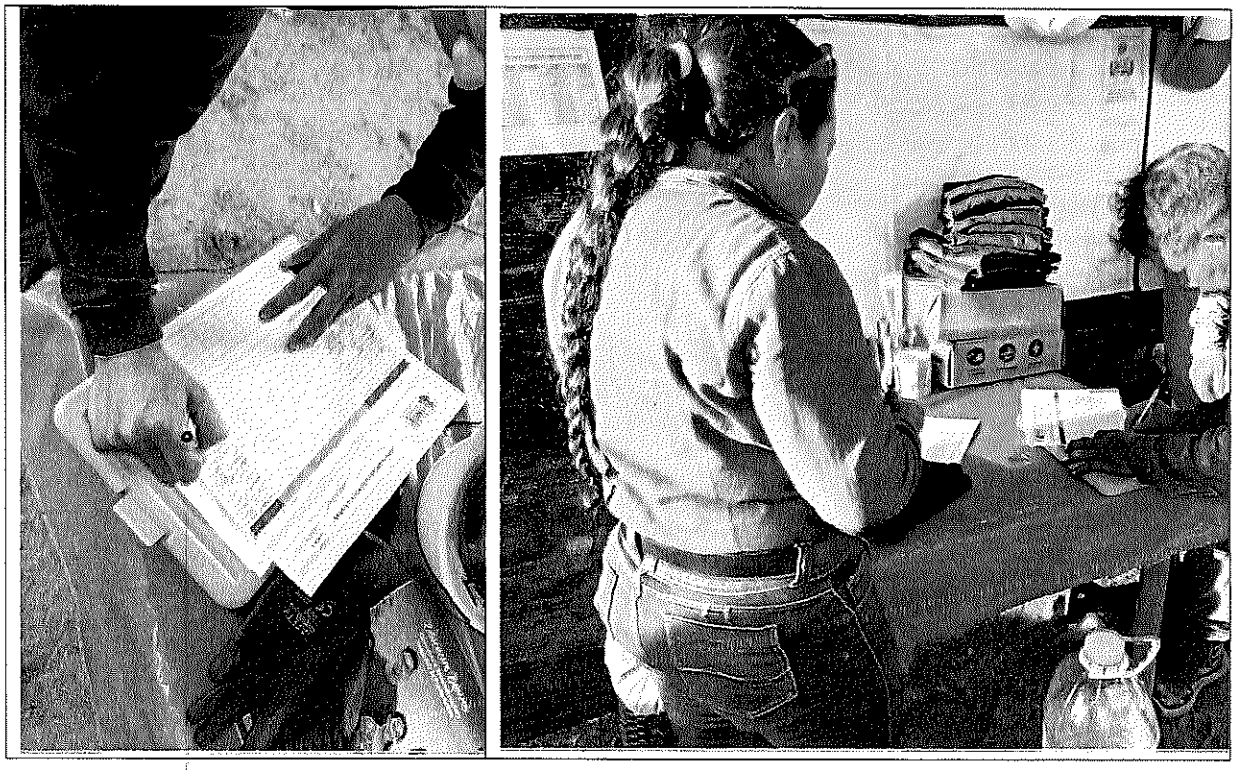

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO

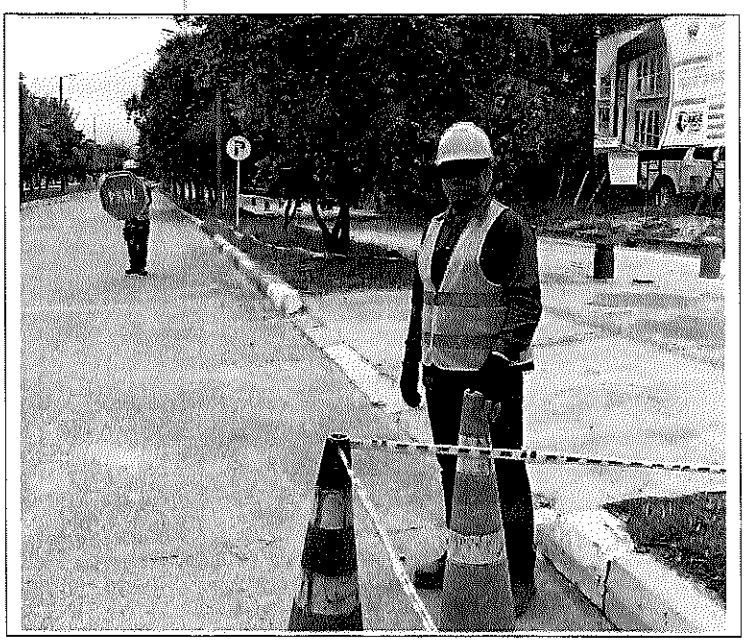

12. CONCLUSIONES

Como resultado de las actividades de seguimiento, revisión y verificación realizadas por la interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, se evidenció que el proyecto presentó avances en la ejecución de las actividades programadas, correspondientes a la demolición de elementos estructurales (columnas, vigas y placa de piso en concreto), rellenos con material mixto, instalación de redes sanitarias y eléctricas, fundida de placa de concreto e instalación de formaleta para vigas aéreas, las cuales fueron desarrolladas conforme a las condiciones técnicas, operativas y de seguridad definidas para la etapa constructiva del proyecto.

La interventoría verificó el adecuado cumplimiento de los lineamientos establecidos en el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), evidenciando la implementación de medidas orientadas a la identificación de peligros, evaluación y control de los riesgos asociados a las actividades ejecutadas, particularmente aquellos relacionados con trabajos de demolición, manipulación de materiales, operación de maquinaria y equipos, y ejecución de actividades estructurales. Asimismo, se constató la aplicación de controles operacionales y medidas preventivas que contribuyeron al desarrollo seguro de las labores y a la prevención de incidentes y accidentes laborales durante el periodo evaluado.

De igual manera, se realizó seguimiento al estado y condiciones de operación de la maquinaria, equipos y herramientas utilizadas en obra, verificando el cumplimiento de las inspecciones preoperacionales, la adecuada utilización de los elementos de protección personal (EPP) y la implementación de prácticas seguras de trabajo, en concordancia con los procedimientos establecidos dentro del Sistema de Gestión HSEQ del proyecto.

En el componente ambiental, la interventoría evidenció el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental implementadas por el contratista, particularmente en lo relacionado con la segregación en la fuente, almacenamiento temporal y disposición adecuada de los residuos sólidos generados durante la ejecución de las actividades constructivas, contribuyendo a la mitigación de los impactos ambientales derivados del proceso constructivo y al cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.

Finalmente, la interventoría concluye que la gestión HSEQ desarrollada durante el periodo evaluado presentó un cumplimiento satisfactorio de los requisitos contractuales, técnicos y normativos establecidos para el proyecto, permitiendo garantizar condiciones adecuadas de seguridad, orden y control operacional en los diferentes frentes de trabajo. En consecuencia, se avalan las acciones implementadas por el contratista en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo y gestión ambiental, las cuales constituyen un soporte fundamental para la continuidad y correcta ejecución de las siguientes fases constructivas, bajo criterios de seguridad, calidad y sostenibilidad ambiental.

Luis Carlos Lazo

LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ
Profesional SST
Union Temporal Interpolicia 2025
Nit. 902.014.419-5

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO :	ASIS-IP2025-02
VERSION:	01
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN:	10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	01/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO			
FECHA:	02/06/2026	HORA:	7:00 AM
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META			
DURACIÓN: 10 MINUTOS			
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP			

TIPO DE EVENTO			
REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
INDUCCIÓN		SIMULACRO	
CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
CUAL:			
FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÒDIGO : ASIS-IP2025-02 VERSION: 01 ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	03/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Carlos Lazo
3	ROBINSON MARROQUIN	86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

1320

UT INTERPOLICIA 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÒDIGO : ASIS-IP2025-02 VERSION: 01 ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	04/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JG
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	05/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Carlos Lazo
3	ROBINSON MARROQUIN	86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	06/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JG
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN META

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	09/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JG
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÒDIGO : ASIS-IP2025-02 VERSION: 01 ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	10/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JG
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Carlos Lazo
3	ROBINSON MARROQUIN	86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	~~RM~~
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	11/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	12/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	13/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO :	ASIS-IP2025-02
VERSION:	01
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN:	10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	16/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE:	Luis Carlos Lazo		

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Lazo
3	ROBINSON MARROQUIN	86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÒDIGO : ASIS-IP2025-02 VERSION: 01 ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	17/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JG
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

1330

UT INTERPOLICIA 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÒDIGO : ASIS-IP2025-02 VERSION: 01 ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	13/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	JG
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO :	ASIS-IP2025-02
VERSION:	01
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN:	10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	19/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02	
VERSION: 01	
ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025	

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	20/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÒDIGO : ASIS-IP2025-02 VERSION: 01 ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	22/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Lazo
3	ROBINSON MARROQUIN	86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025

REGISTRO DE ASISTENCIA

CÒDIGO : ASIS-IP2025-02

VERSION: 01

ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	23/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÒDIGO : ASIS-IP2025-02 VERSION: 01 ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	24/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÒDIGO : ASIS-IP2025-02 VERSION: 01 ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	25/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÒDIGO : ASIS-IP2025-02 VERSION: 01 ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	26/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Carlos Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

UT INTERPOLICIA 2025	REGISTRO DE ASISTENCIA	CÒDIGO : ASIS-IP2025-02 VERSION: 01 ULTIMA FECHA DE ACTUALIZACIÒN: 10/11/2025

ESPECIFICACIONES DEL EVENTO				TIPO DE EVENTO			
FECHA:	30/06/2026	HORA:	7:00 AM	REUNIÓN DE INICIO	X	REUNIÓN DE CIERRE	
				INDUCCIÓN		SIMULACRO	
UBICACIÓN: ESTACION DE POLICIA DE PUERTO GAITAN, META				CAPACITACIÓN		DIVULGACIÓN	
DURACIÓN: 10 MINUTOS				REUNIÓN OPERATIVA		OTROS	
FACILITADOR: LUIS CARLOS LAZO				CUAL:			
TEMA: REGISTRO DE ASISTENCIA, USO CORRECTO DE EPP				FIRMA DEL RESPONSABLE: Luis Carlos Lazo			

PARTICIPANTES

	NOMBRES Y APELLIDOS	C.C.	CARGO	FIRMA
1	JOHATHAN GAVIRIA	1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	
2	LUIS CARLOS LAZO	1.121.892.054	PROFESIONAL SST	Luis Lazo
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

RESUMEN:

ANEXO 10.
CERTIFICADOS DE CUMPLIMIENTO

UT INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

En cumplimiento de las funciones de vigilancia, seguimiento y control de la ejecución contractual asignadas a la interventoría, y en mi calidad de **INTERVENTOR DEL CONTRATO DE OBRA No. 1683 de 2025.**

CERTIFICO QUE:

La **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025**, en el marco de la ejecución del contrato cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio del 2026, fue objeto de seguimiento integral por parte de la Interventoría en los componentes técnico, administrativo, financiero, contable, ambiental y jurídico, respecto de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Con base en las verificaciones realizadas, se evidenció que el contratista ha venido ejecutando las actividades conforme a lo establecido en el contrato, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas, condiciones contractuales y lineamientos requeridos para la adecuada ejecución del proyecto, considerando su desarrollo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

De igual manera, se constató el avance de las actividades constructivas, el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la adecuada gestión en los diferentes componentes objeto de interventoría, necesarios para la correcta ejecución del contrato. En este sentido, la Interventoría continuará realizando el seguimiento integral, con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones pactadas hasta la finalización del proyecto.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de junio del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

UT INTERPOLICIA 2025
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META

CERTIFICACIÓN DE AVANCE DE OBRA

El suscrito, certifica el actual estado de la obra que a continuación se especifica:

CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025
OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN - META"
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN
INTERVENTORÍA: UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
FECHA DE CORTE: 30 DE JUNIO
PERIODO EVALUADO: Del 01 al 30 de junio del 2026

En cumplimiento de las funciones de seguimiento, control y vigilancia de la ejecución contractual, la interventoría certifica el avance financiero del contrato, con base en la programación aprobada y la inversión física ejecutada durante el periodo evaluado.

AVANCE CON RESPECTO A VALOR DEL CONTRATO	SEGUN PROGRAMACION	SEGUN AVANCE FISICO
INVERSION AL 30/06/2026	$822.518.250,00	$111.043.842,97
INVERSION ACUMULADA	$1.861.021.062,00	$680.192.297,05

Para la fecha de corte del presente informe, se evidencia un avance de obra física ejecutada por un valor $680.192.297,05, frente a un avance programado de $1.861.021.062,00. Este resultado refleja un adelanto financiero del 25,80%.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de junio del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERRANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

UT INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE INTERVENTORIA AVALANDO EQUIPOS Y MAQUINARIA PROPUESTOS EN EL CONTRATO DE OBRA

Durante el mes de junio de 2026, una vez analizada y verificada en campo la información y la documentación presentada por el contratista la UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN frente a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones y el anexo técnico del proceso de licitación pública No. LP-CI-010-2025, la UNION TEMPORAL INTER POLICIA 2025, identificado con NIT. 902.014.419-5 representado legalmente por DIEGO ARMANDO CARDOSO GUERRERO identificado con cedula de ciudadanía No. 86.088.145 de Villavicencio, certificamos que se CUMPLIO con los requisitos exigidos respecto a la maquinaria y equipos establecidos durante el mes de junio de 2026. Así las cosas, a continuación, enumeramos uno a uno la maquinaria y equipos colocados en la obra en la siguiente tabla:

Maquinaria y equipo dispuesto por el Consorcio UNION TEMPORAL INGE POLICIA GAITÁN.

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD
VOLQUETA	MARCA DODGE, MODELO D600, CON USO DE: TRANSPORE DE MATERIAL	1

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de junio del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

UT INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES

Con base en las obligaciones la **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025** derivadas de la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025 cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 30 de junio de 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con el manejo de los materiales de excavación generados en los diferentes frentes de obra del proyecto, para los cuales el contratista adelantó acciones orientadas al manejo adecuado de los materiales provenientes de excavaciones y descapote, priorizando su reutilización en sitio para actividades de relleno, reconformación y nivelación de las áreas intervenidas.

En aquellos casos donde no es posible su aprovechamiento inmediato, se ha observado su acopio temporal en condiciones controladas y autorizadas por la comunidad. Así mismo, la disposición final de estos materiales se realiza en sitios definidos dentro del área de intervención, asegurando que no se generen afectaciones a drenajes naturales, fuentes hídricas o zonas ambientalmente sensibles.

A la fecha del presente certificado, estas actividades se desarrollan en el marco de las condiciones propias del proyecto, caracterizado por la ejecución en múltiples frentes de trabajo en zonas rurales dispersas. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento al manejo y disposición de los materiales de excavación, con el fin de garantizar la adecuada reconformación de las áreas intervenidas y la prevención de

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de junio del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

UT INTERPOLICIA 2025

CERTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Con base en las obligaciones la **UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025** derivadas de la ejecución del **Contrato de Obra No. 1683 de 2025** cuyo objeto es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN -META"**, en mi calidad de Interventor del Contrato de Obra me permito CERTIFICAR que:

Durante el periodo comprendido desde el 01 al 30 de junio del 2026, la Interventoría realizó seguimiento a las actividades relacionadas con la gestión de residuos sólidos en los diferentes frentes de obra del proyecto.

Como resultado de las verificaciones, se evidenció que el contratista viene adelantó acciones orientadas a la separación en la fuente y al acopio temporal de los residuos generados según sus características, en condiciones que permiten su manejo controlado, considerando la ejecución de múltiples frentes de trabajo en zonas rurales del municipio de Puerto Gaitán.

A la fecha de corte del presente certificado, el contratista de obra prevé su entrega a gestores o empresas autorizadas una vez se consoliden volúmenes representativos o se finalicen las actividades en cada frente de trabajo. En este sentido, la Interventoría continuará realizando seguimiento a la gestión integral de los residuos, incluyendo la verificación de los respectivos soportes de disposición final.

El presente certificado se expide a los treinta (30) días del mes de junio del año 2026, para los fines pertinentes.

Cordialmente:

ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ
Ingeniero Civil. M.P. No. 25202090337 CND
Director Interventoría
UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1701 DE 2025 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN -META".

PROYECTO BPIN No 202500000031783 CUYO OBJETO ES LA" CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN -META"

No 7. INFORME DE SUPERVISOR

PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2026

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN INFORME MENSUAL NO 7.
(Periodo 01 al 30 de junio de 2026)
PROYECTO BPIN No 202500000031783 CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO. 1701 DE 2025

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual de supervisión tiene por objeto presentar el seguimiento efectuado al Contrato de Interventoría No. 1701 de 2025, correspondiente al período comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2026, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales, técnicas, administrativas, financieras, ambientales, contables y jurídicas derivadas del contrato, así como las actividades desarrolladas por la interventoría respecto del Contrato de Obra No. 1683 de 2025

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INFORMACION BASICA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	CONCURSO DE MÉRITOS CM-SI-010-2025
CONTRATO DE INTERVENTORÍA NO.	1701 DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN -META"
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	09 DE DICIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
NIT:	902.014.419-5
REPRESENTANTE:	DIEGO ARMANDO CARDOZO GUERRERO
No CEDULA DE CIUDADANÍA	86.088.145 DE VILLAVICENCIO
CORREO ELECTRÓNICO DEL CONTRATISTA	utinterpolicia2025@gmail.com
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META
TIEMPO Y/O PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	OCHO (8) MESES
FECHA ACTA INICIO:	DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	DIECISIETE (17) DE AGOSTO DE 2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS ($296.313.094) M/CTE
CÓDIGO BPIN	202500000031783
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

PRORROGA/ ADICION Nº	MOTIVO	FECHA PRORROGA	PERIODO PRORROGA	NUEVA FECHA TERMINACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. INFORMACION FINANCIERA

2.1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP No.	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	Valor
DIS.2025002849	2.3.2.02.02.008	1041-1.3.3.4.01	R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	$74.136.286,00
DIS.2026000009	2.3.2.02.02.008	1041-1.3.3.4.01	R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	$222.176.808,00

2.2 Registro Presupuestal

RP No.	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	Valor
RES.2025004220	2.3.2.02.02.008	1041-1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	$74.136.286,00
RES.2026000003	2.3.2.02.02.008	1041-1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	$222.176.808,00

2.3 Relación de pagos

RELACION DE PAGOS			
ORDEN DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA
N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES			
BALANCE DEL ANTICIPO			
PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
TOTAL			

MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL NO.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

MODIFICATORIA N.°1 (16/12/2025):	MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA DECIMA OCTAVA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

VERIFICACION DE POLIZAS

PÓLIZAS DE CONFORMIDAD CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

MODIFICACION NO.	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO		30-44-101068027 ANEXO 0
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/12/2025	09/12/2026	$59,262,618.80
CALIDAD DEL SERVICIO	09/08/2026	09/08/2031	$59,262,618.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	09/12/2025	09/08/2029	$14,815,654.70
FECHA DE APROBACION		ESTADO DE LAS POLIZAS	
		Aprobada	
MODIFICACION NO.	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO		30-40-101025734 ANEXO 0
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	09/12/2025	09/08/2026	$284.700.000
FECHA DE APROBACION		ESTADO DE LAS POLIZAS	
		Aprobada	

PÓLIZAS DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

MODIFICACION NO.	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
ACTA DE INICIO	SEGUROS DEL ESTADO		30-44-101068027 ANEXO 2
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

FECHA DE APROBACION	ESTADO DE LAS POLIZAS
	Aprobada

PÓLIZAS DE CONFORMIDAD CON LA MODIFICATORIA No 1 DEL CONTRATO

MODIFICACION NO.	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
MODIFICATORIA N°1	SEGUROS DEL ESTADO		30-44-101068027 ANEXO 3
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/12/2025	18/12/2026	$59,262,618.80
CALIDAD DEL SERVICIO	18/08/2026	18/08/2031	$59,262,618.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES	18/12/2025	18/08/2029	$14,815,654.70
FECHA DE APROBACION		ESTADO DE LAS POLIZAS	
		Aprobada	

B. ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN BÁSICA

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	LICITACIÓN PUBLICA **LP-SI-010-2025**
CONTRATO DE OBRA NO.	1683 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	TRES (03) DE DICIEMBRE DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN - META
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN – META
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INGE POLICÍA GAITAN
NIT:	902.011.453-2
REPRESENTANTE LEGAL:	INGRID MARYORY GARCÍA FONSECA
NO CEDULA DE CIUDADANÍA	1.121.837.768 DE VILLAVICENCIO
CORREO	utingepoliciagaitan@gmail.com
TIEMPO Y/O PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES
FECHA ACTA INICIO:	18 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	17 DE AGOSTO DE 2026
PRORROGA	N/A
FECHA TERMINACIÓN PRORROGA	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATRO MIL TRESCIENTOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

	SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.306.277.668,00 M/CTE)
CÓDIGO BPIN	202500000031783
INTERVENTOR	UNION TEMPORAL INTERPOLICIA 2025
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ARMANDO CARDOZO GUERRERO
SUPERVISOR	CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
CARGO	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

1. MODIFICACIONES EN EL TIEMPO – PRORROGAS Y SUSPENSIONES

PRORROGA SUSPENSIÓN Nº	MOTIVO	FECHA DE SUSPENSIÓN / PRORROGA	PERIODO DE SUSPENSIÓN / PRORROGA	NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2. INFORMACION FINANCIERA

2.1 Certificado de Disponibilidad Presupuestal

CDP No.	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALOR
DIS.2025002848	2.3.2.02.02.005	1041-1.3.3.4.01	R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	$620.406.812,00
DIS.2026000007	2.3.2.02.02.005	1041-1.3.3.4.01	R.B CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	$3.685.870.856,00

2.2 Registro Presupuestal

RP No.	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	DESCRIPCIÓN	Valor
RES.2025004223	2.3.2.02.02.005	1041-1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	$620.406.812,00
RES.2026000004	2.3.2.02.02.005	1041-1.3.3.4.01	R.B. CONTRIBUCIÓN SOBRE CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA	$3.685.870.856,00

2.3 Relación de pagos

RELACION DE PAGOS				
ORDEN DE PAGO	VALOR		CONCEPTO	FECHA

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

EGR.2026010031	$1.431.837.324,61	ANTICIPO No. 01 CTO 1683/2025 – 35%	21/01/2026
EGR.2026030507	$24.257.838,20	ANTICIPO No. 02 CTO 1683/2025 – 15%	16/03/2026
EGR.2026030508	$589.386.812,00		16/03/2026
TOTALES	$ 2.045.481.974,81		

BALANCE DEL ANTICIPO

PAGO	VALOR DESEMBOLSO	AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
ANTICIPO	$ 2.045.481.974,81		
PRIMER PAGO PARCIAL		$ 00	$ 00

MODIFICATORIOS Y/O ACLARATORIOS REALIZADOS AL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL NO.	CLÁUSULA ACLARADA Y/O MODIFICADA
N/A	N/A

VERIFICACION DE POLIZAS

PÓLIZAS DE CONFORMIDAD CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO

	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		30-44-101067871 ANEXO 0
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	02/12/2025	02/12/2026	$ 430.627.766,80
Buen manejo del anticipo	02/12/2025	02/12/2026	$ 2.153.138.834,00
Salarios y prestaciones sociales	02/12/2025	02/08/2029	$ 215.313.883,40
Estabilidad y calidad	02/12/2025	02/12/2030	$ 430.627.766,80
FECHA DE APROBACION		ESTADO DE LAS POLIZAS	
		APROBADA	

	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
SUSCRIPCION DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		30-40-101025675 ANEXO 0
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Daño emergente y lucro cesante	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Perjuicios extrapatrimoniales	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Contratistas y subcontratistas	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Responsabilidad civil patronal	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
Vehículos propios y no propios	02/12/2025	02/08/2026	$ 711.750.000,00
FECHA DE APROBACIÓN		ESTADO DE LAS POLIZAS	
		APROBADA	

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

PÓLIZAS DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO

	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
ACTA DE INICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		30-44-101067871 ANEXO 1 Y 2
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	18/12/2025	18/12/2026	$ 430.627.766,80
Buen manejo del anticipo	18/12/2025	18/12/2026	$ 2.153.138.834,00
Salarios y prestaciones sociales	18/12/2025	18/08/2029	$ 215.313.883,40
Estabilidad y calidad	18/12/2025	18/12/2030	$ 430.627.766,80
FECHA DE APROBACION		ESTADO DE LAS POLIZAS	
		APROBADA	

	COMPAÑÍA DE SEGUROS		POLIZA NO.
ACTA DE INICIO	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		30-44-101067871 ANEXO 1 Y 2
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	Predios labores y operaciones	18/12/2025	18/08/2026
Daño emergente y lucro cesante	Daño emergente y lucro cesante	18/12/2025	18/08/2026
Perjuicios extrapatrimoniales	Perjuicios extrapatrimoniales	18/12/2025	18/08/2026
Contratistas y subcontratistas	Contratistas y subcontratistas	18/12/2025	18/08/2026
Responsabilidad civil patronal	Responsabilidad civil patronal	18/12/2025	18/08/2026
Vehículos propios y no propios	Vehículos propios y no propios	18/12/2025	18/08/2026
FECHA DE APROBACION		ESTADO DE LAS POLIZAS	
		APROBADA	

PERSONAL DE INTERVENTORIA

A continuación, se relaciona el personal que labora en la ejecución del contrato de interventoría, del cual se verifico el pago de seguridad social del periodo correspondiente:

NOMBRE	CARGO
ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ C.C 86.053.753	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
JHONATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS C.C 1.121.844.182	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
FERNANDO ORTIZ FUENTES	ESTRUCTURAL

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

C.C 80.074.961	
LUIS CARLOS LAZO SANCHEZ C.C 1.121.892.054	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL
RUBY JOHANNA VILLAREAL C.C 41.952.332	TOPOGRAFA
JUAN DIEGO GARCIA LOZANO C.C 1.121966360	CADENERO
GISSELL JOHANA ACOSTA PEREZ C.C 1.006.874.312	AUXILIAR ADMINISTRATIVA


A. INFORME DE REVISION DE DOCUMENTOS PRECONTRACTUALES Y DISEÑOS (para el primer informe mensual) EN EL CASO DE CONVENIOS INCLUIR TAMBIEN LA VERIFICACION DE LOS ITEMS DEL CONTRATO DERIVADO VS LOS DEL CONVENIO

No aplica

B. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO LO PROGRAMADO VS LO EJECUTADO


CONTRATO DE OBRA No. 1683 DE 2025								
No. MES	VR. MENSUAL PROGRAMADO	VR PROGRAMADO ACUMULADO	% PROGRAMADO MENSUAL	% PROGRAMADO ACUMULADO	VR. MENSUAL EJECUTADO	VR. EJECUTADO ACUMULADO	% EJECUTADO MENSUAL	% EJECUTADO ACUMULADO
18/12/2025	$0	$0	0,00%	0,00%	$0	$0	0,00%	0,00%
31/12/2025	$28.037.949	$28.037.949	0,65%	0,65%	$22.553.338,67	$22.553.338,67	0,52%	0,52%
31/01/2026	$77.425.939	$105.463.888	1,80%	2,45%	$34.577.031,67	$57.130.370,33	0,80%	1,33%
28/02/2026	$191.735.345	$297.199.233	4,45%	6,90%	$121.980.572,67	$179.110.943,00	2,83%	4,16%
31/03/2026	$187.737.987	$484.937.220	4,36%	11,26%	$104.792.888,84	$283.903.831,84	2,43%	6,59%
30/04/2026	$221.627.087	$706.564.307	5,15%	16,41%	$95.934.936,12.	$379.838.767,96	2,23%	8,82%
31/05/2026	$331.938.505	$1.038.502.812	7,71%	24,12%	$189.309.686	$569.148.454	4,40%	13,22%
30/06/2026	$822.518.250	$1.861.021.062,00	19,10%	43,22%	$111.043.842,97	$680.192.297,05	2,58%	15,80%

C. AVANCE DE EJECUCIÓN FÍSICO (obra).

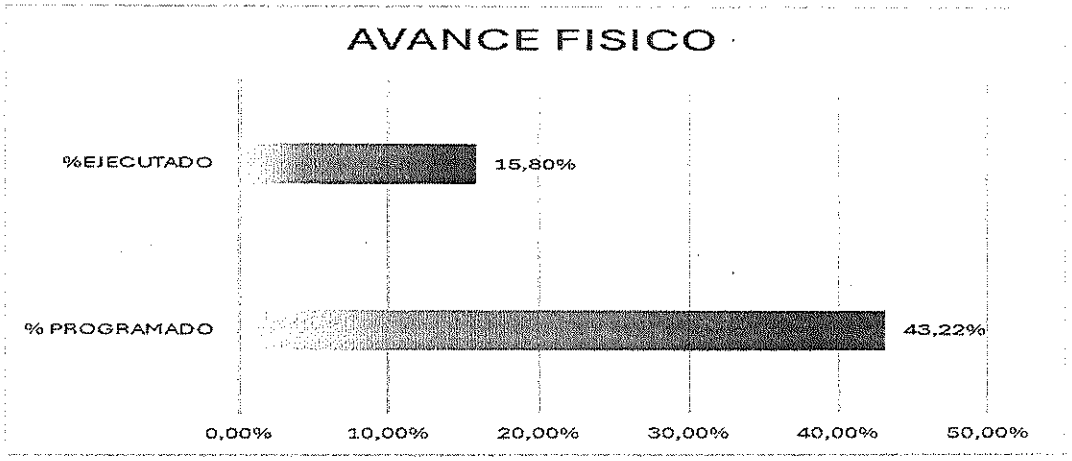


NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

AVANCE TABLA DE SEGUIMIENTO $

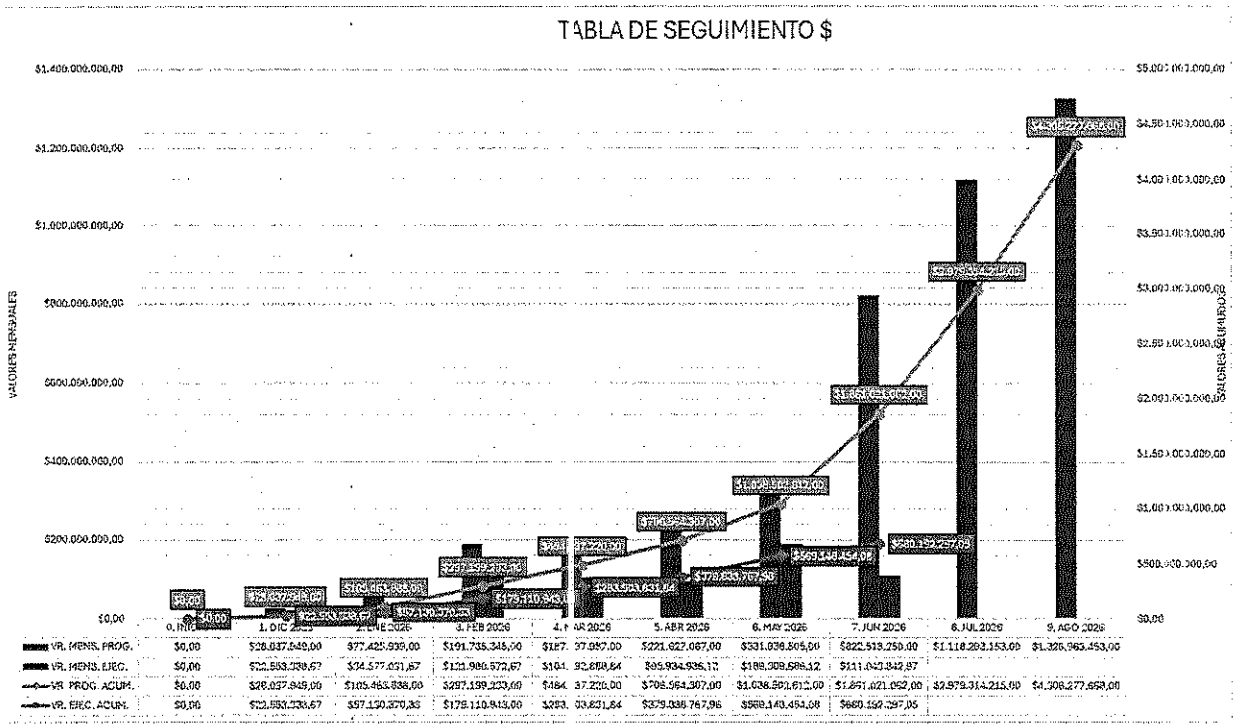

AVANCE TABLA DE SEGUIMIENTO %

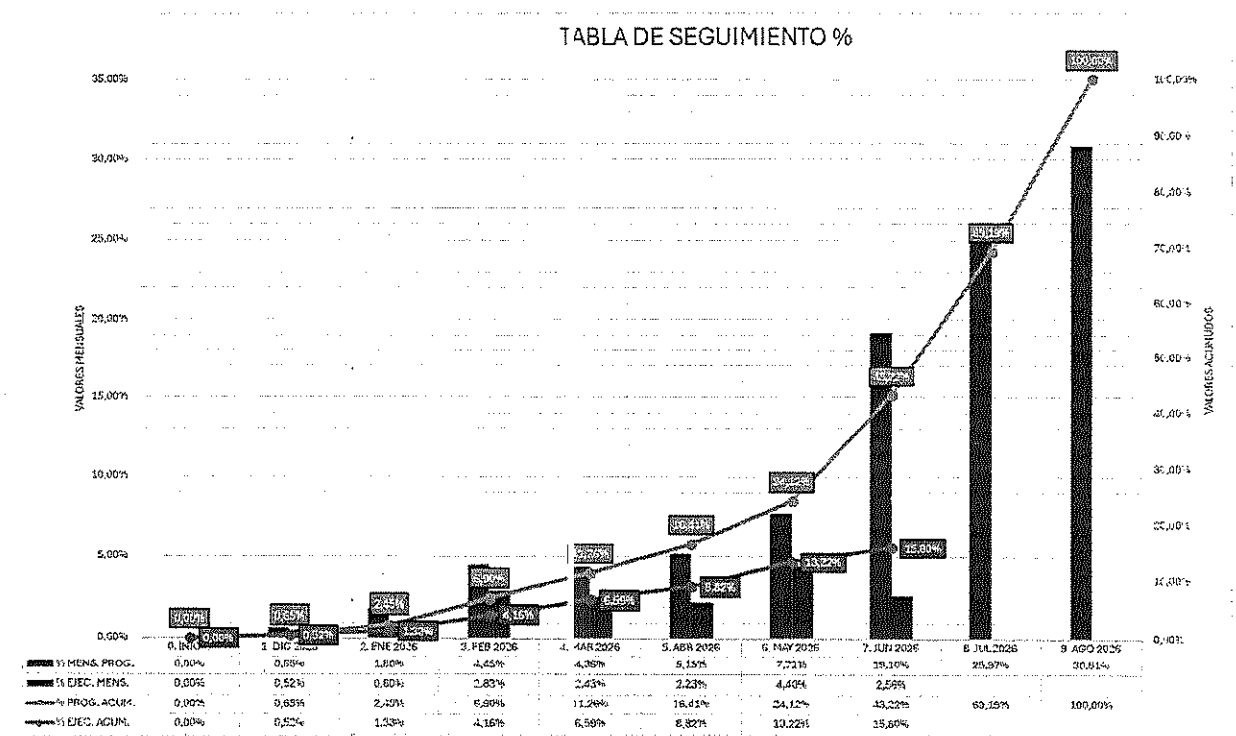

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

RELACION DE DOCUMENTOS

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
No se presentaron documentos radicados durante el período informado	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR

Una vez revisado el Informe Mensual No. 7 presentado por la interventoría, correspondiente al período comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, la supervisión verificó que la interventoría ejerció de manera permanente las actividades de seguimiento, inspección, vigilancia y control sobre la ejecución del Contrato de Obra No. 1683 de 2025, realizando el acompañamiento técnico a los diferentes frentes de trabajo y verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los diseños aprobados, los procedimientos constructivos y las obligaciones contractuales aplicables.

La supervisión evidenció que, durante el período evaluado, la interventoría efectuó seguimiento a las actividades desarrolladas en el componente de Alojamientos Nuevos, relacionadas con el suministro, figurado, armado y colocación de acero de refuerzo, instalación de lámina Metaldeck y ejecución de redes hidrosanitarias y eléctricas. Así mismo, verificó la ejecución de actividades de demolición en la edificación denominada Casa Blanca y el inicio de las actividades preliminares de localización, trazado y replanteo topográfico correspondientes al Tanque Elevado de Agua y al nuevo Cerramiento Perimetral. De acuerdo con la información y soportes allegados, dichas actividades fueron objeto de inspección y control técnico por parte de la interventoría.

De igual manera, la supervisión verificó el seguimiento realizado por la interventoría a las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo y al componente ambiental, evidenciándose controles asociados a los riesgos derivados de las actividades estructurales, fundiciones de concreto, manipulación de acero, demoliciones, operación de maquinaria e instalaciones hidrosanitarias y eléctricas. Así mismo, se constató el seguimiento a la adecuada segregación, almacenamiento temporal y disposición de los residuos generados, así como la aplicación de las medidas establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.

Respecto del avance físico de la obra, la supervisión evidenció que al cierre del período se registra un avance acumulado ejecutado del 15,80 %, frente a un 43,22 % programado, presentándose un desfase acumulado del 27,42 %. De acuerdo con lo informado por la interventoría, esta situación se encuentra asociada principalmente a las condiciones climáticas presentadas durante el período, así como a condiciones logísticas y operativas que afectaron el rendimiento de algunos frentes de trabajo y de actividades pertenecientes a la ruta crítica.

En consecuencia, la supervisión recomienda a la interventoría mantener un seguimiento estricto y permanente al comportamiento de la programación de obra, verificando la implementación y efectividad de las acciones de recuperación adoptadas por el contratista para disminuir el desfase acumulado. Así mismo, deberá realizar seguimiento detallado a las actividades que conforman la ruta crítica, identificar oportunamente las causas que puedan afectar su ejecución y requerir al contratista la adopción de medidas correctivas que permitan mejorar los rendimientos, sin afectar la calidad de las obras ni el cumplimiento de las especificaciones técnicas y obligaciones contractuales.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Igualmente, se recomienda mantener actualizado el control documental de los resultados de laboratorio, certificados de calidad, registros de obra, soportes de inspección, permisos, licencias y demás documentación técnica, administrativa, ambiental y contractual que permita garantizar la trazabilidad de las actividades ejecutadas y facilitar los procesos de seguimiento y control por parte de la Entidad.


Finalmente, una vez efectuado el análisis del Informe Mensual No. 7 y de los soportes allegados, la supervisión considera que la interventoría cumplió con las actividades de seguimiento correspondientes al período comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2026, evidenciándose el ejercicio del control técnico, administrativo, financiero, ambiental y jurídico sobre el contrato de obra. No obstante, teniendo en cuenta el desfase existente entre el avance ejecutado y el programado, la supervisión recomienda mantener especial seguimiento a las acciones de recuperación, al comportamiento de la programación contractual y al desarrollo de los frentes de obra, con el fin de verificar la disminución progresiva del atraso y garantizar el cumplimiento del objeto contractual dentro de las condiciones de calidad, oportunidad y eficiencia previstas.

ING. CHRISTIAN JULIÁN FERNÁNDEZ REYES
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA


NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

Anexo 1: INFORME FOTOGRAFICO


De lo anterior, se anexa la evidencia de las actividades en obra.

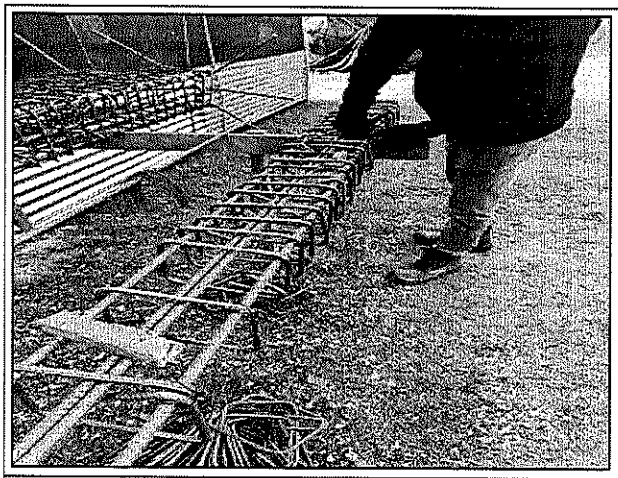


Fotografía. Fotografía. Actividades de figurado, armado, colocación y amarre de acero de refuerzo en la estructura de la segunda planta de alojamientos.

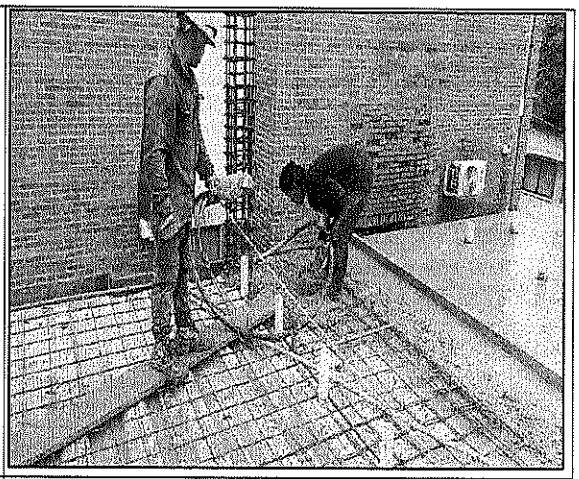


Fotografía. Actividad de instalación y colocación de lámina Metaldeck para la posterior fundida de la placa de entrepiso.

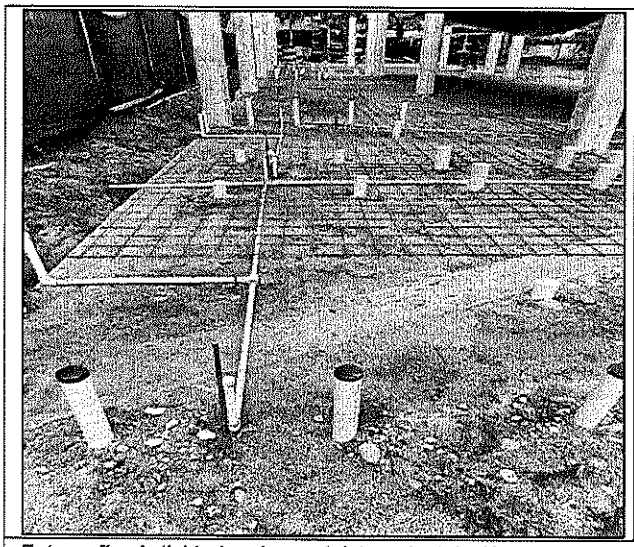

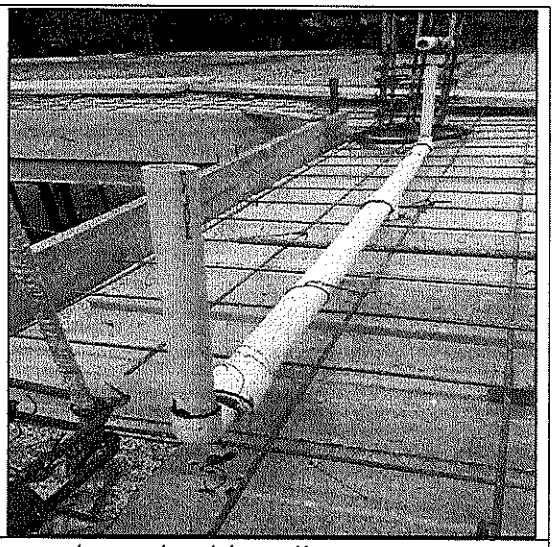


Fotografía. Actividades de suministro e instalación de tubería y accesorios para la red de presión.


NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta

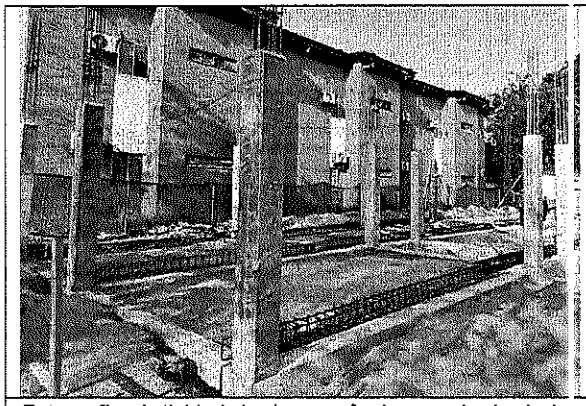


Fotografía. Actividad de desencofrado y acabado de la viga en concreto de 20,7 MPa (3.000 psi), evidenciando la estructura de cimentación superficial terminada y las columnas en proceso de curado mediante película plástica

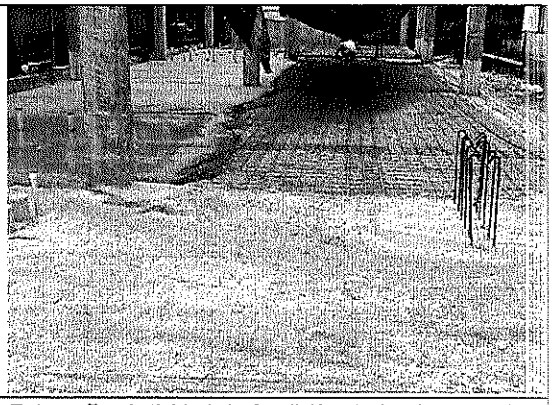



Fotografía. Actividad de fundición de la placa maciza de entrepiso en concreto impermeabilizado de 20,7 MPa (3.000 psi), evidenciando la previa instalación de la malla electrosoldada y del acero de refuerzo

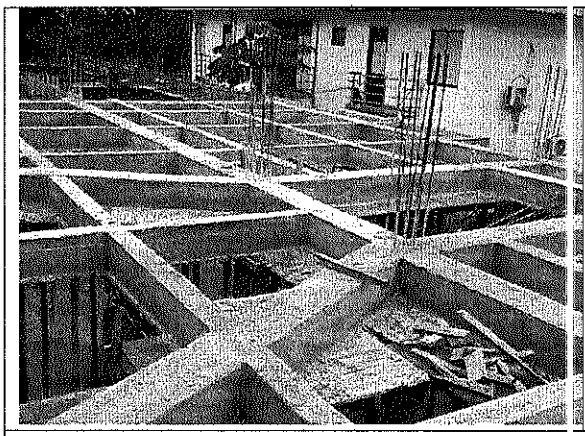

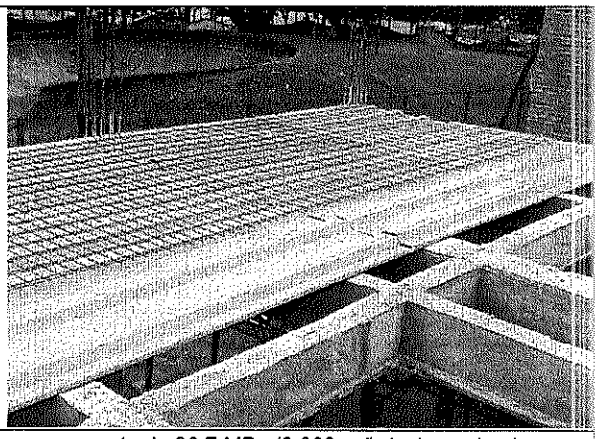

Fotografía. Actividad de montaje estructural de la viga aérea en concreto de 20,7 MPa (3.000 psi), incluyendo el suministro e instalación de lámina Metaldeck de 2" calibre 22, con su respectivo apuntalamiento y soporte inferior.

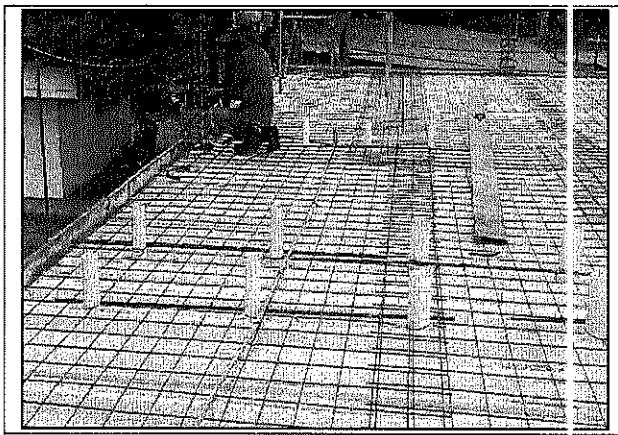

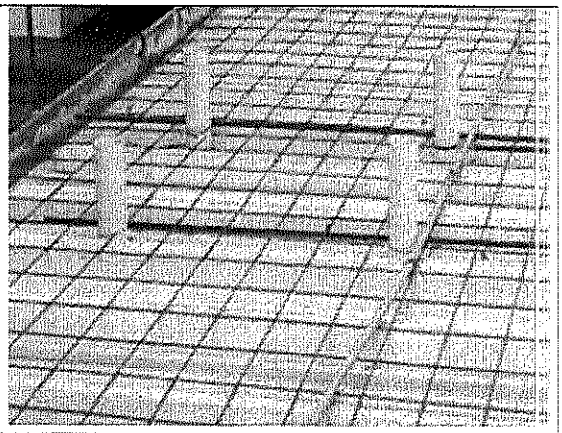

Fotografía. Actividades de suministro e instalación de tubería y accesorios para la red sanitaria.

NIT: 800079035-1 / Código Postal 502041 / Calle 10 No. 10-60 Barrio Centro. Palacio Municipal / Teléfonos: 320 863 2489
E-mail: alcaldia@puertogaitan-meta.gov.co / Página web: www.puertogaitan-meta.gov.co
Facebook: www.facebook.com/alcaldiadepuertogaitan.meta / Instagram: www.instagram.com/puertogaitan_meta
