INVERSIONES LITRUPE SAS
NIT 901.161.324-1
CARRERA 9 #9-66
Tel: (602) 3163689327
Roldanillo - Colombia
inversioneslitrupe@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FIL 6

Señores	MUNICIPIO DE ROLDANILLO		
NIT	891.900.289-6	**Teléfono**	(602) 3183905110
Dirección	CARRERA 7 #7-17	**Ciudad**	Roldanillo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/10/2026, 15:06
Expedición	22/10/2026, 15:16
Vencimiento	06/11/2026

Ítem	Descripción	Vr. Total
1	Costos Directos	146,398,451.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento noventa y seis millones ciento setenta y tres mil novecientos veinticuatro pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Cruce de vencimiento - Cuota No. RC-1-12-1 vence el 2026-10-08 por	$	78,469,570.00
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-11-06 por	$	117,704,354.34

Total Bruto	146,398,451.00
Administración 29.00%	42,455,550.79
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	7,319,922.55
Total a Pagar	196,173,924.34

Observaciones:
EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA.
AMORTIZACION $78.469.570

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764104675817 aprobado en 20260116 prefijo FIL desde el número 1 al 100 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil Tarifa
CUFE: cec4ab49eca4bf9db66b00c5bd7f3cbee5943a29e407dd54794a982f0d8b8399267aa43f1c51b4f4a19c63b7482c6e4b

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Contrato de obra No. 2026140

INFORME PARCIAL DE OBRA No. 1

"Ejecución de obras de mejoramiento y optimización de las redes de alcantarillado sanitario en diferentes tramos del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca"

Periodo

JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2026

Contratante:

MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA

Contratista:

INVERSIONES LITRUPE S.A.S
R.L. SONIA YISELA MONSALVE

SEPTIEMBRE DE 2026

LITRUPE S.A.S
INVERSIONES
email: inversioneslitrupe@gmail.com

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN 3
2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO 4
   2.1 Localización 4
   2.2 Características administrativas 7
   2.3 Aspectos Logísticos 7
   2.4 Revisión de Cantidades 9
   2.5 Aspectos administrativos y legales. 9
   2.6 Pólizas. 9
3. INFORME CONTRATO DE OBRA. 11
   3.1 Características técnicas, administrativas y financieras del proyecto. 12
4. PROGRAMACIÓN Y AVANCE FÍSICO. 16
   4.1 Cronograma. 16
   4.2 Seguimiento a maquinaria y equipo de obra 17
   4.3 Control de aportes legales y seguridad social del contrato 17
   4.4 Seguimiento a programas sociales. 17
   4.5 Seguimiento a programas de seguridad y salud en el trabajo 17
5. REGISTRO FOTOGRAFICO 18

1. INTRODUCCIÓN

La sociedad INVERSIONES LITRUPE S.A.S., identificada con NIT 901.161.324-1, en su calidad de Contratista del Contrato de Obra No. 2026140 presenta ante el MUNICIPIO DE ROLDANILLO – VALLE DEL CAUCA el presente Informe Parcial de Obra No. 1, correspondiente a los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2026, en el cual se consigna el avance de las actividades adelantadas en cumplimiento del objeto contractual.

El contrato tiene su origen en el Proceso de Contratación No. SAMC006DE2026, adelantado bajo la modalidad de Selección Abreviada de Menor Cuantía, y tiene por objeto la EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA. Las obras comprenden actividades de localización y replanteo, excavación, suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillado sanitario, conformación y vaciado de cámaras de inspección, rellenos compactados y reposición de las áreas intervenidas.

En cumplimiento de las obligaciones adquiridas, el Contratista ha desarrollado los trabajos con sus propios medios, materiales, equipos y personal, con plena autonomía técnica y administrativa, dentro del plazo contractual de seis (6) meses, contado a partir de la suscripción del acta de inicio del 29 de mayo de 2026, sin que a la fecha se hayan presentado suspensiones ni prórrogas. La ejecución se ajusta a las especificaciones técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación y a las cantidades de obra previstas en el presupuesto oficial.

El presente documento relaciona la descripción de las actividades ejecutadas durante el periodo, el avance de las cantidades de obra, el valor ejecutado a la fecha y el estado de amortización del anticipo, así como los soportes de cumplimiento de las obligaciones a cargo del Contratista en materia de seguridad social, aportes parafiscales y demás compromisos contractuales. Con ello, el Contratista deja constancia del avance en la ejecución del objeto contratado ante el MUNICIPIO DE ROLDANILLO, para efectos del seguimiento y control por parte de la supervisión.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO

2.1 Localización



Ilustración 1. Localización general

Las actividades ejecutadas en el marco del presente contrato se enmarcan en las siguientes características técnicas generales, de acuerdo con especificaciones del proyecto y las orientaciones de la supervisión:

El contrato No. 2026140, suscrito entre el Municipio de Roldanillo y la empresa INVERSIONES LITRUPE, tiene como objeto la ejecución de obras de mejoramiento y optimización de las redes de alcantarillado sanitario en diferentes tramos del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca.

Objetivo general

Ejecutar las obras de mejoramiento y optimización de las redes de alcantarillado sanitario en diferentes tramos del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, garantizando las condiciones funcionales y de servicio del sistema, conforme a las especificaciones técnicas señaladas en los documentos del Proceso de Contratación No. SAMC006DE2026.

Objetivos específicos

- Realizar la localización y replanteo de los tramos de la red de alcantarillado sanitario a intervenir, de acuerdo con los planos de

diseño, pendientes, cotas y alineamientos establecidos en el proyecto.

- Ejecutar las actividades de excavación y conformación de zanjas, garantizando las dimensiones, profundidades y condiciones de estabilidad requeridas para la instalación de la infraestructura.
- Suministrar e instalar la tubería de alcantarillado sanitario, verificando su alineación, pendiente, niveles y correcta conexión entre los diferentes tramos de la red.
- Construir y/o rehabilitar las cámaras de inspección y estructuras complementarias, de acuerdo con las especificaciones técnicas y dimensiones establecidas en los diseños.
- Ejecutar los rellenos y compactaciones de las zanjas, utilizando materiales adecuados y garantizando las condiciones de estabilidad y soporte de la tubería y del terreno.
- Construir los empalmes a la red existente y las conexiones domiciliarias, permitiendo conducir de manera segura las aguas residuales hacia los colectores y puntos de descarga establecidos.
- Realizar las pruebas y verificaciones del sistema construido, con el fin de comprobar su funcionamiento hidráulico, continuidad, estanqueidad y correcta evacuación de las aguas residuales.
- Garantizar la recuperación de las áreas intervenidas, incluyendo la reposición de pavimentos, andenes, zonas verdes u otros elementos afectados durante la ejecución de las obras.
- Cumplir con las especificaciones técnicas, normas de seguridad y medidas ambientales aplicables durante la ejecución de las obras de alcantarillado sanitario.
- Entregar la obra terminada dentro del plazo contractual, en condiciones de funcionalidad y operación, a entera satisfacción del Municipio de Roldanillo, para efectos de su recibo final y liquidación.

Alcance Técnico

La obra comprende el mejoramiento y la optimización de las redes de alcantarillado sanitario en diferentes tramos del municipio de Roldanillo, incluyendo las actividades de localización y replanteo, excavación y conformación de zanjas, adecuación del fondo de instalación, suministro e instalación de tuberías, construcción de cámaras de inspección y

estructuras complementarias, empalmes a la red existente, ejecución de rellenos y compactación, así como la reposición de las áreas intervenidas. Los trabajos se desarrollan de acuerdo con los planos de diseño, especificaciones técnicas, niveles y pendientes establecidos para el proyecto, garantizando la correcta alineación y el funcionamiento hidráulico de la red. Al terminar cada tramo se realizan las actividades de limpieza, verificación y puesta en servicio, dejando la infraestructura en condiciones adecuadas para su operación.

Áreas y espacios

Las obras se desarrollan en diferentes tramos de las redes de alcantarillado sanitario del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, de acuerdo con la memoria de cantidades y los planos del proceso de contratación, comprendiendo las vías, andenes y zonas públicas intervenidas para la instalación de la tubería y la construcción de las cámaras de inspección.

Obligaciones técnicas inherentes al alcance

En desarrollo del objeto contratado, y de conformidad con las obligaciones consignadas en la minuta del contrato, el alcance del Contratista comprende igualmente:

- El suministro de la totalidad de los materiales, mano de obra, equipos y herramientas necesarios para la correcta ejecución de las actividades.
- La vinculación de mano de obra de la región en los porcentajes mínimos exigidos en el pliego de condiciones.
- El cumplimiento de las normas de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo aplicables durante la ejecución.
- El manejo adecuado de los escombros y sobrantes, y la entrega de las áreas intervenidas en condiciones de aseo y funcionalidad.
- La reparación, por su cuenta y costo, de los defectos que pudieran comprobarse con posterioridad al recibo, dentro del período de garantía de estabilidad de la obra.

Estado de avance

A la fecha de corte del presente informe, las obras se encuentran en ejecución dentro del plazo contractual, dando cumplimiento a las especificaciones técnicas señaladas en los documentos del proceso de contratación. La entrega de las obras se realizará al término del plazo, en condiciones de funcionalidad y operación, para su recibo a satisfacción por parte de la supervisión.

2.2 Características administrativas

NÚMERO DEL CONTRATO:	2026140
OBJETO:	EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA
SUPERVISOR:	JORGE IVÁN RAMIREZ AGUIRRE
CONTRATISTA:	INVERSIONES LITRUPE SAS.
REPRESENTANTE LEGAL:	SONIA YISELA MONSALVE
FECHA DE CONTRATO:	28 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIO:	29 DE MAYO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SEIS (6) MESES
VALOR INICIAL:	$487.760.475,00

2.3 Aspectos Logísticos

Para la ejecución del contrato, INVERSIONES LITRUPE S.A.S. dispuso de los recursos humanos, técnicos, materiales y logísticos necesarios para desarrollar las actividades dentro del plazo y con la calidad establecida, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, conforme a las obligaciones adquiridas en el contrato.

Personal vinculado a la obra

El Contratista vinculó el personal idóneo requerido para la ejecución de las actividades, incluyendo el recurso humano operativo (oficiales y ayudantes de construcción) destinado a las labores de localización, excavación, instalación de tubería, construcción de cámaras de inspección y rellenos. En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se dio prioridad a la vinculación de mano de obra no calificada de la región, y se garantizó la afiliación y el pago oportuno de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y riesgos laborales) del personal empleado durante la ejecución, según se acredita con las planillas correspondientes que hacen parte de los soportes del presente informe.

Maquinaria, equipos y herramientas

El Contratista suministró la maquinaria, equipos y herramientas menores necesarios para el desarrollo de las actividades, incluyendo el equipo

requerido para las labores de excavación mecánica y compactación, el cargue y transporte de escombros y sobrantes a máquina hasta el sitio de disposición autorizado, y las herramientas propias de las actividades de instalación de tubería y construcción de cámaras de inspección.

Materiales y suministros

Los materiales empleados en la obra fueron suministrados por el Contratista con sus propios medios, garantizando su calidad y su idoneidad técnica para cada actividad. En cumplimiento de lo previsto en los documentos del proceso, el Contratista adquirió los bienes nacionales relevantes definidos por la Entidad, dando prioridad a los productos incorporados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales durante la ejecución del contrato.

Manejo del sitio de trabajo y disposición de escombros

Durante la ejecución se implementaron las medidas necesarias para el manejo ordenado del sitio de trabajo, el cargue y retiro de los materiales sobrantes producto de las excavaciones y demoliciones, y su disposición final en sitios autorizados, en un radio menor o igual a diez (10) kilómetros, dando cumplimiento a las normas de gestión ambiental aplicables y entregando las áreas intervenidas en condiciones de aseo y funcionalidad.

Seguridad y salud en el trabajo

El Contratista dio cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo vigentes durante la vigencia del contrato, dotando al personal de los elementos de protección personal requeridos y atendiendo las medidas de prevención propias de las actividades de construcción desarrolladas.

Coordinación con la supervisión

La ejecución se adelantó en permanente comunicación y coordinación con la supervisión del contrato, atendiendo de manera oportuna las observaciones, instrucciones y requerimientos formulados, y facilitando las labores de seguimiento y control conforme a lo previsto en la minuta contractual.

2.4 Revisión de Cantidades

En conjunto con el Supervisor, se realizó la revisión de la obra y sus respectivas cantidades. Las cantidades correspondientes al Acta Parcial No. 1 se soportan en la preacta de medición, y al final del contrato se soportarán con planos récord y memorias de cantidades.

Durante el periodo se intervinieron los sectores Los Alpes, Las Veraneras y Rey Bajo. Entre las cantidades ejecutadas se destacan: 250,00 m de localización y replanteo; 300,00 m³ de excavación a máquina y 479,60 m³ de excavación a mano; 352,00 m de retiro de tubería existente; 120,00 m² de protección de taludes (entibado); 157,60 m de tubería PVC Novafort de 8", 208,00 m de 6" y 95,00 m de 12"; 250,00 m de colchón de grava-arena; 287,03 m³ de relleno con material del sitio compactado; 2 cámaras de inspección tipo B; 7 empalmes a cámara de concreto y 50 acometidas domiciliarias instaladas.

2.5 Aspectos administrativos y legales.

Trámites y permisos.


Para poder iniciar la obra se contó con la siguiente documentación:

- Entrega de documentación al supervisor de obra como Análisis de precios unitarios, cronograma de obra, desglose de la administración, relación del equipo mínimo.

2.6 Pólizas.

Para amparar las obligaciones derivadas del Contrato de Obra No. 2026140, el Contratista constituyó ante SEGUROS DEL ESTADO S.A. las siguientes garantías a favor del MUNICIPIO DE ROLDANILLO (NIT 891.900.289-6). Mediante el Anexo No. 1 de la póliza de cumplimiento, expedido el 1 de junio de 2026 en virtud del Modificatorio No. 1, se incluyó el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo y se modificó el valor asegurado del amparo de cumplimiento.

Póliza / Amparo	Vigencia	Valor asegurado
Cumplimiento No. 60-44-101018211 (Anexo 1) – Cumplimiento del contrato	28/05/2026 – 31/03/2027	$97.552.095,00
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	28/05/2026 – 30/11/2029	$146.328.142,50
Estabilidad y calidad de la obra	3 años a partir del recibo de la obra	$146.328.142,50
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	01/06/2026 – 31/03/2027	$195.104.190,00
RCE No. 60-40-101008523 – Responsabilidad civil extracontractual	28/05/2026 – 30/11/2026	$350.181.000,00

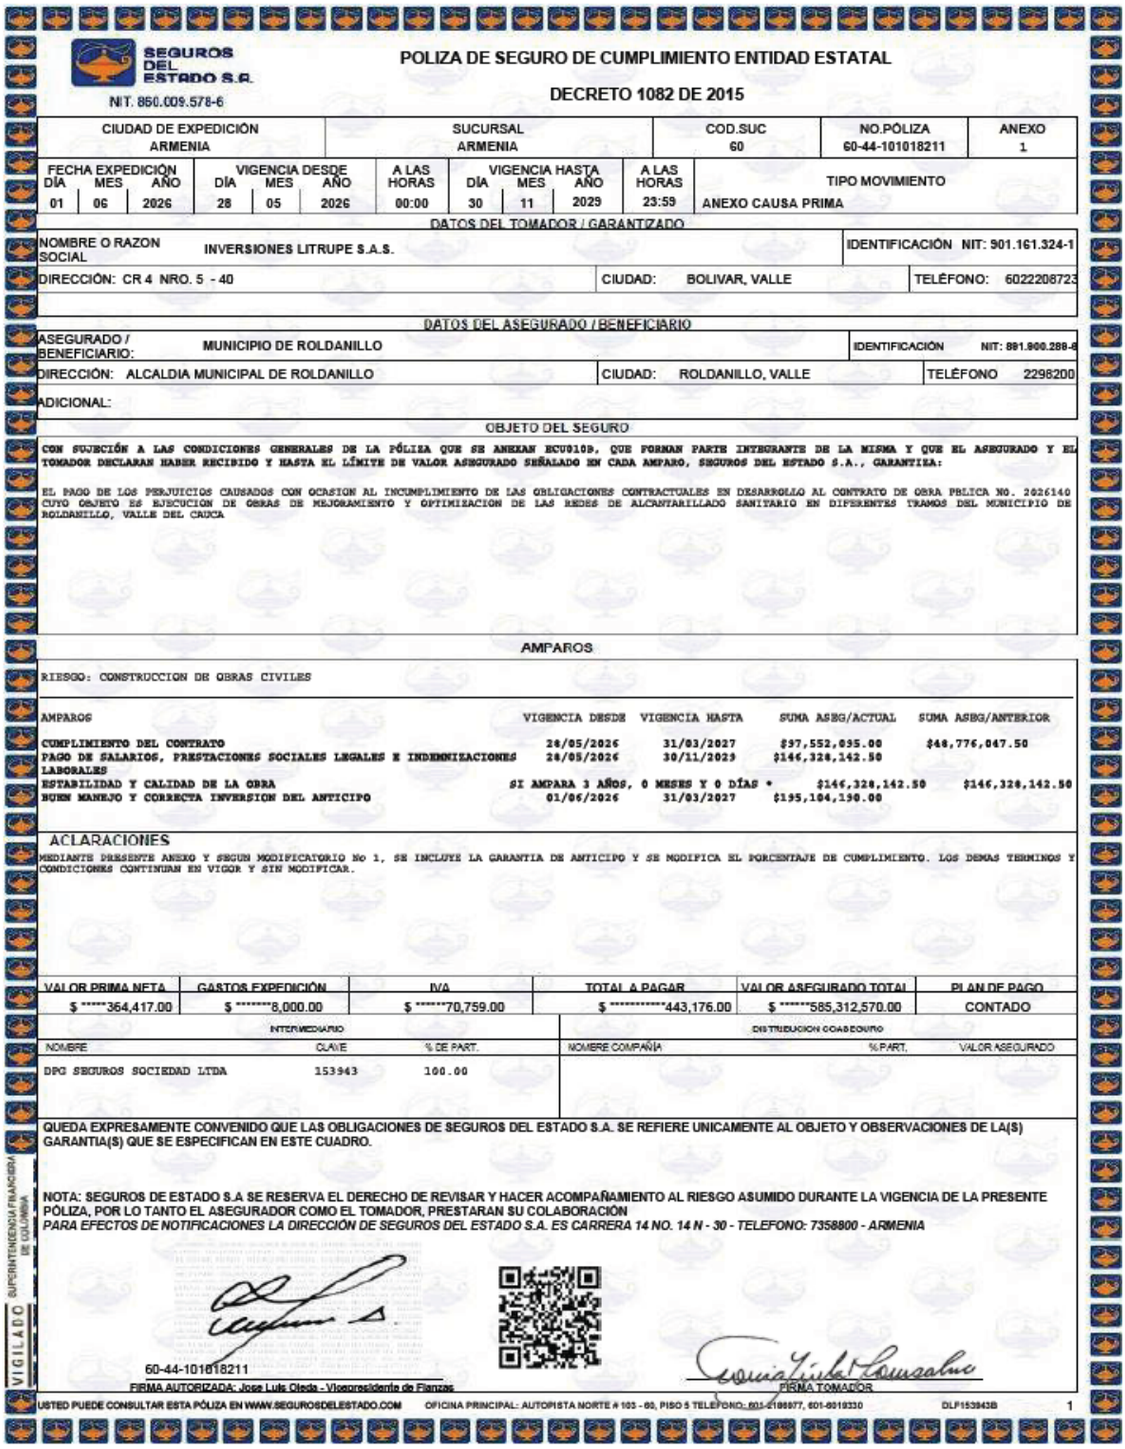

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
ARMENIA	ARMENIA	60	60-44-101018211	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
01	06	2026	28	05	2026	00:00	30	11	2029	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
INVERSIONES LITRUPE S.A.S.	NIT: 901.161.324-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 4 NRO. 5 - 40	BOLIVAR, VALLE	6022208723

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
MUNICIPIO DE ROLDANILLO	NIT: 891.900.288-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO	ROLDANILLO, VALLE	2298200

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION AL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN DESARROLLO AL CONTRATO DE OBRA PBLICA No. 2026140 CUYO OBJETO ES EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	28/05/2026	31/03/2027	$97,552,035.00	$48,776,047.50
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	28/05/2026	30/11/2029	$146,328,142.50	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS *		$146,328,142.50	$146,328,142.50
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/06/2026	31/03/2027	$195,104,190.00	

ACLARACIONES

MEDIANTE PRESENTE ANEXO Y SEGUN MODIFICATORIO No 1, SE INCLUYE LA GARANTIA DE ANTICIPO Y SE MODIFICA EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO. LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN EN VIGOR Y SIN MODIFICAR.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****364,417.00	$ *******8,000.00	$ ******70,759.00	$ **********443,176.00	$ ******585,312,570.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPG SEGUROS SOCIEDAD LTDA	153943	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA($) GARANTIA($) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELEFONO: 7358800 - ARMENIA

60-44-101018211


FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Cleda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-6186677, 601-6019330 DLP153943B 1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ilustración 2. Relación de póliza de cumplimiento

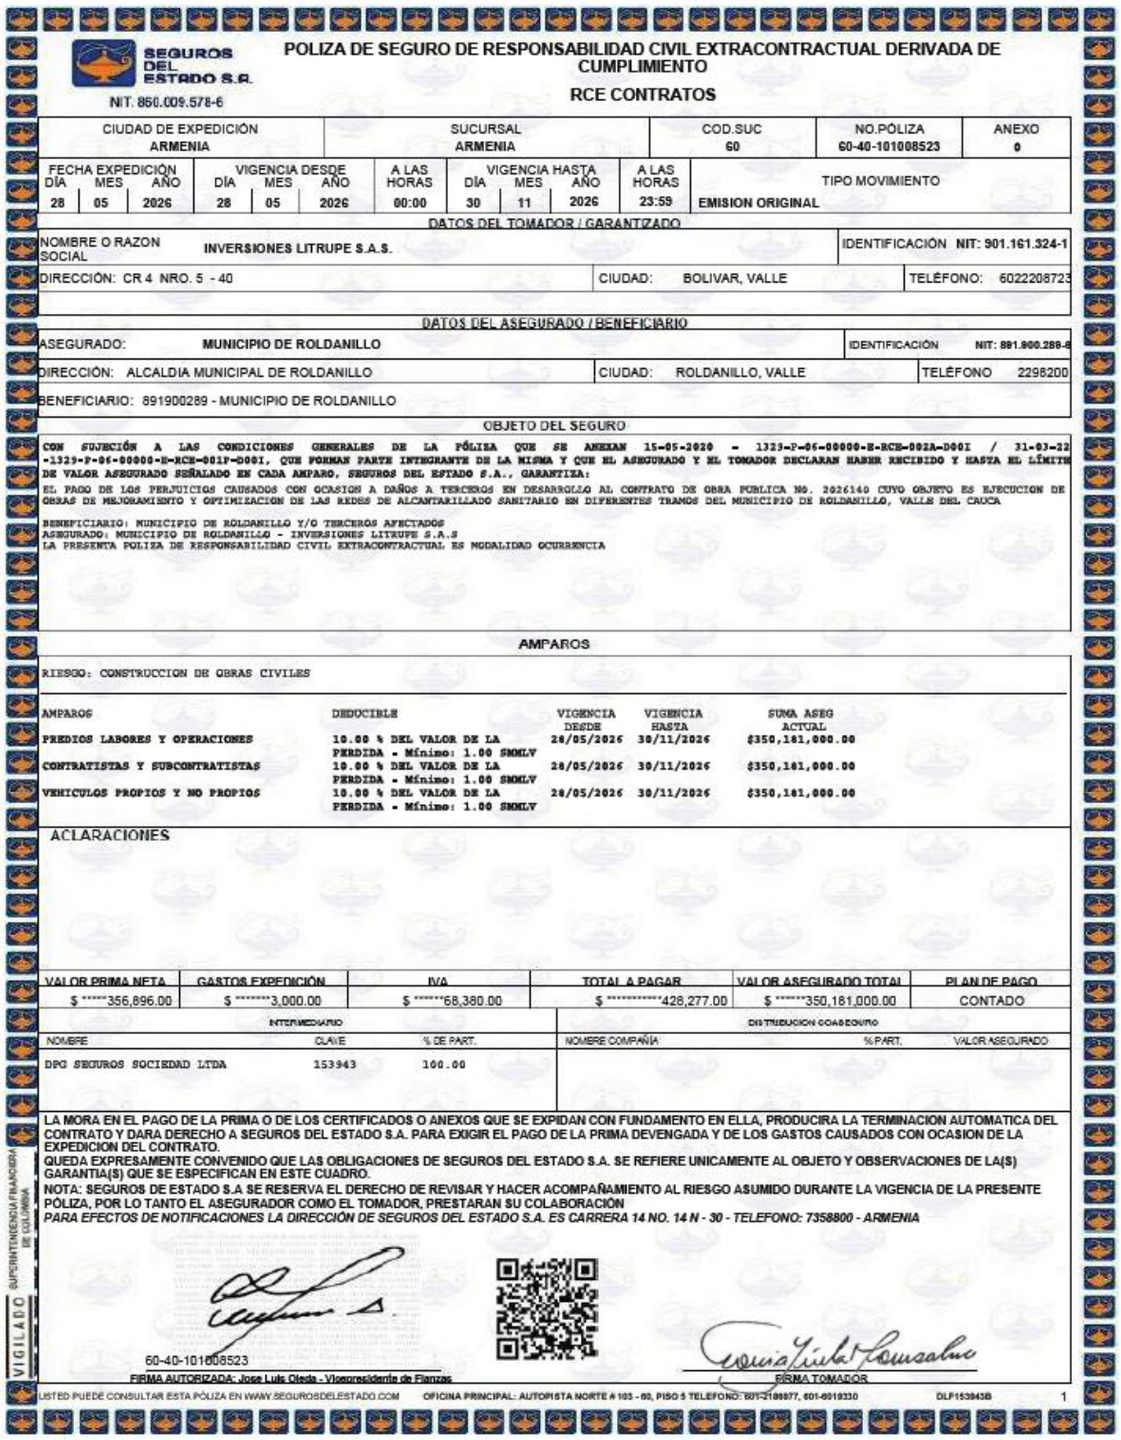

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
ARMENIA	ARMENIA	60	60-40-101008523	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
28	05	2026	28	05	2026	00:00	30	11	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: INVERSIONES LITRUPE S.A.S. — IDENTIFICACIÓN: NIT: 901.161.324-1
DIRECCIÓN: CR 4 NRO. 5 - 40 — CIUDAD: BOLIVAR, VALLE — TELÉFONO: 6022208723

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ROLDANILLO — IDENTIFICACIÓN: NIT: 891.900.288-8
DIRECCIÓN: ALCALDIA MUNICIPAL DE ROLDANILLO — CIUDAD: ROLDANILLO, VALLE — TELÉFONO: 2298200
BENEFICIARIO: 891900289 - MUNICIPIO DE ROLDANILLO

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1323-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I / 31-03-22 -1323-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION A DAÑOS A TERCEROS EN DESARROLLO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N0. 2026140 CUYO OBJETO ES EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA

BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ROLDANILLO Y/O TERCEROS AFECTADOS
ASEGURADO: MUNICIPIO DE ROLDANILLO - INVERSIONES LITRUPE S.A.S
LA PRESENTA POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ES MODALIDAD OCURRENCIA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/05/2026	30/11/2026	$350,181,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/05/2026	30/11/2026	$350,181,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	28/05/2026	30/11/2026	$350,181,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ******356,896.00	$ *******3,000.00	$ ******68,380.00	$ **********428,277.00	$ ******350,181,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DPC SEGUROS SOCIEDAD LTDA	153943	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA($) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 14 NO. 14 N - 30 - TELEFONO: 7358800 - ARMENIA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

60-40-101008523
FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oleda - Vicepresidente de Fianzas
FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM — OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186877, 601-6019330 — DLF1539438 — 1

Ilustración 8. Relación de póliza de RCE

3. INFORME CONTRATO DE OBRA.

La finalidad del presente contrato consiste en la ejecución de obras de mejoramiento y optimización de las redes de alcantarillado sanitario en diferentes tramos del municipio de Roldanillo, Valle del Cauca, con el propósito de mejorar la capacidad y el funcionamiento hidráulico del sistema, reducir los reboses,

obstrucciones y fugas de aguas residuales, y contribuir a la salud pública, la protección del medio ambiente y el bienestar de la comunidad.

Las obras responden a una necesidad previamente identificada por la Administración Municipal, en el marco de los proyectos de desarrollo de la infraestructura municipal.

Con la ejecución del contrato, el Municipio de Roldanillo propende por:
Garantizar la adecuada recolección y conducción de las aguas residuales, mediante redes de alcantarillado sanitario en óptimas condiciones de funcionamiento.

Reducir los reboses, obstrucciones y fugas en los tramos intervenidos, disminuyendo los riesgos sanitarios y ambientales para la comunidad.
Proteger la infraestructura existente, evitando que las fugas de aguas residuales generen deterioro en vías, andenes, viviendas, estructuras y demás elementos cercanos.

Mejorar las condiciones de saneamiento básico del municipio, mediante la optimización de la infraestructura hidráulica de acuerdo con las condiciones topográficas y de servicio de cada sector.

De esta manera, el contrato materializa el interés general y el cumplimiento de los fines estatales que orientan la contratación pública, al traducir la inversión de recursos públicos en un beneficio tangible para la comunidad y en el mejoramiento de la prestación del servicio público de alcantarillado en el territorio.

3.1 Características técnicas, administrativas y financieras del proyecto.

Características técnicas

Las obras se desarrollaron en las siguientes actividades conforme a las especificaciones de los documentos del proceso.

CONDICIONES INCIALES DEL CONTRATO		PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	**OBRAS DE ALCANTARILLADO**		
1.1	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	2,00	$ 330.016
1.2	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	250,00	$ 676.500
1.3	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	98,59	$ 1.039.300
1.4	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	0,00	$ -
1.5	DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	0,00	$ -

1.6	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	52,21	$ 701.155
1.7	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	239,37	$ 7.298.555
1.8	EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	300,00	$ 2.203.800
1.9	EXCAVACION TIERRA A MANO	479,60	$ 13.042.722
1.10	RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA	1,00	$ 679.990
1.11	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	180,00	$ 3.291.480
1.12	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	352,00	$ 4.874.848
1.13	PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60CM	2,00	$ 455.238
1.14	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	120,00	$ 11.318.520
1.15	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	287,03	$ 11.695.933
1.16	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	30,00	$ 2.708.850
1.17	RELLENO TIERRA-NIVELACION	58,15	$ 3.721.020
1.18	COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR	250,00	$ 4.768.500
1.19	DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	26,38	$ 124.713
1.20	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	7,00	$ 1.576.974
1.21	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	2,00	$ 4.141.912
1.22	LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION	5,00	$ 73.300
1.23	TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	157,60	$ 16.383.308
1.24	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	208,00	$ 16.383.536
1.26	TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	95,00	$ 17.905.600
1.27	TUBERIA PVC NOVAFORT 20"	0,00	$ -
1.28	TUBERIA PVC NOVAFORT 16"	0,00	$ -
1.29	CODO 45° X 160MM. NOVAFORT	24,00	$ 1.953.480
1.30	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	50,00	$ 3.201.450
1.31	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 8"	22,00	$ 3.746.974
1.32	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	28,00	$ 5.407.696
1.33	SILLA YEE NOVAF 6"X12"	12,00	$ 3.398.040
1.34	ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	6,00	$ 165.762
1.35	ACARREO MATERIALES PETREOS	295,27	$ 857.169
1.36	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	0,00	$ -
1.37	PAV.CONCR MR=36 MEZCLA IN SITU E=0.15,INC.JUNTA	0,00	$ -
1.38	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	3,00	$ 2.272.110
1.39	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	0,00	$ -
1.40	RECUBRIMIENTO CONCRETO TUBERIA	0,00	$ -

Las actividades se ejecutaron garantizando niveles, hermeticidad, calidad de los procesos constructivos, con materiales de calidad e idoneidad técnica suministrados por el Contratista.

2. Características administrativas

Concepto	**Detalle**
Contrato No.	2026140
Proceso	SAMC006DE2026 – Selección Abreviada de Menor Cuantía
Contratante	Municipio de Roldanillo – Valle del Cauca, NIT 891.900.289-6
Contratista	Inversiones Litrupe S.A.S., NIT 901.161.324-1
Representante legal	Sonia Yisela Monsalve
Supervisor	Jorge Iván Ramírez Aguirre – Secretario de Infraestructura
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Acta de inicio	29 de mayo de 2026
Fecha de terminación	29 de noviembre de 2026
Suspensiones / prórrogas / adiciones	No se han presentado a la fecha
Modificaciones	Modificatorio No. 1: inclusión del anticipo (40%) y ajuste de garantías (Anexo 1 póliza 60-44-101018211, 01/06/2026)

En el desarrollo administrativo del contrato, el Contratista dio cumplimiento a las obligaciones de vinculación de personal idóneo y de mano de obra de la región, afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, adquisición de bienes nacionales relevantes, y atención permanente de las instrucciones y requerimientos de la supervisión. La ejecución se adelanta a través de la plataforma SECOP II, conforme a lo previsto en la minuta contractual.

3. Características financieras

Concepto	Valor	%
Valor inicial del contrato	$487.760.475,00	100%
Anticipo (40%)	$195.104.190,00	40%
Valor ejecutado – Acta Parcial No. 1	$196.173.925,00	40,22%
Amortización del anticipo – Acta Parcial No. 1	$78.469.570,00	16,09%
Saldo del anticipo por amortizar	$116.634.620,00	23,91%
Valor neto a pagar – Acta Parcial No. 1	$117.704.355,00	24,13%
Saldo por ejecutar	$291.586.550,00	59,78%

Con corte al Acta Parcial No. 1, el valor ejecutado asciende a $196.173.925,00, equivalente al 40,22% del valor del contrato, discriminado en costos directos por $146.398.451,00, administración (29%) por $42.455.551,00 y utilidad (5%) por $7.319.923,00. De este valor se amortizaron $78.469.570,00 del anticipo otorgado ($195.104.190,00), quedando un saldo por amortizar de $116.634.620,00 y un valor neto a pagar al Contratista de $117.704.355,00.

4. PROGRAMACIÓN Y AVANCE FÍSICO.

4.1 Cronograma.

EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA	210 días	vie 29/05/26	vie 25/12/26
SECTOR LOS ALPES	47 días	vie 29/05/26	mié 15/07/26
OBRAS DE ALCANTARILLADO	47 días	vie 29/05/26	mié 15/07/26
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	1 día	vie 29/05/26	sáb 30/05/26
LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	2 días	sáb 30/05/26	lun 1/06/26
ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	10 días	mar 16/06/26	vie 26/06/26
CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	10 días	jue 11/06/26	dom 21/06/26
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	10 días	dom 21/06/26	mié 1/07/26
EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	5 días	lun 1/06/26	sáb 6/06/26
EXCAVACION TIERRA A MANO	15 días	sáb 6/06/26	dom 21/06/26
RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA	1 día	mar 14/07/26	mié 15/07/26
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	5 días	jue 11/06/26	mar 16/06/26
RETIRO TUBERIA EXISTENTE	5 días	sáb 6/06/26	jue 11/06/26
PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60CM	1 día	sáb 6/06/26	dom 7/06/26
PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	5 días	sáb 6/06/26	jue 11/06/26
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	5 días	mié 1/07/26	lun 6/07/26
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	3 días	sáb 11/07/26	mar 14/07/26
RELLENO TIERRA-NIVELACION	5 días	lun 6/07/26	sáb 11/07/26
COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR	8 días	mar 16/06/26	mié 24/06/26
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	1 día	jue 11/06/26	vie 12/06/26
EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	1 día	mar 16/06/26	mié 17/06/26
CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	3 días	mié 24/06/26	sáb 27/06/26
LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION	1 día	mié 24/06/26	jue 25/06/26
TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	7 días	mié 24/06/26	mié 1/07/26
TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	8 días	mar 16/06/26	mié 24/06/26
CODO 45° X 160MM. NOVAFORT	15 días	mié 24/06/26	jue 9/07/26
INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	15 días	mié 24/06/26	jue 9/07/26
SILLA YEE NOVAF 6"X12"	15 días	mié 24/06/26	jue 9/07/26
ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	2 días	mié 24/06/26	vie 26/06/26
ACARREO MATERIALES PETREOS	2 días	sáb 11/07/26	lun 13/07/26
TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	1 día	mar 16/06/26	mié 17/06/26

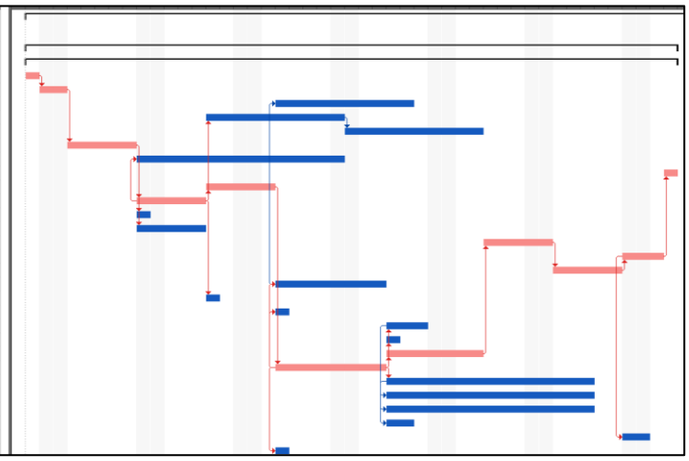


Ilustración 3. Cronograma Los Alpes.

EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA	210 días	vie 29/05/26	vie 25/12/26
SECTOR LOS ALPES	47 días	vie 29/05/26	mié 15/07/26
SECTOR LAS VERANERAS TRAMO 1	48 días	mié 15/07/26	mar 1/09/26
OBRAS DE ALCANTARILLADO	48 días	mié 15/07/26	mar 1/09/26
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	1 día	mié 15/07/26	jue 16/07/26
LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	3 días	jue 16/07/26	dom 19/07/26
ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	6 días	dom 2/08/26	sáb 8/08/26
CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	3 días	dom 2/08/26	mié 5/08/26
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	3 días	mié 5/08/26	sáb 8/08/26
EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	7 días	dom 19/07/26	dom 26/07/26
EXCAVACION TIERRA A MANO	7 días	dom 26/07/26	dom 2/08/26
RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA	2 días	dom 30/08/26	mar 1/09/26
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	8 días	dom 2/08/26	lun 10/08/26
RETIRO TUBERIA EXISTENTE	7 días	dom 26/07/26	dom 2/08/26
PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60CM	1 día	dom 26/07/26	lun 27/07/26
PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	5 días	dom 26/07/26	vie 31/07/26
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	6 días	jue 13/08/26	mié 19/08/26
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	5 días	mar 25/08/26	dom 30/08/26
RELLENO TIERRA-NIVELACION	6 días	mié 19/08/26	mar 25/08/26
COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR	8 días	dom 2/08/26	lun 10/08/26
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	1 día	dom 2/08/26	lun 3/08/26
EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	1 día	lun 3/08/26	mar 4/08/26
CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	3 días	lun 3/08/26	jue 6/08/26
LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION	1 día	dom 2/08/26	lun 3/08/26
TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	1 día	dom 2/08/26	lun 3/08/26
TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	10 días	lun 3/08/26	jue 13/08/26
CODO 45° X 160MM. NOVAFORT	15 días	jue 13/08/26	vie 28/08/26
INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	15 días	jue 13/08/26	vie 28/08/26
SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 8"	1 día	jue 13/08/26	vie 14/08/26
ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	2 días	lun 3/08/26	mié 5/08/26
ACARREO MATERIALES PETREOS	3 días	mar 25/08/26	vie 28/08/26
TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	1 día	dom 2/08/26	lun 3/08/26

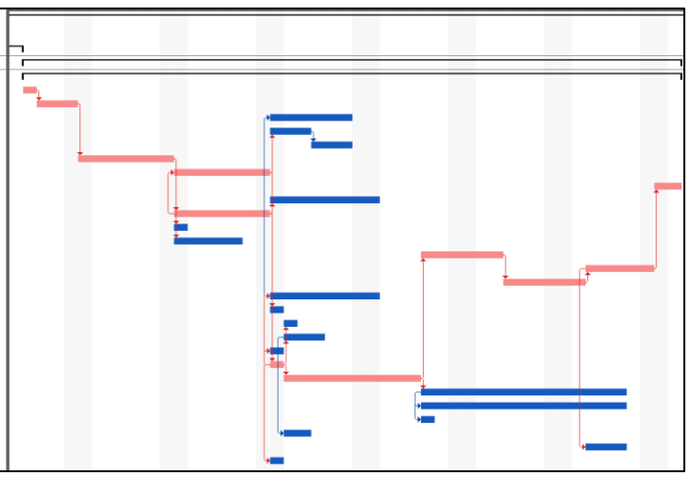


Ilustración 4 Cronograma de ejecución Las Veraneras

EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA	210 días	vie 29/05/26	vie 25/12/26
SECTOR LOS ALPES	47 días	vie 29/05/26	mié 15/07/26
SECTOR LAS VERANERAS TRAMO 1	48 días	mié 15/07/26	mar 1/09/26
SECTOR REY BAJO TRAMO 1	47 días	mar 1/09/26	dom 18/10/26
OBRAS DE ALCANTARILLADO	47 días	mar 1/09/26	dom 18/10/26
CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	1 día	mar 1/09/26	mié 2/09/26
LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	1 día	mié 2/09/26	jue 3/09/26
ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	5 días	jue 17/09/26	mar 22/09/26
CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	1 día	vie 11/09/26	sáb 12/09/26
CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	1 día	sáb 12/09/26	dom 13/09/26
EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	2 días	jue 3/09/26	sáb 5/09/26
EXCAVACION TIERRA A MANO	8 días	sáb 5/09/26	dom 13/09/26
RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA	2 días	vie 16/10/26	dom 18/10/26
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	6 días	vie 11/09/26	jue 17/09/26
RETIRO TUBERIA EXISTENTE	6 días	sáb 5/09/26	vie 11/09/26
PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60CM	1 día	sáb 5/09/26	dom 6/09/26
PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	6 días	sáb 5/09/26	vie 11/09/26
RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	6 días	jue 1/10/26	mié 7/10/26
RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	5 días	dom 11/10/26	vie 16/10/26
RELLENO TIERRA-NIVELACION	4 días	mié 7/10/26	dom 11/10/26
COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR	8 días	jue 17/09/26	vie 25/09/26
DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	1 día	vie 11/09/26	sáb 12/09/26
EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	1 día	jue 17/09/26	vie 18/09/26
CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	3 días	vie 25/09/26	lun 28/09/26
LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION	1 día	vie 25/09/26	sáb 26/09/26
TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	8 días	jue 17/09/26	vie 25/09/26
TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	6 días	vie 25/09/26	jue 1/10/26
CODO 45° X 160MM. NOVAFORT	6 días	vie 25/09/26	jue 1/10/26
INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	6 días	vie 25/09/26	jue 1/10/26
SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 8"	6 días	vie 25/09/26	jue 1/10/26
ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	1 día	vie 25/09/26	sáb 26/09/26
ACARREO MATERIALES PETREOS	1 día	dom 11/10/26	lun 12/10/26
TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	1 día	jue 17/09/26	vie 18/09/26

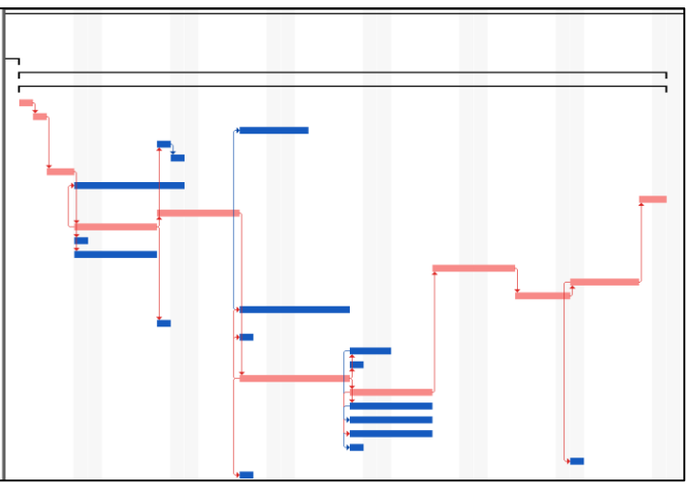


Ilustración 5. Cronograma de ejecución Rey Bajo.

4.2 Seguimiento a maquinaria y equipo de obra

MAQUINARIA Y EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO
PULIDORA	1	BUENO
HERRAMIENTA MENOR	1	BUENO

4.3 Control de aportes legales y seguridad social del contrato

Para el contrato de obra se anexa el soporte de los aportes y pago de planilla de seguridad social.

4.4 Seguimiento a programas sociales.

Durante la gestión social se realizan varias actividades, las cuales se describen a continuación:


Empleos formales generados en la ejecución de la obra: durante la ejecución de la obra se generó empleo para lo cual fue necesario contratar mano de obra no calificada, asi mismo durante la ejecución de este tipo de obras se necesita personal con cierta capacidad de entendimiento por lo que también se contrató personal con estas características.

4.5 Seguimiento a programas de seguridad y salud en el trabajo

Durante la ejecución de la obra se garantizó que cada una de las personas que laboran en la obra contaran con las medidas de seguridad y salud en el trabajo, asegurándose que tuvieran al día la afiliación al sistema de seguridad social, ARL y que contaran con los elementos de protección personal como: casco, guantes, botas, chalecos, etc.

5. REGISTRO FOTOGRAFICO




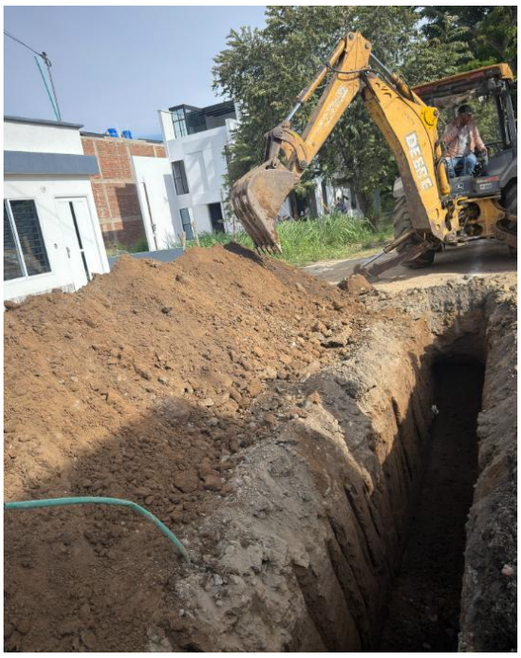








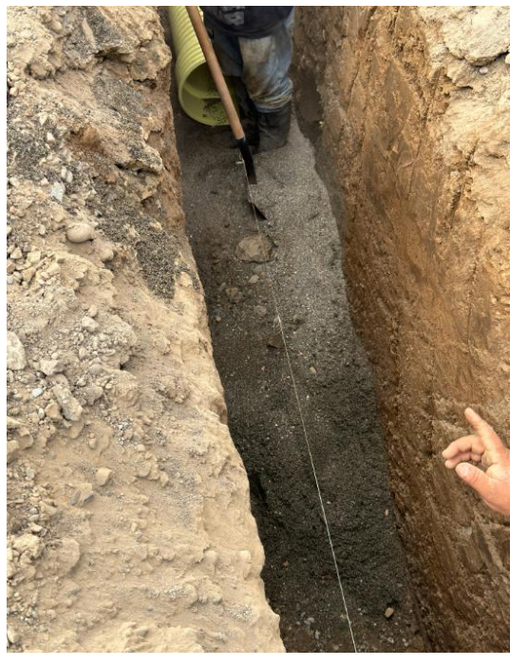



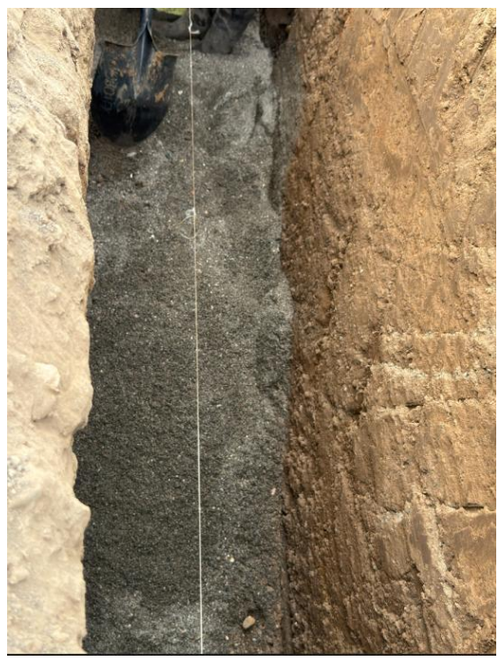












BELLOTA


BELLOTA

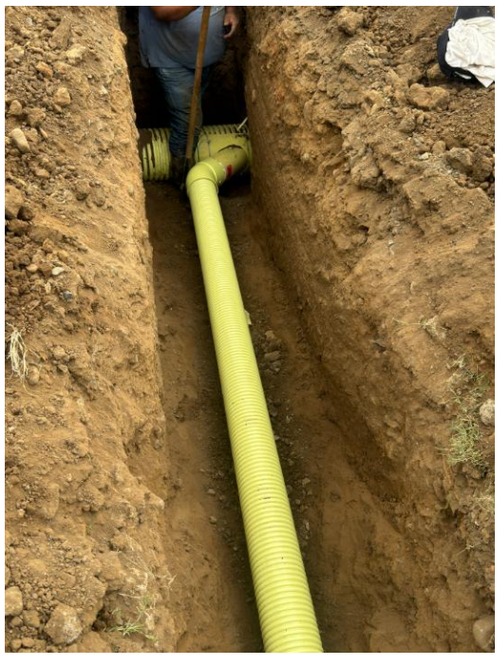

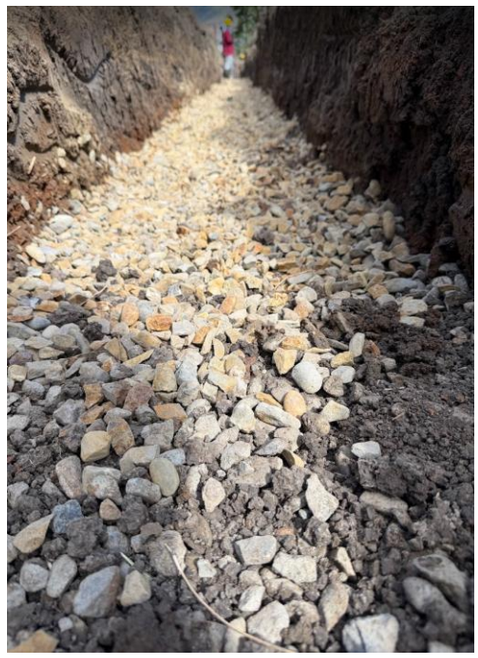





Cordialmente,

SONIA YISELA MONSALVE
R.L INVERSIONES LITRUPE SAS

100

MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA

ACTA PARCIAL DE OBRA 1

CONTRATO No.	2026140	PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES	PLAZO ACUMULADO: SEIS (06) MESES
OBJETO:	EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA	FECHA INICIO: 29/05/2026	FECHA DE TERMINACION: 29/11/2026
CONTRATISTA:	INVERSIONES LITRUPE SAS	FECHA DE SUSPENSION: N.A	FECHA DE REINICIO: N.A
SUPERVISOR:	JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE	VALOR INICIAL: $ 487.760.475	VALOR ADICIONES: $ 0
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. N.A		VALOR ACUMULADO: $ 487.760.475	VALOR PRESENTE ACTA: $ 196.173.925

CONDICIONES INCIALES DEL CONTRATO						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	**OBRAS DE ALCANTARILLADO**				**361.304.055**				**$ 146.398.451**		**$ 146.398.451**
1.1	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	6	165.008,00	990.048,00			2,00	$ 330.016	2,00	$ 330.016
1.2	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	776,5	2.706,00	2.101.209,00			250,00	$ 676.500	250,00	$ 676.500
1.3	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3	395,649	10.542,00	4.170.932,00			98,59	$ 1.039.300	98,59	$ 1.039.300
1.4	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M	72,5	7.727,00	560.208,00			0,00	$ -	0,00	$ -
1.5	DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	M2	20,4	18.041,00	368.036,00			0,00	$ -	0,00	$ -
1.6	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3	196,155	13.429,00	2.634.165,00			52,21	$ 701.155	52,21	$ 701.155
1.7	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3	149,088	30.491,00	4.545.842,00			239,37	$ 7.298.555	239,37	$ 7.298.555
1.8	EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	M3	745,44	7.346,00	5.476.002,00			300,00	$ 2.203.800	300,00	$ 2.203.800
1.9	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	190,2	27.195,00	5.172.489,00			479,60	$ 13.042.722	479,60	$ 13.042.722
1.10	RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA	UND	5	679.990,00	3.399.950,00			1,00	$ 679.990	1,00	$ 679.990
1.11	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	M	289,5	18.286,00	5.293.797,00			180,00	$ 3.291.480	180,00	$ 3.291.480
1.12	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	M	289,5	13.849,00	4.009.286,00			352,00	$ 4.874.848	352,00	$ 4.874.848
1.13	PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60CM	UND	7	227.619,00	1.593.333,00			2,00	$ 455.238	2,00	$ 455.238
1.14	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	M2	203,1	94.321,00	19.156.595,00			120,00	$ 11.318.520	120,00	$ 11.318.520
1.15	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	812,8862579	40.748,00	33.123.489,00			287,03	$ 11.695.933	287,03	$ 11.695.933
1.16	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3	93,18	90.295,00	8.413.688,00			30,00	$ 2.708.850	30,00	$ 2.708.850
1.17	RELLENO TIERRA-NIVELACION	M3	4,23	63.986,00	270.661,00			58,15	$ 3.721.020	58,15	$ 3.721.020
1.18	COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR	M	776,5	19.074,00	14.810.961,00			250,00	$ 4.768.500	250,00	$ 4.768.500
1.19	DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3	142,695	4.728,00	674.662,00			26,38	$ 124.713	26,38	$ 124.713
1.20	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	12	225.282,00	2.703.384,00			7,00	$ 1.576.974	7,00	$ 1.576.974
1.21	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND	7	2.070.956,00	14.496.692,00			2,00	$ 4.141.912	2,00	$ 4.141.912
1.22	LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION	UND	11	14.660,00	161.260,00			5,00	$ 73.300	5,00	$ 73.300
1.23	TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	M	251,5	103.955,00	26.144.683,00			157,60	$ 16.383.308	157,60	$ 16.383.308
1.24	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	M	224	78.767,00	17.643.808,00			208,00	$ 16.383.536	208,00	$ 16.383.536
1.26	TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	M	105	188.480,00	19.790.400,00			95,00	$ 17.905.600	95,00	$ 17.905.600
1.27	TUBERIA PVC NOVAFORT 20"	M	1	518.693,00	518.693,00			0,00	$ -	0,00	$ -
1.28	TUBERIA PVC NOVAFORT 16"	M	420	325.095,00	136.539.900,00			0,00	$ -	0,00	$ -
1.29	CODO 45° X 160MM. NOVAFORT	UND	5	81.395,00	406.975,00			24,00	$ 1.953.480	24,00	$ 1.953.480
1.30	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND	66	64.029,00	4.225.914,00			50,00	$ 3.201.450	50,00	$ 3.201.450
1.31	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 8"	M	29	170.317,00	4.939.193,00			22,00	$ 3.746.974	22,00	$ 3.746.974
1.32	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND	0	193.132,00	0,00			28,00	$ 5.407.696	28,00	$ 5.407.696
1.33	SILLA YEE NOVAF 6"X12"	UND	20	283.170,00	5.663.400,00			12,00	$ 3.398.040	12,00	$ 3.398.040
1.34	ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	M3	97,41	27.627,00	2.691.146,00			6,00	$ 165.762	6,00	$ 165.762
1.35	ACARREO MATERIALES PETREOS	M3 - KM	346,528	2.903,00	1.005.971,00			295,27	$ 857.169	295,27	$ 857.169

	MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA NIT: 891.900.289-6	PÁGINA 1 DE 1
		CÓDIGO: IV-FR-13
	ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1	VERSIÓN: 01
		FECHA DE EMISIÓN: 08/07/2024

100

MUNICIPIO DE ROLDANILLO VALLE DEL CAUCA

ACTA PARCIAL DE OBRA 1

CONTRATO No.	2026140	PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES	PLAZO ACUMULADO: SEIS (06) MESES
OBJETO:	EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA	FECHA INICIO: 29/05/2026	FECHA DE TERMINACION: 29/11/2026
CONTRATISTA:	INVERSIONES LITRUPE SAS	FECHA DE SUSPENSION: N.A	FECHA DE REINICIO: N.A
SUPERVISOR:	JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE	VALOR INICIAL: $ 487.760.475	VALOR ADICIONES: $ 0
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. N.A		VALOR ACUMULADO: $ 487.760.475	VALOR PRESENTE ACTA: $ 196.173.925

CONDICIONES INCIALES DEL CONTRATO						ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.36	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2	4	93.939,00	375.756,00			0,00	$ -	0,00	$ -
1.37	PAV.CONCR MR=36 MEZCLA IN SITU E=0.15,INC.JUNTA	M3	3,06	630.485,00	1.929.284,00			0,00	$ -	0,00	$ -
1.38	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VIAJE	5	757.370,00	3.786.850,00			3,00	$ 2.272.110	3,00	$ 2.272.110
1.39	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	35	6.095,00	213.325,00			0,00	$ -	0,00	$ -
1.40	RECUBRIMIENTO CONCRETO TUBERIA	M3	2	651.034,00	1.302.068,00			0,00	$ -	0,00	$ -

COSTOS DIRECTOS		**$ 361.304.055**			**$ 146.398.451**	**$ 146.398.451**
ADMINISTRACION	29%	$ 104.778.176			$ 42.455.551	$ 42.455.551
IMPREVISTOS	1%	$ 3.613.041			$ -	$ -
UTILIDAD	5%	$ 18.065.203			$ 7.319.923	$ 7.319.923
TOTAL AIU	**35%**	**$ 126.456.420**			**$ 49.775.474**	**$ 49.775.474**
COSTO UNITARIO		**$ 487.760.475**			**$ 196.173.925**	**$ 196.173.925**

	VALOR	%
VALOR ANTICIPO OTORGADO	195.104.190	40,00%
VALOR AMORTIZACION PRESENTE ACTA	78.469.570	16,09%
VALOR AMORTIZADO ACUMULADO	78.469.570	16,09%
VALOR SALDO POR AMORTIZAR	116.634.620	23,91%

No.	DESCRIPCION	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	AMORTIZACION ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR A PAGAR	SALDO POR EJECUTAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta parcial No. 1		196.173.925	40,22%	78.469.570	116.634.620	117.704.355	291.586.550	24,13%
	TOTAL		196.173.925	40,22%	78.469.570	116.634.620	117.704.355	291.586.550	24,13%

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 196.173.925

El recibo por parte de la Supervision de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.
El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.

Para constancia de lo anterior lo firman:

INVERSIONES LITRUPE SAS
SONIA YISELA MONSALVE
R.L. CONTRATISTA

JORGE IVAN RAMIREZ AGUIRRE
SUPERVISOR

PREACTA

ACTA PARCIAL 1

2026140

EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA

INVERSIONES LITRUPE SAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	LARGO	ANCHO	ALTO	AREA	VOLUMEN	DISTANCIA	CANT		TOTAL
1.1	CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND									
	LOS ALPES								1,00		1,00
	LAS VERANERAS								1,00		1,00
	REY BAJO								-		-
	TOTAL								**2,00**		**2,00**
1.2	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M									
	LOS ALPES		96								96,00
	LAS VERANERAS		84								84,00
	REY BAJO		70								70,00
	TOTAL										**250,00**
1.3	ACARREO PETREOS-VARIOS HASTA 100M	M3									
	LOS ALPES		96	0,80	0,30						23,04
	Retiro tuberia		208	0,30	0,30						18,72
	LAS VERANERAS		84	0,80	0,30						20,16
	Retiro tuberia		60	0,40	0,40						9,60
	REY BAJO		70	0,80	0,48						27,07
	TOTAL										**98,59**
1.4	CORTADORA DE PAVIMENTO DE 4 A 7 CM	M									
	LOS ALPES										-
	LAS VERANERAS										-
	REY BAJO		0						2,00		-
	TOTAL										**-**
1.5	DEMOLICION PAVIMENTO CONCRETO E=15CM	M2									
	LOS ALPES										-
	LAS VERANERAS										-
	REY BAJO		0						0,80		-
	TOTAL										**-**
1.6	CARGUE DE SALDO EN SITIO(MANUAL)	M3									
	LOS ALPES		291,1	0,80	0,15						34,93
	LAS VERANERAS		144	0,80	0,15						17,28
	REY BAJO										-
	TOTAL										**52,21**
1.7	CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A MAQUINA <=10KM.	M3									
	LOS ALPES		304	0,80	0,60						145,92
	LAS VERANERAS		144	0,80	0,60						69,12
	REY BAJO		70	0,80	0,43						24,33
	TOTAL										**239,37**
1.8	EXCAVACION A MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	M3									-
	LOS ALPES		96	0,80	1,50						115,20
	LAS VERANERAS		84	0,80	1,50						100,80
	REY BAJO		70	0,80	1,50						84,00
	TOTAL										**300,00**
1.9	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3									
	LOS ALPES		96	0,80	0,20						15,36
	acometidas		112	0,70	1,00						78,40
	LAS VERANERAS		84	0,80	0,20						13,44
	acometidas		60	0,70	8,00						336,00
	REY BAJO		70	0,80	0,20						11,20
	acometidas		36	0,70	1,00						25,20
	TOTAL										**479,60**
1.10	RECONSTRUCCION LOSA SUPERIOR-TAPA CAMARA	UND							-	-	
	LOS ALPES								1,00		1,00
	LAS VERANERAS										-
	REY BAJO										-
	TOTAL										**1,00**
1.11	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	M									-
	LOS ALPES		96								96,00
	LAS VERANERAS		84								84,00
	REY BAJO										-
	TOTAL										**180,00**
1.12	RETIRO TUBERIA EXISTENTE	M									0
	LOS ALPES		96								96,00
	acometidas		112								112,00
	LAS VERANERAS		84								84,00
	acometidas		60								60,00
	REY BAJO										
	acometidas										
	TOTAL										**352,00**
1.13	PASO PEATONAL PROVISIONAL TABLON A=60CM	UND									
	LOS ALPES										-
	LAS VERANERAS		1								1,00
	REY BAJO		1								1,00
	TOTAL										**2,00**
1.14	PROTECCION DE TALUDES (Entibado)	M2									
	LOS ALPES		20		1,20				2,00		48,00
	LAS VERANERAS		30		1,20				2,00		72,00
	REY BAJO		0,0		1,20				2,00		-
	TOTAL										**120,00**
1.15	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3									
	LOS ALPES		96	0,80	1,00						76,80
	acometidas		112	0,60	0,70						47,04
	LAS VERANERAS		84	0,80	1,00						67,20
	acometidas		60	0,60	0,70						25,20
	REY BAJO		70	0,80	0,99						55,67
	acometidas		36	0,60	0,70						15,12
	TOTAL										**287,03**

PREACTA

ACTA PARCIAL 1

2026140

EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA

INVERSIONES LITRUPE SAS

1.16	RELLENO ROCAMUERTA COMPACT-RANA	M3									
	LOS ALPES		96	0,80	0,15						11,52
	acometidas		208	0,60	0,00						-
	LAS VERANERAS		84	0,80	0,15						10,08
	acometidas		60	0,60	0,00						-
	REY BAJO		70	0,80	0,15						8,40
	acometidas		36	0,60	0,00						-
	TOTAL										**30,00**
1.17	RELLENO TIERRA-NIVELACION	M3									
	LOS ALPES		96	0,80	0,15						11,52
	acometidas		208	0,60	0,15						18,72
	LAS VERANERAS		84	0,80	0,15						10,08
	acometidas		60	0,60	0,17						6,19
	REY BAJO		70	0,80	0,15						8,40
	acometidas		36	0,60	0,15						3,24
	TOTAL										**58,15**
1.18	COLCHON GRAVA-ARENA TUBER. INCLUYE ACARR	M									
	LOS ALPES		96								96,00
	LAS VERANERAS		84								84,00
	REY BAJO		70								70,00
	TOTAL										**250,00**
1.19	DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	M3									
	LOS ALPES		96	0,30	0,30						8,64
	acometidas		112	0,30	0,30						10,08
	LAS VERANERAS		84	0,30	0,21						5,26
	acometidas		60	0,20	0,20						2,40
	REY BAJO		0	0,80	0,20						-
	acometidas										
	TOTAL										**26,38**
1.20	EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND									
	LOS ALPES		2								2,00
	LAS VERANERAS		4								4,00
	REY BAJO		1								1,00
	TOTAL										**7,00**
1.21	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND									
	LOS ALPES		1								1,00
	LAS VERANERAS		1								1,00
	REY BAJO		0								-
	TOTAL										**2,00**
1.22	LIMPIEZA - RESANE CAJA INSPECCION	UND									
	LOS ALPES		1								1,00
	LAS VERANERAS		3								3,00
	REY BAJO		1								1,00
	TOTAL										**5,00**
1.23	TUBERIA PVC NOVAFORT 8"	M									
	LOS ALPES										
	LAS VERANERAS		84								84,00
	REY BAJO		73,6								73,60
	TOTAL										**157,60**
1.24	TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	M									
	LOS ALPES		112								112,00
	LAS VERANERAS		60								60,00
	REY BAJO		36								36,00
	TOTAL										**208,00**
1.26	TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	M									
	LOS ALPES		95								95,00
	LAS VERANERAS		0								-
	REY BAJO		0								-
	TOTAL										**95,00**
1.26	TUBERIA PVC NOVAFORT 12"	M									
	LOS ALPES		0								-
	LAS VERANERAS		0								-
	REY BAJO		0								-
	TOTAL										**-**
1.27	TUBERIA PVC NOVAFORT 20"	M									
	LOS ALPES		0								-
	LAS VERANERAS		0								-
	REY BAJO		0								-
	TOTAL										**-**
1.28	TUBERIA PVC NOVAFORT 16"	M									
	LOS ALPES										
	LAS VERANERAS										
	REY BAJO		0								-
	TOTAL										**-**
1.29	CODO 45° X 160MM. NOVAFORT	UND									
	LOS ALPES		18								18,00
	LAS VERANERAS		6								6,00
	REY BAJO		0								-
	TOTAL										**24,00**
1.30	INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA	UND									
	LOS ALPES		28								28,00
	LAS VERANERAS		10								10,00
	REY BAJO		12								12,00
	TOTAL										**50,00**

PREACTA

ACTA PARCIAL 1

2026140

EJECUCION DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA

INVERSIONES LITRUPE SAS

1.31	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 8"	UND									
	LOS ALPES		0								-
	LAS VERANERAS		10								10,00
	REY BAJO		12								12,00
	TOTAL										**22,00**
1.32	SILLA YEE NOVAFORT DIAMETRO DE 6" A 10"	UND									0
	LOS ALPES		28								28,00
	LAS VERANERAS										-
	REY BAJO										-
	TOTAL										**28,00**
1.33	SILLA YEE NOVAF 6"X12"	UND									
	LOS ALPES		12								12,00
	LAS VERANERAS										-
	REY BAJO										-
	TOTAL										**12,00**
1.34	ACARREO MATERIALES DESDE O HACIA LA OBRA <= 10 KM.	M3									
	LOS ALPES		6								6,00
	LAS VERANERAS										-
	REY BAJO										-
	TOTAL										**6,00**
1.35	ACARREO MATERIALES PETREOS	M3 - KM									
	LOS ALPES		225,27								225,27
	LAS VERANERAS		50								50,00
	REY BAJO		20,00								20,00
	TOTAL										**295,27**
1.36	ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI	M2									
	LOS ALPES		0								-
	LAS VERANERAS		0								-
	REY BAJO										-
	TOTAL										**-**
1.37	PAV.CONCR MR=36 MEZCLA IN SITU E=0.15,INC.JUNTA	M3									0
	LOS ALPES										-
	LAS VERANERAS										-
	REY BAJO		0								-
	TOTAL										**-**
1.38	TRANSPORTE CAMION URBANO 1.0-5.0 TON	VIAJE									
	LOS ALPES		1								1,00
	LAS VERANERAS		1								1,00
	REY BAJO		1								1,00
	TOTAL										**3,00**
1.39	ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG									
	LOS ALPES										-
	LAS VERANERAS										-
	REY BAJO								-		-
	TOTAL										**-**
1.40	RECUBRIMIENTO CONCRETO TUBERIA	M3									
	LOS ALPES										-
	LAS VERANERAS										-
	REY BAJO						-				-
	TOTAL										**-**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901161324	1	INVERSIONES LITRUPE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACIÓN	CRA 9 9 66	ROLDANILLO-VALLE	3163689327	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-05	282835305	9504373274	E	2026/05/08	2026/05/05	BANCOLOMBIA	0	$4,750,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: ADMINISTRACIÓN (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: ADMINISTRACIÓN (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: ROLDANILLO Depto: VALLE (1 Afiliados)						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1113781547	CASTRO GERMAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0

EMPLEADO						PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSTRUCCIÓN (9 Afiliados)						$13,948,877	$2,232,300			$13,948,877	$558,500			$13,948,877	$558,500			$13,948,877	$971,200		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSTRUCCIÓN (9 Afiliados)						$13,948,877	$2,232,300			$13,948,877	$558,500			$13,948,877	$558,500			$13,948,877	$971,200		$0	$0
Ciudad: ROLDANILLO Depto: VALLE (9 Afiliados)						$13,948,877	$2,232,300			$13,948,877	$558,500			$13,948,877	$558,500			$13,948,877	$971,200		$0	$0
2	CC	16554357	BOCANEGRA JOHN	230301	13	$758,726	$121,400	EPS018	13	$758,726	$30,400	CCF57	13	$758,726	$30,400	14-11	13	$758,726	$52,900	13	$0	$0
3	PT	1223675	CASTILLO EDGAR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1113793481	DAZA SEBASTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1007820684	GIL DIEGO	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	16458319	GIRALDO WILLIAM	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1114240164	LOAIZA JHOJAN	230301	16	$933,816	$149,500	ESSC24	16	$933,816	$37,400	CCF57	16	$933,816	$37,400	14-11	16	$933,816	$65,000	16	$0	$0
8	CC	1094932958	PEREZ WILSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1113792235	ROSSO YONNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	1113792306	SUAZA JHON	230201	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
Total			**Afiliados(10)**			$15,699,782	$2,512,500			$15,699,782	$628,600			$15,699,782	$628,600			$15,699,782	$980,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				10	$2,512,500	$0	$0	$2,512,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,952,100	$0	$0	$1,952,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$980,400	$0	$0	$980,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	10	$980,400	$0	$0	$980,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	$628,600	$0	$0	$628,600
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	10	$628,600	$0	$0	$628,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				10	$628,600	$0	$0	$628,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$317,800	$0	$0	$317,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$140,200	$0	$0	$140,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$30,400	$0	$0	$30,400
TOTAL				**10**	**$4,750,100**	**$0**	**$0**	**$4,750,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901161324	1	INVERSIONES LITRUPE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACIÓN	CRA 9 9 66	ROLDANILLO-VALLE	3163689327	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	378715362	9506177430	E	2026/06/05	2026/06/10	BANCOLOMBIA	5	$4,210,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONSTRUCCIÓN (11 Afiliados)						$13,540,334	$2,167,000			$13,540,334	$542,200			$13,540,334	$542,200			$13,540,334	$942,900		$0	$0
Centro de Trabajo: CONSTRUCCIÓN (11 Afiliados)						$13,540,334	$2,167,000			$13,540,334	$542,200			$13,540,334	$542,200			$13,540,334	$942,900		$0	$0
Ciudad: ROLDANILLO Depto: VALLE (11 Afiliados)						$13,540,334	$2,167,000			$13,540,334	$542,200			$13,540,334	$542,200			$13,540,334	$942,900		$0	$0
1	CC	1007502284	CASTILLO DIEGO	230301	18	$1,050,543	$168,100	ESSC24	18	$1,050,543	$42,100	CCF57	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	$73,200	18	$0	$0
2	PT	1223675	CASTILLO EDGAR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1113781547	CASTRO GERMAN	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
4	CC	1006438976	CHAVERRA OSCAR	230301	5	$291,818	$46,700	EPS037	5	$291,818	$11,700	CCF57	5	$291,818	$11,700	14-11	5	$291,818	$20,400	5	$0	$0
5	CC	1113793481	DAZA SEBASTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1007820684	GIL DIEGO	230301	8	$466,908	$74,800	ESSC24	8	$466,908	$18,700	CCF57	8	$466,908	$18,700	14-11	8	$466,908	$32,500	8	$0	$0
7	CC	16458319	GIRALDO WILLIAM	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	1094932958	PEREZ WILSON	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1113792235	ROSSO YONNY	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	1112932807	SERNA DIEGO	230301	25	$1,459,088	$233,500	ESSC18	25	$1,459,088	$58,400	CCF57	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0
11	CC	1113792306	SUAZA JHON	230201	25	$1,459,088	$233,500	ESSC24	25	$1,459,088	$58,400	CCF57	25	$1,459,088	$58,400	14-11	25	$1,459,088	$101,600	25	$0	$0
Total			**Afiliados(11)**			$13,540,334	$2,167,000			$13,540,334	$542,200			$13,540,334	$542,200			$13,540,334	$942,900		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,167,000	$8,100	$0	$2,175,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$280,200	$1,100	$0	$281,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	9	$1,653,300	$6,100	$0	$1,659,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$233,500	$900	$0	$234,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$942,900	$3,500	$0	$946,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$942,900	$3,500	$0	$946,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$542,200	$2,000	$0	$544,200
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	11	$542,200	$2,000	$0	$544,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	$542,200	$2,200	$0	$544,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	$191,700	$800	$0	$192,500
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	$128,500	$500	$0	$129,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$151,900	$600	$0	$152,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$300	$0	$70,400
TOTAL				**11**	**$4,194,300**	**$15,800**	**$0**	**$4,210,100**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901161324	1	INVERSIONES LITRUPE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACIÓN	CRA 9 9 66	ROLDANILLO-VALLE	3163689327	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-06	2026-07	456971035	9507617439	E	2026/07/07	2026/07/06	BANCOLOMBIA	0	$7,012,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BIBLIOTECA (18 Afiliados)					$22,701,593	$3,633,400			$22,701,593	$909,100			$22,701,593	$902,000			$22,701,593	$1,568,400		$0	$0
Centro de Trabajo: BIBLIOTECA (18 Afiliados)					$22,701,593	$3,633,400			$22,701,593	$909,100			$22,701,593	$902,000			$22,701,593	$1,568,400		$0	$0
Ciudad: ROLDANILLO Depto: VALLE (18 Afiliados)					$22,701,593	$3,633,400			$22,701,593	$909,100			$22,701,593	$902,000			$22,701,593	$1,568,400		$0	$0
1	CC	1092912793	AGUDELO JOHN	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS018	22	$1,283,997	$51,400	CCF57	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0
2	CC	16550188	ALMANZA JOSE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	1116444553	ARIZA JHOAN	230301	9	$525,272	$84,100	ESSC18	9	$525,272	$21,100	CCF57	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0
4	CC	1113791736	CARMONA JOHAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1006439034	CASTAÑO ANA	25-14	27	$1,575,815	$252,200	EPS037	27	$1,575,815	$63,100	CCF57	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
6	CC	1006439034	CASTAÑO ANA	25-14	3	$175,091	$28,100	EPS037	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
7	CC	16551626	CASTRILLON NORBEY	231001	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$32,700	CCF57	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0
8	CC	1007689947	CORREA CRISTIAN	230301	6	$350,181	$56,100	EPS037	6	$350,181	$14,100	CCF57	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$24,400	6	$0	$0
9	CC	1006317486	DAVALOS KEVIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	PT	5324138	GOMEZ ALEXIS	25-14	6	$350,181	$56,100	ESSC24	6	$350,181	$14,100	CCF57	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$24,400	6	$0	$0
11	CC	1007889702	HERNANDEZ CARLOS	230301	6	$350,181	$56,100	ESSC24	6	$350,181	$14,100	CCF57	6	$350,181	$14,100	14-11	6	$350,181	$24,400	6	$0	$0
12	CC	1113781016	JIMENEZ JUAN	25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS042	22	$1,283,997	$51,400	CCF57	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0
13	CC	16549908	PEREA FREDDY	25-14	14	$817,089	$130,800	ESSC24	14	$817,089	$32,700	CCF57	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0
14	CC	1007753448	PEREA JUAN	230301	14	$817,089	$130,800	EPS037	14	$817,089	$32,700	CCF57	14	$817,089	$32,700	14-11	14	$817,089	$56,900	14	$0	$0
15	CC	1117017375	PINILLA DANIEL	25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS018	22	$1,283,997	$51,400	CCF57	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0
16	CC	16551417	SANCHEZ DUBERNEY	25-14	22	$1,283,997	$205,500	EPS037	22	$1,283,997	$51,400	CCF57	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0
17	CC	16687832	VANEGAS LIBARDO	230301	22	$1,283,997	$205,500	EPS018	22	$1,283,997	$51,400	CCF57	22	$1,283,997	$51,400	14-11	22	$1,283,997	$89,400	22	$0	$0
18	CC	1113790072	VINASCO JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
19	CC	1113789474	ZAPATA SEBASTIAN	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF57	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
Total		**Afiliados(18)**			$22,701,593	$3,633,400			$22,701,593	$909,100			$22,701,593	$902,000			$22,701,593	$1,568,400		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				18	$3,633,400	$0	$0	$3,633,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$130,800	$0	$0	$130,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	7	$1,363,900	$0	$0	$1,363,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$2,138,700	$0	$0	$2,138,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$1,568,400	$0	$0	$1,568,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	18	$1,568,400	$0	$0	$1,568,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$902,000	$0	$0	$902,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	18	$902,000	$0	$0	$902,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				18	$909,100	$0	$0	$909,100
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	$51,400	$0	$0	$51,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$131,000	$0	$0	$131,000
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$21,100	$0	$0	$21,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$140,000	$0	$0	$140,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	$271,200	$0	$0	$271,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	$154,200	$0	$0	$154,200
TOTAL				**18**	**$7,012,900**	**$0**	**$0**	**$7,012,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901161324	1	INVERSIONES LITRUPE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACIÓN	CRA 9 9 66	ROLDANILLO-VALLE	3163689327	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-07	2026-08	579625620	9509702762	E	2026/08/10	2026/08/19	BANCOLOMBIA	9	$14,036,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BIBLIOTECA (28 Afiliados)					$44,296,090	$7,088,900			$45,988,632	$1,841,300			$45,988,632	$1,829,500			$45,988,632	$3,181,700		$0	$0
Centro de Trabajo: BIBLIOTECA (28 Afiliados)					$44,296,090	$7,088,900			$45,988,632	$1,841,300			$45,988,632	$1,829,500			$45,988,632	$3,181,700		$0	$0
Ciudad: ROLDANILLO Depto: VALLE (28 Afiliados)					$44,296,090	$7,088,900			$45,988,632	$1,841,300			$45,988,632	$1,829,500			$45,988,632	$3,181,700		$0	$0
1	CC	1092912793	AGUDELO JOHN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1070918878	ALDANA JHON	230301	17	$992,180	$158,800	EPSC34	17	$992,180	$39,700	CCF57	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
3	CC	16550188	ALMANZA JOSE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	PT	2246601	APONTE CARLOS	230301	9	$525,272	$84,100	ESSC24	9	$525,272	$21,100	CCF57	9	$525,272	$21,100	14-11	9	$525,272	$36,600	9	$0	$0
5	CC	1116444553	ARIZA JHOAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1113791736	CARMONA JOHAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	1006439034	CASTAÑO ANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	16551626	CASTRILLON NORBEY	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1098677205	CONTRERAS WILDER	230301	17	$992,180	$158,800	EPS037	17	$992,180	$39,700	CCF57	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
10	CC	1007689947	CORREA CRISTIAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
11	CC	1006317486	DAVALOS KEVIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1114122468	GARCIA LUIS	230201	24	$1,400,724	$224,200	ESSC24	24	$1,400,724	$56,100	CCF57	24	$1,400,724	$56,100	14-11	24	$1,400,724	$97,500	24	$0	$0
13	PT	5324138	GOMEZ ALEXIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	1004537236	GRUESO EDWIN	230201	29	$1,692,542	$270,900	EPS037	29	$1,692,542	$67,800	CCF57	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
15	CC	1010157703	GRUESO LEONARDO	230201	29	$1,692,542	$270,900	EPS037	29	$1,692,542	$67,800	CCF57	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
16	CC	1113792012	HENAO JORGE	230301	15	$875,453	$140,100	ESSC24	15	$875,453	$35,100	CCF57	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
17	CC	1113792012	HENAO JORGE	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC24	2	$116,727	$4,700	CCF57	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
18	CC	1007889702	HERNANDEZ CARLOS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
19	CC	1113781016	JIMENEZ JUAN	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
20	CC	16549908	PEREA FREDDY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
21	CC	1007753448	PEREA JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
22	CC	1117017375	PINILLA DANIEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
23	CC	1112043367	RODRIGUEZ EMANUEL	230301	17	$992,180	$158,800	ESSC24	17	$992,180	$39,700	CCF57	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
24	CC	16551417	SANCHEZ DUBERNEY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
25	CC	6187833	SANCHEZ HECTOR	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS042	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
26	CC	16547372	VALENCIA PEDRO		0	$0	$0	EPS018	26	$1,517,451	$60,700	CCF57	26	$1,517,451	$60,700	14-11	26	$1,517,451	$105,700	26	$0	$0
27	CC	16547372	VALENCIA PEDRO		0	$0	$0	EPS018	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
28	CC	16687832	VANEGAS LIBARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
29	CC	1113790072	VINASCO JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
30	CC	1113789474	ZAPATA SEBASTIAN	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF57	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
Total		**Afiliados(28)**				$44,296,090	$7,088,900			$45,988,632	$1,841,300			$45,988,632	$1,829,500			$45,988,632	$3,181,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				27	$7,088,900	$48,500	$0	$7,137,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$2,000	$0	$282,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,241,600	$15,300	$0	$2,256,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	15	$3,801,100	$25,900	$0	$3,827,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$766,000	$5,300	$0	$771,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$3,181,700	$21,700	$0	$3,203,400
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	28	$3,181,700	$21,700	$0	$3,203,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$1,829,500	$12,500	$0	$1,842,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	28	$1,829,500	$12,500	$0	$1,842,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				28	$1,841,300	$12,800	$0	$1,854,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$39,700	$300	$0	$40,000
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$140,200	$1,000	$0	$141,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	8	$437,100	$3,000	$0	$440,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$70,100	$500	$0	$70,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$140,000	$1,000	$0	$141,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$500	$0	$70,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9	$595,900	$4,100	$0	$600,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$500	$0	$70,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$278,100	$1,900	$0	$280,000
TOTAL				**28**	**$13,941,400**	**$95,500**	**$0**	**$14,036,900**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901161324	1	INVERSIONES LITRUPE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACIÓN	CRA 9 9 66	ROLDANILLO-VALLE	3163689327	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-09	2026-10	718076848	9512455473	E	2026/10/07	2026/10/06	BANCOLOMBIA	0	$10,048,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BIBLIOTECA (23 Afiliados)						$32,683,568	$5,231,100			$34,434,474	$1,379,600			$34,434,474	$1,255,100			$34,434,474	$2,182,600		$0	$0
Centro de Trabajo: BIBLIOTECA (23 Afiliados)						$32,683,568	$5,231,100			$34,434,474	$1,379,600			$34,434,474	$1,255,100			$34,434,474	$2,182,600		$0	$0
Ciudad: ROLDANILLO Depto: VALLE (23 Afiliados)						$32,683,568	$5,231,100			$34,434,474	$1,379,600			$34,434,474	$1,255,100			$34,434,474	$2,182,600		$0	$0
1	CC	1092912793	AGUDELO JOHN	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS018	28	$1,634,178	$65,400	CCF57	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
2	CC	1092912793	AGUDELO JOHN	230301	2	$116,727	$18,700	EPS018	2	$116,727	$4,700	CCF57	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
3	CC	1070918878	ALDANA JHON	230301	18	$1,050,543	$168,100	EPSC34	18	$1,050,543	$42,100	CCF57	18	$1,050,543	$42,100	14-11	18	$1,050,543	$73,200	18	$0	$0
4	CC	16550188	ALMANZA JOSE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1116444553	ARIZA JHOAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1113791736	CARMONA JOHAN	230301	28	$1,634,178	$261,500	ESSC24	28	$1,634,178	$65,400	CCF57	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
7	CC	1113791736	CARMONA JOHAN	230301	2	$116,727	$18,700	ESSC24	2	$116,727	$4,700	CCF57	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
8	CC	1006439034	CASTAÑO ANA	25-14	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF57	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
9	CC	1006439034	CASTAÑO ANA	25-14	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF57	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
10	CC	1098677205	CONTRERAS WILDER	230301	29	$1,692,542	$270,900	EPS037	29	$1,692,542	$67,800	CCF57	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
11	CC	1098677205	CONTRERAS WILDER	230301	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
12	CC	1006317486	DAVALOS KEVIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	PT	5324138	GOMEZ ALEXIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	1004537236	GRUESO EDWIN	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
15	CC	1010157703	GRUESO LEONARDO	230201	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
16	CC	1113792012	HENAO JORGE	230301	27	$1,575,815	$252,200	ESSC24	27	$1,575,815	$63,100	CCF57	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
17	CC	1113792012	HENAO JORGE	230301	3	$175,091	$28,100	ESSC24	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
18	CC	1007889702	HERNANDEZ CARLOS	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
19	CC	1113781016	JIMENEZ JUAN	25-14	17	$992,180	$158,800	ESSC24	17	$992,180	$39,700	CCF57	17	$992,180	$0	14-11	17	$992,180	$0	17	$0	$0
20	CC	1113781016	JIMENEZ JUAN	25-14	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$2,400	14-11	1	$58,364	$4,100	1	$0	$0
21	CC	1113781016	JIMENEZ JUAN	25-14	12	$700,362	$112,100	ESSC24	12	$700,362	$28,100	CCF57	12	$700,362	$0	14-11	12	$700,362	$0	12	$0	$0
22	CC	1113778689	MARIN SANTIAGO	25-14	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF57	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
23	CC	16549908	PEREA FREDDY	25-14	23	$1,342,361	$214,800	ESSC24	23	$1,342,361	$53,700	CCF57	23	$1,342,361	$53,700	14-11	23	$1,342,361	$93,500	23	$0	$0
24	CC	16549908	PEREA FREDDY	25-14	3	$175,091	$28,100	ESSC24	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
25	CC	16549908	PEREA FREDDY	25-14	4	$233,454	$37,400	ESSC24	4	$233,454	$9,400	CCF57	4	$233,454	$0	14-11	4	$233,454	$0	4	$0	$0
26	CC	1007753448	PEREA JUAN	230301	28	$1,634,178	$261,500	EPS037	28	$1,634,178	$65,400	CCF57	28	$1,634,178	$65,400	14-11	28	$1,634,178	$113,800	28	$0	$0
27	CC	1007753448	PEREA JUAN	230301	2	$116,727	$18,700	EPS037	2	$116,727	$4,700	CCF57	2	$116,727	$0	14-11	2	$116,727	$0	2	$0	$0
28	CC	1117017375	PINILLA DANIEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
29	CC	1112043367	RODRIGUEZ EMANUEL	230301	29	$1,692,542	$270,900	ESSC24	29	$1,692,542	$67,800	CCF57	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
30	CC	1112043367	RODRIGUEZ EMANUEL	230301	1	$58,364	$9,400	ESSC24	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
31	CC	16551417	SANCHEZ DUBERNEY	25-14	29	$1,692,542	$270,900	EPS037	29	$1,692,542	$67,800	CCF57	29	$1,692,542	$67,800	14-11	29	$1,692,542	$117,900	29	$0	$0
32	CC	16551417	SANCHEZ DUBERNEY	25-14	1	$58,364	$9,400	EPS037	1	$58,364	$2,400	CCF57	1	$58,364	$0	14-11	1	$58,364	$0	1	$0	$0
33	CC	16547372	VALENCIA PEDRO		0	$0	$0	EPS018	27	$1,575,815	$63,100	CCF57	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
34	CC	16547372	VALENCIA PEDRO		0	$0	$0	EPS018	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
35	CC	16687832	VANEGAS LIBARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
36	CC	1113790072	VINASCO JUAN	230301	15	$875,453	$140,100	EPS037	15	$875,453	$35,100	CCF57	15	$875,453	$35,100	14-11	15	$875,453	$61,000	15	$0	$0
Total			**Afiliados(23)**			$32,683,568	$5,231,100			$34,434,474	$1,379,600			$34,434,474	$1,255,100			$34,434,474	$2,182,600		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$5,231,100	$0	$0	$5,231,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,101,800	$0	$0	$2,101,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$3,110,500	$0	$0	$3,110,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$18,800	$0	$0	$18,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,182,600	$0	$0	$2,182,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$2,182,600	$0	$0	$2,182,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,255,100	$0	$0	$1,255,100
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	23	$1,255,100	$0	$0	$1,255,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				23	$1,379,600	$0	$0	$1,379,600
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$42,100	$0	$0	$42,100
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$491,100	$0	$0	$491,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$70,100	$0	$0	$70,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$355,600	$0	$0	$355,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$0	$0	$70,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$280,500	$0	$0	$280,500
TOTAL				23	$10,048,400	$0	$0	$10,048,400

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901161324	1	INVERSIONES LITRUPE S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACIÓN	CRA 9 9 66	ROLDANILLO-VALLE	3163689327	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-09	637436621	9510930291	E	2026/09/07	2026/09/08	BANCOLOMBIA	1	$13,799,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: BIBLIOTECA (26 Afiliados)					$44,004,272	$7,042,100			$45,755,177	$1,831,800			$45,755,177	$1,794,300			$45,755,177	$3,120,500		$0	$0
Centro de Trabajo: BIBLIOTECA (26 Afiliados)					$44,004,272	$7,042,100			$45,755,177	$1,831,800			$45,755,177	$1,794,300			$45,755,177	$3,120,500		$0	$0
Ciudad: ROLDANILLO Depto: VALLE (26 Afiliados)					$44,004,272	$7,042,100			$45,755,177	$1,831,800			$45,755,177	$1,794,300			$45,755,177	$3,120,500		$0	$0
1	CC	1092912793	AGUDELO JOHN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
2	CC	1070918878	ALDANA JHON	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
3	CC	16550188	ALMANZA JOSE	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS017	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
4	CC	1116444553	ARIZA JHOAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC18	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
5	CC	1113791736	CARMONA JOHAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
6	CC	1006439034	CASTAÑO ANA	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
7	CC	16551626	CASTRILLON NORBEY	231001	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
8	CC	1098677205	CONTRERAS WILDER	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
9	CC	1006317486	DAVALOS KEVIN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS041	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
10	CC	1114122468	GARCIA LUIS	230201	17	$992,180	$158,800	ESSC24	17	$992,180	$39,700	CCF57	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
11	PT	5324138	GOMEZ ALEXIS	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
12	CC	1004537236	GRUESO EDWIN	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
13	CC	1010157703	GRUESO LEONARDO	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
14	CC	1113792012	HENAO JORGE	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
15	CC	1007889702	HERNANDEZ CARLOS	230301	27	$1,575,815	$252,200	ESSC24	27	$1,575,815	$63,100	CCF57	27	$1,575,815	$63,100	14-11	27	$1,575,815	$109,700	27	$0	$0
16	CC	1007889702	HERNANDEZ CARLOS	230301	3	$175,091	$28,100	ESSC24	3	$175,091	$7,100	CCF57	3	$175,091	$0	14-11	3	$175,091	$0	3	$0	$0
17	CC	1113781016	JIMENEZ JUAN	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS042	17	$992,180	$39,700	CCF57	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
18	CC	1113781016	JIMENEZ JUAN	25-14	13	$758,726	$121,400	EPS042	13	$758,726	$30,400	CCF57	13	$758,726	$0	14-11	13	$758,726	$0	13	$0	$0
19	CC	16549908	PEREA FREDDY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
20	CC	1007753448	PEREA JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
21	CC	1117017375	PINILLA DANIEL	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
22	CC	1112043367	RODRIGUEZ EMANUEL	230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC24	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
23	CC	16551417	SANCHEZ DUBERNEY	25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
24	CC	6187833	SANCHEZ HECTOR	25-14	17	$992,180	$158,800	EPS042	17	$992,180	$39,700	CCF57	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	$69,100	17	$0	$0
25	CC	16547372	VALENCIA PEDRO		0	$0	$0	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
26	CC	16687832	VANEGAS LIBARDO	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS018	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
27	CC	1113790072	VINASCO JUAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$70,100	CCF57	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	$121,900	30	$0	$0
28	CC	1113789474	ZAPATA SEBASTIAN	230301	30	$3,500,000	$560,000	EPS010	30	$3,500,000	$140,000	CCF57	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(26)**					$44,004,272	$7,042,100			$45,755,177	$1,831,800			$45,755,177	$1,794,300			$45,755,177	$3,120,500		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$7,042,100	$5,500	$0	$7,047,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$280,200	$300	$0	$280,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$2,120,200	$1,600	$0	$2,121,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,922,500	$3,000	$0	$3,925,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$719,200	$600	$0	$719,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$3,120,500	$2,400	$0	$3,122,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	26	$3,120,500	$2,400	$0	$3,122,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				26	$1,794,300	$1,400	$0	$1,795,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	26	$1,794,300	$1,400	$0	$1,795,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				26	$1,831,800	$1,900	$0	$1,833,700
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$100	$0	$70,200
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	2	$109,800	$100	$0	$109,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	7	$460,400	$400	$0	$460,800
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	1	$70,100	$100	$0	$70,200
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$140,000	$200	$0	$140,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$70,100	$100	$0	$70,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	8	$560,800	$500	$0	$561,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$70,100	$100	$0	$70,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	4	$280,400	$300	$0	$280,700
TOTAL				**26**	**$13,788,700**	**$11,200**	**$0**	**$13,799,900**
