GOBIERNO DE CALDAS	/INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION CONTRATO 01 PARCIAL	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO	15072026-1134	RADICADO JURID. NRO:		15072026-1134	
OBJETO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 2 SUBREGION CENTRO SUR				
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JOSÉ 2026				
NOMBRE DEL INTERVENTOR	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS				
NOMBRE DEL SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025			PRORROGA 01 PLAZO	N/A
VALOR DEL CONTRATO (V. INICIAL+ADICIONAL) INCLUIDO A.U (34%)	$ 468.918.975	PORCENTAJE AU %	32% (A: 26%, U: 5%		
VALOR TOTAL	$ 468.918.975			PRORROGA 02 PLAZO	N/A

OBRA CONTRATADA				DIFER.	OBRA EJECUTADA		
DESCRIPCION	CANT.	VALOR	PESO %	%	CANT.	VALOR	PESO %
LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	100.000,00	354.700.000,00	75,64%	-9,83%	87.000,00	308.589.000	65,81%
MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	160,00	4.196.478,00	0,89%	-0,89%	0,00	0	0,00%
SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO _____ DIIMENSIONES _____ CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO_____ (Analizado para señal tipo sr, sp y/o si, dimension 75x75 cm en lámina galvanizada con lamina retrorreflectiva tipo IV)	20,00	23.406.120,00	4,99%	-4,99%	0,00	0	0,00%
TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO TIPO _____ (Analizado con espigo tipo A retrorreflectiva bidireccional de un (1) solo color)	20,00	4.730.400,00	1,01%	-1,01%	0,00	0	0,00%
DEFENSA METÁLICA	220,00	45.806.000,00	9,77%	-9,77%	0,00	0	0,00%
MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Suministro e instalación)	40,00	28.274.260,00	6,03%	-6,03%	0,00	0	0,00%
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.00 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	20,00	7.805.717,00	1,66%	-1,66%	0,00	0	0,00%
VALOR TOTAL INCLUIDO AU DEL 34,00% (A: 29,00% - U: 5%)	**468.918.975,00**	**100,00%**				**308.589.000,00**	**65,81%**

INFORMACIÓN DE CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JOSE
VALOR DEL CONTRATO	$ 468.918.975
VALOR ADICIONAL	$ 0
VALOR TOTAL	$ 468.918.975
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESESDESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO HASTA 31/12/2025
FECHA INICIACION	JULIO 29 DE 2026
FECHA TERMINACION	NOVIEMBRE 28 DE 2026

INTERVENTORIA/SUPERVISION
LA INTERVENTORIA EXTERNA ES REALIZADA POR CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS LA SUPERVISION ESTA A CARGO DEL INGENIERO JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT, PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CANTIDAD DE LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO EJECUTADAS POR MUNICIPIO : MANIZALES: 8,000,00 ML, NEIRA: 18,000,00 ML, CHICNHINA: 45,000,00 ML Y PALESTINA: 16,000,00

ACTIVIDADES REALIZADAS

DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HA REALIZADO LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO SOBRE LAS VIAS VIAS: MANIZALES-QUIEBRA DE VELEZ (MUNICIPIO MANIZALES), MANIZALES-NEIRA (MUNICIPIO MANIZALES): , CHICNHINA-PALESTINA (MUNICIPIO CHINCHINA), CHINCHINA-VILLAMARIA SECTOR EL DESTIERRO, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CHINCHINA-EL TREBOL-RIO SAN FRACISCO (MUNICIPIO CHINCHINA) SANTAGUEDA-ARAUCA (MUNICIPIO PALESTINA), PALESTINA-CURAZAO (MUNICIPIO PALESTINA)., CON UNA INVERSION DE $ 308.589.000.00 EQUIVALENTE AL 65,81% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AU DEL 32% (ADMINISTRACION: 26% - UTILIDAD: 6,00%.

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS

INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	INFORME DE INTERVENTORIA/SUPERVISION 01 PARCIAL AL CONTRATO DE OBRA 15072026-1134	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de Modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA
SEPTIEMBRE 21 DE 2026

ACTA NRO. 01 PARCIAL — **INFORME AMBIENTAL DE INTERVENTORIA**

CONTRATO	15072026-1134	**CONSULTORIA**		**OBRA:**	X

Nro. CONTRATO RADICADO:	15072026-1134
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 2. SUBREGION CENTRO SUR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN JOSE
INTERVENTOR:	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
SUPERVISOR	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT

PREGUNTAS	SI	NO	N/A	OBSERVACIONES
El personal que labora en la obra utiliza uniformes y equipos de protección personal			X	
Los vehículos que transportan los sobrantes y escombros de construcción cuentan con el distintivo en las puertas laterales donde se indica el nombre de contratista, la entidad contratante y la obra para la cual labora			X	
La vía en el sector donde se realizan las obras se encuentran libres de escombros			X	
Se acumulan escombros, sobrantes de excavación y materiales en zonas verdes o sobre las cunetas.			X	
Los escombros de construcción permanecen en la obra por más de 24 horas			X	
Se cubren los materiales almacenados temporalmente con un material impermeable			X	
Existe un cerramiento con malla fina sintética o doble cinta reflectiva para los materiales almacenados temporalmente en la obra			X	
Se lleva a cabo una recolección periódica de basuras y desperdicios			X	
Existe un cerramiento del frente de la obra con malla fina sintética o cinta reflectiva			X	
La obra cuenta con valla publicitaria			X	
Se instalaron vallas informativas al transito vehicular 100 metros antes de la llegada a la obra			X	
La disolución de la liga asfáltica se realiza con calentadores portátiles que utilicen gas como combustible o por el contrario debidamente adecuados con resistencias eléctricas			X	
En la obra se realizan quemas a cielo abierto			X	
Se mezclan concretos en plataformas metálicas o geotextil			X	
Las baterías de las máquinas son reemplazadas en un taller autorizado			X	
El cambio de aceites se realiza en la obra			X	
Se utilizan compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de la obra			X	
El establecimiento de la maquinaria o el almacenamiento de combustibles se realizó en zonas públicas			X	
Las labores de reparación y mantenimiento de maquinaria se realiza en centros autorizados			X	
Se usan baños portátiles			X	
Se entrega volantes informativos para la comunidad			X	
Se tiene el manual de mínimas implicaciones ambientales en la obra			X	
Se afectan corredores de fauna nativa			X	
Se afecta el hábitat de fauna y flora propia de la región			X	
Se hace control de emisión de gases a equipos mecánicos utilizados en obra			X	
Se hace control a la posible quema de desechos de materiales provenientes de la obra			X	
Se hace control en vaciados de concreto (esparcimiento de partículas de cemento)			X	
Se hace control de desechos tóxicos que puedan generar contaminación del aire			X	
Se hace control de desechos orgánicos que puedan producir CO2 por descomposición			X	
se requiere concesión de aguas para aprovechamiento en la obra			X	
Se alteran los valores escénicos de la unidad paisajística de la región			X	

OBSERVACIONES:

CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
INTERVENTOR EXTERNO

GOBIERNO DE CALDAS	**INFORME DE INTERVENTORÍA CONTRATOS 01 PARCIAL AL CONTRATO 15072026-1134**	Código: FO-FT-02-005 Versión: 07 Fecha de modificación: 19/01/2016

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FECHA:	**SEPTIEMBRE 21 DE 2026**

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES: DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE HA REALIZADO LA LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO SOBRE LAS VIAS VIAS: MANIZALES-QUIEBRA DE VELEZ (MUNICIPIO MANIZALES), MANIZALES-NEIRA (MUNICIPIO MANIZALES), CHICNHINA-PALESTINA (MUNICIPIO CHINCHINA), CHINCHINA-VILLAMARIA SECTOR EL DESTIERRO, MUNICIPIO DE CHINCHINA, CHINCHINA-EL TREBOL-RIO SAN FRACISCO (MUNICIPIO CHINCHINA) SANTAGUEDA-ARAUCA (MUNICIPIO PALESTINA), PALESTINA-CURAZAO (MUNICIPIO PALESTINA)., CON UNA INVERSION DE $ 308.589.000,00 EQUIVALENTE AL 65,81% DEL VALOR DEL CONTRATO INCLUIDO AU DEL 32% (ADMINISTRACION: 26% - UTILIDAD: 6,00%.

CONTRATO	15072026-1134	**CONSULTORIA**		**OBRA**	15072026-1134

OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 2. SUBREGION CENTRO SUR
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN JOSE 2026
INTERVERNTOR EXTERNO	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS
SUPERVISOR (A)	JUAN SEBASTIAN MEZA BETANCURT

FIANZAS (POLIZAS) NRO. 55-40-101045126	**$ ASEGURADO**	**VIGENCIA**	**ASEGURADORA**
PENAL PECUNIARIA (RESPONSABILIDAD CIVIL)	$ 350.181.000,00	29/07/2026 AL 02/12/2026	SEGUROS DEL ESTADO
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES	$ 93.783.795,00	29/07/2026 AL 2903/2027	SEGUROS DEL ESTADO
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	$ 140.675.692,50	CINCO AÑOS	SEGUROS DEL ESTADO
ANTICIPO Y CORRECTA INVERSION DEL MISMO	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES	$ 93.783.795,00	29/07/2026 AL 29/11/2029	SEGUROS DEL ESTADO

NOTA:

RECIBO DE PAGO ESTAMPILLAS	**NRO.**	DESCONTADO DE CADA ACTA	**PLANILLAS SALUD**	X
RECIBO PAGO CAJA, SENA, ICBF			**PAZ Y SALVO MINTRAB.**	
RECIBO PAGO SENA (FIC)			**INF. SUPERVISION**	X

NOTA: LOS PAZ Y SALVOS DE SENA, CONFAMILIARES, ICBF Y MINISTERIO DE TRABAJO SE PRESENTARAN A LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE IGUAL MANERA LA POLIZA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD CON QUE SE AMPARO EL CONTRATO DEBIDAMENTE ACTUALIZADA

ESTADO DEL TIEMPO			
FECHA	**MES**	**ESTADO**	**OBSERVACIONES**
29/07/2026 AL 31/07/2026	JULIO	SECO	DIAS SOLEADOS
01/07/2026 AL 31/08/2026	AGSOTO	SECO	DIAS SOLEADOS
01/09/2026 AL 21/09/2026	SEPTIEMBRE	SECO	DIAS SOLEADOS

	INTERVENTOR/SUPERVISOR
	CINTE S.A.S INGENIERIA DE CONSTRUCCION E INTERVENTORIA SAS

INFORME DE EJECUCIÓN.

Informe de ejecución de contrato N° 15072026-1134 del contrato denominado **"SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL HORIZONTAL, VERTICAL, REDUCTORES DE VELOCIDAD Y MEDIDAS DE SEGURIDAD VIAL EN ALGUNAS VÍAS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS. LOTE 2. SUBREGION CENTRO SUR".**

Cantidades a enmarcadas y ejecutadas dentro del contrato de obra de la vigencia 2026.

TOTAL, CENTRO SUR					
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	100000	$ 3.547	$ 354.700.000
2	MARCA VIAL CON PINTURA EN FRÍO	M2	67	$ 62.634	$ 4.196.478
4	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO SP-SR-DIIMENSIONES 75x75 CON LAMINA RETRORREFLECTIVA TIPO IV (18 SP-25A) y (2 SP-47)	UNID	20	$ 1.170.306	$ 23.406.120
7	TACHA REFLECTIVA CON ESPIGO Y/O ESTOPEROL	UNID	200	$ 23.652	$ 4.730.400
8	DEFENSA METÁLICA	M	40,0	$ 1.145.150	$ 45.806.000
9	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (Suministro e instalación)	M3	20,00	$ 1.413.713	$ 28.274.260
10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PASAMANOS EN TUBERÍA NEGRA DE 2". DOS HILOS H= 1.20 M. PARALES VERTICALES CADA 1.20 METROS. INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, EQUIPO DE SOLDADURA, ANCLAJE, PINTURA CON ESMALTE PINTULUX O SIMILAR Y WASH PRIMER. SIN RELLENO	ML	23	$ 339.379	$ 7.805.717
				TOTAL	**$ 468.918.975**

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN.

TRES PUERTAS - QUIEBRA DE VÉLEZ - MANIZALES (DESDE EL COUNTRY CLUB HASTA TRES PUERTAS ENCUENTRO DE LA GLORIETA DE AUTOPISTA)					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	8000	$ 3.547	$ 23.722.240

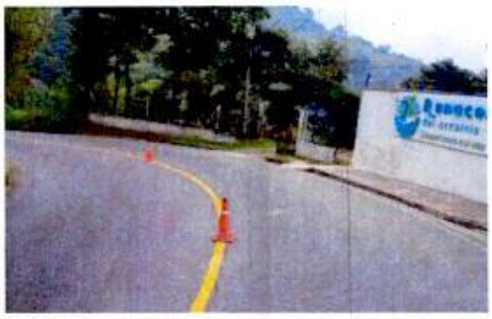









VIA MANIZALES NEIRA- INICIA EN EL PUNTO DEL CENTRO REHABILITACION RENACER HASTA LA FINCA LA TESALIA EN LA VIA HACIA ARANZAZU (10 kilómetros en línea central amarilla y 18.060 kilómetros complementaria en línea central y lateral blanca)					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	18000	$ 3.547	$ 23.722.240













VÍA CHINCHINA PALESTINA LA ROCHELA					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	15.000	$ 3.547	$ 68.811.800







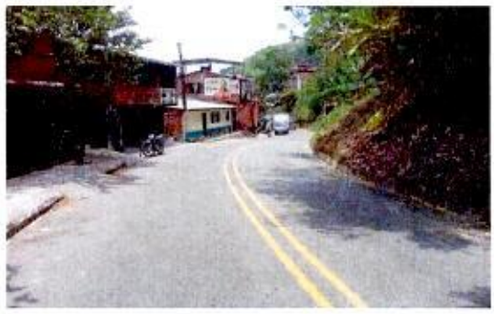

EL DESTIERRO - ANTIGUO RIO CLARO - EL CRUCERO- DESDE CHINCHINA HASTA VILLAMARIA LA PAVIMENTADA- LA VIA TIENE 3800 METROS LINEALES (TRES LINEAS DOS LATERALES BLANCAS Y LINEA CENTRAL AMARILLA)					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	10.000	$ 3.547	$ 40.435.800








INICIANDO EN LA GLORIETA DE SANTAGUEDA HACIA - (ARAUCA BOQUERON HASTA EL PUENTE AQUILINO VILLEGAS.					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	6.000	$ 3.547	$ 21.282.000





CRUCE RAMAL 29CL01) EL LAGO - LA ESTRELLA - EL TRÉBOL (LIMITE RISARALDA)", en el municipio de Chinchiná desde el inicio en el lago Cameguadua hasta el límite con Risaralda- (incluyendo el tramo de la vuelta del bobo sentido Curazao a Chinchiná aprox. es de 2 kilómetros)					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	20.000	$ 3.547	$ 78.034.000










CARTAGENA – CURAZAO INICIANDO EN EL (TRES LINEAS DOS LATERALES BLANCAS Y LINEA CENTRAL AMARILLA) incluyendo la doble calzada - cada via tiene 3 lineas					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR. UNIT	VALOR TOTAL
1	LÍNEA DE DEMARCACIÓN CON PINTURA EN FRÍO	M	**10.000**	$ 3.547	$ 46.607.580








CARLOS EDUARDO HERNANDEZ
Residente de Obra
Mat. Profesional 17202140892 CLD
