FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:		**Fecha del informe:**	**23/10/2026**
Unidad responsable:	COORDINACION ADMINISTRATIVA -FLORENCIA	**Contrato No.**	018 DE 2026 LOTE No. 02
Supervisor (es):	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**Fecha de suscripción:**	08/07/2026
	23.876.199 expedida en Pauna Boyacá	**Valor total:**	$ 695,935,370
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	Ciento Sesenta y Tres (163) días
Contratista:	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS** Integrado por: SERVITEDH S.A.S - 95% ARMELCO S.A.S - 5%	**Fecha de terminacion:**	31/12/2026
Modalidad de Selección	SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SA-001 -2026	**Lugar de ejecución:**	Sedes Judiciales del Distrito Judicial de Florencia en el Departamento del Caquetá
		Porcentaje avance:	3141.4%
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	22/07/2026
Plazo inicial:	Ciento Sesenta y Tres (163) días
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2026
Fecha terminación:	31/12/2026

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension	NA			
Reinicio	NA			
Prorroga	N/A			

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 695,935,370.00			**Valor Total:**	$ 695,935,370.00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 420,371,536.07

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
0.85	5,902,285.76	Pago parcial No. 01 de 2026: Factura FE-4 del 23/9/2026 (Ascensores) y Factura FE-5 del 23/9/2026 (Mantenimiento de Aires Acondicionados) Unidad Ejecutora 27-01-01-812, correspondiente al periodo comprendido del 22 de julio al 22 de septiembre de 2026.
4.03	22,163,539.37	
17.71	95,218,993.59	Pago parcial No. 02 de 2026: Factura FE-9 del 23/10/2026 (Mantenimiento de Inmuebles) y Factura FE-10 del 23/10/2026 (Mantenimiento de Ascensores) Factura FE 11 del 23/10/2026 (Mantenimiento Equipos Electromecánicos) Factura FE 12 del 23/10/2026 (Mantenimiento Equipos de Climatización) Unidad Ejecutora 27-01-01-812, correspondiente al periodo comprendido del del 22 de septiembre al 23 de octubre de 2026.
20.63	20,284,610.29	
31.41	75,055,077.86	
39.60	56,939,327.06	
	275,563,833.93	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**
392660526	29-sep-26	5,902,285.76			
392666426	29/09/2026	22,163,539			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo (Dias)**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**

23/10/2026	83	39.60	Mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia, correspondiente al periodo comprendido del 22 del 22 de septiembre al 23 de octubre de 2026.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	**Descripción del Bien o Servicio Recibido**
23/10/2026	Dentro de las actividades ejecutadas en el Contrato No. 018 de 2026 que tiene por objeto el mantenimiento integral preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, los sistemas de climatización y el transporte vertical de las sedes que conforman el Distrito Judicial de Florencia, se tiene que para el segundo corte comprendido del 22 de septiembre al 22 de cotubre de 2026: **MANTENIMIENTO DE INMUEBLES:** En materia de mantenimiento de inmuebles, se realizó el suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I a tres manos (442.47 m²) y de estuco plástico (415.59 m²) en el pasillo del piso 1 de la sede Tribunales, en las oficinas de las salas de audiencias de los Juzgados Administrativos 1, 2 y 3 y en la oficina de la Secretaría de la Sala Penal. Adicionalmente, se ejecutó el suministro e instalación del sistema de impermeabilización con membrana de PVC tipo SIKAPLAN 12 G (200 m²) en el Palacio de Justicia de Florencia – Tribunales, con el fin de corregir las filtraciones de agua lluvia y proteger la infraestructura del edificio. **MANTENIMIENTO DE ASCENSORES** En materia de mantenimiento de equipos de transporte vertical, se realizó en el mes de octubre el mantenimiento preventivo y la atención de emergencias del ascensor marca Glarie (5 paradas) del Palacio de Justicia de Florencia y del ascensor marca Interlift (4 paradas) de la sede Tribunales, así como el mantenimiento preventivo del elevador para trabajo en alturas del Palacio de Justicia de Florencia. Igualmente, se efectuó el suministro, instalación, programación y puesta en servicio de un variador de velocidad Monarch 4007 – 220 V para el ascensor de la sede Tribunales. **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS (Plantas - Motobombas - Tableros Eléctricos)** En materia de mantenimiento de equipos electromecánicos, se realizó la revisión de los sistemas de alimentación eléctrica y tableros de transferencia, con pruebas de funcionalidad, en las sedes judiciales de Florencia, Puerto Rico y Belén de los Andaquíes; el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de los Palacios de Justicia de Florencia (incluida la sede Tribunales), Puerto Rico, Belén de los Andaquíes y Albania; el mantenimiento preventivo y correctivo de las motobombas y bombas de alta presión de Florencia y Belén de los Andaquíes, así como de las bombas sumergibles de esta última sede; y el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de red contraincendios de Florencia (sede principal y sede Tribunales) y de Belén de los Andaquíes. Adicionalmente, se suministraron e instalaron un contactor de 32 A, dos breakers 3*40 y un totalizador de 160 A en Florencia. **MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN** En materia de mantenimiento de equipos de climatización, se realizó el mantenimiento preventivo de 49 equipos mini split en Florencia y en las sedes de los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solita y Valparaíso, y de 11 equipos tipo cassette / piso techo en Puerto Rico, Belén de los Andaquíes y Solita. En Florencia se instalaron 17 equipos mini split (13 de 9.000 a 18.000 BTU y 3 de 24.000 a 36.000 BTU) y uno de 60.000 BTU, con el desmonte de 17 equipos y el suministro de tuberías de cobre, accesorios, aislamiento térmico Rubatex, cable encauchetado y manguera de drenaje; en San José del Fragua se instaló un equipo de 24.000 a 36.000 BTU con su respectiva red. Adicionalmente, se ejecutaron trabajos correctivos como el cambio de un motor de condensador de 18.000 BTU y de una tarjeta electrónica inverter, la corrección de fuga con carga de refrigerante, el ajuste de carga de refrigerante R-410 en Belén de los Andaquíes y el suministro de controles remotos en Morelia y Valparaíso.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**
23/07/2026	Solicitud visita técnica coordinar actividades de inicio de ejecución del contrato 018 de 2026.
24/08/2026	Se reitera solicitud de visita técnica para coordinar ejecución de actividades establecidas dentro del marco del contrato 018 de 2026. Se recibe respuesta mediante correo electrónico del 24/8/2026 fijando fecha de visita para el 26/8/2026.

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	**El contrato presenta retraso?**	**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**
SI X NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

En desarrollo del Contrato 018 de 2026, suscrito con el Consorcio Infraestructura AS, se adelantaron diversas actuaciones técnicas y administrativas orientadas a atender las necesidades de mantenimiento de las sedes judiciales del Distrito Judicial de Florencia. Entre ellas, se destaca el diagnóstico realizado el 20 de agosto de 2026 al ascensor marca Glarier del Palacio de Justicia de Florencia, en el que se determinó la necesidad de reemplazar el variador de frecuencia, como resultado del diagnistico técnico de fecha 20 de agosto de 2026, suscrito por la firma contratista. Previa verificación de precios de mercado, se autorizó su adquisición y, posteriormente, mediante requerimiento del 5 de octubre de 2026, la supervisión solicitó precisiones sobre la garantía integral de la intervención. El 14 de octubre de 2026, el contratista da respuesta a lso 11 puntos relacionados con la garantía del variador y con base en ello, la supervisión otorgó el aval definitivo el 15 de octubre de 2026, permitiendo la instalación y el restablecimiento del servicio el 21 de octubre de 2026. Este mismo día, se dió lugar al mantenimiento preventivo del equipo del Palacio de Justicia de Florencia, sede alterna de los Tribunales y tijera elevadora ubicada en el archivo central de Florencia.

De igual manera, se adelantaron las gestiones técnicas y administrativas para la impermeabilización de sectores de las cubiertas del Palacio de Justicia y de la sede de los Tribunales de Florencia, incluyendo la revisión de la cotización y la aprobación de la ficha técnica de impermeabilización correspondiente. Para el período objeto de cobro, se contempla el suministro de los materiales requeridos, quedando pendiente la ejecución de las actividades de instalación. Adicionalmente, se realizaron actividades de mantenimiento de infraestructura y pintura, mantenimiento preventivo de 49 equipos de climatización tipo mini split y labores de mantenimiento de equipos electromecánicos, conforme a las actividades ejecutadas y los soportes correspondientes.

Resumen pendientes del contratista:

N/A

Observaciones:

Equipo elevador – Palacio de Justicia de Florencia: El equipo elevador marca GLARIE, luego de estar fuera de servicio desde el 10 de agosto de 2026, el 21 de octubre de 2026 y previa ejecución de ciertas actividades preliminares se restableció el servcio. Documentos que hacen parte de la carpeta digital del proceso en los direferentes repositorios Drive y SECOP II.

Sede Judicial de Belén de los Andaquíes

Se deja constancia de que el equipo elevador ubicado en esta sede Judicial, se encuentra incluido en la oferta económica presentada por el contratista dentro del contrato de mantenimiento integral. Se le realizaron dos visita técnicas con el fin de determinar las causas que han dejado fuera de servicio el referido equipo, entre ello al momento de la visita técnica el ascensor SCHINDLER ANDINO se encontró bloqueado a nivel de piso, sin posibilidadde operación. Se verificó que el equipo fue encontrado con las seguridades puenteadas por intervención previa no documentada, y que aun en dicha condición el equipo continuaba bloqueado, evidenciando una falla adicional. Se estableció comunicación con el anterior contratista, quien informó formalmente que no realizó ningún tipo de intervención sobre este equipo. El Consorcio Infraestructura AS deja constancia de esta comunicación como antecedente relevante para el diagnóstico. Y dentro de su resultado de visita se concluye que se debe realizar el suministro e instalación del módulo de auto-rescate nuevo y el contactor principal del motor, componentes necesarios para la puesta en marcha del equipo, se reibe cotizaciones donde las económica asciende a la suma de $14.696.502.

No obstante, a la fecha del presente informe no se ha avanzado con la intervención sobre dicho equipo, teniendo en cuenta que la sede judicial se encuentra en trámite solicitud de garantía de estabilidad de obra y correcto funcionamiento de los bienes, razón por la cual se ha considerado técnicamente pertinente no efectuar intervención mientras este en curso dicha garantía y se defina al respecto.

La supervisión continuará realizando el seguimiento correspondiente y dejará constancia de cualquier actuación que resulte procedente.

De esta manera, las actuaciones adelantadas han permitido contar con el diagnóstico técnico necesario para establecer las condiciones de los equipos y definir las intervenciones requeridas, manteniendo pendiente la decisión sobre la ejecución del mantenimiento correctivo por su costo, hasta tanto se concluya el análisis técnico, administrativo, contractual y presupuestal correspondiente.

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial



FIRMA SUPERVISORA
Marta Edelmira Castro Sierra
Asignación Supervisión -Resolución DESAJNER26-2519 del

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
26310843c9c50018ef3a5dd493cc216d77278d631eecb6f75a73302ef39531fdcbed71db3c86c1cf4975fd70bf91a316

Número de Factura: FE-9
Fecha de Emisión: 23/10/2026
Fecha de Vencimiento: 07/12/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Nombre Comercial: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Nit del Emisor: 902080280
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 27 8 06
Teléfono / Móvil: 3164692215
Correo: consorcioinfraestructuraas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800165866
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105
Teléfono / Móvil: 8713774
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	Acta Parcial No. 02 Contrato N. 018 de 2026 Manteniminet o Inmuebles	SUBTOTAL	94	1,00	$ 80.015.961,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 15.203.032,59	19.00			$ 80.015.961,00

Notas Finales

#$27-01-01-812;018de2026;mcastrosi@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
23/10/2026 15:24:53
Documento validado por la DIAN:
23/10/2026 15:24:54
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	80015961
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	80015961
IVA	15203032.59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	15203032.59
Total neto factura (=)	95218993.59
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 95218993.59

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	80.015.961,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	80.015.961,00
IVA	15.203.032,59
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	15.203.032,59
Total neto factura (=)	95.218.993,59
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 95.218.993,59

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764115849269 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2028-09-18

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
d69adec544d8ca517d9e1a92205433ef6f7630676443c8ade330fff29222d425290e83fee97443e7183c3ff1f00dc76e

Número de Factura: FE-10
Fecha de Emisión: 23/10/2026
Fecha de Vencimiento: 07/12/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Nombre Comercial: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Nit del Emisor: 902080280
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 27 8 06
Teléfono / Móvil: 3164692215
Correo: consorcioinfraestructuraas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800165866
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105
Teléfono / Móvil: 8713774
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Acta Parcial No. 02 Contrato N. 018 de 2026 Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical	SUBTOTAL	94	1,00	$ 17.045.891,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.238.719,29	19.00			$ 17.045.891,00

Notas Finales

#$27-01-01-812;018de2026;mcastrosi@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
23/10/2026 15:26:29
Documento validado por la DIAN:
23/10/2026 15:26:30
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	17045891
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17045891
IVA	3238719.29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	3238719.29
Total neto factura (=)	20284610.29
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 20284610.29

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	17.045.891,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	17.045.891,00
IVA	3.238.719,29
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	3.238.719,29
Total neto factura (=)	20.284.610,29
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 20.284.610,29

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764115849269 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2028-09-18

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
58702f68e89cf878e7e69387221bbe5b8ea2e6bffd9a7a370b906a224eceef726744e3700aaad67c3fc2ef2e52a9ba9f

Número de Factura: FE-11
Fecha de Emisión: 23/10/2026
Fecha de Vencimiento: 07/12/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Nombre Comercial: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Nit del Emisor: 902080280
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 27 8 06
Teléfono / Móvil: 3164692215
Correo: consorcioinfraestructuraas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800165866
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105
Teléfono / Móvil: 8713774
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Acta Parcial No. 02 Contrato N. 018 de 2026 Mantenimiento de Equipos Electromecanicos	SUBTOTAL	94	1,00	$ 63.071.494,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.983.583,86	19.00			$ 63.071.494,00

Notas Finales

#$27-01-01-812;018de2026;mcastrosi@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/10/2026 15:28:13
Documento validado por la DIAN:
23/10/2026 15:28:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	63071494
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	63071494
IVA	11983583.86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	11983583.86
Total neto factura (=)	75055077.86
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 75055077.86

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	63.071.494,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	63.071.494,00
IVA	11.983.583,86
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.983.583,86
Total neto factura (=)	75.055.077,86
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 75.055.077,86

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764115849269 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2028-09-18

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b79d9f921c9c327218fb17de716029ed33b89e451a959fd84886e2377b964ea56ce073748eb3cb1565fe7b2fc64789a7

Número de Factura: FE-12
Fecha de Emisión: 23/10/2026
Fecha de Vencimiento: 07/12/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Nombre Comercial: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
Nit del Emisor: 902080280
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4290

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: CL 27 8 06
Teléfono / Móvil: 3164692215
Correo: consorcioinfraestructuraas@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL NEIVA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800165866
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Huila
Municipio / Ciudad: Neiva
Dirección: ED PALACIO DE JUSTICIA OF 105
Teléfono / Móvil: 8713774
Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	Acta Parcial No. 02 Contrato N. 018 de 2026 Mantenimiento de Equipos de Climatizacion	SUBTOTAL	94	1,00	$ 47.848.174,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.091.153,06	19.00			$ 47.848.174,00

Notas Finales

#$27-01-01-812;018de2026;mcastrosi@cendoj.ramajudicial.gov.co#$
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/10/2026 15:29:23
Documento validado por la DIAN:
23/10/2026 15:29:23
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	47848174
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	47848174
IVA	9091153.06
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	9091153.06
Total neto factura (=)	56939327.06
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 56939327.06

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	47.848.174,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	47.848.174,00
IVA	9.091.153,06
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	9.091.153,06
Total neto factura (=)	56.939.327,06
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 56.939.327,06

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764115849269 Rango desde: 1 Rango hasta: 20 Vigencia: 2028-09-18

EL SUSCRITO DIRECTOR DE LA OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA DE FLORENCIA – CAQUETA

H A C E C O N S T AR

En el marco del Contrato No. 018 de 2026, suscrito el 8 de julio de 2026 con el **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**, representado legalmente por el ingeniero Fernando Daniel Fajardo Núñez, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.461.245 expedida en Bogotá D. C., cuyo objeto es *"Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia"*, por valor de **SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($695.935.370)**, con fecha de inicio del 22 de julio de 2026, se certifica que se reciben a satisfacción las actividades ejecutadas correspondientes al segundo corte de ejecución para pago, relacionadas con el mantenimiento de inmuebles, por valor de **NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($95.218.993,59)**, de conformidad con la Factura Electrónica No. FE 9 del 22 de octubre de 2026 y los documentos anexos.

Así mismo, en cumplimiento del Manual de Políticas Contables y de los lineamientos establecidos en la Circular DEAJC24-48 del 20 de diciembre de 2024, denominada *"Lineamientos tratamiento financiero contratos de obra para mejoras de la propiedad, planta y equipo - Inmuebles"*, se informa que las actividades objeto del presente corte de ejecución corresponden contablemente al concepto de **mantenimiento y reparaciones**.

Florencia, a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2026.

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Profesional Universitario G-9 / Supervisor

Elaboró. MECS//


CEDULA DE CIUDADANIA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
NUIP 1.075.233.348
Apellidos
PARRA TORRES
Nombres
XIMENA
Nacionalidad
COL
Estatura
1.59
Sexo
F
Fecha de nacimiento
17 AGO 1988
G.S.
B+
Lugar de nacimiento
NEIVA (HUILA)
Fecha y lugar de expedición
16 DIC 2006, NEIVA
Firma
Fecha de expiración
29 DIC 2032


IDD
0116898762
REGISTRADOR NACIONAL
ICCOL0116898762190001<<<<<<<<<<<
8808176F3212297COL1075233348<1
PARRA<TORRES<<XIMENA<<<<<<<<<<

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0E18642360701 9F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **XIMENA PARRA TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1075233348 de NEIVA (HUILA) Y Tarjeta Profesional No 317580-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

CERTIFICACIÓN DE PAGOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 79.461.245 de Bogotá D.C., en calidad de Representante Legal de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS** NIT 902.080.280-1 y **XIMENA PARRA TORRES** identificada con cédula de ciudadanía N° 1.075.233.348 de Neiva, con tarjeta profesional N° 317580-T en calidad de Contadora de **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**, bajo la gravedad de juramento manifestamos, que hemos cumplido y nos encontramos a paz y salvo con el pago de los aportes de salud, riesgos laborales -ARL, pensiones, aportes a las Cajas de Compensación Familiar (Artículo 65 Ley 1819 de 2016), y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA-) durante los últimos seis (6) meses, teniendo en cuenta las fechas límites establecidas en el Decreto 1990 de 2016.

De igual manera, bajo la gravedad de juramento, certifico que el personal vinculado al proyecto a través de contrato de prestación de servicios cumple con las obligaciones al Sistema Integrado de Seguridad Social.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás disposiciones legales.

En constancia, se expide en Neiva, a los 23 días del mes de octubre de 2026.



FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
C.C No. 79.461.245 de Bogotá D.C.
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 902.080.280-1



XIMENA PARRA TORRES
TP: 317580-T
CONTADORA
C.C No. 1.075.233.348 de Neiva

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONTRATO No. 018 DE 2026**				**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**PLAZO INICIAL:**	**6 MESES**	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**PLAZO ADICIONAL:**		**Fecha Acta:** **23/10/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	**PLAZO FINAL:**	**6 MESES**	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0	**FECHA DE INICIACION:**	**04/09/2026**	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	**FECHA TERMINACION:**	**31/12/2026**	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
I	**MANTENIMIENTO DE INMUEBLES**											
1	**PRELIMINARES**											
1.1	Proteccion de areas a intervenir (equipos, escritorios, etc) durante trabajo en oficinas.	M2		$ 14,709	$ 15,910	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.2	Desmonte de canales o bajantes de aguas lluvias.	ML		$ 16,095	$ 17,420	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.3	Revisión, mantenimiento y limpieza de cubierta existente. (Incluye arregblo de goteras y todos los elementos necesarios para su correcta reparación).	M2		$ 51,891	$ 56,121	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.4	Retiro de manto asfaltico, incluye limpieza de superficie con solventes y aplicación de calor.	M2		$ 28,543	$ 30,889	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.5	Desinstalación piso tipo vinisol o similar.	M2		$ 28,305	$ 30,652	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.6	Corte y desmonte de ducto en lámina.	ML		$ 60,389	$ 65,310	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.7	Corte y apertura de muros para paso de instalaciones	M2		$ 37,219	$ 40,260	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.8	Desmonte de cubierta existente.	M2		$ 38,366	$ 41,503	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.9	Desmonte de cielo raso existente.	M2		$ 24,695	$ 26,705	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.10	Desmonte de espejos.	UN		$ 57,194	$ 61,904	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.11	Desmonte de divisiones de Oficina. En Aluminio, madera o mamparas modulares (Incluye accesorios de fijación).	M2		$ 41,006	$ 44,385	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.12	Traslado de división de oficina (desarme, transporte, ensamble).	M2		$ 51,170	$ 55,379	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.13	Desmonte divisiones baño.	M2		$ 32,913	$ 35,638	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.14	Desmonte división en vidrio piso techo.	M2		$ 51,740	$ 55,995	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.15	Reinstalación de hoja de puerta en vidrio.	UN		$ 96,999	$ 104,965	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.16	Desmonte de rejas metálicas.	M2		$ 49,479	$ 53,545	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.17	Desmonte de pasamanos.	ML		$ 31,375	$ 33,952	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.18	Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación de ellos.	UN		$ 71,945	$ 77,846	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.19	Desmonte de aparatos sanitarios para cambio.	UN		$ 78,880	$ 85,349	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.20	Desmonte de puerta en madera.	UN		$ 59,470	$ 64,347	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.21	Desmonte de puerta metálica.	UN		$ 76,479	$ 82,781	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.22	Desmonte de ventaneria metálica.	M2		$ 47,293	$ 51,188	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.23	Desmonte de puertas y/o ventanas en aluminio.	M2		$ 41,167	$ 44,559	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.24	Desmonte de lámparas.	UN		$ 51,372	$ 55,596	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.25	Desmonte de muebles en madera.	ML		$ 32,317	$ 34,975	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.26	Desmonte canaleta metálica.	ML		$ 27,133	$ 29,362	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.27	Desmonte de bandeja tipo rejiband	ML		$ 39,150	$ 42,368	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.28	Desmonte de puntos eléctricos.	UN		$ 36,460	$ 39,453	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.29	Desmonte cable UTP, normal y regulado.	ML		$ 24,932	$ 26,979	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.30	Desmonte de tableros eléctricos existentes.	UN		$ 177,940	$ 192,435	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.31	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües.	UN		$ 85,864	$ 92,905	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.32	Demolición de pañetes.	M2		$ 31,811	$ 34,432	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.33	Demolición de poceta de aseo.	UN		$ 108,818	$ 117,771	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.34	Demolición de piso baldosa tipo granito o similar.	M2		$ 52,938	$ 57,296	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.35	Demolición de guarda escoba.	ML		$ 19,424	$ 21,021	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.36	Demolición de muro en drywall existente. Incluye estructura y todo lo necesario para la demolición del mismo.	M2		$ 53,951	$ 58,360	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.37	Demolición de enchape de piso y/o pared.	M2		$ 34,266	$ 37,067	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.38	Desmonte y retiro de tanque plástico elevado para almacenamiento de agua potable. Incluye desconexión de flotador, y entrada y salida de agua.	UN		$ 211,486	$ 228,831	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.39	Destaponamiento de sifón. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN		$ 44,337	$ 47,985	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.40	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada.	ML		$ 21,644	$ 23,425	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.41	Desmonte de tableros eléctricos existentes.	UN		$ 217,305	$ 235,176	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.42	Desmonte de interuptor existente.	UN		$ 12,843	$ 13,899	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.43	Desmonte de tomacorriente existente.	UN		$ 12,894	$ 13,953	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
2	IMPERMEABILIZACIONES											
2.1	Corrección de humedad (incluye resane, impermeabilización, estuco, pintura vinilo tipo 1 tres manos)	M2		$ 96,304	$ 104,521	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
2.2	Mantenimiento de manto existente. (Incluye elementos necesarios)	M2		$ 40,960	$ 44,449	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3	PISOS Y ENCHAPES											
3.1	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida, cristalizada y brillada)	M2		$ 51,316	$ 55,378	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3.2	Reparación de andenes	M2		$ 129,285	$ 139,511	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3.3	Mantenimiento de juntas de enchape con boquilla, incluye limpieza y retiro existente.	M2		$ 28,784	$ 31,063	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3.4	Suministro e instalación de guardaescoba plastico	ML		$ 21,367	$ 23,063	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3.5	Suministro e instalación de cinta antideslizante para escalones. Incluye retiro de la cinta existente, limpieza y todo lo relacionado para su correcta instalación.	ML		$ 45,561	$ 49,156	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4	PINTURA, ESTUCO Y ACABADOS											
4.1	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I; 3 manos.	M2		$ 39,727	$ 42,878	$ 0		$ 0	442.47	$ 17,578,006	442.47	$ 17,578,006
4.2	Suministro, aplicación de pintura 3 manos, para exterior.	M2		$ 35,803	$ 38,632	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.3	Suministro y aplicación de estuco plástico.	M2		$ 23,974	$ 25,864	$ 0		$ 0	415.59	$ 9,963,355	415.59	$ 9,963,355
4.4	Suministro e aplicación de graniplast.	M2		$ 48,406	$ 52,226	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.5	Suministro e aplicación de pasta acrilica.	M2		$ 30,140	$ 32,525	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.6	Suministro e instalación de pintura en esmalte para marcos metálicos, color similar al existente. (Incluye 1 capa en anticorrosivo)	ML		$ 27,283	$ 29,437	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.7	Pintura para puerta en madera, color similar al existente. (Incluye desmonte e instalación, lijada y/o resane)	UN		$ 155,142	$ 167,414	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.8	Pintura de guardaescoba.	ML		$ 27,239	$ 29,390	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.9	Suministro y aplicación de pintura de pasamanos y/o barandas existentes, incluye limpieza, lijado y todo lo relacionado para su correcta ejecución.	ML		$ 37,885	$ 40,888	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.10	Suministro y aplicación de pintura en esmalte. Incluye anticorrosivo.	M2		$ 40,165	$ 43,349	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.11	Pintura de gabinetes contra incendios	UN		$ 99,040	$ 106,860	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.12	Suministro y aplicación de pintura trafico pesado para demarcación lineal, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	ML		$ 15,223	$ 16,429	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
4.13	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado color negro para tapar señalización existente, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	ML		$ 14,839	$ 16,017	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.14	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para demarcación. Incluye limpieza y preparación de superficie	M2		$ 37,132	$ 40,074	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.15	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para numeración.	UN		$ 35,715	$ 38,543	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.16	Corte y resane de muros por paso de tuberias	UN		$ 74,508	$ 80,406	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.17	Suministro y aplicación de pintura conductiva o pintura antiestática (ESD) color negro en muros de cuarto de comunicaciones.	M2		$ 98,078	$ 105,840	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5	**CUBIERTA**											
5.1	Suministro e instalación de flanche metálico cal. 22". L=variable	ML		$ 71,331	$ 76,964	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.2	Sellado de tornillos con cinta asfaltica	M2		$ 12,514	$ 13,503	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.3	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 18. Ancho y altura variable, más las pestañas necesarias para rigidez.	ML		$ 236,047	$ 254,660	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.4	Suministro e instalación de lámina en policarbonato para cubierta de pérgola. Incluye tornillería, cintas de fijación, silicona y retiro de lámina averiada.	M2		$ 134,304	$ 144,897	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.5	Mantenimiento de canales y/o bajantes en PVC, por colmatación que impide libre evacuación de agua. Incluye lo necesario.	ML		$ 16,894	$ 18,232	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.6	Suministro e instalación de pasarela o plataforma de tránsito en cubierta, fabricada en lámina alfajor de aluminio de 2,4 mm de espesor, soportada en piedeamigos de hierro en ángulo cada 0,45 m. Incluye lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	ML		$ 364,501	$ 393,244	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.7	Instalacion de puntos de anclajes certificados.	UN		$ 283,018	$ 305,319	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.8	Pasarela para cubiertas en aluminio certificadas.	ML		$ 459,690	$ 495,917	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.9	Suministro e instalación de rejillas de sosco para los bajantes. Incluye producto aplicación de silicona.	UN		$ 40,210	$ 43,388	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.10	Destapada de sifón de terraza con sonda espiral y agua a presión.	UN		$ 57,459	$ 61,999	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.11	Limpieza de terrazas mediante barrido, lavado y retiro de sobrantes.	M2		$ 11,319	$ 12,216	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.12	Suministro e instalación de cinta asfaltica.	ML		$ 16,104	$ 17,377	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.13	Lavado de muros, fachadas o estructuras metálicas en altura con hidrolavadora. Incluye remoción y raspado previo de la superficie a intervenir con recolección de residuos.	M2		$ 31,925	$ 34,456	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026					ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
5.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	ML		$ 236,718	$ 255,391	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.15	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)	ML		$ 168,565	$ 181,858	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.16	Canal en lámina galvanizada Cal. 18, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML		$ 196,331	$ 211,817	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.17	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 18 d=100 cm. (Suministro e instalación)	ML		$ 258,921	$ 279,333	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.18	Canal en lámina galvanizada Cal. 18, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML		$ 202,577	$ 218,593	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.19	Canal en lámina galvanizada Cal. 18, desarrollo 0,90 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML		$ 218,505	$ 235,781	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6	**CIELO RASOS**											
6.1	Mantenimiento de cielo raso existente. Incluye láminas de fibra mineral.	M2		$ 68,128	$ 73,504	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6.2	Suministro e instalación de cielos raso falso en fibra mineral, de dimensiones 610mm x 610mm, color blanco, suspensores metálicos - perfiles livianos de 15/16" (24mm) o de 9/16 (15mm) a la vista, en acero electrogalvanizado con acabado en color blanco	M2		$ 147,351	$ 158,976	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6.3	Mantienimiento y adecuacion de muro y/o cielo raso en drywall, inlcuye lamina de drywall y terminacion en pintura en vinilo tipo dos, a tres manos.	M2		$ 73,421	$ 79,207	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6.4	Suministro e instalación de tapa de inspección en cieloraso con marco en aluminio en "T" y tapa de 60 cm * 60 cm.	UN		$ 157,089	$ 169,477	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6.5	Mantenimiento de cielo raso existente en mortero, incluye retiro de texturizado existente, limpieza, impermeabilizante, nivelacion y terminado tipo garraplast.	M2		$ 70,278	$ 75,814	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7	**CAMBIO DE CHAPAS -GUARDA - LLAVES - BRAZO HIDRÁULICO**											
7.1	Cambio de guardas y llaves incluye (2 llaves por chapas).	UN		$ 106,167	$ 114,554	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.2	Suministro e instalación de cerradura de bola o manija.	UN		$ 126,060	$ 136,014	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.3	Mantenimiento y ajuste de brazo hidráulico para puerta de vidrio.	UN		$ 128,312	$ 138,448	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.4	Apertura cerradura de pomo o botón.	UN		$ 56,189	$ 60,635	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.5	Apertura cerradura de pomo fija o doble cilindro.	UN		$ 74,588	$ 80,480	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
7.6	Apertura pasador de seguridad.	UN		$ 49,991	$ 53,939	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.7	Apertura, cambio de guardas y elaboración de llaves cerradura de pomo.	UN		$ 92,116	$ 99,368	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.8	Instalación de chapa de seguridad con cantonera. Incluye perforación de puerta y marco de madera, y suministro de tornillería.	UN		$ 182,126	$ 196,498	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.9	Duplicado de llaves.	UN		$ 10,276	$ 11,089	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.10	Mantenimiento y lubricación de cerradura.	UN		$ 38,835	$ 41,905	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.11	Mantenimiento y reparación de bisagras de vaivén.	UN		$ 61,045	$ 65,873	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.12	Suministro de bisagra de vaivén.	UN		$ 148,379	$ 160,122	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.13	Mantenimiento (revisión y fijación) de bisagras en biblioteca de madera.	UN		$ 37,754	$ 40,748	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.14	Mantenimiento puerta de madera (cambio de bisagras y ajuste cantonera).	UN		$ 77,896	$ 84,050	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.15	Suministro e instalación de chapa pico de loro tipo Yale.	UN		$ 141,758	$ 152,943	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.16	Suministro e instalación de cerradura pasador de seguridad tipo pesado.	UN		$ 128,313	$ 138,445	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.17	Suministro e instalación de chapa tipo Yale 396*1/4 de roseta.	UN		$ 188,540	$ 203,433	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.18	Suministro e instalación de cerrojo o cantonera para ventana en aluminio.	UN		$ 71,286	$ 76,908	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.19	Suministro e instalación de brazo hidráulico tipo Yale de 80 Kg con acoples y accesorios.	UN		$ 252,603	$ 272,536	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8	**CARPINTERIA**											
8.1	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada en RH.	M2		$ 618,298	$ 667,000	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.2	Arregblo y ajuste de puerta en aluminio.	M2		$ 55,153	$ 59,517	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.3	Arregblo y ajuste de puerta en madera.	M2		$ 66,988	$ 72,277	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.4	Arregblo y ajuste de pasamanos metalico	ML		$ 45,233	$ 48,818	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.5	Suministro e instalación de puerta o ventana en aluminio, incluye vidrio crudo 4mm.	M2		$ 527,524	$ 569,219	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.6	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304 para escaleras de acceso, incluye todo lo relacionado para su correcta instalación y funcionamiento.	ML		$ 597,672	$ 644,794	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.7	Reposición de tapas de gabinetes	UN		$ 119,804	$ 129,264	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.8	Ajuste de marcos	UN		$ 47,567	$ 51,316	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.9	Suministro e instalacion de bisagras	UN		$ 47,902	$ 51,677	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
8.10	Cambio de chapas pequeñas de mobiliario de madera en oficinas	UN		$ 50,255	$ 54,211	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.11	Mantenimiento de puerta de aluminio y vidrio, (ancho minimo 0.9m x altura minima 2m), incluye desmonte de la puerta, cambio de bisagras, ajuste vidrio, ajuste de aluminio, aplicación de silicona, cambio de perfil si lo requiere, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN		$ 146,258	$ 157,820	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.12	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada en triplex dimen. 0.80 m x 2.05 m	UN		$ 477,592	$ 515,339	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.13	Suministro e instalación de tabla o entrepaño en RH color blanco enchapada en todos sus lados, de 1,5 cm de espesor * 30 cm de ancho y 147 cm de largo, soportada en los extremos con tablas en RH de 10cm * 30 cm, chazos y tornillos.	UN		$ 146,656	$ 158,234	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9	**VIDRIOS**											
9.1	Suministro e instalación de vidrio crudo de 5 mm.	M2		$ 160,032	$ 172,657	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.2	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2		$ 238,176	$ 256,971	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.3	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2		$ 277,635	$ 299,549	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.4	Suministro e instalación de película sand blasting.	M2		$ 106,478	$ 114,878	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.5	Sellado de ventanas con silicona, incluye lo necesario para su funcionamiento.	ML		$ 22,784	$ 24,582	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.6	Suministro e instalación de polarizado para vidrios	M2		$ 119,755	$ 129,194	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.7	Suministero e instalación de vidrio texturizado decorativo para ventanas (incluye silicona y todo lo necesario para su correcta instalación	M2		$ 232,126	$ 250,438	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.8	Puerta en vidrio templado e=10 mm, 0,90x2,00m. (Suministro e instalación. Incluye cerradura, herrajes, accesorios)	UN		$ 1,398,018	$ 1,508,495	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.9	Vidrio templado e=10 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2		$ 719,919	$ 776,790	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10	**REDES SANITARIAS E HIDRAULICAS**											
10.1	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 2".	PTO		$ 164,372	$ 177,344	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.2	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 3".	PTO		$ 188,112	$ 202,961	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.3	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4".	PTO		$ 202,113	$ 218,051	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.4	Suministro e instalación tubería sanitaria en PVC de 2".	ML		$ 107,741	$ 116,242	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.5	Suministro e instalación tubería sanitaria en PVC de 3".	ML		$ 126,735	$ 136,730	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.6	Suministro e instalación tubería sanitaria en PVC de 4".	ML		$ 167,333	$ 180,523	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.7	Suministro e instalación tubería sanitaria en PVC de 6".	ML		$ 152,738	$ 164,781	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.8	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	UN		$ 27,789	$ 29,979	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.9	Accesorios PVC Sanitario 3". (Suministro e instalación)	UN		$ 35,951	$ 38,786	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.10	Accesorios PVC Sanitario 4". (Suministro e instalación)	UN		$ 51,204	$ 55,247	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.11	Accesorios PVC Sanitario 6". (Suministro e instalación)	UN		$ 102,943	$ 111,086	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.12	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML		$ 53,716	$ 57,952	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.13	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML		$ 73,759	$ 79,577	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.14	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML		$ 95,184	$ 102,691	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.15	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML		$ 174,601	$ 188,377	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.16	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML		$ 45,959	$ 49,581	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.17	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 3". (Suministro e instalación)	ML		$ 63,809	$ 68,837	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.18	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 4". (Suministro e instalación)	ML		$ 83,041	$ 89,585	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.19	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 6". (Suministro e instalación)	ML		$ 153,340	$ 165,426	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.20	Abrazadera metálica para tubería 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 18,307	$ 19,755	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.21	Abrazadera metálica para tubería 2". (Suministro e instalación)	UN		$ 21,991	$ 23,730	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.22	Abrazadera metálica para tubería 3". (Suministro e instalación)	UN		$ 31,747	$ 34,254	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.23	Abrazadera metálica para tubería 4". (Suministro e instalación)	UN		$ 42,796	$ 46,173	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.24	Abrazadera metálica para tubería 6". (Suministro e instalación)	UN		$ 70,435	$ 75,996	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.25	Sellamiento de puntos sanitarios (Lavamanos, sanitarios, sifones, etc).	UN		$ 70,532	$ 76,106	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.26	Mantenimiento del sanitario. (Incluye ajustes y empaques)	UN		$ 136,815	$ 147,602	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.27	Suministro e instalación de sanitario. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	UN		$ 980,381	$ 1,057,568	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.28	Suministro e instalación de punto hidráulico.	PTO		$ 168,887	$ 182,196	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.29	Suministro e instalación tubería hidráulica en PVC de 1/2".	ML		$ 36,142	$ 38,996	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.30	Suministro e instalación tubería hidráulica en PVC de 3/4".	ML		$ 44,596	$ 48,111	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.31	Suministro e instalación tubería hidráulica en PVC de 1".	ML		$ 59,623	$ 64,332	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.32	Accesorio PVC-P Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 12,033	$ 12,982	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.33	Accesorio PVC-P Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	UN		$ 15,708	$ 16,946	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.34	Accesorio PVC-P Ø=1". (Suministro e instalación)	UN		$ 20,626	$ 22,251	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.35	Accesorio PVC-P Ø=1.1/4". (Suministro e instalación)	UN		$ 30,788	$ 33,217	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.36	Accesorio PVC-P Ø=1.1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 36,697	$ 39,587	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.37	Accesorio PVC-P Ø=2". (Suministro e instalación)	UN		$ 52,248	$ 56,368	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.38	Accesorio PVC-P Ø=2 1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 78,354	$ 84,528	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.39	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 53,572	$ 57,791	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.40	Cheque de 3/4". (Suministro e instalación)	UN		$ 69,946	$ 75,453	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.41	Cheque de 1". (Suministro e instalación)	UN		$ 95,265	$ 102,776	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.42	Cheque de 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 244,647	$ 263,997	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.43	Suministro e instalación de lavamanos. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	UN		$ 647,871	$ 699,063	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.44	Mantenimiento de lavamanos. (incluye ajustes y empaques)	UN		$ 77,646	$ 83,777	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.45	Suministro e instalación llave de paso 1/2".	UN		$ 123,344	$ 133,066	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.46	Suministro e instalación válvula 1".	UN		$ 136,329	$ 147,095	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.47	Suministro e instalación de Bajante aguas lluvia tubería PVC 4"	ML		$ 95,184	$ 102,691	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.48	Suministro e instalación de Bajante aguas lluvias tubería PVC 6"	ML		$ 174,601	$ 188,377	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.49	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería. Incluye accesorios.	UN		$ 646,691	$ 697,722	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.50	Mantenimiento de tanque de almacenamiento hasta de 1.000L. Incluye accesorios y todo lo necesario.	UN		$ 463,519	$ 500,094	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.51	Mantenimiento de de sifones	UN		$ 53,405	$ 57,619	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.52	Suministro e instalación de tuberia agua lluvias en PVC de 6". Incluye accesorios pvc sanitarios (Bujes, uniones, yee y todo lo necesario para su correcta instalacion)	ML		$ 209,251	$ 225,746	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.53	Suministro e instalación acople para lavamanos (manguera).	UN		$ 37,360	$ 40,310	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.54	Suministro e instalación de grifería para lavamanos (rejilla, llave y sifón).	UN		$ 199,828	$ 215,599	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.55	Suministro e instalación de llave mezcladora con eje de 18 cm para lavamanos. Incluye mangueras y retiro de llave averiada.	UN		$ 268,448	$ 289,615	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.56	Suministro e instalación llave de perilla.	UN		$ 69,093	$ 74,541	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.57	Suministro e instalación de sifón rejilla.	UN		$ 57,515	$ 62,044	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.58	Suministro e instalación codo sifón para lavamanos.	UN		$ 34,196	$ 36,891	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.59	Suministro e instalación de asiento con tapa para sanitario.	UN		$ 89,801	$ 96,910	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.60	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 24,067	$ 25,964	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.61	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 31,747	$ 34,254	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.62	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 42,465	$ 45,812	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.63	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 25,915	$ 27,960	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.64	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 34,251	$ 36,948	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.65	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 45,444	$ 49,022	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.66	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 39,793	$ 42,930	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.67	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 52,334	$ 56,456	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.68	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 76,494	$ 82,519	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.69	Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidrolavadora con agua a presión.	ML		$ 74,886	$ 80,775	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.70	Suministro e instalación de flotador de entrada de 1/2" para tanque hidrostático elevado. Incluye retiro del flotador averiado y regulación de nuevo flotador.	UN		$ 77,894	$ 84,037	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.71	Suministro e instalación de orinal. Incluye suministro de tornillería de anclaje, grifería y empaques.	UN		$ 599,584	$ 646,968	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.72	Suministro en instalación de taza sanitario de árbol.	UN		$ 538,290	$ 580,792	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.73	Suministro e instalación de tanque con sistema ahorrador para sanitario.	UN		$ 326,494	$ 352,277	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.74	Suministro e instalación de palanca de descarga para sanitario de árbol.	UN		$ 66,109	$ 71,334	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.75	Suministro e instalación de Aqua-Stop para sanitario.	UN		$ 105,633	$ 113,970	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.76	Suministro e instalación de grifería para sanitario de árbol.	UN		$ 155,184	$ 167,420	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.77	Suministro e instalación de acople (manguera) para sanitario.	UN		$ 43,825	$ 47,282	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.78	Suministro e instalación de sifón sosco de 2" con pegante y boquilla.	UN		$ 75,284	$ 81,219	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.79	Suministro e instalación de árbol de entrada hidrostático tipo Grival.	UN		$ 208,430	$ 224,864	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONTRATO No. 018 DE 2026**				**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**PLAZO INICIAL:**	**6 MESES**	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**PLAZO ADICIONAL:**		**Fecha Acta:** **23/10/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	**PLAZO FINAL:**	**6 MESES**	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0	**FECHA DE INICIACION:**	**04/09/2026**	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	**FECHA TERMINACION:**	**31/12/2026**	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.80	Suministro e instalación de válvula push de descarga antivandálica completa, incluye: regata, desmonte válvula averiada, pegantes, empaques, resanes. No incluye reposición de cerámica.	UN		$ 683,918	$ 737,818	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.81	Suministro e instalación de lavamanos tipo mesón flotante en cuarzo con base metálica estructural calibre 16.	ML		$ 1,560,437	$ 1,683,797	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.82	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 34,357	$ 37,073	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.83	Tapa registro 20x20 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 143,266	$ 154,607	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.84	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 193,032	$ 208,299	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.85	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 264,122	$ 285,022	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.86	Dispensador institucional de jabón 36 onz en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 219,039	$ 236,345	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.87	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 1,162,123	$ 1,253,843	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.88	Barra para discapacitados, recta fija a muro L=60 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 196,115	$ 211,608	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.89	Barra para discapacitados, superior en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 286,871	$ 309,539	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.90	Barra para discapacitados, piso a muro en "L" en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 350,147	$ 377,786	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.91	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push pico largo. (Suministro e instalación)	UN		$ 623,171	$ 672,312	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.92	Grifería kit valvula antivandálica para orinal. (Suministro e instalación)	UN		$ 573,180	$ 618,495	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.93	Lavamanos para discapacitados con grifería. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN		$ 1,003,318	$ 1,082,608	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS**											
11.1	Instalación a todo costo de Puntos de Corriente Normal (Incluye: Suministro del Cable Eléctrico Trenzado # 12. (4 mts. en promedio por punto).	UN		$ 123,868	$ 133,644	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.2	Instalación a todo costo de Puntos de Corriente Regulada (Incluye: Suministro del Cable Eléctrico Trenzado # 12. (4 mts. en promedio por punto).	UN		$ 138,327	$ 149,231	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.3	Instalación a todo costo de circuito de Corriente Normal y/o Regulada (Incluye: Suministro del Cable Eléctrico Trenzado # 12)	ML		$ 22,018	$ 23,753	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.4	Instalación a todo costo de acometida eléctrica principal trifásica en 3 cables calibre No.8, un cable calibre No.10 y un cable calibre No.12 verde en tubo de 1" EMT galvanizado con accesorios y curvas RETIE. Todo debidamente marquillado.	ML		$ 115,647	$ 124,782	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.5	Instalación a todo costo de acometida eléctrica principal trifásica en 4 cables calibre No.4 y un cable calibre No.8 en canaleta 100*45 o tubería EMT galvanizada de 1 1/2 ". Todo debidamente marquillado.	ML		$ 203,276	$ 219,343	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.6	Instalación a todo costo de acometida eléctrica bifásica de 220V en 3 cables calibre No.10 y un cable calibre No.12 verde, en tubo de 1" EMT galvanizado con accesorios y curvas RETIE.	ML		$ 97,327	$ 105,007	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.7	Instalación a todo costo de acometida eléctrica bifásica de 220V en 3 cables calibre No.12 y en tubo de 3/4" EMT galvanizado con accesorios y curvas RETIE.	ML		$ 70,278	$ 75,814	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.8	Instalación a todo costo de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 y en tubo EMT de 3/4". Incluye accesorios tales como codos, uniones, abrazaderas y terminales de 3/4".	ML		$ 70,557	$ 76,113	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.9	Instalación a todo costo de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 desde el tablero hasta donde se requiera. Incluye amarres y encintado.	ML		$ 41,058	$ 44,313	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.10	Instalación a todo costo de circuito monofásico en 3 cables No. 12 para alimentación de tomas dobles. Incluye encintado de empalmes en ducto existente metálico de 1/2" o 3/4".	ML		$ 44,235	$ 47,733	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.11	Instalación a todo costo de acometida monofásica a 220V en 2 cables No. 10 y un cable No. 12.	ML		$ 61,701	$ 66,565	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.12	Instalación a todo costo de circuito monofásico en 2 cables No. 12 para alimentación de luminarias. Incluye encintado de empalmes.	ML		$ 33,528	$ 36,179	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.13	Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.20 mm * 0.12 mm * 2.00 m con adhesivo.	ML		$ 41,744	$ 45,050	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.14	Suministro e instalación de canaleta plástica de 10cm * 4 cm * 2.00 m con división. Incluye chazos y tornillería.	ML		$ 84,314	$ 90,967	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.15	Suministro e instalación de canaleta plástica media caña para cableado de piso con adhesivo.	ML		$ 57,758	$ 62,318	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.16	Cambio de tubos led de 9W, 18W	UN		$ 41,026	$ 44,259	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.17	Suministro e instalación de panel led de sobreponer de 18W.	UN		$ 70,662	$ 76,237	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.18	Suministro e instalación de panel led de18W de incrustar.	UN		$ 78,399	$ 84,582	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.19	Suministro e instalación de panel led de 24W de sobreponer.	UN		$ 97,761	$ 105,469	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.20	Suministro e instalación de extractor de aire de 200 a 300 watts a 110 voltios.	UN		$ 421,726	$ 455,078	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.21	Suministro e instalación de caja de 4 o 6 circuitos con barraje independiente.	UN		$ 343,567	$ 370,729	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.22	Suministro e instalación de breaker enchufable de 3*60. Todo debidamente marquillado, identificando cada uno de los circuitos.	UN		$ 491,614	$ 530,456	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.23	Suministro e instalación de tomacorriente con protección de falla a tierra (GFCI), para uso en zonas húmedas.	UN		$ 161,042	$ 173,770	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.24	Suministro e instalación de cajas eléctricas de sobreponer para tomacorriente o switch, de uso interior.	UN		$ 36,548	$ 39,427	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.25	Suministro e instalación de reflector led de 150W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN		$ 301,864	$ 325,730	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.26	Suministro e instalación de reflector led de 100W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN		$ 246,131	$ 265,583	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.27	Suministro e instalación de reflector de 200W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN		$ 378,241	$ 408,106	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.28	Suministro e instalación de juego de abrazaderas para riel chanel de soporte de tubería hidráulica o eléctrica. Incluye: Tramo riel chanel, 4 varillas 3/8" rosca corrida de 0,60 m a 1,00 m de largo, 4 chazos metálicos expansivos, tuercas y arandelas.	UN		$ 367,351	$ 396,352	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.29	Suministro e instalación de troquel triple para tomacorriente normal, regulado y datos.	UN		$ 61,328	$ 66,171	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.30	Suministro e instalación de punto de 110V para iluminación. Incluye regata, resanes, caja, cable No. 14, de varios colores interruptor y todos los accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento.	PTO		$ 151,430	$ 163,358	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.31	Suministro e instalación de luminarias de incrustar y/o sobre poner de 0,60 x 0,60 m. (Incluye cable y todos los accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento)	UN		$ 197,166	$ 212,731	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.32	Suministro e instalación de tomacorriente normal o regulado.	UN		$ 46,390	$ 50,055	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.33	Suministro e instalación de interruptor sencillo, doble o triple.	UN		$ 94,065	$ 101,496	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.34	Instalación de canaleta 10 x 4 calibre 22 en pintura electroestática.	ML		$ 99,216	$ 107,048	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.35	Suministro e instalación de canaleta metálica de 15 a 21 cm de alto *27 cm de ancho con pestañas de anclaje perforadas de 2,5 cm y pestañas de auto ensamble, pintada con pintura electrostática blanca. Incluye chazos y tornillería.	ML		$ 279,082	$ 301,123	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.36	Marquillado de puntos electricos	UN		$ 12,232	$ 13,196	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.37	Suministro e instalacion de marcos en aluminio de incrustar o sobreponer para luminaria de 60x60cm	UN		$ 82,486	$ 89,010	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONTRATO No. 018 DE 2026**				**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**PLAZO INICIAL:**	**6 MESES**	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**PLAZO ADICIONAL:**		**Fecha Acta:** **23/10/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	**PLAZO FINAL:**	**6 MESES**	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0	**FECHA DE INICIACION:**	**04/09/2026**	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	**FECHA TERMINACION:**	**31/12/2026**	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.38	Suministro e instalación de breaker 2*30 amperios enchufable.	UN		$ 151,960	$ 163,965	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.39	Suministro e instalación de breaker 2*20 amperios enchufable.	UN		$ 140,175	$ 151,250	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.40	Suministro e instalación de breaker 2*15 amperios enchufable.	UN		$ 128,291	$ 138,427	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.41	Instalación de breaker 2*15, 2*20, 2*30 amperios enchufable.	UN		$ 38,315	$ 41,338	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.42	Suministro e Instalación de Bandeja Portables Tipo Rejiban. (Incluye Accesorios de Sujeción)	ML		$ 170,388	$ 183,854	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.43	Suministro e instalación de escalerilla portacable de 30 x 6 cm, en lámina metálica galvanizada en caliente, con su respectiva tapa metálica galvanizada y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación (tornillos, pernos, uniones y soportes).	ML		$ 302,378	$ 326,302	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.44	Suministro e instalación de tubería EMT 1/2".	ML		$ 35,770	$ 38,599	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.45	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4".	ML		$ 48,425	$ 52,254	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.46	Suministro e instalación de tubería EMT 1".	ML		$ 68,912	$ 74,376	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.47	Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2".	ML		$ 95,654	$ 103,204	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.48	Suministro e instalación de gabinete cofre doble fondo RETIE 100×80×30 mm IP55 CL16.	UN		$ 1,282,607	$ 1,383,924	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.49	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos, en gabinete metálico con puerta.	UN		$ 694,824	$ 749,701	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.50	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos, en gabinete metálico con puerta.	UN		$ 976,367	$ 1,053,316	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.51	Suministro e instalación de tablero Bifásico 50A 8 circuitos.	UN		$ 528,080	$ 569,689	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.52	Suministro e instalación de tablero Trifásico 50A 12 circuitos.	UN		$ 707,222	$ 762,936	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.53	Suministro e instalación de tablero Bifásico 75A 12 circuitos.	UN		$ 721,982	$ 779,022	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.54	Suministro e instalación de tablero Trifásico 150A 24 circuitos, con espacio para totalizador.	UN		$ 1,558,514	$ 1,681,595	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.55	Suministro e instalación de tablero Bifásico 100A 20 circuitos.	UN		$ 904,763	$ 976,195	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.56	Cable N°14 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 7,214	$ 7,784	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.57	Cable N°12 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 9,225	$ 9,954	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.58	Cable N°10 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 13,455	$ 14,516	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.59	Cable N°8 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 20,899	$ 22,547	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.60	Cable N°6 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 33,514	$ 36,156	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.61	Cable N°4 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 52,146	$ 56,258	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.62	Tubería Conduit PVC certificada 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 9,941	$ 10,725	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.63	Tubería Conduit PVC certificada 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 13,882	$ 14,976	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.64	Tubería Conduit PVC certificada 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 18,001	$ 19,424	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.65	Coraza Metalica Certificada de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)	ML		$ 39,673	$ 42,806	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.66	Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 26,410	$ 28,496	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.67	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 35,473	$ 38,274	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.68	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 48,884	$ 52,743	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.69	Puesta a tierra compuesta por una varilla cooper welld 5/8" X 2,44m. (Suministro e instalación. Incluye soldadura exotermica 115 gr.)	UN		$ 230,608	$ 248,818	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12	**RED DE VOZ Y DATOS**											
12.1	Suministro e instalación de punto de datos en categoría 6A incluye: Cable UTP Cat6A, Jack Cat6A, Face Plate CAT6A, Patch Cord de 1 y 3 mts CAT6A Ductería y canalización. (4 mts. en promedio por punto)	UN		$ 185,825	$ 200,489	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.2	Cable UTP Cat 6A. Incluye Suministro y tendido, accesorios de montaje	ML		$ 12,411	$ 13,390	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.3	Patch cords RJ45-RJ45 de 2 m. de longitud y flexibles categoría 6A,)	UN		$ 23,428	$ 25,277	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.4	Suministro e instalación de switch de red de 48 puertos, con capacidad para conexión de datos en topología estructurada, incluyendo, accesorios de montaje, bandejas y organizadores de cables.	UN		$ 2,504,383	$ 2,701,717	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.5	Certificaciones de Puntos Cat 6a	UN		$ 23,093	$ 24,920	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.6	Suministro e instalación de Herraje categoría 6A, de 24 puestos.	UN		$ 1,182,571	$ 1,275,839	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.7	Mantenimiento de UPS. (Incluye suministro de baterías y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.)	UN		$ 595,979	$ 643,066	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
13	**TRASCIEGO DE ELEMENTOS**											
13.1	Trasiego de elementos (muebles de oficina y/o puestos de trabajo y/o equipos de oficinas)	GBL		$ 478,976	$ 516,820	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14	**OTRAS LABORES**											
14.1	Impermeabilizacion de fachada con hidrofugo transparente a dos manos. (Incluye andamios, equipos, hidrofugo)	M2		$ 36,311	$ 39,178	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.2	Suministro y aplicación de acabado de piso en gravilla lavada. Incluye retiro de acabado en mal estado, picado de la superficie, aplicación de mortero del espesor requerido, manejo y lavado de la gravilla.	M2		$ 121,571	$ 131,160	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
14.3	Suministro e instalación de concertina de seguridad. (Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.)	ML		$ 134,295	$ 144,899	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.4	Suministro e instalación de señalización guia evacuación, oficina, etc.	ML		$ 30,167	$ 32,551	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.5	Suministro e instalación de blackout.	M2		$ 460,454	$ 496,798	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.6	Suministro e instalación de borde metalico para escaleras, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ML		$ 40,688	$ 43,902	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.7	Reparación de membrana PVC existente	M2		$ 53,081	$ 57,274	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.8	Reparación y/o mantenimiento de bordillos	ML		$ 36,101	$ 38,953	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.9	Reparación de rejilla de aguas lluvias	M2		$ 86,031	$ 92,820	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.10	Suministro e instalación de gargola, incluye el desmonte y taponamiento de gargola existente. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	UN		$ 233,367	$ 251,780	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026					ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
14.11	Suministro y instalación de alfajias en poliuretano con acabado en graniplast	ML		$ 69,349	$ 74,819	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.12	Suministro e instalacion de malla plastica	ML		$ 12,497	$ 13,482	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
15	**ASEO GENERAL**											
15.1	Aseo y/o limpieza general. (Por sitio de intervenido)	M2		$ 7,562	$ 8,159	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
15.2	Trasiego, cargue, retiro y disposición final de escombros y sobrantes.	M3		$ 161,937	$ 174,707	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
15.3	Limpieza de cajas de inspeccion o sumideros	UN		$ 48,520	$ 52,357	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
ITEM NO PREVISTOS												
NP.01	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con MEMBRANA DE PVC marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO O SIMILAR, resistente a rayos UV de 1.2mm de espesor termo fundida, color blanca o gris claro que incluye: preparación de la superficie, instalación de perfilería de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil 1600Nt , aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias y anclajes, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes.	M2		$ 262,373		$ 0		$ 0	200.00	$ 52,474,600	200.00	$ 52,474,600
NP.02	Inyección de fisura con resina epoxica de baja viscosidad tipo SIKADUR 35 LV HI MOD que incluye; limpieza de la fisura, sello con resina epoxica tipo SIKADUR PANEL/31 y aplicación por gravedad de la resina epoxica hasta saturación.	GL		$ 1,382,564		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.03	Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca interlift (4 paradas) palacio de justicia florencia sede de tribunales	UND		$ 949,292		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.04	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia sede tribunales conforme a las siguientes descripciones: motor: diésel cummins	UND		$ 3,623,924		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.05	Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de variador de velocidad Monarch 4007 - 220V para ascensor.	UND		$ 14,470,400		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.06	Suministro de gas refrigerante R32.	LIBRA		$ 82,000		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.07	Suministro e instalación de cinta vinilo.	ROLLO		$ 16,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.08	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*12	ML		$ 20,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.09	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*10	ML		$ 27,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.10	Suministro e instalacion de Manguera plastica para drenaje	ML		$ 16,800		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.11	Suministro e instalacion de Aislamineto térmico Rubatex	ML		$ 19,934		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP.12	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" para red central de drenaje	ML		$ 18,427		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.13	suministro e instalacion de contactor de 32 amp	UND		$ 468,230		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.14	suministro e instalacion de breaker 3*40	UND		$ 175,007		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.15	Suministro e instalacion de totalizador 160 amp	UND		$ 704,179		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.16	Suministro e instalacion de llave de cortina de 2 1/2"	UND		$ 1,536,459		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.17	Suministro e instalacion de cargador de bateria 12 v 8 amp para planta electrica	UND		$ 1,057,261		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.18	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia,sede tribunales conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba jockey r.c.i y demás partes que la conforman.	GL		$ 4,663,995		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.19	Destaponamiento de Drenaje	GLB		$ 31,685		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
	VALOR BASICO DE OBRA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 80,015,961**		**$ 80,015,961**
	IVA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 15,203,033**		**$ 15,203,033**
	VALOR TOTAL					**$ 0**		**$ 0**		**$ 95,218,994**		**$ 95,218,994**

SON: **NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($95.218.993,59)**

FERNANDO DANIEL FAJARDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026					ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR

CONSOLIDADO DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO - PRESENTE ACTA

IVA % 19.00%

MUNICIPIO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL	% PART.
FLORENCIA	$ 80,015,961.00	$ 15,203,032.59	$ 95,218,993.59	100.00%
TOTAL	**$ 80,015,961.00**	**$ 15,203,032.59**	**$ 95,218,993.59**	**100.00%**
DIFERENCIA VS. ACTA (debe ser 0)	$ 0.00			

DETALLE DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO (según memorias de cantidades)

MUNICIPIO	ÍTEM	CANT.	V/UNIT	VALOR
FLORENCIA	4.1	442.47	$ 39,727	$ 17,578,006
FLORENCIA	4.3	415.59	$ 23,974	$ 9,963,355
FLORENCIA	NP.01	200.00	$ 262,373	$ 52,474,600
TOTAL				**$ 80,015,961**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I; 3 manos.**	**NO. ITEM**	**4.1**
		UNIDAD	**M2**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Alto	Profundidad				
PASILLO PISO 1 SEDE TRIBUNAL	*6.10*	*3.36*		1.00	M2	20.50	
	0.80	*3.36*		1.00	M2	2.69	
	5.60	*3.36*		1.00	M2	18.82	
	0.80	*3.36*		1.00	M2	2.69	
	4.00	*3.36*		1.00	M2	13.44	
	0.80	*3.36*		1.00	M2	2.69	
	2.90	*3.36*		1.00	M2	9.74	
	3.20	*3.36*		1.00	M2	10.75	
	8.70	*3.36*		1.00	M2	29.23	
	20.00	*3.36*		1.00	M2	67.20	
OFICINA SALA AUDIENCIAS JUZGADDOS ADMINISTRATIVOS 1	8.70	3.36		2.00	M2	58.46	
	4.00	3.36		2.00	M2	26.88	
OFICINA SALA AUDIENCIAS JUZGADDOS ADMINISTRATIVOS 2	8.70	3.36		2.00	M2	58.46	
	4.00	3.36		2.00	M2	26.88	
OFICINA SALA AUDIENCIAS JUZGADDOS ADMINISTRATIVOS 3	8.70	3.36		2.00	M2	58.46	
	4.00	3.36		2.00	M2	26.88	
OFICINA SECRETARIA SALA PENAL	4.00	3.36		2.00		26.88	
DESCUENTOS VENTANAS	2.16	1.80		-1.00	M2	-3.89	
	1.53	1.28		-1.00	M2	-1.96	
	1.70	1.27		-1.00	M2	-2.16	
DESCUENTOS PUERTAS	0.90	2.12		-1.00	M2	-1.91	
	0.90	2.12		-1.00	M2	-1.91	
	1.00	2.12		-3.00	M2	-6.36	
TOTAL						**442.47**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Suministro y aplicación de estuco plástico.**	**NO. ITEM**	**4.3**
		UNIDAD	**M2**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Alto	Profundidad				
PASILLO PISO 1 SEDE TRIBUNAL	*6.10*	*3.36*		1.00	M2	20.50	
	0.80	*3.36*		1.00	M2	2.69	
	5.60	*3.36*		1.00	M2	18.82	
	0.80	*3.36*		1.00	M2	2.69	
	4.00	*3.36*		1.00	M2	13.44	
	0.80	*3.36*		1.00	M2	2.69	
	2.90	*3.36*		1.00	M2	9.74	
	3.20	*3.36*		1.00	M2	10.75	
	8.70	*3.36*		1.00	M2	29.23	
	20.00	*3.36*		1.00	M2	67.20	
OFICINA SALA AUDIENCIAS JUZGADDOS ADMINISTRATIVOS 1	8.70	3.36		2.00	M2	58.46	
	4.00	3.36		2.00	M2	26.88	
OFICINA SALA AUDIENCIAS JUZGADDOS ADMINISTRATIVOS 2	8.70	3.36		2.00	M2	58.46	
	4.00	3.36		2.00	M2	26.88	
OFICINA SALA AUDIENCIAS JUZGADDOS ADMINISTRATIVOS 3	8.70	3.36		2.00	M2	58.46	
	4.00	3.36		2.00	M2	26.88	
DESCUENTOS VENTANAS	2.16	1.80		-1.00	M2	-3.89	
	1.53	1.28		-1.00	M2	-1.96	
	1.70	1.27		-1.00	M2	-2.16	
DESCUENTOS PUERTAS	0.90	2.12		-1.00	M2	-1.91	
	0.90	2.12		-1.00	M2	-1.91	
	1.00	2.12		-3.00	M2	-6.36	
TOTAL						**415.59**	



CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con MEMBRANA DE PVC marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO O SIMILAR, resistente a rayos UV de 1.2mm de espesor termo fundida, color blanca o gris claro que incluye: preparación de la superficie, instalación de perfilería de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil 1600Nt , aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias y anclajes, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes.**	**NO. ITEM**	**NP.01**
		UNIDAD	**M2**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Longitud	**ALTO**	**Profundidad**				
PALACIO DE JUSTICIA DE FLORENCIA TRIBUNALES				200.00	M2	200.00	
TOTAL						**200.00**	

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:		6 MESES			
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:				Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			PLAZO FINAL:		6 MESES			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0			FECHA DE INICIACION:		04/09/2026			
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:		31/12/2026			

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
II	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRASPORTE VERTICAL											
1.1	Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca gblarie (5 paradas) palacio de justicia florencia	UN		$ 949,292	$ 1,018,507	$ 0		$ 0	1.00	$ 949,292.00	$ 3.00	$ 2,847,876.00
1.2	Mantenimiento preventivo para elevador para trabajo en alturas en funcionamiento (palacio de justicia de florencia)	UN		$ 676,907	$ 726,229	$ 0		$ 0	1.00	$ 676,907.00	$ 3.00	$ 2,030,721.00
1.3	Mantenimiento preventivo para ascensor en funcionamiento. (palacio de justicia belen de los andaquies)	UN		$ 853,753	$ 915,919	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 2.00	$ 1,707,506.00
ITEM NO PREVISTOS												
NP.01	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con MEMBRANA DE PVC marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO O SIMILAR, resistente a rayos UV de 1.2mm de espesor termo fundida, color blanca o gris claro que incluye: preparación de la superficie, instalación de perfilería de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil 1600Nt , aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias y anclajes, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes.	M2		$ 262,373		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.02	Inyección de fisura con resina epoxica de baja viscosidad tipo SIKADUR 35 LV HI MOD que incluye; limpieza de la fisura, sello con resina epoxica tipo SIKADUR PANEL/31 y aplicación por gravedad de la resina epoxica hasta saturación.	GL		$ 1,382,564		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.03	Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca interlift (4 paradas) palacio de justicia florencia sede de tribunales	UND		$ 949,292		$ 0		$ 0	1.00	$ 949,292	1.00	$ 949,292
NP.04	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia sede tribunales conforme a las siguientes descripciones: motor: diésel cummins	UND		$ 3,623,924		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.05	Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de variador de velocidad Monarch 4007 - 220V para ascensor.	UND		$ 14,470,400		$ 0		$ 0	1.00	$ 14,470,400	1.00	$ 14,470,400
NP.06	Suministro de gas refrigerante R32.	LIBRA		$ 82,000		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.07	Suministro e instalación de cinta vinilo.	ROLLO		$ 16,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.08	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*12	ML		$ 20,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.09	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*10	ML		$ 27,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.10	Suministro e instalacion de Manguera plastica para drenaje	ML		$ 16,800		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.11	Suministro e instalacion de Aislamineto térmico Rubatex	ML		$ 19,934		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.12	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" para red central de drenaje	ML		$ 18,427		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.13	suministro e instalacion de contactor de 32 amp	UND		$ 468,230		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.14	suministro e instalacion de breaker 3*40	UND		$ 175,007		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.15	Suministro e instalacion de totalizador 160 amp	UND		$ 704,179		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.16	Suministro e instalacion de llave de cortina de 2 1/2"	UND		$ 1,536,459		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.17	Suministro e instalacion de cargador de bateria 12 v 8 amp para planta electrica	UND		$ 1,057,261		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		PLAZO INICIAL:	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA		PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370		PLAZO FINAL:	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0		FECHA DE INICIACION:	04/09/2026					
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370		FECHA TERMINACION:	31/12/2026					

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP.18	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia,sede tribunales conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba jockey r.c.i y demás partes que la conforman.	GL		$ 4,663,995		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.19	Destaponamiento de Drenaje	GLB		$ 31,685		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

	VALOR BASICO DE OBRA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 17,045,891.00**		**$ 22,005,795.00**
	IVA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 3,238,719.29**		**$ 4,181,101.05**
	VALOR TOTAL					**$ 0**		**$ 0**		**$ 20,284,610.29**		**$ 26,186,896.05**

SON: **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($20.284.610,29)**

FERNANDO DANIEL FAJARDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026										ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.									
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:		6 MESES				
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			PLAZO FINAL:		6 MESES				
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0			FECHA DE INICIACION:		04/09/2026				
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:		31/12/2026				

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR

CONSOLIDADO DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO - PRESENTE ACTA

IVA % 19.00%

MUNICIPIO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL	% PART.
FLORENCIA	$ 17,045,891.00	$ 3,238,719.29	$ 20,284,610.29	100.00%
TOTAL	**$ 17,045,891.00**	**$ 3,238,719.29**	**$ 20,284,610.29**	**100.00%**
DIFERENCIA VS. ACTA (debe ser 0)	$ 0.00			

DETALLE DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO (según memorias de cantidades)

MUNICIPIO	ÍTEM	CANT.	V/UNIT	VALOR
FLORENCIA	1.1	1.00	$ 949,292	$ 949,292
FLORENCIA	1.2	1.00	$ 676,907	$ 676,907
FLORENCIA	NP.03	1.00	$ 949,292	$ 949,292
FLORENCIA	NP.05	1.00	$ 14,470,400	$ 14,470,400
TOTAL				**$ 17,045,891**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca gblarie (5 paradas) palacio de justicia florencia**	**NO. ITEM**	**1.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Longitud	**ALTO**	**Profundidad**				
PALACIO DE JUSTICIA DE FLORENCIA OCTUBRE				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo para elevador para trabajo en alturas en funcionamiento (palacio de justicia de florencia)**	**NO. ITEM**	**1.2**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Longitud	**ALTO**	**Profundidad**				
PALACIO DE JUSTICIA DE FLORENCIA OCTUBRE				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca interlift (4 paradas) palacio de justicia florencia sede de tribunales**	**NO. ITEM**	**NP.03**
		UNIDAD	**UND**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Longitud	**ALTO**	**Profundidad**				
PALACIO DE JUSTICIA DE SEDE TRIBUNALES OCTUBRE				1.00	UND	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de variador de velocidad Monarch 4007 - 220V para ascensor.**	**NO. ITEM**	**NP.05**
		UNIDAD	**UND**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Longitud	**ALTO**	**Profundidad**				
PALACIO DE JUSTICIA DE SEDE TRIBUNALES OCTUBRE				1.00	UND	1.00	
TOTAL						**1.00**	

GARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/A UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
III	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS											
1.1	Revisión de los sistemas de alimentación electrico, tableros de transferencia y realización de pruebas de funcionalidad por una sede judicial	UN		$ 3,832,295		$ 0		$ 0	4.00	$ 15,329,180	4.00	$ 15,329,180
					$ 4,111,568				3.00	$ 12,334,704	3.00	$ 12,334,704
1.2	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia conforme a las siguientes descripciones: marca: puma motor: diésel enfriamiento por radiador de agua con salida de 3 fases batería 4dt, 1400	UN		$ 3,623,924	$ 3,888,080	$ 0		$ 0	1.00	$ 3,623,924	1.00	$ 3,623,924
1.3	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de puerto rico, conforme a las siguientes descripciones: marca: perkins motor: diesel serial: 3777eo1b	UN		$ 1,736,190	$ 1,862,658	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,862,658	1.00	$ 1,862,658
1.4	Mantenimiento preventivo y correctivo para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de belen de los andaquies, conforme a las siguientes descripciones: marca:toyama xp motor: diesel serial: tdg8500sle3dxp	UN		$ 1,486,679	$ 1,595,138	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,595,138	1.00	$ 1,595,138
1.5	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la planta eléctrica del palacio de justicia de albania, conforme a las siguientes descripciones: marca: kama motor: diesel serial: kde 6.500 t fases: 1x19, 6 amperes regulación de voltaje: avrtanque: 15 lts	UN		$ 1,619,695	$ 1,737,775	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,737,775	1.00	$ 1,737,775
1.6	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la motobomba de alta presión de agua del palacio de justicia de florencia, conforme a las siguientes descripciones: marca: siemens serial: 1la7113-2ya69.	UN		$ 1,135,123	$ 1,217,821	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,135,123	1.00	$ 1,135,123
1.7	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la motobomba alta presión eléctrica palacio de justicia de florencia, conforme a las siguientes descripciones: marca: weg instaldor. barnes tipo de bomba. centrifuga tipo de acoplamiento: monobloque tipo: eléctrico voltaje: 230 v	UN		$ 1,195,904	$ 1,282,971	$ 0		$ 0	2.00	$ 2,391,808	2.00	$ 2,391,808
1.8	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para las bombas de alta presión del palacio de justicia de belen de los andaquies. marca: pearl tipo de bomba. presión serial. c2p 30h36s tipo: electrico voltaje: 220 -440	UN		$ 822,231	$ 882,248	$ 0		$ 0	2.00	$ 1,764,496	2.00	$ 1,764,496
1.9	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para las bombas sumergibles del palacio de justicia de belen de los andaquies. 1. bomba electrosumergible de 1hp, 220v modelo robusta marca -aqua pak 2. equipo eyector duplex con dos bombas de a 1 hp c/u etiqueta de marca. barnes ne. 3-10-4-220	UN		$ 1,775,273	$ 1,904,768	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,904,768	1.00	$ 1,904,768

		CONTRATO No. 018 DE 2026										ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.										
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:	6 MESES						
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:						Fecha Acta:	23/10/2026
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR INICIAL :	$ 695,935,370			PLAZO FINAL:	6 MESES						
		VALOR ADICIONAL :	$ 0			FECHA DE INICIACION:	04/09/2026						
		VALOR FINAL :	$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:	31/12/2026						

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/A UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
2.0	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia, conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba respaldo r.c.i (1.2. hp - marca siemens) *bomba principal r.c.i *bomba jockey r.c.i (vertical de 5hp con 16 pasos 220/440 v) *tablero bomba principal (50 hp) *tablero bomba jockey (5 hp) *presostato bomba principal de 100-120 psi *presostato bomba principal respaldo de 100-120 psi *presostato bomba jockey de 120-140 psi y demás partes que la conforman.	UN		$ 4,663,995	$ 5,003,972	$ 0		$ 0	1.00	$ 4,663,995	1.00	$ 4,663,995
2.1	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de belén de los andaquies, conformado por los siguientes equipos: Tanque de almacenamiento de agua equipo diesel nacional q=250 gpm p=100 p.s.i marca. barnes elit-vse113 Bomba jockey 1.5hp multietapas vertical, 220/440 vac , inox, trifásica, 120 mca / 8 gpm marca: barmesa pumps *tablero bomba principal *tablero bomba jockey y demás partes que la conforman.	UN		$ 4,583,684	$ 4,917,583	$ 0		$ 0	1.00	$ 4,917,583	1.00	$ 4,917,583
ITEM NO PREVISTOS												
NP.01	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con MEMBRANA DE PVC marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO O SIMILAR, resistente a rayos UV de 1.2mm de espesor termo fundida, color blanca o gris claro que incluye: preparación de la superficie, instalación de perfilería de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil 1600Nt , aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias y anclajes, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes.	M2		$ 262,373		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.02	Inyección de fisura con resina epoxica de baja viscosidad tipo SIKADUR 35 LV HI MOD que incluye; limpieza de la fisura, sello con resina epoxica tipo SIKADUR PANEL/31 y aplicación por gravedad de la resina epoxica hasta saturación.	GL		$ 1,382,564		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.03	Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca interlift (4 paradas) palacio de justicia florencia sede de tribunales	UND		$ 949,292		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.04	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia sede tribunales conforme a las siguientes descripciones: motor: diésel cummins	UND		$ 3,623,924		$ 0		$ 0	1.00	$ 3,623,924	1.00	$ 3,623,924
NP.05	Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de variador de velocidad Monarch 4007 - 220V para ascensor.	UND		$ 14,470,400		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026										ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.										
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:	6 MESES						
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:						Fecha Acta:	23/10/2026
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR INICIAL :	$ 695,935,370			PLAZO FINAL:	6 MESES						
		VALOR ADICIONAL :	$ 0			FECHA DE INICIACION:	04/09/2026						
		VALOR FINAL :	$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:	31/12/2026						

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/A UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP.06	Suministro de gas refrigerante R32.	LIBRA		$ 82,000		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.07	Suministro e instalación de cinta vinilo.	ROLLO		$ 16,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.08	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*12	ML		$ 20,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.09	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*10	ML		$ 27,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.10	Suministro e instalacion de Manguera plastica para drenaje	ML		$ 16,800		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.11	Suministro e instalacion de Aislamineto térmico Rubatex	ML		$ 19,934		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.12	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" para red central de drenaje	ML		$ 18,427		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.13	suministro e instalacion de contactor de 32 amp	UND		$ 468,230		$ 0		$ 0	1.00	$ 468,230	1.00	$ 468,230
NP.14	suministro e instalacion de breaker 3*40	UND		$ 175,007		$ 0		$ 0	2.00	$ 350,014	2.00	$ 350,014
NP.15	Suministro e instalacion de totalizador 160 amp	UND		$ 704,179		$ 0		$ 0	1.00	$ 704,179	1.00	$ 704,179
NP.16	Suministro e instalacion de llave de cortina de 2 1/2"	UND		$ 1,536,459		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.17	Suministro e instalacion de cargador de bateria 12 v 8 amp para planta electrica	UND		$ 1,057,261		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.18	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia,sede tribunales conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba jockey r.c.i y demás partes que la conforman.	GL		$ 4,663,995		$ 0		$ 0	1.00	$ 4,663,995	1.00	$ 4,663,995
NP.19	Destaponamiento de Drenaje	GLB		$ 31,685		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
	VALOR BASICO DE OBRA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 63,071,494**		**$ 63,071,494**
	IVA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 11,983,584**		**$ 11,983,584**
	VALOR TOTAL					**$ 0**		**$ 0**		**$ 75,055,078**		**$ 75,055,078**

SON: **SETENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($75.055.077,86)**

FERNANDO DANIEL PAJARDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

		CONTRATO No. 018 DE 2026										**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**	
		OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.										
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS				**PLAZO INICIAL:**	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA				**PLAZO ADICIONAL:**					**Fecha Acta:**	**23/10/2026**
		VALOR INICIAL :	$ 695,935,370				**PLAZO FINAL:**	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		**VALOR ADICIONAL :**	$ 0				**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026					
		VALOR FINAL :	$ 695,935,370				**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026					

ITEM	**DESCRIPCION**	**CONDICIONES ORIGINALES**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
		UNID	**CANT**	**V/UNIT FLORENCIA**	**V/A UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASUETA**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
									CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**

CONSOLIDADO DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO - PRESENTE ACTA

IVA % 19.00%

MUNICIPIO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL	% PART.
FLORENCIA	$ 36,954,372.00	$ 7,021,330.68	$ 43,975,702.68	58.59%
ALBANIA	$ 1,737,775.00	$ 330,177.25	$ 2,067,952.25	2.76%
BELEN	$ 18,405,121.00	$ 3,496,972.99	$ 21,902,093.99	29.18%
PUERTO RICO	$ 5,974,226.00	$ 1,135,102.94	$ 7,109,328.94	9.47%
TOTAL	**$ 63,071,494.00**	**$ 11,983,583.86**	**$ 75,055,077.86**	**100.00%**
DIFERENCIA VS. ACTA (debe ser 0)	$ 0.00			

DETALLE DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO (según memorias de cantidades)

MUNICIPIO	ÍTEM	CANT.	V/UNIT	VALOR
FLORENCIA	1.1	4.00	$ 3,832,295	$ 15,329,180
PUERTO RICO	1.1	1.00	$ 4,111,568	$ 4,111,568
BELEN	1.1	2.00	$ 4,111,568	$ 8,223,136
FLORENCIA	1.2	1.00	$ 3,623,924	$ 3,623,924
PUERTO RICO	1.3	1.00	$ 1,862,658	$ 1,862,658
BELEN	1.4	1.00	$ 1,595,138	$ 1,595,138
ALBANIA	1.5	1.00	$ 1,737,775	$ 1,737,775
FLORENCIA	1.6	1.00	$ 1,135,123	$ 1,135,123
FLORENCIA	1.7	2.00	$ 1,195,904	$ 2,391,808
BELEN	1.8	2.00	$ 882,248	$ 1,764,496
BELEN	1.9	1.00	$ 1,904,768	$ 1,904,768
FLORENCIA	2.0	1.00	$ 4,663,995	$ 4,663,995
BELEN	2.1	1.00	$ 4,917,583	$ 4,917,583
FLORENCIA	NP.04	1.00	$ 3,623,924	$ 3,623,924
FLORENCIA	NP.13	1.00	$ 468,230	$ 468,230
FLORENCIA	NP.14	2.00	$ 175,007	$ 350,014
FLORENCIA	NP.15	1.00	$ 704,179	$ 704,179
FLORENCIA	NP.18	1.00	$ 4,663,995	$ 4,663,995
TOTAL				**$ 63,071,494**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	276-275-274-273-272-271-270
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Revisión de los sistemas de alimentación electrico, tableros de transferencia y realización de pruebas de funcionalidad por una sede judicial**	**NO. ITEM**	**1.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Longitud	ALTO	Profundidad			
PALACIO JUSTICIA PUERTO RICO RED PRINCIPAL				1.00	UN	1.00
PALACIO JUSTICIA BELEN TABLERO BOMBAS				1.00	UN	1.00
PALACIO JUSTICIA BOMBAS PEARL BELEN				1.00	UN	1.00
TOTAL						**3.00**
PALACIO JUSTICIA FLORENCIA BOMBAS JOCKEY				1.00	UN	1.00
PALACIA JUSTICIA FLORENCIA TABLERO CONTRA INCENDIOS PRINCIPAL				1.00	UN	1.00
PALACIO JUSTICIA FLORENCIA TABLERO CONTRA INCENDIOS SEGUNDARIO				1.00	UN	1.00
PALACIO JUSTICIA FLORENCIA TABLERO BOMBAS				1.00	UN	1.00
TOTAL						**4.00**
TOTAL						**14.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	251
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia conforme a las siguientes descripciones:** **marca: puma** **motor: diésel** **enfriamiento por radiador de agua** **con salida de 3 fases** **batería 4dt, 1400**	**NO. ITEM**	**1.2**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
GENERADOR ENERGIA FLORENCIA				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	268
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de puerto rico, conforme a las siguientes descripciones:** **marca: perkins** **motor: diesel** **serial: 3777eo1b**	**NO. ITEM**	**1.3**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PLANTA ELECTRICA PUERTO RICO				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	267
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de belen de los andaquies, conforme a las siguientes descripciones:** **marca:toyama xp** **motor: diesel** **serial: tdg8500sle3dxp**	**NO. ITEM**	**1.4**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PLANTA ELECTRICA BELEN				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	266
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la planta eléctrica del palacio de justicia de albania, conforme a las siguientes descripciones:** **marca: kama motor: diesel serial: kde 6.500 t fases: 1x19, 6 amperes** **regulación de voltaje: avrtanque: 15 lts**	**NO. ITEM**	**1.5**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PLANTA ELECTRICA ALBANIA				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	255
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la motobomba de alta presión de agua del palacio de justicia de florencia, conforme a las siguientes descripciones: marca: siemens serial: 1la7113-2ya69.**	**NO. ITEM**	**1.6**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PALACIO JUSTICIA FLORENCIA				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	258-257
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la motobomba alta presión eléctrica palacio de justicia de florencia, conforme a las siguientes descripciones:** **marca: weg** **instaldor. barnes** **tipo de bomba. centrifuga** **tipo de acoplamiento: monobloque** **tipo: eléctrico** **voltaje: 230 v**	**NO. ITEM**	**1.7**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PALACIO JUUSTICIA FLORENCIA BOMBA				1.00	UN	1.00	
PALACIO JUUSTICIA FLORENCIA BOMBA				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**2.00**	



CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	261-260
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para las bombas de alta presión del palacio de justicia de belen de los andaquies.** **marca: pearl** **tipo de bomba. presión** **serial. c2p 30h36s** **tipo: electrico** **voltaje: 220 -440**	**NO. ITEM**	**1.8**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PALACIO JUSTICIA BELEN BOMBA				2.00	UN	2.00	
TOTAL						**2.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	263-262
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para las bombas sumergibles del palacio de justicia de belen de los andaquies.** **1. bomba electrosumergible de 1hp, 220v** **modelo robusta** **marca -aqua pak** **2. equipo eyector duplex con dos bombas de a 1 hp c/u** **etiqueta de marca. barnes** **ne. 3-10-4-220**	**NO. ITEM**	**1.9**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
BOMBAS BELEN				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	253
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia, conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba respaldo r.c.i (1.2. hp - marca siemens) *bomba principal r.c.i *bomba jockey r.c.i (vertical de 5hp con 16 pasos 220/440 v) *tablero bomba principal (50 hp) *tablero bomba jockey (5 hp) *presostato bomba principal de 100-120 psi *presostato bomba principal respaldo de 100-120 psi *presostato bomba jockey de 120-140 psi y demás partes que la conforman.**	**NO. ITEM**	**2.0**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
RED CONTRA INCENDIOS FLORENCIA				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	265
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de belén de los andaquies, conformado por los siguientes equipos:** **Tanque de almacenamiento de agua equipo diesel nacional q=250 gpm p=100 p.s.i** **marca. barnes** **elit-vse113** **Bomba jockey 1.5hp multietapas vertical, 220/440 vac , inox, trifásica, 120 mca / 8 gpm** **marca: barmesa pumps** ***tablero bomba principal** ***tablero bomba jockey** **y demás partes que la conforman.**	**NO. ITEM**	**2.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
RED CONTRAINCENDIOS BELEN				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	265
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia sede tribunales conforme a las siguientes descripciones: motor: diésel cummins**	**NO. ITEM**	**NP.04**
		UNIDAD	**UND**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PLANTA SEDE TRIBUNALES				1.00	UND	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	270
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**suministro e instalacion de contactor de 32 amp**	**NO. ITEM**	**NP.13**
		UNIDAD	**UND**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PALACIO DE JUSTICIA FLORENCIA PRINCIPAL				1.00	UND	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	270
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**suministro e instalacion de breaker 3*40**	**NO. ITEM**	**NP.14**
		UNIDAD	**UND**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PALACIO DE JUSTICIA FLORENCIA PRINCIPAL				2.00	UND	2.00	
TOTAL						**2.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	272
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Suministro e instalacion de totalizador 160 amp**	**NO. ITEM**	**NP.15**
		UNIDAD	**UND**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PALACIO DE JUSTICIA FLORENCIA PRINCIPAL TABLERO DE BOMBAS				1.00	UND	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	252
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia,sede tribunales conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba jockey r.c.i y demás partes que la conforman.**	**NO. ITEM**	**NP.18**
		UNIDAD	**GL**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PLANTA GENERADORA SEDE TRIBUNALES				1.00	GL	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

		CONTRATO No. 018 DE 2026									**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		**CONTRATISTA:**		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		**PLAZO INICIAL:**	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		**SUPERVISOR:**		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA		**PLAZO ADICIONAL:**					**Fecha Acta:**	**23/10/2026**
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370		**PLAZO FINAL:**	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		**VALOR ADICIONAL :**		$ 0		**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026					
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370		**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026					

ITEM	**DESCRIPCION**	**CONDICIONES ORIGINALES**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
		UNID	**CANT**	**V/UNIT FLORENCIA**	**V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
									CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
IV	**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION**											
1.1	Mantenimientopreventivo equipos mini split (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)	UN		$ 164,308		$ 0		$ 0	10.00	$ 1,643,080.00	$ 31.00	$ 5,093,548.00
					$ 176,625	$ 0		$ 0	39.00	$ 6,888,375.00	$ 67.00	$ 11,833,875.00
1.2	Mantenimientopreventivo equipos cassette-piso techo (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)	UN		$ 177,518	$ 190,386	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 1.00	$ 177,518.00
					$ 190,386	$ 0		$ 0	11.00	$ 2,094,246.00	$ 12.00	$ 2,284,632.00
1.3	Instalacion basica equipo mini split de 9000 12000 y 18000 btu (mano de obra)	UN		$ 1,024,118	$ 1,084,999	$ 0		$ 0	13.00	$ 13,313,534.00	$ 17.00	$ 17,410,006.00
1.4	Instalacion basica equipo mini split de 24000 y 36000 btu (mano de obra)	UN		$ 1,354,355		$ 0		$ 0	3.00	$ 4,063,065.00	$ 4.00	$ 5,417,420.00
					$ 1,420,002	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,420,002.00	$ 1.00	$ 1,420,002.00
1.5	Instalacion basica equipo 60000 btu (mano de obra)	UN		$ 1,523,810	$ 1,707,598	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,523,810.00	$ 1.00	$ 1,523,810.00
1.6	Desmonte de aire acondicionado equipo mini split de 9000 hasta 18000 btu (mano de obra) y entrega en almacen del palacio de justicia o en sitio de nueva instalcion	UN		$ 137,258	$ 151,500	$ 0		$ 0	13.00	$ 1,784,354.00	$ 18.00	$ 2,470,644.00
1.7	Desmonte de aire acondicionado equipos mini split de 24000 hasta 60000 btu (mano de obra) y entrega en almacen del palacio de justicia o en sitio de nueva instalcion	UN		$ 186,936		$ 0		$ 0	4.00	$ 747,744.00	$ 4.00	$ 747,744.00
					$ 206,286	$ 0		$ 0	1.00	$ 206,286.00	$ 1.00	$ 206,286.00
1.8	Suministro e instalacion de cinta vinilo	GBL		$ 21,292	$ 23,502	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1.9	Programacion de aires acondicionados de 9000 a 60000 btu	UN		$ 111,702	$ 123,431	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.0	Resane y pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos del muro donde se instale o desistale el aire acondicionado	ML		$ 122,060	$ 134,666	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.1	Suministro e instalacion de aislamiento termico rubatex	LB		$ 19,759	$ 21,818	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.2	Suministro y ajuste de carga refrigerante r-22 para equipos convencionales	LB		$ 98,255	$ 108,524	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.3	Suminstro y ajuste de carga refrigerante r-410 para equipos ecologicos y tecnologia inverter	LB		$ 72,536		$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
					$ 80,098	$ 0		$ 0	2.00	$ 160,196.00	$ 2.00	$ 160,196.00
2.4	carga completa de refrigerante r-22 para equipos convencionales	LB		$ 283,717	$ 312,615	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.5	Carga completa de refrigerante r-410 para equipos ecologicos y tecnologia inverter	UN		$ 219,597	$ 243,190	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.6	Suministro e instalacion de motor fancoi de 9000 btu	UN		$ 508,641	$ 561,688	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.7	Suministro e instalacion de motor de 12000 btu	UN		$ 551,915	$ 609,333	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 1.00	$ 551,915.00
2.8	Suministro e instalacion de motor fancoi de 18000 btu	UN		$ 567,799	$ 627,216	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.9	Suministro e instalacion de motor fancoi de 24000 btu	UN		$ 618,129	$ 682,654	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.0	Suministro e instalacion de motor fancoi de 36000 btu	UN		$ 759,960	$ 839,092	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.1	Suministro e instalacion de motor fancoi tipo techo de 36000 btu	UN		$ 838,901	$ 926,039	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.2	Suministro e instalacion de motor fancoi tipo caste de 36000 btu	UN		$ 829,317	$ 915,910	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.3	Suministro e instalacion de motor para condesador de 9000 btu	UN		$ 570,474	$ 629,893	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.4	Suministro e instalacion de motor para condesador de 12000 btu	UN		$ 620,269	$ 684,716	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.5	Suministro e instalacion de motor para condesador de 18000 btu	UN		$ 641,547	$ 708,595	$ 0		$ 0	1.00	$ 641,547.00	$ 1.00	$ 641,547.00

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONTRATO No. 018 DE 2026**				**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**PLAZO INICIAL:**	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**PLAZO ADICIONAL:**		**Fecha Acta:** **23/10/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	**PLAZO FINAL:**	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0	**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.6	Suministro e instalacion de motor para condesador de 24000 btu	UN		$ 698,566	$ 771,391	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.7	Suministro e instalacion de motor para condesador de 36000 btu	UN		$ 769,554	$ 849,582	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.8	Suministro e instalacion de motor para condesador de 60000 btu	UN		$ 765,366	$ 845,172	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.9	Suministro e instalacion de capacitores 1,5 micro faradios	UN		$ 77,468	$ 85,527	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.0	Suministro e instalacion de capacitores 3,0 micro faradios	UN		$ 77,979	$ 86,072	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.1	Suministro e instalacion de capacitores 3,5 micro faradios	UN		$ 81,753	$ 90,228	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.2	Suministro e instalacion de capacitores 5,0 micro faradios	UN		$ 79,286	$ 87,595	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.3	Suministro e instalacion de capacitores 10 micro faradios	UN		$ 81,589	$ 90,106	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.4	Suministro e instalacion de capacitores 15 micro faradios	UN		$ 82,133	$ 90,685	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.5	Suministro e instalacion de capacitores 25 micro faradios	UN		$ 85,905	$ 94,839	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.6	Suministro e instalacion de capacitores 30 micro faradios	UN		$ 99,927	$ 110,308	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.7	Suministro e instalacion de capacitores 35 micro faradios	UN		$ 100,585	$ 111,009	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.8	Suministro e instalacion decapacitores 45 micro faradios	UN		$ 99,444	$ 109,803	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.9	Suministro e instalacion de capacitores 55 micro faradios	UN		$ 110,609	$ 122,199	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.0	Suministro e instalacion de capacitores 60 micro faradios	UN		$ 111,355	$ 122,994	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.1	Suministro e instalacion de contactor 3 polos 40 amp	UN		$ 131,883	$ 145,633	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.2	Suministro e instalacion de contactor 3 polos 50 amp	UN		$ 225,711	$ 249,174	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.3	Suministro e instalacion de contactor 3 polos 60 amp	UN		$ 280,636	$ 309,752	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.4	Suministro e instalacion de contactor 3 polos 75 amp	UN		$ 330,286	$ 364,733	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.5	Suministro y programacion de control remoto mini split de 9000 a 24000 btu	UN		$ 148,973		$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
					$ 164,470	$ 0		$ 0	2.00	$ 328,940.00	$ 2.00	$ 328,940.00
5.6	Suministro y programacion de control remoto mini split de 36000 a 60000 btu	UN		$ 154,655	$ 170,706	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.7	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split de 9000 btu	UN		$ 458,133	$ 505,565	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.8	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini splist de 12000 btu	UN		$ 495,020	$ 546,149	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.9	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split de 18000 btu	UN		$ 532,345	$ 587,200	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.0	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split de 24000 btu	UN		$ 639,589	$ 706,520	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.1	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split de 36000 btu	UN		$ 683,307	$ 754,634	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.2	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split inverter (facoil)	UN		$ 880,827	$ 972,543	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.3	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split inverter (unidad condensadora)	UN		$ 1,067,648	$ 1,178,546	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,067,648.00	$ 2.00	$ 2,135,296.00
6.4	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split piso techo de 36000 btu	UN		$ 2,325,021	$ 2,567,165	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.5	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para tipo casete de 60000 btu	UN		$ 2,491,408	$ 2,750,247	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		PLAZO INICIAL:	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA		PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370		PLAZO FINAL:	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0		FECHA DE INICIACION:	04/09/2026					
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370		FECHA TERMINACION:	31/12/2026					

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
6.6	Suministro e instalacion de transformador de 40 w	UN		$ 153,204	$ 169,082	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.7	Suministro e instalacion de transformador de 75 w	UN		$ 364,094	$ 401,739	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.8	Suministro e instalacion de bomba de condensado	UN		$ 600,957	$ 663,411	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 1.00	$ 600,957.00
6.9	Suministro e instalacion de motor step - persiana - para mini split - 9000 btu	UN		$ 121,038	$ 133,635	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.0	Suministro e instalacion de motor step - persiana - para mini split - 12000 btu	UN		$ 117,527	$ 129,876	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.1	Suministro e instalacion de motor step - persiana - para mini split 18000 btu	UN		$ 131,405	$ 145,121	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.2	Suministro e instalacion de motor step persiana para mini split- 24000 btu	UN		$ 147,203	$ 162,537	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.3	Suministro e instalacion de motor step persiana para mini split 36000 btu	UN		$ 168,385	$ 185,882	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.4	Suministro e instalacion de terminal hembra o terminal macho	UN		$ 31,675	$ 34,984	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.5	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 4 x 10	ML		$ 36,767	$ 40,577	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.6	Suministro e instalacion de cable electrico concetrico 4 x 12	ML		$ 24,290	$ 26,815	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.7	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 4 x 14	ML		$ 21,192		$ 0		$ 0	60.50	$ 1,282,116.00	$ 71.50	$ 1,515,228.00
					$ 23,408	$ 0		$ 0	5.00	$ 117,040.00	$ 5.00	$ 117,040.00
7.8	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 3x12	UN		$ 18,995	$ 20,977	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.9	Suministro e instalacion de breaker 20 amp	UN		$ 75,557	$ 83,418	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 4.00	$ 302,228.00
8.0	Suministro e instalacion de breaker 30 amp	UN		$ 75,146	$ 82,985	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.1	Suministro e instalacion de breaker 40 amp	UN		$ 84,474	$ 93,263	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.2	Suministro e instalacion de breaker 50 amp	UN		$ 93,764	$ 103,497	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.3	Suministro e instalacion de breaker 2 x 20 amp	UN		$ 101,319	$ 111,810	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.4	Suministro e instalacion de breaker 2 x 30 amp	UN		$ 102,598	$ 113,338	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.5	Suministro e instalacion de breaker 2 x 40 amp	UN		$ 115,784	$ 127,875	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.6	Suministro e instalacion de breaker 2 x 50 amp	UN		$ 160,585	$ 177,312	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.7	Suministro e instalacion de breaker 3x90 amp	ML		$ 255,946	$ 282,541	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.8	Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 1/2 pulgada	ML		$ 45,278	$ 50,007	$ 0		$ 0	12.00	$ 543,336.00	$ 20.00	$ 905,560.00
8.9	Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 1/4 pulgada	ML		$ 24,131		$ 0		$ 0	12.00	$ 289,572.00	$ 26.00	$ 627,406.00
					$ 26,645	$ 0		$ 0	4.00	$ 106,580.00	$ 4.00	$ 106,580.00
9.0	Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 3/8 pulgada	ML		$ 33,735	$ 37,242	$ 0		$ 0	12.50	$ 421,688.00	$ 18.50	$ 624,098.00
9.1	Suministro e instalacion de tuberia de refrigeracion (cobre) 5/8 pulgada	ML		$ 63,576		$ 0		$ 0	12.50	$ 794,700.00	$ 12.50	$ 794,700.00
					$ 70,224	$ 0		$ 0	4.00	$ 280,896.00	$ 4.00	$ 280,896.00
9.2	Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 7/8 pulgada	UN		$ 86,670	$ 95,709	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		PLAZO INICIAL:	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA		PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370		PLAZO FINAL:	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0		FECHA DE INICIACION:	04/09/2026					
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370		FECHA TERMINACION:	31/12/2026					

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
9.3	Suministro e instalacion de uniones de cobre 1/2 pulgadas	UN		$ 25,518	$ 28,165	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.4	Suministro e instalacion de uniones de cobre 1/4 de pulgada	UN		$ 14,551	$ 16,074	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.5	Suministro e instalacion de uniones de cobre 3/8 pulgada	UN		$ 18,229	$ 20,131	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.6	Suministro e instalacion de uniones de cobre 5/8 pulgada	UN		$ 31,768	$ 35,071	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.7	Suministro e instalacion de uniones de cobre 7/8 pulgada	UN		$ 41,855	$ 46,198	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.8	Suministro e instalacion de codos de cobre 1/2 pulgada	UN		$ 25,807	$ 28,477	$ 0		$ 0	13.00	$ 335,491.00	$ 13.00	$ 335,491.00
9.9	Suministro e instalacion de codos de cobre 1/4 pulgada	UN		$ 14,984	$ 16,536	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.0	Suministro e instalacion de codos de cobre 3/8 pulgadas	UN		$ 18,548	$ 20,471	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.1	Suministro e instalacion de codos de cobre 5/8 pulgadas	UN		$ 32,320	$ 35,661	$ 0		$ 0	10.00	$ 323,200.00	$ 10.00	$ 323,200.00
10.2	Suministro e instalacion de codos de cobre 7/8 pulgadas	ML		$ 41,085	$ 45,372	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.3	Suministro e instalacion de canaleta plastica 100 x 45	ML		$ 48,148	$ 53,162	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.80	$ 38,518.00
10.4	Suministro e instalacion de tuberia pvc 1/2"	UN		$ 10,015	$ 11,060	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.5	Suministro e instalacion de codos pvc 1/2"	UN		$ 2,945	$ 3,253	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.6	Suministro e instalacion de uniones pvc 1/2"	ML		$ 2,965	$ 3,273	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.7	Suministro e instalacion de maguera plastica para drenaje	UN		$ 16,798	$ 18,541	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.8	Suministro e instalacion de mogollas (caucho)	UN		$ 11,422	$ 12,608	$ 0		$ 0	68.00	$ 776,696.00	$ 68.00	$ 776,696.00
10.9	Suministro e instalacion de soporte metalico en pie de amigo para condensadora de 9000 a 18000 btu	UN		$ 108,932	$ 120,300	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.0	Suministro e instalacion de soporte metalico en pie de amigo para condensadora de 24000 btu	UN		$ 132,117	$ 145,976	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.1	Suministro e instalacion de soporte metalico en pie de amigo para condensadora de 36000 a 60000 btu	M2		$ 148,385	$ 163,911	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.2	Suministro e instalacion de aspa para condensadora	UN		$ 151,991	$ 167,856	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.3	Suministro e instalacion de capilares	UN		$ 132,844	$ 146,675	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.4	Cambio rodamientos motor condensadora y unidad manejadora	UN		$ 316,487	$ 349,357	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.5	Suministro e instalacion de chaquetas en foil de aluminio	ML		$ 304,711	$ 336,282	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.6	Suministro e instalacion de compresores hermeticos de 3.0 t.r.	UN		$ 6,541,602	$ 7,228,623	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.7	Suministro e instalacion de compresores hermeticos de 4.0 t.r.	UN		$ 7,500,365	$ 8,286,085	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.8	Suministro e instalacion de compresores hermeticos de 5.0 t.r.	UN		$ 9,200,865	$ 10,162,313	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.9	Suministro e instalacion de compresores rotativo de 12000 btu convencional	UN		$ 1,110,105	$ 1,225,819	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.0	Suministro e instalacion de compresores rotativo de 18000 btu convencional	UN		$ 1,275,138	$ 1,407,729	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.1	Suministro e instalacion de compresores rotativo de 24000 btu convencional	UN		$ 1,540,236	$ 1,700,004	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.2	Suministro e instalacion de compresores rotativo de 9000 btu convencional	UN		$ 1,072,790	$ 1,184,362	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.3	Suministro e instalacion de control de presion alta y baja mixto	UN		$ 162,524	$ 179,526	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.4	Suministro e instalacion de control de presion de aceite	UN		$ 386,704	$ 427,057	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.5	Correccion de fuga y carga de refrigerante de 1 a 5 t.r.	GBL		$ 682,703	$ 753,768	$ 0		$ 0	1.00	$ 682,703.00	$ 1.00	$ 682,703.00

	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	Fecha Acta: 23/10/2026
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
12.6	Embobinado o rebobinado motor condensador aa de 9000 btu a 36000 btu	UN		$ 454,923	$ 502,403	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.7	Suministro e instalacion de filtro secador roscar 1/4" a 1/2"	UN		$ 158,300	$ 174,780	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.8	Suministro e instalacion de filtro secador roscar de 5/8" a 7/8	UN		$ 247,685	$ 273,409	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.9	Suministro e instalacion de kit de arranque	UN		$ 131,580	$ 145,213	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.0	Fabricacion e instalacion ducto en lamina de piralum	ML		$ 500,633	$ 553,211	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.1	Suministro e instalacion de motor de 1 h.p. Para unidad condensadora	M2		$ 733,748	$ 810,614	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.2	Suministro e instalacion de motor de 1 h.p. Para unidad manejadora	M2		$ 763,194	$ 842,945	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.3	Suministro e instalacion de motor de 1/2 h.p. Para unidad condensadora	UN		$ 796,979	$ 880,054	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.4	Suministro e instalacion de motor 3/4" h.p. Para unidad condensadora	UN		$ 821,827	$ 907,281	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.5	Motor para unidad manejadora hasta 3/4" hp	UN		$ 892,889	$ 985,508	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.6	Suministro de nitrogeno	UN		$ 95,514	$ 105,473	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.7	Suministro e instalacion de piedra filtrante	UN		$ 157,953	$ 174,383	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.8	Suministro e instalacion de presostato de alta y baja presion tipo pila	M3		$ 193,555	$ 213,638	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.9	Protector de voltaje monofasico y trifasico	UN		$ 264,396	$ 291,764	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.0	Suministro e instalacion de refrigerante freon 141 para barrido	UN		$ 77,996	$ 86,053	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.1	Suministro e instalacion de tarjeta electronica universal para mini split	UN		$ 176,226	$ 194,614	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.2	Suministro e instalacion de temporizador de 1 a 5 minutos	LB		$ 80,890	$ 89,352	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.3	Suministro e instalacion de termostato de ambiente de una etapa	UN		$ 339,296	$ 374,705	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.4	Valvula de expansion r-22- 5 t.r.	UN		$ 1,270,024	$ 1,402,238	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.5	Suministro e instalacion de valvula solenoide de 1 a 5 t.r.	UN		$ 893,898	$ 986,730	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.6	Suministro e instalacion de difusor de aire	UN		$ 382,984	$ 422,862	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.7	Rebobinado motor para unidad condensadora aa mini split	UN		$ 413,048	$ 455,950	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.8	Rebobinado motor para unidad manejadora aa mini split	UN		$ 485,047	$ 535,308	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.9	Reparacion tarjeta electronica para unidad manejadora o fancoil de 9000 a 60000 btu	UN		$ 488,206	$ 538,673	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.0	Suministro e instalacion de unidad manejadora o fancoil aa mini split 9000, 12000 btu (completa)	UN		$ 1,952,674	$ 2,155,559	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.1	Suministro e instalacion de unidad manejadora o fancoil aa mini split 18000, 24000 y 36000 btu (completa)	UN		$ 4,151,314	$ 4,586,725	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.2	Suministro e instalacion de unidad manejadora o fancoil aa mini split de 48000 a 60000 btu (completa)	UN		$ 7,329,392	$ 8,096,202	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.3	Suministro e instalacion de blower para unidad manejadora de 9000 a 36000 btu	UN		$ 468,228	$ 517,092	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.4	Suministro e instalacion de blower para unidad manejadora de 36000 a 60000 btu	UN		$ 1,377,175	$ 1,520,534	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

		CONTRATO No. 018 DE 2026									**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		**CONTRATISTA:**		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		**PLAZO INICIAL:**	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		**SUPERVISOR:**		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA		**PLAZO ADICIONAL:**					**Fecha Acta:**	**23/10/2026**
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370		**PLAZO FINAL:**	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		**VALOR ADICIONAL :**		$ 0		**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026					
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370		**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026					

ITEM	**DESCRIPCION**	**CONDICIONES ORIGINALES**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
		UNID	**CANT**	**V/UNIT FLORENCIA**	**V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
									CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
15.5	Suministro e instalacion de blower para unidad manejadora de 5 a 10 t.r.	UN		$ 2,165,090	$ 2,389,934	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.6	Suministro e instalacion de unidad condensadora aa (completa) mini split 9000, 12000 btu	UN		$ 2,848,796	$ 3,146,184	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.7	Suministro e instalacion de unidad condensadora aa (completa) mini split 18000 240000 btu	UN		$ 2,325,165	$ 2,567,294	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.8	Suministro e instalacion de unidad condensadora aa (completa) mini split 36000 480000 btu	UN		$ 5,507,310	$ 6,084,188	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.9	Suministro e instalacion de protector termico para compresores de 1 a 5 t.r.	UN		$ 101,420	$ 112,017	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.0	Suministro e instalacion de aceite sintectico para compresor	UN		$ 129,515	$ 143,013	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.1	Suministro e instalacion de aceite capella w 68	UN		$ 430,230	$ 474,961	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.2	Suministro e instalacion de suministro e instalacion de blower para evaporadora de 12.000, btu	UN		$ 253,930	$ 280,401	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.3	Suministro e instalacion de blower para evaporadora de 18.000 btu	GBL		$ 279,851	$ 308,953	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.4	Suministro e instalacion de blower para evaporadora de 24.000 btu	GBL		$ 344,099	$ 379,796	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.5	Suministro e instalacion de compresor rotativo de 9.000 btu inverter	UN		$ 1,226,760	$ 1,354,761	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.6	Suministro e instalacion de compresor rotativo de 12.00,btu inverter	UN		$ 1,517,795	$ 1,676,589	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.7	Suministro e instalacion de compresor rotativo de 18.000 btu inverter	UN		$ 1,791,479	$ 1,978,439	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.8	Suministro e instalacion de compresor rotativo de 24.000 btu inverter	UN		$ 1,933,180	$ 2,134,431	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.9	Suministro e instalacion de compresor scroll de 36.000 btu inverter	UN		$ 4,901,826	$ 5,410,880	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.0	Suministro e instalacion de compresor scroll de 48.000 btu inverter	UN		$ 7,055,433	$ 7,788,210	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.1	Suministro e instalacion de compresor scroll de 60.000 btu inverter	UN		$ 8,282,965	$ 9,141,161	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.2	Compresor scroll de 90.000 btu inverter	UN		$ 8,877,889	$ 9,810,274	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.3	Suministro e instalacion de compresor scroll de 120.000 btu inverter	UN		$ 15,116,425	$ 16,699,984	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.4	Suministro e instalacion de compresor scroll de 36.000 btu convencional	UN		$ 2,408,462	$ 2,660,135	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.5	Suministro e instalacion de compresor scroll de 48.000 btu convencional	UN		$ 2,796,376	$ 3,087,860	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.6	Suministro e instalacion de compresor scroll de 60.000 btu convencional	UN		$ 3,446,986	$ 3,805,408	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.7	Instalacion y reparacion de acometida de fuente de poder aires mini-split (convensional e inverter)	UN		$ 131,113	$ 144,714	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:		6 MESES			
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:				Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			PLAZO FINAL:		6 MESES			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0			FECHA DE INICIACION:		04/09/2026			
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:		31/12/2026			

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
17.8	Instalacion y reparacion de acometida de fuente de poder aires cassete	UN		$ 237,421	$ 262,176	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.9	Suministro e instalacion de baterias para control remoto	UN		$ 7,919	$ 8,439	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.0	Suministro e instalacion de tarjeta diaplay para unidad evaporadora	UN		$ 113,728	$ 125,261	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:	6 MESES				
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:				Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			PLAZO FINAL:	6 MESES				
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0			FECHA DE INICIACION:	04/09/2026				
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:	31/12/2026				

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
18.1	Suministro e instalacion de termistor para equipos minisplit	UN		$ 173,903	$ 193,524	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.2	Suministro e instalacion de curva plana 100x45	UN		$ 26,988	$ 29,403	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 1.00	$ 26,988.00
18.3	Suministro e instalacion de tapa final 100x45	UN		$ 21,402	$ 23,483	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.4	Suministro e instalacion de persiana frontal para equipo minisplit	UN		$ 182,933	$ 201,759	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.5	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 3x10	UN		$ 27,169	$ 29,811	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.6	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 3x14	UN		$ 16,177	$ 17,766	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.7	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 3x12	UN		$ 20,441	$ 22,456	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.8	Correccion de corto	UN		$ 80,472	$ 88,812	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.9	Suministro e instalacion de canaleta plastica cableado electrico	UN		$ 22,289	$ 24,530	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
19.0	Suministro e instalacion de canaleta plastica red de refrigeracion	UN		$ 51,723	$ 57,004	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ITEM NO PREVISTOS												
NP.01	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con MEMBRANA DE PVC marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO O SIMILAR, resistente a rayos UV de 1.2mm de espesor termo fundida, color blanca o gris claro que incluye: preparación de la superficie, instalación de perfilería de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil 1600Nt , aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias y anclajes, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes.	M2		$ 262,373		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.02	Inyección de fisura con resina epoxica de baja viscosidad tipo SIKADUR 35 LV HI MOD que incluye; limpieza de la fisura, sello con resina epoxica tipo SIKADUR PANEL/31 y aplicación por gravedad de la resina epoxica hasta saturación.	GL		$ 1,382,564		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.03	Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca interlift (4 paradas) palacio de justicia florencia sede de tribunales	UND		$ 949,292		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.04	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia sede tribunales conforme a las siguientes descripciones: motor: diésel cummins	UND		$ 3,623,924		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.05	Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de variador de velocidad Monarch 4007 - 220V para ascensor.	UND		$ 14,470,400		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.06	Suministro de gas refrigerante R32.	LIBRA		$ 82,000		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.07	Suministro e instalación de cinta vinilo.	ROLLO		$ 16,500		$ 0		$ 0	6.00	$ 99,000	6.00	$ 99,000
NP.08	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*12	ML		$ 20,500		$ 0		$ 0	124.50	$ 2,552,250	124.50	$ 2,552,250
NP.09	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*10	ML		$ 27,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.10	Suministro e instalacion de Manguera plastica para drenaje	ML		$ 16,800		$ 0		$ 0	6.00	$ 100,800	6.00	$ 100,800
NP.11	Suministro e instalacion de Aislamineto térmico Rubatex	ML		$ 19,934		$ 0		$ 0	163.50	$ 3,259,279	163.50	$ 3,259,279
NP.12	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" para red central de drenaje	ML		$ 18,427		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.13	suministro e instalacion de contactor de 32 amp	UND		$ 468,230		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

	CONTRATO No. 018 DE 2026				**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**PLAZO INICIAL:**	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**PLAZO ADICIONAL:**		**Fecha Acta:** **23/10/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	**PLAZO FINAL:**	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :** $ 0		**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP.14	suministro e instalacion de breaker 3*40	UND		$ 175,007		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.15	Suministro e instalacion de totalizador 160 amp	UND		$ 704,179		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.16	Suministro e instalacion de llave de cortina de 2 1/2"	UND		$ 1,536,459		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.17	Suministro e instalacion de cargador de bateria 12 v 8 amp para planta electrica	UND		$ 1,057,261		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.18	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia,sede tribunales conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba jockey r.c.i y demás partes que la conforman.	GL		$ 4,663,995		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.19	Destaponamiento de Drenaje	GLB		$ 31,685		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
	VALOR BASICO DE OBRA					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 47,848,174.00**		**$ 66,472,997.00**
	IVA					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 9,091,153.06**		**$ 12,629,869.43**
	VALOR TOTAL					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 56,939,327.06**		**$ 79,102,866.43**

SON: **CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($56.939.327,06)**

FERNANDO DANIEL FAJARDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

	CONTRATO No. 018 DE 2026										ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
	OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.									
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			PLAZO FINAL:	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :		$ 0			FECHA DE INICIACION:	04/09/2026					
	VALOR FINAL :		$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:	31/12/2026					

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASANARE	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR

CONSOLIDADO DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO - PRESENTE ACTA

IVA % 19.00%

MUNICIPIO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL	% PART.
FLORENCIA	$ 36,245,613.00	$ 6,886,666.47	$ 43,132,279.47	75.75%
ALBANIA	$ 529,875.00	$ 100,676.25	$ 630,551.25	1.11%
BELEN	$ 3,096,284.00	$ 588,293.96	$ 3,684,577.96	6.47%
CARTAGENA DEL CHAIRA	$ 529,875.00	$ 100,676.25	$ 630,551.25	1.11%
CURILLO	$ 529,875.00	$ 100,676.25	$ 630,551.25	1.11%
MILAN	$ 706,500.00	$ 134,235.00	$ 840,735.00	1.48%
MORELIA	$ 517,720.00	$ 98,366.80	$ 616,086.80	1.08%
PUERTO RICO	$ 1,087,272.00	$ 206,581.68	$ 1,293,853.68	2.27%
SAN JOSE DE LA FRAGUA	$ 2,660,679.00	$ 505,529.01	$ 3,166,208.01	5.56%
SAN VICENTE	$ 883,125.00	$ 167,793.75	$ 1,050,918.75	1.85%
SOLITA	$ 367,011.00	$ 69,732.09	$ 436,743.09	0.77%
VALPARAISO	$ 694,345.00	$ 131,925.55	$ 826,270.55	1.45%
TOTAL	**$ 47,848,174.00**	**$ 9,091,153.06**	**$ 56,939,327.06**	**100.00%**
DIFERENCIA VS. ACTA (debe ser 0)	$ 0.00			

DETALLE DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO (según memorias de cantidades)

MUNICIPIO	ÍTEM	CANT.	V/UNIT	VALOR
FLORENCIA	1.1	10.00	$ 164,308	$ 1,643,080
ALBANIA	1.1	3.00	$ 176,625	$ 529,875
BELEN	1.1	8.00	$ 176,625	$ 1,413,000
CARTAGENA DEL CHAIRA	1.1	3.00	$ 176,625	$ 529,875
CURILLO	1.1	3.00	$ 176,625	$ 529,875
MILAN	1.1	4.00	$ 176,625	$ 706,500
MORELIA	1.1	2.00	$ 176,625	$ 353,250
PUERTO RICO	1.1	4.00	$ 176,625	$ 706,500
SAN JOSE DE LA FRAGUA	1.1	3.00	$ 176,625	$ 529,875
SAN VICENTE	1.1	5.00	$ 176,625	$ 883,125
SOLITA	1.1	1.00	$ 176,625	$ 176,625
VALPARAISO	1.1	3.00	$ 176,625	$ 529,875
PUERTO RICO	1.2	2.00	$ 190,386	$ 380,772
BELEN	1.2	8.00	$ 190,386	$ 1,523,088
SOLITA	1.2	1.00	$ 190,386	$ 190,386
FLORENCIA	1.3	13.00	$ 1,024,118	$ 13,313,534
FLORENCIA	1.4	3.00	$ 1,354,355	$ 4,063,065

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS MINI SPLIT (INCLUYE MANO DE OBRA, FRANCOI, CONDENSADORA, LA BOMBA DE CONDENSADO Y SU RESPECTIVO DRENAJE ETC.)**	**NO. ITEM**	**1.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
CUARTO MONITOREO	ED. PRINCIPAL	2	0301	1	1.00	1
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 315	ED. PRINCIPAL	2	0320	1	1.00	1
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 315	ED. PRINCIPAL	2	0319	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	043	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304 - DESPACHO MG	ED TRIBUNALES	2	0324	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 3 OF 303	ED TRIBUNALES	2	0322	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 3 OF 303 - DESPACHO MG	ED TRIBUNALES	2	0323	1	1.00	1
JUZGADO 1 DE RESTITUCION DE TIERRAS	ED TRIBUNALES	2	0321	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA DESPACHO 3 OFICINA 306 - SALA PENAL	ED TRIBUNALES	2	044	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA DESPACHO 3 OFICINA 306 - DESPACHO MG	ED TRIBUNALES	2	045	1	1.00	1
TOTAL						**10.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO








CARLOS MARIO RUENDA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	MUNICIPIOS (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS MINI SPLIT (INCLUYE MANO DE OBRA, FRANCOI, CONDENSADORA, LA BOMBA DE CONDENSADO Y SU RESPECTIVO DRENAJE ETC.)**	**NO. ITEM**	**1.1 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
ALBANIA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIA, SECRETARIA, DESPACHO)	ALBANIA	2	0349, 0348, 0350	3	1.00	3
BELEN - EDIFICIO JUDICIAL (DEPOSITO, RACK, LACTANCIA, DESPACHOS, SECRETARIA)	BELEN	2	0506, 0508, 0509, 0515, 0518, 0517, 0522, 0520	8	1.00	8
CARTAGENA DEL CHAIRA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (SECRETARIA, AUDIENCIA, DESPACHO)	CARTAGENA DEL CHAIRA	2	0337, 0338, 0339	3	1.00	3
CURILLO - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIA, SECRETARIA, DESPACHO)	CURILLO	2	0346, 0345, 0344	3	1.00	3
MILAN - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIAS, SECRETARIA, DESPACHO)	MILAN	2	0343, 0342, 0340, 0341	4	1.00	4
MORELIA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (DESPACHO, SECRETARIA)	MORELIA	2	0529, 0528	2	1.00	2
PUERTO RICO - JUZGADOS PROMISCUOS (AUDIENCIAS, DESPACHO 2, DESPACHO 3)	PUERTO RICO	2	0335, 0336, 0330, 0334	4	1.00	4
SAN JOSE DE LA FRAGUA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIA, DESPACHO, SECRETARIA)	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0503, 0502, 0501	3	1.00	3
SAN VICENTE DEL CAGUAN - JUZGADOS PROMISCUOS MUNICIPALES (AUDIENCIA, JUZGADO 1, JUZGADO 2)	SAN VICENTE	2	0327, 0329, 0331, 0326, 0325	5	1.00	5
SOLITA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (SECRETARIA)	SOLITA	2	0524	1	1.00	1
VALPARAISO - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIA, DESPACHO, SECRETARIA)	VALPARAISO	2	0527, 0526, 0525	3	1.00	3
TOTAL						**39.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO










CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	MUNICIPIOS (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS CASSETTE-PISO TECHO (INCLUYE MANO DE OBRA, FRANCOI, CONDENSADORA, LA BOMBA DE CONDENSADO Y SU RESPECTIVO DRENAJE ETC.)**	**NO. ITEM**	**1.2 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
PUERTO RICO - JUZGADO 3 PROMISCUO CIRCUITO - SECRETARIA (40000 BTU)	PUERTO RICO	2	0333	1	1.00	1
PUERTO RICO - JUZGADO 2 PROMISCUO CIRCUITO - SECRETARIA (40000 BTU)	PUERTO RICO	2	0332	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #1 (40000 BTU)	BELEN	2	0510	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #2 (40000 BTU)	BELEN	2	0511	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #3 (40000 BTU)	BELEN	2	0512	1	1.00	1
BELEN - AUDITORIO (60000 BTU)	BELEN	2	0513	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PROYECTADO - SECREATARIA (40000 BTU)	BELEN	2	0514	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA (40000 BTU)	BELEN	2	0519	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - SECRETARIA (40000 BTU)	BELEN	2	0516	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CIRCUITO - SECRETARIA (40000 BTU)	BELEN	2	0521	1	1.00	1
SOLITA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA (40000 BTU)	SOLITA	2	0523	1	1.00	1
TOTAL						**11.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO








CARLOS MARIO BLENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)**	**NO. ITEM**	**1.3**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**			
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	1	1.00	1
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0309-0310	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA -DESPACHO OF 205	ED TRIBUNALES	2	0453	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0459	1	1.00	1
TOTAL						**13.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO








CARLOS MARIO BLENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (MANO DE OBRA)**	**NO. ITEM**	**1.4**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
SALA DE AUDIENCIA OF105	ED. PRINCIPAL	2	0314	1	1.00	1
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	1	1.00	1
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	1	1.00	1
TOTAL						**3.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO









CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	SAN JOSE DE LA FRAGUA (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (MANO DE OBRA)**	**NO. ITEM**	**1.4 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0505	1	1.00	1
TOTAL						**1.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARLOS MARIO BUENO VIEDMA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**INSTALACION BASICA EQUIPO 60000 BTU (MANO DE OBRA)**	**NO. ITEM**	**1.5**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN				
SECRETARIA - TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL OF 308	ED TRIBUNALES	2	0315-0316	1	1.00	1	   
TOTAL						**1.0**	

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (MANO DE OBRA) Y ENTREGA EN ALMACEN DEL PALACIO DE JUSTICIA O EN SITIO DE NUEVA INSTALCION**	**NO. ITEM**	**1.6**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	1	1.00	1
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0309-0310	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA -DESPACHO OF 205	ED TRIBUNALES	2	0453	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0459	1	1.00	1
TOTAL						**13.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO








CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (MANO DE OBRA) Y ENTREGA EN ALMACEN DEL PALACIO DE JUSTICIA O EN SITIO DE NUEVA INSTALCION**	**NO. ITEM**	**1.7**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0315-0316	1	1.00	1
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED. PRINCIPAL	2	0308-0314	1	1.00	1
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	1	1.00	1
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	1	1.00	1
TOTAL						**4.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	SAN JOSE DE LA FRAGUA (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (MANO DE OBRA) Y ENTREGA EN ALMACEN DEL PALACIO DE JUSTICIA O EN SITIO DE NUEVA INSTALCION**	**NO. ITEM**	**1.7 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0504	1	1.00	1
TOTAL						**1.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	BELEN DE LOS ANDAQUIES (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER**	**NO. ITEM**	**2.3 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**LB**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #1	BELEN	2	0510	2	1.00	2
TOTAL						**2.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENO VIEDMA
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 18000 BTU**	**NO. ITEM**	**3.5**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO 6° ADMINISTRATIVO	AD ADMINISTRATIVOS-TRIBUNALES	2	047	1	1.00	1
TOTAL						**1.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	VALPARAISO Y MORELIA (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU**	**NO. ITEM**	**5.5 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**			
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	VALPARAISO	2	0527	1	1.00	1
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MORELIA	2	0529	1	1.00	1
TOTAL						**2.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT INVERTER (UNIDAD CONDENSADORA)**	**NO. ITEM**	**6.3**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**				
JUZGADO 6° ADMINISTRATIVO	AD ADMINISTRATIVOS-TRIBUNALES	2	047	1	1.00	1	
TOTAL						**1.0**	





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14**	**NO. ITEM**	**7.7**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	5	1.00	5
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	5	1.00	5
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0309-0310	3	1.00	3
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED. PRINCIPAL	2	0308-0314	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	5	1.00	5
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	3	1.00	3
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	4.5	1.00	4.5
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	6	1.00	6
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	7.5	1.00	7.5
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	6	1.00	6
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	7.5	1.00	7.5
TOTAL						**60.5**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	SAN JOSE DE LA FRAGUA (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14**	**NO. ITEM**	**7.7 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0505	5	1.00	5
TOTAL						**5.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA**	**NO. ITEM**	**8.8**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	4	1.00	4
DESPACHO 2 OF 302 TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL	ED TRIBUNALES	2	0310	2.5	1.00	2.5
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	3.5	1.00	3.5
TOTAL						**12.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO



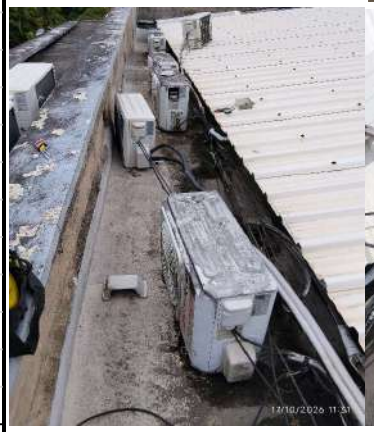

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA**	**NO. ITEM**	**8.9**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	4	1.00	4
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0310	2.5	1.00	2.5
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	3.5	1.00	3.5
TOTAL						**12.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO



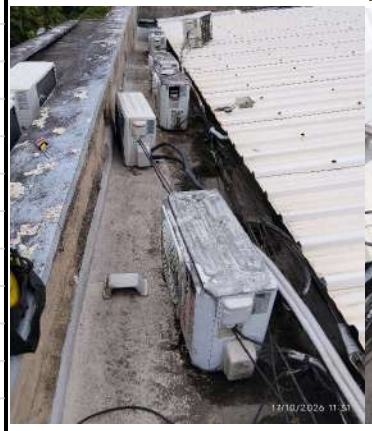

CARLOS MARIO RUEDA PIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	SAN JOSE DE LA FRAGUA (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA**	**NO. ITEM**	**8.9 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0505	4	1.00	4
TOTAL						**4.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA**	**NO. ITEM**	**9.0**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**			
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	5.5	1.00	5.5
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	7	1.00	7
TOTAL						**12.5**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA**	**NO. ITEM**	**9.1**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	5.5	1.00	5.5
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	7	1.00	7
TOTAL						**12.5**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	SAN JOSE DE LA FRAGUA (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA**	**NO. ITEM**	**9.1 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**			
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0505	4	1.00	4
TOTAL						**4.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUSTOS FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA**	**NO. ITEM**	**9.8**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA -DESPACHO OF 205	ED TRIBUNALES	2	0453	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0459	3	1.00	3
TOTAL						**13.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS**	**NO. ITEM**	**10.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	5	1.00	5
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	5	1.00	5
TOTAL						**10.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)**	**NO. ITEM**	**10.8**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	4	1.00	4
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0305-0316	4	1.00	4
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0309-0310	4	1.00	4
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED. PRINCIPAL	2	0308-0314	4	1.00	4
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	4	1.00	4
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	4	1.00	4
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA -DESPACHO OF 205	ED TRIBUNALES	2	0453	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	4	1.00	4
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0459	4	1.00	4
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	4	1.00	4
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	4	1.00	4
TOTAL						**68.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO









CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5 T.R.**	**NO. ITEM**	**12.5**
		UNIDAD	**GBL**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**			
SALA DE AUDIENCIA OF310	ED. PRINCIPAL	2	0302	1	1.00	1
TOTAL						**1.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA VINILO.**	**NO. ITEM**	**NP.07**
		UNIDAD	**ROLLO**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	1	1.00	1
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0305-0316	1	1.00	1
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED. PRINCIPAL	2	0308-0314	1	1.00	1
TOTAL						**6.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3*12**	**NO. ITEM**	**NP.08**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	2	059	5	1.00	5
RECURSOS HUMANOS- ARCHIVO	EDIFICIO PRINCIPAL	2	067	4	1.00	4
EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIO PRINCIPAL	2	100	50	1.00	50
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	5	1.00	5
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	5	1.00	5
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0309-0310	3	1.00	3
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED. PRINCIPAL	2	0308-0314	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	5	1.00	5
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	3	1.00	3
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	4.5	1.00	4.5
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	6	1.00	6
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	7.5	1.00	7.5
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	6	1.00	6
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	7.5	1.00	7.5
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0505	5	1.00	5
TOTAL						**124.5**

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PLASTICA PARA DRENAJE**	**NO. ITEM**	**NP.10**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**			
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - DESPACHO	EDIFICIO PRINCIPAL	2	025	5	1.00	5
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL OF 402	EDIFICIO PRINCIPAL	2	022	1	1.00	1
TOTAL						**6.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMINETO TÉRMICO RUBATEX**	**NO. ITEM**	**NP.11**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN				
DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	2	059	10	1.00	10	
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	2	001	30	1.00	30	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - OFICINA DE APOYO JUDICIAL - COORDINACION ADMINISTRATIVA	EDIFICIO PRINCIPAL	2	061	4	1.00	4	
RECURSOS HUMANOS- ARCHIVO	EDIFICIO PRINCIPAL	2	067	8	1.00	8	
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - DESPACHO	EDIFICIO PRINCIPAL	2	025	6	1.00	6	
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	4	1.00	4	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	12	1.00	12	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	4	1.00	4	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	8	1.00	8	
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0305-0316	2	1.00	2	
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0309-0310	5	1.00	5	
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED. PRINCIPAL	2	0308-0314	4	1.00	4	
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	4	1.00	4	
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	7	1.00	7	
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA -DESPACHO OF 205	ED TRIBUNALES	2	0453	1.5	1.00	1.5	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	4	1.00	4	
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	6	1.00	6	
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	7	1.00	7	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	8	1.00	8	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0459	4	1.00	4	
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	11	1	11	
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	14	1	14	
TOTAL						**163.5**	



CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONTROL DE EJECUCIÓN POR RUBRO						
RUBRO	**CAPÍTULO DEL ACTA**	**MONTO TOTAL CONTRATADO**	**EJECUTADO PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**
Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y arreglos locativos	I. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	$ 410,790,560.00	$ 95,218,993.59	$ 95,218,993.59	$ 315,571,566.41	23.18%
Mantenimiento aires acondicionados	IV. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION	$ 210,000,000.00	$ 56,939,327.06	$ 79,102,866.43	$ 130,897,133.57	37.67%
Mantenimiento Plantas Eléctricas, Bombas y Motobombas	III. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	$ 43,194,810.00	$ 75,055,077.86	$ 75,055,077.86	-$ 31,860,267.86	173.76%
Mantenimiento ascensores	II. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRASPORTE VERTICAL	$ 31,950,000.00	$ 20,284,610.29	$ 26,186,896.05	$ 5,763,103.95	81.96%
TOTAL CONTRATO		**$ 695,935,370.00**	**$ 247,498,008.80**	**$ 275,563,833.93**	**$ 420,371,536.07**	**39.60%**

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ALB0001

FECHA: 4 de marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Calle 5 No 3 - 23
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Albania - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHNCB	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1HN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY800063Y	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	1 de marzo de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 4 de marzo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	7 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 8 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	29 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ALB0002

FECHA: 4 de marzo de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Calle 5 No 3 - 23
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Albania - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHNCB	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1HN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY900029X	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUGADO PROMISCUO MUNICIPAL SALA DE AUDIENCIAS EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	1 de marzo de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	MMTO - AJUSTE GAS - CAPACITOR - 4 de marzo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	7 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 8 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	29 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ALB0003

FECHA: 4 de marzo de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Calle 5 No 3 - 23
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Albania - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	211TAWME1585	**SERIAL CONDENSADORA:**	2MPR6027	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	1 de marzo de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 4 de mayo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	4 de mayo de 2024
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 29 de spetiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0019

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YHJE18XJ6DTJRX	**MODELO CONDENSADORA:**	YHJE18YJ6DTJOX	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DEPOSITO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	2 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0015

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	011TASWEC718	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	RACK PISO 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO BANDEJA DRENAJE - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 2 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0008

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	011TACXEC883	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO DE LACTANCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	2 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 2 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0010

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	033KCEA19A56	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 3 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	CAMBIO TARJETA - 11 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 5:**	AJUSTE DE GAS	11 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 2 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0011

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	033KCHL19961	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 3 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	CAMBIO TARJETA - 11 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	2 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0009

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	033KCRM19958	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 2 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:

NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ

IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:

NOMBRE:

IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0017

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ60GMLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ60GMLA4	
SERIAL EVAPORADORA:	MEZ68513322	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	AUDITORIO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	RE UBICACIÓN CONDENSADORA 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	TRASLADO EQUIPO - 13 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	2 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0016

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GSJAA	**MODELO CONDENSADORA:**	AV5W48GFAJ	
SERIAL EVAPORADORA:	912TATGC8161	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DEL MUNICIPAL EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 7 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0001

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	003KCLH19A52	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 7 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0002

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GSJAA	**MODELO CONDENSADORA:**	AMNW12GS	
SERIAL EVAPORADORA:	912TAZFC8157	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 7 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0006

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	003KCTB19A52	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 7 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0013

FECHA: 8 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GSJAA	**MODELO CONDENSADORA:**	AV5W48GFAJ	
SERIAL EVAPORADORA:	912TAQPC8156	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA EQ 2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	6 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0012

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNLA4	
SERIAL EVAPORADORA:	033KCTB19A53	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA EQ 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 6 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0007

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GSJAA	**MODELO CONDENSADORA:**	AV5W48GFAJ	
SERIAL EVAPORADORA:	912TAZFC8157	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ3 PROYECTADO JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO 7 de novimebre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 2 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0014

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	003KCPS19960	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PROYECTADO EQ4	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO 7 de novimebre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 2 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0003

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	011TAZFEC885	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA EQ 3 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 6 octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ	**NOMBRE:**	
IDENTIFICACION	79.461.245	**IDENTIFICACION:**	

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CC001

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Cartagena del Chaira - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EH	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDCY900023K	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDPY900054	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115814	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 22 de junio de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	24 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACIONES:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CC002

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Cartagena del Chaira - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFN8NT0WCOI	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX13112CFN8	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130034	**SERIAL CONDENSADORA:**	HDEA9240120001	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO DEL JUEZ EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115796	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 22 de junio de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	24 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACIONES:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CC003

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Cartagena del Chaira - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM142C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM142C7
SERIAL EVAPORADORA:	911TAHQD4241	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA EQ3	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CU001

FECHA: 15 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: CURILLO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11D-24CRFN8	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX330-24CFN8	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDHA9280130003	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ 1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	6 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 29 de sptiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CU002

FECHA: 15 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: CURILLO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY900042A	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ 2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	6 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 29 de sptiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CU003

FECHA: 15 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: CURILLO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YSECO09FSADG	**MODELO CONDENSADORA:**	YSECO09FSADG	
SERIAL EVAPORADORA:	100001006140100000	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	9.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SALA DE AUDIENCIA EQ3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	5 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 29 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00195

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF261E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF261E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121901972	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 3 MAGISTRADA GILBERTO GALVIS AVE OF 303 TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIAR - LABORAL EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00196

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	911TAGHC6879	**SERIAL CONDENSADORA:**	007TACXHP883	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 3 MAGISTRADA GILBERTO GALVIS AVE OF 303 TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIAR - LABORAL EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00203

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121903756	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 MAG DIELA HORTENCIA LUZ MARINA ORTEGA CASTRO TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL OF 304 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE-UBICACIÓN	2 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00204

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121903759	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 MAG DIELA HORTENCIA LUZ MARINA ORTEGA CASTRO TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL OF 304 EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE-UBICACIÓN	2 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00193

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E7	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121904444	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 3 MAGISTRADA SAIDA MORENO OF 306 TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 9 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00194

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E7	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121904589	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 MAGISTRADA SAIDA MORENO OF 306 TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 9 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00201

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121903647	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL OF 302 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	26 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE- UBICACIÓN - 2 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00202

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFN5NT0W-COI	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130057	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL OF 302 EQ2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	26 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE- UBICACIÓN - 2 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00207

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF181C	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF181C	
SERIAL EVAPORADORA:	7072200639	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA - TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA OF 208 EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	REVISION - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE- UBICACIÓN	5 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00226

FECHA: 6 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF261E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF261E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121901846	**SERIAL CONDENSADORA:**	7121901892	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS 105	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 2 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00208

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF181E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF181E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121900362	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA - TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA OF 208 EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	CORRECION DE CORTO - 25 de marzo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE- UBICACIÓN	5 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00206

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF181E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF181E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121900441	**SERIAL CONDENSADORA:**	7121900160	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA - TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL OF 308 EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 2 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00205

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM1A5	
SERIAL EVAPORADORA:	311TAFZFV467	**SERIAL CONDENSADORA:**	310TADRE9930	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA - TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL OF 308 EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 2 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00224

FECHA: 6 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF261E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF261E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121901845	**SERIAL CONDENSADORA:**	7121901798	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS 107	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 19 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00225

FECHA: 6 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF261E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF261E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121901967	**SERIAL CONDENSADORA:**	7121901799	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS 106	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 19 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00215

FECHA: 26 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121904716	**SERIAL CONDENSADORA:**	7121904131	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO OF 205 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	4 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 19 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00217

FECHA: 26 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121903646	**SERIAL CONDENSADORA:**	7121904498	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 TRIBUNAL CONENCIOSO ADMINISTRATIVO OF 207 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	4 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 19 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00200

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11AB12CRNBNT0WEO	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 1 TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL OF 305 EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	26 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	DAÑO EN TARJETA ELECTRONICA - 25 de marzo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	21 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 21 de abril de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00230

FECHA: 21 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	54NQ18KL2PEEC26C02	**SERIAL CONDENSADORA:**	501TAEJST820	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 15 de septiembre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	TAJETA INTERIOR	21 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	MOTO CONDENSADORA - 21 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SIMPLY	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00030

FECHA: 8 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ELF181LQ	**MODELO CONDENSADORA:**	CLF181Q	
SERIAL EVAPORADORA:	7051900684	**SERIAL CONDENSADORA:**	150211	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO DE CAMARAS O MONITOREO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000110312	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 27 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 28 de septiembre de 2026	**OBSERVACIONES:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00016

FECHA: 22 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24DIEH	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24DIEH	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY900060R	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA 310 EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	97464	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 24 de junio de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	CORRECION DE FUGA	29 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00176

FECHA: 19 de enero de 2026

SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	906TAACDM192	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	CENTRO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS OF 315 EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000109303	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN DE TUBERIA - 14 de enero de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ	**NOMBRE:**	
IDENTIFICACION	79.461.245	**IDENTIFICACION:**	

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00175

FECHA: 19 de enero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM092C8	**MODELO CONDENSADORA:**	VM092C8	
SERIAL EVAPORADORA:	910TAQPAG004	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	9.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	CENTRO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS OF 315 EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000109295	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	6 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 15 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	15 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 6 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000137

FECHA: 4 de diciembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	4MYW4524A1000AA	**MODELO CONDENSADORA:**	4MYW4524A1000AA	
SERIAL EVAPORADORA:	3C85770060666	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R40A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS OF 403 EQ3 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000105001	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	9 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 22 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE-UBICACIÓN CONDENSADORA	15 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 3 de febrero de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	6 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MIL0001

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Milan - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YSEC24FSADG	**MODELO CONDENSADORA:**	YSE24FS	
SERIAL EVAPORADORA:	100001822140420107	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 ESCRIBIENTE	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	151617	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 2:**	PREVENTIVO	25 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MIL0002

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Milan - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHX	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHX	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG2PDPY900080H	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SALA DE AUDIENCIAS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	151617	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 25 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MIL0003

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Milan - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFNB	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX13012CFS	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ3 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 25 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MIL0004

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Milan - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TACXST739	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R41A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ4 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PRVENTIVO	25 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	-	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MOR0001

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Morelia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TAVYST735	**SERIAL CONDENSADORA:**	412TAYVJK650	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	26 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 26 de nomviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	9 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MOR0002

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Morelia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TAPESTB832	**SERIAL CONDENSADORA:**	501TAKKSQ611	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	26 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 26 de nomviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	9 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0028

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VO122H1	**MODELO CONDENSADORA:**	VO122H1	
SERIAL EVAPORADORA:	501CRFT52379	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 002 PROMISCUO CIRCUITO EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de octubre de 226	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0027

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM1A5	
SERIAL EVAPORADORA:	502TAZFHW357	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 002 PROMISCUO CIRCUITO EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	1UFPT	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de octubre de 226	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0025

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM1A5	
SERIAL EVAPORADORA:	502TAGHHW359	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 003 PRMISCUO EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	2UFPT	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0026

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VO122H1	**MODELO CONDENSADORA:**	VO122H1	
SERIAL EVAPORADORA:	501CRPY52480	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 003 PRMISCUO CIRCUITO EQ2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0024

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VO242H1	**MODELO CONDENSADORA:**	VO242H1	
SERIAL EVAPORADORA:	412CRYQ07226	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	2	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0023

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VO242H1	**MODELO CONDENSADORA:**	VO242H1	
SERIAL EVAPORADORA:	412CRNL07335	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	1	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° JF001

FECHA: 20 de diciembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: San José de Fragua - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11D24CRFN8NT0WCOI	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX33024CFN8NT0WCO0	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDHA9280130045	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 12 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 30 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° JF002

FECHA: 20 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: San José de Fragua - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFN8NT0WCOI	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX33024CFN8NT0WCO0	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130006	**SERIAL CONDENSADORA:**	54122000HDEA9240120047	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO DEL JUEZ EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 12 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 30 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° JF003

FECHA: 20 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	San José de Fragua - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY900046S	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA EQ3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 12 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 30 de septiembre de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	RE-UBICACIÓN	30 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° SV0001

FECHA: 7 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL: 310 297 3801
CIUDAD: San Vicente - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	4MYW4524A1000AA	**MODELO CONDENSADORA:**	4MYW4524A	
SERIAL EVAPORADORA:	63229962253	**SERIAL CONDENSADORA:**	6322996225	
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL EQ 1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	166869	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 11 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	13 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 17 de abril de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	22 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° SV0002

FECHA: 7 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL: 310 297 3801
CIUDAD: San Vicente - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRF18NT0WCCI	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX13012CFN8NT0WC00	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130040	**SERIAL CONDENSADORA:**	54122000HDEA9240120046	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL EQ 2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 11 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	DESMONTE - 16 de abril - 2024	**FECHA INTERVENCION 5:**	INSTALACION	16 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 22 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° SV0003

FECHA: 7 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL: 310 297 3801
CIUDAD: San Vicente - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFN8NTOWCCI	**MODELO CONDENSADORA:**	MSG11B12CRFN8NTOWCCI	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130040	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL EQ 2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 11 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	DESMONTE - 16 de abril de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	INSTALACION	16 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 22 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

0

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° SV0004

FECHA: 7 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL: 310 297 3801
CIUDAD: San Vicente - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TABNAC709	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 11 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 17 de abril de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	22 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

Nº SV0005

FECHA: 16 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL: 310 297 3801
CIUDAD: San Vicente - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TABNST733	**SERIAL CONDENSADORA:**	CJK688	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO DE EQUIPO	10 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 13 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	17 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 22 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ST0001

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Solita - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TARUST830	**SERIAL CONDENSADORA:**	501TANSSQ639	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	26 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 10 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ST0002

FECHA: 11 de junio de 2025

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Solita - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AUUQ40GH1A5	
SERIAL EVAPORADORA:	502TAULHW318	**SERIAL CONDENSADORA:**	501TAXTR4338	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	26 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 10 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° VLP0001

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Valparaiso - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YSEC24FS-ADG	**MODELO CONDENSADORA:**	YSE24FS	
SERIAL EVAPORADORA:	100001822140420095	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	151617	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	TRASLADO EQUIPO - 20 de ciiembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	8 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° VLP0002

FECHA: 26 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Valparaiso - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YSE09FS	**MODELO CONDENSADORA:**	YSE09FS	
SERIAL EVAPORADORA:	100001178130800026	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	9.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	1200000097461	**CODIGO EXTERNO:**	160981	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	TRASLADO DE EQUIPO - 20 de ciiembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	8 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° VLP0003

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Valparaiso - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MS121OE1	**MODELO CONDENSADORA:**	MS121OE1	
SERIAL EVAPORADORA:	240105722066305000000	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	BLUELINE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ3 ENTRADA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	160539	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	TRASLADO DE EQUIPO - 20 de ciiembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	8 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	BLUELINE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
I	MANTENIMIENTO DE INMUEBLES											
1	PRELIMINARES											
1.1	Proteccion de areas a intervenir (equipos, escritorios, etc) durante trabajo en oficinas.	M2		$ 14,709	$ 15,910	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.2	Desmonte de canales o bajantes de aguas lluvias.	ML		$ 16,095	$ 17,420	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.3	Revisión, mantenimiento y limpieza de cubierta existente. (Incluye arregblo de goteras y todos los elementos necesarios para su correcta reparación).	M2		$ 51,891	$ 56,121	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.4	Retiro de manto asfaltico, incluye limpieza de superficie con solventes y aplicación de calor.	M2		$ 28,543	$ 30,889	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.5	Desinstalación piso tipo vinisol o similar.	M2		$ 28,305	$ 30,652	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.6	Corte y desmonte de ducto en lámina.	ML		$ 60,389	$ 65,310	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.7	Corte y apertura de muros para paso de instalaciones	M2		$ 37,219	$ 40,260	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.8	Desmonte de cubierta existente.	M2		$ 38,366	$ 41,503	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.9	Desmonte de cielo raso existente.	M2		$ 24,695	$ 26,705	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.10	Desmonte de espejos.	UN		$ 57,194	$ 61,904	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.11	Desmonte de divisiones de Oficina. En Aluminio, madera o mamparas modulares (Incluye accesorios de fijación).	M2		$ 41,006	$ 44,385	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.12	Traslado de división de oficina (desarme, transporte, ensamble).	M2		$ 51,170	$ 55,379	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.13	Desmonte divisiones baño.	M2		$ 32,913	$ 35,638	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.14	Desmonte división en vidrio piso techo.	M2		$ 51,740	$ 55,995	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.15	Reinstalación de hoja de puerta en vidrio.	UN		$ 96,999	$ 104,965	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.16	Desmonte de rejas metálicas.	M2		$ 49,479	$ 53,545	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.17	Desmonte de pasamanos.	ML		$ 31,375	$ 33,952	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.18	Desmonte de aparatos sanitarios con recuperación de ellos.	UN		$ 71,945	$ 77,846	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.19	Desmonte de aparatos sanitarios para cambio.	UN		$ 78,880	$ 85,349	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.20	Desmonte de puerta en madera.	UN		$ 59,470	$ 64,347	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.21	Desmonte de puerta metálica.	UN		$ 76,479	$ 82,781	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.22	Desmonte de ventaneria metálica.	M2		$ 47,293	$ 51,188	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.23	Desmonte de puertas y/o ventanas en aluminio.	M2		$ 41,167	$ 44,559	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.24	Desmonte de lámparas.	UN		$ 51,372	$ 55,596	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.25	Desmonte de muebles en madera.	ML		$ 32,317	$ 34,975	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.26	Desmonte canaleta metálica.	ML		$ 27,133	$ 29,362	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.27	Desmonte de bandeja tipo rejiband	ML		$ 39,150	$ 42,368	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.28	Desmonte de puntos eléctricos.	UN		$ 36,460	$ 39,453	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
1.29	Desmonte cable UTP, normal y regulado.	ML		$ 24,932	$ 26,979	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.30	Desmonte de tableros eléctricos existentes.	UN		$ 177,940	$ 192,435	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.31	Desmonte de puntos hidráulicos y desagües.	UN		$ 85,864	$ 92,905	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.32	Demolición de pañetes.	M2		$ 31,811	$ 34,432	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.33	Demolición de poceta de aseo.	UN		$ 108,818	$ 117,771	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.34	Demolición de piso baldosa tipo granito o similar.	M2		$ 52,938	$ 57,296	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.35	Demolición de guarda escoba.	ML		$ 19,424	$ 21,021	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.36	Demolición de muro en drywall existente. Incluye estructura y todo lo necesario para la demolición del mismo.	M2		$ 53,951	$ 58,360	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.37	Demolición de enchape de piso y/o pared.	M2		$ 34,266	$ 37,067	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.38	Desmonte y retiro de tanque plástico elevado para almacenamiento de agua potable. Incluye desconexión de flotador, y entrada y salida de agua.	UN		$ 211,486	$ 228,831	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.39	Destaponamiento de sifón. Incluye desmonte, montaje y materiales requeridos.	UN		$ 44,337	$ 47,985	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.40	Desmonte de Tubería eléctrica galvanizada.	ML		$ 21,644	$ 23,425	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.41	Desmonte de tableros eléctricos existentes.	UN		$ 217,305	$ 235,176	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.42	Desmonte de interuptor existente.	UN		$ 12,843	$ 13,899	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
1.43	Desmonte de tomacorriente existente.	UN		$ 12,894	$ 13,953	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
2	IMPERMEABILIZACIONES											
2.1	Corrección de humedad (incluye resane, impermeabilización, estuco, pintura vinilo tipo 1 tres manos)	M2		$ 96,304	$ 104,521	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
2.2	Mantenimiento de manto existente. (Incluye elementos necesarios)	M2		$ 40,960	$ 44,449	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3	PISOS Y ENCHAPES											
3.1	Pulida y brillada de pisos existentes en granito. (Incluye equipos, pulida, cristalizada y brillada)	M2		$ 51,316	$ 55,378	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3.2	Reparación de andenes	M2		$ 129,285	$ 139,511	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3.3	Mantenimiento de juntas de enchape con boquilla, incluye limpieza y retiro existente.	M2		$ 28,784	$ 31,063	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3.4	Suministro e instalación de guardaescoba plastico	ML		$ 21,367	$ 23,063	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
3.5	Suministro e instalación de cinta antideslizante para escalones. Incluye retiro de la cinta existente, limpieza y todo lo relacionado para su correcta instalación.	ML		$ 45,561	$ 49,156	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4	PINTURA, ESTUCO Y ACABADOS											
4.1	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I; 3 manos.	M2		$ 39,727	$ 42,878	$ 0		$ 0	442.47	$ 17,578,006	442.47	$ 17,578,006
4.2	Suministro, aplicación de pintura 3 manos, para exterior.	M2		$ 35,803	$ 38,632	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.3	Suministro y aplicación de estuco plástico.	M2		$ 23,974	$ 25,864	$ 0		$ 0	415.59	$ 9,963,355	415.59	$ 9,963,355
4.4	Suministro e aplicación de graniplast.	M2		$ 48,406	$ 52,226	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.5	Suministro e aplicación de pasta acrilica.	M2		$ 30,140	$ 32,525	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.6	Suministro e instalación de pintura en esmalte para marcos metálicos, color similar al existente. (Incluye 1 capa en anticorrosivo)	ML		$ 27,283	$ 29,437	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.7	Pintura para puerta en madera, color similar al existente. (Incluye desmonte e instalación, lijada y/o resane)	UN		$ 155,142	$ 167,414	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.8	Pintura de guardaescoba.	ML		$ 27,239	$ 29,390	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.9	Suministro y aplicación de pintura de pasamanos y/o barandas existentes, incluye limpieza, lijado y todo lo relacionado para su correcta ejecución.	ML		$ 37,885	$ 40,888	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.10	Suministro y aplicación de pintura en esmalte. Incluye anticorrosivo.	M2		$ 40,165	$ 43,349	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.11	Pintura de gabinetes contra incendios	UN		$ 99,040	$ 106,860	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.12	Suministro y aplicación de pintura trafico pesado para demarcación lineal, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	ML		$ 15,223	$ 16,429	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
4.13	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado color negro para tapar señalización existente, e= 10 a 12 cm. Incluye limpieza y preparación de superficie	ML		$ 14,839	$ 16,017	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.14	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para demarcación. Incluye limpieza y preparación de superficie	M2		$ 37,132	$ 40,074	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.15	Suministro y aplicación de pintura tráfico pesado para numeración.	UN		$ 35,715	$ 38,543	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.16	Corte y resane de muros por paso de tuberias	UN		$ 74,508	$ 80,406	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
4.17	Suministro y aplicación de pintura conductiva o pintura antiestática (ESD) color negro en muros de cuarto de comunicaciones.	M2		$ 98,078	$ 105,840	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5	**CUBIERTA**											
5.1	Suministro e instalación de flanche metálico cal. 22". L=variable	ML		$ 71,331	$ 76,964	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.2	Sellado de tornillos con cinta asfaltica	M2		$ 12,514	$ 13,503	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.3	Suministro e instalación de canal en lámina galvanizada calibre 18. Ancho y altura variable, más las pestañas necesarias para rigidez.	ML		$ 236,047	$ 254,660	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.4	Suministro e instalación de lámina en policarbonato para cubierta de pérgola. Incluye tornillería, cintas de fijación, silicona y retiro de lámina averiada.	M2		$ 134,304	$ 144,897	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.5	Mantenimiento de canales y/o bajantes en PVC, por colmatación que impide libre evacuación de agua. Incluye lo necesario.	ML		$ 16,894	$ 18,232	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.6	Suministro e instalación de pasarela o plataforma de tránsito en cubierta, fabricada en lámina alfajor de aluminio de 2,4 mm de espesor, soportada en piedeamigos de hierro en ángulo cada 0,45 m. Incluye lo necesario para su correcta instalacion y funcionamiento.	ML		$ 364,501	$ 393,244	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.7	Instalacion de puntos de anclajes certificados.	UN		$ 283,018	$ 305,319	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.8	Pasarela para cubiertas en aluminio certificadas.	ML		$ 459,690	$ 495,917	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.9	Suministro e instalación de rejillas de sosco para los bajantes. Incluye producto aplicación de silicona.	UN		$ 40,210	$ 43,388	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.10	Destapada de sifón de terraza con sonda espiral y agua a presión.	UN		$ 57,459	$ 61,999	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.11	Limpieza de terrazas mediante barrido, lavado y retiro de sobrantes.	M2		$ 11,319	$ 12,216	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.12	Suministro e instalación de cinta asfaltica.	ML		$ 16,104	$ 17,377	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.13	Lavado de muros, fachadas o estructuras metálicas en altura con hidrolavadora. Incluye remoción y raspado previo de la superficie a intervenir con recolección de residuos.	M2		$ 31,925	$ 34,456	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026					ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
5.14	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 16 d=70 cm. (Suministro e instalación)	ML		$ 236,718	$ 255,391	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.15	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 20 d=50 cm. (Suministro e instalación)	ML		$ 168,565	$ 181,858	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.16	Canal en lámina galvanizada Cal. 18, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML		$ 196,331	$ 211,817	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.17	Canal de aguas lluvias en lámina galvanizada cal. 18 d=100 cm. (Suministro e instalación)	ML		$ 258,921	$ 279,333	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.18	Canal en lámina galvanizada Cal. 18, desarrollo 0,80 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML		$ 202,577	$ 218,593	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
5.19	Canal en lámina galvanizada Cal. 18, desarrollo 0,90 m. (Suministro e instalación. Incluye anticorrosivo, esmalte, anclajes)	ML		$ 218,505	$ 235,781	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6	**CIELO RASOS**											
6.1	Mantenimiento de cielo raso existente. Incluye láminas de fibra mineral.	M2		$ 68,128	$ 73,504	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6.2	Suministro e instalación de cielos raso falso en fibra mineral, de dimensiones 610mm x 610mm, color blanco, suspensores metálicos - perfiles livianos de 15/16" (24mm) o de 9/16 (15mm) a la vista, en acero electrogalvanizado con acabado en color blanco	M2		$ 147,351	$ 158,976	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6.3	Mantienimiento y adecuacion de muro y/o cielo raso en drywall, inlcuye lamina de drywall y terminacion en pintura en vinilo tipo dos, a tres manos.	M2		$ 73,421	$ 79,207	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6.4	Suministro e instalación de tapa de inspección en cieloraso con marco en aluminio en "T" y tapa de 60 cm * 60 cm.	UN		$ 157,089	$ 169,477	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
6.5	Mantenimiento de cielo raso existente en mortero, incluye retiro de texturizado existente, limpieza, impermeabilizante, nivelacion y terminado tipo garraplast.	M2		$ 70,278	$ 75,814	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7	**CAMBIO DE CHAPAS -GUARDA - LLAVES - BRAZO HIDRÁULICO**											
7.1	Cambio de guardas y llaves incluye (2 llaves por chapas).	UN		$ 106,167	$ 114,554	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.2	Suministro e instalación de cerradura de bola o manija.	UN		$ 126,060	$ 136,014	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.3	Mantenimiento y ajuste de brazo hidráulico para puerta de vidrio.	UN		$ 128,312	$ 138,448	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.4	Apertura cerradura de pomo o botón.	UN		$ 56,189	$ 60,635	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.5	Apertura cerradura de pomo fija o doble cilindro.	UN		$ 74,588	$ 80,480	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
7.6	Apertura pasador de seguridad.	UN		$ 49,991	$ 53,939	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.7	Apertura, cambio de guardas y elaboración de llaves cerradura de pomo.	UN		$ 92,116	$ 99,368	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.8	Instalación de chapa de seguridad con cantonera. Incluye perforación de puerta y marco de madera, y suministro de tornillería.	UN		$ 182,126	$ 196,498	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.9	Duplicado de llaves.	UN		$ 10,276	$ 11,089	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.10	Mantenimiento y lubricación de cerradura.	UN		$ 38,835	$ 41,905	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.11	Mantenimiento y reparación de bisagras de vaivén.	UN		$ 61,045	$ 65,873	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.12	Suministro de bisagra de vaivén.	UN		$ 148,379	$ 160,122	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.13	Mantenimiento (revisión y fijación) de bisagras en biblioteca de madera.	UN		$ 37,754	$ 40,748	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.14	Mantenimiento puerta de madera (cambio de bisagras y ajuste cantonera).	UN		$ 77,896	$ 84,050	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.15	Suministro e instalación de chapa pico de loro tipo Yale.	UN		$ 141,758	$ 152,943	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.16	Suministro e instalación de cerradura pasador de seguridad tipo pesado.	UN		$ 128,313	$ 138,445	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.17	Suministro e instalación de chapa tipo Yale 396*1/4 de roseta.	UN		$ 188,540	$ 203,433	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.18	Suministro e instalación de cerrojo o cantonera para ventana en aluminio.	UN		$ 71,286	$ 76,908	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
7.19	Suministro e instalación de brazo hidráulico tipo Yale de 80 Kg con acoples y accesorios.	UN		$ 252,603	$ 272,536	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8	**CARPINTERIA**											
8.1	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada en RH.	M2		$ 618,298	$ 667,000	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.2	Arregblo y ajuste de puerta en aluminio.	M2		$ 55,153	$ 59,517	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.3	Arregblo y ajuste de puerta en madera.	M2		$ 66,988	$ 72,277	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.4	Arregblo y ajuste de pasamanos metalico	ML		$ 45,233	$ 48,818	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.5	Suministro e instalación de puerta o ventana en aluminio, incluye vidrio crudo 4mm.	M2		$ 527,524	$ 569,219	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.6	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable 304 para escaleras de acceso, incluye todo lo relacionado para su correcta instalación y funcionamiento.	ML		$ 597,672	$ 644,794	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.7	Reposición de tapas de gabinetes	UN		$ 119,804	$ 129,264	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.8	Ajuste de marcos	UN		$ 47,567	$ 51,316	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.9	Suministro e instalacion de bisagras	UN		$ 47,902	$ 51,677	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
8.10	Cambio de chapas pequeñas de mobiliario de madera en oficinas	UN		$ 50,255	$ 54,211	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.11	Mantenimiento de puerta de aluminio y vidrio, (ancho minimo 0.9m x altura minima 2m), incluye desmonte de la puerta, cambio de bisagras, ajuste vidrio, ajuste de aluminio, aplicación de silicona, cambio de perfil si lo requiere, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UN		$ 146,258	$ 157,820	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.12	Suministro e instalación de puerta de madera entamborada en triplex dimen. 0.80 m x 2.05 m	UN		$ 477,592	$ 515,339	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
8.13	Suministro e instalación de tabla o entrepaño en RH color blanco enchapada en todos sus lados, de 1,5 cm de espesor * 30 cm de ancho y 147 cm de largo, soportada en los extremos con tablas en RH de 10cm * 30 cm, chazos y tornillos.	UN		$ 146,656	$ 158,234	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9	**VIDRIOS**											
9.1	Suministro e instalación de vidrio crudo de 5 mm.	M2		$ 160,032	$ 172,657	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.2	Espejos flotados y biselados de 4 mm. (Suministro e instalación)	M2		$ 238,176	$ 256,971	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.3	Espejos flotados y biselados de 5 mm. (Suministro e instalación)	M2		$ 277,635	$ 299,549	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.4	Suministro e instalación de película sand blasting.	M2		$ 106,478	$ 114,878	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.5	Sellado de ventanas con silicona, incluye lo necesario para su funcionamiento.	ML		$ 22,784	$ 24,582	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.6	Suministro e instalación de polarizado para vidrios	M2		$ 119,755	$ 129,194	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.7	Suministero e instalación de vidrio texturizado decorativo para ventanas (incluye silicona y todo lo necesario para su correcta instalación	M2		$ 232,126	$ 250,438	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.8	Puerta en vidrio templado e=10 mm, 0,90x2,00m. (Suministro e instalación. Incluye cerradura, herrajes, accesorios)	UN		$ 1,398,018	$ 1,508,495	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
9.9	Vidrio templado e=10 mm. (Suminstro e instalación. Incluye herrajes, accesorios)	M2		$ 719,919	$ 776,790	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10	**REDES SANITARIAS E HIDRAULICAS**											
10.1	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 2".	PTO		$ 164,372	$ 177,344	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.2	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 3".	PTO		$ 188,112	$ 202,961	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.3	Suministro e instalación de Punto de desagüe o sanitario en PVC 4".	PTO		$ 202,113	$ 218,051	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.4	Suministro e instalación tubería sanitaria en PVC de 2".	ML		$ 107,741	$ 116,242	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.5	Suministro e instalación tubería sanitaria en PVC de 3".	ML		$ 126,735	$ 136,730	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.6	Suministro e instalación tubería sanitaria en PVC de 4".	ML		$ 167,333	$ 180,523	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.7	Suministro e instalación tubería sanitaria en PVC de 6".	ML		$ 152,738	$ 164,781	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.8	Accesorios PVC Sanitario 2". (Suministro e instalación)	UN		$ 27,789	$ 29,979	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.9	Accesorios PVC Sanitario 3". (Suministro e instalación)	UN		$ 35,951	$ 38,786	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.10	Accesorios PVC Sanitario 4". (Suministro e instalación)	UN		$ 51,204	$ 55,247	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.11	Accesorios PVC Sanitario 6". (Suministro e instalación)	UN		$ 102,943	$ 111,086	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.12	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 2". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML		$ 53,716	$ 57,952	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.13	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 3". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML		$ 73,759	$ 79,577	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.14	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 4". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML		$ 95,184	$ 102,691	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.15	Bajantes A.N. Tubería PVC Sanitaria 6". (Suministro e instalación. Incluye anclajes)	ML		$ 174,601	$ 188,377	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.16	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 2". (Suministro e instalación)	ML		$ 45,959	$ 49,581	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.17	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 3". (Suministro e instalación)	ML		$ 63,809	$ 68,837	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.18	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 4". (Suministro e instalación)	ML		$ 83,041	$ 89,585	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.19	Tubería PVC Reventilación-Aguas Lluvias 6". (Suministro e instalación)	ML		$ 153,340	$ 165,426	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.20	Abrazadera metálica para tubería 1-1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 18,307	$ 19,755	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.21	Abrazadera metálica para tubería 2". (Suministro e instalación)	UN		$ 21,991	$ 23,730	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.22	Abrazadera metálica para tubería 3". (Suministro e instalación)	UN		$ 31,747	$ 34,254	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.23	Abrazadera metálica para tubería 4". (Suministro e instalación)	UN		$ 42,796	$ 46,173	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.24	Abrazadera metálica para tubería 6". (Suministro e instalación)	UN		$ 70,435	$ 75,996	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.25	Sellamiento de puntos sanitarios (Lavamanos, sanitarios, sifones, etc).	UN		$ 70,532	$ 76,106	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.26	Mantenimiento del sanitario. (Incluye ajustes y empaques)	UN		$ 136,815	$ 147,602	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.27	Suministro e instalación de sanitario. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	UN		$ 980,381	$ 1,057,568	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.28	Suministro e instalación de punto hidráulico.	PTO		$ 168,887	$ 182,196	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.29	Suministro e instalación tubería hidráulica en PVC de 1/2".	ML		$ 36,142	$ 38,996	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.30	Suministro e instalación tubería hidráulica en PVC de 3/4".	ML		$ 44,596	$ 48,111	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.31	Suministro e instalación tubería hidráulica en PVC de 1".	ML		$ 59,623	$ 64,332	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.32	Accesorio PVC-P Ø= 1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 12,033	$ 12,982	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.33	Accesorio PVC-P Ø= 3/4". (Suministro e instalación)	UN		$ 15,708	$ 16,946	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.34	Accesorio PVC-P Ø=1". (Suministro e instalación)	UN		$ 20,626	$ 22,251	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.35	Accesorio PVC-P Ø=1.1/4". (Suministro e instalación)	UN		$ 30,788	$ 33,217	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.36	Accesorio PVC-P Ø=1.1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 36,697	$ 39,587	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.37	Accesorio PVC-P Ø=2". (Suministro e instalación)	UN		$ 52,248	$ 56,368	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.38	Accesorio PVC-P Ø=2 1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 78,354	$ 84,528	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.39	Cheque de 1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 53,572	$ 57,791	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.40	Cheque de 3/4". (Suministro e instalación)	UN		$ 69,946	$ 75,453	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.41	Cheque de 1". (Suministro e instalación)	UN		$ 95,265	$ 102,776	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.42	Cheque de 2-1/2". (Suministro e instalación)	UN		$ 244,647	$ 263,997	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.43	Suministro e instalación de lavamanos. Incluye todos los accesorios para su correcta instalación y funcionamiento).	UN		$ 647,871	$ 699,063	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.44	Mantenimiento de lavamanos. (incluye ajustes y empaques)	UN		$ 77,646	$ 83,777	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.45	Suministro e instalación llave de paso 1/2".	UN		$ 123,344	$ 133,066	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.46	Suministro e instalación válvula 1".	UN		$ 136,329	$ 147,095	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.47	Suministro e instalación de Bajante aguas lluvia tubería PVC 4"	ML		$ 95,184	$ 102,691	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.48	Suministro e instalación de Bajante aguas lluvias tubería PVC 6"	ML		$ 174,601	$ 188,377	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.49	Suministro e instalación de lavaplatos con grifería. Incluye accesorios.	UN		$ 646,691	$ 697,722	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.50	Mantenimiento de tanque de almacenamiento hasta de 1.000L. Incluye accesorios y todo lo necesario.	UN		$ 463,519	$ 500,094	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.51	Mantenimiento de de sifones	UN		$ 53,405	$ 57,619	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.52	Suministro e instalación de tuberia agua lluvias en PVC de 6". Incluye accesorios pvc sanitarios (Bujes, uniones, yee y todo lo necesario para su correcta instalacion)	ML		$ 209,251	$ 225,746	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.53	Suministro e instalación acople para lavamanos (manguera).	UN		$ 37,360	$ 40,310	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.54	Suministro e instalación de grifería para lavamanos (rejilla, llave y sifón).	UN		$ 199,828	$ 215,599	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.55	Suministro e instalación de llave mezcladora con eje de 18 cm para lavamanos. Incluye mangueras y retiro de llave averiada.	UN		$ 268,448	$ 289,615	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.56	Suministro e instalación llave de perilla.	UN		$ 69,093	$ 74,541	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.57	Suministro e instalación de sifón rejilla.	UN		$ 57,515	$ 62,044	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.58	Suministro e instalación codo sifón para lavamanos.	UN		$ 34,196	$ 36,891	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.59	Suministro e instalación de asiento con tapa para sanitario.	UN		$ 89,801	$ 96,910	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.60	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 24,067	$ 25,964	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.61	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 31,747	$ 34,254	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.62	Suministro e instalación de codo 90°, diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 42,465	$ 45,812	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.63	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 25,915	$ 27,960	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.64	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 34,251	$ 36,948	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.65	Suministro e instalación de adaptador macho diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 45,444	$ 49,022	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.66	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 1 1/2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 39,793	$ 42,930	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.67	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 2". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 52,334	$ 56,456	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.68	Suministro e instalación de unión universal diámetro de 3". Incluye limpiador y pegante.	UN		$ 76,494	$ 82,519	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.69	Destapada de tubería PVC de 4" a 6" con sonda eléctrica o hidrolavadora con agua a presión.	ML		$ 74,886	$ 80,775	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.70	Suministro e instalación de flotador de entrada de 1/2" para tanque hidrostático elevado. Incluye retiro del flotador averiado y regulación de nuevo flotador.	UN		$ 77,894	$ 84,037	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.71	Suministro e instalación de orinal. Incluye suministro de tornillería de anclaje, grifería y empaques.	UN		$ 599,584	$ 646,968	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.72	Suministro en instalación de taza sanitario de árbol.	UN		$ 538,290	$ 580,792	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.73	Suministro e instalación de tanque con sistema ahorrador para sanitario.	UN		$ 326,494	$ 352,277	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.74	Suministro e instalación de palanca de descarga para sanitario de árbol.	UN		$ 66,109	$ 71,334	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.75	Suministro e instalación de Aqua-Stop para sanitario.	UN		$ 105,633	$ 113,970	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.76	Suministro e instalación de grifería para sanitario de árbol.	UN		$ 155,184	$ 167,420	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.77	Suministro e instalación de acople (manguera) para sanitario.	UN		$ 43,825	$ 47,282	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.78	Suministro e instalación de sifón sosco de 2" con pegante y boquilla.	UN		$ 75,284	$ 81,219	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.79	Suministro e instalación de árbol de entrada hidrostático tipo Grival.	UN		$ 208,430	$ 224,864	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONTRATO No. 018 DE 2026**				**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**PLAZO INICIAL:**	**6 MESES**	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**PLAZO ADICIONAL:**		**Fecha Acta:** **23/10/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	**PLAZO FINAL:**	**6 MESES**	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0	**FECHA DE INICIACION:**	**04/09/2026**	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	**FECHA TERMINACION:**	**31/12/2026**	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.80	Suministro e instalación de válvula push de descarga antivandálica completa, incluye: regata, desmonte válvula averiada, pegantes, empaques, resanes. No incluye reposición de cerámica.	UN		$ 683,918	$ 737,818	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.81	Suministro e instalación de lavamanos tipo mesón flotante en cuarzo con base metálica estructural calibre 16.	ML		$ 1,560,437	$ 1,683,797	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.82	Tapa registro plástica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 34,357	$ 37,073	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.83	Tapa registro 20x20 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 143,266	$ 154,607	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.84	Dispensador institucional de papel higiénico en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 193,032	$ 208,299	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.85	Dispensador institucional de toallas de papel en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 264,122	$ 285,022	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.86	Dispensador institucional de jabón 36 onz en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 219,039	$ 236,345	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.87	Secador de manos institucional Potenza o similar en acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 1,162,123	$ 1,253,843	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.88	Barra para discapacitados, recta fija a muro L=60 cm en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 196,115	$ 211,608	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.89	Barra para discapacitados, superior en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 286,871	$ 309,539	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.90	Barra para discapacitados, piso a muro en "L" en Acero inoxidable. (Suministro e instalación)	UN		$ 350,147	$ 377,786	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.91	Grifería antivandálica para lavamanos tipo push pico largo. (Suministro e instalación)	UN		$ 623,171	$ 672,312	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.92	Grifería kit valvula antivandálica para orinal. (Suministro e instalación)	UN		$ 573,180	$ 618,495	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
10.93	Lavamanos para discapacitados con grifería. (Suministro e instalación. Incluye sifón, desague, accesorios necesarios)	UN		$ 1,003,318	$ 1,082,608	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11	**INSTALACIONES ELECTRICAS**											
11.1	Instalación a todo costo de Puntos de Corriente Normal (Incluye: Suministro del Cable Eléctrico Trenzado # 12. (4 mts. en promedio por punto).	UN		$ 123,868	$ 133,644	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.2	Instalación a todo costo de Puntos de Corriente Regulada (Incluye: Suministro del Cable Eléctrico Trenzado # 12. (4 mts. en promedio por punto).	UN		$ 138,327	$ 149,231	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.3	Instalación a todo costo de circuito de Corriente Normal y/o Regulada (Incluye: Suministro del Cable Eléctrico Trenzado # 12)	ML		$ 22,018	$ 23,753	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.4	Instalación a todo costo de acometida eléctrica principal trifásica en 3 cables calibre No.8, un cable calibre No.10 y un cable calibre No.12 verde en tubo de 1" EMT galvanizado con accesorios y curvas RETIE. Todo debidamente marquillado.	ML		$ 115,647	$ 124,782	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.5	Instalación a todo costo de acometida eléctrica principal trifásica en 4 cables calibre No.4 y un cable calibre No.8 en canaleta 100*45 o tubería EMT galvanizada de 1 1/2 ". Todo debidamente marquillado.	ML		$ 203,276	$ 219,343	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.6	Instalación a todo costo de acometida eléctrica bifásica de 220V en 3 cables calibre No.10 y un cable calibre No.12 verde, en tubo de 1" EMT galvanizado con accesorios y curvas RETIE.	ML		$ 97,327	$ 105,007	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.7	Instalación a todo costo de acometida eléctrica bifásica de 220V en 3 cables calibre No.12 y en tubo de 3/4" EMT galvanizado con accesorios y curvas RETIE.	ML		$ 70,278	$ 75,814	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.8	Instalación a todo costo de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 y en tubo EMT de 3/4". Incluye accesorios tales como codos, uniones, abrazaderas y terminales de 3/4".	ML		$ 70,557	$ 76,113	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.9	Instalación a todo costo de acometida eléctrica monofásica en 3 cables calibre No.12 desde el tablero hasta donde se requiera. Incluye amarres y encintado.	ML		$ 41,058	$ 44,313	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.10	Instalación a todo costo de circuito monofásico en 3 cables No. 12 para alimentación de tomas dobles. Incluye encintado de empalmes en ducto existente metálico de 1/2" o 3/4".	ML		$ 44,235	$ 47,733	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.11	Instalación a todo costo de acometida monofásica a 220V en 2 cables No. 10 y un cable No. 12.	ML		$ 61,701	$ 66,565	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.12	Instalación a todo costo de circuito monofásico en 2 cables No. 12 para alimentación de luminarias. Incluye encintado de empalmes.	ML		$ 33,528	$ 36,179	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.13	Suministro e instalación de canaleta plástica de 0.20 mm * 0.12 mm * 2.00 m con adhesivo.	ML		$ 41,744	$ 45,050	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.14	Suministro e instalación de canaleta plástica de 10cm * 4 cm * 2.00 m con división. Incluye chazos y tornillería.	ML		$ 84,314	$ 90,967	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.15	Suministro e instalación de canaleta plástica media caña para cableado de piso con adhesivo.	ML		$ 57,758	$ 62,318	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.16	Cambio de tubos led de 9W, 18W	UN		$ 41,026	$ 44,259	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.17	Suministro e instalación de panel led de sobreponer de 18W.	UN		$ 70,662	$ 76,237	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.18	Suministro e instalación de panel led de18W de incrustar.	UN		$ 78,399	$ 84,582	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.19	Suministro e instalación de panel led de 24W de sobreponer.	UN		$ 97,761	$ 105,469	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.20	Suministro e instalación de extractor de aire de 200 a 300 watts a 110 voltios.	UN		$ 421,726	$ 455,078	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CACHETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.21	Suministro e instalación de caja de 4 o 6 circuitos con barraje independiente.	UN		$ 343,567	$ 370,729	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.22	Suministro e instalación de breaker enchufable de 3*60. Todo debidamente marquillado, identificando cada uno de los circuitos.	UN		$ 491,614	$ 530,456	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.23	Suministro e instalación de tomacorriente con protección de falla a tierra (GFCI), para uso en zonas húmedas.	UN		$ 161,042	$ 173,770	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.24	Suministro e instalación de cajas eléctricas de sobreponer para tomacorriente o switch, de uso interior.	UN		$ 36,548	$ 39,427	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.25	Suministro e instalación de reflector led de 150W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN		$ 301,864	$ 325,730	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.26	Suministro e instalación de reflector led de 100W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN		$ 246,131	$ 265,583	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.27	Suministro e instalación de reflector de 200W. Incluye soportes, chazos, tornillería y encintado de cables.	UN		$ 378,241	$ 408,106	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.28	Suministro e instalación de juego de abrazaderas para riel chanel de soporte de tubería hidráulica o eléctrica. Incluye: Tramo riel chanel, 4 varillas 3/8" rosca corrida de 0,60 m a 1,00 m de largo, 4 chazos metálicos expansivos, tuercas y arandelas.	UN		$ 367,351	$ 396,352	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.29	Suministro e instalación de troquel triple para tomacorriente normal, regulado y datos.	UN		$ 61,328	$ 66,171	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.30	Suministro e instalación de punto de 110V para iluminación. Incluye regata, resanes, caja, cable No. 14, de varios colores interruptor y todos los accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento.	PTO		$ 151,430	$ 163,358	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.31	Suministro e instalación de luminarias de incrustar y/o sobre poner de 0,60 x 0,60 m. (Incluye cable y todos los accesorios necesarios para su puesta en funcionamiento)	UN		$ 197,166	$ 212,731	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.32	Suministro e instalación de tomacorriente normal o regulado.	UN		$ 46,390	$ 50,055	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.33	Suministro e instalación de interruptor sencillo, doble o triple.	UN		$ 94,065	$ 101,496	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.34	Instalación de canaleta 10 x 4 calibre 22 en pintura electroestática.	ML		$ 99,216	$ 107,048	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.35	Suministro e instalación de canaleta metálica de 15 a 21 cm de alto *27 cm de ancho con pestañas de anclaje perforadas de 2,5 cm y pestañas de auto ensamble, pintada con pintura electrostática blanca. Incluye chazos y tornillería.	ML		$ 279,082	$ 301,123	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.36	Marquillado de puntos electricos	UN		$ 12,232	$ 13,196	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.37	Suministro e instalacion de marcos en aluminio de incrustar o sobreponer para luminaria de 60x60cm	UN		$ 82,486	$ 89,010	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONTRATO No. 018 DE 2026**				**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**PLAZO INICIAL:**	**6 MESES**	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**PLAZO ADICIONAL:**		**Fecha Acta:** **23/10/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	**PLAZO FINAL:**	**6 MESES**	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0	**FECHA DE INICIACION:**	**04/09/2026**	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	**FECHA TERMINACION:**	**31/12/2026**	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.38	Suministro e instalación de breaker 2*30 amperios enchufable.	UN		$ 151,960	$ 163,965	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.39	Suministro e instalación de breaker 2*20 amperios enchufable.	UN		$ 140,175	$ 151,250	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.40	Suministro e instalación de breaker 2*15 amperios enchufable.	UN		$ 128,291	$ 138,427	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.41	Instalación de breaker 2*15, 2*20, 2*30 amperios enchufable.	UN		$ 38,315	$ 41,338	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.42	Suministro e Instalación de Bandeja Portables Tipo Rejiban. (Incluye Accesorios de Sujeción)	ML		$ 170,388	$ 183,854	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.43	Suministro e instalación de escalerilla portacable de 30 x 6 cm, en lámina metálica galvanizada en caliente, con su respectiva tapa metálica galvanizada y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación (tornillos, pernos, uniones y soportes).	ML		$ 302,378	$ 326,302	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.44	Suministro e instalación de tubería EMT 1/2".	ML		$ 35,770	$ 38,599	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.45	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4".	ML		$ 48,425	$ 52,254	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.46	Suministro e instalación de tubería EMT 1".	ML		$ 68,912	$ 74,376	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.47	Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2".	ML		$ 95,654	$ 103,204	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.48	Suministro e instalación de gabinete cofre doble fondo RETIE 100×80×30 mm IP55 CL16.	UN		$ 1,282,607	$ 1,383,924	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.49	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 12 circuitos, en gabinete metálico con puerta.	UN		$ 694,824	$ 749,701	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.50	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos, en gabinete metálico con puerta.	UN		$ 976,367	$ 1,053,316	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.51	Suministro e instalación de tablero Bifásico 50A 8 circuitos.	UN		$ 528,080	$ 569,689	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.52	Suministro e instalación de tablero Trifásico 50A 12 circuitos.	UN		$ 707,222	$ 762,936	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.53	Suministro e instalación de tablero Bifásico 75A 12 circuitos.	UN		$ 721,982	$ 779,022	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.54	Suministro e instalación de tablero Trifásico 150A 24 circuitos, con espacio para totalizador.	UN		$ 1,558,514	$ 1,681,595	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.55	Suministro e instalación de tablero Bifásico 100A 20 circuitos.	UN		$ 904,763	$ 976,195	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.56	Cable N°14 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 7,214	$ 7,784	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.57	Cable N°12 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 9,225	$ 9,954	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.58	Cable N°10 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 13,455	$ 14,516	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.59	Cable N°8 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 20,899	$ 22,547	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.60	Cable N°6 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 33,514	$ 36,156	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.61	Cable N°4 AWG Certificado (Suministro e instalación)	ML		$ 52,146	$ 56,258	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.62	Tubería Conduit PVC certificada 1/2". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 9,941	$ 10,725	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
11.63	Tubería Conduit PVC certificada 3/4". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 13,882	$ 14,976	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.64	Tubería Conduit PVC certificada 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios de conexión, soporte, anclaje necesarios)	ML		$ 18,001	$ 19,424	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.65	Coraza Metalica Certificada de 1". (Suministro e instalación. Incluye accesorios necesarios)	ML		$ 39,673	$ 42,806	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.66	Caja de paso metálica 10x10 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 26,410	$ 28,496	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.67	Caja de paso metálica 15x15 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 35,473	$ 38,274	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.68	Caja de paso metálica 20x20 cm. (Suministro e instalación)	UN		$ 48,884	$ 52,743	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
11.69	Puesta a tierra compuesta por una varilla cooper welld 5/8" X 2,44m. (Suministro e instalación. Incluye soldadura exotermica 115 gr.)	UN		$ 230,608	$ 248,818	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12	**RED DE VOZ Y DATOS**											
12.1	Suministro e instalación de punto de datos en categoría 6A incluye: Cable UTP Cat6A, Jack Cat6A, Face Plate CAT6A, Patch Cord de 1 y 3 mts CAT6A Ductería y canalización. (4 mts. en promedio por punto)	UN		$ 185,825	$ 200,489	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.2	Cable UTP Cat 6A. Incluye Suministro y tendido, accesorios de montaje	ML		$ 12,411	$ 13,390	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.3	Patch cords RJ45-RJ45 de 2 m. de longitud y flexibles categoría 6A,)	UN		$ 23,428	$ 25,277	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.4	Suministro e instalación de switch de red de 48 puertos, con capacidad para conexión de datos en topología estructurada, incluyendo, accesorios de montaje, bandejas y organizadores de cables.	UN		$ 2,504,383	$ 2,701,717	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.5	Certificaciones de Puntos Cat 6a	UN		$ 23,093	$ 24,920	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.6	Suministro e instalación de Herraje categoría 6A, de 24 puestos.	UN		$ 1,182,571	$ 1,275,839	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
12.7	Mantenimiento de UPS. (Incluye suministro de baterías y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.)	UN		$ 595,979	$ 643,066	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
13	**TRASCIEGO DE ELEMENTOS**											
13.1	Trasiego de elementos (muebles de oficina y/o puestos de trabajo y/o equipos de oficinas)	GBL		$ 478,976	$ 516,820	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14	**OTRAS LABORES**											
14.1	Impermeabilizacion de fachada con hidrofugo transparente a dos manos. (Incluye andamios, equipos, hidrofugo)	M2		$ 36,311	$ 39,178	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.2	Suministro y aplicación de acabado de piso en gravilla lavada. Incluye retiro de acabado en mal estado, picado de la superficie, aplicación de mortero del espesor requerido, manejo y lavado de la gravilla.	M2		$ 121,571	$ 131,160	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta: 23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
14.3	Suministro e instalación de concertina de seguridad. (Incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.)	ML		$ 134,295	$ 144,899	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.4	Suministro e instalación de señalización guia evacuación, oficina, etc.	ML		$ 30,167	$ 32,551	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.5	Suministro e instalación de blackout.	M2		$ 460,454	$ 496,798	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.6	Suministro e instalación de borde metalico para escaleras, incluye todo lo necesario para su correcta instalación	ML		$ 40,688	$ 43,902	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.7	Reparación de membrana PVC existente	M2		$ 53,081	$ 57,274	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.8	Reparación y/o mantenimiento de bordillos	ML		$ 36,101	$ 38,953	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.9	Reparación de rejilla de aguas lluvias	M2		$ 86,031	$ 92,820	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.10	Suministro e instalación de gargola, incluye el desmonte y taponamiento de gargola existente. Incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento	UN		$ 233,367	$ 251,780	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026					ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
14.11	Suministro y instalación de alfajias en poliuretano con acabado en graniplast	ML		$ 69,349	$ 74,819	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
14.12	Suministro e instalacion de malla plastica	ML		$ 12,497	$ 13,482	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
15	**ASEO GENERAL**											
15.1	Aseo y/o limpieza general. (Por sitio de intervenido)	M2		$ 7,562	$ 8,159	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
15.2	Trasiego, cargue, retiro y disposición final de escombros y sobrantes.	M3		$ 161,937	$ 174,707	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
15.3	Limpieza de cajas de inspeccion o sumideros	UN		$ 48,520	$ 52,357	$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
ITEM NO PREVISTOS												
NP.01	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con MEMBRANA DE PVC marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO O SIMILAR, resistente a rayos UV de 1.2mm de espesor termo fundida, color blanca o gris claro que incluye: preparación de la superficie, instalación de perfilería de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil 1600Nt , aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias y anclajes, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes.	M2		$ 262,373		$ 0		$ 0	200.00	$ 52,474,600	200.00	$ 52,474,600
NP.02	Inyección de fisura con resina epoxica de baja viscosidad tipo SIKADUR 35 LV HI MOD que incluye; limpieza de la fisura, sello con resina epoxica tipo SIKADUR PANEL/31 y aplicación por gravedad de la resina epoxica hasta saturación.	GL		$ 1,382,564		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.03	Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca interlift (4 paradas) palacio de justicia florencia sede de tribunales	UND		$ 949,292		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.04	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia sede tribunales conforme a las siguientes descripciones: motor: diésel cummins	UND		$ 3,623,924		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.05	Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de variador de velocidad Monarch 4007 - 220V para ascensor.	UND		$ 14,470,400		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.06	Suministro de gas refrigerante R32.	LIBRA		$ 82,000		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.07	Suministro e instalación de cinta vinilo.	ROLLO		$ 16,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.08	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*12	ML		$ 20,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.09	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*10	ML		$ 27,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.10	Suministro e instalacion de Manguera plastica para drenaje	ML		$ 16,800		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.11	Suministro e instalacion de Aislamineto térmico Rubatex	ML		$ 19,934		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP.12	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" para red central de drenaje	ML		$ 18,427		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.13	suministro e instalacion de contactor de 32 amp	UND		$ 468,230		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.14	suministro e instalacion de breaker 3*40	UND		$ 175,007		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.15	Suministro e instalacion de totalizador 160 amp	UND		$ 704,179		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.16	Suministro e instalacion de llave de cortina de 2 1/2"	UND		$ 1,536,459		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.17	Suministro e instalacion de cargador de bateria 12 v 8 amp para planta electrica	UND		$ 1,057,261		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.18	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia,sede tribunales conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba jockey r.c.i y demás partes que la conforman.	GL		$ 4,663,995		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.19	Destaponamiento de Drenaje	GLB		$ 31,685		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
	VALOR BASICO DE OBRA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 80,015,961**		**$ 80,015,961**
	IVA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 15,203,033**		**$ 15,203,033**
	VALOR TOTAL					**$ 0**		**$ 0**		**$ 95,218,994**		**$ 95,218,994**

SON: **NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($95.218.993,59)**

FERNANDO DANIEL FAJARDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026					ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR

CONSOLIDADO DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO - PRESENTE ACTA

IVA % 19.00%

MUNICIPIO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL	% PART.
FLORENCIA	$ 80,015,961.00	$ 15,203,032.59	$ 95,218,993.59	100.00%
TOTAL	**$ 80,015,961.00**	**$ 15,203,032.59**	**$ 95,218,993.59**	**100.00%**
DIFERENCIA VS. ACTA (debe ser 0)	$ 0.00			

DETALLE DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO (según memorias de cantidades)

MUNICIPIO	ÍTEM	CANT.	V/UNIT	VALOR
FLORENCIA	4.1	442.47	$ 39,727	$ 17,578,006
FLORENCIA	4.3	415.59	$ 23,974	$ 9,963,355
FLORENCIA	NP.01	200.00	$ 262,373	$ 52,474,600
TOTAL				**$ 80,015,961**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I; 3 manos.**	**NO. ITEM**	**4.1**
		UNIDAD	**M2**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Alto	Profundidad				
PASILLO PISO 1 SEDE TRIBUNAL	*6.10*	*3.36*		1.00	M2	20.50	
	0.80	*3.36*		1.00	M2	2.69	
	5.60	*3.36*		1.00	M2	18.82	
	0.80	*3.36*		1.00	M2	2.69	
	4.00	*3.36*		1.00	M2	13.44	
	0.80	*3.36*		1.00	M2	2.69	
	2.90	*3.36*		1.00	M2	9.74	
	3.20	*3.36*		1.00	M2	10.75	
	8.70	*3.36*		1.00	M2	29.23	
	20.00	*3.36*		1.00	M2	67.20	
OFICINA SALA AUDIENCIAS JUZGADDOS ADMINISTRATIVOS 1	8.70	3.36		2.00	M2	58.46	
	4.00	3.36		2.00	M2	26.88	
OFICINA SALA AUDIENCIAS JUZGADDOS ADMINISTRATIVOS 2	8.70	3.36		2.00	M2	58.46	
	4.00	3.36		2.00	M2	26.88	
OFICINA SALA AUDIENCIAS JUZGADDOS ADMINISTRATIVOS 3	8.70	3.36		2.00	M2	58.46	
	4.00	3.36		2.00	M2	26.88	
OFICINA SECRETARIA SALA PENAL	4.00	3.36		2.00		26.88	
DESCUENTOS VENTANAS	2.16	1.80		-1.00	M2	-3.89	
	1.53	1.28		-1.00	M2	-1.96	
	1.70	1.27		-1.00	M2	-2.16	
DESCUENTOS PUERTAS	0.90	2.12		-1.00	M2	-1.91	
	0.90	2.12		-1.00	M2	-1.91	
	1.00	2.12		-3.00	M2	-6.36	
TOTAL						**442.47**	





CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Suministro y aplicación de estuco plástico.**	**NO. ITEM**	**4.3**
		UNIDAD	**M2**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	Alto	Profundidad				
PASILLO PISO 1 SEDE TRIBUNAL	*6.10*	*3.36*		1.00	M2	20.50	
	0.80	*3.36*		1.00	M2	2.69	
	5.60	*3.36*		1.00	M2	18.82	
	0.80	*3.36*		1.00	M2	2.69	
	4.00	*3.36*		1.00	M2	13.44	
	0.80	*3.36*		1.00	M2	2.69	
	2.90	*3.36*		1.00	M2	9.74	
	3.20	*3.36*		1.00	M2	10.75	
	8.70	*3.36*		1.00	M2	29.23	
	20.00	*3.36*		1.00	M2	67.20	
OFICINA SALA AUDIENCIAS JUZGADDOS ADMINISTRATIVOS 1	8.70	3.36		2.00	M2	58.46	
	4.00	3.36		2.00	M2	26.88	
OFICINA SALA AUDIENCIAS JUZGADDOS ADMINISTRATIVOS 2	8.70	3.36		2.00	M2	58.46	
	4.00	3.36		2.00	M2	26.88	
OFICINA SALA AUDIENCIAS JUZGADDOS ADMINISTRATIVOS 3	8.70	3.36		2.00	M2	58.46	
	4.00	3.36		2.00	M2	26.88	
DESCUENTOS VENTANAS	2.16	1.80		-1.00	M2	-3.89	
	1.53	1.28		-1.00	M2	-1.96	
	1.70	1.27		-1.00	M2	-2.16	
DESCUENTOS PUERTAS	0.90	2.12		-1.00	M2	-1.91	
	0.90	2.12		-1.00	M2	-1.91	
	1.00	2.12		-3.00	M2	-6.36	
TOTAL						**415.59**	



CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con MEMBRANA DE PVC marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO O SIMILAR, resistente a rayos UV de 1.2mm de espesor termo fundida, color blanca o gris claro que incluye: preparación de la superficie, instalación de perfilería de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil 1600Nt , aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias y anclajes, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes.**	**NO. ITEM**	**NP.01**
		UNIDAD	**M2**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Longitud	**ALTO**	**Profundidad**				
PALACIO DE JUSTICIA DE FLORENCIA TRIBUNALES				200.00	M2	200.00	
TOTAL						**200.00**	

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		**CONTRATO No. 018 DE 2026**									**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**	
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.										
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			**PLAZO INICIAL:**	6 MESES						
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			**PLAZO ADICIONAL:**						**Fecha Acta:**	**23/10/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370			**PLAZO FINAL:**	6 MESES						
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0			**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026						
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370			**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026						

ITEM	**DESCRIPCION**	**CONDICIONES ORIGINALES**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
		UNID	**CANT**	**V/UNIT FLORENCIA**	**V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
									CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
II	**MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRASPORTE VERTICAL**											
1.1	Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca gblarie (5 paradas) palacio de justicia florencia	UN		$ 949,292	$ 1,018,507	$ 0		$ 0	1.00	$ 949,292.00	$ 3.00	$ 2,847,876.00
1.2	Mantenimiento preventivo para elevador para trabajo en alturas en funcionamiento (palacio de justicia de florencia)	UN		$ 676,907	$ 726,229	$ 0		$ 0	1.00	$ 676,907.00	$ 3.00	$ 2,030,721.00
1.3	Mantenimiento preventivo para ascensor en funcionamiento. (palacio de justicia belen de los andaquies)	UN		$ 853,753	$ 915,919	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 2.00	$ 1,707,506.00
ITEM NO PREVISTOS												
NP.01	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con MEMBRANA DE PVC marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO O SIMILAR, resistente a rayos UV de 1.2mm de espesor termo fundida, color blanca o gris claro que incluye: preparación de la superficie, instalación de perfilería de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil 1600Nt , aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias y anclajes, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes.	M2		$ 262,373		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.02	Inyección de fisura con resina epoxica de baja viscosidad tipo SIKADUR 35 LV HI MOD que incluye; limpieza de la fisura, sello con resina epoxica tipo SIKADUR PANEL/31 y aplicación por gravedad de la resina epoxica hasta saturación.	GL		$ 1,382,564		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.03	Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca interlift (4 paradas) palacio de justicia florencia sede de tribunales	UND		$ 949,292		$ 0		$ 0	1.00	$ 949,292	1.00	$ 949,292
NP.04	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia sede tribunales conforme a las siguientes descripciones: motor: diésel cummins	UND		$ 3,623,924		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.05	Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de variador de velocidad Monarch 4007 - 220V para ascensor.	UND		$ 14,470,400		$ 0		$ 0	1.00	$ 14,470,400	1.00	$ 14,470,400
NP.06	Suministro de gas refrigerante R32.	LIBRA		$ 82,000		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.07	Suministro e instalación de cinta vinilo.	ROLLO		$ 16,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.08	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*12	ML		$ 20,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.09	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*10	ML		$ 27,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.10	Suministro e instalacion de Manguera plastica para drenaje	ML		$ 16,800		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.11	Suministro e instalacion de Aislamineto térmico Rubatex	ML		$ 19,934		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.12	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" para red central de drenaje	ML		$ 18,427		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.13	suministro e instalacion de contactor de 32 amp	UND		$ 468,230		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.14	suministro e instalacion de breaker 3*40	UND		$ 175,007		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.15	Suministro e instalacion de totalizador 160 amp	UND		$ 704,179		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.16	Suministro e instalacion de llave de cortina de 2 1/2"	UND		$ 1,536,459		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.17	Suministro e instalacion de cargador de bateria 12 v 8 amp para planta electrica	UND		$ 1,057,261		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.									
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :	$ 695,935,370			PLAZO FINAL:	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :	$ 0			FECHA DE INICIACION:	04/09/2026					
		VALOR FINAL :	$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:	31/12/2026					

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
NP.18	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia,sede tribunales conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba jockey r.c.i y demás partes que la conforman.	GL		$ 4,663,995		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.19	Destaponamiento de Drenaje	GLB		$ 31,685		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

	VALOR BASICO DE OBRA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 17,045,891.00**		**$ 22,005,795.00**
	IVA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 3,238,719.29**		**$ 4,181,101.05**
	VALOR TOTAL					**$ 0**		**$ 0**		**$ 20,284,610.29**		**$ 26,186,896.05**

SON: **VEINTE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS M/CTE ($20.284.610,29)**

FERNANDO DANIEL FAJARDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026										ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.									
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:		6 MESES				
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			PLAZO FINAL:		6 MESES				
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0			FECHA DE INICIACION:		04/09/2026				
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:		31/12/2026				

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR

CONSOLIDADO DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO - PRESENTE ACTA

IVA % 19.00%

MUNICIPIO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL	% PART.
FLORENCIA	$ 17,045,891.00	$ 3,238,719.29	$ 20,284,610.29	100.00%
TOTAL	**$ 17,045,891.00**	**$ 3,238,719.29**	**$ 20,284,610.29**	**100.00%**
DIFERENCIA VS. ACTA (debe ser 0)	$ 0.00			

DETALLE DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO (según memorias de cantidades)

MUNICIPIO	ÍTEM	CANT.	V/UNIT	VALOR
FLORENCIA	1.1	1.00	$ 949,292	$ 949,292
FLORENCIA	1.2	1.00	$ 676,907	$ 676,907
FLORENCIA	NP.03	1.00	$ 949,292	$ 949,292
FLORENCIA	NP.05	1.00	$ 14,470,400	$ 14,470,400
TOTAL				**$ 17,045,891**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca gblarie (5 paradas) palacio de justicia florencia**	**NO. ITEM**	**1.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Longitud	**ALTO**	**Profundidad**				
PALACIO DE JUSTICIA DE FLORENCIA OCTUBRE				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo para elevador para trabajo en alturas en funcionamiento (palacio de justicia de florencia)**	**NO. ITEM**	**1.2**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Longitud	**ALTO**	**Profundidad**				
PALACIO DE JUSTICIA DE FLORENCIA OCTUBRE				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca interlift (4 paradas) palacio de justicia florencia sede de tribunales**	**NO. ITEM**	**NP.03**
		UNIDAD	**UND**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Longitud	**ALTO**	**Profundidad**				
PALACIO DE JUSTICIA DE SEDE TRIBUNALES OCTUBRE				1.00	UND	1.00	
TOTAL						**1.00**	

GARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de variador de velocidad Monarch 4007 - 220V para ascensor.**	**NO. ITEM**	**NP.05**
		UNIDAD	**UND**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Longitud	**ALTO**	**Profundidad**				
PALACIO DE JUSTICIA DE SEDE TRIBUNALES OCTUBRE				1.00	UND	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

INFRAESTRUCTURA AS	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.				
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES		
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		Fecha Acta:	23/10/2026
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES		
	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026		
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026		

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/A UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
III	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS											
1.1	Revisión de los sistemas de alimentación electrico, tableros de transferencia y realización de pruebas de funcionalidad por una sede judicial	UN		$ 3,832,295		$ 0		$ 0	4.00	$ 15,329,180	4.00	$ 15,329,180
					$ 4,111,568				3.00	$ 12,334,704	3.00	$ 12,334,704
1.2	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia conforme a las siguientes descripciones: marca: puma motor: diésel enfriamiento por radiador de agua con salida de 3 fases batería 4dt, 1400	UN		$ 3,623,924	$ 3,888,080	$ 0		$ 0	1.00	$ 3,623,924	1.00	$ 3,623,924
1.3	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de puerto rico, conforme a las siguientes descripciones: marca: perkins motor: diesel serial: 3777eo1b	UN		$ 1,736,190	$ 1,862,658	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,862,658	1.00	$ 1,862,658
1.4	Mantenimiento preventivo y correctivo para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de belen de los andaquies, conforme a las siguientes descripciones: marca:toyama xp motor: diesel serial: tdg8500sle3dxp	UN		$ 1,486,679	$ 1,595,138	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,595,138	1.00	$ 1,595,138
1.5	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la planta eléctrica del palacio de justicia de albania, conforme a las siguientes descripciones: marca: kama motor: diesel serial: kde 6.500 t fases: 1x19, 6 amperes regulación de voltaje: avrtanque: 15 lts	UN		$ 1,619,695	$ 1,737,775	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,737,775	1.00	$ 1,737,775
1.6	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la motobomba de alta presión de agua del palacio de justicia de florencia, conforme a las siguientes descripciones: marca: siemens serial: 1la7113-2ya69.	UN		$ 1,135,123	$ 1,217,821	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,135,123	1.00	$ 1,135,123
1.7	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la motobomba alta presión eléctrica palacio de justicia de florencia, conforme a las siguientes descripciones: marca: weg instaldor. barnes tipo de bomba. centrifuga tipo de acoplamiento: monobloque tipo: eléctrico voltaje: 230 v	UN		$ 1,195,904	$ 1,282,971	$ 0		$ 0	2.00	$ 2,391,808	2.00	$ 2,391,808
1.8	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para las bombas de alta presión del palacio de justicia de belen de los andaquies. marca: pearl tipo de bomba. presión serial. c2p 30h36s tipo: electrico voltaje: 220 -440	UN		$ 822,231	$ 882,248	$ 0		$ 0	2.00	$ 1,764,496	2.00	$ 1,764,496
1.9	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para las bombas sumergibles del palacio de justicia de belen de los andaquies. 1. bomba electrosumergible de 1hp, 220v modelo robusta marca -aqua pak 2. equipo eyector duplex con dos bombas de a 1 hp c/u etiqueta de marca. barnes ne. 3-10-4-220	UN		$ 1,775,273	$ 1,904,768	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,904,768	1.00	$ 1,904,768

		CONTRATO No. 018 DE 2026										ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.										
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:	6 MESES						
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:						Fecha Acta:	23/10/2026
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR INICIAL :	$ 695,935,370			PLAZO FINAL:	6 MESES						
		VALOR ADICIONAL :	$ 0			FECHA DE INICIACION:	04/09/2026						
		VALOR FINAL :	$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:	31/12/2026						

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/A UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
2.0	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia, conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba respaldo r.c.i (1.2. hp - marca siemens) *bomba principal r.c.i *bomba jockey r.c.i (vertical de 5hp con 16 pasos 220/440 v) *tablero bomba principal (50 hp) *tablero bomba jockey (5 hp) *presostato bomba principal de 100-120 psi *presostato bomba principal respaldo de 100-120 psi *presostato bomba jockey de 120-140 psi y demás partes que la conforman.	UN		$ 4,663,995	$ 5,003,972	$ 0		$ 0	1.00	$ 4,663,995	1.00	$ 4,663,995
2.1	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de belén de los andaquies, conformado por los siguientes equipos: Tanque de almacenamiento de agua equipo diesel nacional q=250 gpm p=100 p.s.i marca. barnes elit-vse113 Bomba jockey 1.5hp multietapas vertical, 220/440 vac , inox, trifásica, 120 mca / 8 gpm marca: barmesa pumps *tablero bomba principal *tablero bomba jockey y demás partes que la conforman.	UN		$ 4,583,684	$ 4,917,583	$ 0		$ 0	1.00	$ 4,917,583	1.00	$ 4,917,583
ITEM NO PREVISTOS												
NP.01	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con MEMBRANA DE PVC marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO O SIMILAR, resistente a rayos UV de 1.2mm de espesor termo fundida, color blanca o gris claro que incluye: preparación de la superficie, instalación de perfilería de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil 1600Nt , aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias y anclajes, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes.	M2		$ 262,373		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.02	Inyección de fisura con resina epoxica de baja viscosidad tipo SIKADUR 35 LV HI MOD que incluye; limpieza de la fisura, sello con resina epoxica tipo SIKADUR PANEL/31 y aplicación por gravedad de la resina epoxica hasta saturación.	GL		$ 1,382,564		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.03	Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca interlift (4 paradas) palacio de justicia florencia sede de tribunales	UND		$ 949,292		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.04	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia sede tribunales conforme a las siguientes descripciones: motor: diésel cummins	UND		$ 3,623,924		$ 0		$ 0	1.00	$ 3,623,924	1.00	$ 3,623,924
NP.05	Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de variador de velocidad Monarch 4007 - 220V para ascensor.	UND		$ 14,470,400		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

INFRAESTRUCTURA AS		**CONTRATO No. 018 DE 2026**					**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.					
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**PLAZO INICIAL:**	6 MESES			
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**PLAZO ADICIONAL:**			**Fecha Acta:**	**23/10/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	**PLAZO FINAL:**	6 MESES			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0	**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026			
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026			

ITEM	**DESCRIPCION**	**CONDICIONES ORIGINALES**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
		UNID	**CANT**	**V/UNIT FLORENCIA**	**V/A UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASUETA**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
									CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
NP.06	Suministro de gas refrigerante R32.	LIBRA		$ 82,000		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.07	Suministro e instalación de cinta vinilo.	ROLLO		$ 16,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.08	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*12	ML		$ 20,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.09	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*10	ML		$ 27,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.10	Suministro e instalacion de Manguera plastica para drenaje	ML		$ 16,800		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.11	Suministro e instalacion de Aislamineto térmico Rubatex	ML		$ 19,934		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.12	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" para red central de drenaje	ML		$ 18,427		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.13	suministro e instalacion de contactor de 32 amp	UND		$ 468,230		$ 0		$ 0	1.00	$ 468,230	1.00	$ 468,230
NP.14	suministro e instalacion de breaker 3*40	UND		$ 175,007		$ 0		$ 0	2.00	$ 350,014	2.00	$ 350,014
NP.15	Suministro e instalacion de totalizador 160 amp	UND		$ 704,179		$ 0		$ 0	1.00	$ 704,179	1.00	$ 704,179
NP.16	Suministro e instalacion de llave de cortina de 2 1/2"	UND		$ 1,536,459		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.17	Suministro e instalacion de cargador de bateria 12 v 8 amp para planta electrica	UND		$ 1,057,261		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.18	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia,sede tribunales conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba jockey r.c.i y demás partes que la conforman.	GL		$ 4,663,995		$ 0		$ 0	1.00	$ 4,663,995	1.00	$ 4,663,995
NP.19	Destaponamiento de Drenaje	GLB		$ 31,685		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
	VALOR BASICO DE OBRA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 63,071,494**		**$ 63,071,494**
	IVA					**$ 0**		**$ 0**		**$ 11,983,584**		**$ 11,983,584**
	VALOR TOTAL					**$ 0**		**$ 0**		**$ 75,055,078**		**$ 75,055,078**

SON: **SETENTA Y CINCO MILLONES CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($75.055.077,86)**

FERNANDO DANIEL PAJARDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

		CONTRATO No. 018 DE 2026										**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**	
		OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.										
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS				**PLAZO INICIAL:**	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA				**PLAZO ADICIONAL:**					**Fecha Acta:**	**23/10/2026**
		VALOR INICIAL :	$ 695,935,370				**PLAZO FINAL:**	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		**VALOR ADICIONAL :**	$ 0				**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026					
		VALOR FINAL :	$ 695,935,370				**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026					

ITEM	**DESCRIPCION**	**CONDICIONES ORIGINALES**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
		UNID	**CANT**	**V/UNIT FLORENCIA**	**V/A UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASUETA**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
									CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**

CONSOLIDADO DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO - PRESENTE ACTA

IVA % 19.00%

MUNICIPIO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL	% PART.
FLORENCIA	$ 36,954,372.00	$ 7,021,330.68	$ 43,975,702.68	58.59%
ALBANIA	$ 1,737,775.00	$ 330,177.25	$ 2,067,952.25	2.76%
BELEN	$ 18,405,121.00	$ 3,496,972.99	$ 21,902,093.99	29.18%
PUERTO RICO	$ 5,974,226.00	$ 1,135,102.94	$ 7,109,328.94	9.47%
TOTAL	**$ 63,071,494.00**	**$ 11,983,583.86**	**$ 75,055,077.86**	**100.00%**
DIFERENCIA VS. ACTA (debe ser 0)	$ 0.00			

DETALLE DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO (según memorias de cantidades)

MUNICIPIO	ÍTEM	CANT.	V/UNIT	VALOR
FLORENCIA	1.1	4.00	$ 3,832,295	$ 15,329,180
PUERTO RICO	1.1	1.00	$ 4,111,568	$ 4,111,568
BELEN	1.1	2.00	$ 4,111,568	$ 8,223,136
FLORENCIA	1.2	1.00	$ 3,623,924	$ 3,623,924
PUERTO RICO	1.3	1.00	$ 1,862,658	$ 1,862,658
BELEN	1.4	1.00	$ 1,595,138	$ 1,595,138
ALBANIA	1.5	1.00	$ 1,737,775	$ 1,737,775
FLORENCIA	1.6	1.00	$ 1,135,123	$ 1,135,123
FLORENCIA	1.7	2.00	$ 1,195,904	$ 2,391,808
BELEN	1.8	2.00	$ 882,248	$ 1,764,496
BELEN	1.9	1.00	$ 1,904,768	$ 1,904,768
FLORENCIA	2.0	1.00	$ 4,663,995	$ 4,663,995
BELEN	2.1	1.00	$ 4,917,583	$ 4,917,583
FLORENCIA	NP.04	1.00	$ 3,623,924	$ 3,623,924
FLORENCIA	NP.13	1.00	$ 468,230	$ 468,230
FLORENCIA	NP.14	2.00	$ 175,007	$ 350,014
FLORENCIA	NP.15	1.00	$ 704,179	$ 704,179
FLORENCIA	NP.18	1.00	$ 4,663,995	$ 4,663,995
TOTAL				**$ 63,071,494**

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	276-275-274-273-272-271-270
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Revisión de los sistemas de alimentación electrico, tableros de transferencia y realización de pruebas de funcionalidad por una sede judicial**	**NO. ITEM**	**1.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	Longitud	ALTO	Profundidad			
PALACIO JUSTICIA PUERTO RICO RED PRINCIPAL				1.00	UN	1.00
PALACIO JUSTICIA BELEN TABLERO BOMBAS				1.00	UN	1.00
PALACIO JUSTICIA BOMBAS PEARL BELEN				1.00	UN	1.00
TOTAL						**3.00**
PALACIO JUSTICIA FLORENCIA BOMBAS JOCKEY				1.00	UN	1.00
PALACIA JUSTICIA FLORENCIA TABLERO CONTRA INCENDIOS PRINCIPAL				1.00	UN	1.00
PALACIO JUSTICIA FLORENCIA TABLERO CONTRA INCENDIOS SEGUNDARIO				1.00	UN	1.00
PALACIO JUSTICIA FLORENCIA TABLERO BOMBAS				1.00	UN	1.00
TOTAL						**4.00**
TOTAL						**14.00**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	251
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia conforme a las siguientes descripciones:** **marca: puma** **motor: diésel** **enfriamiento por radiador de agua** **con salida de 3 fases** **batería 4dt, 1400**	**NO. ITEM**	**1.2**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
GENERADOR ENERGIA FLORENCIA				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	268
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de puerto rico, conforme a las siguientes descripciones:** **marca: perkins** **motor: diesel** **serial: 3777eo1b**	**NO. ITEM**	**1.3**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PLANTA ELECTRICA PUERTO RICO				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	267
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de belen de los andaquies, conforme a las siguientes descripciones:** **marca:toyama xp** **motor: diesel** **serial: tdg8500sle3dxp**	**NO. ITEM**	**1.4**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PLANTA ELECTRICA BELEN				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	266
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la planta eléctrica del palacio de justicia de albania, conforme a las siguientes descripciones:** **marca: kama motor: diesel serial: kde 6.500 t fases: 1x19, 6 amperes** **regulación de voltaje: avrtanque: 15 lts**	**NO. ITEM**	**1.5**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PLANTA ELECTRICA ALBANIA				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	255
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la motobomba de alta presión de agua del palacio de justicia de florencia, conforme a las siguientes descripciones: marca: siemens serial: 1la7113-2ya69.**	**NO. ITEM**	**1.6**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PALACIO JUSTICIA FLORENCIA				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	258-257
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la motobomba alta presión eléctrica palacio de justicia de florencia, conforme a las siguientes descripciones:** **marca: weg** **instaldor. barnes** **tipo de bomba. centrifuga** **tipo de acoplamiento: monobloque** **tipo: eléctrico** **voltaje: 230 v**	**NO. ITEM**	**1.7**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PALACIO JUUSTICIA FLORENCIA BOMBA				1.00	UN	1.00	
PALACIO JUUSTICIA FLORENCIA BOMBA				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**2.00**	



CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	261-260
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para las bombas de alta presión del palacio de justicia de belen de los andaquies.** **marca: pearl** **tipo de bomba. presión** **serial. c2p 30h36s** **tipo: electrico** **voltaje: 220 -440**	**NO. ITEM**	**1.8**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PALACIO JUSTICIA BELEN BOMBA				2.00	UN	2.00	
TOTAL						**2.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	263-262
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para las bombas sumergibles del palacio de justicia de belen de los andaquies.** **1. bomba electrosumergible de 1hp, 220v** **modelo robusta** **marca -aqua pak** **2. equipo eyector duplex con dos bombas de a 1 hp c/u** **etiqueta de marca. barnes** **ne. 3-10-4-220**	**NO. ITEM**	**1.9**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
BOMBAS BELEN				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	253
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia, conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba respaldo r.c.i (1.2. hp - marca siemens) *bomba principal r.c.i *bomba jockey r.c.i (vertical de 5hp con 16 pasos 220/440 v) *tablero bomba principal (50 hp) *tablero bomba jockey (5 hp) *presostato bomba principal de 100-120 psi *presostato bomba principal respaldo de 100-120 psi *presostato bomba jockey de 120-140 psi y demás partes que la conforman.**	**NO. ITEM**	**2.0**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
RED CONTRA INCENDIOS FLORENCIA				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	265
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de belén de los andaquies, conformado por los siguientes equipos:** **Tanque de almacenamiento de agua equipo diesel nacional q=250 gpm p=100 p.s.i** **marca. barnes** **elit-vse113** **Bomba jockey 1.5hp multietapas vertical, 220/440 vac , inox, trifásica, 120 mca / 8 gpm** **marca: barmesa pumps** ***tablero bomba principal** ***tablero bomba jockey** **y demás partes que la conforman.**	**NO. ITEM**	**2.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
RED CONTRAINCENDIOS BELEN				1.00	UN	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	265
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia sede tribunales conforme a las siguientes descripciones: motor: diésel cummins**	**NO. ITEM**	**NP.04**
		UNIDAD	**UND**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PLANTA SEDE TRIBUNALES				1.00	UND	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	270
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**suministro e instalacion de contactor de 32 amp**	**NO. ITEM**	**NP.13**
		UNIDAD	**UND**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	Longitud	**ALTO**	**Profundidad**				
PALACIO DE JUSTICIA FLORENCIA PRINCIPAL				1.00	UND	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	270
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**suministro e instalacion de breaker 3*40**	**NO. ITEM**	**NP.14**
		UNIDAD	**UND**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PALACIO DE JUSTICIA FLORENCIA PRINCIPAL				2.00	UND	2.00	
TOTAL						**2.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	272
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Suministro e instalacion de totalizador 160 amp**	**NO. ITEM**	**NP.15**
		UNIDAD	**UND**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PALACIO DE JUSTICIA FLORENCIA PRINCIPAL TABLERO DE BOMBAS				1.00	UND	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	NEIVA
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	252
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	ALMACEN
ITEM:	**Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia,sede tribunales conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba jockey r.c.i y demás partes que la conforman.**	**NO. ITEM**	**NP.18**
		UNIDAD	**GL**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	Longitud	ALTO	Profundidad				
PLANTA GENERADORA SEDE TRIBUNALES				1.00	GL	1.00	
TOTAL						**1.00**	

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		PLAZO INICIAL:	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA		PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370		PLAZO FINAL:	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0		FECHA DE INICIACION:	04/09/2026					
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370		FECHA TERMINACION:	31/12/2026					

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
IV	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION											
1.1	Mantenimientopreventivo equipos mini split (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)	UN		$ 164,308		$ 0		$ 0	10.00	$ 1,643,080.00	$ 31.00	$ 5,093,548.00
					$ 176,625	$ 0		$ 0	39.00	$ 6,888,375.00	$ 67.00	$ 11,833,875.00
1.2	Mantenimientopreventivo equipos cassette-piso techo (incluye mano de obra, francoi, condensadora, la bomba de condensado y su respectivo drenaje etc.)	UN		$ 177,518	$ 190,386	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 1.00	$ 177,518.00
					$ 190,386	$ 0		$ 0	11.00	$ 2,094,246.00	$ 12.00	$ 2,284,632.00
1.3	Instalacion basica equipo mini split de 9000 12000 y 18000 btu (mano de obra)	UN		$ 1,024,118	$ 1,084,999	$ 0		$ 0	13.00	$ 13,313,534.00	$ 17.00	$ 17,410,006.00
1.4	Instalacion basica equipo mini split de 24000 y 36000 btu (mano de obra)	UN		$ 1,354,355		$ 0		$ 0	3.00	$ 4,063,065.00	$ 4.00	$ 5,417,420.00
					$ 1,420,002	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,420,002.00	$ 1.00	$ 1,420,002.00
1.5	Instalacion basica equipo 60000 btu (mano de obra)	UN		$ 1,523,810	$ 1,707,598	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,523,810.00	$ 1.00	$ 1,523,810.00
1.6	Desmonte de aire acondicionado equipo mini split de 9000 hasta 18000 btu (mano de obra) y entrega en almacen del palacio de justicia o en sitio de nueva instalcion	UN		$ 137,258	$ 151,500	$ 0		$ 0	13.00	$ 1,784,354.00	$ 18.00	$ 2,470,644.00
1.7	Desmonte de aire acondicionado equipos mini split de 24000 hasta 60000 btu (mano de obra) y entrega en almacen del palacio de justicia o en sitio de nueva instalcion	UN		$ 186,936		$ 0		$ 0	4.00	$ 747,744.00	$ 4.00	$ 747,744.00
					$ 206,286	$ 0		$ 0	1.00	$ 206,286.00	$ 1.00	$ 206,286.00
1.8	Suministro e instalacion de cinta vinilo	GBL		$ 21,292	$ 23,502	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
1.9	Programacion de aires acondicionados de 9000 a 60000 btu	UN		$ 111,702	$ 123,431	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.0	Resane y pintura en vinilo tipo 1 a 3 manos del muro donde se instale o desistale el aire acondicionado	ML		$ 122,060	$ 134,666	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.1	Suministro e instalacion de aislamiento termico rubatex	LB		$ 19,759	$ 21,818	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.2	Suministro y ajuste de carga refrigerante r-22 para equipos convencionales	LB		$ 98,255	$ 108,524	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.3	Suminstro y ajuste de carga refrigerante r-410 para equipos ecologicos y tecnologia inverter	LB		$ 72,536		$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
					$ 80,098	$ 0		$ 0	2.00	$ 160,196.00	$ 2.00	$ 160,196.00
2.4	carga completa de refrigerante r-22 para equipos convencionales	LB		$ 283,717	$ 312,615	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.5	Carga completa de refrigerante r-410 para equipos ecologicos y tecnologia inverter	UN		$ 219,597	$ 243,190	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.6	Suministro e instalacion de motor fancoi de 9000 btu	UN		$ 508,641	$ 561,688	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.7	Suministro e instalacion de motor de 12000 btu	UN		$ 551,915	$ 609,333	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 1.00	$ 551,915.00
2.8	Suministro e instalacion de motor fancoi de 18000 btu	UN		$ 567,799	$ 627,216	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
2.9	Suministro e instalacion de motor fancoi de 24000 btu	UN		$ 618,129	$ 682,654	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.0	Suministro e instalacion de motor fancoi de 36000 btu	UN		$ 759,960	$ 839,092	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.1	Suministro e instalacion de motor fancoi tipo techo de 36000 btu	UN		$ 838,901	$ 926,039	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.2	Suministro e instalacion de motor fancoi tipo caste de 36000 btu	UN		$ 829,317	$ 915,910	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.3	Suministro e instalacion de motor para condesador de 9000 btu	UN		$ 570,474	$ 629,893	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.4	Suministro e instalacion de motor para condesador de 12000 btu	UN		$ 620,269	$ 684,716	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.5	Suministro e instalacion de motor para condesador de 18000 btu	UN		$ 641,547	$ 708,595	$ 0		$ 0	1.00	$ 641,547.00	$ 1.00	$ 641,547.00

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONTRATO No. 018 DE 2026**				**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**PLAZO INICIAL:**	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	**SUPERVISOR:**	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**PLAZO ADICIONAL:**		**Fecha Acta:** **23/10/2026**
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	**PLAZO FINAL:**	6 MESES	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	**VALOR ADICIONAL :**	$ 0	**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
3.6	Suministro e instalacion de motor para condesador de 24000 btu	UN		$ 698,566	$ 771,391	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.7	Suministro e instalacion de motor para condesador de 36000 btu	UN		$ 769,554	$ 849,582	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.8	Suministro e instalacion de motor para condesador de 60000 btu	UN		$ 765,366	$ 845,172	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
3.9	Suministro e instalacion de capacitores 1,5 micro faradios	UN		$ 77,468	$ 85,527	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.0	Suministro e instalacion de capacitores 3,0 micro faradios	UN		$ 77,979	$ 86,072	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.1	Suministro e instalacion de capacitores 3,5 micro faradios	UN		$ 81,753	$ 90,228	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.2	Suministro e instalacion de capacitores 5,0 micro faradios	UN		$ 79,286	$ 87,595	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.3	Suministro e instalacion de capacitores 10 micro faradios	UN		$ 81,589	$ 90,106	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.4	Suministro e instalacion de capacitores 15 micro faradios	UN		$ 82,133	$ 90,685	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.5	Suministro e instalacion de capacitores 25 micro faradios	UN		$ 85,905	$ 94,839	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.6	Suministro e instalacion de capacitores 30 micro faradios	UN		$ 99,927	$ 110,308	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.7	Suministro e instalacion de capacitores 35 micro faradios	UN		$ 100,585	$ 111,009	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.8	Suministro e instalacion decapacitores 45 micro faradios	UN		$ 99,444	$ 109,803	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
4.9	Suministro e instalacion de capacitores 55 micro faradios	UN		$ 110,609	$ 122,199	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.0	Suministro e instalacion de capacitores 60 micro faradios	UN		$ 111,355	$ 122,994	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.1	Suministro e instalacion de contactor 3 polos 40 amp	UN		$ 131,883	$ 145,633	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.2	Suministro e instalacion de contactor 3 polos 50 amp	UN		$ 225,711	$ 249,174	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.3	Suministro e instalacion de contactor 3 polos 60 amp	UN		$ 280,636	$ 309,752	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.4	Suministro e instalacion de contactor 3 polos 75 amp	UN		$ 330,286	$ 364,733	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.5	Suministro y programacion de control remoto mini split de 9000 a 24000 btu	UN		$ 148,973		$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
					$ 164,470	$ 0		$ 0	2.00	$ 328,940.00	$ 2.00	$ 328,940.00
5.6	Suministro y programacion de control remoto mini split de 36000 a 60000 btu	UN		$ 154,655	$ 170,706	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.7	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split de 9000 btu	UN		$ 458,133	$ 505,565	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.8	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini splist de 12000 btu	UN		$ 495,020	$ 546,149	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
5.9	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split de 18000 btu	UN		$ 532,345	$ 587,200	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.0	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split de 24000 btu	UN		$ 639,589	$ 706,520	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.1	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split de 36000 btu	UN		$ 683,307	$ 754,634	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.2	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split inverter (facoil)	UN		$ 880,827	$ 972,543	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.3	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split inverter (unidad condensadora)	UN		$ 1,067,648	$ 1,178,546	$ 0		$ 0	1.00	$ 1,067,648.00	$ 2.00	$ 2,135,296.00
6.4	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para mini split piso techo de 36000 btu	UN		$ 2,325,021	$ 2,567,165	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.5	Suministro e instalacion de tarjeta electronica para tipo casete de 60000 btu	UN		$ 2,491,408	$ 2,750,247	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		PLAZO INICIAL:	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA		PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370		PLAZO FINAL:	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0		FECHA DE INICIACION:	04/09/2026					
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370		FECHA TERMINACION:	31/12/2026					

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
6.6	Suministro e instalacion de transformador de 40 w	UN		$ 153,204	$ 169,082	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.7	Suministro e instalacion de transformador de 75 w	UN		$ 364,094	$ 401,739	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
6.8	Suministro e instalacion de bomba de condensado	UN		$ 600,957	$ 663,411	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 1.00	$ 600,957.00
6.9	Suministro e instalacion de motor step - persiana - para mini split - 9000 btu	UN		$ 121,038	$ 133,635	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.0	Suministro e instalacion de motor step - persiana - para mini split - 12000 btu	UN		$ 117,527	$ 129,876	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.1	Suministro e instalacion de motor step - persiana - para mini split 18000 btu	UN		$ 131,405	$ 145,121	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.2	Suministro e instalacion de motor step persiana para mini split- 24000 btu	UN		$ 147,203	$ 162,537	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.3	Suministro e instalacion de motor step persiana para mini split 36000 btu	UN		$ 168,385	$ 185,882	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.4	Suministro e instalacion de terminal hembra o terminal macho	UN		$ 31,675	$ 34,984	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.5	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 4 x 10	ML		$ 36,767	$ 40,577	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.6	Suministro e instalacion de cable electrico concetrico 4 x 12	ML		$ 24,290	$ 26,815	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.7	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 4 x 14	ML		$ 21,192		$ 0		$ 0	60.50	$ 1,282,116.00	$ 71.50	$ 1,515,228.00
					$ 23,408	$ 0		$ 0	5.00	$ 117,040.00	$ 5.00	$ 117,040.00
7.8	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 3x12	UN		$ 18,995	$ 20,977	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
7.9	Suministro e instalacion de breaker 20 amp	UN		$ 75,557	$ 83,418	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 4.00	$ 302,228.00
8.0	Suministro e instalacion de breaker 30 amp	UN		$ 75,146	$ 82,985	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.1	Suministro e instalacion de breaker 40 amp	UN		$ 84,474	$ 93,263	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.2	Suministro e instalacion de breaker 50 amp	UN		$ 93,764	$ 103,497	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.3	Suministro e instalacion de breaker 2 x 20 amp	UN		$ 101,319	$ 111,810	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.4	Suministro e instalacion de breaker 2 x 30 amp	UN		$ 102,598	$ 113,338	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.5	Suministro e instalacion de breaker 2 x 40 amp	UN		$ 115,784	$ 127,875	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.6	Suministro e instalacion de breaker 2 x 50 amp	UN		$ 160,585	$ 177,312	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.7	Suministro e instalacion de breaker 3x90 amp	ML		$ 255,946	$ 282,541	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
8.8	Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 1/2 pulgada	ML		$ 45,278	$ 50,007	$ 0		$ 0	12.00	$ 543,336.00	$ 20.00	$ 905,560.00
8.9	Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 1/4 pulgada	ML		$ 24,131		$ 0		$ 0	12.00	$ 289,572.00	$ 26.00	$ 627,406.00
					$ 26,645	$ 0		$ 0	4.00	$ 106,580.00	$ 4.00	$ 106,580.00
9.0	Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 3/8 pulgada	ML		$ 33,735	$ 37,242	$ 0		$ 0	12.50	$ 421,688.00	$ 18.50	$ 624,098.00
9.1	Suministro e instalacion de tuberia de refrigeracion (cobre) 5/8 pulgada	ML		$ 63,576		$ 0		$ 0	12.50	$ 794,700.00	$ 12.50	$ 794,700.00
					$ 70,224	$ 0		$ 0	4.00	$ 280,896.00	$ 4.00	$ 280,896.00
9.2	Suministro e instalacion de tuberias de refrigeracion (cobre) 7/8 pulgada	UN		$ 86,670	$ 95,709	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		PLAZO INICIAL:	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA		PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370		PLAZO FINAL:	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0		FECHA DE INICIACION:	04/09/2026					
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370		FECHA TERMINACION:	31/12/2026					

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
9.3	Suministro e instalacion de uniones de cobre 1/2 pulgadas	UN		$ 25,518	$ 28,165	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.4	Suministro e instalacion de uniones de cobre 1/4 de pulgada	UN		$ 14,551	$ 16,074	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.5	Suministro e instalacion de uniones de cobre 3/8 pulgada	UN		$ 18,229	$ 20,131	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.6	Suministro e instalacion de uniones de cobre 5/8 pulgada	UN		$ 31,768	$ 35,071	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.7	Suministro e instalacion de uniones de cobre 7/8 pulgada	UN		$ 41,855	$ 46,198	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
9.8	Suministro e instalacion de codos de cobre 1/2 pulgada	UN		$ 25,807	$ 28,477	$ 0		$ 0	13.00	$ 335,491.00	$ 13.00	$ 335,491.00
9.9	Suministro e instalacion de codos de cobre 1/4 pulgada	UN		$ 14,984	$ 16,536	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.0	Suministro e instalacion de codos de cobre 3/8 pulgadas	UN		$ 18,548	$ 20,471	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.1	Suministro e instalacion de codos de cobre 5/8 pulgadas	UN		$ 32,320	$ 35,661	$ 0		$ 0	10.00	$ 323,200.00	$ 10.00	$ 323,200.00
10.2	Suministro e instalacion de codos de cobre 7/8 pulgadas	ML		$ 41,085	$ 45,372	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.3	Suministro e instalacion de canaleta plastica 100 x 45	ML		$ 48,148	$ 53,162	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.80	$ 38,518.00
10.4	Suministro e instalacion de tuberia pvc 1/2"	UN		$ 10,015	$ 11,060	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.5	Suministro e instalacion de codos pvc 1/2"	UN		$ 2,945	$ 3,253	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.6	Suministro e instalacion de uniones pvc 1/2"	ML		$ 2,965	$ 3,273	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.7	Suministro e instalacion de maguera plastica para drenaje	UN		$ 16,798	$ 18,541	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
10.8	Suministro e instalacion de mogollas (caucho)	UN		$ 11,422	$ 12,608	$ 0		$ 0	68.00	$ 776,696.00	$ 68.00	$ 776,696.00
10.9	Suministro e instalacion de soporte metalico en pie de amigo para condensadora de 9000 a 18000 btu	UN		$ 108,932	$ 120,300	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.0	Suministro e instalacion de soporte metalico en pie de amigo para condensadora de 24000 btu	UN		$ 132,117	$ 145,976	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.1	Suministro e instalacion de soporte metalico en pie de amigo para condensadora de 36000 a 60000 btu	M2		$ 148,385	$ 163,911	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.2	Suministro e instalacion de aspa para condensadora	UN		$ 151,991	$ 167,856	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.3	Suministro e instalacion de capilares	UN		$ 132,844	$ 146,675	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.4	Cambio rodamientos motor condensadora y unidad manejadora	UN		$ 316,487	$ 349,357	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.5	Suministro e instalacion de chaquetas en foil de aluminio	ML		$ 304,711	$ 336,282	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.6	Suministro e instalacion de compresores hermeticos de 3.0 t.r.	UN		$ 6,541,602	$ 7,228,623	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.7	Suministro e instalacion de compresores hermeticos de 4.0 t.r.	UN		$ 7,500,365	$ 8,286,085	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.8	Suministro e instalacion de compresores hermeticos de 5.0 t.r.	UN		$ 9,200,865	$ 10,162,313	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
11.9	Suministro e instalacion de compresores rotativo de 12000 btu convencional	UN		$ 1,110,105	$ 1,225,819	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.0	Suministro e instalacion de compresores rotativo de 18000 btu convencional	UN		$ 1,275,138	$ 1,407,729	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.1	Suministro e instalacion de compresores rotativo de 24000 btu convencional	UN		$ 1,540,236	$ 1,700,004	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.2	Suministro e instalacion de compresores rotativo de 9000 btu convencional	UN		$ 1,072,790	$ 1,184,362	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.3	Suministro e instalacion de control de presion alta y baja mixto	UN		$ 162,524	$ 179,526	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.4	Suministro e instalacion de control de presion de aceite	UN		$ 386,704	$ 427,057	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.5	Correccion de fuga y carga de refrigerante de 1 a 5 t.r.	GBL		$ 682,703	$ 753,768	$ 0		$ 0	1.00	$ 682,703.00	$ 1.00	$ 682,703.00

	CONTRATO No. 018 DE 2026				ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02
	OBJETO:	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.			
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	PLAZO INICIAL:	6 MESES	
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	PLAZO ADICIONAL:		
	VALOR INICIAL :	$ 695,935,370	PLAZO FINAL:	6 MESES	Fecha Acta: 23/10/2026
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :	$ 0	FECHA DE INICIACION:	04/09/2026	
	VALOR FINAL :	$ 695,935,370	FECHA TERMINACION:	31/12/2026	

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
12.6	Embobinado o rebobinado motor condensador aa de 9000 btu a 36000 btu	UN		$ 454,923	$ 502,403	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.7	Suministro e instalacion de filtro secador roscar 1/4" a 1/2"	UN		$ 158,300	$ 174,780	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.8	Suministro e instalacion de filtro secador roscar de 5/8" a 7/8	UN		$ 247,685	$ 273,409	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
12.9	Suministro e instalacion de kit de arranque	UN		$ 131,580	$ 145,213	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.0	Fabricacion e instalacion ducto en lamina de piralum	ML		$ 500,633	$ 553,211	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.1	Suministro e instalacion de motor de 1 h.p. Para unidad condensadora	M2		$ 733,748	$ 810,614	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.2	Suministro e instalacion de motor de 1 h.p. Para unidad manejadora	M2		$ 763,194	$ 842,945	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.3	Suministro e instalacion de motor de 1/2 h.p. Para unidad condensadora	UN		$ 796,979	$ 880,054	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.4	Suministro e instalacion de motor 3/4" h.p. Para unidad condensadora	UN		$ 821,827	$ 907,281	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.5	Motor para unidad manejadora hasta 3/4" hp	UN		$ 892,889	$ 985,508	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.6	Suministro de nitrogeno	UN		$ 95,514	$ 105,473	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.7	Suministro e instalacion de piedra filtrante	UN		$ 157,953	$ 174,383	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.8	Suministro e instalacion de presostato de alta y baja presion tipo pila	M3		$ 193,555	$ 213,638	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
13.9	Protector de voltaje monofasico y trifasico	UN		$ 264,396	$ 291,764	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.0	Suministro e instalacion de refrigerante freon 141 para barrido	UN		$ 77,996	$ 86,053	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.1	Suministro e instalacion de tarjeta electronica universal para mini split	UN		$ 176,226	$ 194,614	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.2	Suministro e instalacion de temporizador de 1 a 5 minutos	LB		$ 80,890	$ 89,352	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.3	Suministro e instalacion de termostato de ambiente de una etapa	UN		$ 339,296	$ 374,705	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.4	Valvula de expansion r-22- 5 t.r.	UN		$ 1,270,024	$ 1,402,238	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.5	Suministro e instalacion de valvula solenoide de 1 a 5 t.r.	UN		$ 893,898	$ 986,730	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.6	Suministro e instalacion de difusor de aire	UN		$ 382,984	$ 422,862	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.7	Rebobinado motor para unidad condensadora aa mini split	UN		$ 413,048	$ 455,950	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.8	Rebobinado motor para unidad manejadora aa mini split	UN		$ 485,047	$ 535,308	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
14.9	Reparacion tarjeta electronica para unidad manejadora o fancoil de 9000 a 60000 btu	UN		$ 488,206	$ 538,673	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.0	Suministro e instalacion de unidad manejadora o fancoil aa mini split 9000, 12000 btu (completa)	UN		$ 1,952,674	$ 2,155,559	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.1	Suministro e instalacion de unidad manejadora o fancoil aa mini split 18000, 24000 y 36000 btu (completa)	UN		$ 4,151,314	$ 4,586,725	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.2	Suministro e instalacion de unidad manejadora o fancoil aa mini split de 48000 a 60000 btu (completa)	UN		$ 7,329,392	$ 8,096,202	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.3	Suministro e instalacion de blower para unidad manejadora de 9000 a 36000 btu	UN		$ 468,228	$ 517,092	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.4	Suministro e instalacion de blower para unidad manejadora de 36000 a 60000 btu	UN		$ 1,377,175	$ 1,520,534	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

		CONTRATO No. 018 DE 2026									**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		**CONTRATISTA:**		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		**PLAZO INICIAL:**	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		**SUPERVISOR:**		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA		**PLAZO ADICIONAL:**					**Fecha Acta:**	**23/10/2026**
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370		**PLAZO FINAL:**	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		**VALOR ADICIONAL :**		$ 0		**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026					
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370		**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026					

ITEM	**DESCRIPCION**	**CONDICIONES ORIGINALES**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
		UNID	**CANT**	**V/UNIT FLORENCIA**	**V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
									CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
15.5	Suministro e instalacion de blower para unidad manejadora de 5 a 10 t.r.	UN		$ 2,165,090	$ 2,389,934	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.6	Suministro e instalacion de unidad condensadora aa (completa) mini split 9000, 12000 btu	UN		$ 2,848,796	$ 3,146,184	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.7	Suministro e instalacion de unidad condensadora aa (completa) mini split 18000 240000 btu	UN		$ 2,325,165	$ 2,567,294	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.8	Suministro e instalacion de unidad condensadora aa (completa) mini split 36000 480000 btu	UN		$ 5,507,310	$ 6,084,188	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
15.9	Suministro e instalacion de protector termico para compresores de 1 a 5 t.r.	UN		$ 101,420	$ 112,017	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.0	Suministro e instalacion de aceite sintectico para compresor	UN		$ 129,515	$ 143,013	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.1	Suministro e instalacion de aceite capella w 68	UN		$ 430,230	$ 474,961	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.2	Suministro e instalacion de suministro e instalacion de blower para evaporadora de 12.000, btu	UN		$ 253,930	$ 280,401	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.3	Suministro e instalacion de blower para evaporadora de 18.000 btu	GBL		$ 279,851	$ 308,953	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.4	Suministro e instalacion de blower para evaporadora de 24.000 btu	GBL		$ 344,099	$ 379,796	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.5	Suministro e instalacion de compresor rotativo de 9.000 btu inverter	UN		$ 1,226,760	$ 1,354,761	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.6	Suministro e instalacion de compresor rotativo de 12.00,btu inverter	UN		$ 1,517,795	$ 1,676,589	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.7	Suministro e instalacion de compresor rotativo de 18.000 btu inverter	UN		$ 1,791,479	$ 1,978,439	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.8	Suministro e instalacion de compresor rotativo de 24.000 btu inverter	UN		$ 1,933,180	$ 2,134,431	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
16.9	Suministro e instalacion de compresor scroll de 36.000 btu inverter	UN		$ 4,901,826	$ 5,410,880	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.0	Suministro e instalacion de compresor scroll de 48.000 btu inverter	UN		$ 7,055,433	$ 7,788,210	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.1	Suministro e instalacion de compresor scroll de 60.000 btu inverter	UN		$ 8,282,965	$ 9,141,161	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.2	Compresor scroll de 90.000 btu inverter	UN		$ 8,877,889	$ 9,810,274	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.3	Suministro e instalacion de compresor scroll de 120.000 btu inverter	UN		$ 15,116,425	$ 16,699,984	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.4	Suministro e instalacion de compresor scroll de 36.000 btu convencional	UN		$ 2,408,462	$ 2,660,135	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.5	Suministro e instalacion de compresor scroll de 48.000 btu convencional	UN		$ 2,796,376	$ 3,087,860	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.6	Suministro e instalacion de compresor scroll de 60.000 btu convencional	UN		$ 3,446,986	$ 3,805,408	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.7	Instalacion y reparacion de acometida de fuente de poder aires mini-split (convensional e inverter)	UN		$ 131,113	$ 144,714	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:		6 MESES			
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:				Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			PLAZO FINAL:		6 MESES			
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0			FECHA DE INICIACION:		04/09/2026			
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:		31/12/2026			

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CAQUETA	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
17.8	Instalacion y reparacion de acometida de fuente de poder aires cassete	UN		$ 237,421	$ 262,176	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
17.9	Suministro e instalacion de baterias para control remoto	UN		$ 7,919	$ 8,439	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.0	Suministro e instalacion de tarjeta diaplay para unidad evaporadora	UN		$ 113,728	$ 125,261	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

		CONTRATO No. 018 DE 2026									ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:	6 MESES				
MUNICIPIO DE FLORENCIA		SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:				Fecha Acta:	23/10/2026
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			PLAZO FINAL:	6 MESES				
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		VALOR ADICIONAL :		$ 0			FECHA DE INICIACION:	04/09/2026				
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:	31/12/2026				

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR
18.1	Suministro e instalacion de termistor para equipos minisplit	UN		$ 173,903	$ 193,524	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.2	Suministro e instalacion de curva plana 100x45	UN		$ 26,988	$ 29,403	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 1.00	$ 26,988.00
18.3	Suministro e instalacion de tapa final 100x45	UN		$ 21,402	$ 23,483	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.4	Suministro e instalacion de persiana frontal para equipo minisplit	UN		$ 182,933	$ 201,759	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.5	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 3x10	UN		$ 27,169	$ 29,811	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.6	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 3x14	UN		$ 16,177	$ 17,766	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.7	Suministro e instalacion de cable electrico concentrico 3x12	UN		$ 20,441	$ 22,456	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.8	Correccion de corto	UN		$ 80,472	$ 88,812	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
18.9	Suministro e instalacion de canaleta plastica cableado electrico	UN		$ 22,289	$ 24,530	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
19.0	Suministro e instalacion de canaleta plastica red de refrigeracion	UN		$ 51,723	$ 57,004	$ 0		$ 0		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
ITEM NO PREVISTOS												
NP.01	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con MEMBRANA DE PVC marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO O SIMILAR, resistente a rayos UV de 1.2mm de espesor termo fundida, color blanca o gris claro que incluye: preparación de la superficie, instalación de perfilería de PVC mediante chazos de fijación, instalación de capa de separación en geotextil 1600Nt , aplicación de sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias y anclajes, aplicación de sellos en poliuretano para perímetro de membrana de PVC, tuberías existentes y anclajes.	M2		$ 262,373		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.02	Inyección de fisura con resina epoxica de baja viscosidad tipo SIKADUR 35 LV HI MOD que incluye; limpieza de la fisura, sello con resina epoxica tipo SIKADUR PANEL/31 y aplicación por gravedad de la resina epoxica hasta saturación.	GL		$ 1,382,564		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.03	Mantenimiento preventivo y atencion de emergencias del ascensor marca interlift (4 paradas) palacio de justicia florencia sede de tribunales	UND		$ 949,292		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.04	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del palacio de justicia de florencia sede tribunales conforme a las siguientes descripciones: motor: diésel cummins	UND		$ 3,623,924		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.05	Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de variador de velocidad Monarch 4007 - 220V para ascensor.	UND		$ 14,470,400		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.06	Suministro de gas refrigerante R32.	LIBRA		$ 82,000		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.07	Suministro e instalación de cinta vinilo.	ROLLO		$ 16,500		$ 0		$ 0	6.00	$ 99,000	6.00	$ 99,000
NP.08	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*12	ML		$ 20,500		$ 0		$ 0	124.50	$ 2,552,250	124.50	$ 2,552,250
NP.09	Suministro e instalacion de cable encauchetado 3*10	ML		$ 27,500		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.10	Suministro e instalacion de Manguera plastica para drenaje	ML		$ 16,800		$ 0		$ 0	6.00	$ 100,800	6.00	$ 100,800
NP.11	Suministro e instalacion de Aislamineto térmico Rubatex	ML		$ 19,934		$ 0		$ 0	163.50	$ 3,259,279	163.50	$ 3,259,279
NP.12	Suministro e instalacion de tuberia PVC de 1" para red central de drenaje	ML		$ 18,427		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.13	suministro e instalacion de contactor de 32 amp	UND		$ 468,230		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

		CONTRATO No. 018 DE 2026									**ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02**	
		OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.								
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA		**CONTRATISTA:**		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		**PLAZO INICIAL:**	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA		**SUPERVISOR:**		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA		**PLAZO ADICIONAL:**					**Fecha Acta:**	**23/10/2026**
		VALOR INICIAL :		$ 695,935,370		**PLAZO FINAL:**	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA		**VALOR ADICIONAL :**		$ 0		**FECHA DE INICIACION:**	04/09/2026					
		VALOR FINAL :		$ 695,935,370		**FECHA TERMINACION:**	31/12/2026					

ITEM	**DESCRIPCION**	**CONDICIONES ORIGINALES**					**CONDICIONES ACTUALIZADAS**		**OBRA EJECUTADA**			
		UNID	**CANT**	**V/UNIT FLORENCIA**	**V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CIRCUITO**	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**	**PRESENTE ACTA**		**ACUMULADA**	
									CANT	**VALOR**	**CANT**	**VALOR**
NP.14	suministro e instalacion de breaker 3*40	UND		$ 175,007		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.15	Suministro e instalacion de totalizador 160 amp	UND		$ 704,179		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.16	Suministro e instalacion de llave de cortina de 2 1/2"	UND		$ 1,536,459		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.17	Suministro e instalacion de cargador de bateria 12 v 8 amp para planta electrica	UND		$ 1,057,261		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.18	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del palacio de justicia de florencia,sede tribunales conformado por los siguientes equipos: tanque de almacenamiento de agua *bomba jockey r.c.i y demás partes que la conforman.	GL		$ 4,663,995		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0
NP.19	Destaponamiento de Drenaje	GLB		$ 31,685		$ 0		$ 0		$ 0	0.00	$ 0

	VALOR BASICO DE OBRA					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 47,848,174.00**		**$ 66,472,997.00**
	IVA					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 9,091,153.06**		**$ 12,629,869.43**
	VALOR TOTAL					**$ 0.00**		**$ 0.00**		**$ 56,939,327.06**		**$ 79,102,866.43**

SON: **CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON SEIS CENTAVOS M/CTE ($56.939.327,06)**

FERNANDO DANIEL FAJARDO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
REPRESENTANTE LEGAL - CONTRATISTA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

	CONTRATO No. 018 DE 2026										ACTA DE CORTE PARCIAL No. 02	
	OBJETO:		Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.									
DISTRITO JUDICIAL DE FLORENCIA	CONTRATISTA:		CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS			PLAZO INICIAL:	6 MESES					
MUNICIPIO DE FLORENCIA	SUPERVISOR:		MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA			PLAZO ADICIONAL:					Fecha Acta:	23/10/2026
	VALOR INICIAL :		$ 695,935,370			PLAZO FINAL:	6 MESES					
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA	VALOR ADICIONAL :		$ 0			FECHA DE INICIACION:	04/09/2026					
	VALOR FINAL :		$ 695,935,370			FECHA TERMINACION:	31/12/2026					

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA			
		UNID	CANT	V/UNIT FLORENCIA	V/R UNITARIO OTROS MUNICIPIOS DEL CASANARE	VALOR	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
									CANT	VALOR	CANT	VALOR

CONSOLIDADO DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO - PRESENTE ACTA

IVA % 19.00%

MUNICIPIO	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR TOTAL	% PART.
FLORENCIA	$ 36,245,613.00	$ 6,886,666.47	$ 43,132,279.47	75.75%
ALBANIA	$ 529,875.00	$ 100,676.25	$ 630,551.25	1.11%
BELEN	$ 3,096,284.00	$ 588,293.96	$ 3,684,577.96	6.47%
CARTAGENA DEL CHAIRA	$ 529,875.00	$ 100,676.25	$ 630,551.25	1.11%
CURILLO	$ 529,875.00	$ 100,676.25	$ 630,551.25	1.11%
MILAN	$ 706,500.00	$ 134,235.00	$ 840,735.00	1.48%
MORELIA	$ 517,720.00	$ 98,366.80	$ 616,086.80	1.08%
PUERTO RICO	$ 1,087,272.00	$ 206,581.68	$ 1,293,853.68	2.27%
SAN JOSE DE LA FRAGUA	$ 2,660,679.00	$ 505,529.01	$ 3,166,208.01	5.56%
SAN VICENTE	$ 883,125.00	$ 167,793.75	$ 1,050,918.75	1.85%
SOLITA	$ 367,011.00	$ 69,732.09	$ 436,743.09	0.77%
VALPARAISO	$ 694,345.00	$ 131,925.55	$ 826,270.55	1.45%
TOTAL	**$ 47,848,174.00**	**$ 9,091,153.06**	**$ 56,939,327.06**	**100.00%**
DIFERENCIA VS. ACTA (debe ser 0)	$ 0.00			

DETALLE DE VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO (según memorias de cantidades)

MUNICIPIO	ÍTEM	CANT.	V/UNIT	VALOR
FLORENCIA	1.1	10.00	$ 164,308	$ 1,643,080
ALBANIA	1.1	3.00	$ 176,625	$ 529,875
BELEN	1.1	8.00	$ 176,625	$ 1,413,000
CARTAGENA DEL CHAIRA	1.1	3.00	$ 176,625	$ 529,875
CURILLO	1.1	3.00	$ 176,625	$ 529,875
MILAN	1.1	4.00	$ 176,625	$ 706,500
MORELIA	1.1	2.00	$ 176,625	$ 353,250
PUERTO RICO	1.1	4.00	$ 176,625	$ 706,500
SAN JOSE DE LA FRAGUA	1.1	3.00	$ 176,625	$ 529,875
SAN VICENTE	1.1	5.00	$ 176,625	$ 883,125
SOLITA	1.1	1.00	$ 176,625	$ 176,625
VALPARAISO	1.1	3.00	$ 176,625	$ 529,875
PUERTO RICO	1.2	2.00	$ 190,386	$ 380,772
BELEN	1.2	8.00	$ 190,386	$ 1,523,088
SOLITA	1.2	1.00	$ 190,386	$ 190,386
FLORENCIA	1.3	13.00	$ 1,024,118	$ 13,313,534
FLORENCIA	1.4	3.00	$ 1,354,355	$ 4,063,065

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS MINI SPLIT (INCLUYE MANO DE OBRA, FRANCOI, CONDENSADORA, LA BOMBA DE CONDENSADO Y SU RESPECTIVO DRENAJE ETC.)**	**NO. ITEM**	**1.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
CUARTO MONITOREO	ED. PRINCIPAL	2	0301	1	1.00	1
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 315	ED. PRINCIPAL	2	0320	1	1.00	1
CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 315	ED. PRINCIPAL	2	0319	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	043	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304 - DESPACHO MG	ED TRIBUNALES	2	0324	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 3 OF 303	ED TRIBUNALES	2	0322	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 3 OF 303 - DESPACHO MG	ED TRIBUNALES	2	0323	1	1.00	1
JUZGADO 1 DE RESTITUCION DE TIERRAS	ED TRIBUNALES	2	0321	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA DESPACHO 3 OFICINA 306 - SALA PENAL	ED TRIBUNALES	2	044	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA DESPACHO 3 OFICINA 306 - DESPACHO MG	ED TRIBUNALES	2	045	1	1.00	1
TOTAL						**10.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO








CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	MUNICIPIOS (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS MINI SPLIT (INCLUYE MANO DE OBRA, FRANCOI, CONDENSADORA, LA BOMBA DE CONDENSADO Y SU RESPECTIVO DRENAJE ETC.)**	**NO. ITEM**	**1.1 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
ALBANIA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIA, SECRETARIA, DESPACHO)	ALBANIA	2	0349, 0348, 0350	3	1.00	3
BELEN - EDIFICIO JUDICIAL (DEPOSITO, RACK, LACTANCIA, DESPACHOS, SECRETARIA)	BELEN	2	0506, 0508, 0509, 0515, 0518, 0517, 0522, 0520	8	1.00	8
CARTAGENA DEL CHAIRA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (SECRETARIA, AUDIENCIA, DESPACHO)	CARTAGENA DEL CHAIRA	2	0337, 0338, 0339	3	1.00	3
CURILLO - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIA, SECRETARIA, DESPACHO)	CURILLO	2	0346, 0345, 0344	3	1.00	3
MILAN - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIAS, SECRETARIA, DESPACHO)	MILAN	2	0343, 0342, 0340, 0341	4	1.00	4
MORELIA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (DESPACHO, SECRETARIA)	MORELIA	2	0529, 0528	2	1.00	2
PUERTO RICO - JUZGADOS PROMISCUOS (AUDIENCIAS, DESPACHO 2, DESPACHO 3)	PUERTO RICO	2	0335, 0336, 0330, 0334	4	1.00	4
SAN JOSE DE LA FRAGUA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIA, DESPACHO, SECRETARIA)	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0503, 0502, 0501	3	1.00	3
SAN VICENTE DEL CAGUAN - JUZGADOS PROMISCUOS MUNICIPALES (AUDIENCIA, JUZGADO 1, JUZGADO 2)	SAN VICENTE	2	0327, 0329, 0331, 0326, 0325	5	1.00	5
SOLITA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (SECRETARIA)	SOLITA	2	0524	1	1.00	1
VALPARAISO - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL (AUDIENCIA, DESPACHO, SECRETARIA)	VALPARAISO	2	0527, 0526, 0525	3	1.00	3
TOTAL						**39.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO










CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	MUNICIPIOS (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**MANTENIMIENTOPREVENTIVO EQUIPOS CASSETTE-PISO TECHO (INCLUYE MANO DE OBRA, FRANCOI, CONDENSADORA, LA BOMBA DE CONDENSADO Y SU RESPECTIVO DRENAJE ETC.)**	**NO. ITEM**	**1.2 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
PUERTO RICO - JUZGADO 3 PROMISCUO CIRCUITO - SECRETARIA (40000 BTU)	PUERTO RICO	2	0333	1	1.00	1
PUERTO RICO - JUZGADO 2 PROMISCUO CIRCUITO - SECRETARIA (40000 BTU)	PUERTO RICO	2	0332	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #1 (40000 BTU)	BELEN	2	0510	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #2 (40000 BTU)	BELEN	2	0511	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #3 (40000 BTU)	BELEN	2	0512	1	1.00	1
BELEN - AUDITORIO (60000 BTU)	BELEN	2	0513	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PROYECTADO - SECREATARIA (40000 BTU)	BELEN	2	0514	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA (40000 BTU)	BELEN	2	0519	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - SECRETARIA (40000 BTU)	BELEN	2	0516	1	1.00	1
BELEN - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CIRCUITO - SECRETARIA (40000 BTU)	BELEN	2	0521	1	1.00	1
SOLITA - JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA (40000 BTU)	SOLITA	2	0523	1	1.00	1
TOTAL						**11.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO








CARLOS MARIO BLENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (MANO DE OBRA)**	**NO. ITEM**	**1.3**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	1	1.00	1
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0309-0310	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA -DESPACHO OF 205	ED TRIBUNALES	2	0453	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0459	1	1.00	1
TOTAL						**13.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO









CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (MANO DE OBRA)**	**NO. ITEM**	**1.4**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
SALA DE AUDIENCIA OF105	ED. PRINCIPAL	2	0314	1	1.00	1
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	1	1.00	1
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	1	1.00	1
TOTAL						**3.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO









CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	SAN JOSE DE LA FRAGUA (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (MANO DE OBRA)**	**NO. ITEM**	**1.4 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN				
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0505	1	1.00	1	
TOTAL						**1.0**	







CARLOS MARIO BUENO FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**INSTALACION BASICA EQUIPO 60000 BTU (MANO DE OBRA)**	**NO. ITEM**	**1.5**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN				
SECRETARIA - TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL OF 308	ED TRIBUNALES	2	0315-0316	1	1.00	1	
TOTAL						**1.0**	

CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (MANO DE OBRA) Y ENTREGA EN ALMACEN DEL PALACIO DE JUSTICIA O EN SITIO DE NUEVA INSTALCION**	**NO. ITEM**	**1.6**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	1	1.00	1
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0309-0310	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA -DESPACHO OF 205	ED TRIBUNALES	2	0453	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	1	1.00	1
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0459	1	1.00	1
TOTAL						**13.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO








CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (MANO DE OBRA) Y ENTREGA EN ALMACEN DEL PALACIO DE JUSTICIA O EN SITIO DE NUEVA INSTALCION**	**NO. ITEM**	**1.7**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0315-0316	1	1.00	1
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED. PRINCIPAL	2	0308-0314	1	1.00	1
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	1	1.00	1
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	1	1.00	1
TOTAL						**4.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARLOS MARIO BUENO FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	SAN JOSE DE LA FRAGUA (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (MANO DE OBRA) Y ENTREGA EN ALMACEN DEL PALACIO DE JUSTICIA O EN SITIO DE NUEVA INSTALCION**	**NO. ITEM**	**1.7 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0504	1	1.00	1
TOTAL						**1.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	BELEN DE LOS ANDAQUIES (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER**	**NO. ITEM**	**2.3 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**LB**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #1	BELEN	2	0510	2	1.00	2
TOTAL						**2.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENO VIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 18000 BTU**	**NO. ITEM**	**3.5**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO 6° ADMINISTRATIVO	AD ADMINISTRATIVOS-TRIBUNALES	2	047	1	1.00	1
TOTAL						**1.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	VALPARAISO Y MORELIA (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:		**NO. ITEM**	**5.5 (MUNICIPIOS)**
	SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU	**UNIDAD**	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**			
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	VALPARAISO	2	0527	1	1.00	1
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MORELIA	2	0529	1	1.00	1
TOTAL						**2.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT INVERTER (UNIDAD CONDENSADORA)**	**NO. ITEM**	**6.3**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	**DIMENSIONES**			**CANTIDAD**	**UNIDAD**	**TOTAL**	**REGISTRO FOTOGRAFICO**
	SEDE	**RUTINA**	**NUMERO ORDEN**				
JUZGADO 6° ADMINISTRATIVO	AD ADMINISTRATIVOS-TRIBUNALES	2	047	1	1.00	1	
TOTAL						**1.0**	





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14**	**NO. ITEM**	**7.7**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	5	1.00	5
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	5	1.00	5
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0309-0310	3	1.00	3
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED. PRINCIPAL	2	0308-0314	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	5	1.00	5
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	3	1.00	3
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	4.5	1.00	4.5
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	6	1.00	6
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	7.5	1.00	7.5
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	6	1.00	6
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	7.5	1.00	7.5
TOTAL						**60.5**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	SAN JOSE DE LA FRAGUA (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14**	**NO. ITEM**	**7.7 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0505	5	1.00	5
TOTAL						**5.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA**	**NO. ITEM**	**8.8**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	4	1.00	4
DESPACHO 2 OF 302 TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL	ED TRIBUNALES	2	0310	2.5	1.00	2.5
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	3.5	1.00	3.5
TOTAL						**12.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO

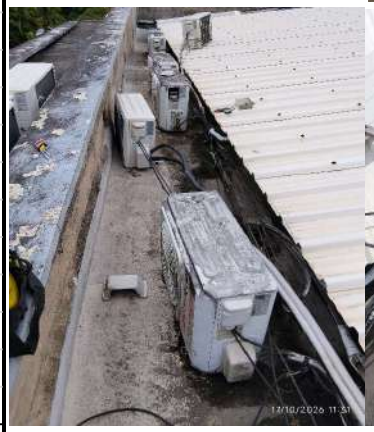


CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO


MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA**	**NO. ITEM**	**8.9**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	4	1.00	4
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0310	2.5	1.00	2.5
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	3.5	1.00	3.5
TOTAL						**12.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO

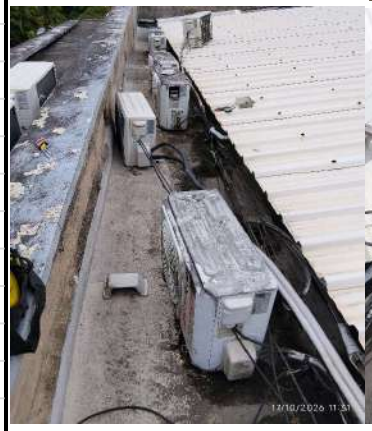


CARLOS MARIO DUEÑAS PIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	SAN JOSE DE LA FRAGUA (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA**	**NO. ITEM**	**8.9 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0505	4	1.00	4
TOTAL						**4.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA**	**NO. ITEM**	**9.0**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	5.5	1.00	5.5
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	7	1.00	7
TOTAL						**12.5**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA**	**NO. ITEM**	**9.1**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	5.5	1.00	5.5
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	7	1.00	7
TOTAL						**12.5**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	SAN JOSE DE LA FRAGUA (CAQUETA)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA**	**NO. ITEM**	**9.1 (MUNICIPIOS)**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0505	4	1.00	4
TOTAL						**4.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUSTOS FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA**	**NO. ITEM**	**9.8**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA -DESPACHO OF 205	ED TRIBUNALES	2	0453	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0459	3	1.00	3
TOTAL						**13.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS**	**NO. ITEM**	**10.1**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	5	1.00	5
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	5	1.00	5
TOTAL						**10.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO





CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)**	**NO. ITEM**	**10.8**
		UNIDAD	**UN**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	4	1.00	4
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0305-0316	4	1.00	4
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0309-0310	4	1.00	4
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED. PRINCIPAL	2	0308-0314	4	1.00	4
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	4	1.00	4
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	4	1.00	4
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA -DESPACHO OF 205	ED TRIBUNALES	2	0453	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	4	1.00	4
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	4	1.00	4
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0459	4	1.00	4
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	4	1.00	4
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	4	1.00	4
TOTAL						**68.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO









CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5 T.R.**	**NO. ITEM**	**12.5**
		UNIDAD	**GBL**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
SALA DE AUDIENCIA OF310	ED. PRINCIPAL	2	0302	1	1.00	1
TOTAL						**1.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA VINILO.**	**NO. ITEM**	**NP.07**
		UNIDAD	**ROLLO**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	1	1.00	1
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	1	1.00	1
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0305-0316	1	1.00	1
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED. PRINCIPAL	2	0308-0314	1	1.00	1
TOTAL						**6.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ENCAUCHETADO 3*12**	**NO. ITEM**	**NP.08**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	2	059	5	1.00	5
RECURSOS HUMANOS- ARCHIVO	EDIFICIO PRINCIPAL	2	067	4	1.00	4
EDIFICIO PRINCIPAL	EDIFICIO PRINCIPAL	2	100	50	1.00	50
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	5	1.00	5
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	2	1.00	2
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	5	1.00	5
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0309-0310	3	1.00	3
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED. PRINCIPAL	2	0308-0314	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	2	1.00	2
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	5	1.00	5
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	3	1.00	3
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	4.5	1.00	4.5
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	6	1.00	6
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	7.5	1.00	7.5
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	6	1.00	6
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	7.5	1.00	7.5
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	SAN JOSE DE LA FRAGUA	2	0505	5	1.00	5
TOTAL						**124.5**

REGISTRO FOTOGRAFICO







CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA PLASTICA PARA DRENAJE**	**NO. ITEM**	**NP.10**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN			
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - DESPACHO	EDIFICIO PRINCIPAL	2	025	5	1.00	5
JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL OF 402	EDIFICIO PRINCIPAL	2	022	1	1.00	1
TOTAL						**6.0**

REGISTRO FOTOGRAFICO



CARLOS MARIO BUENDIA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
RESIDENTE DE OBRA

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
SUPERVISOR DEL CONTRATO

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO	Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.		
CONTRATO No.	CONTRATO No. 018 DE 2026	**CIUDAD**	FLORENCIA (SEDE PRINCIPAL)
CONTRATISTA	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE SERVICIO**	----------
SUPERVISOR	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA	**OFICINA**	AREA ADMINISTRATIVA
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMINETO TÉRMICO RUBATEX**	**NO. ITEM**	**NP.11**
		UNIDAD	**ML**

DESCRIPCION	DIMENSIONES			CANTIDAD	UNIDAD	TOTAL	REGISTRO FOTOGRAFICO
	SEDE	RUTINA	NUMERO ORDEN				
DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	2	059	10	1.00	10	
EDIFICIO ADMINISTRATIVO	EDIFICIO ADMINISTRATIVO	2	001	30	1.00	30	
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - OFICINA DE APOYO JUDICIAL - COORDINACION ADMINISTRATIVA	EDIFICIO PRINCIPAL	2	061	4	1.00	4	
RECURSOS HUMANOS- ARCHIVO	EDIFICIO PRINCIPAL	2	067	8	1.00	8	
JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - DESPACHO	EDIFICIO PRINCIPAL	2	025	6	1.00	6	
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	ED TRIBUNALES	2	0307-0311	4	1.00	4	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	ED TRIBUNALES	2	0303-0315	12	1.00	12	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	ED TRIBUNALES	2	0306-0317	4	1.00	4	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	ED TRIBUNALES	2	0304 -0318	8	1.00	8	
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0305-0316	2	1.00	2	
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED TRIBUNALES	2	0309-0310	5	1.00	5	
EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	ED. PRINCIPAL	2	0308-0314	4	1.00	4	
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0313	4	1.00	4	
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	ED TRIBUNALES	2	0312	7	1.00	7	
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA -DESPACHO OF 205	ED TRIBUNALES	2	0453	1.5	1.00	1.5	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	ED TRIBUNALES	2	0455	4	1.00	4	
TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	ED TRIBUNALES	2	0456	6	1.00	6	
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	ED TRIBUNALES	2	0457	7	1.00	7	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0458	8	1.00	8	
TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	ED TRIBUNALES	2	0459	4	1.00	4	
SALA DE AUDIENCIA OF107	ED TRIBUNALES	2	0451	11	1	11	
SALA DE AUDIENCIA OF106	ED TRIBUNALES	2	0452	14	1	14	
TOTAL						**163.5**	



CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

CONTROL DE EJECUCIÓN POR RUBRO						
RUBRO	**CAPÍTULO DEL ACTA**	**MONTO TOTAL CONTRATADO**	**EJECUTADO PRESENTE ACTA**	**ACUMULADO EJECUTADO**	**SALDO POR EJECUTAR**	**% EJECUTADO**
Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo y arreglos locativos	I. MANTENIMIENTO DE INMUEBLES	$ 410,790,560.00	$ 95,218,993.59	$ 95,218,993.59	$ 315,571,566.41	23.18%
Mantenimiento aires acondicionados	IV. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION	$ 210,000,000.00	$ 56,939,327.06	$ 79,102,866.43	$ 130,897,133.57	37.67%
Mantenimiento Plantas Eléctricas, Bombas y Motobombas	III. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS ELECTROMECANICOS	$ 43,194,810.00	$ 75,055,077.86	$ 75,055,077.86	-$ 31,860,267.86	173.76%
Mantenimiento ascensores	II. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRASPORTE VERTICAL	$ 31,950,000.00	$ 20,284,610.29	$ 26,186,896.05	$ 5,763,103.95	81.96%
TOTAL CONTRATO		**$ 695,935,370.00**	**$ 247,498,008.80**	**$ 275,563,833.93**	**$ 420,371,536.07**	**39.60%**

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 018 DE 2026

DESAJ- CAQUETA

N°	FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	28/09/2026	ED. PRINCIPAL	0301	CUARTO MONITOREO	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	1	$ 164.308	$ 164.308
2	06/10/2026	ED. PRINCIPAL	0320	CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 315	MINISPLIT	LG	9.000	1	$ 164.308	$ 164.308
3	06/10/2026	ED. PRINCIPAL	0319	CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 315	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 164.308	$ 164.308
4	08/10/2026	ED TRIBUNALES	043	TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 164.308	$ 164.308
5	08/10/2026	ED TRIBUNALES	0324	TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304 - DESPACHO MG	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 164.308	$ 164.308
6	08/10/2026	ED TRIBUNALES	0322	TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 3 OF 303	MINISPLIT	MIRAGE	24.000	1	$ 164.308	$ 164.308
7	08/10/2026	ED TRIBUNALES	0323	TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 3 OF 303 - DESPACHO MG	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 164.308	$ 164.308
8	08/10/2026	ED TRIBUNALES	0321	JUZGADO 1 DE RESTITUCION DE TIERRAS	MINISPLIT	TRANE	24.000	1	$ 164.308	$ 164.308
9	09/10/2026	ED TRIBUNALES	044	TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA DESPACHO 3 OFICINA 306 - SALA PENAL	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 164.308	$ 164.308
10	09/10/2026	ED TRIBUNALES	045	TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA DESPACHO 3 OFICINA 306 - DESPACHO MG	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	1	$ 164.308	$ 164.308
11	25/09/2026	MILAN	0343	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIAS	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
12	25/09/2026	MILAN	0342	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIAS	MINISPLIT	MIDEA	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625

13	25/09/2026	MILAN	0340	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	YORK	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
14	26/09/2026	MILAN	0341	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
15	24/09/2026	CARTAGENA DEL CHAIRA	0337	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
16	24/09/2026	CARTAGENA DEL CHAIRA	0338	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIAS	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
17	24/09/2026	CARTAGENA DEL CHAIRA	0339	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	MIDEA	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
18	23/09/2026	PUERTO RICO	0335	SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
19	23/09/2026	PUERTO RICO	0336	SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
20	23/09/2026	PUERTO RICO	0333	JUZGADO 3 PROMISCUO CIRCUITO - SECRETARIA	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 190.386	$ 190.386
21	23/09/2026	PUERTO RICO	0332	JUZGADO 2 PROMISCUO CIRCUITO - SECRETARIA	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 190.386	$ 190.386
22	23/09/2026	PUERTO RICO	0330	JUZGADO 2 PROMISCUO CIRCUITO - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
23	24/09/2026	PUERTO RICO	0334	JUZGADO 3 PROMISCUO CIRCUITO - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
24	23/09/2026	SAN VICENTE	0327	SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 176.625	$ 176.625
25	22/09/2026	SAN VICENTE	0329	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	MISEA	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
26	22/09/2026	SAN VICENTE	0331	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL	MINISPLIT	TRANE	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
27	22/09/2026	SAN VICENTE	0326	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	MIDEA	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
28	22/09/2026	SAN VICENTE	0325	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
29	30/09/2026	SAN JOSE DE LA FRAGUA	0503	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	MIDEA	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
30	30/09/2026	SAN JOSE DE LA FRAGUA	0502	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	MIDEA	18.000	1	$ 176.625	$ 176.625
31	30/09/2026	SAN JOSE DE LA FRAGUA	0501	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
32	24/09/2026	ALBANIA	0349	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
33	24/09/2026	ALBANIA	0348	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
34	24/09/2026	ALBANIA	0350	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
35	29/09/2026	CURILLO	0346	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	YORK	9.000	1	$ 176.625	$ 176.625

36	29/09/2026	CURILLO	0345	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
37	29/09/2026	CURILLO	0344	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	MIDEA	2.400	1	$ 176.625	$ 176.625
38	01/10/2026	BELEN	0506	DEPOSITO	MINISPLIT	YORK	1.800	1	$ 176.625	$ 176.625
39	02/10/2026	BELEN	0508	CUARTO RACK	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
40	02/10/2026	BELEN	0509	CUARTO DE LACTANCIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
41	02/10/2026	BELEN	0510	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #1	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 190.386	$ 190.386
42	02/10/2026	BELEN	0511	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #2	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 190.386	$ 190.386
43	02/10/2026	BELEN	0512	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #3	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 190.386	$ 190.386
44	02/10/2026	BELEN	0513	AUDITORIO	PISO TECHO	LG	60.000	1	$ 190.386	$ 190.386
45	02/10/2026	BELEN	0515	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PROYECTADO - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
46	02/10/2026	BELEN	0518	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
47	02/10/2026	BELEN	0514	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PROYECTADO - SECREATARIA	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 190.386	$ 190.386
48	06/10/2026	BELEN	0519	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 190.386	$ 190.386
49	06/10/2026	BELEN	0517	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625

50	06/10/2026	BELEN	0516	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - SECRETARIA	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 190.386	$ 190.386
51	07/10/2026	BELEN	0522	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CIRCUITO - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
52	07/10/2026	BELEN	0521	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CIRCUITO - SECRETARIA	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 190.386	$ 190.386
53	07/10/2026	BELEN	0520	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CIRCUITO - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
54	09/10/2026	MORELIA	0529	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 176.625	$ 176.625
55	09/10/2026	MORELIA	0528	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
56	08/10/2026	VALPARAISO	0527	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	BLUELINE	12.000	1	$ 176.625	$ 176.625
57	08/10/2026	VALPARAISO	0526	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	YORK	9.000	1	$ 176.625	$ 176.625
58	08/10/2026	VALPARAISO	0525	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	YORK	24.000	1	$ 176.625	$ 176.625
59	08/10/2026	SOLITA	0523	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	PISO TECHO	LG	40.000	1	$ 190.386	$ 190.386
60	08/10//2026	SOLITA	0524	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA	MINISPLIT	LG	18.000	1	$ 176.625	$ 176.625
SUB-TOTAL										**$ 10.625.701**
IVA										**$ 2.018.883**
TOTAL										**$ 12.644.584**

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

059

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____ **Fecha:** 02/09/26

Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

Municipio: Florencia

Dirección: Edificio Administrativo **Sede / Despacho Judicial:** Despacho 01 Tribunal Contencioso Administrativo Oficina 205

Encargado de la sede: JOSE RAMON GARCIA PARADA.

Técnico(s) responsable(s): Elkin Peidomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAG11D-240RFN8	**Modelo condensador:**	MOX330-24CFN8
Serial evaporador:	130027	**Serial condensador:**	200032
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Montaje de un aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tubería de Cobre 1/2	5Mts	4	Cable 3x12	5Mts
2	Tubería de Cobre 1/4	5Mts	5	Rubatex	10 Mts
3	Señal 4x14	3Mts	6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/09/26 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Elkin Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 6.33

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

001

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ___ **Fecha:** 19-08-26

Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

Municipio: Florencia **Sede / Despacho Judicial:** edificio los tribunales

Dirección: Palacio Justicia - los Tribunales

Encargado de la sede: _____

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

Técnico(s) responsable(s): Zikin Perdomo

MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		Modelo condensador:	
Serial evaporador:		Serial condensador:	
Marca:		No. de placa:	
Capacidad:		Zona / Ubicación:	
Voltaje de Operación:		Tipo de Refrigerante:	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta: contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Cambio aislamiento termico	3 mts.	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-08-26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Zikin Perdomo - 1080296438
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

061

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 03/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio palacio de justicia	**Sede / Despacho Judicial:** Consejo Superior de la judicatura oficina de Apoyo judicial Coordinación Adm
Encargado de la sede: Edwin Bobadilla.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin padomo
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	PTE-36JSN	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	160009	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Blueline	**No. de placa:**	12-000000107350
Capacidad:	36000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☑ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza Cambio de aislamiento de tubería de Refrigeración y destapamiento de drenaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 03/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin padomo	Edwin S. Bobadilla Torres
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

067

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ___	**Fecha:** 08/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: EDIFICIO palacio de justicia	**Sede / Despacho Judicial:** OFICINA Recursos Humanos Archivo
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	
TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**Técnico(s) responsable(s):** ELKIN Pardomo
MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VH18ZC7	**Modelo condensador:**	VH18ZC7
Serial evaporador:	910TAPEA8072	**Serial condensador:**	P.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N-0000006110310
Capacidad:	18000 BIO	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Montaje de un aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	4Mts de tubuca Cobre 3/8	4Mts	4	Cable 3x12	4Mts
2	Tubuca Cobre 1/4	4Mts	5	Rubatex	8Mts
3	Señal 4x14	4Mts	6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/09/26 **Hora inicio:** ___ **Hora fin:** ___

Elkin Pardomo	Juan Manuel Mejia Rodriguez
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

025

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 11-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Palacio de Justicia	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 4to Penal del Circuito Despacho
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	Técnico(s) responsable(s): Elkin Fernando Perdomo
TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	Modelo condensador:	UM182CT
Serial evaporador:	910TACXAB075	Serial condensador:	906TAT6CT753
Marca:	LG	No. de placa:	
Capacidad:	18000 BTU	Zona / Ubicación:	Cubierta 4to Piso
Voltaje de Operación:	220v	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	22°C		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se entrega equipo de A/C operativo y funcionando en optima condicion

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaidas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañileria, pintura, plomeria, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tubería Flexible 1/4 en cobre	3 mts
2	Tubería Flexible 1/2 en cobre	3 mts
3	Cable enrauchetado 4X14	2 mts

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
4	Canaleta 100x45	0.40 cm
5	Curva Plana	1 und
6	Manguera de Cristal 5/16	5 mts

Observaciones generales:
Se suministra bomba de condensado con su respectiva manguera de Drenaje 6 mts
Rubatex

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/09/2026 | Hora inicio: _____ | Hora fin: _____

Elkin Fernando Perdomo	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ROJAS
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

022

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____ **Fecha:** 10-09-2026

Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

Municipio: Florencia

Dirección: Cll 16 # 6-47 Edificio Palacio de Justicia **Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 8 Penal Municipal

Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia **Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	Modelo condensador:	VS122C7
Serial evaporador:	212TAZFER773	Serial condensador:	212TAWMD3633
Marca:	LG	No. de placa:	
Capacidad:	12000 btu	Zona / Ubicación:	Juzgado 8 Penal Municipal
Voltaje de Operación:	220 voltios	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	12C°		Oficina 402

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☒ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza instalacion del split o unidad interior y se corrige Posicion de la Red de Tuberias.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 1/4	2 mts	4	Manguera de Drenaje	01
2	Tuberia Cobre Flexible 3/8	2 mts	5		
3	Canaleta 100 x 45	0.30cm	6		

Observaciones generales: Equipo Puesta en Marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-09-2026 **Hora inicio:** 9:Am **Hora fin:** ____

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Ana Maria Caballos Lopez - Secretaria.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

100

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ___	Fecha: 18/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Palacio de justicia	Sede / Despacho Judicial:
Encargado de la sede: Maria Edelmira Castro	
TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	Técnico(s) responsable(s):
MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		Modelo condensador:	
Serial evaporador:		Serial condensador:	
Marca:		No. de placa:	
Capacidad:		Zona / Ubicación:	
Voltaje de Operación:		Tipo de Refrigerante:	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☑ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Cable encauchetado 3x12	50 MTS	4		
2	Breker	4	5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 | Hora inicio: ___ | Hora fin: ___

Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 16
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0302

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 29-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de Audiencias 310
Dirección: Edificio Palacio de Justicia	
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Peidomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AR50F24D7EHN	**Modelo condensador:**	AR50F24D7EHX
Serial evaporador:	0MG1PDBY900060R	**Serial condensador:**	
Marca:	Samsung	**No. de placa:**	
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	M.T Plano Superior
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	12 C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Correccion de Fuga y Carga Completa de R32

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo queda Funcional

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10: Am — **Hora inicio:** 1 3:20Pm — **Hora fin:** ____

Elkin Fernando Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 702
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0311

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 02 oficina 302 Magist
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Sala Penal, Tribunal Superior Florencia
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAG11B-12CRFN8	**Modelo condensador:**	MOX130-12CFN8
Serial evaporador:	5472000HDDA9250730057	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, reubicacion de red de Tuberias de refrigeracion, cambio de: Aislamiento termico, cableado de Comunicacion y Voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento termico Rubatex	4 mts	4	cable encauchetado 4x14	2 mts
2	Cinta Vinilo	7 Rll	5	Soporte Antivibratorio Mogolla	4 und
3	Cable encauchetado 3x12	2 mts	6		

Observaciones generales: Se realiza instalacion de aire acondicionado. En buen funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-10-2026	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 706
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0315

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria - Tribunal Superior
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Sala Civil Familiar laboral - Oficina 308
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF18T E	**Modelo condensador:**	CMF18T E
Serial evaporador:	7127900441	**Serial condensador:**	7127900760
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 bTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea - Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:	12 C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza: Desmonte de aire acondicionado, Reubicacion de red de Tuberias de Refrigeracion, Cambios de: Aislamiento termico, cableado de Comunicacion y Voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Cable encauchetado 3x12	5 mts	4	Cinta Unico	2 Rll
2	Cable encauchetado 4x14	5 mts	5	Soportes Antivibratorios	4 Und
3	Aislamiento Termico Rubatex	12 mts	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado. En buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 707
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0317

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 02 Oficina 304
Dirección: Edificio Tribunales Administrativo	Tribunal Superior Sala Civil, Familia, Laboral
Encargado de la sede: Giovanny Ramirez Cotto	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF12TE	**Modelo condensador:**	CMF12TE
Serial evaporador:	—	**Serial condensador:**	712903647
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea – Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°C		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza: desmonte de aire Acondicionado, Reubicacion de red de tuberias de refrigeracion, Cambio de aislamiento y Cableados de Comunicacion y Voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento Termico	4 mts	4	Cable encauchetado 3x14	2 mts
2	Cinta Unilo	1 Rll	5	Soporte Antivibratorio Mogallas	4 und
3	Cable encauchetado 3x12	2 mts	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado. En buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-13-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 204
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0318

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 2 Oficina Magistrado OF-304, Tribunal Superior Sala Civil Familia Laboral
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF72TE	**Modelo condensador:**	EMF72TE
Serial evaporador:	727903659	**Serial condensador:**	727904139
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea - Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	72 C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza: Desmonte de aire acondicionado, Reubicacion de comunicacion y Tuberias de refrigeracion, Cambio de: Aislamientos termicos y Cableados Voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 1/2	4 mts	4	Cable encauchetado 3 X 12	5 mts
2	Tuberia Cobre Flexible 1/4	4 mts	5	Cable encauchetado 4 X 14	5 mts
3	Aislamiento Termico Rubatex	8 mts	6	Soporte Antivibratorio Maquina	4 und

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado, en buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	Nombre, cargo, firma y sello
Nombre, firma y cédula	Encargado del recibido (Sede / Supervisor)
Técnico que realizó el trabajo	

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 205
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0316

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria - Tribunal Superior
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Sala Civil Familiar Laboral oficina 308
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ406M7AS	**Modelo condensador:**	AUUQ40HS
Serial evaporador:	311TAFZFV467	**Serial condensador:**	310TADRE9930
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	220 Voltios / 39.100 Btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea – Placa Izquierda
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	22°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☑ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, Reubicacion de Tuberias de refrigeracion y cambios de aislamiento Termico Rubatex

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento Termico Rubatex	2mts	4		
2	Cinta Vinilo	1 Rll	5		
3	Soportes Antivibratorios - Mogo	4 und	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado. En buen Funcionamiento.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-10-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0310

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 02 Oficina 302
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Sala Penal, Tribunal Superior Florencia
Encargado de la sede: Giovanny Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Peidomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF72TE	**Modelo condensador:**	EMF72TE
Serial evaporador:	712790364 7	**Serial condensador:**	712790414 5
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza: Desmonte de aire acondicionado, reubicacion de red de tuberias de refrigeracion, cambio de aislamiento termico y Cableado de Comunicacion y Volt

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 1/2	2,5 mts	4	Cable encauchetado Voltaje 3X12	3 mts
2	Tuberia Cobre Flexible 1/4	2,5 mts	5	Cable encauchetado control 4X14	3 mts
3	Aislamiento Termico Rubatex	5 mts	6	Soporte Antivibratorio Mogolla	4 und

Observaciones generales:

Se realiza Instalacion de aire Acondicionado. En buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-10-2026	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin Fernando Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 776
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0314

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de Audiencia 705
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF767E	**Modelo condensador:**	CMF767E
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	7727907892
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea, Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	17 C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza: Desmonte de aire acondicionado, Recubricion de tuberia de refrigeracion, cambio de: Aislamiento termico, Cableado de Comunicacion y Voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento Termico Rubatex	4 mts	4	Cableado encauchetado 4X14	2 mts
2	Cinta Vinilo	1 Rll	5	Soportes Antivibratorios	4 Und
3	Cableado encauchetado 3X12	2 mts	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado. En buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	[signature]
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 208
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0313

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 05-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria – Tribunal Contencioso Administrativo del Caqueta, oficina 208
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF18TE	**Modelo condensador:**	CMF18TE
Serial evaporador:	772190036 2	**Serial condensador:**	772190024 6
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea, Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, reubicacion de Tuberia de refrigeracion Cambio de aislamiento termico, cable de Comunicacion y voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tubería Cobre Flexible 1/4	2 mts	4	Cable encauchetado 3 X 12	3 mts
2	Tubería Cobre Flexible 1/2	2 mts	5	Cable encauchetado 4 X 14	3 mts
3	Aislamiento Termico Robatex	4 mts	6	Soporte Antivibratorio Mod 14	4 Und

Observaciones generales:
Se realiza Instalacion de aire acondicionado. en buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05-10-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 707
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0312

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 05-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria – Tribunal Contencioso Administrativo del Caqueta OF 208
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF187C	**Modelo condensador:**	CMF187C
Serial evaporador:	707220639	**Serial condensador:**	707220176
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea, Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	17C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, reubicacion de red de tuberias de refrigeracion, cambio de: Aislamiento termico, Cableado de Comunicacion y Voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 1/2	3,5 mts	4	Cableado encauchetado 3X12	5 mts
2	Tubería Cobre Flexible 1/4	3,5 mts	5	Cableado encauchetado 4X14	5 mts
3	Aislamiento Termico	7 mts	6	Soporte Antivibratorio Mopolas	4 und

Observaciones generales:
Se realiza Instalacion de aire acondicionado. En buen funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 0453

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 7 oficina 705 Magist. Tribunal Contencioso Administrativo del Caqueta
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: _____	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF121E	**Modelo condensador:**	CMF121E
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	7127904131
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N/T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Aeotaca. Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	22°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, adecuacion de tuberia de refrigeracion y Cambio de aislamiento Termico Rubatex

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento termico Rubatex	1,5 mts	4		
2	Soporte Antivibratorio	4 und	5		
3	Codo en cobre 1/2	2 Und	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado. Equipo Funcional

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	Nicolas.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0455

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 2 Oficina 304 Magistrado Tribunal Superior Sala Civil – Familia – Laboral
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: ____	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF121E	**Modelo condensador:**	CFM121E
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	7121904556
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea. Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, Adecuacion de tuberias de refrigeracion, cambio de aislamiento termico Rubatex.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guias, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaidas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañileria, pintura, plomeria, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento termico Rubatex	4 mts	4	Cable encauchetado 3X12	3mts
2	Soporte Antivibratorio	4 Und	5	Cable encauchetado 4X14	3mts
3	Codo en cobre de 1/2	2 Und	6		

Observaciones generales:
Se realiza Instalacion de Aire acondicionado. Equipo funcional

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026 — **Hora inicio:** ____ — **Hora fin:** ____

Elkin Fernando Perdomo	Nicolas
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0456

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 2 oficina 302 Magistrado Tribunal Superior Florencia Sala Penal
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSA6-12CR-N8	**Modelo condensador:**	MOX130-12CFN8
Serial evaporador:	'	**Serial condensador:**	HDEA92401120012
Marca:	Midea	**No. de placa:**	P.T
Capacidad:	12000 BTO	**Zona / Ubicación:**	Azotea, Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R32a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se desmonta aire acondicionado, se realiza adecuacion de tuberias de refrigeracion, se realiza Cambio de aislamiento Termico Robatex

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento Termico Robatex	6mts	4	Cable encauchetado 3X12	4.5mts
2	Soporte Antivibratorio	4 und	5	Cable encauchetado 4X14	4.5mts
3	Codo en cobre 1/2	2 und	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado, en funcionamiento.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	Nicolas
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 0457

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 2 oficina 207 magistrado
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Tribunal Contencioso Administrativo del Caqueta
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF121E	**Modelo condensador:**	CMF121E
Serial evaporador:	—	**Serial condensador:**	712790444988
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	P.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Acotea. Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	EM10a
Temp. de Suministro:	12 C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, alteracion de tuberia de refrigeracion, cambio de aislamiento y termo Rubatex.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento termico Rubatex	7 mts	4	Cable encauchetado 3X12	6 mts
2	Soporte Antivibratorio	4 und	5	Cable encauchetado 4X14	6 mts
3	Codos en cobre 1/2	2 und	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de Aire acondicionado. Equipo Funcional

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026	**Hora inicio:**	**Hora fin:**

Elkin Fernando Perdomo Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nicolas Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0458

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 1 Oficina 305 Magistrado Tribunal Superior Sala Penal
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: _____	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAG11B-12CEFN8	**Modelo condensador:**	MOX130—12CFN8
Serial evaporador:	—	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea. Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, Adecuacion de tuberias de refrigeracion, Cambio de aislamiento termico.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento termico Rubatex	8 mts	4	Cable encauchetado 3X12	7,5 mts
2	Soporte Antivibratorio	4 Und	5	Cable encauchetado 4X14	7,5 mts
3	Codo en cobre 1/2	20 Und	6		

Observaciones generales: Se realiza instalacion de Aire acondicionado, Equipo funcional

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	Nicolas.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 0459

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 1 Oficina 305
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Tribunal Superior Sala Penal -
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF121E	**Modelo condensador:**	CMF921E
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	7121904133
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea. Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, Adecuacion de Tuberia de refrigeracion, cambio de aislamiento termico, instalacion de Soporte Condensador.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento termico Rubatex	4mts	4		
2	Codos en cobre de 1/2	3 Und	5		
3	Soporte Antivibratorio	4 Und	6		

Observaciones generales: Se realiza instalacion de aire acondicionado, en funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026	**Hora inicio:**	**Hora fin:**

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nicolas Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 0451

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias 107
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMFZ61E	**Modelo condensador:**	CFM261E
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	712190779B
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea, Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, Instalacion de tuberia de refrigeracion y Suministro de aislamiento termico Rubatex.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 5/8	5.5 mts	4	Cable enaochetado 3X12	6mts
2	tuberia Cobre Flexible 3/8	5.5 mts	5	Cable enaochetado 4X14	6mts
3	Aislamiento termico Rubatex	11 mts	6	Codo 5/8 en cobre	5und

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado. EN Funcionamiento. Soporte Antivibratorio 04 und.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	Nicolas.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 0452

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias 106
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: ____	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF261E	**Modelo condensador:**	CMF261E
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	7127901799
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	P.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea. Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado. Instalacion de tuberias de refrigeracion y cambio de aislamiento Termico Rubatex.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 5/8	7 mts	4	Cableado encauchetado 3X12	7,5 mts
2	Tuberia Cobre Flexible 3/8	7 mts	5	Cableado encauchetado 4X14	7,5 mts
3	Aislamiento Termico Rubatex	14 mts	6	Codo 5/8 en cobre	5 Und

Observaciones generales:
Se realiza Instalacion de aire acondicionado. En Funcionamiento. Soporte Antivibro — Todo 4 und.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin Fernando Perdomo	Nicolas
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

047

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 21-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 6to Administrativo Despacho
Encargado de la sede: Nicolas Losada	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM18CC7	**Modelo condensador:**	VM18CC7
Serial evaporador:	54NQ78KL2PEEC2GC02	**Serial condensador:**	501TAEJST820
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Fachada Posterior
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	17 C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Suministro e instalacion de Tarjeta electronica para Mini Split inverter Suministro e instalacion de Motor Fan Condensador de 12000 BTU

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales.
Equipo queda en Funcionamiento optimo

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 21-10-2026	**Hora inicio:**	**Hora fin:**
Elkin Fernando Perdomo Nombre, firma y cédula		Nombre, cargo, firma y sello

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 I
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0505

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 30/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2025 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: San Jose de la Fragua	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Promiscuo Municipal Sala de audiencias
Dirección: Juzgado San Jose	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo
Encargado de la sede: Jul Elena Guerrero Ortiz	**MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAGIID-24CR	**Modelo condensador:**	MOX330-24CF
Serial evaporador:	130045	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Montaje de un aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tubería de Cobre 5/8	4 MTS	4	Cable potencia 3x12	5 MTS
2	Tubería de Cobre 1/4	4 MTS	5		
3	Señal 4x14	5 MTS	6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 I
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0504

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 30/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: San Jose de Fragua	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Sala de Audiencias
Dirección: Juzgado San Jose	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo
Encargado de la sede: Jue Elena Guerrero ortega.	

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSA6110-24CR	**Modelo condensador:**	MOX330-24CF
Serial evaporador:	130045	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Mideci	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Desmontaje de aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0510

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaques	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo del Circuito Sala de Audiencia #1
Dirección: Juzgado Belen	
Encargado de la sede: Jaime Andres Antuni Parra	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ATNQ06NLA4	**Modelo condensador:**	N T
Serial evaporador:	003KDEA19A56	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N T
Capacidad:	9000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Plaza
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	16		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☑ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Carga de Refrigerante R410A		4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/10/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0527

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 08/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Valparaiso	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo
Dirección: Juzgado Valparaiso	Municipal Sala de Audiencia
Encargado de la sede: Giuliana Roncancio Perdomo	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Padomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MS-12IOEI	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	N.T	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Blueline	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	115V	**Tipo de Refrigerante:**	R22
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Control Remoto	1	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en noimal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/10/26	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Elkin perdomo	Giuliana R.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 7
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0529

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Morelia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Despacho juez
Dirección: Juzgado Morelia	
Encargado de la sede: Laura Alejandra Ennis	**Técnico(s) responsable(s):** ____

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	**Modelo condensador:**	VM182C7
Serial evaporador:	SOTAPEST832	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Control Universal	1	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/10/26 | **Hora inicio:** ____ | **Hora fin:** ____

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Laura Ennis Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

251

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Sede principal
Dirección: Av 16 #16-47	
Encargado de la sede: Martha Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☒ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:	Perkin	**Capacidad:**	181 KVA.	**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	trifasica 220	**Potencia motor:**	181 KVA	**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Mantenimiento Preventivo Planta			
2	electrica 281 KVA Diesel Perkin			
3	cambio de filtros de aire, aceite combustible			
4	limpieza general			
5	Pruebas de arranque			
6	Cambio de aceite.			
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Planta generadora

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: _____ **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Carlos Daniel Valencia
Nombre, firma y cédula 1075664108
Técnico que realizó el trabajo

Martha Castro Herrera
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

252

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia.	**Sede / Despacho Judicial:** Tribunales
Dirección: Cra 2 #32-91 – Cooperativa.	
Encargado de la sede: Martha Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia.

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo Planta Electrica

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:	Comis	**Capacidad:**	96 KVA	**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	Trifasico 220V	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Se realiza Pruebas de encendido			
2	Cambio de aceite de motor			
3	Cambio de filtro de Aceite			
4	Cambio de filtro de combustible			
5	Cambio de filtro de aire.			
6	limpieza general.			
7	Pruebs de voltaje.			
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-10-2026 **Hora inicio:** 4:00 Pm **Hora fin:** 8:00 Pm

Carlos Daniel Valencia Cordoba.
Nombre, firma y cédula 1.053.864.108
Técnico que realizó el trabajo

Martha Castro Sierra.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

253

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia.	**Sede / Despacho Judicial:** _____
Dirección: AV 16 H 6-12	
Encargado de la sede: _____	**Técnico(s) responsable(s):** _____

TIPO SERVICIO	☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	Barnes	**No. de placa:**	150766
Capacidad:	50 hp	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	trifasico 220v	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo Modelo QE500TB)

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:	Barnes	**Capacidad:**	50 hp	**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	220 V Trifasica	**Potencia motor:**	50 hp	**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	limpieza general			
2	Cambio de sello mecanico			
3	Cambio de rodamiento			
4	Prueba de encendido			
5				
6				
7	Se recomienda la instalacion			
8	hidroneumatico. Para este sistema.			

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Red contra incendios
Se recomienda no encender para llenado de tanques

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-10-2026 **Hora inicio:** 4:00 PM **Hora fin:** 6:00 PM

Nombre, firma y cédula 1053804108 Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

255

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia.	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia, Florencia.
Dirección: AV 16 # 6-47	
Encargado de la sede: Martha Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo Modelo 1LA3731-2YB79.

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:	Baldor	**Capacidad:**	12 hp	**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	220 V trifasico	**Potencia motor:**	12 hp	**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Limpieza general			
2	Cambio de sello mecanico			
3	Cambio de Rodamiento			
4	Pruebas de encendido.			
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Red contra incendios

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-10-026 **Hora inicio:** 4:00 pm **Hora fin:** 6:00 pm

Nombre, firma y cédula 1053864108
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

257

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio de Justicia
Dirección: AV - 16 # 6 - 17	
Encargado de la sede: Martha Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia.

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo Bomba 1

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	2"
Marca:	Barnes	**Capacidad:**	7.5 hp	**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	220V trifasico	**Potencia motor:**	7.5 hp	**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	se realizo desmonte			
2	se realiza limpieza			
3	se realiza desarme de la maquina			
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Se evidencia Maquina Quemada Se recomienda Cambio

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-10-2026 — **Hora inicio:** 2:00 Pm — **Hora fin:** 4:00 Pm

Nombre, firma y cédula 1055866108
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

258

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia.	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia
Dirección: AV 16 # 6-47	
Encargado de la sede: Martha Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia.

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**	1" 1/2.	**Dimensiones:**	
Marca:	Barnes	**Capacidad:**	6.6 HP.	**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	220V trifasico	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	desmonte de maquina			
2	desarme de maquina			
3	Se evidencia que esta quemada			
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: se informa para cambio por una nueva.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-10-2026 **Hora inicio:** 2:00 pm **Hora fin:** 4:00 pm.

Nombre, firma y cédula 1.073.864.168
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 259

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 14-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia.	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia Tribunales
Dirección: Cra 1 32-91	
Encargado de la sede: Martha Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia.

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	Barnes	**No. de placa:**	No tiene.
Capacidad:	10 hp	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	Trifasico 220 V	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañileria, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Se realiza Revicion y diagnostico			
2	Se evidencia Bomba quemado.			
3	Se solicita Cambio			
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 14-10-2026	**Hora inicio:** 5:30 pm	**Hora fin:** 6:30 pm

Nombre, firma y cédula 1053804168 Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

260

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ___	**Fecha:** 15-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen.	**Sede / Despacho Judicial:** Belen
Dirección:	
Encargado de la sede: Martha Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia.

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo modelo 2P30h36J.

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**	3 1/2 – 2"	**Dimensiones:**	
Marca:	Pear	**Capacidad:**	3 HP	**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	220V trifasica	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Cambio de Sello mecanico			
2	Cambio de rodamientos			
3	limpieza general.			
4	Pruebas de encendido exitosa			
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Bombas

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-10-2026 **Hora inicio:** 10:00 AM **Hora fin:** 12:00 pm

Nombre, firma y cédula 1053864608 Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

261

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia.
Dirección:	
Encargado de la sede: Martha Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**	III	**Dimensiones:**	-
Marca:	Pear	**Capacidad:**	3 hp	**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	220 v - trifasica	**Potencia motor:**	3 hp	**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Cambio de sello mecanico			
2	Cambio de Rodamiento			
3	limpieza general			
4	pruebas de encendido exitosa.			
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: _____ **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

262

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15 - 10 - 2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia.
Dirección:	
Encargado de la sede: Martha Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia.

TIPO SERVICIO	☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:	Bairez	**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**	Bomba excatoria	**Dimensiones:**	
Marca:	Bairez	**Capacidad:**	—	**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	Trifasica	**Potencia motor:**	—	**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Verificacion de turbinas			
2	Verificacion de flotadores			
3	Mantenimiento de turbina			
4	mantenimiento de cheque.			
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15 - 10 - 2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 263

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia.
Dirección:	
Encargado de la sede: Marta Castro.	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**	Bomba- eyector	**Dimensiones:**	
Marca:	Barnes	**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	220- trifasico	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	verificar de turbinas			
2	verificacion de flotadores			
3	mantenimiento de turbinas			
4	mantenimiento de los cheques			
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-10-2026 — **Hora inicio:** 4:00 pm — **Hora fin:** 6:00 pm

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 264

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** _____
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen.	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio justicia
Dirección: _____	
Encargado de la sede: Martha Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia

TIPO SERVICIO	☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	MANTENIMIENTO	☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	RESULTADO	☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**	Bomba de achique	**Dimensiones:**	
Marca:	Aquapak	**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	220 – trifasico	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Mantenimiento de turbina			
2	mantenimiento de chequeo			
3	Revision de arrancador inteligen.			
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-10-2026	**Hora inicio:** 6:30 Pm	**Hora fin:** 8:00 Pm

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

265

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** _____
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia
Dirección: _____	
Encargado de la sede: Marta. Castro.	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia

TIPO SERVICIO	☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Visita diagnostico sistema contraincendios			
2	Fallo en motor Diesel			
3				
4	Se soliata Visita de mecanico			
5	laboratorio Diesel, Fallo en Bomba			
6	de combustible.			
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: _____	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula 1075864106
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

266

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-10-2026.
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Albania.	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Albania,
Dirección:	
Encargado de la sede: Marta Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia.

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo Planta Electrica

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:	KAMA	**Capacidad:**	6500,	**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	220	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañileria, pintura, plomeria, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Cambio de Aceite.			
2	cambio de fitro de Aceite.			
3	Mantenimiento fitro Aire.			
4	Pruebas de encendido			
5	Pruebas de Voltaje.			
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Cambio de manguera	1	4		
2	del fitro combustible		5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: _____ **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula 1.053864108
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

267

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia.
Dirección:	
Encargado de la sede: Marta Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia

TIPO SERVICIO	☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo Planta electrica

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:	Toyama.	**Capacidad:**	7.5 KVA.	**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Cambio de aceite.			
2	Cambio de filtro aceite.			
3	Prueba de voltaje Bateria			
4	limpieza general.			
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: _____ **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

268

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: pto Rico	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia.
Dirección:	
Encargado de la sede: Marta Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo Planta electrica

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Cambio de Aceite.			
2	Limpieza general			
3	cambio de filtro de combustible			
4	cambio de filtro de Aceite.			
5	Cambio de Bateria.			
6	Pruebas de encendido.			
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Bateria 750 Amh		4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Se recomienda la compra de cargador de bateria.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula 1053864108
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

270

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-10-2026.
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia
Dirección: AV 16 # 6-97.	
Encargado de la sede: marta castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia.

TIPO SERVICIO	☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo tablero electro Bomba1

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	Trifasico	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	Revision general			
2	limpieza general.			
3	ajuste de tornilleria.			
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Cambio de Breikers 3X40	2	4		
2	Cambio de Contactores 32 AM	2	5		
3			6		

Observaciones generales:
se realiza Revison de Breikers, cableado, Medidas de voltaje. y ajustes de tornillos

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: _____ **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

271

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 10-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia
Dirección:	
Encargado de la sede: Mantenimiento	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valero.

TIPO SERVICIO: ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo Tablero electrico control incendios 1

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	trifasico	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2	limpieza general.			
3	ajuste y [illegible]			
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Se realiza inspeccion, limpieza, ajustes de tornilleria, Pruebas de Voltaje y verificacion de cableado

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: _____ **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

272

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia
Dirección:	
Encargado de la sede: Martha Castro.	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Urrea C.

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo Tablero Bomba incendio 1

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	trifasico	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1	limpieza general			
2	ajustes de Breakes			
3	Revision de cableado.			
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	totalizador 160 Amp	1	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Se realiza cambio de totalizador 160 Amp y ajuste de tornillería, verificacion de cableado

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: _____ **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

273

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio de Justicia.
Dirección: AV - 16 - #6 - 47	
Encargado de la sede: Marta Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia.

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo Tablero electrico Bomba Yoki

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	trifasico	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2	Todo Sin Novedad.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Se realiza limpieza, ajuste de Breaker, revision de cableado, Pruebas de voltaje.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula 1075869108
Técnico que realizó el trabajo

Marta Castro Sierra
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

274

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia.
Dirección:	
Encargado de la sede: marta Castro	**Técnico(s) responsable(s):** David Valencia

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo Tablero electrico Bombas Pear 1

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	trifasico.	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2	Todo sin novedad.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Se realiza revision general de tablero, limpieza, ajuste de tornilleria y Pruebas de voltaje.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: _____ **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula 1.075864108 Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

275

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 15-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia.
Dirección:	
Encargado de la sede: martha Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia.

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo tablero electrico Bombas eyectoras

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	trifasico.	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañileria, pintura, plomeria, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2	Instalacion de testigo de fase.			
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	testig de fase	1	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: se realiza visita tecnica, ajuste de tornillerm, revision de cableado, Pruebas de Voltaje.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 15-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

276

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 16-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☒ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** Palacio Justicia
Dirección:	
Encargado de la sede: Martha Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Daniel Valencia

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	
Marca:		**No. de placa:**	
Capacidad:		**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo tablero electrico Pimapa Puerto Rico

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:	trifasico	**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2	Se realiza ajuste de . Breakes			
3	ya que encontramos puntos caliente)			
4				
5	Se deja operativo sin novedad			
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Se realiza ajuste de totalizadores, limpieza, Pruebas de voltaje.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 16-10-2026 **Hora inicio:** 9:00 Am **Hora fin:** 9:40 am

Nombre, firma y cédula 1.053864108 Técnico que realizó el trabajo	Martha Castro Serna. Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Powered by CamScanner

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 030

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 28-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Cuarto de Monitoreo
Dirección: Edificio Palacio de Justicia	
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ELF18Q	**Modelo condensador:**	ELF18Q
Serial evaporador:	705790068 4	**Serial condensador:**	705790020 9
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	
Capacidad:	18080 Btu	**Zona / Ubicación:**	Parqueadero 2, Sotano
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R-410 A
Temp. de Suministro:	23 C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza mantenimiento Preventivo General a Unidad interior y Exterior

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo en Funcion Optima

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 28-09-2026	**Hora inicio:** 2: Pm	**Hora fin:** 5:45 Pm

Elkin Fernando Perdomo Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 175
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0320

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 06-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Centro de Servicios Administrativos
Dirección: Edificio palacio de Justicia de los Juzgados Penales Circuito Especializado OF: 375	
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM092C8	**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:	910TAQPA6004	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	72-000000109295
Capacidad:	9000	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo en buen funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-10-2026 **Hora inicio:** 3:Pm **Hora fin:** 4:15Pm

Elkin Fernando Perdomo	HECTOR PERDOMO ESPAÑA.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 126
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0319

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 06-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales Circuito Especializado 315
Dirección: Edificio Palacio de Justicia	
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	UM18ZC7	**Modelo condensador:**	
Serial evaporador:	906TAACDM192	**Serial condensador:**	
Marca:	LG	**No. de placa:**	12-000000709303
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	72C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo en buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-10-2026 **Hora inicio:** 10:30 Am **Hora fin:** 12 PM

Elkin Fernando Perdomo	HECTOR PERDOMO ESPAÑA
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 704
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

043

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 08-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 2 Oficina 304
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Tribunal Superior Civil - Familia - laboral
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):**

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF12TE	**Modelo condensador:**	CMF12TE
Serial evaporador:	712790375G	**Serial condensador:**	
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	N.T Azotea, Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo funcionando en optimas condiciones

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-10-2026 **Hora inicio:** 4:15 Pm **Hora fin:** 5 Pm

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 703
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0324

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 08-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Dapacho 2 oficina 304 Magistrado
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Tribunal Superior Sala civil familia laboral
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF127E	**Modelo condensador:**	EMF127E
Serial evaporador:	7721903659	**Serial condensador:**	7721904139
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea - Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo Funcional, temperatura confort.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 2:30 Pm 08-10-2026 — **Hora inicio:** 2:30 PM — **Hora fin:** 3:45pm

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 195
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0322

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 08-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 3 Oficina 303
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Tribunal Superior Sala Civil Familiar Laboral
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMFZ61E	**Modelo condensador:**	CMFZ61E
Serial evaporador:	7721901972	**Serial condensador:**	
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N°.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea, Placa Derecha
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo y Configuracion del Mando o control inalambrico

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo funcional, optimas condiciones y temperatura confort

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-10-2026 **Hora inicio:** 8.15 Am **Hora fin:** 9:30

Elkin Fernando Perdomo	Jorge A. Bonilla Tovar
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 196
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0323

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____ **Fecha:** 08-10-2026

Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

Municipio: Florencia **Sede / Despacho Judicial:** Oficina Magistrado Despacho 3 OF 303 Tribunal Superior Sala Civil Familia laboral.

Dirección: Edificio Tribunales Administrativos **Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

Encargado de la sede: ____

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	Modelo condensador:	VM182C7
Serial evaporador:	911TA6HC6879	Serial condensador:	007TACxHP883
Marca:	LG	No. de placa:	N.T
Capacidad:	18000 btu	Zona / Ubicación:	Azotea, Plaza derecha
Voltaje de Operación:	220 Voltios	Tipo de Refrigerante:	R410a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se realiza Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo Funcional. Control remoto Presenta Falla en Display..

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08-10-2026 **Hora inicio:** 10. Am **Hora fin:** 11:40 Am

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Jorge Alexander Bonilla.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 137
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0321

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 06-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2025 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 1ro de Restitucion de Tierras
Dirección: Edificio Palacio de Justicia	
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	4MYW4524A7000AA	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	3C85770000666	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	TRANE	**No. de placa:**	72-000000000105001
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	-
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12°C		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se encontro Equipo Generando bajo enfriamiento y Congelamiento de las lineas de Tuberias.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Se realiza mantenimiento Preventivo, Equipo queda Funcional y buen confort

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06-10-2026 **Hora inicio:** 4:20 Pm **Hora fin:** 6. Pm

Elkin Fernando Perdomo	Patricia Gamboa
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 193
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

044

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 3 oficina 306
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Tribunal Superior de Florencia, Sala Penal
Encargado de la sede: Giovani Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Pedomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	CMF121E	**Modelo condensador:**	CMF121E
Serial evaporador:	472790444N	**Serial condensador:**	—
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea, Placa derecha
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12°C		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo en Funcion optima.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Pedomo	Jairo Camilo Vasquez - citador grado IV
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 | 9U
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

045

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 3 Oficina 306 Magistrado. Tribunal Superior de Florencia
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Cortes	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF12TE	**Modelo condensador:**	EMF12TE
Serial evaporador:	712190458 9	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	
Capacidad:	12000 btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea Placa derecha
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza Mantenimiento Preventivo.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador -	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en Función optima

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	Laura Camila Mosquera - Ctedor grado
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

IV

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 2
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0343

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 25/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Milan	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Sala de audiencias
Dirección: Juzgado Milán	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin perdomo
Encargado de la sede: WILLIAM MONTAÑA G.	

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ARUSDE24DIEHN	**Modelo condensador:**	ARUSDE24DIEHN
Serial evaporador:	0MGIPDB190001W	**Serial condensador:**	N.I
Marca:	SamSung	**No. de placa:**	N.I
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaidas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

M.C
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor) 17.643.706.

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0342

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____ **Fecha:** 25/09/26

Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

Municipio: Milan **Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Sala de audiencias

Dirección: Juzgado Milán **Técnico(s) responsable(s):** Elkin peidomo

Encargado de la sede: WILLIAM MONTILLA G.

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAG11B-12CR	Modelo condensador:	MOX130-12CF
Serial evaporador:	130041	Serial condensador:	N.T
Marca:	Midea	No. de placa:	N.T
Capacidad:	12000 BTU	Zona / Ubicación:	Placa
Voltaje de Operación:	210V	Tipo de Refrigerante:	R32
Temp. de Suministro:	1P		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/09/26 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0340

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 25/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Milán	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Juzgado Milán	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo
Encargado de la sede: [illegible]	

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	YSEC24ES-ADG	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	420107	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	YORK	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 25/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Perdomo	[illegible] G.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello 17675706 Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0341

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____ **Fecha:** 25/04/26

Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

Municipio: Milán **Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Despacho Juez

Dirección: Juzgado Milán **Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

Encargado de la sede: William Montilla G.

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM24267	**Modelo condensador:**	VM24267
Serial evaporador:	SO1TACXST739	**Serial condensador:**	N.I
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.I
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	12490
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 26/04/25 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor) 17645706

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0337

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____ **Fecha:** 24/09/26

Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

Municipio: Cartagena del Chaira **Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Secretaria

Dirección: Juzgado Cartagena **Técnico(s) responsable(s):** Elkin perdomo

Encargado de la sede: LIZ MARINA WALTEROS

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AR50F24DIEIH	Modelo condensador:	AR50F24DIEIH
Serial evaporador:	0M61PDCY900023K	Serial condensador:	N.T
Marca:	SamSung	No. de placa:	N.T
Capacidad:	24000 BTU	Zona / Ubicación:	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	Tipo de Refrigerante:	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/09/26 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Elkin perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0338

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 24/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Cartagena del chaira	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Sala de Audiencias
Dirección: Juzgado Cartagena	
Encargado de la sede: LUZ MARINA WALTEROS	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM242C7	**Modelo condensador:**	VM242C7
Serial evaporador:	911TAHQD4241	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 C
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0339

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 24/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Cartagena del Chairá	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Despacho Juez
Dirección: Juzgado Cartagena	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin padomo
Encargado de la sede: LUZ MARINA WALTEROS	**MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAG11B-12CR	**Modelo condensador:**	MOX130-12CF
Serial evaporador:	130034	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000Btu	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	1P		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 24/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin padomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 20
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0335

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 23/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto Rico	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de Audiencias
Dirección: Juzgado Puerto Rico	
Encargado de la sede: Nicolas E. Losada.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin peidomo

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VO242H1	**Modelo condensador:**	VO242H1
Serial evaporador:	412CRYQ07726	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo2
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	16		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 23
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0336

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 23/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto Rico	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de Audiencias
Dirección: Juzgado Puerto Rico	
Encargado de la sede: Nicolas Losada.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peldomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V0242H1	**Modelo condensador:**	V0242H1
Serial evaporador:	412CRNL07335	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BIU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/09/26 — **Hora inicio:** ____ — **Hora fin:** ____

Elkin peldomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 75
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0333

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 23/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 003 promiscuo Circuito Secretaria
Dirección: Juzgado puerto rico	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin perdomo
Encargado de la sede: Luisa juliana Giraldo S.	

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ406M1A5	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	S02TAGHHW359	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	40000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☑ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Luisa Juliana Giraldo S
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 77
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0332

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 23/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto Rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 002 promiscuo Circuito Secretaria
Dirección: Juzgado Puerto Rico	**Técnico(s) responsable(s):** ____
Encargado de la sede: Willder Ariel Chica	**MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ40GM1A5	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	502TA2FHW357	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	40000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☑ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/09/26 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Elkin Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 13
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0330

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____ **Fecha:** 23/09/26

Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

Municipio: Puerto Rico **Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 002 Promiscuo Circuito Despacho Juez

Dirección: Juzgado Puerto Rico **Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo

Encargado de la sede: William Andrés Chica Pimentel

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	V012H1	**Modelo condensador:**	V012H1
Serial evaporador:	501CRFT52379	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/09/26 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Elkin Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002-26
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0334

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 23/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2025 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Puerto Rico	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 003 promiscuo circuito Despacho juez
Dirección: Juzgado puerto rico	
Encargado de la sede: Luisa juliana Giraldo	**Técnico(s) responsable(s):** ____

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VO122H1	**Modelo condensador:**	VO122H1
Serial evaporador:	501CRPY52480	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 23/09/26 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Elkin palomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Luisa juliana Giraldo S.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 4
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0327

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 22/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: San Vicente del Caguan	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de Audiencias
Dirección: Juzgados San Vicente	
Encargado de la sede: Edgar Lende Ortiz	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VSI82C7	**Modelo condensador:**	VSI82C7
Serial evaporador:	401TABNAC709	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	211	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 2
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0329

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 22/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: San Vicente del Caguan	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado primero promiscuo Municipal Despacho Juz
Dirección: Juzgado San Vicente	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo
Encargado de la sede: Edgar Leon de Ortiz	

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAG11B-12CR	**Modelo condensador:**	MOX13C-12CF
Serial evaporador:	130042	**Serial condensador:**	
Marca:	Midea	**No. de placa:**	
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0331

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 22/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: San Vicente del Caguan	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado primero promiscuo Municipal
Dirección: San Vicente Juzgado	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pedomo
Encargado de la sede: Edgar Conde Ortiz	

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	4MYW45Z4A1OOA/A	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	N.T	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Tiane	**No. de placa:**	166869
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Pedomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 3
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0326

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 22/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: San Vicente del Caguan	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Segundo Promiscuo Municipal Despacho 002
Dirección: Juzgado San Vicente	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo
Encargado de la sede: EDGAR NEISON CARVAJAL	

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAG11B-12CR	**Modelo condensador:**	MOX13C-12CF
Serial evaporador:	130040	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 5
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0325

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 22/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: San Vicente del Caguan	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Segundo Promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Juzgado San Vicente	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo
Encargado de la sede: EDWAR NIPSON CADUMAL.	

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM242C7	**Modelo condensador:**	VM242C7
Serial evaporador:	N.T	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	211V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 22/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0503

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 30/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: San Jose del Fragua	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Promiscuo Municipal Sala de Audiencias
Dirección: Juzgado San Jose	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo
Encargado de la sede: Luz Elena Guevara Ortega	**MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAB11D-24CR	**Modelo condensador:**	MOX330-24CF
Serial evaporador:	130045	**Serial condensador:**	N.I
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.I
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	116		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin peidomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 2
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0502

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 30/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: San José del Fragua	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal - Despacho Juez 2
Dirección: Juzgado San José	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo
Encargado de la sede: Luz Elena Guerrero Ortega	

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAG4B-12CR	**Modelo condensador:**	MOXB30-12CF
Serial evaporador:	130006	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 3
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0501

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 30/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: San Jose del Fragua	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Juzgado San Jose	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo
Encargado de la sede: Lic Elena Guerrero Ortega	

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ARSOF24DIEHN	**Modelo condensador:**	ARSOF24DIEHN
Serial evaporador:	0MG1PDBY900046D	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Samsung	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0349

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 29/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Albania	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Promiscuo Municipal - Sala de Audiencias
Dirección: Juzgado Albania	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo
Encargado de la sede: Cesar Augusto Guarnizo B.	

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ARSOF24DIEHN	**Modelo condensador:**	ARSOF24DIEHN
Serial evaporador:	0ME1PPBY900029X	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	SamSung	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

1117513794.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 | Versión: 002 | Fecha: 03-08-2026

0348

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 29/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Albania	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Juzgado Albania	
Encargado de la sede: Cesar Augusto Guarnizo B.	**Técnico(s) responsable(s):** ____

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AR50F24DIEHN	**Modelo condensador:**	AR50F24DIEHN
Serial evaporador:	0MGIPDBY800063Y	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Samsung	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	211	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29/09/26 — **Hora inicio:** ____ — **Hora fin:** ____

Elkin Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

1117513759
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 3
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0350

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 29/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Albania	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Juez Despacho
Dirección: Juzgado Albania	
Encargado de la sede: Cesar Alexito Guarnizo B.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VS122C7	**Modelo condensador:**	VS122C7
Serial evaporador:	211TAWME1585	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29/09/26	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Elkin peidomo	1117513759.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0346

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 29/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Colinto	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo
Dirección: Juzgado Colinto	Municipal Sala de audiencia
Encargado de la sede: Diego Armando Lopez Sanchez	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Palomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	YSECO9FS-AD6	**Modelo condensador:**	N.F
Serial evaporador:	1000166	**Serial condensador:**	N.F
Marca:	YORK	**No. de placa:**	N.F
Capacidad:	9000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	19°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29/09/26 | **Hora inicio:** _____ | **Hora fin:** _____

Elkin Palomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0345

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 29/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2025 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Curillo	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Juzgado Curillo	
Encargado de la sede: Diego Armando Reyes Sanchez	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ARSOF24DIEHN	**Modelo condensador:**	ARSOF24DIEGN
Serial evaporador:	OMGIPDBY900047A	**Serial condensador:**	
Marca:	Samsung	**No. de placa:**	
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29/09/26	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin Perdomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0344

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 29/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Coritto	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Despacho juez
Dirección: Juzgado coritto	
Encargado de la sede: Diego Armando Espitia Sanchez	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	WSASMD-24OF	**Modelo condensador:**	MOX330-24FM
Serial evaporador:	130003	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 29/09/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 19
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0506

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____		**Fecha:** 02/10/26	
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)			
Municipio: Belen de los Andaquies		**Sede / Despacho Judicial:** Deposito	
Dirección: Juzgado Belen			
Encargado de la sede: Maria Castro Sierra.		**Técnico(s) responsable(s):** Elkin perdomo	
TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	YHJE18XJ6DTJ-RX	**Modelo condensador:**	YHJC18YJ6DTJ0-X
Serial evaporador:	N.T	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	YORK	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		
TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/10/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin perdomo	Maria Castro Sierra.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 15
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0508

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaquies	**Sede / Despacho Judicial:** Cuarto Rock
Dirección: Juzgado Belen	
Encargado de la sede: Mallacastro Sierra.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin peidomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	011TASWEC718	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo 2
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/10/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin peidomo	Mallacastro Sierra.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 8
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0509

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____		**Fecha:** 02/10/26	
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)			
Municipio: Belen de los Andaquies		**Sede / Despacho Judicial:** cuarto de factancia	
Dirección: Juzgado Belen			
Encargado de la sede: Maria Castro Parra.		**Técnico(s) responsable(s):** Elkin peidomo	
TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	011ACXEC883	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	P.T
Capacidad:	12000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		
TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/10/26	**Hora inicio:**	**Hora fin:**

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Maria Castro Parra.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 / 0
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0510

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2025 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaquies	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo del Circuito Sala de Audiencias #1
Dirección: Juzgado Belen	
Encargado de la sede: Jaime Andres Antori Parra	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ATNQ06NLA4	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	003KDEA19A56	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	40000BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☑ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Carga de Refrigerante R410A		4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/10/26	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin Peidomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0511

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belén de los Andaquies	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal – sala de Audiencia #2
Dirección: Juzgado Belen	
Encargado de la sede: Marta castro sierra.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ATNQ40GNLA4	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	003KCHL19961	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	40000BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☑ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/10/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin perdomo	Marta Castro Sierra.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 9
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0512

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaquies	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo de Familia Sala de Audiencias #3
Dirección: Juzgado Belen	
Encargado de la sede: Mantenimiento Sierra	**Técnico(s) responsable(s):** ____

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ATNQ40GNLA4	**Modelo condensador:**	N.I
Serial evaporador:	003KCRM19958	**Serial condensador:**	N.I
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.I
Capacidad:	40000BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☑ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/10/26 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Elkin palomo	[signature]
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0513

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaques	**Sede / Despacho Judicial:** Auditorio
Dirección: Juzgado Belen	
Encargado de la sede: Maria castro Serna.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin pardomo

TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AJNQ606MLA4	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	N.T	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	60000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☑ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/10/26	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin pardomo	Maria castro Serna
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0515

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____		**Fecha:** 02/10/26	
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)			
Municipio: Belen de los Andaquies		**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Picgectado Despacho juez	
Dirección: Juzgado Belen			
Encargado de la sede: Maria Castro Sierra.		**Técnico(s) responsable(s):** Elkin perdomo	
TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AMNW18GSJAA	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	912TATGC8161	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/10/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Maria Castro Sierra.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 3
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0518

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 06/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaquies	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo de familia Secretaria
Dirección: Juzgado Belen	
Encargado de la sede: Marta Castro Sierra.	**Técnico(s) responsable(s):** _____

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	**Modelo condensador:**	VM122C7
Serial evaporador:	011TA2FEC885	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06/10/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Perdomo	Marta Castro Sierra.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 14
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0514

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaquies	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal proyectado Secretaria
Dirección: Juzgado Belen	
Encargado de la sede: Marta Castro Sierra	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin peidomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ATNQ406NLA4	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	N.T	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	40000BTU	**Zona / Ubicación:**	Plaza
Voltaje de Operación:	240V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☑ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/10/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Marta Castro Sierra
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 6
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0519

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 06/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaquies	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Juzgado Belen	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo
Encargado de la sede: Maria Castro Sierra	

TIPO SERVICIO	☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO**	☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ATNQ40GNLA4	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	003KCLH19AS2	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	40000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO	☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☑ CASSETTE ☐ OTRO	**RESULTADO**	☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06/10/26	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Elkin perdomo	Maria Castro Sierra
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 | 3
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0517

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 06/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaquies	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo de familia Despacho juz2
Dirección: Juzgado Belen	
Encargado de la sede: Maria Castro Serra	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AMNW12GSJAA	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	N.T	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	110		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06/10/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Maria Castro Serra
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 12
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0516

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 06/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaquies	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo de Familia Secretaria
Dirección: Juzgado Belen	
Encargado de la sede: Maria Castro Serna	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin peidomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ATNQ90GNLA4	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	003KCTB19AS3	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	40000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☑ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 06/10/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 2
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0522

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 07/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaquies	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo del circuito Despacho Juz
Dirección: Juzgado Belen	
Encargado de la sede: Jaime Andrés Anturi Parra	**Técnico(s) responsable(s):**

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AMNW126SJAA	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	912TA2FC8157	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07/10/26	**Hora inicio:**	**Hora fin:**

Elkin Pedomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0521

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 07/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaquies	**Sede / Despacho Judicial:** Jorgado promiscuo del Circuito Secretaria
Dirección: Jorgado Belen	
Encargado de la sede: Jaime Andrés Arturi Parra	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pardomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ATNQ406PLA4	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	N.T	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	40000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☑ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07/10/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin pardomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 16
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0520

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 07/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaquies	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Despacho Juez
Dirección: Juzgado Belen	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo
Encargado de la sede: Mantacastro Sierra	

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AMNW126SJAA	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	N.T	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 07/10/26 | **Hora inicio:** ____ | **Hora fin:** ____

Elkin peidomo	Mantacastro Sierra.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 Z
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0529

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Morelia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Despacho Jor2
Dirección: Juzgado Moretici	
Encargado de la sede: Laura Alejandra Ennis	**Técnico(s) responsable(s):**

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	**Modelo condensador:**	VM182C7
Serial evaporador:	SOITAPEST832	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Control Universal	1	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/10/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Laura Ennis Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 1
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0528

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Morelia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Juzgado Morelia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo
Encargado de la sede: Laura Alejandra Ennis	

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM242C7	**Modelo condensador:**	VM242C7
Serial evaporador:	5OTAV1ST35	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/10/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Laura Ennis
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0527

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 08/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Valparaiso	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Promiscuo Municipal Sala de Audiencias
Dirección: Juzgado Valparaiso	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo
Encargado de la sede: Giuliana Roncancio Perdomo	

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MS-12IOEL	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	N.T	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Blueline	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	115V	**Tipo de Refrigerante:**	R22
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento Preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Control Remoto	1	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/10/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Perdomo	Giuliana R.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 2
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0526

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 8/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Valparaiso	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Despacho juez
Dirección: Juzgado Valparaiso	
Encargado de la sede: Giuliana Roncancio Pentomo	**Técnico(s) responsable(s):**

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	YSEC09FY-ADC	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	800226	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	YORK	**No. de placa:**	12-000000097461
Capacidad:	9000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/10/26	**Hora inicio:**	**Hora fin:**

Elkin Pardomo	Giuliana R.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0525

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 08/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Juzgado Valparaiso	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Juzgado Valparaiso	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Pardomo
Encargado de la sede: Giuliana Roncancio Perdomo	

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	YSEC24FS-ADG	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	200925	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	YORK	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/10/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Pardomo	Giuliana R.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0523

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 8/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Solita	**Sede / Despacho Judicial:** Jorgado promiscuo Municipal Secretaria
Dirección: Jorgado solita	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin pedomo
Encargado de la sede: ~~Fredy~~ Rodrigo Rivera Morales	

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ90GMIAS	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	502TAOLHW318	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	40000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☑ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 8/10/26 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin pedomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0524

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____ **Fecha:** 10/08/26

Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

Municipio: Solita **Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Promiscuo Municipal Secretaria

Dirección: Juzgado Solita

Encargado de la sede: Freddy Rodrigo Rivera Morales **Técnico(s) responsable(s):** ____

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	**Modelo condensador:**	VM182C7
Serial evaporador:	3011AR1ST830	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10/08/26 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Elkin Pedomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

RELACIÓN DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO CONTRATO No. 018 DE 2026

DESAJ-CAQUETA

FECHA	MUNICIPIO	ORDEN DE TRABAJO No.	ZONA DE CLIMATIZACIÓN	EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU	DETALLE	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
02/09/2026	ED TRIBUNALES	059	DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - OF 205	MINISPLIT	MIDEA	24.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	5	ML	$ 20.500	$ 102.500
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	10	ML	$ 19.934	$ 199.344
19/08/2026	ED TRIBUNALES	001	EDIFICIO ADMINISTRATIVO				SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	30	ML	$ 19.934	$ 598.033
03/09/2026	ED. PRINCIPAL	061	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - OFICINA DE APOYO JUDICIAL - COORDINACION ADMINISTRATIVA	PISO TECHO	BLUELINE	36.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	ML	$ 19.934	$ 79.738
08/09/2026	ED. PRINCIPAL	067	RECURSOS HUMANOS- ARCHIVO	MINISPLIT	LG	18.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	8	ML	$ 19.934	$ 159.475
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	4	ML	$ 20.500	$ 82.000
09/09/2026	ED. PRINCIPAL	025	JUZGADO 4 PENAL DEL CIRCUITO - DESPACHO	MINISPLIT	LG	18.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	6	ML	$ 19.934	$ 119.607
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	5	ML	$ 16.800	$ 84.000
10/09/2026	ED. PRINCIPAL	022	JUZGADO 8 PENAL MUNICIPAL OF 402	MINISPLIT	LG	12.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE MAGUERA PLASTICA PARA DRENAJE	1	ML	$ 16.800	$ 16.800
18/09/2026	ED. PRINCIPAL	100	EDIFICIO PRINCIPAL				SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	50	ML	$ 20.500	$ 1.025.000
29/09/2026	ED. PRINCIPAL	0302	SALA DE AUDIENCIA OF310	MINISPLIT	SAMSUNG	24.000	CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5 T.R.	1	GBL	$ 682.703	$ 682.703
02/10/2026	ED TRIBUNALES	0311	TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	MINISPLIT	MIDEA	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 16.500	$ 16.500
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	2	ML	$ 20.500	$ 41.000
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	2	ML	$ 21.192	$ 42.384
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	ML	$ 19.934	$ 79.738
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
02/10/2026	ED TRIBUNALES	0315	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	5	ML	$ 20.500	$ 102.500
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	5	ML	$ 21.192	$ 105.960
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	12	ML	$ 19.934	$ 239.213
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO	2	ROLLO	$ 16.500	$ 33.000
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688

02/10/2026	ED TRIBUNALES	0317	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	ML	$ 19.934	$ 79.738
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 16.500	$ 16.500
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	2	ML	$ 20.500	$ 41.000
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	2	ML	$ 21.192	$ 42.384
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
02/10/2026	ED TRIBUNALES	0318	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	4,0	ML	$ 45.278	$ 181.112
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	4,0	ML	$ 24.131	$ 96.524
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	8	ML	$ 19.934	$ 159.475
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	5	ML	$ 20.500	$ 102.500
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	5	ML	$ 21.192	$ 105.960
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
02/10/2026	ED TRIBUNALES	0316	EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	PISO TECHO	LG	40.000	INSTALACION BASICA EQUIPO 60000 BTU	1	UND	$ 1.523.810	$ 1.523.810
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 186.936	$ 186.936
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	2	ML	$ 19.934	$ 39.869
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 16.500	$ 16.500
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
02/10/2026	ED TRIBUNALES	0310	EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	2,5	ML	$ 45.278	$ 113.195
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	2,5	ML	$ 24.131	$ 60.328
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	5	ML	$ 19.934	$ 99.672
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	3	ML	$ 20.500	$ 61.500
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	3	ML	$ 21.192	$ 63.576
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688

02/10/2026	ED. PRINCIPAL	0314	EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	MINISPLIT	MIRAGE	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.354.355	$ 1.354.355
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 186.936	$ 186.936
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	ML	$ 19.934	$ 79.738
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO	1	ROLLO	$ 16.500	$ 16.500
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	2	ML	$ 20.500	$ 41.000
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	2	ML	$ 21.192	$ 42.384
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
05/10/2026	ED TRIBUNALES	0313	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	2	ML	$ 20.500	$ 41.000
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	2	ML	$ 21.192	$ 42.384
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	ML	$ 19.934	$ 79.738
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	2	ML	$ 45.278	$ 90.556
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	2	ML	$ 24.131	$ 48.262
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
05/10/2026	ED TRIBUNALES	0312	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	MINISPLIT	MIRAGE	18.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	5	ML	$ 20.500	$ 102.500
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	5	ML	$ 21.192	$ 105.960
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	7	ML	$ 19.934	$ 139.541
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA	3,5	ML	$ 45.278	$ 158.473
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA	3,5	ML	$ 24.131	$ 84.459
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
19/10/2026	ED TRIBUNALES	0453	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO OF 205	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	1,5	ML	$ 19.934	$ 29.902
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA	2	UND	$ 25.807	$ 51.614

19/10/2026	ED TRIBUNALES	0455	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	ML	$ 19.934	$ 79.738
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA	2	UND	$ 25.807	$ 51.614
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	3	ML	$ 20.500	$ 61.500
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	3	ML	$ 21.192	$ 63.576
19/10/2026	ED TRIBUNALES	0456	TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	MINISPLIT	MIDEA	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	6	ML	$ 19.934	$ 119.607
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA	2	UND	$ 25.807	$ 51.614
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	4,5	ML	$ 20.500	$ 92.250
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	4,5	ML	$ 21.192	$ 95.364
19/10/2026	ED TRIBUNALES	0457	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	7	ML	$ 19.934	$ 139.541
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA	2	UND	$ 25.807	$ 51.614
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	6	ML	$ 20.500	$ 123.000
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	6	ML	$ 21.192	$ 127.152
19/10/2026	ED TRIBUNALES	0458	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	MINISPLIT	MIDEA	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	8	ML	$ 19.934	$ 159.475
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA	2	UND	$ 25.807	$ 51.614
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	7,5	ML	$ 20.500	$ 153.750
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	7,5	ML	$ 21.192	$ 158.940

19/10/2026	ED TRIBUNALES	0459	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	MINISPLIT	MIRAGE	12.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU	1	UND	$ 1.024.118	$ 1.024.118
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU	1	UND	$ 137.258	$ 137.258
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA	3	UND	$ 25.807	$ 77.421
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	4	ML	$ 19.934	$ 79.738
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
19/10/2026	ED TRIBUNALES	0451	SALA DE AUDIENCIA OF107	MINISPLIT	MIRAGE	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.354.355	$ 1.354.355
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 186.936	$ 186.936
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	11	ML	$ 19.934	$ 219.279
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA	5,5	UND	$ 33.735	$ 185.543
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	5,5	UND	$ 63.576	$ 349.668
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS	5	UND	$ 32.320	$ 161.600
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	6	ML	$ 20.500	$ 123.000
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	6	ML	$ 21.192	$ 127.152
19/10/2026	ED TRIBUNALES	0452	SALA DE AUDIENCIA OF106	MINISPLIT	MIRAGE	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.354.355	$ 1.354.355
							DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 186.936	$ 186.936
							SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX	14	ML	$ 19.934	$ 279.082
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO)	4	UND	$ 11.422	$ 45.688
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA	7	UND	$ 33.735	$ 236.145
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA	7	UND	$ 63.576	$ 445.032
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS	5	UND	$ 32.320	$ 161.600
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	7,5	ML	$ 20.500	$ 153.750
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14	7,5	ML	$ 21.192	$ 158.940
21/10/2026	ED PRINCIPAL	0047	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO - DESPACHO	MINISPLIT	LG	18.000	SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA ELECTRONICA PARA MINI SPLIT INVERTER (UNIDAD CONDENSADORA)	1	UN	$ 1.067.648	$ 1.067.648
							SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR PARA CONDESADOR DE 18000 BTU	1	UN	$ 641.547	$ 641.547
30/09/2026	SAN JOSE DE LA FRAGUA	0505	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	MIDEA	24.000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU	1	UND	$ 1.420.002	$ 1.420.002
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA-	4	ML	$ 26.645	$ 106.580
							SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA -	4	ML	$ 70.224	$ 280.896
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 -	5	ML	$ 23.408	$ 117.040
							SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12	5	ML	$ 20.500	$ 102.500

30/09/2026	SAN JOSE DE LA FRAGUA	0504	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	MIDEA	24.000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU	1	UND	$ 206.286	$ 206.286
02/10/2026	BELEN	0510	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #1	PISO TECHO	LG	40.000	SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER	2	LB	$ 80.098	$ 160.196
08/10/2026	VALPARAISO	0527	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT	BLUELINE	12.000	SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU	1	UND	$ 164.470	$ 164.470
09/10/2026	MORELIA	0529	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT	LG	18.000	SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU	1	UND	$ 164.470	$ 164.470
SUBTOTAL											**$ 37.222.473**
IVA											**$ 7.072.270**
TOTAL											**$ 44.294.743**

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

059

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____ **Fecha:** 02/09/26

Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☐ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

Municipio: Florencia

Dirección: Edificio Administrativo **Sede / Despacho Judicial:** Despacho 01 Tribunal Contencioso Administrativo Oficina 205

Encargado de la sede: JOSE RAMON GARCIA PARADA.

Técnico(s) responsable(s): Elkin Peidomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAG11D-240RFN8	**Modelo condensador:**	MOX330-24CFN8
Serial evaporador:	130027	**Serial condensador:**	200032
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	220V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Montaje de un aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tubería de Cobre 1/2	5Mts	4	Cable 3x12	5Mts
2	Tubería de Cobre 1/4	5Mts	5	Rubatex	10 Mts
3	Señal 4x14	3Mts	6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/09/26 **Hora inicio:** ____ **Hora fin:** ____

Elkin Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 6.33

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

001

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ___ **Fecha:** 19-08-26

Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

Municipio: Florencia **Sede / Despacho Judicial:** edificio los tribunales

Dirección: Palacio Justicia - los Tribunales

Encargado de la sede: _____

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

Técnico(s) responsable(s): Zikin Perdomo

MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		Modelo condensador:	
Serial evaporador:		Serial condensador:	
Marca:		No. de placa:	
Capacidad:		Zona / Ubicación:	
Voltaje de Operación:		Tipo de Refrigerante:	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta: contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Cambio aislamiento termico	3 mts.	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-08-26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Zikin Perdomo - 1080296438
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

061

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden:	**Fecha:** 03/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio palacio de justicia	**Sede / Despacho Judicial:** Consejo Superior de la judicatura oficina de Apoyo judicial Coordinación Adm
Encargado de la sede: Edwin Bobadilla.	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin padomo
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	PTE-36JSN	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	160009	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Blueline	**No. de placa:**	12-000000107350
Capacidad:	36000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☑ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza Cambio de aislamiento de tubería de Refrigeración y destapamiento de drenaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 03/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin padomo	Edwin S. Bobadilla Torres
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

067

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ___	**Fecha:** 08/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: EDIFICIO palacio de justicia	**Sede / Despacho Judicial:** OFICINA Recursos Humanos Archivo
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	
TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**Técnico(s) responsable(s):** ELKIN Pardomo
MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VH18ZC7	**Modelo condensador:**	VH18ZC7
Serial evaporador:	910TAPEA8072	**Serial condensador:**	P.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N-0000006110310
Capacidad:	18000 BIO	**Zona / Ubicación:**	Placa
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Montaje de un aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	4Mts de tubuca Cobre 3/8	4Mts	4	Cable 3x12	4Mts
2	Tubuca Cobre 1/4	4Mts	5	Rubatex	8Mts
3	Señal 4x14	4Mts	6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/09/26 **Hora inicio:** ___ **Hora fin:** ___

Elkin Pardomo	Juan Manuel Mejia Rodriguez
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

025

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	Fecha: 11-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Palacio de Justicia	Sede / Despacho Judicial: Juzgado 4to Penal del Circuito Despacho
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	Técnico(s) responsable(s): Elkin Fernando Perdomo
TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	Modelo condensador:	UM182CT
Serial evaporador:	910TACXAB075	Serial condensador:	906TAT6CT753
Marca:	LG	No. de placa:	
Capacidad:	18000 BTU	Zona / Ubicación:	Cubierta 4to Piso
Voltaje de Operación:	220v	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	22°C		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Se entrega equipo de A/C operativo y funcionando en optima condicion

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaidas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañileria, pintura, plomeria, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tubería Flexible 1/4 en cobre	3 mts
2	Tubería Flexible 1/2 en cobre	3 mts
3	Cable enrauchetado 4X14	2 mts

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
4	Canaleta 100x45	0.40 cm
5	Curva Plana	1 und
6	Manguera de Cristal 5/16	5 mts

Observaciones generales:
Se suministra bomba de condensado con su respectiva manguera de Drenaje 6 mts
Rubatex

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/09/2026 | Hora inicio: _____ | Hora fin: _____

Elkin Fernando Perdomo	OSCAR EDUARDO GUTIERREZ ROJAS
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

022

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____ **Fecha:** 10-09-2026

Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)

Municipio: Florencia

Dirección: Cll 16 # 6-47 Edificio Palacio de Justicia **Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 8 Penal Municipal

Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia **Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☒ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM122C7	Modelo condensador:	VS122C7
Serial evaporador:	212TAZFER773	Serial condensador:	212TAWMD3633
Marca:	LG	No. de placa:	
Capacidad:	12000 btu	Zona / Ubicación:	Juzgado 8 Penal Municipal
Voltaje de Operación:	220 voltios	Tipo de Refrigerante:	R410A
Temp. de Suministro:	12C°		Oficina 402

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☒ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☒ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza instalacion del split o unidad interior y se corrige Posicion de la Red de Tuberias.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 1/4	2 mts	4	Manguera de Drenaje	01
2	Tuberia Cobre Flexible 3/8	2 mts	5		
3	Canaleta 100 x 45	0.30cm	6		

Observaciones generales: Equipo Puesta en Marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10-09-2026 **Hora inicio:** 9:Am **Hora fin:** ____

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Ana Maria Caballos Lopez - Secretaria.
Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

100

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ___	Fecha: 18/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Palacio de justicia	Sede / Despacho Judicial:
Encargado de la sede: Maria Edelmira Castro	
TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	Técnico(s) responsable(s):
MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:		Modelo condensador:	
Serial evaporador:		Serial condensador:	
Marca:		No. de placa:	
Capacidad:		Zona / Ubicación:	
Voltaje de Operación:		Tipo de Refrigerante:	
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☑ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		Descripción:		Dimensiones:	
Marca:		Capacidad:		Velocidad:	
Voltaje/Fase:		Potencia motor:		No. paradas:	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Cable encauchetado 3x12	50 MTS	4		
2	Breker	4	5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 18/09/26 | Hora inicio: ___ | Hora fin: ___

Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 16
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0302

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 29-09-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de Audiencias 310
Dirección: Edificio Palacio de Justicia	
Encargado de la sede: Juan Manuel Mejia	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Peidomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AR50F24D7EHN	**Modelo condensador:**	AR50F24D7EHX
Serial evaporador:	0MG1PDBY900060R	**Serial condensador:**	
Marca:	Samsung	**No. de placa:**	
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	M.T Plano Superior
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	12 C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico:
Correccion de Fuga y Carga Completa de R32

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:
Equipo queda Funcional

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 10: Am — **Hora inicio:** 1 3:20Pm — **Hora fin:** ____

Elkin Fernando Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 702
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0311

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 02 oficina 302 Magist
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Sala Penal, Tribunal Superior Florencia
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAG11B-12CRFN8	**Modelo condensador:**	MOX130-12CFN8
Serial evaporador:	5472000HDDA9250730057	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, reubicacion de red de Tuberias de refrigeracion, cambio de: Aislamiento termico, cableado de Comunicacion y Voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento termico Rubatex	4 mts	4	cable encauchetado 4x14	2 mts
2	Cinta Vinilo	7 Rll	5	Soporte Antivibratorio Mogolla	4 und
3	Cable encauchetado 3x12	2 mts	6		

Observaciones generales: Se realiza instalacion de aire acondicionado. En buen funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-10-2026	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 706
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0315

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria - Tribunal Superior
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Sala Civil Familiar laboral - Oficina 308
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF18T E	**Modelo condensador:**	CMF18T E
Serial evaporador:	7127900441	**Serial condensador:**	7127900760
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 bTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea - Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	
Temp. de Suministro:	12 C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza: Desmonte de aire acondicionado, Reubicacion de red de Tuberias de Refrigeracion, Cambios de: Aislamiento termico, cableado de Comunicacion y Voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Cable encauchetado 3x12	5 mts	4	Cinta Unico	2 Rll
2	Cable encauchetado 4x14	5 mts	5	Soportes Antivibratorios	4 Und
3	Aislamiento Termico Rubatex	12 mts	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado. En buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 707
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0317

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 02 Oficina 304
Dirección: Edificio Tribunales Administrativo	Tribunal Superior Sala Civil, Familia, Laboral
Encargado de la sede: Giovanny Ramirez Cotto	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF12TE	**Modelo condensador:**	CMF12TE
Serial evaporador:	—	**Serial condensador:**	712903647
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea – Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	17°C		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza: desmonte de aire Acondicionado, Reubicacion de red de tuberias de refrigeracion, Cambio de aislamiento y Cableados de Comunicacion y Voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento Termico	4 mts	4	Cable encauchetado 3x14	2 mts
2	Cinta Unilo	1 Rll	5	Soporte Antivibratorio Mogallas	4 und
3	Cable encauchetado 3x12	2 mts	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado. En buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-13-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 204
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0318

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 2 Oficina Magistrado OF-304, Tribunal Superior Sala Civil Familia Laboral
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF72TE	**Modelo condensador:**	EMF72TE
Serial evaporador:	727903659	**Serial condensador:**	727904139
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea - Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	72 C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza: Desmonte de aire acondicionado, Reubicacion de comunicacion y Tuberias de refrigeracion, Cambio de: Aislamientos termicos y Cableados Voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 1/2	4 mts	4	Cable encauchetado 3 X 12	5 mts
2	Tuberia Cobre Flexible 1/4	4 mts	5	Cable encauchetado 4 X 14	5 mts
3	Aislamiento Termico Rubatex	8 mts	6	Soporte Antivibratorio Maquina	4 und

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado, en buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	Nombre, cargo, firma y sello
Nombre, firma y cédula	Encargado del recibido (Sede / Supervisor)
Técnico que realizó el trabajo	

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 205
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0316

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria - Tribunal Superior
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Sala Civil Familiar Laboral oficina 308
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	AVNQ406M7AS	**Modelo condensador:**	AUUQ40HS
Serial evaporador:	311TAFZFV467	**Serial condensador:**	310TADRE9930
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	220 Voltios / 39.100 Btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea – Placa Izquierda
Voltaje de Operación:		**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	22°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☑ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, Reubicacion de Tuberias de refrigeracion y cambios de aislamiento Termico Rubatex

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento Termico Rubatex	2mts	4		
2	Cinta Vinilo	1 Rll	5		
3	Soportes Antivibratorios - Mogo	4 und	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado. En buen Funcionamiento.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-10-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0310

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 02 Oficina 302
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Sala Penal, Tribunal Superior Florencia
Encargado de la sede: Giovanny Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Peidomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF72TE	**Modelo condensador:**	EMF72TE
Serial evaporador:	712790364 7	**Serial condensador:**	712790414 5
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 Btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza: Desmonte de aire acondicionado, reubicacion de red de tuberias de refrigeracion, cambio de aislamiento termico y Cableado de Comunicacion y Volt

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 1/2	2,5 mts	4	Cable encauchetado Voltaje 3X12	3 mts
2	Tuberia Cobre Flexible 1/4	2,5 mts	5	Cable encauchetado control 4X14	3 mts
3	Aislamiento Termico Rubatex	5 mts	6	Soporte Antivibratorio Mogolla	4 und

Observaciones generales:

Se realiza Instalacion de aire Acondicionado. En buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-10-2026	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin Fernando Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 776
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0314

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de Audiencia 705
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF767E	**Modelo condensador:**	CMF767E
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	7727907892
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea, Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	17 C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza: Desmonte de aire acondicionado, Recubricion de tuberia de refrigeracion, cambio de: Aislamiento termico, Cableado de Comunicacion y Voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento Termico Rubatex	4 mts	4	Cableado encauchetado 4X14	2 mts
2	Cinta Vinilo	1 Rll	5	Soportes Antivibratorios	4 Und
3	Cableado encauchetado 3X12	2 mts	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado. En buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	[signature]
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 208
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0313

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 05-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria – Tribunal Contencioso Administrativo del Caqueta, oficina 208
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF18TE	**Modelo condensador:**	CMF18TE
Serial evaporador:	772190036 2	**Serial condensador:**	772190024 6
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea, Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, reubicacion de Tuberia de refrigeracion Cambio de aislamiento termico, cable de Comunicacion y voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tubería Cobre Flexible 1/4	2 mts	4	Cable encauchetado 3 X 12	3 mts
2	Tubería Cobre Flexible 1/2	2 mts	5	Cable encauchetado 4 X 14	3 mts
3	Aislamiento Termico Robatex	4 mts	6	Soporte Antivibratorio Mod 14	4 Und

Observaciones generales:
Se realiza Instalacion de aire acondicionado. en buen Funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05-10-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 707
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0312

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 05-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Secretaria – Tribunal Contencioso Administrativo del Caqueta OF 208
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: Giovany Ramirez Castro	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF187C	**Modelo condensador:**	CMF187C
Serial evaporador:	707220639	**Serial condensador:**	707220176
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 btu	**Zona / Ubicación:**	Azotea, Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	17C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, reubicacion de red de tuberias de refrigeracion, cambio de: Aislamiento termico, Cableado de Comunicacion y Voltaje

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 1/2	3,5 mts	4	Cableado encauchetado 3X12	5 mts
2	Tubería Cobre Flexible 1/4	3,5 mts	5	Cableado encauchetado 4X14	5 mts
3	Aislamiento Termico	7 mts	6	Soporte Antivibratorio Mopolas	4 und

Observaciones generales:
Se realiza Instalacion de aire acondicionado. En buen funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 05-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 0453

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 7 oficina 705 Magist. Tribunal Contencioso Administrativo del Caqueta
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: _____	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF121E	**Modelo condensador:**	CMF121E
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	7127904131
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N/T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Aeotaca. Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	22°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, adecuacion de tuberia de refrigeracion y Cambio de aislamiento Termico Rubatex

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento termico Rubatex	1,5 mts	4		
2	Soporte Antivibratorio	4 und	5		
3	Codo en cobre 1/2	2 Und	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado. Equipo Funcional

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	Nicolas.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0455

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 2 Oficina 304 Magistrado Tribunal Superior Sala Civil – Familia – Laboral
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: ____	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☐ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF121E	**Modelo condensador:**	CFM121E
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	7121904556
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea. Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:			

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, Adecuacion de tuberias de refrigeracion, cambio de aislamiento termico Rubatex.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guias, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaidas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañileria, pintura, plomeria, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento termico Rubatex	4 mts	4	Cable encauchetado 3X12	3mts
2	Soporte Antivibratorio	4 Und	5	Cable encauchetado 4X14	3mts
3	Codo en cobre de 1/2	2 Und	6		

Observaciones generales:
Se realiza Instalacion de Aire acondicionado. Equipo funcional

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026 — **Hora inicio:** ____ — **Hora fin:** ____

Elkin Fernando Perdomo	Nicolas
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0456

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 2 oficina 302 Magistrado Tribunal Superior Florencia Sala Penal
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSA6-12CR-N8	**Modelo condensador:**	MOX130-12CFN8
Serial evaporador:	'	**Serial condensador:**	HDEA92401120012
Marca:	Midea	**No. de placa:**	P.T
Capacidad:	12000 BTO	**Zona / Ubicación:**	Azotea, Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R32a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se desmonta aire acondicionado, se realiza adecuacion de tuberias de refrigeracion, se realiza Cambio de aislamiento Termico Robatex

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento Termico Robatex	6mts	4	Cable encauchetado 3X12	4.5mts
2	Soporte Antivibratorio	4 und	5	Cable encauchetado 4X14	4.5mts
3	Codo en cobre 1/2	2 und	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado, en funcionamiento.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	Nicolas
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 0457

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 2 oficina 207 magistrado
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Tribunal Contencioso Administrativo del Caqueta
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF121E	**Modelo condensador:**	CMF121E
Serial evaporador:	—	**Serial condensador:**	712790444988
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	P.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Acotea. Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	EM10a
Temp. de Suministro:	12 C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, alteracion de tuberia de refrigeracion, cambio de aislamiento y termo Rubatex.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento termico Rubatex	7 mts	4	Cable encauchetado 3X12	6 mts
2	Soporte Antivibratorio	4 und	5	Cable encauchetado 4X14	6 mts
3	Codos en cobre 1/2	2 und	6		

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de Aire acondicionado. Equipo Funcional

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026	**Hora inicio:**	**Hora fin:**

Elkin Fernando Perdomo Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nicolas Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0458

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 1 Oficina 305 Magistrado Tribunal Superior Sala Penal
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: _____	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAG11B-12CEFN8	**Modelo condensador:**	MOX130—12CFN8
Serial evaporador:	—	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea. Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, Adecuacion de tuberias de refrigeracion, Cambio de aislamiento termico.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento termico Rubatex	8 mts	4	Cable encauchetado 3X12	7,5 mts
2	Soporte Antivibratorio	4 Und	5	Cable encauchetado 4X14	7,5 mts
3	Codo en cobre 1/2	20 Und	6		

Observaciones generales: Se realiza instalacion de Aire acondicionado, Equipo funcional

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	Nicolas.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 0459

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Despacho 1 Oficina 305
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	Tribunal Superior Sala Penal -
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF121E	**Modelo condensador:**	CMF921E
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	7121904133
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea. Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	12°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, Adecuacion de Tuberia de refrigeracion, cambio de aislamiento termico, instalacion de Soporte Condensador.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Aislamiento termico Rubatex	4mts	4		
2	Codos en cobre de 1/2	3 Und	5		
3	Soporte Antivibratorio	4 Und	6		

Observaciones generales: Se realiza instalacion de aire acondicionado, en funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026	**Hora inicio:**	**Hora fin:**

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nicolas Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 0451

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias 107
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede:	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMFZ61E	**Modelo condensador:**	CFM261E
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	712190779B
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea, Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado, Instalacion de tuberia de refrigeracion y Suministro de aislamiento termico Rubatex.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 5/8	5.5 mts	4	Cable enaochetado 3X12	6mts
2	tuberia Cobre Flexible 3/8	5.5 mts	5	Cable enaochetado 4X14	6mts
3	Aislamiento termico Rubatex	11 mts	6	Codo 5/8 en cobre	5und

Observaciones generales:
Se realiza instalacion de aire acondicionado. EN Funcionamiento. Soporte Antivibratorio 04 und.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026 — **Hora inicio:** _____ — **Hora fin:** _____

Elkin Fernando Perdomo	Nicolas.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS	**ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA** Contratos 017 y 018 de 2026	**Código:** ST-IM-F-002 **Versión:** 002 **Fecha:** 03-08-2026 0452

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 19-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	**Sede / Despacho Judicial:** Sala de audiencias 106
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	
Encargado de la sede: ____	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO:** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	EMF261E	**Modelo condensador:**	CMF261E
Serial evaporador:		**Serial condensador:**	7127901799
Marca:	Mirage	**No. de placa:**	P.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Azotea. Placa Izquierda
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410
Temp. de Suministro:	12C°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO — **RESULTADO:** ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Se realiza desmonte de aire acondicionado. Instalacion de tuberias de refrigeracion y cambio de aislamiento Termico Rubatex.

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tuberia Cobre Flexible 5/8	7 mts	4	Cableado encauchetado 3X12	7,5 mts
2	Tuberia Cobre Flexible 3/8	7 mts	5	Cableado encauchetado 4X14	7,5 mts
3	Aislamiento Termico Rubatex	14 mts	6	Codo 5/8 en cobre	5 Und

Observaciones generales:
Se realiza Instalacion de aire acondicionado. En Funcionamiento. Soporte Antivibro — Todo 4 und.

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 19-10-2026	**Hora inicio:** ____	**Hora fin:** ____

Elkin Fernando Perdomo	Nicolas
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

047

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 21-10-2026
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Florencia	
Dirección: Edificio Tribunales Administrativos	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado 6to Administrativo Despacho
Encargado de la sede: Nicolas Losada	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Fernando Perdomo
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	**MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM18CC7	**Modelo condensador:**	VM18CC7
Serial evaporador:	54NQ78KL2PEEC2GC02	**Serial condensador:**	501TAEJST820
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Fachada Posterior
Voltaje de Operación:	220 Voltios	**Tipo de Refrigerante:**	R410a
Temp. de Suministro:	17 C°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Suministro e instalacion de Tarjeta electronica para Mini Split inverter Suministro e instalacion de Motor Fan Condensador de 12000 BTU

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales.
Equipo queda en Funcionamiento optimo

RECEPCION DEL TRABAJO

Fecha: 21-10-2026	**Hora inicio:**	**Hora fin:**
Elkin Fernando Perdomo Nombre, firma y cédula		Nombre, cargo, firma y sello

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 I
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0505

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 30/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2025 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: San Jose de la Fragua	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado Promiscuo Municipal Sala de audiencias
Dirección: Juzgado San Jose	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Perdomo
Encargado de la sede: Jul Elena Guerrero Ortiz	**MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia
TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble	

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSAGIID-24CR	**Modelo condensador:**	MOX330-24CF
Serial evaporador:	130045	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Midea	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	2104	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☐ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Montaje de un aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Tubería de Cobre 5/8	4 MTS	4	Cable potencia 3x12	5 MTS
2	Tubería de Cobre 1/4	4 MTS	5		
3	Señal 4x14	5 MTS	6		

Observaciones generales: Equipo puesto en marcha

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Perdomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 I
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0504

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 30/09/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: San Jose de Fragua	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Sala de Audiencias
Dirección: Juzgado San Jose	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo
Encargado de la sede: Jue Elena Guerrero ortega.	

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MSA6110-24CR	**Modelo condensador:**	MOX330-24CF
Serial evaporador:	130045	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Mideci	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	24000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R32
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☑ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Desmontaje de aire acondicionado

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1			4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales:

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 30/09/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0510

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 02/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Belen de los Andaques	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo del Circuito Sala de Audiencia #1
Dirección: Juzgado Belen	
Encargado de la sede: Jaime Andres Antuni Parra	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Peidomo

TIPO SERVICIO: ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble

MANTENIMIENTO: ☑ Preventivo ☑ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	ATNQ06NLA4	**Modelo condensador:**	N T
Serial evaporador:	003KDEA19A56	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N T
Capacidad:	9000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Plaza
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	16		

TIPO EQUIPO: ☐ SISTEMA VRF ☐ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☑ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO: ☑ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Carga de Refrigerante R410A		4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 02/10/26 **Hora inicio:** _____ **Hora fin:** _____

Elkin Peidomo
Nombre, firma y cédula
Técnico que realizó el trabajo

Nombre, cargo, firma y sello
Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0527

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 08/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Valparaiso	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo
Dirección: Juzgado Valparaiso	Municipal Sala de Audiencia
Encargado de la sede: Giuliana Roncancio Perdomo	**Técnico(s) responsable(s):** Elkin Padomo

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble — **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	MS-12IOEI	**Modelo condensador:**	N.T
Serial evaporador:	N.T	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	Blueline	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	12000 BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulo
Voltaje de Operación:	115V	**Tipo de Refrigerante:**	R22
Temp. de Suministro:	17°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO

RESULTADO ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A	Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)				**Pozo, rellanos y pruebas funcionales**			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐	Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐	Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐	Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Cabina y puertas				Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐				
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐				
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐				

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Control Remoto	1	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en noimal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 08/10/26	**Hora inicio:** _____	**Hora fin:** _____

Elkin perdomo	Giuliana R.
Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

INFRAESTRUCTURA AS

ORDEN DE TRABAJO CONSOLIDADA

Contratos 017 y 018 de 2026

Código: ST-IM-F-002 7
Versión: 002
Fecha: 03-08-2026

0529

Entidad contratante: Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva

No. de Orden: ____	**Fecha:** 09/10/26
Contrato: ☐ 017 de 2026 (Lote 1 – Neiva) ☑ 018 de 2026 (Lote 2 – Florencia)	
Municipio: Morelia	**Sede / Despacho Judicial:** Juzgado promiscuo Municipal Despacho juez
Dirección: Juzgado Morelia	
Encargado de la sede: Laura Alejandra Ennis	**Técnico(s) responsable(s):** ____

TIPO SERVICIO ☑ Climatización ☐ Ascensores ☐ Obra civil / Locativo ☐ Mueble | **MANTENIMIENTO** ☑ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Emergencia

SECCIÓN A · CLIMATIZACIÓN (AIRES ACONDICIONADOS)

Modelo evaporador:	VM182C7	**Modelo condensador:**	VM182C7
Serial evaporador:	SOTAPEST832	**Serial condensador:**	N.T
Marca:	LG	**No. de placa:**	N.T
Capacidad:	18000BTU	**Zona / Ubicación:**	Angulos
Voltaje de Operación:	210V	**Tipo de Refrigerante:**	R410A
Temp. de Suministro:	11°		

TIPO EQUIPO ☐ SISTEMA VRF ☑ MURAL O SPLIT ☐ PISO - TECHO ☐ CASSETTE ☐ OTRO | **RESULTADO** ☐ Buen estado ☐ Montaje/Desmontaje ☐ Reparación ☐ Requiere repuestos

Informes y observaciones del técnico: Mantenimiento preventivo

SECCIÓN B · ASCENSORES / BOMBAS

Especificaciones del equipo

Tipo (MRL/MR):		**Descripción:**		**Dimensiones:**	
Marca:		**Capacidad:**		**Velocidad:**	
Voltaje/Fase:		**Potencia motor:**		**No. paradas:**	

Checklist de mantenimiento (☐ Conforme ☐ No conforme ☐ N/A)

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Motor y control (MRL/MR)			
Inspección visual del motor: temperatura, ruido, vibración	☐	☐	☐
Revisión del freno del motor / panel de control / variador	☐	☐	☐
Revisión de cables de tracción, tensión y polea	☐	☐	☐
Cabina y puertas			
Revisión del operador de puerta, contactos y sensores	☐	☐	☐
Revisión de botonera, señalización e indicadores	☐	☐	☐
Prueba de intercomunicador / citófono y alarma de emergencia	☐	☐	☐

Ítem de verificación	Conf.	No conf.	N/A
Pozo, rellanos y pruebas funcionales			
Inspección del foso: limpieza, humedad, iluminación, fines de carrera	☐	☐	☐
Revisión de puertas de rellano: guías, cerrojos y contactos	☐	☐	☐
Prueba de marcha continua, parada de emergencia y paracaídas	☐	☐	☐
Prueba de modo bomberos, ruido, vibraciones y consumo	☐	☐	☐

SECCIÓN C · OBRA CIVIL / MANTENIMIENTO LOCATIVO / MUEBLE

Ítem	Descripción de la actividad (albañilería, pintura, plomería, etc.)	Unidad	Cantidad	Observación
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

REPUESTOS Y OBSERVACIONES GENERALES

Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.	Ítem	Descripción del Repuesto/Material	Cant.
1	Control Universal	1	4		
2			5		
3			6		

Observaciones generales: Equipo en normal funcionamiento

RECEPCIÓN DEL TRABAJO

Fecha: 09/10/26 | **Hora inicio:** ____ | **Hora fin:** ____

Nombre, firma y cédula Técnico que realizó el trabajo	Laura Ennis Nombre, cargo, firma y sello Encargado del recibido (Sede / Supervisor)

Florencia,Octubre 22 de 2026

Señores
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

Referencia: **INFORME RUTINA DOS- CONTRATO N° 018 DE 2026- NEIVA**

En la rutina comprendida entre los dias 22 de Septiembre y Martes 20 de Octubre se da continuidad a la rutina de mantenimientos preventivos en el edificio principal, edificio adminsitrativo (tribunales) y rutina de mantenimiento en municipios.De igual manera se atienden algunos requerimientos reportados como emergencia por la entidad para atencion inmediata.El siguiente documento anexa registros fotograficos como evidencia de las actividades desarrolladas en cada una de las sedes intervenidas.


Sedes intervenidas:

- Florencia-edificio principal
- Florencia -Sede administrativos
- Albania
- Belen de los Andaquies
- Cartagena del Chaira
- Curillo
- Milan
- Morelia
- Puerto Rico
- San Jose de Fragua
- San Vicente del caguan
- Solita
- Valparaiso

OFICINA / DEPENDENCIAS: CUARTO MONITOREO

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED. PRINCIPAL | OT: 0301 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 18000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 10):
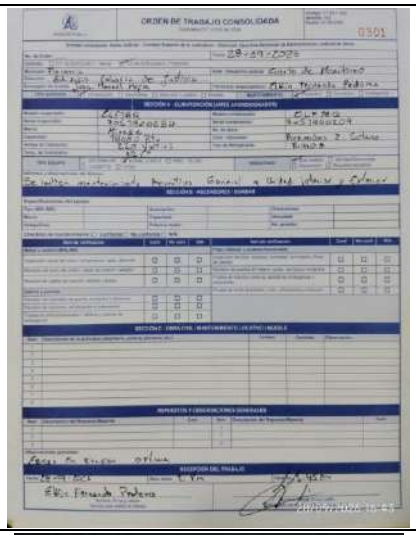
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: CUARTO MONITOREO (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED. PRINCIPAL | OT: 0301 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 18000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 10):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: CUARTO MONITOREO (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED. PRINCIPAL | OT: 0301 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 18000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 10 de 10):






OFICINA / DEPENDENCIAS: CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 315

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED. PRINCIPAL | OT: 0320 | EQUIPO: MINISPLIT LG 9000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 5):

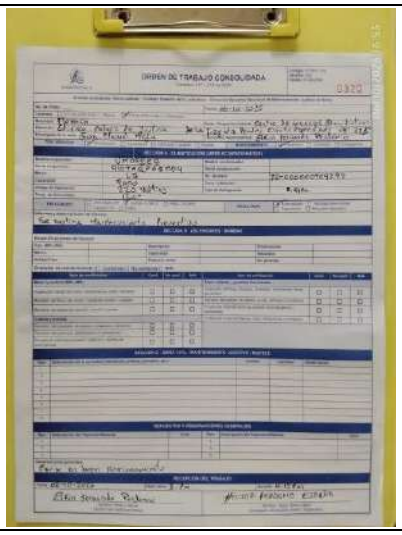



OFICINA / DEPENDENCIAS: CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 315 (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED. PRINCIPAL | OT: 0320 | EQUIPO: MINISPLIT LG 9000 BTU


Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 5 de 5):



OFICINA / DEPENDENCIAS: CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 315

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED. PRINCIPAL | OT: 0319 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 10):

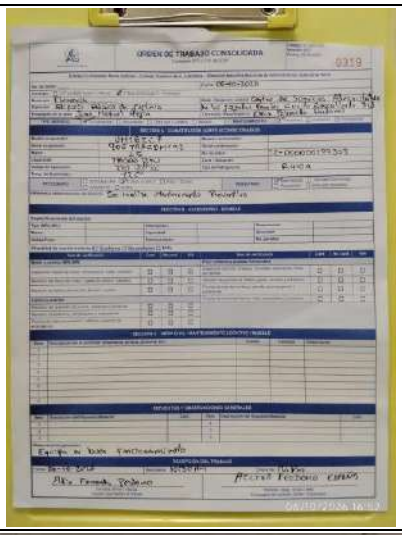







OFICINA / DEPENDENCIAS: CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 315 (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED. PRINCIPAL | OT: 0319 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 10):









OFICINA / DEPENDENCIAS: CENTRO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LOS JUZGADOS PENALES CIRCUITO ESPECIALIZADO - OF 315 (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED. PRINCIPAL | OT: 0319 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 10 de 10):






OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 043 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 6):



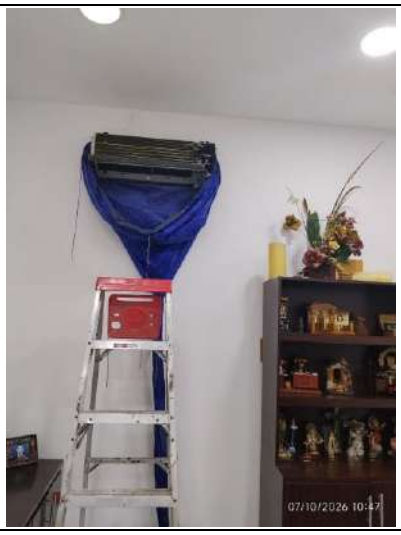





OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304 (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 043 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 6 de 6):







OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304 - DESPACHO MG

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0324 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 6):
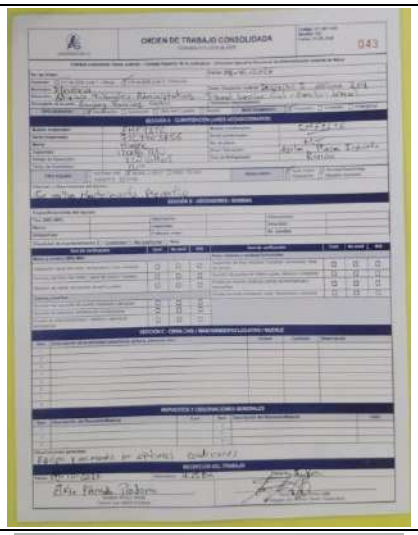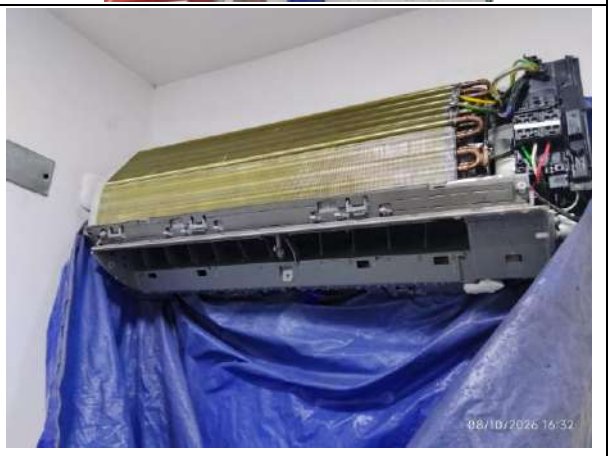
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304 - DESPACHO MG (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0324 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 6 de 6):







OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 3 OF 303

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0322 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 24000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 7):

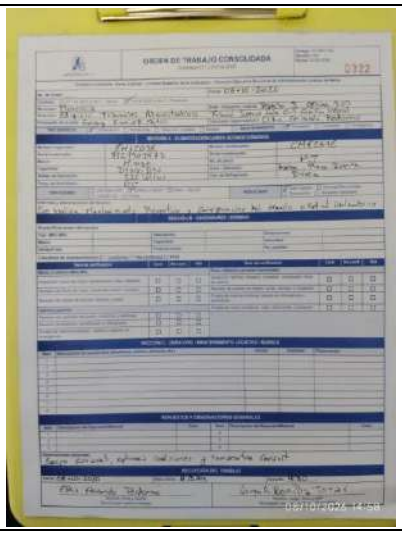

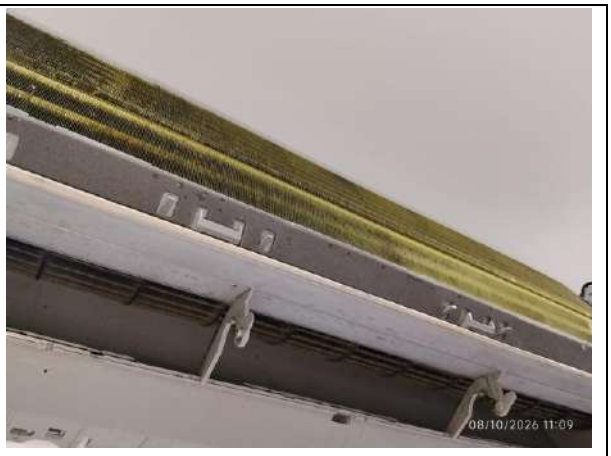





OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 3 OF 303 (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0322 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 24000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 7 de 7):








CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL DE FAMILIA LABORAL - DESPACHO 3 OF 303 - DESPACHO MG

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0323 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

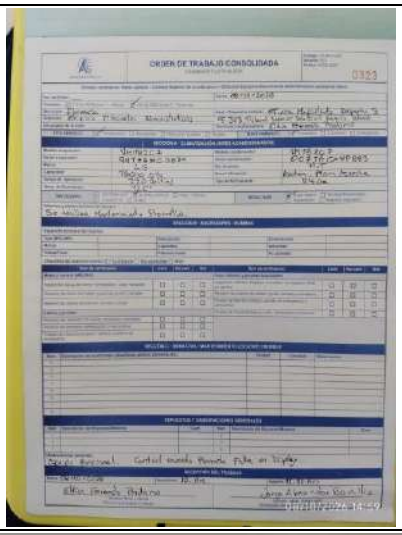








OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 1 DE RESTITUCION DE TIERRAS

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0321 | EQUIPO: MINISPLIT TRANE 24000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 11):

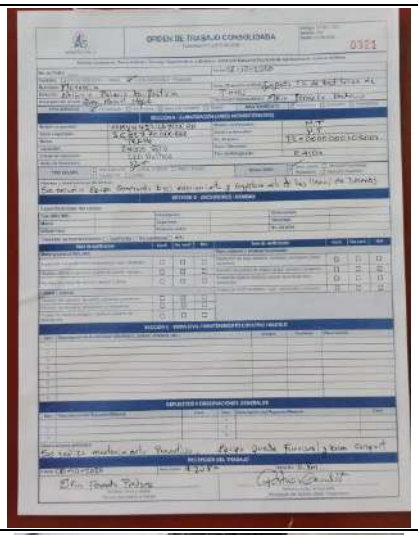







OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 1 DE RESTITUCION DE TIERRAS (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0321 | EQUIPO: MINISPLIT TRANE 24000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 11):









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 1 DE RESTITUCION DE TIERRAS (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0321 | EQUIPO: MINISPLIT TRANE 24000 BTU


Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 11 de 11):


<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA DESPACHO 3 OFICINA 306 - SALA PENAL

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 044 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 11):

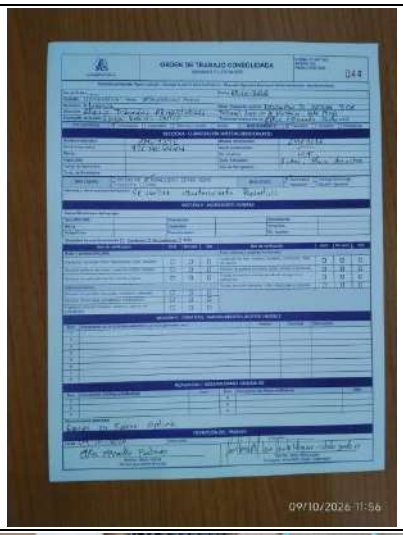

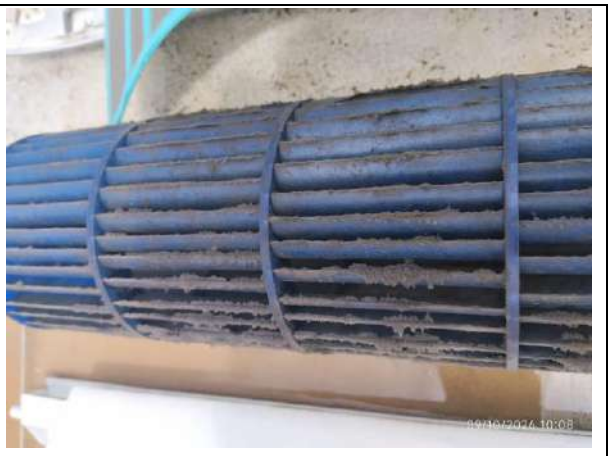





OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA DESPACHO 3 OFICINA 306 - SALA PENAL (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 044 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 11):









OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA DESPACHO 3 OFICINA 306 - SALA PENAL (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 044 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 11 de 11):






OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA DESPACHO 3 OFICINA 306 - DESPACHO MG

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 045 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 9):

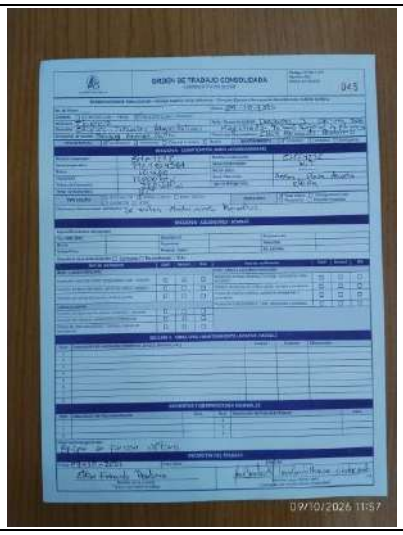







OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA DESPACHO 3 OFICINA 306 - DESPACHO MG (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 045 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 9):









OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR DE FLORENCIA DESPACHO 3 OFICINA 306 - DESPACHO MG (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 045 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000 BTU


Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 9 de 9):



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIAS

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: MILAN | OT: 0343 | EQUIPO: MINISPLIT SAMSUNG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):
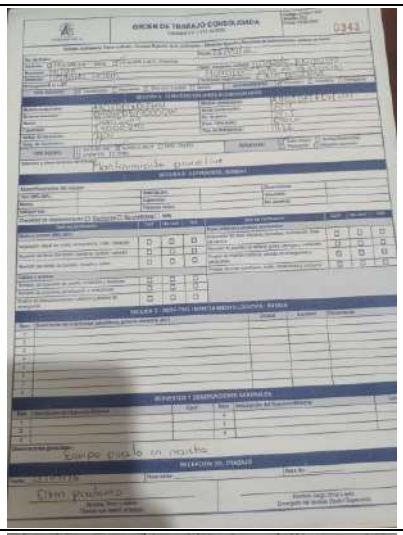
<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIAS

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: MILAN | OT: 0342 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000 BTU


Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: MILAN | OT: 0340 | EQUIPO: MINISPLIT YORK 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):
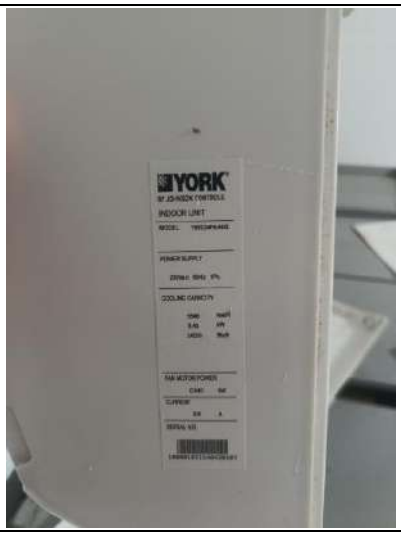
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: MILAN | OT: 0341 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU


Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CARTAGENA DEL CHAIRA | OT: 0337 | EQUIPO: MINISPLIT SAMSUNG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):
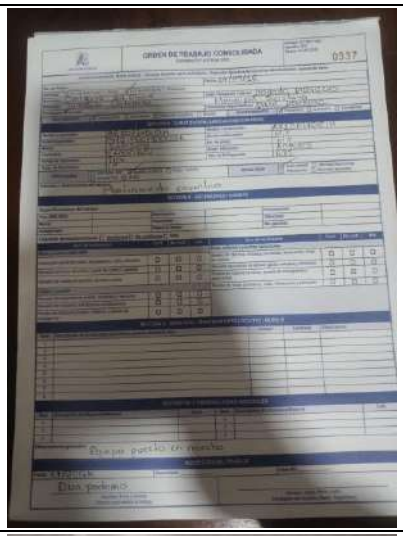
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIAS

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CARTAGENA DEL CHAIRA | OT: 0338 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CARTAGENA DEL CHAIRA | OT: 0339 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 0335 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 0336 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU


Soporte Fotográfico (4 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 3 PROMISCUO CIRCUITO - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 0333 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

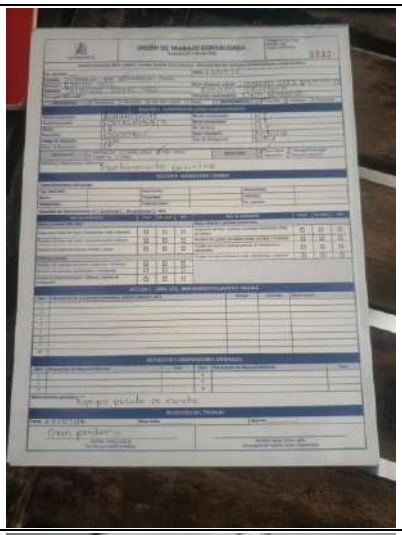








CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PROMISCUO CIRCUITO - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 0332 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):
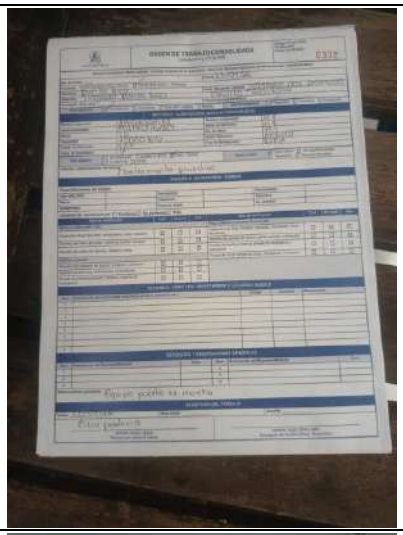
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PROMISCUO CIRCUITO - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 0330 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (2 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 3 PROMISCUO CIRCUITO - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: PUERTO RICO | OT: 0334 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):






OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: SAN VICENTE | OT: 0327 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):




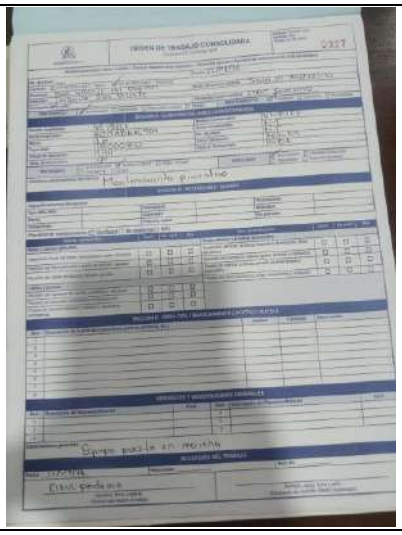

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: SAN VICENTE | OT: 0329 | EQUIPO: MINISPLIT MISEA 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

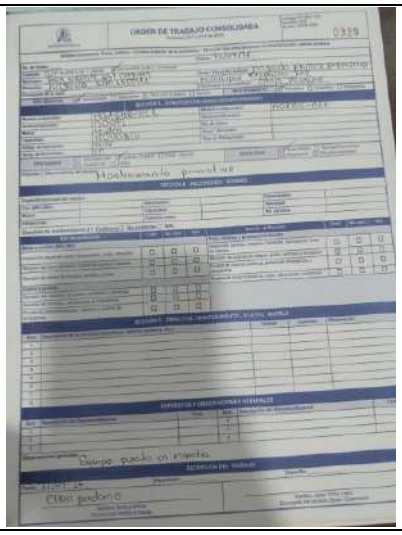



OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: SAN VICENTE | OT: 0331 | EQUIPO: MINISPLIT TRANE 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):


	

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: SAN VICENTE | OT: 0326 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):


CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

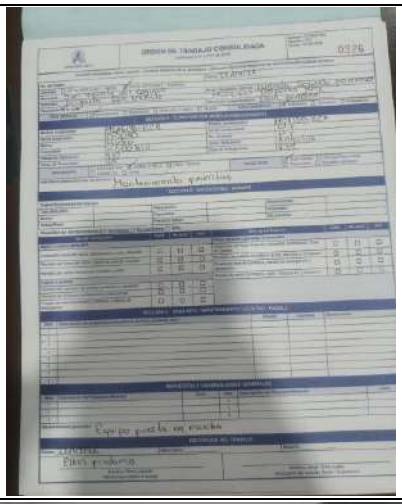NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: SAN VICENTE | OT: 0325 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):
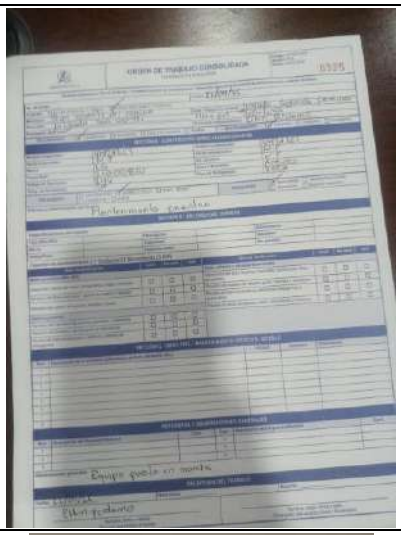
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>


CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: SAN JOSE DE LA FRAGUA | OT: 0503 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 24000 BTU


Soporte Fotográfico (4 fotos):
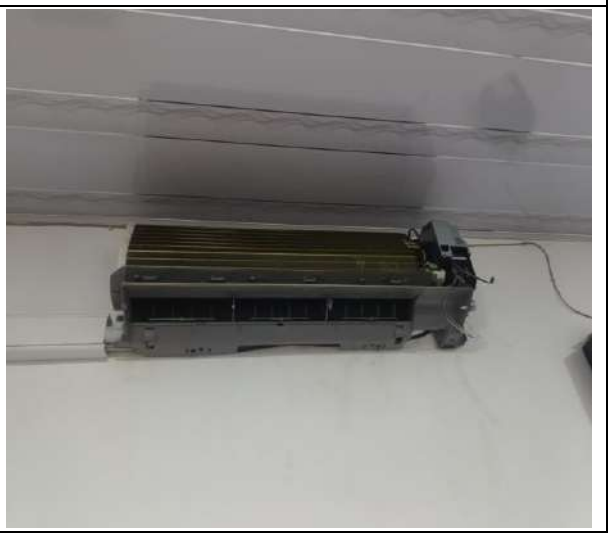
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: SAN JOSE DE LA FRAGUA | OT: 0502 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 18000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):
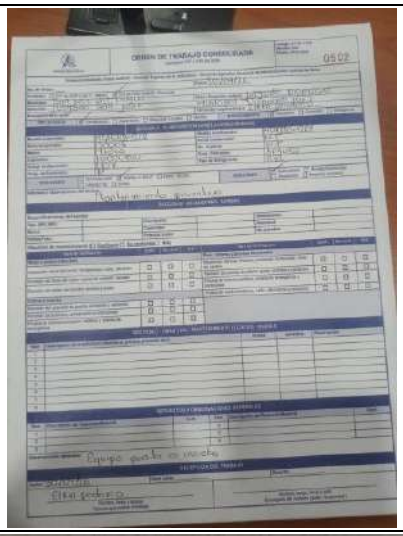
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: SAN JOSE DE LA FRAGUA | OT: 0501 | EQUIPO: MINISPLIT SAMSUNG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ALBANIA | OT: 0349 | EQUIPO: MINISPLIT SAMSUNG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ALBANIA | OT: 0348 | EQUIPO: MINISPLIT SAMSUNG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: ALBANIA | OT: 0350 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CURILLO | OT: 0346 | EQUIPO: MINISPLIT YORK 9000 BTU


Soporte Fotográfico (4 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CURILLO | OT: 0345 | EQUIPO: MINISPLIT SAMSUNG 24000 BTU


Soporte Fotográfico (4 fotos):
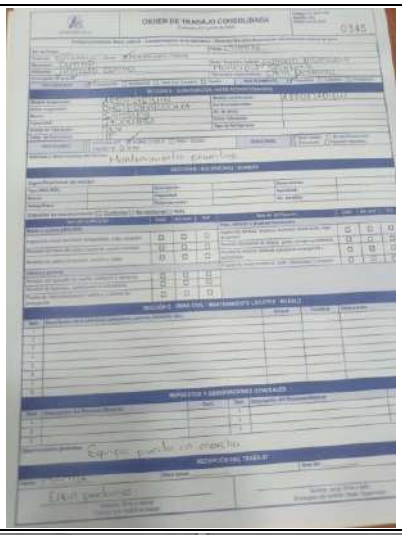
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: CURILLO | OT: 0344 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 2400 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

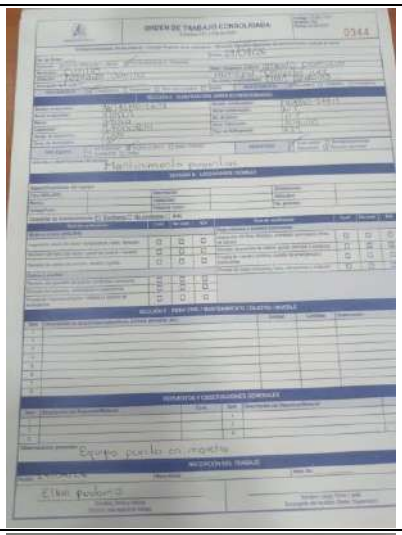







OFICINA / DEPENDENCIAS: DEPOSITO

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0506 | EQUIPO: MINISPLIT YORK 1800 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: CUARTO RACK

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0508 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: CUARTO DE LACTANCIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0509 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #1

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0510 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU


Soporte Fotográfico (4 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #2

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0511 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU


Soporte Fotográfico (4 fotos):
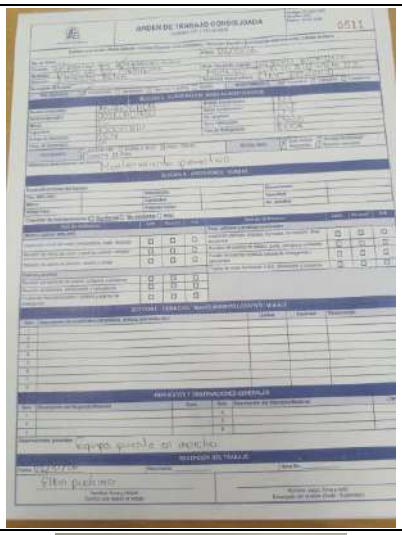
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #3

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0512 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU


Soporte Fotográfico (4 fotos):
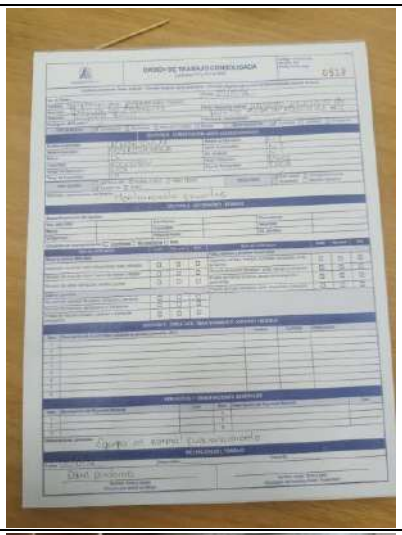
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: AUDITORIO

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0513 | EQUIPO: PISO TECHO LG 60000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):
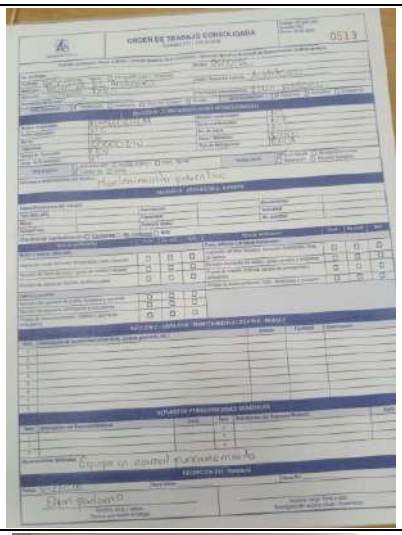
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PROYECTADO - DESPACHO JUEZ


[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0515 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 6):







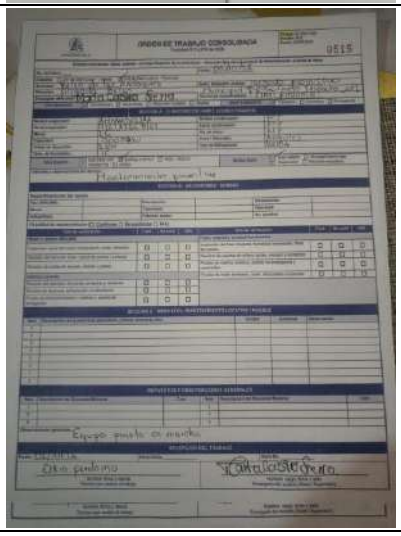

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PROYECTADO - DESPACHO JUEZ (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0515 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 6 de 6):







OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0518 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

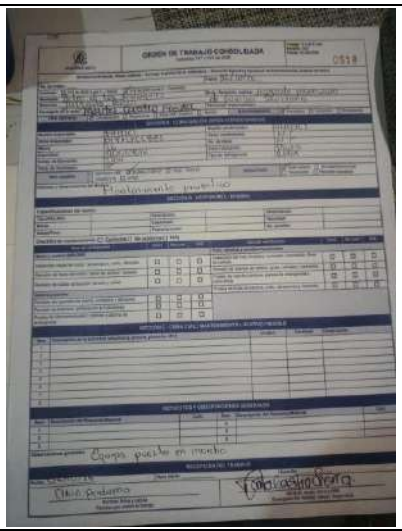

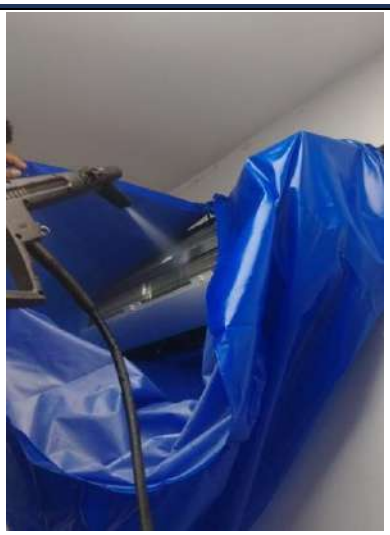


OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PROYECTADO - SECREATARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0514 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):



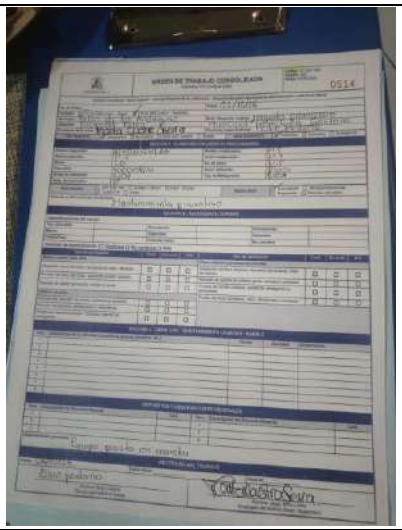

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0519 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 5):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA (Continuación)

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0519 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 5 de 5):





CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0517 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):
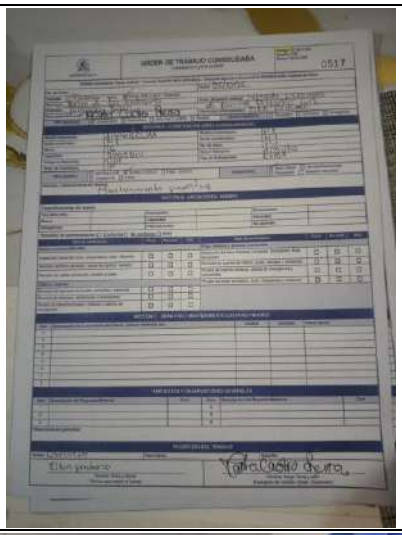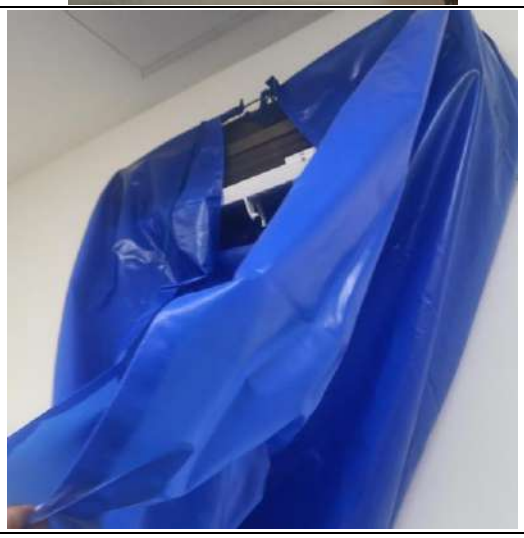
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
</table>


OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0516 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):





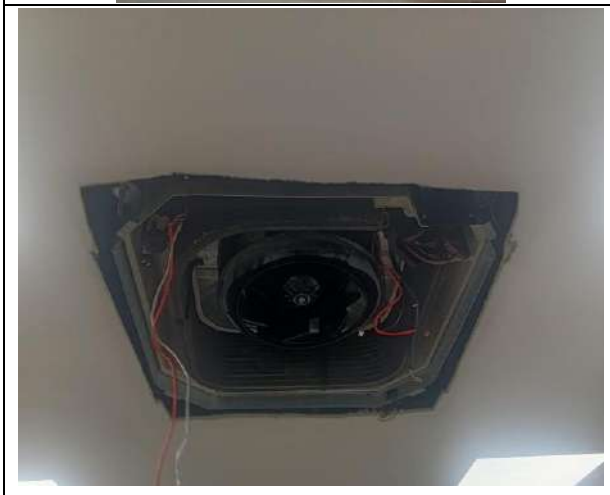




CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CIRCUITO - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0522 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU


Soporte Fotográfico (3 fotos):
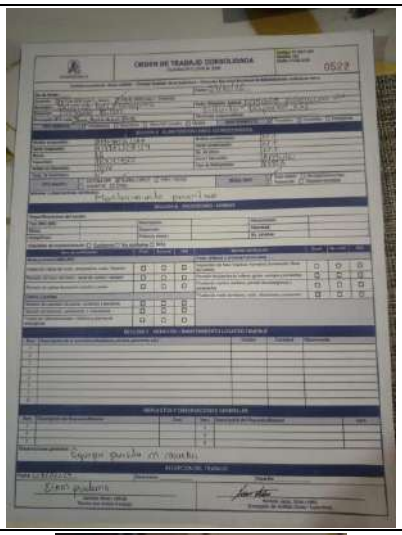
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CIRCUITO - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0521 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):
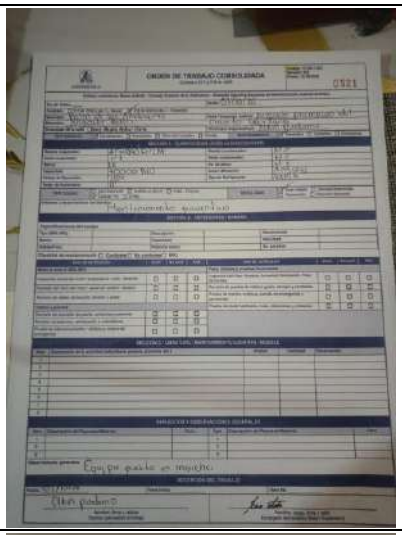
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>


CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DEL CIRCUITO - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: BELEN | OT: 0520 | EQUIPO: MINISPLIT LG 12000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):
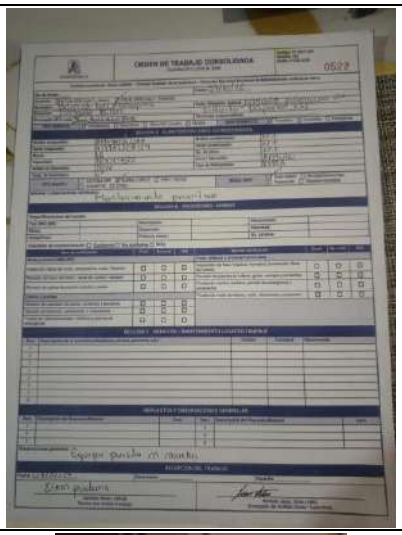
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: MORELIA | OT: 0529 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):









OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: MORELIA | OT: 0528 | EQUIPO: MINISPLIT LG 24000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: VALPARAISO | OT: 0527 | EQUIPO: MINISPLIT BLUELINE 12000 BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):










OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: VALPARAISO | OT: 0526 | EQUIPO: MINISPLIT YORK 9000 BTU


Soporte Fotográfico (4 fotos):
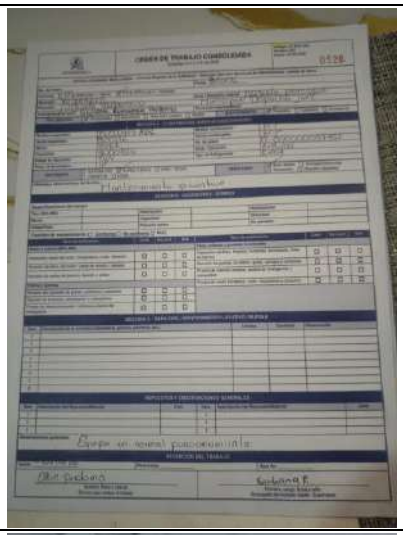
<table>
<tr>
<td></td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: VALPARAISO | OT: 0525 | EQUIPO: MINISPLIT YORK 24000 BTU

Soporte Fotográfico (3 fotos):
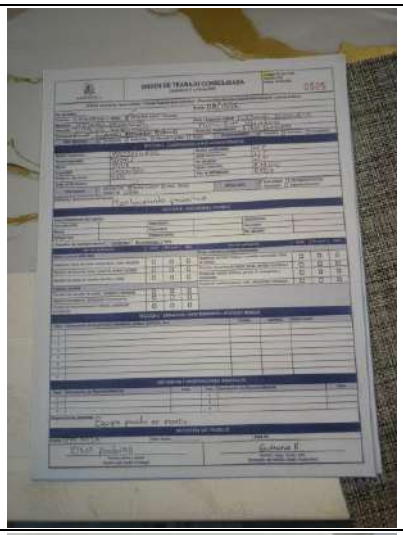
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
</table>


CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: SOLITA | OT: 0523 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000 BTU


Soporte Fotográfico (3 fotos):
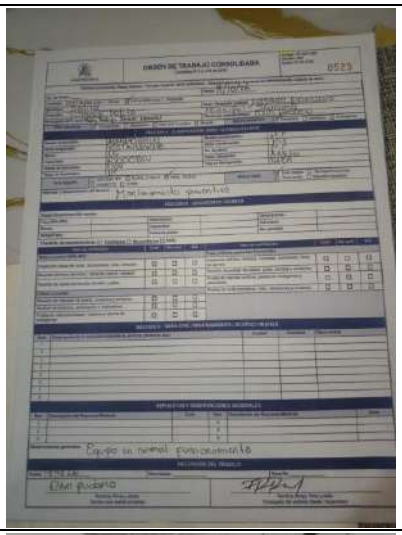
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SECRETARIA

[RUTINA 2 - PREVENTIVO] MUNICIPIO / SEDE: SOLITA | OT: 0524 | EQUIPO: BTU

Soporte Fotográfico (4 fotos):
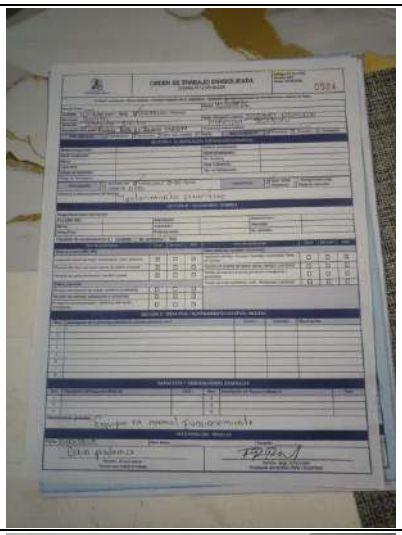
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

SECCIÓN 2

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES Y REPUESTOS

CONTRATO Nº 018 DE 2026 - RAMA JUDICIAL DE COLOMBIA (CAQUETÁ)

ORDEN DE TRABAJO	DEPENDENCIA / SEDE	EQUIPO ASOCIADO	ACTIVIDAD / ALCANCE
0302	SALA DE AUDIENCIA OF310	MINISPLIT SAMSUNG 24000	CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5 T.R. (1 GBL)
0307-0311	TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA	MINISPLIT MIDEA 12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)
0303-0315	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308	MINISPLIT MIRAGE 18000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (12 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (2 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)
0306-0317	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304	MINISPLIT MIRAGE 12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)
0304 -0318	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG	MINISPLIT MIRAGE 12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

ORDEN DE TRABAJO	DEPENDENCIA / SEDE	EQUIPO ASOCIADO	ACTIVIDAD / ALCANCE
			TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (8 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)
0305-0316	EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	PISO TECHO LG 40000	INSTALACION BASICA EQUIPO 60000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)
0309-0310	EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	MINISPLIT MIRAGE 12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (2.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (2.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (3 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (3 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)
0308-0314	EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS	MINISPLIT MIRAGE 24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)
0313	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	MINISPLIT MIRAGE 18000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE

ORDEN DE TRABAJO	DEPENDENCIA / SEDE	EQUIPO ASOCIADO	ACTIVIDAD / ALCANCE
			TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)
0312	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208	MINISPLIT MIRAGE 18000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (7 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (3.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (3.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)
0505	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT MIDEA 24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (MANO DE OBRA) (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML)
0504	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT MIDEA 24000	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND)
0510	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #1	PISO TECHO LG 40000	SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER (2 LB)
0527	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA	MINISPLIT BLUELINE 12000	SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU (1 UND)
0529	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ	MINISPLIT LG 18000	SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU (1 UND)
0453	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO OF 205	MINISPLIT MIRAGE 12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (1.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND)

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

ORDEN DE TRABAJO	DEPENDENCIA / SEDE	EQUIPO ASOCIADO	ACTIVIDAD / ALCANCE
0455	TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304	MINISPLIT MIRAGE 12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (3 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (3 ML)
0456	TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302	MINISPLIT MIDEA 12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (6 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (4.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (4.5 ML)
0457	TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207	MINISPLIT MIRAGE 12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (7 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (6 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (6 ML)
0458	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	MINISPLIT MIDEA 12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (8 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (7.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (7.5 ML)
0459	TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305	MINISPLIT MIRAGE 12000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (3 UND) // SUMINISTRO E

ORDEN DE TRABAJO	DEPENDENCIA / SEDE	EQUIPO ASOCIADO	ACTIVIDAD / ALCANCE
			INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)
0451	SALA DE AUDIENCIA OF107	MINISPLIT MIRAGE 24000	INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (11 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA (5.5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA (5.5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS (5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (6 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (6 ML)
0452	SALA DE AUDIENCIA OF106	MINISPLIT MIRAGE 24000	ININSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (14 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA (7 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA (7 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS (5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (7.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (7.5 ML)


A continuación se detalla el registro fotográfico respectivo (máximo 4 fotografías por bloque):

OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA OF310

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED. PRINCIPAL | OT: 0302 | EQUIPO: MINISPLIT SAMSUNG 24000

ACTIVIDAD REALIZADA: CORRECCION DE FUGA Y CARGA DE REFRIGERANTE DE 1 A 5 T.R. (1 GBL)

Soporte Fotográfico (4 fotos):
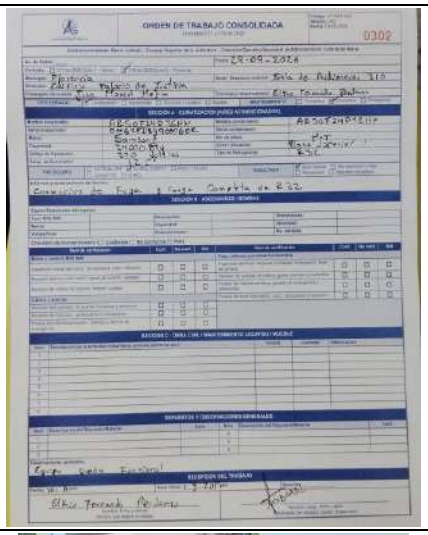
<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0307-0311 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 10):



OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0307-0311 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 10):









OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA - DESPACHO 2 OF 302 - SALA PLENA (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0307-0311 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 10 de 10):





CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS


NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0303-0315 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 18000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (12 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (2 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 5):

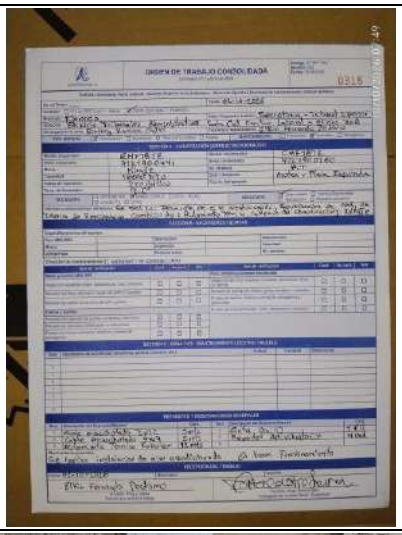







OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - OF 308 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0303-0315 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 18000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (12 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (2 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 5 de 5):




OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0306-0317 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 11):

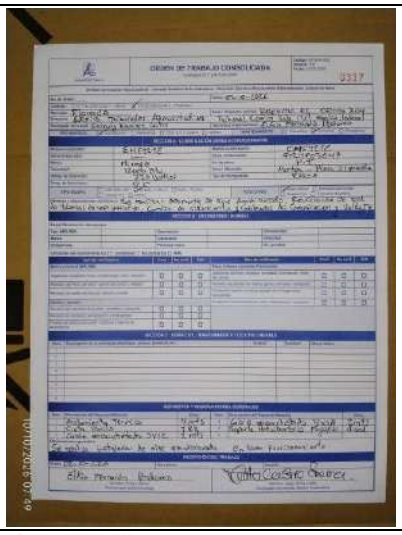







OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0306-0317 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 11):









OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF 304 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0306-0317 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 11 de 11):







CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS


NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0304 -0318 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (8 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 10):

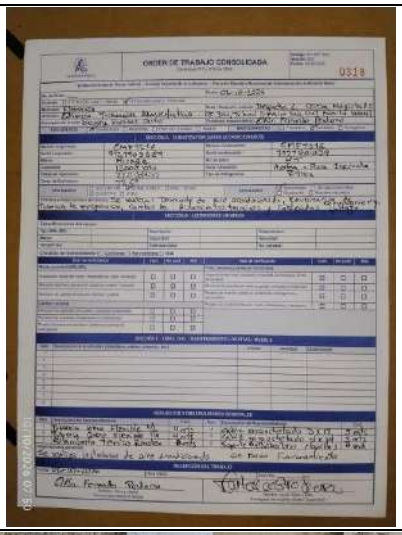







OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0304 -0318 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (8 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 10):









OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL DESPACHO 2 - OF MG (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0304 -0318 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (8 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 10 de 10):






OFICINA / DEPENDENCIAS: EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0305-0316 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO 60000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 8):
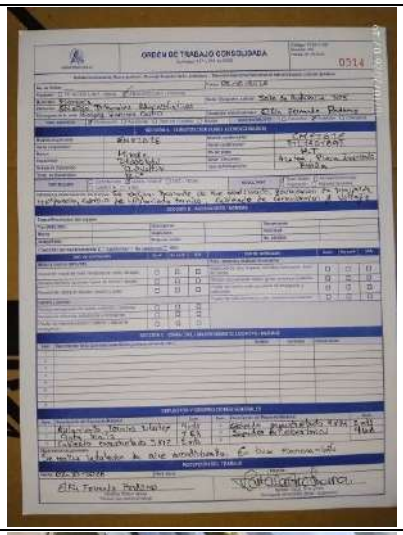
<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>

OFICINA / DEPENDENCIAS: EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0305-0316 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO 60000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 8):



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0309-0310 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (2.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (2.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (3 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (3 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (4 fotos):










OFICINA / DEPENDENCIAS: EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED. PRINCIPAL | OT: 0308-0314 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 24000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 5):

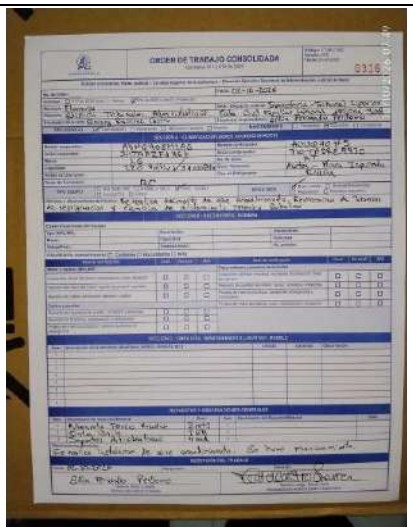







OFICINA / DEPENDENCIAS: EDIFICIO TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED. PRINCIPAL | OT: 0308-0314 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 24000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA VINILO (1 ROLLO) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 5 de 5):



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS


NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0313 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 18000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 5):

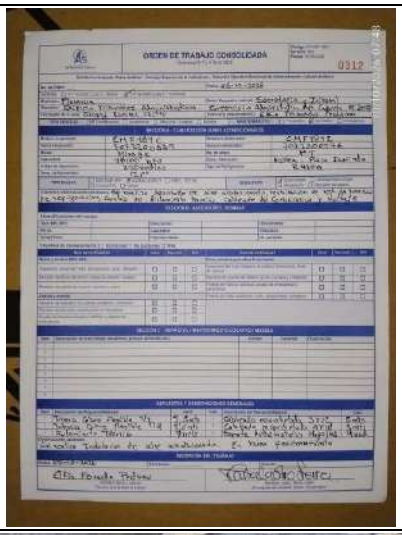







OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0313 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 18000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (2 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 5 de 5):



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS


NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208


[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0312 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 18000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (7 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (3.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (3.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 9):

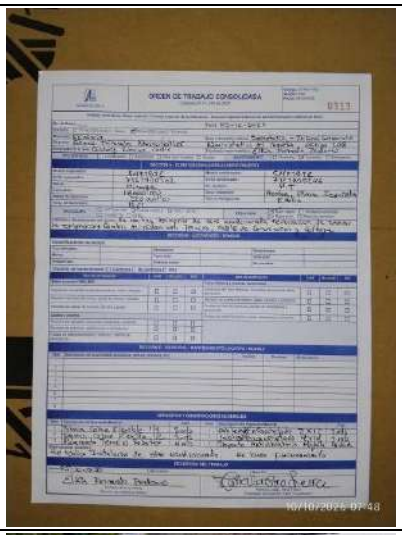



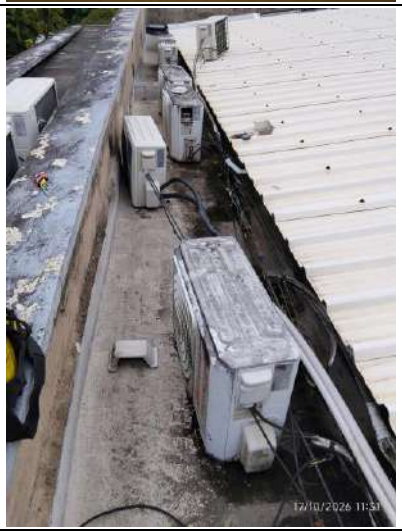



OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0312 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 18000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (7 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (3.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (3.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 9):









OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - OF 208 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0312 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 18000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (7 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/2 PULGADA (3.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (3.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 9 de 9):



CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: SAN JOSE DE LA FRAGUA | OT: 0505 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 24000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (MANO DE OBRA) (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 1/4 PULGADA (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (5 ML)

Soporte Fotográfico (4 fotos):









CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1


OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: SAN JOSE DE LA FRAGUA | OT: 0504 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 24000

ACTIVIDAD REALIZADA: DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND)

Soporte Fotográfico (4 fotos):



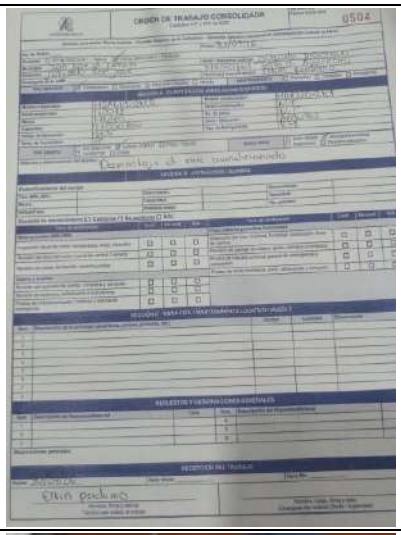





CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS

NIT: 902080280-1

OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO - SALA DE AUDIENCIA #1

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: BELEN | OT: 0510 | EQUIPO: PISO TECHO LG 40000

ACTIVIDAD REALIZADA: SUMINSTRO Y AJUSTE DE CARGA REFRIGERANTE R-410 PARA EQUIPOS ECOLOGICOS Y TECNOLOGIA INVERTER (2 LB)

Soporte Fotográfico (4 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - SALA DE AUDIENCIA

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: VALPARAISO | OT: 0527 | EQUIPO: MINISPLIT BLUELINE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU (1 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 5):





OFICINA / DEPENDENCIAS: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL - DESPACHO JUEZ

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: MORELIA | OT: 0529 | EQUIPO: MINISPLIT LG 18000

ACTIVIDAD REALIZADA: SUMINISTRO Y PROGRAMACION DE CONTROL REMOTO MINI SPLIT DE 9000 A 24000 BTU (1 UND)

Soporte Fotográfico (4 fotos):





OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA -DESPACHO OF 205

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0453 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (1.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 7):





OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA -DESPACHO OF 205 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0453 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (1.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 7 de 7):


	

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0455 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (3 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (3 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 11):

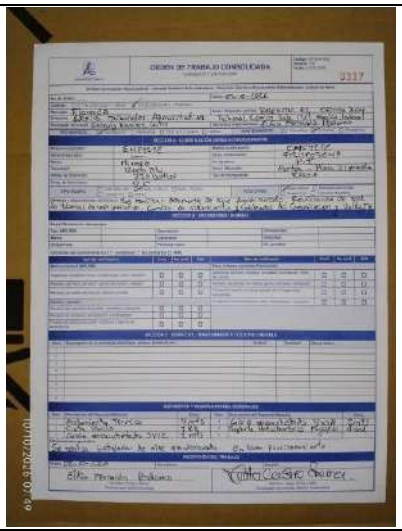OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0455 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (3 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (3 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 11):

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL FAMILIA LABORAL - DESPACHO 2 OF 304 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0455 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (3 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (3 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 11 de 11):

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0456 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (6 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (4.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (4.5 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 14):





OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0456 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (6 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (4.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (4.5 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 14):






	

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0456 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (6 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (4.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (4.5 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 12 de 14):

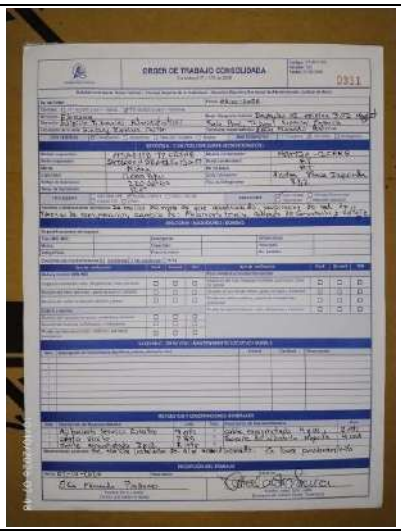OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR FLORENCIA -SALA PENAL DESPACHO 2 OF302 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0456 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (6 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (4.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (4.5 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 13 a 14 de 14):

OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0457 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (7 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (6 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (6 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 10):









OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0457 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (7 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (6 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (6 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 10):









OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA - DESPACHO 2 OF 207 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0457 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (7 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (6 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (6 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 10 de 10):





OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0458 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (8 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (7.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (7.5 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 11):





OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0458 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (8 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (7.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (7.5 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 11):





OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0458 | EQUIPO: MINISPLIT MIDEA 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (8 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (2 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (7.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (7.5 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 11 de 11):





OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0459 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (3 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 5):









OFICINA / DEPENDENCIAS: TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL - DESPACHO 1 OF305 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0459 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 12000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 12000 Y 18000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPO MINI SPLIT DE 9000 HASTA 18000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 1/2 PULGADA (3 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (4 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 5 de 5):



OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA OF107

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0451 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 24000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (11 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA (5.5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA (5.5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS (5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (6 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (6 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 7):









OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA OF107 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0451 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 24000

ACTIVIDAD REALIZADA: INSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (11 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA (5.5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA (5.5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS (5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (6 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (6 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 7 de 7):





OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA OF106

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0452 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 24000

ACTIVIDAD REALIZADA: ININSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (14 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA (7 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA (7 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS (5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (7.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (7.5 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 1 a 4 de 12):


	

OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA OF106 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0452 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 24000

ACTIVIDAD REALIZADA: ININSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (14 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA (7 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA (7 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS (5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (7.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (7.5 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 5 a 8 de 12):

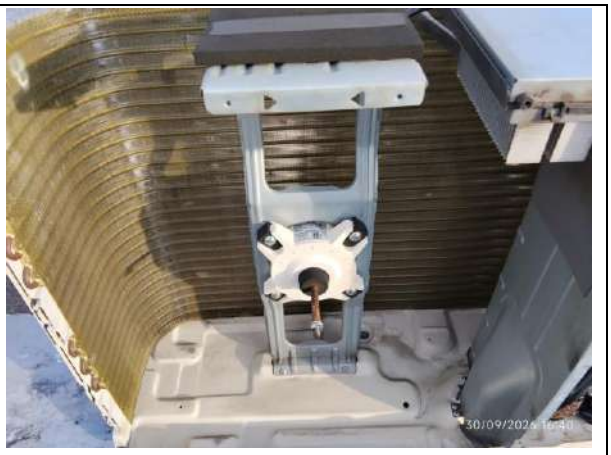OFICINA / DEPENDENCIAS: SALA DE AUDIENCIA OF106 (Continuación)

[MANTENIMIENTO CORRECTIVO] SEDE: ED TRIBUNALES | OT: 0452 | EQUIPO: MINISPLIT MIRAGE 24000

ACTIVIDAD REALIZADA: ININSTALACION BASICA EQUIPO MINI SPLIT DE 24000 Y 36000 BTU (1 UND) // DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EQUIPOS MINI SPLIT DE 24000 HASTA 60000 BTU (1 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE AISLAMIENTO TERMICO RUBATEX (14 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE MOGOLLAS (CAUCHO) (4 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE REFRIGERACION (COBRE) 3/8 PULGADA (7 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE REFRIGERACION (COBRE) 5/8 PULGADA (7 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CODOS DE COBRE 5/8 PULGADAS (5 UND) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 3X12 (7.5 ML) // SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE ELECTRICO CONCENTRICO 4 X 14 (7.5 ML)

Soporte Fotográfico (Fotos 9 a 12 de 12):

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00030

FECHA: 8 de septiembre de 2023

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ELF181LQ	**MODELO CONDENSADORA:**	CLF181Q	
SERIAL EVAPORADORA:	7051900684	**SERIAL CONDENSADORA:**	150211	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO DE CAMARAS O MONITOREO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000110312	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de septiembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 27 de diciembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 28 de septiembre de 2026	**OBSERVACIONES:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00016

FECHA: 22 de agosto de 2023

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24DIEH	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24DIEH	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY900060R	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA 310 EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	97464	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	8 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de diciembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 24 de junio de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	CORRECION DE FUGA	29 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00176

FECHA: 19 de enero de 2026

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	906TAACDM192	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	CENTRO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS OF 315 EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000109303	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN DE TUBERIA - 14 de enero de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F00175

FECHA: 19 de enero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM092C8	**MODELO CONDENSADORA:**	VM092C8	
SERIAL EVAPORADORA:	910TAQPAG004	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	9.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	CENTRO DE SERVICIO ADMINISTRATIVO DE LOS JUZGADOS PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADOS OF 315 EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000109295	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	6 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 15 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	15 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 6 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° F000137

FECHA: 4 de diciembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: AV 16 No. 6 - 47
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	4MYW4524A1000AA	**MODELO CONDENSADORA:**	4MYW4524A1000AA	
SERIAL EVAPORADORA:	3C85770060666	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R40A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN	JUZGADO 1 CIVIL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO EN RESTITUCION DE TIERRAS OF 403 EQ3 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000105001	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	9 de febrero de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 22 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE-UBICACIÓN CONDENSADORA	15 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 3 de febrero de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	6 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA - HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00195

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF261E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF261E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121901972	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 3 MAGISTRADA GILBERTO GALVIS AVE OF 303 TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIAR - LABORAL EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00196

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	911TAGHC6879	**SERIAL CONDENSADORA:**	007TACXHP883	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 3 MAGISTRADA GILBERTO GALVIS AVE OF 303 TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIAR - LABORAL EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00203

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121903756	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 MAG DIELA HORTENCIA LUZ MARINA ORTEGA CASTRO TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL OF 304 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE-UBICACIÓN	2 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA: _____
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA: _____
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00204

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121903759	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 MAG DIELA HORTENCIA LUZ MARINA ORTEGA CASTRO TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL OF 304 EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 8 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE-UBICACIÓN	2 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00193

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E7	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121904444	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 3 MAGISTRADA SAIDA MORENO OF 306 TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 9 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00194

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E7	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121904589	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 MAGISTRADA SAIDA MORENO OF 306 TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	25 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 9 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00201

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121903647	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL OF 302 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	26 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE- UBICACIÓN - 2 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00202

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFN5NT0W-COI	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130057	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL OF 302 EQ2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	26 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE- UBICACIÓN - 2 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00207

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF181C	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF181C	
SERIAL EVAPORADORA:	7072200639	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA - TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA OF 208 EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	REVISION - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE- UBICACIÓN	5 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00226

FECHA: 6 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF261E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF261E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121901846	**SERIAL CONDENSADORA:**	7121901892	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS 105	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 2 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00208

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF181E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF181E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121900362	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA - TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA OF 208 EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	CORRECION DE CORTO - 25 de marzo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	RE- UBICACIÓN	5 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00206

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF181E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF181E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121900441	**SERIAL CONDENSADORA:**	7121900160	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA - TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL OF 308 EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 2 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00205

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM1A5	
SERIAL EVAPORADORA:	311TAFZFV467	**SERIAL CONDENSADORA:**	310TADRE9930	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA - TRIBUNAL SUPERIOR SALA CIVIL - FAMILIA - LABORAL OF 308 EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	27 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 2 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00224

FECHA: 6 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF261E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF261E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121901845	**SERIAL CONDENSADORA:**	7121901798	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS 107	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 19 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00225

FECHA: 6 de abril de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF261E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF261E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121901967	**SERIAL CONDENSADORA:**	7121901799	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS 106	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	5 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 19 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00215

FECHA: 26 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121904716	**SERIAL CONDENSADORA:**	7121904131	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 1 TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO OF 205 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	4 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 19 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00217

FECHA: 26 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	EMF121E	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	7121903646	**SERIAL CONDENSADORA:**	7121904498	
MARCA:	MIRAGE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 2 TRIBUNAL CONENCIOSO ADMINISTRATIVO OF 207 EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	4 de marzo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	RE-UBICACIÓN - 19 de octubre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIRAGE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00200

FECHA: 12 de marzo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11AB12CRNBNT0WEO	**MODELO CONDENSADORA:**	EMF121E	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO 1 TRIBUNAL SUPERIOR SALA PENAL OF 305 EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**		
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	26 de febrero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	DAÑO EN TARJETA ELECTRONICA - 25 de marzo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	21 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 21 de abril de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° FT00230

FECHA: 21 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: ED TRIBUNALES
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Florencia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	54NQ18KL2PEEC26C02	**SERIAL CONDENSADORA:**	501TAEJST820	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 6 ADMINISTRATIVO EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 15 de septiembre de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	TAJETA INTERIOR	21 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	MOTO CONDENSADORA - 21 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SIMPLY	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MIL0001

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Milan - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YSEC24FSADG	**MODELO CONDENSADORA:**	YSE24FS	
SERIAL EVAPORADORA:	100001822140420107	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 ESCRIBIENTE	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	151617	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 2:**	PREVENTIVO	25 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MIL0002

FECHA: 26 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Milan - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHX	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHX	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG2PDPY900080H	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SALA DE AUDIENCIAS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	151617	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 25 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MIL0003

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Milan - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFNB	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX13012CFS	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ3 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	21 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 25 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MIL0004

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Milan - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TACXST739	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R41A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ4 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 21 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PRVENTIVO	25 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	-	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MOR0001

FECHA: 26 de noviembre de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Morelia - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TAVYST735	**SERIAL CONDENSADORA:**	412TAYVJK650	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	26 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 26 de nomviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	9 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CARRERA 16 No. 34 - 22
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° MOR0002

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Morelia - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TAPESTB832	**SERIAL CONDENSADORA:**	501TAKKSQ611	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	26 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 26 de nomviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	9 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0028

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VO122H1	**MODELO CONDENSADORA:**	VO122H1	
SERIAL EVAPORADORA:	501CRFT52379	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 002 PROMISCUO CIRCUITO EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de octubre de 226	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0027

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM1A5	
SERIAL EVAPORADORA:	502TAZFHW357	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 002 PROMISCUO CIRCUITO EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	1UFPT	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de octubre de 226	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0025

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AVNQ40GM1A5	
SERIAL EVAPORADORA:	502TAGHHW359	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 003 PRMISCUO EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	2UFPT	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0026

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VO122H1	**MODELO CONDENSADORA:**	VO122H1	
SERIAL EVAPORADORA:	501CRPY52480	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 003 PRMISCUO CIRCUITO EQ2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0024

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VO242H1	**MODELO CONDENSADORA:**	VO242H1	
SERIAL EVAPORADORA:	412CRYQ07226	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	2	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° PR0023

FECHA: 24 de febrero de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: CRA 5 No. 4 - 07
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: PUERTO RICO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VO242H1	**MODELO CONDENSADORA:**	VO242H1	
SERIAL EVAPORADORA:	412CRNL07335	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIAS EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	1	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de enero de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 23 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° JF001

FECHA: 20 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: San José de Fragua - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11D24CRFN8NT0WCOI	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX33024CFN8NT0WCO0	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDHA9280130045	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 12 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 30 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° JF002

FECHA: 20 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: San José de Fragua - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFN8NT0WCOI	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX33024CFN8NT0WCO0	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130006	**SERIAL CONDENSADORA:**	54122000HDEA9240120047	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO DEL JUEZ EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 12 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 30 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° JF003

FECHA: 20 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	San José de Fragua - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY900046S	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA EQ3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	20 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 12 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 30 de septiembre de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	RE-UBICACIÓN	30 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION: 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° SV0001

FECHA: 7 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL: 310 297 3801
CIUDAD: San Vicente - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	4MYW4524A1000AA	**MODELO CONDENSADORA:**	4MYW4524A	
SERIAL EVAPORADORA:	63229962253	**SERIAL CONDENSADORA:**	6322996225	
MARCA:	TRANE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL EQ 1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	166869	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 11 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	13 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 17 de abril de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	22 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	TRANE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° SV0002

FECHA: 7 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL: 310 297 3801
CIUDAD: San Vicente - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRF18NT0WCCI	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX13012CFN8NT0WC00	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130040	**SERIAL CONDENSADORA:**	54122000HDEA9240120046	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 1 PROMISCUO MUNICIPAL EQ 2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 11 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	DESMONTE - 16 de abril - 2024	**FECHA INTERVENCION 5:**	INSTALACION	16 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 22 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° SV0003

FECHA: 7 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL: 310 297 3801
CIUDAD: San Vicente - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFN8NTOWCCI	**MODELO CONDENSADORA:**	MSG11B12CRFN8NTOWCCI	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130040	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL EQ 2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 11 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	DESMONTE - 16 de abril de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	INSTALACION	16 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 22 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

0

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° SV0004

FECHA: 7 de agosto de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL: 310 297 3801
CIUDAD: San Vicente - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	401TABNAC709	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de agosto de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 11 de octubre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	13 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 17 de abril de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	22 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

Nº SV0005

FECHA: 16 de octubre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

SUPERVISOR: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
EMPRESA: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
NIT: RAMA JUDICIAL
DIRECCIÓN: 800165866-1
TELÉFONO:
E-MAIL: 310 297 3801
CIUDAD: San Vicente - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM242C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM242C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TABNST733	**SERIAL CONDENSADORA:**	CJK688	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO 2 PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	CAMBIO DE EQUIPO	10 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 13 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	17 de abril de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 22 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ST0001

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Solita - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM182C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM182C7	
SERIAL EVAPORADORA:	501TARUST830	**SERIAL CONDENSADORA:**	501TANSSQ639	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	26 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 10 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ST0002

FECHA: 11 de junio de 2025

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Solita - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AVNQ40GM1A5	**MODELO CONDENSADORA:**	AUUQ40GH1A5	
SERIAL EVAPORADORA:	502TAULHW318	**SERIAL CONDENSADORA:**	501TAXTR4338	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	PISO TECHO	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO UNICO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	26 de noviembre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 10 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° VLP0001

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Valparaiso - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YSEC24FS-ADG	**MODELO CONDENSADORA:**	YSE24FS	
SERIAL EVAPORADORA:	100001822140420095	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	151617	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	TRASLADO EQUIPO - 20 de ciiembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	8 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° VLP0002

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Valparaiso - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YSE09FS	**MODELO CONDENSADORA:**	YSE09FS	
SERIAL EVAPORADORA:	100001178130800026	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	9.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICPAL EQ2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	1200000097461	**CODIGO EXTERNO:**	160981	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	TRASLADO DE EQUIPO - 20 de ciiembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	8 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS		Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° VLP0003

FECHA: 26 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Cll 5 No. 4 - 02
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Valparaiso - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MS121OE1	**MODELO CONDENSADORA:**	MS121OE1	
SERIAL EVAPORADORA:	240105722066305000000	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	BLUELINE	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ3 ENTRADA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	160539	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	31 de octubre de 2024
FECHA INTERVENCION 2:	TRASLADO DE EQUIPO - 20 de ciiembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	8 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	BLUELINE	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ALB0001

FECHA: 4 de marzo de 2024

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Calle 5 No 3 - 23
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Albania - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHNCB	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1HN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY800063Y	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	1 de marzo de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 4 de marzo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	7 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 8 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	29 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ALB0002

FECHA: 4 de marzo de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Calle 5 No 3 - 23
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Albania - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHNCB	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1HN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY900029X	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUGADO PROMISCUO MUNICIPAL SALA DE AUDIENCIAS EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	1 de marzo de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	MMTO - AJUSTE GAS - CAPACITOR - 4 de marzo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	DESMONTE	7 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	INSTALACION - 8 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	29 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° ALB0003

FECHA: 4 de marzo de 2024

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Calle 5 No 3 - 23
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Albania - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VS122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VS122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	211TAWME1585	**SERIAL CONDENSADORA:**	2MPR6027	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	OFICINA JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	NUEVO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	1 de marzo de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	DESMONTE - 4 de mayo de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	INSTALACION	4 de mayo de 2024
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 29 de spetiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0019

FECHA: 8 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YHJE18XJ6DTJRX	**MODELO CONDENSADORA:**	YHJE18YJ6DTJOX	
SERIAL EVAPORADORA:	-	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	18.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DEPOSITO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	2 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 2:		**FECHA INTERVENCION 3:**		
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0015

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	011TASWEC718	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	RACK PISO 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO BANDEJA DRENAJE - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 2 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0008

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	011TACXEC883	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	CUARTO DE LACTANCIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	2 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 2 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0010

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	033KCEA19A56	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 3 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	CAMBIO TARJETA - 11 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 5:**	AJUSTE DE GAS	11 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 6:	PREVENTIVO - 2 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0011

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	033KCHL19961	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	22 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 3 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	5 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	CAMBIO TARJETA - 11 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	2 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0009

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	033KCRM19958	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA No 3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 2 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0017

FECHA: 8 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ60GMLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ60GMLA4	
SERIAL EVAPORADORA:	MEZ68513322	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	AUDITORIO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	RE UBICACIÓN CONDENSADORA 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	TRASLADO EQUIPO - 13 de noviembre de 2025	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	2 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0016

FECHA: 8 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GSJAA	**MODELO CONDENSADORA:**	AV5W48GFAJ	
SERIAL EVAPORADORA:	912TATGC8161	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DEL MUNICIPAL EQ1 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 7 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0001

FECHA: 8 de septiembre de 2023

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	003KCLH19A52	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ1 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 7 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0002

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GSJAA	**MODELO CONDENSADORA:**	AMNW12GS	
SERIAL EVAPORADORA:	912TAZFC8157	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO EQ2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 7 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 7 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0006

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	003KCTB19A52	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 7 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0013

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GSJAA	**MODELO CONDENSADORA:**	AV5W48GFAJ	
SERIAL EVAPORADORA:	912TAQPC8156	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA EQ 2 JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 16 de mayo de 2026	**FECHA INTERVENCION 5:**	PREVENTIVO	6 de octubre de 2026
FECHA INTERVENCION 6:		**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0012

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNLA4	
SERIAL EVAPORADORA:	033KCTB19A53	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA EQ 1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 de noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	6 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 6 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0007

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AMNW12GSJAA	**MODELO CONDENSADORA:**	AV5W48GFAJ	
SERIAL EVAPORADORA:	912TAZFC8157	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ3 PROYECTADO JUEZ	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO 7 de novimebre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 2 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0014

FECHA: 21 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN: Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	ATNQ40GNLA4	**MODELO CONDENSADORA:**	ATNQ40GNL	
SERIAL EVAPORADORA:	003KCPS19960	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	CASSETTE	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	40.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PROYECTADO EQ4	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO 7 de novimebre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 2 de octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° B0003

FECHA: 8 de septiembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA:	RAMA JUDICIAL
NIT:	800165866-1
DIRECCIÓN:	Carrera 4 No 5 - 57
TELÉFONO:	310 297 3801
E-MAIL:	
CIUDAD:	Belen de los Andaquies - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	VM122C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM122C7	
SERIAL EVAPORADORA:	011TAZFEC885	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINISPLIT	
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA EQ 3 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	21 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 6 noviembre de 2024	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	7 de noviembre de 2025
FECHA INTERVENCION 4:	PREVENTIVO - 6 octubre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CC001

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Cartagena del Chaira - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EH	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDCY900023K	**SERIAL CONDENSADORA:**	0MG2PDPY900054	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SECRETARIA EQ1	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115814	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 22 de junio de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	24 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACIONES:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	**CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CC002

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Cartagena del Chaira - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11B12CRFN8NT0WCOI	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX13112CFN8	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDDA9250130034	**SERIAL CONDENSADORA:**	HDEA9240120001	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	12.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	DESPACHO DEL JUEZ EQ2	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	12000000115796	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADIO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	PREVENTIVO	7 de diciembre de 2023
FECHA INTERVENCION 2:	INSTALACION - 22 de junio de 2026	**FECHA INTERVENCION 3:**	PREVENTIVO	24 de septiembre de 2026
FECHA INTERVENCION 4:		**OBSERVACIONES:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CC003

FECHA: 19 de diciembre de 2023

NOMBRE DEL CLIENTE: MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
CARGO DEL CLIENTE: ASISTENTE ADMINISTRATIVA DESAJ
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 310 297 3801
E-MAIL:
CIUDAD: Cartagena del Chaira - Caqueta

REGISTRO FOTOGRAFICO

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO			
MODELO EVAPORADORA:	VM142C7	**MODELO CONDENSADORA:**	VM142C7
SERIAL EVAPORADORA:	911TAHQD4241	**SERIAL CONDENSADORA:**	-
MARCA:	LG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT
REFRIGERANTE:	R410A	**CAPACIDAD BTU:**	24.000
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	SALA DE AUDIENCIA EQ3	**VOLTAJE:**	220V
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-
ESTADIO:	BUENO		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	LG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJARDO NUÑEZ
IDENTIFICACION 79.461.245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CU001

FECHA: 15 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: CURILLO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	MSAG11D-24CRFN8	**MODELO CONDENSADORA:**	MOX330-24CFN8	
SERIAL EVAPORADORA:	54122000HDHA9280130003	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	MIDEA	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ 1 DESPACHO	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	6 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 29 de sptiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	MIDEA	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CU002

FECHA: 15 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: CURILLO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	AR50F24D1EHN	**MODELO CONDENSADORA:**	AR50F24D1EHN	
SERIAL EVAPORADORA:	0MG1PDBY900042A	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	SAMSUNG	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R32	**CAPACIDAD BTU:**	24.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL EQ 2 SECRETARIA	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	INSTALACION	6 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 29 de sptiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	SAMSUNG	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS	Código:	ST-PC-F-009
		Version	001
	HOJA DE VIDA	Fecha:	24-abr-23

N° CU003

FECHA: 15 de mayo de 2026

REGISTRO FOTOGRAFICO

NOMBRE DEL CLIENTE: HERMES TOVAR
CARGO DEL CLIENTE: SUPERVISOR COOR ADMINISTRATIVA
EMPRESA: RAMA JUDICIAL
NIT: 800165866-1
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 320 3131710
E-MAIL:
CIUDAD: CURILLO - CAQUETA

INFORMACION GENERAL DEL EQUIPO				
MODELO EVAPORADORA:	YSECO09FSADG	**MODELO CONDENSADORA:**	YSECO09FSADG	
SERIAL EVAPORADORA:	100001006140100000	**SERIAL CONDENSADORA:**	-	
MARCA:	YORK	**TIPO DE EQUIPO:**	MINI SPLIT	
REFRIGERANTE:	R22	**CAPACIDAD BTU:**	9.000	
ZONA DE CLIMATIZACIÓN:	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SALA DE AUDIENCIA EQ3	**VOLTAJE:**	220V	
No. PLACA INVENTARIO:	-	**CODIGO EXTERNO:**	-	
ESTADO:	BUENO	**FECHA INTERVENCION 1:**	DESMONTE	5 de mayo de 2026
FECHA INTERVENCION 2:	PREVENTIVO - 29 de septiembre de 2026	**OBSERVACION:**		

INFORMACION GENERAL DEL PROVEEDOR			
NOMBRE DEL FABRICANTE:	YORK	**TELEFONO DEL PROVEEDOR:**	316 469 2215
CONTACTO DEL PROVEEDOR:	SERVITEDH SAS	**DIRECCION DEL PROVEEDOR:**	CALLE 27 No 8 - 06
GARANTIA:	30 DIAS POR MANO DE OBRA	**CIUDAD/PAIS**	NEIVA / HUILA

FIRMA:
NOMBRE: FERNANDO DANIEL FAJAR NUÑEZ
IDENTIFICACION 79461245

FIRMA:
NOMBRE:
IDENTIFICACION:

SERVIAMBIENTAL S.A. E.S.P.

REPORTE DIARIO DE RESIDUOS No.281042

RT-F 011
Versión 4 1/1
12 de Junio de 2018

Fecha y Hora	Solicitud Servicio No.	Novedad Servicio	Estado
2026-09-02 16:50:42	9054	NINGUNA	Realizada

Programación No.	Vehículo No.	CC No.	Operario 1	CC No.	Operario 2
28556	TGU380	96333671	HITLER FABIAN VALDERRAMA VALDERRAMA		

NIT	Cliente	Lista	Municipio	Lugar
900196409-	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S	HUILA INDUSTRIAL - RECOLECCIóN Y DISPOSICIóN - ESTANDAR	NEIVA	CALLE 27 # 08-06 SANTA LUCIA

Servicio Especial	Observación
	SOLICITUD CREADA AUTOMÁTICAMENTE

No.	Producto	Cantidad	Unidad	Cantidad Emb.	Embalaje	Observación
188712	RECOLECCIóN RESIDUOS ORDINARIOS	01.50	KILOGRAMO	1	BOLSA	

Aceptación Cliente

Nombre Contacto	Nit	Cargo	Calificación Servicio
JULIÁN CAVIEDES	1079179247	ALMACENISTA	SATISFACTORIO

Firma

Gracias por contar con nosotros!

Neiva - Huila, 02 de octubre del 2026.

CERTIFICA

Que la empresa **SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH SAS** Nit **900.196.409**, sostiene relaciones comerciales en la prestación del **SERVICIO RECOLECCIóN, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIóN FINAL DE RESIDUOS INDUSTRIALES** a la fecha.

La anterior certificación se expide a petición de la parte interesada.

Cualquier información con gusto será atendida a nuestros números (8) 874 41 41 Ext:5002 ó 317 365 20000

DANIELA MACIAS ESCOBAR
Jefe de Negocios y Proyectos

ADVERTENCIA: Se recuerda que cualquier modificación, enmendadura, tacha, supresión o alteración del texto del presente certificado para su uso, se considera falsificación de documento privado de conformidad con el artículo 289 del Código Penal, y que la Compañía está en la obligación de denunciar conforme al artículo 67 del Código de Procedimiento Penal

Código de Autenticación: 035

CONSORCIO
INFRAESTRUCTURA AS

INFORME ACTA PARCIAL N° 02

Objeto contractual: *"Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia".*

Contrato de obra N°: 018 DE 2026
Contratista: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
NIT: 902.080.280-1

PERIODO: DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 23 DE OCTUBRE DE 2026

OCTUBRE DE 2026

FLORENCIA - CAQUETÁ

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO DEL CONTRATO
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
5. CONTRATO DE OBRA
    a. Generalidades del contrato N°: 018 DE 2026
    b. Actuaciones contractuales
    c. Valor ejecutado por capítulo
    d. Avance financiero
    e. Inversión del anticipo
6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
    a. Resumen ejecutivo
    b. Actividades ejecutadas – Mantenimiento de Inmuebles
    c. Actividades ejecutadas – Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical
    d. Actividades ejecutadas – Mantenimiento de Equipos Electromecánicos
    e. Actividades ejecutadas – Mantenimiento de Equipos de Climatización
7. RELACIÓN DE RESPONSABLES
8. CONCLUSIONES

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad documentar el avance y desarrollo de las actividades ejecutadas por el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS, en su calidad de contratista del Contrato N°. 018 de 2026, suscrito con la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia. El presente informe corresponde al Acta de Corte Parcial N° 02 y, de conformidad con lo solicitado, se circunscribe únicamente a las actividades ejecutadas en los componentes de Mantenimiento de Inmuebles, Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical, Mantenimiento de Equipos Electromecánicos y Mantenimiento de Equipos de Climatización.

2. OBJETIVO DEL CONTRATO

Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto contemplado en el presente contrato responde a la necesidad de garantizar el adecuado funcionamiento y conservación de la infraestructura física, de los equipos electromecánicos, de los sistemas de climatización y de los equipos de transporte vertical (ascensores, salvaescaleras y elevadores) de las sedes judiciales del Distrito Judicial de Florencia, en beneficio de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Florencia.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolla en las sedes judiciales del Distrito Judicial de Florencia, localizadas en el departamento del Caquetá, incluyendo el Palacio de Justicia de Florencia (sede principal y sede Tribunales) y las sedes judiciales de Belén de los Andaquíes, Puerto Rico y Albania.

5. CONTRATO DE OBRA

a. Generalidades del contrato N°: 018 DE 2026

Objeto:	*Contratar el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia.*
Contratista:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS – RL FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Residente de obra:	CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
Supervisor:	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Contrato N°:	018 DE 2026
Valor Inicial:	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 695,935,370.00)
Valor Adicional:	$ 0.00
Valor Final:	SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 695,935,370.00)
Plazo Inicial:	SEIS (06) MESES
Fecha de inicio:	4 de septiembre de 2026
Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2026

Tabla 1, Información General del Contrato de Obra

b. Actuaciones contractuales

TIPO DE ACTA	FECHA
ACTA DE INICIO	4 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ACTA DE CORTE PARCIAL N° 01	21 DE SEPTIEMBRE DE 2026
ACTA DE CORTE PARCIAL N° 02	23 DE OCTUBRE DE 2026
DÍAS TRANSCURRIDOS DESDE EL INICIO	49 DÍAS

Tabla 2, Relación de Actuaciones Contractuales

c. Valor ejecutado por capítulo (Acta Parcial N° 02)

ACTA DE CORTE PARCIAL N° 02 – DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE DE 2026	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 695,935,370.00
VALOR EJECUTADO – MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (Incl. IVA)	$ 95,218,993.59
VALOR EJECUTADO – TRANSPORTE VERTICAL (Incl. IVA)	$ 20,284,610.29
VALOR EJECUTADO – EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS (Incl. IVA)	$ 75,055,077.86
VALOR EJECUTADO – EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN (Incl. IVA)	$ 56,939,327.06
VALOR TOTAL EJECUTADO – PRESENTE ACTA	**$ 247,498,008.80**
TIEMPO TRANSCURRIDO EN EL PERIODO	32 DÍAS

Tabla 3, Estado y Avance Financiero – Acta de Corte Parcial N° 02

Nota: los valores anteriores incluyen IVA (19%) y corresponden exclusivamente a los ítems ejecutados en los capítulos I. Mantenimiento de Inmuebles, II. Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical, III. Mantenimiento de Equipos Electromecánicos y IV. Mantenimiento de Equipos de Climatización del Contrato N° 018 de 2026, de acuerdo con el Acta de Corte Parcial N° 02 de fecha 23 de octubre de 2026.

d. Avance financiero

Con la presente Acta de Corte Parcial N° 02, el valor a tramitar correspondiente a los componentes de Mantenimiento de Inmuebles, Transporte Vertical, Equipos Electromecánicos y Equipos de Climatización asciende

a $ 247,498,008.80 (incluido IVA). El estado acumulado de estos componentes, según el control de ejecución por rubro del acta, es el siguiente:

CAPÍTULO	MONTO CONTRATADO	EJECUTADO PRESENTE ACTA	ACUMULADO EJECUTADO	% EJECUTADO
I. Mantenimiento de Inmuebles	$ 410,790,560	$ 95,218,994	$ 95,218,994	23.18%
II. Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical	$ 31,950,000	$ 20,284,610	$ 26,186,896	81.96%
III. Mantenimiento de Equipos Electromecánicos	$ 43,194,810	$ 75,055,078	$ 75,055,078	173.76%
IV. Mantenimiento de Equipos de Climatización	$ 210,000,000	$ 56,939,327	$ 79,102,866	37.67%
TOTAL	**$ 695,935,370**	**$ 247,498,009**	**$ 275,563,834**	**39.60%**

Tabla 4, Avance financiero acumulado por capítulo (valores con IVA)

e. Inversión del anticipo

El Contrato N° 018 de 2026 no contempla el pago de anticipo, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones del proceso de selección.

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

a. Resumen ejecutivo

Del 22 de septiembre al 23 de octubre de 2026, en el marco del Contrato N° 018 de 2026, el Consorcio Infraestructura AS ejecutó actividades de mantenimiento de inmuebles (obras civiles) y de mantenimiento de equipos de transporte vertical en el Palacio de Justicia de Florencia, incluida la sede Tribunales, así como actividades de mantenimiento de equipos electromecánicos en las sedes judiciales de Florencia, Belén de los Andaquíes, Puerto Rico y Albania, y actividades de mantenimiento de equipos de climatización en las sedes judiciales de Florencia, Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solita y Valparaíso.

En materia de mantenimiento de inmuebles, se realizó el suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I a tres manos (442.47 m²) y de estuco plástico (415.59 m²) en el pasillo del piso 1 de la sede Tribunales, en las oficinas de las salas de audiencias de los Juzgados Administrativos 1, 2 y 3 y en la oficina de la Secretaría de la Sala Penal. Adicionalmente, se ejecutó el suministro e instalación del sistema de impermeabilización con membrana de PVC tipo SIKAPLAN 12 G (200 m²) en el Palacio de Justicia de Florencia – Tribunales, con el fin de corregir las filtraciones de agua lluvia y proteger la infraestructura del edificio.

En materia de mantenimiento de equipos de transporte vertical, se realizó en el mes de octubre el mantenimiento preventivo y la atención de emergencias del ascensor marca Glarie (5 paradas) del Palacio de Justicia de Florencia y del ascensor marca Interlift (4 paradas) de la sede Tribunales, así como el mantenimiento preventivo del elevador para trabajo en alturas del Palacio de Justicia de Florencia. Igualmente, se efectuó el suministro, instalación, programación y puesta en servicio de un variador de velocidad Monarch 4007 – 220 V para el ascensor de la sede Tribunales.

En materia de mantenimiento de equipos electromecánicos, se realizó la revisión de los sistemas de alimentación eléctrica y tableros de transferencia, con pruebas de funcionalidad, en las sedes judiciales de Florencia, Puerto Rico y Belén de los Andaquíes; el mantenimiento preventivo y correctivo de las plantas eléctricas de los Palacios de Justicia de Florencia (incluida la sede Tribunales), Puerto Rico, Belén de los Andaquíes y Albania; el mantenimiento preventivo y correctivo de las motobombas y bombas de alta presión de Florencia y Belén de los Andaquíes, así como de las bombas sumergibles de esta última sede; y el mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de red contraincendios de Florencia (sede principal y sede Tribunales) y de Belén de los Andaquíes. Adicionalmente, se suministraron e instalaron un contactor de 32 A, dos breakers 3*40 y un totalizador de 160 A en Florencia.

En materia de mantenimiento de equipos de climatización, se realizó el mantenimiento preventivo de 49 equipos mini split en Florencia y en las sedes de los municipios de Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairá, Curillo, Milán, Morelia, Puerto Rico, San José del Fragua, San Vicente del Caguán, Solita y Valparaíso, y de 11 equipos tipo cassette / piso techo en Puerto Rico, Belén de los Andaquíes y Solita. En Florencia se instalaron 17 equipos mini split (13 de 9.000 a 18.000 BTU y 3 de 24.000 a 36.000 BTU) y uno de 60.000 BTU, con el desmonte de 17 equipos y el suministro de tuberías de cobre, accesorios, aislamiento térmico Rubatex, cable encauchetado y manguera de drenaje; en San José del Fragua se instaló un equipo de 24.000 a 36.000 BTU con su respectiva red. Adicionalmente, se ejecutaron trabajos correctivos como el cambio de un motor de condensador de 18.000 BTU y de una tarjeta electrónica inverter, la corrección de fuga con carga de refrigerante, el ajuste de carga de refrigerante R-410 en Belén de los Andaquíes y el suministro de controles remotos en Morelia y Valparaíso.

b. Actividades ejecutadas – I. Mantenimiento de Inmuebles

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	SEDE/ MUNICIPIO	VR. EJECUTADO (sin IVA)
4.1	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I; 3 manos.	M2	442.47	FLORENCIA	$ 17,578,006
4.3	Suministro y aplicación de estuco plástico.	M2	415.59	FLORENCIA	$ 9,963,355

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	SEDE/ MUNICIPIO	VR. EJECUTADO (sin IVA)
NP.01	Suministro e instalación de sistema de impermeabilización con membrana de PVC marca SIKA SIKAPLAN 12 G CO o similar, resistente a rayos UV, de 1.2 mm de espesor, termofundida, color blanco o gris claro. Incluye preparación de la superficie, perfilería de PVC con chazos de fijación, capa de separación en geotextil 1600 NT, sellos con resinas epóxicas para bajantes de aguas lluvias y anclajes, y sellos en poliuretano para el perímetro de la membrana, tuberías existentes y anclajes.	M2	200.00	FLORENCIA	$ 52,474,600
				SUBTOTAL VALOR BÁSICO (sin IVA)	**$ 80,015,961**

Tabla 5, Cantidades ejecutadas – I. Mantenimiento de Inmuebles (Acta Parcial N° 02)

IVA (19%): $ 15,203,032.59 | VALOR TOTAL SECCIÓN I (incl. IVA): $ 95,218,993.59

c. Actividades ejecutadas – II. Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	SEDE/ MUNICIPIO	VR. EJECUTADO (sin IVA)
1.1	Mantenimiento preventivo y atención de emergencias del ascensor marca Gblarie (5 paradas), Palacio de Justicia de Florencia.	UN	1.00	FLORENCIA	$ 949,292
1.2	Mantenimiento preventivo para elevador para trabajo en alturas en funcionamiento (Palacio de Justicia de Florencia).	UN	1.00	FLORENCIA	$ 676,907
NP.03	Mantenimiento preventivo y atención de emergencias del ascensor marca Interlift (4 paradas), Palacio de Justicia de Florencia – Sede Tribunales.	UN	1.00	FLORENCIA	$ 949,292
NP.05	Suministro, instalación, programación y puesta en servicio de variador de velocidad Monarch 4007 – 220 V para ascensor (Palacio de Justicia de Florencia – Sede Tribunales).	UN	1.00	FLORENCIA	$ 14,470,400
				SUBTOTAL VALOR BÁSICO (sin IVA)	**$ 17,045,891**

Tabla 6, Cantidades ejecutadas – II. Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical (Acta Parcial N° 02)

IVA (19%): $ 3,238,719.29 | VALOR TOTAL SECCIÓN II (incl. IVA): $ 20,284,610.29

d. Actividades ejecutadas – III. Mantenimiento de Equipos Electromecánicos

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	SEDE/ MUNICIPIO	VR. EJECUTADO (sin IVA)
1.1	Revisión de los sistemas de alimentación eléctrica, tableros de transferencia y realización de pruebas de funcionalidad por sede judicial.	UN	4.00	FLORENCIA	$ 15,329,180
1.1	Revisión de los sistemas de alimentación eléctrica, tableros de transferencia y realización de pruebas de funcionalidad por sede judicial.	UN	1.00	PUERTO RICO	$ 4,111,568
1.1	Revisión de los sistemas de alimentación eléctrica, tableros de transferencia y realización de pruebas de funcionalidad por sede judicial.	UN	2.00	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	$ 8,223,136
1.2	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del Palacio de Justicia de Florencia. Marca Puma, motor diésel, enfriamiento por radiador de agua, salida de 3 fases.	UN	1.00	FLORENCIA	$ 3,623,924

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	SEDE/ MUNICIPIO	VR. EJECUTADO (sin IVA)
1.3	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del Palacio de Justicia de Puerto Rico. Marca Perkins, motor diésel, serial 3777E01B.	UN	1.00	PUERTO RICO	$ 1,862,658
1.4	Mantenimiento preventivo y correctivo para el generador de energía (planta eléctrica) del Palacio de Justicia de Belén de los Andaquíes. Marca Toyama XP, motor diésel, serial TDG8500SLE3DXP.	UN	1.00	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	$ 1,595,138
1.5	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la planta eléctrica del Palacio de Justicia de Albania. Marca Kama, motor diésel, serial KDE 6500 T.	UN	1.00	ALBANIA	$ 1,737,775
1.6	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la motobomba de alta presión de agua del Palacio de Justicia de Florencia. Marca Siemens, serial 1LA7113-2YA69.	UN	1.00	FLORENCIA	$ 1,135,123
1.7	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para la motobomba de alta presión eléctrica del Palacio de Justicia de Florencia. Marca WEG, bomba centrífuga monobloque, 230 V.	UN	2.00	FLORENCIA	$ 2,391,808
1.8	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para las bombas de alta presión del Palacio de Justicia de Belén de los Andaquíes. Marca Pearl, serial C2P 30H36S, 220-440 V.	UN	2.00	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	$ 1,764,496
1.9	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para las bombas sumergibles del Palacio de Justicia de Belén de los Andaquíes (bomba electrosumergible 1 HP Aqua Pak y equipo eyector dúplex Barnes de dos bombas de 1 HP).	UN	1.00	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	$ 1,904,768
2.0	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del Palacio de Justicia de Florencia (tanque, bombas principal, de respaldo y jockey, tableros y presostatos).	UN	1.00	FLORENCIA	$ 4,663,995
2.1	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del Palacio de Justicia de Belén de los Andaquíes (tanque, equipo diésel Barnes 250 GPM, bomba jockey 1.5 HP Barmesa y tableros).	UN	1.00	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	$ 4,917,583
NP.04	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el generador de energía (planta eléctrica) del Palacio de Justicia de Florencia – Sede Tribunales. Motor diésel Cummins.	UN	1.00	FLORENCIA	$ 3,623,924
NP.13	Suministro e instalación de contactor de 32 A.	UN	1.00	FLORENCIA	$ 468,230
NP.14	Suministro e instalación de breaker 3*40.	UN	2.00	FLORENCIA	$ 350,014
NP.15	Suministro e instalación de totalizador de 160 A.	UN	1.00	FLORENCIA	$ 704,179
NP.18	Mantenimiento preventivo y correctivo con repuestos para el sistema de red contraincendios del Palacio de Justicia de Florencia – Sede Tribunales (tanque de almacenamiento y bomba jockey).	UN	1.00	FLORENCIA	$ 4,663,995
				SUBTOTAL VALOR BÁSICO (sin IVA)	**$ 63,071,494**

Tabla 7, Cantidades ejecutadas – III. Mantenimiento de Equipos Electromecánicos (Acta Parcial N° 02)

IVA (19%): $ 11,983,583.86 | VALOR TOTAL SECCIÓN III (incl. IVA): $ 75,055,077.86

e. Actividades ejecutadas – IV. Mantenimiento de Equipos de Climatización

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	SEDE/ MUNICIPIO	VR. EJECUTADO (sin IVA)
1.1	Mantenimiento preventivo de equipos mini split (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	10.00	FLORENCIA	$ 1,643,080
1.1	Mantenimiento preventivo de equipos mini split (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	3.00	ALBANIA	$ 529,875
1.1	Mantenimiento preventivo de equipos mini split (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	8.00	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	$ 1,413,000
1.1	Mantenimiento preventivo de equipos mini split (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	3.00	CARTAGENA DEL CHAIRÁ	$ 529,875
1.1	Mantenimiento preventivo de equipos mini split (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	3.00	CURILLO	$ 529,875
1.1	Mantenimiento preventivo de equipos mini split (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	4.00	MILÁN	$ 706,500
1.1	Mantenimiento preventivo de equipos mini split (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	2.00	MORELIA	$ 353,250
1.1	Mantenimiento preventivo de equipos mini split (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	4.00	PUERTO RICO	$ 706,500
1.1	Mantenimiento preventivo de equipos mini split (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	3.00	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	$ 529,875
1.1	Mantenimiento preventivo de equipos mini split (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	5.00	SAN VICENTE DEL CAGUÁN	$ 883,125
1.1	Mantenimiento preventivo de equipos mini split (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	1.00	SOLITA	$ 176,625
1.1	Mantenimiento preventivo de equipos mini split (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	3.00	VALPARAÍSO	$ 529,875
1.2	Mantenimiento preventivo de equipos cassette / piso techo (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	2.00	PUERTO RICO	$ 380,772

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	SEDE/ MUNICIPIO	VR. EJECUTADO (sin IVA)
1.2	Mantenimiento preventivo de equipos cassette / piso techo (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	8.00	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	$ 1,523,088
1.2	Mantenimiento preventivo de equipos cassette / piso techo (incluye mano de obra, fan coil, condensadora, bomba de condensado y su respectivo drenaje).	UN	1.00	SOLITA	$ 190,386
1.3	Instalación básica de equipo mini split de 9.000, 12.000 y 18.000 BTU (mano de obra).	UN	13.00	FLORENCIA	$ 13,313,534
1.4	Instalación básica de equipo mini split de 24.000 y 36.000 BTU (mano de obra).	UN	3.00	FLORENCIA	$ 4,063,065
1.4	Instalación básica de equipo mini split de 24.000 y 36.000 BTU (mano de obra).	UN	1.00	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	$ 1,420,002
1.5	Instalación básica de equipo de 60.000 BTU (mano de obra).	UN	1.00	FLORENCIA	$ 1,523,810
1.6	Desmonte de aire acondicionado mini split de 9.000 hasta 18.000 BTU (mano de obra) y entrega en almacén del Palacio de Justicia o en sitio de nueva instalación.	UN	13.00	FLORENCIA	$ 1,784,354
1.7	Desmonte de aire acondicionado mini split de 24.000 hasta 60.000 BTU (mano de obra) y entrega en almacén del Palacio de Justicia o en sitio de nueva instalación.	UN	4.00	FLORENCIA	$ 747,744
1.7	Desmonte de aire acondicionado mini split de 24.000 hasta 60.000 BTU (mano de obra) y entrega en almacén del Palacio de Justicia o en sitio de nueva instalación.	UN	1.00	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	$ 206,286
2.3	Suministro y ajuste de carga de refrigerante R-410 para equipos ecológicos y tecnología inverter.	LB	2.00	BELÉN DE LOS ANDAQUÍES	$ 160,196
3.5	Suministro e instalación de motor para condensador de 18.000 BTU.	UN	1.00	FLORENCIA	$ 641,547
5.5	Suministro y programación de control remoto para mini split de 9.000 a 24.000 BTU.	UN	1.00	MORELIA	$ 164,470
5.5	Suministro y programación de control remoto para mini split de 9.000 a 24.000 BTU.	UN	1.00	VALPARAÍSO	$ 164,470
6.3	Suministro e instalación de tarjeta electrónica para mini split inverter (unidad condensadora).	UN	1.00	FLORENCIA	$ 1,067,648
7.7	Suministro e instalación de cable eléctrico concéntrico 4 x 14.	ML	60.50	FLORENCIA	$ 1,282,116
7.7	Suministro e instalación de cable eléctrico concéntrico 4 x 14.	ML	5.00	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	$ 117,040
8.8	Suministro e instalación de tubería de refrigeración (cobre) de 1/2".	ML	12.00	FLORENCIA	$ 543,336
8.9	Suministro e instalación de tubería de refrigeración (cobre) de 1/4".	ML	12.00	FLORENCIA	$ 289,572
8.9	Suministro e instalación de tubería de refrigeración (cobre) de 1/4".	ML	4.00	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	$ 106,580
9.0	Suministro e instalación de tubería de refrigeración (cobre) de 3/8".	ML	12.50	FLORENCIA	$ 421,688
9.1	Suministro e instalación de tubería de refrigeración (cobre) de 5/8".	ML	12.50	FLORENCIA	$ 794,700

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	SEDE/ MUNICIPIO	VR. EJECUTADO (sin IVA)
9.1	Suministro e instalación de tubería de refrigeración (cobre) de 5/8".	ML	4.00	SAN JOSÉ DEL FRAGUA	$ 280,896
9.8	Suministro e instalación de codos de cobre de 1/2".	UN	13.00	FLORENCIA	$ 335,491
10.1	Suministro e instalación de codos de cobre de 5/8".	UN	10.00	FLORENCIA	$ 323,200
10.8	Suministro e instalación de mogollas (caucho).	UN	68.00	FLORENCIA	$ 776,696
12.5	Corrección de fuga y carga de refrigerante de 1 a 5 T.R.	GBL	1.00	FLORENCIA	$ 682,703
NP.07	Suministro e instalación de cinta vinilo.	ROLLO	6.00	FLORENCIA	$ 99,000
NP.08	Suministro e instalación de cable encauchetado 3*12.	ML	124.50	FLORENCIA	$ 2,552,250
NP.10	Suministro e instalación de manguera plástica para drenaje.	ML	6.00	FLORENCIA	$ 100,800
NP.11	Suministro e instalación de aislamiento térmico Rubatex.	ML	163.50	FLORENCIA	$ 3,259,279
				SUBTOTAL VALOR BÁSICO (sin IVA)	**$ 47,848,174**

Tabla 8, Cantidades ejecutadas – IV. Mantenimiento de Equipos de Climatización (Acta Parcial N° 02)

IVA (19%): $ 9,091,153.06 | VALOR TOTAL SECCIÓN IV (incl. IVA): $ 56,939,327.06

VALOR TOTAL EJECUTADO – PRESENTE ACTA (incl. IVA): $ 247,498,008.80

7. RELACIÓN DE RESPONSABLES

CARGO	NOMBRE
Representante Legal	FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Residente de Obra	CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
Supervisor del Contrato	MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA

Tabla 9, Relación de responsables del Contrato N° 018 de 2026

8. CONCLUSIONES

El Contrato N° 018 de 2026 avanza en el cumplimiento del objeto contractual relacionado con el mantenimiento integral, preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, de climatización y de transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia. En lo correspondiente a los componentes de Mantenimiento de Inmuebles, Mantenimiento de Equipos de Transporte Vertical, Mantenimiento de Equipos Electromecánicos y Mantenimiento de Equipos de Climatización, las actividades ejecutadas durante el periodo del presente informe se realizaron conforme a lo programado, alcanzando un avance acumulado del 23.18% en el capítulo de Mantenimiento de Inmuebles del 81.96% en el capítulo de Transporte Vertical, del 37.67% en el capítulo de Equipos de Climatización y del 173.76% en el capítulo de Equipos Electromecánicos, valor este último que supera el monto asignado a dicho rubro y que será objeto del ajuste correspondiente con la supervisión del contrato. El Consorcio Infraestructura AS continúa comprometido con la ejecución oportuna de las actividades restantes, para su recibo a satisfacción por parte de la entidad.

Se firma el 23 de octubre de 2026.

FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Representante Legal
Consorcio Infraestructura AS

CARLOS MARIO BUENDÍA FIERRO
Residente de Obra
Consorcio Infraestructura AS

INFORME TÉCNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE EQUIPOS

DIRIGIDO A: DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE FLORENCIA – Supervisión del Contrato N° 018 de 2026
CONTRATO: N° 018 de 2026 – Mantenimiento Preventivo de plantas eléctricas, electrobombas y sistemas contra incendios
UBICACIÓN: Departamento del Caquetá, Colombia
CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS
PERIODO DE EJECUCIÓN: 13/10/2026 – 17/10/2026
FECHA DE PRESENTACIÓN: 21/10/2026
RESPONSABLE TÉCNICO: CARLOS DANIEL VALENCIA CORDOBA

1. OBJETIVO

Presentar a la supervisión del Contrato N° 018 de 2026 el informe técnico de las actividades de mantenimiento preventivo, inspección y diagnóstico realizadas a las plantas eléctricas, bombas eyectoras, bombas de presión de agua y sistemas contra incendios ubicados en las diferentes sedes atendidas en el departamento del Caquetá.

Las actividades desarrolladas tuvieron como finalidad contribuir a la conservación de los equipos, verificar sus condiciones generales de funcionamiento, prevenir fallas operativas e identificar las novedades técnicas que requieren intervención correctiva o seguimiento.

2. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio comprendió la atención de equipos de generación eléctrica y sistemas de bombeo, de acuerdo con las actividades programadas en el marco del contrato.

Los equipos contemplados en el alcance general fueron:

* Cinco (5) plantas eléctricas.
* Tres (3) bombas eyectoras.
* Cuatro (4) bombas de presión de agua.
* Sistemas contra incendios de las sedes atendidas, incluyendo inspecciones, diagnósticos y mantenimiento de bombas asociadas, según las condiciones identificadas en cada instalación.

Las actividades se ejecutaron en los municipios de Belén, Florencia, Puerto Rico y Albania, incluyendo la localidad de Florencia – Tribunales.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR MUNICIPIO

3.1. BELÉN, CAQUETÁ

Equipos atendidos:

* Una (1) planta eléctrica Toyama diésel.
* Tres (3) bombas eyectoras.
* Dos (2) bombas de presión de agua.
* Una (1) visita técnica de diagnóstico al sistema contra incendios.

3.1.1. Mantenimiento de planta eléctrica Toyama diésel

Se realizó mantenimiento preventivo a la planta eléctrica, incluyendo las siguientes actividades:

* Cambio de aceite lubricante del motor.
* Cambio de filtros correspondientes.
* Limpieza general del equipo.
* Inspección visual de los componentes accesibles.
* Pruebas de encendido para verificar la respuesta operativa del equipo.

3.1.2. Mantenimiento de bombas eyectoras y bombas de presión de agua

Se realizó mantenimiento preventivo a tres (3) bombas eyectoras y dos (2) bombas de presión de agua. Las actividades ejecutadas comprendieron:

* Cambio de sellos mecánicos.
* Cambio de rodamientos.
* Limpieza general de los equipos y de los componentes intervenidos.
* Inspección de las condiciones mecánicas de los elementos accesibles.
* Verificación de las condiciones de funcionamiento, de acuerdo con las pruebas efectuadas.

Estas actividades estuvieron orientadas a conservar las condiciones mecánicas de las bombas y contribuir a la prevención de fugas y fallas asociadas al desgaste de sus componentes.

3.1.3. Diagnóstico del sistema contra incendios

Se realizó una visita técnica de inspección y diagnóstico al sistema contra incendios. Durante la revisión se identificó una novedad en el sistema de inyección del motor diésel asociado al sistema.

Como resultado de la inspección, se recomendó la intervención de un mecánico especializado en motores diésel, con el fin de efectuar una evaluación detallada del sistema de inyección, determinar el origen de la falla y establecer las reparaciones necesarias.

Estado: Novedad técnica reportada, pendiente de diagnóstico especializado y de la correspondiente intervención correctiva.

3.2. FLORENCIA, CAQUETÁ

Equipos atendidos:

* Una (1) planta eléctrica de 181 kVA.
* Dos (2) bombas de presión de agua.
* Dos (2) bombas asociadas al sistema contra incendios.

3.2.1. Mantenimiento de planta eléctrica de 181 kVA

Se efectuó mantenimiento preventivo a la planta eléctrica de 181 kVA, que comprendió:

* Cambio de aceite lubricante.
* Cambio de filtros correspondientes.
* Limpieza general del equipo.
* Inspección visual de sus componentes accesibles.
* Pruebas de encendido para verificar su respuesta operativa.

3.2.2. Inspección de bombas de presión de agua

Durante la revisión de las dos (2) bombas de presión de agua, se evidenció que ambas presentaban daños por quemadura y se encontraban fuera de servicio.

Debido a su condición, los dos equipos fueron dados de baja. En consecuencia, se reportó la novedad y se solicitó el suministro de dos (2) bombas nuevas para su reposición.

Estado: Dos (2) bombas dadas de baja, pendientes de reposición mediante el suministro de equipos nuevos.

3.2.3. Mantenimiento del sistema contra incendios

Se realizó mantenimiento al sistema contra incendios, incluyendo la revisión e intervención de dos (2) bombas pertenecientes al sistema.

Las actividades se orientaron a conservar las condiciones mecánicas y operativas de los equipos intervenidos.

Las condiciones finales de funcionamiento deberán respaldarse con los resultados de las pruebas efectuadas y los registros correspondientes.

3.3. FLORENCIA – TRIBUNALES, CAQUETÁ

Equipos atendidos:

* Una (1) planta eléctrica de 96 kVA.
* Una (1) visita técnica de diagnóstico al sistema contra incendios.

3.3.1. Mantenimiento de planta eléctrica de 96 kVA

Se realizó mantenimiento preventivo a la planta eléctrica de 96 kVA, incluyendo:

* Cambio de aceite lubricante.
* Cambio de filtros correspondientes.
* Limpieza general del equipo.
* Inspección visual de los componentes accesibles.
* Pruebas de encendido para verificar su respuesta operativa.

3.3.2. Diagnóstico del sistema contra incendios

Se efectuó una visita técnica de inspección y diagnóstico para evaluar las condiciones generales del sistema contra incendios.

Durante la revisión se evidenció que la bomba de 10 HP (caballos de fuerza) se encontraba quemada, condición que compromete su disponibilidad operativa.

Como recomendación técnica, se indicó la necesidad de evaluar el estado del equipo para determinar la viabilidad de su reparación o la necesidad de reemplazo, con el propósito de recuperar las condiciones de operación del sistema.

Estado: Bomba de 10 HP reportada como quemada, pendiente de evaluación correctiva y de reparación o sustitución.

3.4. PUERTO RICO, CAQUETÁ

Equipos y actividades atendidas:

* Una (1) planta eléctrica.
* Suministro de una (1) batería para la planta eléctrica.

3.4.1. Mantenimiento de planta eléctrica

Se efectuó mantenimiento preventivo a la planta eléctrica, incluyendo cambio de aceite lubricante, cambio de filtros correspondientes, limpieza general e inspección visual de los componentes accesibles.

Adicionalmente, se realizó el suministro de una (1) batería destinada al equipo, con el propósito de contribuir a la disponibilidad del sistema de arranque.

Se efectuaron las verificaciones operativas correspondientes, de acuerdo con las actividades realizadas y las condiciones del equipo.

3.5. ALBANIA, CAQUETÁ

Equipos atendidos:

* Una (1) planta eléctrica diésel de 6,5 kW.

3.5.1. Mantenimiento de planta eléctrica diésel de 6,5 kW

Se realizó mantenimiento preventivo a la planta eléctrica diésel, que comprendió:

* Cambio de aceite lubricante.
* Cambio de filtros correspondientes.
* Limpieza general del equipo.
* Inspección visual de los componentes accesibles.

* Verificación de las condiciones generales de operación.

Se realizaron las verificaciones de encendido y funcionamiento correspondientes, de acuerdo con las actividades efectuadas y las condiciones del equipo.

4. RESUMEN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Municipio o localidad Equipos atendidos y principales actividades
Belén Mantenimiento a una planta Toyama diésel, tres bombas eyectoras y dos bombas de presión de agua. Diagnóstico del sistema contra incendios, con novedad en el sistema de inyección del motor diésel.
Florencia Mantenimiento a una planta de 181 kVA. Dos bombas de presión quemadas y dadas de baja, con solicitud de reposición. Mantenimiento a dos bombas del sistema contra incendios.
Florencia – Tribunales Mantenimiento a una planta de 96 kVA. Diagnóstico del sistema contra incendios e identificación de una bomba de 10 HP quemada.
Puerto Rico Mantenimiento a una planta eléctrica y suministro de una batería.
Albania Mantenimiento a una planta eléctrica diésel de 6,5 kW.

5. NOVEDADES TÉCNICAS Y ACTIVIDADES PENDIENTES

Como resultado de las inspecciones y diagnósticos realizados, se identificaron las siguientes novedades que requieren seguimiento:

5.1. Belén – Motor diésel del sistema contra incendios

Se identificó una falla en el sistema de inyección del motor diésel asociado al sistema contra incendios. Se recomienda programar una revisión por parte de un mecánico especializado en motores diésel para determinar la causa de la falla y establecer las acciones correctivas necesarias.

5.2. Florencia – Bombas de presión de agua

Se identificaron dos (2) bombas de presión de agua quemadas y fuera de servicio. Ambos equipos fueron dados de baja y se solicitó el suministro de dos (2) bombas nuevas para su reposición.

Se recomienda efectuar la instalación de los equipos de reemplazo y realizar las pruebas de funcionamiento correspondientes una vez estén disponibles.

5.3. Florencia – Tribunales – Sistema contra incendios

Se identificó una bomba de 10 HP quemada. Se recomienda evaluar su reparación o reemplazo y verificar posteriormente el funcionamiento del sistema.
Las novedades descritas deben mantenerse registradas hasta la ejecución de las acciones correctivas y la verificación de las condiciones operativas de los equipos afectados.

6. RECOMENDACIONES GENERALES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

6.1. Plantas eléctricas

Con el propósito de prolongar la vida útil de las plantas eléctricas y contribuir a su confiabilidad y disponibilidad, se recomienda:

1. Frecuencia de mantenimiento: realizar mantenimiento preventivo cada noventa (90) horas de operación o cada seis (6) a ocho (8) meses, lo que ocurra primero, siempre que este intervalo sea compatible con las especificaciones del fabricante para cada modelo y las condiciones de operación.
2. Lubricación y filtros: efectuar los cambios de aceite lubricante y filtros conforme al manual del fabricante, teniendo en cuenta las horas de funcionamiento y las condiciones de servicio.
3. Inspección de componentes: revisar periódicamente los niveles de aceite y refrigerante, cuando aplique, el estado de las mangueras, correas, conexiones, batería y demás componentes accesibles.
4. Pruebas de encendido: realizar pruebas periódicas de arranque y funcionamiento, documentando las novedades identificadas y verificando la respuesta del equipo.
5. Inspección de tableros eléctricos: efectuar revisiones visuales de los tableros de control, protecciones, indicadores, conductores y conexiones accesibles, buscando señales de recalentamiento, corrosión, deterioro o daños visibles. Cualquier intervención interna deberá ser realizada por personal competente, bajo condiciones seguras de trabajo.
6. Condiciones de instalación: mantener los equipos en áreas limpias, ventiladas y con acceso restringido a personal no autorizado. Evitar obstrucciones en las entradas y salidas de aire.
7. Uso adecuado: operar las plantas dentro de su capacidad nominal, evitar sobrecargas y atender oportunamente cualquier ruido anormal, vibración, fuga, dificultad de arranque o señal de alarma.
8. Control de horas de operación: llevar una bitácora de las horas trabajadas, los mantenimientos efectuados, los repuestos utilizados y las novedades presentadas.

6.2. Bombas eyectoras y bombas de presión de agua

Para las bombas eyectoras y las bombas de presión de agua, se recomienda realizar mantenimiento preventivo cada seis (6) a ocho (8) meses, ajustando la periodicidad según las condiciones reales de operación y las indicaciones del fabricante.

Se recomienda:
1. Inspeccionar periódicamente los sellos mecánicos, rodamientos, acoples y demás componentes sujetos a desgaste.
2. Verificar la presencia de fugas de agua, humedad anormal, ruidos, vibraciones o sobrecalentamiento.
3. Mantener las bombas y sus áreas de instalación limpias y libres de residuos.
4. Realizar inspecciones visuales de los tableros eléctricos, conductores, protecciones, contactores, indicadores y demás componentes accesibles.
5. Solicitar revisión por personal eléctrico competente ante señales de recalentamiento, olor a quemado, daños visibles o disparos frecuentes de las protecciones.
6. Verificar, según el sistema, el funcionamiento de los controles de arranque y parada, presostatos y demás dispositivos asociados.
7. Evitar la operación en seco, las obstrucciones y el funcionamiento fuera de las condiciones previstas para cada equipo.
8. Registrar los mantenimientos, las reparaciones, los repuestos sustituidos y las novedades encontradas.
9. Mantener fuera de operación los equipos que presenten daños que comprometan su funcionamiento seguro, hasta que sean reparados o sustituidos y se verifique su adecuada operación.

6.3. Sistemas contra incendios

Debido a la importancia de estos sistemas para la seguridad de las instalaciones y sus ocupantes, se recomienda:

1. Programar inspecciones y mantenimientos periódicos de las bombas, motores, tableros eléctricos, controles y demás componentes asociados.
2. Verificar que los equipos estén disponibles para operar y que no existan fugas, daños visibles, alarmas o condiciones que comprometan su funcionamiento.
3. Atender prioritariamente la falla del sistema de inyección del motor diésel identificado en Belén.
4. Gestionar la reparación o sustitución de la bomba de 10 HP reportada como quemada en Florencia – Tribunales.
5. Gestionar la reposición de las dos bombas de presión dadas de baja en Florencia.

6. Realizar y documentar pruebas funcionales del sistema conforme a las especificaciones del fabricante y los procedimientos técnicos aplicables.
7. Mantener registros de las inspecciones, pruebas, reparaciones y novedades de cada instalación.

Mientras existan equipos esenciales fuera de servicio o fallas pendientes de solución, se recomienda informar formalmente al responsable de cada instalación para que evalúe las medidas temporales de seguridad necesarias. La disponibilidad del sistema contra incendios deberá confirmarse mediante las verificaciones y pruebas correspondientes.

7. CONCLUSIONES

Durante la ejecución de los trabajos se realizaron actividades de mantenimiento preventivo, inspección y diagnóstico a las plantas eléctricas, bombas eyectoras, bombas de presión de agua y sistemas contra incendios de las sedes atendidas en el departamento del Caquetá.

Las actividades ejecutadas incluyeron cambios de aceite lubricante 15w-40 de la marca Mobile y filtros, limpieza general y pruebas de encendido en las plantas eléctricas, así como cambios de sellos mecánicos y rodamientos y limpieza de los componentes intervenidos en las bombas atendidas.

Adicionalmente, se realizó mantenimiento a dos bombas del sistema contra incendios en Florencia y se llevaron a cabo visitas de diagnóstico que permitieron identificar novedades técnicas que requieren atención posterior.

Se deja constancia de que dos (2) bombas de presión de agua ubicadas en Florencia fueron dadas de baja debido a los daños por quemadura identificados, y que se solicitó su reposición. Asimismo, se reportó una bomba de 10 HP quemada en Florencia – Tribunales y una falla en el sistema de inyección del motor diésel del sistema contra incendios en Belén.

Se recomienda dar continuidad al programa de mantenimiento preventivo, efectuar inspecciones visuales periódicas, conservar los registros de operación y mantenimiento y gestionar oportunamente las acciones correctivas pendientes.

El seguimiento de estas recomendaciones contribuirá a la conservación de los equipos, a la reducción de fallas operativas y a la disponibilidad de los sistemas atendidos.

El presente informe se entrega como soporte documental de las actividades de mantenimiento preventivo, inspección y diagnóstico técnico realizadas en las sedes relacionadas.

Florencia – Caquetá, lunes 24 de agosto de 2026

Ingeniero
FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Representante Legal
Consorcio Infraestructura AS
Nit. 900.208.028-1
Neiva Huila

Asunto: Autorización para adquisición y reemplazo de variador de frecuencia (VFD) – Ascensor – Palacio de Justicia de Florencia.

Respetado Ingeniero Fajardo:

En atención al **Informe Técnico de fecha 20 de agosto de 2026**, presentado por el Consorcio Infraestructura AS, relacionado con el ascensor ubicado en el Palacio de Justicia "Gerardo Cortes Castañeda" de Florencia – Caquetá, en el que se hacen las siguientes precisiones:

De acuerdo con el diagnóstico efectuado durante la visita técnica, el equipo se encuentra **fuera de servicio** y sin posibilidad de arranque, evidenciándose una falla en el variador de frecuencia (VFD). Según lo señalado en el informe, durante la inspección física de la tarjeta del variador se identificó deformación visible en los condensadores electrolíticos de potencia, condición asociada a una posible falla interna por sobretensión, sobrecalentamiento o agotamiento de la vida útil de sus componentes, que impide el arranque del equipo y limita la posibilidad de efectuar el diagnóstico mediante los mecanismos convencionales.

Asimismo, el informe técnico establece que, ante la condición encontrada, se requiere el reemplazo del variador de frecuencia por uno de iguales o superiores especificaciones, seguido de la correspondiente parametrización del sistema, pruebas de arranque y verificación de los circuitos antes de su puesta en funcionamiento.

En consideración a lo anterior, y atendiendo la necesidad de restablecer oportunamente la operación del ascensor, esta supervisión autoriza al contratista para adelantar y efectuar la adquisición y reemplazo del variador de frecuencia requerido, observando estrictamente las siguientes condiciones:

1. **El repuesto deberá ser nuevo, original y de la misma marca del equipo**, y deberá corresponder a la referencia o especificación técnica compatible con el ascensor instalado. No se autoriza la instalación de elementos usados,

reacondicionados, genéricos o de procedencia que no pueda ser debidamente acreditada.

2. La utilización de un repuesto original y técnicamente compatible deberá estar orientada a garantizar la adecuada operación del ascensor, conservar las condiciones técnicas y de seguridad del equipo y evitar afectaciones o deterioros en otros componentes del sistema derivados de la instalación de elementos incompatibles o de especificaciones diferentes a las requeridas por el fabricante.
3. Previo a la adquisición, el contratista deberá informar por escrito a esta supervisión el valor del variador de frecuencia, acompañando la respectiva cotización y/o soporte comercial que permita verificar el precio del elemento, así como la referencia, marca, características técnicas y demás información que permita establecer que el repuesto ofrecido corresponde al requerido técnicamente.
4. El repuesto deberá contar con garantía de calidad y funcionamiento, la cual deberá ser informada y acreditada documentalmente por el proveedor y/o fabricante, indicando expresamente el término de vigencia y las condiciones para hacerla efectiva. La garantía deberá amparar el correcto funcionamiento del elemento suministrado durante el período establecido.
5. La adquisición deberá adelantarse con carácter prioritario y urgente, procurando la consecución del repuesto en el menor tiempo técnicamente posible y evitando prolongar innecesariamente la suspensión del servicio del ascensor.
6. Una vez adquirido e instalado el variador de frecuencia, el contratista deberá realizar la parametrización correspondiente, pruebas de arranque, verificación de los circuitos, comprobación de funcionamiento y demás pruebas técnicas y de seguridad que resulten necesarias, antes de poner nuevamente el equipo al servicio.
7. De la intervención deberá quedar el correspondiente soporte técnico y documental, incluyendo, entre otros, la identificación y referencia del repuesto instalado, factura o documento equivalente, garantía, registro de las actividades ejecutadas, pruebas realizadas y evidencia de la correcta puesta en funcionamiento del equipo.

La presente autorización se fundamenta en el diagnóstico técnico contenido en el informe presentado por el contratista y en la necesidad de atender de manera prioritaria una condición que actualmente mantiene fuera de servicio un equipo esencial para la movilidad vertical dentro del Palacio de Justicia *"Gerardo Cortés Castañeda"* de Florencia Caquetá.

Lo anterior adquiere especial relevancia si se tiene en cuenta que en esta sede judicial desarrollan sus actividades más de 250 servidores judiciales y administrativos, además de la permanente afluencia de usuarios, abogados, partes procesales y demás ciudadanos que concurren a las instalaciones para acceder a los servicios de administración de justicia.

Dentro de esta población se encuentran personas con movilidad reducida, adultos mayores, personas con discapacidad y usuarios que requieren condiciones adecuadas de accesibilidad, para quienes la disponibilidad del ascensor constituye un elemento fundamental para garantizar el acceso a las diferentes áreas de la sede.

En consecuencia, la atención oportuna de la falla reportada no obedece únicamente a razones de comodidad o conveniencia, sino a la necesidad de mantener condiciones adecuadas de funcionamiento, accesibilidad, seguridad y prestación del servicio público de

administración de justicia, razón por la cual se considera necesario procurar el restablecimiento del equipo en el menor tiempo posible.

Finalmente, se precisa que la presente autorización se circunscribe al reemplazo del variador de frecuencia técnicamente requerido y no constituye, por sí misma, aprobación de un valor determinado, por lo que el contratista deberá presentar previamente a esta supervisión los respectivos soportes del costo del repuesto y acreditar el cumplimiento de las condiciones técnicas y de garantía anteriormente señaladas, de conformidad con las obligaciones y condiciones establecidas en el Contrato No. 018 de 2026.

Agradecemos adelantar las gestiones correspondientes con carácter prioritario e informar a esta supervisión sobre las actuaciones realizadas, la disponibilidad del repuesto, su costo y el cronograma previsto para su instalación y puesta en funcionamiento.

Agradezco su atención y quedo atenta a su respuesta.

Cordialmente,



MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Supervisora del Contrato No. 018 de 2026
Profesional Universitario

Florencia – Caquetá, lunes 5 de octubre de 2026

Ingeniero
FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Representante Legal
Consorcio Infraestructura AS
Nit. 900.208.028-1
Neiva Huila

Asunto: *Requerimiento de precisión sobre garantía integral para suministro, instalación, configuración, puesta en servicio y funcionamiento del variador de frecuencia (VFD) – Ascensor Glarie del Palacio de Justicia de Florencia*

Respetado Ingeniero Fajardo:

En ejercicio de las funciones de supervisión del **Contrato No. 018 de 2026**, cuyo objeto corresponde al *mantenimiento integral preventivo y correctivo de la infraestructura física, los equipos electromecánicos, los sistemas de climatización y el transporte vertical de las sedes del Distrito Judicial de Florencia*, y una vez revisada la documentación técnica remitida con ocasión de la intervención requerida para el reemplazo del variador de frecuencia del ascensor marca Glarie ubicado en el Palacio de Justicia de Florencia, se considera necesario solicitar precisión formal respecto del alcance de las garantías y responsabilidades que ampararán la totalidad de la intervención.
Dentro de la documentación aportada se encuentran, entre otros, los siguientes documentos:

- Certificado de calidad de los controles importados.
- Carta o certificado de garantía del repuesto, en la cual se señala una cobertura de doce (12) meses, contados a partir de la fecha de compra o instalación, con las exclusiones allí establecidas respecto de las piezas sometidas al desgaste derivado del funcionamiento normal del producto.
- Certificado de control del gabinete.
- Manual del equipo Monarch MISE 3000 NEO, en idioma español.

Una vez revisada dicha documentación, se advierte que, si bien constituye soporte técnico del elemento propuesto, no se encuentra claramente definido el alcance de la garantía respecto de las actividades de instalación, conexión, programación, parametrización, configuración, calibración, pruebas, puesta en funcionamiento y correcto desempeño del variador una vez incorporado al sistema del ascensor.

Al respecto, es necesario precisar que la garantía comercial otorgada por el fabricante o proveedor respecto del repuesto no sustituye ni limita las responsabilidades que correspondan al contratista por las actividades que se encuentran a su cargo dentro de la ejecución contractual, particularmente aquellas relacionadas con la instalación, conexión, programación, configuración, calibración, pruebas y puesta en servicio del elemento suministrado.

En efecto, el adecuado funcionamiento del ascensor no depende exclusivamente de la calidad o garantía individual del variador, sino también de que su instalación e integración al sistema existente sean ejecutadas de manera técnicamente correcta, conforme a las especificaciones del fabricante, las características particulares del equipo instalado y las condiciones técnicas requeridas para su operación segura y adecuada.

Por lo anterior, resulta necesario que quede expresamente establecido que cualquier falla, daño, deficiencia o anomalía que tenga origen o guarde relación causal con una instalación incorrecta, conexión inadecuada, programación o parametrización errónea, configuración deficiente, calibración incorrecta, omisión de pruebas, puesta en funcionamiento inadecuada o cualquier otra actuación técnica atribuible al contratista deberá ser atendida y corregida por este, sin costo adicional para la Entidad, de conformidad con las obligaciones contractuales que le corresponden.

Lo anterior resulta especialmente relevante teniendo en cuenta que una intervención inadecuada sobre el variador podría no solamente afectar el funcionamiento del componente reemplazado, sino eventualmente generar afectaciones sobre otros elementos del sistema de transporte vertical y, consecuentemente, comprometer la disponibilidad y continuidad del servicio.

En consecuencia, antes de proceder con la autorización definitiva de la instalación y puesta en funcionamiento del variador, se requiere que la firma contratista, por escrito, precise y certifique el alcance de la garantía y responsabilidad que asumirá respecto de la totalidad de la intervención, indicando como mínimo lo siguiente:

1. Garantía del variador o repuesto suministrado

Precisar el término de garantía aplicable al variador, indicando:

- Fecha o hecho a partir del cual inicia su contabilización.
- Cobertura otorgada.
- Condiciones para hacer efectiva la garantía.
- Procedimiento para su reclamación.
- Tiempos de respuesta y atención.
- Exclusiones y limitaciones establecidas por el fabricante o proveedor.

En caso de que la garantía del fabricante o proveedor se encuentre expresamente condicionada a determinadas condiciones de instalación, programación, configuración o puesta en servicio, estas deberán ser informadas y acreditadas documentalmente ante la supervisión.

2. Garantía y responsabilidad por la instalación

Certificar expresamente el término y alcance de la garantía que asumirá el contratista respecto de la instalación física y eléctrica del variador, incluyendo, según corresponda, montaje, conexiones, cableado, integración con los sistemas existentes y demás actividades necesarias para su correcta incorporación al ascensor.

Deberá indicarse expresamente que cualquier falla atribuible a una instalación, conexión o intervención técnicamente inadecuada será atendida por el contratista sin generar costos adicionales para la Entidad.

3. Programación, parametrización, configuración y calibración

Precisar las actividades que serán ejecutadas por el contratista para la programación, parametrización, configuración y calibración del variador, indicando los procedimientos, parámetros y condiciones técnicas aplicables.

Deberá igualmente garantizarse que dichas actividades serán ejecutadas por personal técnicamente competente y conforme a las especificaciones del fabricante y a las características particulares del ascensor marca Glarie.

4. Puesta en funcionamiento y pruebas

Precisar las pruebas técnicas que serán realizadas antes de entregar nuevamente el ascensor al servicio, indicando los aspectos que serán objeto de verificación para acreditar su correcta operación.

Las pruebas deberán permitir verificar, según corresponda, el comportamiento del variador, la adecuada respuesta del sistema, las condiciones de operación del ascensor y la inexistencia de alarmas, fallas o comportamientos anormales derivados de la intervención.

Los resultados de dichas pruebas deberán ser documentados y entregados a la supervisión como soporte de la puesta en funcionamiento del equipo.

5. Responsabilidad por fallas posteriores a la intervención

Certificar expresamente que, durante el término de garantía, las fallas o anomalías que tengan como causa o guarden relación con las actividades ejecutadas por el contratista serán atendidas por este sin costo adicional para la Entidad, incluyendo las labores de diagnóstico, desplazamiento, mano de obra, ajustes, reprogramaciones, correcciones y, cuando técnicamente corresponda, el suministro o reemplazo de los elementos que resulten afectados como consecuencia de una intervención defectuosa.

Lo anterior deberá entenderse sin perjuicio de las garantías comerciales que correspondan directamente al fabricante o proveedor del variador.

En caso de presentarse una falla o anomalía durante el periodo de garantía, el contratista deberá efectuar el correspondiente diagnóstico técnico documentado, determinando, en la medida técnicamente posible, el origen de la novedad y dejando constancia de las pruebas y verificaciones realizadas. La determinación de una eventual exclusión de garantía deberá encontrarse debidamente sustentada desde el punto de vista técnico.

6. Garantía integral de la intervención

Se solicita precisar expresamente que la garantía asociada a la intervención no se limita a la entrega física del variador ni a la acreditación de la garantía comercial del fabricante, sino que comprende las actividades ejecutadas por el contratista para su instalación, integración, configuración, programación, calibración, pruebas y puesta en servicio, dentro del alcance de las obligaciones contractuales a su cargo.

En consecuencia, deberá indicarse claramente el término de garantía que el contratista asumirá respecto de dichas actividades y el hecho a partir del cual comenzará a contabilizarse.

7. Exclusiones

Las exclusiones de garantía deberán ser señaladas de manera expresa, clara y técnicamente sustentada, indicando las circunstancias específicas que podrían dar lugar a su aplicación.

No deberán considerarse como causales de exclusión aquellas fallas que, previo análisis técnico, sean atribuibles a las actividades de instalación, conexión, programación, configuración, calibración, puesta en servicio o demás actuaciones ejecutadas por el contratista.

En caso de presentarse una falla durante el periodo de garantía, corresponderá al contratista efectuar el diagnóstico técnico necesario para determinar su origen y dejar constancia documentada de las causas identificadas, sin que la simple invocación de una exclusión de garantía pueda sustituir el correspondiente diagnóstico técnico.

8. Periodo de observación y seguimiento

Adicionalmente, y como medida de seguimiento técnico, la supervisión considera pertinente establecer un periodo inicial de observación de ocho (8) días calendario, contados a partir de la puesta en funcionamiento del ascensor, durante el cual se realizará seguimiento al comportamiento del equipo bajo condiciones normales de operación.

Este periodo de observación no sustituye, reduce, modifica ni constituye el término de la garantía correspondiente al variador, a la instalación o a las demás actividades ejecutadas por el contratista.

Durante dicho periodo deberán atenderse oportunamente las novedades atribuibles a la intervención y deberán conservarse los registros de las pruebas, verificaciones, ajustes o correcciones que llegaren a efectuarse.

La culminación del periodo de observación tampoco implicará, por sí sola, la liberación de las obligaciones de garantía ni podrá interpretarse como aceptación de eventuales defectos no manifiestos que tengan origen en las actividades ejecutadas por el contratista.

9. Soportes de entrega y recibo técnico

Una vez culminada la intervención, se deberá entregar a la supervisión la documentación que permita acreditar, como mínimo:

- Identificación del variador efectivamente instalado.
- Ficha técnica y/o documentación del fabricante.
- Certificado de calidad y garantía correspondiente.
- Registro de instalación.
- Parámetros o configuración realizada, cuando resulte técnicamente procedente.
- Resultados de las pruebas efectuadas.
- Registro de puesta en funcionamiento.
- Certificación o constancia de correcto funcionamiento del equipo, suscrita por el personal técnico responsable de la intervención.
- Los demás documentos técnicos que permitan verificar la correcta ejecución de la actividad.

10. Constancia de responsabilidad del contratista

Finalmente, se solicita que el contratista certifique expresamente que asume la responsabilidad por la correcta ejecución de las actividades de suministro, instalación, configuración, programación, calibración, pruebas y puesta en funcionamiento que se encuentren a su cargo, y que las mismas serán ejecutadas de conformidad con las especificaciones técnicas del fabricante, las condiciones del equipo existente y las obligaciones establecidas en el Contrato No. 018 de 2026.

11. Garantías y amparos constituidos en el Contrato No. 018 de 2026

La precisión y certificación de las garantías solicitadas en el presente requerimiento se efectúa sin perjuicio de las garantías contractuales, obligaciones de calidad y correcto funcionamiento y demás amparos constituidos por el contratista en las pólizas que respaldan la ejecución del Contrato No. 018 de 2026.

En particular, deberá tenerse en cuenta el amparo correspondiente a calidad y correcto funcionamiento de los bienes, así como los demás amparos que, de acuerdo con las condiciones particulares y generales de las pólizas vigentes, resulten aplicables a los bienes suministrados, las actividades ejecutadas y las obligaciones a cargo del contratista.

En consecuencia, la garantía comercial otorgada por el fabricante o proveedor del variador, así como la garantía y responsabilidad que el contratista asuma respecto de su instalación, configuración, programación, calibración y puesta en funcionamiento, no sustituyen, limitan ni afectan los amparos y obligaciones derivados del contrato y de las garantías constituidas para su ejecución, cuando los hechos que se presenten se encuentren comprendidos dentro de sus respectivas coberturas.

De igual manera, cualquier eventual reclamación deberá analizarse de acuerdo con la naturaleza y causa de la novedad presentada, determinando, según corresponda y con fundamento en las condiciones contractuales y asegurativas vigentes, si debe ser atendida directamente por el contratista, por el fabricante o proveedor del componente, o mediante la afectación del amparo de la póliza que resulte aplicable.

Por lo anterior, la instalación y puesta en funcionamiento del variador deberá ejecutarse dejando plenamente documentadas las condiciones técnicas de entrega, las pruebas efectuadas, los parámetros de operación y el estado del equipo, de manera que, ante una eventual novedad posterior, sea posible establecer técnicamente su origen y determinar el mecanismo de garantía o reclamación que corresponda.

La presente solicitud tiene como finalidad dejar debidamente delimitadas las responsabilidades y condiciones de garantía antes de autorizar la intervención, prevenir controversias posteriores y garantizar que cualquier eventual falla derivada de la intervención realizada sea atendida oportunamente por quien corresponda, sin trasladar a la Entidad costos o responsabilidades que tengan origen en actuaciones imputables al contratista.

Se deja igualmente constancia de que la presente solicitud no constituye una ampliación unilateral de las obligaciones contractuales ni una modificación de las condiciones pactadas, sino un requerimiento dirigido a que el contratista precise documentalmente el alcance de las garantías comerciales y de las responsabilidades que le corresponden respecto de las actividades que ejecutará en desarrollo del contrato.

En consecuencia, se requiere remitir la información y certificaciones solicitadas con anterioridad a la instalación y puesta en funcionamiento del variador, junto con cualquier documento técnico adicional que permita acreditar su compatibilidad con el ascensor Glarie y las condiciones requeridas para su correcta instalación y operación.

Lo anterior se solicita con carácter prioritario, teniendo en cuenta que el equipo se encuentra fuera de servicio desde el 10 de agosto de 2026, situación que afecta las condiciones de accesibilidad y prestación adecuada del servicio en el Palacio de Justicia de Florencia. En razón de la naturaleza pública del servicio de administración de justicia y de la necesidad de garantizar la disponibilidad de los espacios y servicios requeridos por servidores judiciales y usuarios, resulta necesario avanzar oportunamente en la solución técnica, sin que la urgencia por restablecer el servicio implique omitir las verificaciones técnicas y documentales necesarias para salvaguardar los intereses de la Entidad.

Agradezco remitir la respuesta formal y los documentos complementarios solicitados, a efectos de continuar con el trámite correspondiente y, una vez verificada su suficiencia, proceder con las actuaciones necesarias para la instalación y puesta en funcionamiento del ascensor, en el marco de la ejecución del Contrato No. 018 de 2026.

Cordialmente,

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Supervisora del Contrato No. 018 de 2026
Profesional Universitario

Neiva, 14 de octubre de 2026

Doctora

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Supervisora del Contrato No. 018 de 2026 – Profesional Universitario
Consejo Superior de la Judicatura – Coordinación Administrativa de Florencia
Florencia – Caquetá

Referencia: Respuesta a su oficio del 5 de octubre de 2026 – Precisión de garantía integral para el suministro, instalación, configuración, puesta en servicio y funcionamiento del variador de frecuencia (VFD) del ascensor Glarie – Palacio de Justicia de Florencia. Contrato No. 018 de 2026.

Respetada doctora Castro:

En atención al requerimiento de la referencia, el Consorcio Infraestructura AS, en calidad de contratista del Contrato No. 018 de 2026, da respuesta formal a cada uno de los puntos solicitados, y manifiesta que asume la responsabilidad integral de la intervención, sin perjuicio de las garantías comerciales del fabricante o proveedor, en los siguientes términos:

1. Garantía del variador o repuesto suministrado. El variador es nuevo y fue adquirido a ELEVATECH COLOMBIA S.A.S., con carta de garantía de SERVIMEL ELEVATOR PARTS S.A.S. (anexa), que lo ampara contra defectos de fabricación por doce (12) meses, contados desde la fecha de compra o de instalación. La garantía se hace efectiva mediante reclamación escrita del Consorcio al proveedor, con el diagnóstico técnico documentado, y cubre el reemplazo del elemento con defecto de fabricación o ensamble; excluye piezas de desgaste por uso normal y el transporte. El Consorcio gestionará directamente la reclamación y los tiempos de respuesta ante el proveedor, sin trasladar trámite ni costo alguno a la Entidad. Las condiciones de instalación, programación y puesta en servicio exigidas por el fabricante serán cumplidas y acreditadas ante la supervisión, de modo que la garantía no resulte condicionada o afectada por la intervención.

2. Garantía y responsabilidad por la instalación. El Consorcio garantiza la instalación física y eléctrica del variador (desmontaje del equipo averiado, montaje, conexionado, cableado e integración con el sistema existente del ascensor) por el mismo término de doce (12) meses, contados desde la fecha del acta de puesta en servicio. Cualquier falla atribuible a una instalación, conexión o intervención técnicamente inadecuada será atendida y corregida por el Consorcio sin costo adicional para la Entidad.

3. Programación, parametrización, configuración y calibración. Serán ejecutadas por personal técnico competente, conforme a las especificaciones del fabricante y a las características del ascensor Glarie, e incluyen: parametrización de los datos del motor (corriente, voltaje, frecuencia y velocidad

nominal); programación de paradas y pisos; configuración de lectura y posicionamiento del foso; configuración del encoder y sistema de realimentación; límites de recorrido; aceleración y desaceleración; velocidades de viaje y nivelación; ajuste de nivelación en cada piso; sensores e imanes de posicionamiento; parámetros de puertas y tiempos de operación; señales de entrada y salida; y verificación del sentido de giro. Los parámetros finales quedarán registrados y se entregarán a la supervisión.

4. Puesta en funcionamiento y pruebas. Antes de devolver el ascensor al servicio se realizarán pruebas de funcionamiento en recorrido completo (ascenso y descenso en todas las paradas), verificación de nivelación en cada piso, operación de puertas, respuesta del sistema, y comprobación de la inexistencia de alarmas, fallas o comportamientos anormales. Los resultados se documentarán en un protocolo de pruebas y registro fotográfico, que se entregarán a la supervisión como soporte de la puesta en funcionamiento.

6. Garantía integral de la intervención. La garantía asumida por el Consorcio no se limita a la entrega física del variador ni a la garantía comercial del fabricante: comprende el suministro, instalación, integración, configuración, programación, calibración, pruebas y puesta en servicio, por doce (12) meses contados desde la fecha del acta de puesta en servicio del ascensor, suscrita con la supervisión.

7. Exclusiones. La garantía asumida por el Consorcio cubre exclusivamente las fallas que, previo diagnóstico técnico documentado, tengan origen en las actividades de suministro, instalación, conexión, programación, parametrización, calibración y puesta en servicio ejecutadas por el Consorcio. Por la naturaleza del equipo intervenido (ascensor Glarie existente, con componentes, cableado, motor, encoder, tarjeta principal, sensores e instalaciones preexistentes cuya condición y antigüedad no son imputables al Consorcio), se establecen las siguientes exclusiones, que deberán sustentarse técnicamente en cada caso: (a) fallas o daños en componentes, partes o sistemas del ascensor distintos del variador suministrado e instalado (motor de tracción, freno, encoder, tarjeta principal de control, cableado y canalizaciones existentes, operador de puertas, sensores, imanes, cables de tracción, guías, cabina y contrapeso), o derivados de su desgaste, envejecimiento, deterioro previo o defectos preexistentes a la intervención; (b) fallas originadas en condiciones de la instalación eléctrica del edificio, tales como sobretensiones, subtensiones, caídas o cortes de energía, fluctuaciones de voltaje, desbalance de fases, ausencia o deficiencia de puesta a tierra, descargas atmosféricas o fallas de la acometida y de las protecciones a cargo de la Entidad; (c) fallas asociadas a condiciones ambientales o locativas del cuarto de máquinas, el gabinete y el foso, como ingreso o filtración de agua, humedad, inundación, oxidación, polvo, temperatura fuera de rango, plagas o infraestructura civil, de lo cual existe constancia en el informe técnico del 20/08/2026 (presencia de agua y oxidación en el foso), mientras la Entidad no las corrija; (d) intervenciones, ajustes, modificaciones de parámetros, reparaciones o mantenimientos efectuados por terceros no autorizados por el Consorcio, o la manipulación indebida del variador, del gabinete o de la parametrización; (e) uso inadecuado, sobrecarga por encima de la capacidad nominal del ascensor, actos de vandalismo, daños intencionales o por negligencia de usuarios o de personal de la Entidad, golpes, o uso del equipo fuera de las condiciones de diseño; (f) caso fortuito o fuerza mayor, tales como sismos, inundaciones, incendios, tormentas eléctricas, y hechos de terceros, siniestros u otros eventos externos ajenos al control del Consorcio; (g) defectos de fabricación o ensamble del variador, cuya

reposición corresponde al fabricante o proveedor conforme a su carta de garantía (con las limitaciones de esta: piezas de desgaste y transporte), caso en el cual el Consorcio gestionará la reclamación y atenderá la mano de obra de reinstalación y reprogramación de acuerdo con lo señalado en el numeral 5; (h) fallas posteriores a la suspensión o falta de mantenimiento preventivo del equipo por causas no imputables al Consorcio, o por incumplimiento de las recomendaciones técnicas que el Consorcio comunique por escrito a la supervisión y que no sean atendidas por la Entidad; y (i) el desgaste normal de consumibles y elementos sujetos a vida útil. Para la aplicación de cualquier exclusión, el Consorcio realizará un diagnóstico técnico documentado (hallazgos, mediciones, pruebas y registro fotográfico), lo comunicará por escrito a la supervisión y la invitará a verificarlo conjuntamente, de manera que la determinación sea objetiva y verificable. En todo caso, el Consorcio acepta que no se considerarán causales de exclusión las fallas que, previo análisis técnico, sean atribuibles a sus propias actividades de instalación, conexión, programación, configuración, calibración o puesta en servicio, y que la simple invocación de una exclusión no sustituye el diagnóstico técnico. Las fallas ocurridas por las causas aquí excluidas no se entenderán como incumplimiento del Consorcio y su atención podrá requerir una cotización o autorización adicional de la Entidad, sin perjuicio de que el Consorcio colabore con el diagnóstico y las recomendaciones para su solución.

8. Periodo de observación y seguimiento. El Consorcio acepta el periodo inicial de observación de ocho (8) días calendario, contados desde la puesta en funcionamiento, y atenderá oportunamente las novedades atribuibles a la intervención, conservando los registros de pruebas, verificaciones, ajustes o correcciones.

9. Soportes de entrega y recibo técnico. Finalizada la intervención se entregarán a la supervisión: identificación (referencia y serie) del variador instalado; ficha técnica y documentación del fabricante; certificado de calidad y garantía; registro de instalación; parámetros y configuración realizada; resultados de las pruebas; registro de puesta en funcionamiento; y certificación de correcto funcionamiento suscrita por el técnico responsable. Con la presente se anexan los soportes ya disponibles.

10. Constancia de responsabilidad del contratista. El Consorcio Infraestructura AS certifica expresamente que asume la responsabilidad por la correcta ejecución de las actividades de suministro, instalación, configuración, programación, calibración, pruebas y puesta en funcionamiento a su cargo, conforme a las especificaciones del fabricante, las condiciones del equipo existente y las obligaciones del Contrato No. 018 de 2026.

11. Garantías y amparos del Contrato No. 018 de 2026. El Consorcio reconoce que lo aquí certificado no sustituye ni limita las garantías contractuales, las obligaciones de calidad y correcto funcionamiento ni los amparos constituidos en las pólizas que respaldan el contrato, y que cualquier reclamación se analizará según la naturaleza y causa de la novedad para determinar si es atendida por el Consorcio, por el fabricante o proveedor, o mediante la póliza aplicable.

Adicionalmente, el Consorcio es consciente de que el ascensor permanece fuera de servicio desde el 10 de agosto de 2026 y de su impacto en la accesibilidad del Palacio de Justicia. Por ello, y una vez la supervisión verifique la suficiencia de la presente respuesta, solicitamos respetuosamente la autorización para proceder de manera prioritaria con la instalación y puesta en funcionamiento del

variador, la cual coordinaremos con la supervisión para fijar fecha y hora de las pruebas y del recibo técnico.

Quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente,



FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Representante Legal
Consorcio Infraestructura AS
NIT: 902.080.280-1

Florencia – Caquetá, jueves 15 de octubre de 2026

Ingeniero
FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Representante Legal
Consorcio Infraestructura AS
Nit. 900.208.028-1
Neiva Huila

Asunto: *Aval definitivo para el suministro, instalación y puesta en funcionamiento del variador de frecuencia del ascensor del Palacio de Justicia de Florencia – Contrato 018 de 2026".*

Respetado Ingeniero Fajardo:

En atención a la comunicación suscrita por usted, en calidad de representante legal del **CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS**, de fecha 14 de octubre de 2026, mediante la cual se da respuesta a los requerimientos formulados por esta supervisión respecto de las garantías y responsabilidades asociadas al suministro, instalación y puesta en funcionamiento del variador de frecuencia del ascensor del Palacio de Justicia de Florencia, me permito informar que, una vez revisadas las respuestas presentadas frente a los once (11) aspectos requeridos, esta supervisión encuentra satisfactorias las aclaraciones y los compromisos expuestos.

En consecuencia, se otorga el aval definitivo para proceder con el suministro, instalación, configuración, parametrización, calibración y puesta en funcionamiento del variador de frecuencia, de conformidad con las condiciones técnicas revisadas y con los compromisos de garantía y responsabilidad expresamente asumidos por el contratista en la comunicación antes referida.

Se precisa que el suministro y reemplazo del componente corresponden al ítem no previsto previamente avalado por esta supervisión, cuyo propósito es atender correctivamente la falla presentada en el ascensor, teniendo en cuenta que la oferta económica inicial contemplaba actividades de mantenimiento preventivo y atención de emergencias del equipo elevador del Palacio de Justicia de Florencia. Por consiguiente, el presente aval se circunscribe a la intervención aprobada y a las condiciones de garantía y responsabilidad aclaradas por el contratista, sin modificar las demás obligaciones contractuales.

Así mismo, se recuerda que el alcance del Contrato 018 de 2026 comprende actividades de mantenimiento preventivo del equipo elevador. En tal sentido, se solicita que, en el marco de la intervención, se ejecuten las actividades preventivas que técnicamente correspondan, incluyendo limpieza, lubricación, inspección de conexiones, verificación de componentes y demás procedimientos establecidos por el fabricante, según resulte aplicable, con el

propósito de contribuir al adecuado funcionamiento del ascensor y a la conservación de sus componentes.

De igual manera, se requiere al contratista verificar técnicamente las posibles causas que pudieron originar el daño del variador de frecuencia anteriormente instalado, así como identificar y atender los factores que puedan ocasionar nuevas fallas en dicho componente o en otros elementos asociados al funcionamiento del ascensor. Esta revisión deberá contemplar, según corresponda, las condiciones de alimentación eléctrica, posibles fluctuaciones de tensión, estado de las conexiones, sistemas de protección y demás condiciones eléctricas, mecánicas u operativas que puedan incidir en el funcionamiento del equipo. Las actividades de diagnóstico, mantenimiento y corrección que correspondan deberán desarrollarse dentro del alcance y las obligaciones del contrato, de acuerdo con los hallazgos técnicos identificados.

En caso de evidenciarse condiciones que puedan comprometer el funcionamiento, la seguridad o la vida útil del nuevo variador, estas deberán ser informadas oportunamente a la supervisión, mediante el respectivo reporte técnico, indicando los hallazgos, las medidas correctivas recomendadas y las acciones requeridas para su atención. Lo anterior tiene como finalidad que la intervención no se limite al reemplazo del componente averiado, sino que permita identificar posibles factores asociados a la falla y adoptar las medidas preventivas y correctivas que técnicamente correspondan, procurando evitar la repetición de daños y nuevas interrupciones del servicio.

Finalmente, se solicita coordinar con esta supervisión la fecha de intervención y adelantar las actividades en el menor tiempo posible. Una vez finalizados los trabajos, el contratista deberá entregar el informe técnico correspondiente, los resultados de las pruebas de funcionamiento, los soportes de configuración y puesta en servicio, los documentos de garantía aplicables, en cumplimiento de los compromisos asumidos en su comunicación del 14 de octubre de 2026 y demás que se consideren necesarios.

Lo anterior, teniendo en cuenta la importancia de restablecer el funcionamiento del ascensor y garantizar condiciones adecuadas de movilidad y accesibilidad para los servidores judiciales y usuarios que concurren al Palacio de Justicia “Gerardo Cortés Castañeda” de la ciudad de Florencia – Caquetá.

Cordialmente,

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Supervisora del Contrato No. 018 de 2026
Profesional Universitario G-9

CAFLO26-1103
Florencia, 10 de septiembre de 2026

Ingeniero
FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Representante Legal
Consorcio Infraestructura AS
Nit. 900.208.028-1
Neiva Huila

Asunto: *Aprobación fichas técnicas – Sistema de impermeabilización de las sedes judiciales de Florencia.*

Respetado Ingeniero Fajardo:

De manera atenta, me permito informar que, una vez revisadas las fichas técnicas correspondientes a la membrana impermeabilizante y demás productos propuestos para la ejecución de las actividades de impermeabilización en el Palacio de Justicia y la sede de los Tribunales de Florencia, y con fundamento en el concepto técnico emitido por el profesional que presta apoyo especializado a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Neiva, se considera procedente otorgar aprobación técnica a los productos propuestos para su eventual utilización en el marco del Contrato No. 018 de 2026.

De acuerdo con la información técnica suministrada por el contratista y los fabricantes de los productos, estos presentan características favorables en cuanto a sus propiedades físicas, mecánicas y químicas, así como una vida útil estimada superior a veinte (20) años, condiciones que, en principio, resultan acordes con las necesidades de protección, impermeabilización y durabilidad requeridas para las cubiertas y superficies objeto de intervención.

En consecuencia, se aceptan las fichas técnicas presentadas como requisito previo para el desarrollo de las actividades contractuales. En tal sentido, se solicita al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS adelantar las gestiones necesarias para la programación y ejecución de la visita técnica a las sedes objeto de intervención, con el propósito de verificar en sitio las condiciones reales de cada inmueble, identificar las patologías existentes, determinar los procedimientos constructivos aplicables, establecer las cantidades efectivamente requeridas y definir las actividades necesarias para garantizar una adecuada intervención.

Con fundamento en la visita y las verificaciones realizadas, el contratista deberá remitir a la supervisión del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de la presente comunicación, las correspondientes cotizaciones, análisis técnicos, especificaciones complementarias y demás soportes requeridos para su revisión y trámite por parte de la Entidad.

La presente aprobación se otorga exclusivamente respecto de las fichas técnicas y documentación técnica allegada para revisión, y no constituye aceptación definitiva de diseños, cantidades de obra, metodologías constructivas, rendimientos, valores económicos, cronogramas, garantías ni demás aspectos que deban ser evaluados con posterioridad en desarrollo de la ejecución contractual.

De igual forma, esta aprobación no exime al contratista de su obligación de efectuar las verificaciones técnicas correspondientes en campo ni de asumir la responsabilidad integral sobre la calidad, idoneidad, compatibilidad, desempeño y correcta aplicación de los materiales y procedimientos que finalmente emplee. En consecuencia, será responsabilidad exclusiva del contratista garantizar que los productos propuestos sean compatibles con las condiciones particulares de las superficies a intervenir, que cumplan con las especificaciones técnicas exigidas por los fabricantes, las normas técnicas aplicables y las condiciones de calidad requeridas para la adecuada ejecución de las actividades contratadas.

Se precisa igualmente que las características técnicas, propiedades físicas y químicas, rendimientos, garantías y vida útil de los productos corresponden a la información suministrada por los fabricantes y presentada por el contratista, razón por la cual la Entidad no certifica ni garantiza dichas condiciones, las cuales deberán ser respaldadas y asumidas por el contratista y sus proveedores.

Así mismo, la aprobación aquí otorgada no limita ni restringe las facultades de supervisión, seguimiento, inspección y control de la Entidad durante la ejecución contractual, ni releva al contratista de atender las observaciones, requerimientos o ajustes técnicos que puedan surgir con ocasión de las visitas de verificación, revisiones de obra o actividades de seguimiento realizadas por la supervisión del contrato.

Agradecemos adelantar las actuaciones correspondientes y remitir oportunamente la información requerida para continuar con el trámite respectivo.

Cordialmente,

DELIO ANDRES ARTUNDUAGA LOSADA
Director Administrativo (AF)

MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Supervisora Contrato No. 018 de 2026
Profesional Universitario

DAAL/MECS/

Florencia – Caquetá, martes 5 de octubre de 2026

Ingeniero
FERNANDO DANIEL FAJARDO NÚÑEZ
Representante Legal
Consorcio Infraestructura AS
Nit. 900.208.028-1
Neiva Huila

Asunto: *Aprobación definitiva ficha técnica – Sistema de impermeabilización de las sedes judiciales de Florencia.*

Respetado Ingeniero Fajardo:

En atención a la documentación técnica y económica presentada por ustedes, en calidad de contratista, para la ejecución de las actividades de impermeabilización en las sedes judiciales del Palacio de Justicia y de los Tribunales Administrativos ubicadas en esta ciudad, y una vez revisadas por esta supervisión las cotizaciones, justificación y demás soportes correspondientes al ítem no previsto de suministro e instalación de membrana en PVC, se comunica la aprobación definitiva de la ficha técnica del sistema de impermeabilización propuesto.

Lo anterior, teniendo en cuenta que la ficha técnica inicialmente presentada por el contratista fue objeto de revisión y aval por parte de esta supervisión mediante oficio CAFLO26-1103 del 10 de septiembre de 2026, dejando como condición la posterior presentación, entre otros documentos, de la respectiva cotización y soportes técnicos requeridos para continuar con el análisis y trámite correspondiente. Dichos documentos fueron allegados por el contratista el 23 de septiembre de 2026 y han sido objeto de revisión y análisis por parte de esta supervisión.

En ese sentido, y para efectos del trámite de la actividad propuesta, se deja constancia de que, entre las cotizaciones y que son objeto de comparación, se tendrá como referencia la correspondiente al menor valor, de conformidad con los soportes que reposan y harán parte del respectivo trámite de justificación del ítem no previsto.

En consecuencia, se imparte la aprobación técnica para continuar con las gestiones necesarias relacionadas con el suministro e instalación del sistema de impermeabilización con membrana de PVC marca SIKA, referencia SikaPlan 12 G CO, o similar que cumpla con las mismas o superiores características técnicas, resistente a los rayos UV y demás condiciones, especificaciones y requerimientos establecidos en la ficha técnica previamente presentada y avalada, así como en la cotización y demás documentos técnicos allegados.

Se precisa que el contratista deberá garantizar que los materiales que sean suministrados y las actividades de instalación que eventualmente se ejecuten correspondan estrictamente a las especificaciones técnicas aprobadas, a las recomendaciones del fabricante y a las

condiciones particulares de las superficies objeto de intervención. Asimismo, deberá garantizar la correcta ejecución de los trabajos y responder por la calidad, estabilidad y adecuado funcionamiento del sistema instalado.

De igual manera, cualquier falla, defecto, deterioro, filtración o inconveniente que se presente con ocasión del suministro, instalación o funcionamiento del sistema de impermeabilización deberá ser atendido por el contratista dentro del menor término posible y en el marco de la garantía correspondiente, sin perjuicio de las demás obligaciones contractuales y legales que le sean aplicables.

Por lo anterior, se solicita al CONSORCIO INFRAESTRUCTURA AS adelantar, en el menor tiempo posible, las actuaciones preparatorias necesarias para la programación de las actividades y la ejecución del sistema de impermeabilización.

Finalmente, se deja expresa constancia de que, como parte del trámite correspondiente, se adelantarán y formalizarán los documentos técnicos, administrativos y económicos relacionados con la justificación, aprobación e incorporación del ítem no previsto, incluyendo las respectivas cotizaciones, justificación del item no previsto y demás soportes que correspondan, los cuales harán parte integral del expediente contractual.

La presente comunicación da continuidad al trámite de aprobación técnica previamente iniciado y constituye la conformidad de esta supervisión respecto de la solución técnica propuesta y de la ficha técnica presentada, sin que ello implique, por sí mismo, la modificación del contrato, la autorización de un mayor valor, ni la ejecución o reconocimiento económico del ítem no previsto, aspectos que estarán sujetos al cumplimiento de las formalidades y procedimientos contractuales correspondientes.

Cordialmente,



MARTA EDELMIRA CASTRO SIERRA
Supervisora del Contrato No. 018 de 2026
Profesional Universitario G-9
