SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com

Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

Bogotá 28 de noviembre de 2025

Señores.
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Grupo de mantenimiento y construcciones
Atn: Ing Luis Guillermo Quintero
Supervisor contrato de obra No. 096 de 2025
Ing. Javier Agudelo
Apoyo técnico al supervisor del contrato

CONTRATO DE OBRA NRO. 096 DE 2025 FRR CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA LA REGISTRADURÍA MUNICIPAL DE RIOSUCIO.

ASUNTO. INFORME DE EJECUCIÓN 100%

Cordial saludo.

En cumplimiento del objeto contractual y conforme al cronograma establecido, me permito presentar el Informe de ejecución de acuerdo al avance parcial del 90% de obra ejecutada en el marco del contrato mencionado, correspondiente a la intervención realizada en la registraduría municipal de Riosucio, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, los protocolos de seguridad y salud en el trabajo, y la calidad requerida por el contratante.

1. **RESUMEN Y COSTOS DEL CONTRATO:**


RESUMEN Y COSTOS CONTRATO 096 DE 2025 FRR			
RESUMEN DEL PRESUPUESTO	**COSTO DIRECTO**	**AIU - IVA**	**TOTAL**
CONTRATO INICIAL - ACTIVIDADES TODO COSTO (incluido AIU)	$ 98.110.500,0	$ 28.589.400,0	$ 126.699.900,0
VALOR DEL CONTRATO			**$ 126.699.900,0**
CORTE 1	$ 49.915.715	$ 14.545.439	$ 64.461.154
CORTE 2	$ 46.460.020	$ 13.538.449	$ 59.998.469
SALDO POR FACTURAR			$ 2.240.276

2. PERSONAL QUE LABORA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

CARGO	NOMBRE	CEDULA
INGENIERO RESIDENTE	RICARDO TORRES GONZÁLEZ	1094964730
PERSONAL EN OBRA	JAIME EDUARDO OLARTE	17417589
	CRISTIAN ANDRÉS SALAZAR	1005179591
	YAIDER PACHECO CAMPO	1048555585

3. **EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:** el desarrollo de la obra ha requerido equipo menor:

- Martillo demoledor
- Cortadora de cerámica
- Taladro
- Escaleras
- Palas
- Destornillador
- Martillo
- Alicate
- Flexómetro
- Carretilla
- Palustre
- Llana



4. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

El proyecto presenta un avance superior al 100% de ejecución, se ha cumplido a cabalidad con todas las especificaciones técnicas establecidas. Una vez finalizadas las labores de obra negra, se llevaron a cabo los respectivos remates de obra gris y, de manera consecutiva, se ha trabajado intensamente en los acabados como estucos, pinturas y enchapes. Adicionalmente, se han ejecutado las instalaciones de carpintería metálica, carpintería en madera, mobiliario consolidando así el progreso significativo alcanzado hasta la fecha.

SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com

Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

5. ACTIVIDADES EJECUTADAS ACTA 2 (PRESUPUESTO)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 (Segundo corte del 100%)		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
1.01	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**							
01.01.01	DEMOLICIÓN PAÑETES, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m²	12,00	$ 18.500	$ 222.000	8,00	148.000,00	14%
01.01.02	DESMONTE DE LÁMPARAS INCRUSTADAS Y/O SOBREPUESTAS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION FINAL SC	un	25,00	$ 15.000	$ 375.000		-	0%
01.01.03	INSPECCIÓN, REVISIÓN Y LIMPIEZA DE SIFONES Y RED HIDROSANITARIA	m	45,00	$ 23.000	$ 1.035.000		-	0%
01.01.04	DEMOLICIÓN DE MESÓN	m	1,00	$ 45.000	$ 45.000		-	0%
01.01.05	DESMONTE APARATOS SANITARIOS (DISCAPACITADOS)	un	1,00	$ 19.000	$ 19.000		-	0%
01.01.06	DESMONTE MARCOS Y PUERTAS	un	3,00	$ 14.000	$ 42.000		-	0%
01.01.07	DEMOLICIÓN MUROS 0.15M - 0.25 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO SC	m²	18,00	$ 15.000	$ 270.000		-	0%
01.01.08	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE	m²	18,00	$ 17.000	$ 306.000	8,17	138.890,00	30%
01.01.09	DEMOLICIÓN PISO CERÁMICO	m²	145,00	$ 17.000	$ 2.465.000		-	0%
01.01.10	DESMONTE Y REINSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL	un	1,00	$ 185.000	$ 185.000	1,00	185.000,00	100%
01.01.11	DESMONTE Y RETIRO POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE GRIFERÍA.	un	1,00	$ 19.000	$ 19.000		-	0%
01.01.12	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN MUROS DE MAMPOSTERIA <30 CM. INCLUYE CORTE CON DISCO	ML	55,00	$ 8.000	$ 440.000		-	0%
2	**MAMPOSTERIA**							
2.01	**MAMPOSTERIA**							
02.01.01	MURO DRYWALL de ESPESOR 1/2" DOBLE CARA E=12CM	m²	44,00	$ 77.000	$ 3.388.000	18,82	1.449.140,00	100%
02.01.02	DINTEL EN CONCRETO 0.15x0.20	m	1,50	$ 43.000	$ 64.500	3,60	154.800,00	100%
3	**CIELORRASOS**							
3.01	**CIELORRASOS**							
03.01.01	CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2	m²	154,00	$ 80.000	$ 12.320.000	2,00	160.000,00	1%

SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com

Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 (Segundo corte del 100%)		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%
4	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**							
4.01	**ENCHAPES Y ACCESORIOS**							
04.01.01	ESPEJO CRISTAL 4MM	m²	3,00	$ 100.000	$ 300.000	1,80	180.000,00	100%
04.01.02	CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM	m²	16,00	$ 61.600	$ 985.600	30,20	1.860.320,00	100%
04.01.03	ACCESORIOS PARA BAÑO (5UN)	un	3,00	$ 150.000	$ 450.000	3,00	450.000,00	100%
04.01.04	TAPAS REGISTRO 15CMX15CM	un	3,00	$ 10.000	$ 30.000	1,00	10.000,00	100%
5	**RED SANITARIA**							
5.01	**RED SANITARIA**							
05.01.01	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2	un	4,00	$ 70.000	$ 280.000		-	0%
05.01.02	TUBERÍA PVCS 2	m	35,00	$ 25.000	$ 875.000		-	0%
05.01.03	RED SANITARIA PVC 4"	m	9,00	$ 60.000	$ 540.000	6,00	360.000,00	0%
05.01.04	CONEXION A RED EXISTENTE AGUAS LLUVIAS PVC A.LL. 4"	glb	1,00	$ 700.000	$ 700.000		-	0%
05.01.05	CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM	un	2,00	$ 480.000	$ 960.000		-	0%
05.01.06	SALIDA SANITARIA INODORO 4	un	2,00	$ 110.000	$ 220.000	3,00	330.000,00	100%
05.01.07	SUMINISTRO E INST. DE REJILLAS PARA SIFÓN DE PISO 2 Y 3" EN PVC	un	3,00	$ 15.000	$ 45.000	4,00	60.000,00	100%
6	**RED ELÉCTRICA**							
6.01	**RED ELÉCTRICA**							
06.01.01	REVISION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS ELÉCTRICOS EXISTENTES. (INCLUYE TOMAS, INTERRUPTORES, PLAFONES, CABLEADO).	un	18,00	$ 24.000	$ 432.000		-	0%
06.01.02	SUMINISTRO E INST. LAMPARA TIPO APLIQUE LED DIRIGIBLE 20w	un	6,00	$ 100.000	$ 600.000	3,00	300.000,00	100%
06.01.03	INST. LAMPARA LED REDONDA (INCRUSTAR O SOBREPONER) 24W	un	4,00	$ 59.000	$ 236.000	4,00	236.000,00	100%
06.01.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA 60X60 LED	un	15,00	$ 115.000	$ 1.725.000		-	0%
06.01.05	SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	un	15,00	$ 270.000	$ 4.050.000		-	0%
06.01.06	SALIDA LUMINARIA EN TECHO PVC	un	12,00	$ 160.000	$ 1.920.000		-	0%

SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com

Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 (Segundo corte del 100%)		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%
06.01.07	SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO PVC	un	4,00	$ 110.000	$ 440.000			0%
06.01.08	ALIMENTADOR DE CIRCUITO ALAMBRE CU 3X12+1X12AWG PVC Ø3/4	m	5,00	$ 77.000	$ 385.000	35,00	2.695.000,00	60%
06.01.09	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE PVC	un	6,00	$ 140.000	$ 840.000		-	0%
06.01.10	SALIDA TOMA CORRIENTE BIFÁSICO EN MURO PVC	un	8,00	$ 170.000	$ 1.360.000		-	0%
06.01.11	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN CANALETA	un	18,00	$ 85.000	$ 1.530.000	11,00	935.000,00	100%
06.01.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DE 15X15 CM CON TAPA, INCLUYE CHAZOS, PERFORACIONES	un	2,00	$ 80.000	$ 160.000		-	0%
7	**CARPINTERÍA MADERA**							
7,01	**CARPINTERÍA MADERA**							
07.01.01	MUEBLE COCINA SUPERIOR E INFERIOR	glb	1,00	$ 1.670.000	$ 1.670.000	1,00	1.670.000,00	100%
07.01.02	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	un	5,00	$ 550.000	$ 2.750.000	6,00	3.300.000,00	100%
07.01.03	MUEBLE TIPO LINOS	m²	1,00	$ 267.000	$ 267.000	1,00	267.000,00	100%
8	**CARPINTERÍA METÁLICA**							
8,01	**CARPINTERÍA METÁLICA**							
08.01.01	MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL EXISTENTE (incluye , manijas, silicona y empaquetadura Ajuste de apertura y cambio de vidrio)	un	1,00	$ 520.000	$ 520.000	1,00	520.000,00	100%
08.01.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA FIJA Alto: 2.00 m Ancho: 2,06 m. (Bodega)	un	1,00	$ 460.000	$ 460.000	1,00	460.000,00	100%
9	**PINTURAS**							
9,01	**PINTURAS**							
9.01.01	PINTURA 3 MANOS DE PINTURA PARA CIELO RASOS (2 MANOS DE VINILO TIPO 2)	m²	154,00	$ 20.000	$ 3.080.000	32,50	650.000,00	22%
9.01.02	RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES	m²	10,00	$ 28.000	$ 280.000	13,90	389.200,00	100%
9.01.03	RESANE, LIJADA Y PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, IGUAL O SUPEROR A VINILTEX TIPO 1	m²	235,60	$ 24.000	$ 5.654.400	251,37	6.032.880,00	79%
9.01.04	ESTUCO INTERIOR	m²	150,00	$ 17.000	$ 2.550.000	67,11	1.140.870,00	71%

SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com

Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 (Segundo corte del 100%)		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%
10	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**							
10,01	**CONCRETOS - MORTEROS Y PAÑETES**							
10.01.01	FILOS Y DILATACIONES	m	20,00	$ 10.000	$ 200.000	31,57	315.700,00	100%
10.01.02	PAÑETE LISO MUROS 1:3 E=2CMS	m²	120,00	$ 34.000	$ 4.080.000	8,00	272.000,00	10%
11	**CAPITULO ADICIONALES**							
11,01	**SUBCAPITULO ADICIONALES**							
11.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARCHIVO RODANTE MECÁNICO	un	1,00	$ 9.700.000	$ 9.700.000	1,00	9.700.000,00	100%
12	**OTROS**							
12,01	**HONORARIOS**							
12.01.01	ASEO GENERAL	glb	1,00	$ 780.000	$ 780.000	1,00	780.000,00	100%
13	**RED HIDRÁULICA**							
13,01	**RED HIDRÁULICA**							
13.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE PASO DIRECTO RED WHITE.	un	2,00	$ 89.000	$ 178.000	-		0%
13.01.02	PUNTO A.F. 1/2" INCRUSTADO. INCLUYE ACCESORIOS REGATA Y RESANE	un	3,00	$ 49.000	$ 147.000	-		0%
14	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**							
14,01	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APARATOS**							
14.01.01	COMBO SANITARIO SMART	un	2,00	$ 1.300.000	$ 2.600.000	2,00	2.600.000,00	100%
14.01.02	ASIENTO PARA SANITARIO DIFERENTES MODELOS	un	3,00	$ 190.000	$ 570.000	-		0%
14.01.03	MANTENIMIENTO LAVAMANOS INCLUYE ACCESORIOS	un	2,00	$ 250.000	$ 500.000	-		0%
14.01.04	MANTENIMIENTO SANITARIO DIFERENTES MODELOS INCLUYE ACCESORIOS	un	2,00	$ 150.000	$ 300.000	-		0%
14.01.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO COMPLETO DE DISCAPACITADOS	un	1,00	$ 4.700.000	$ 4.700.000	1,00	4.700.000,00	100%
15	**PISOS**							
15,01	**PISOS**							
15.01.01	ALISTADO DE PISO 4CM	m²	154,00	$ 29.000	$ 4.466.000	6,00	174.000,00	4%
15.01.02	GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM	m	77,00	$ 15.000	$ 1.155.000	105,51	1.582.650,00	90%

SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com


Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CONDICIONES CONTRACTUALES			ACTA DE AVANCE DE OBRA No. 2 (Segundo corte del 100%)		
			CANT.	VR./UNITARIO	VR./TOTAL	CANT.	VR./TOTAL	%
15.01.03	PISO CERÁMICA 55.2X55.2CM BAÑOS	m²	12,00	$ 67.000	$ 804.000	7,35	492.450,00	100%
15.01.04	PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM	m²	145,00	$ 72.000	$ 10.440.000	24,46	1.761.120,00	16%
~~DIRECTO~~					~~98.110.500~~		~~46.460.020,00~~	
	ADMINISTRACIÓN	20%			$ 19.622.100		$ 9.292.004,00	
	IMPREVISTOS	2%			$ 1.962.210		$ 929.200,00	
	UTILIDAD	6%			$ 5.886.630		$ 2.787.601,00	
	IVA	19%			$ 1.118.460		$ 529.644,00	
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES					**$ 126.699.900**		**$ 59.998.469,00**	47,35%

6. REGISTRO FOTOGRAFICO

DEMOLICIÓN DE ENCHAPE



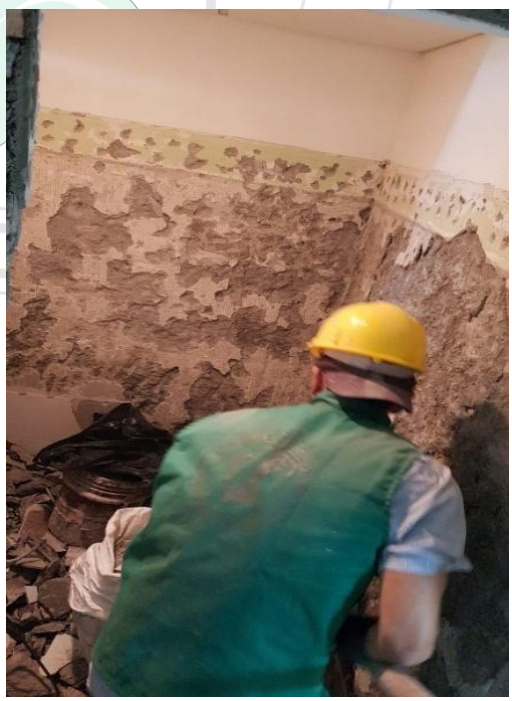

SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com

Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

DESMONTE Y REINSTALACION DE AVISO INSTITUCIONAL





MURO DRYWALL de ESPESOR 1/2" DOBLE CARA E=12CM






SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com


Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

DINTEL EN CONCRETO 0.15x0.20



- **CIELORRASO PLANO DRYWALL 1/2**

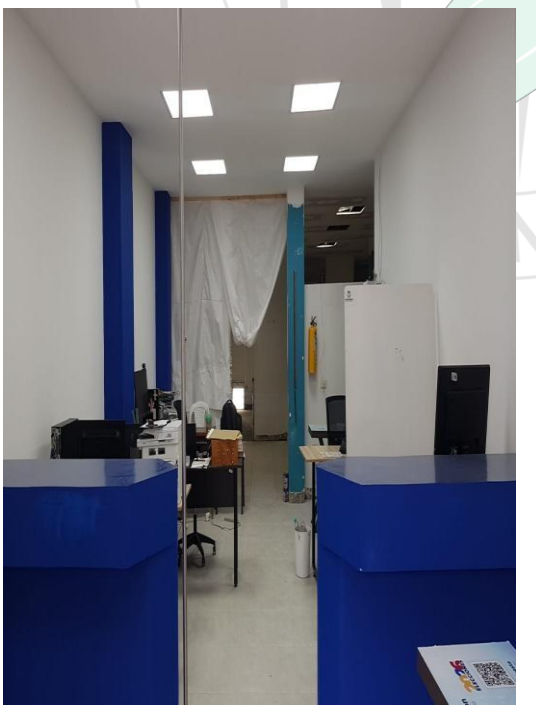

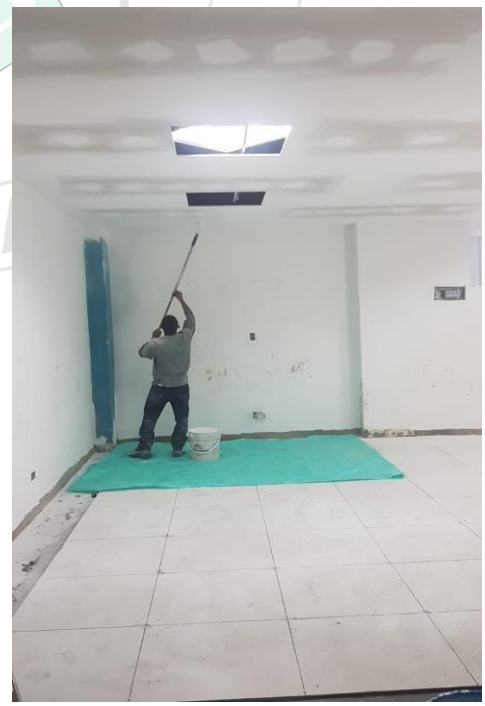

SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com

Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

- **ESPEJO CRISTAL 4MM**





- **CERÁMICA FORMATO 30CMX60CM:**



- **ACCESORIOS PARA BAÑO (5UN):**



- **TAPAS REGISTRO 15CMX15CM**



- **RED SANITARIA PVC 4":**



- **SALIDA SANITARIA INODORO 4:**



SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com


Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

- **SUMINISTRO E INST. DE REJILLAS PARA SIFÓN DE PISO 2 Y 3" EN PVC**





- **INST. LAMPARA LED REDONDA (INCRUSTAR O SOBREPONER) 24W:**

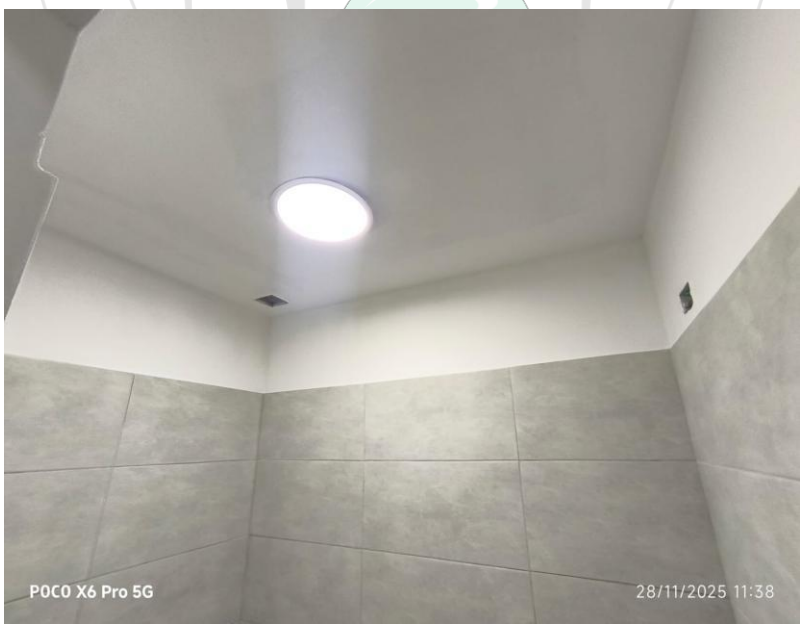


SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com

Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

- **SUMINISTRO E INST. LAMPARA TIPO APLIQUE LED DIRIGIBLE 20w**



- **ALIMENTADOR DE CIRCUITO ALAMBRE CU 3X12+1X12AWG PVC Ø3/4:**

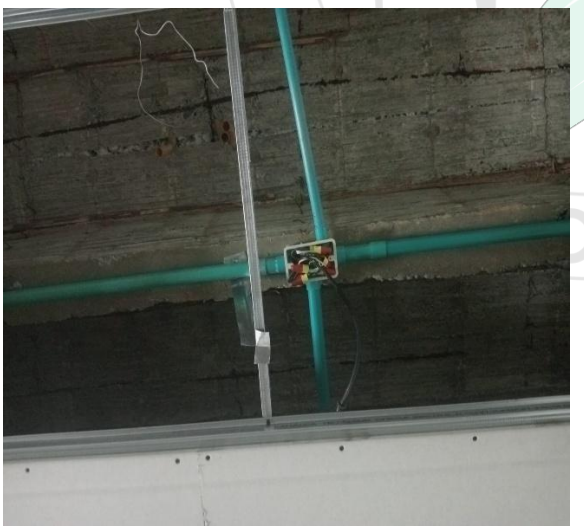




- **SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE EN CANALETA**





- **MUEBLE COCINA SUPERIOR E INFERIOR:**

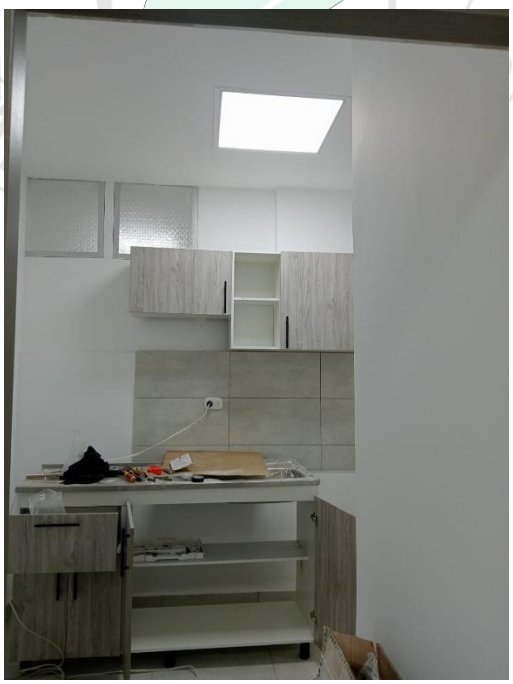

- **PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M:**




- **MUEBLE TIPO LINOS:**



SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com

Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

- **MANTENIMIENTO PUERTA PRINCIPAL EXISTENTE (incluye , manijas, silicona y empaquetadura Ajuste de apertura y cambio de vidrio)**

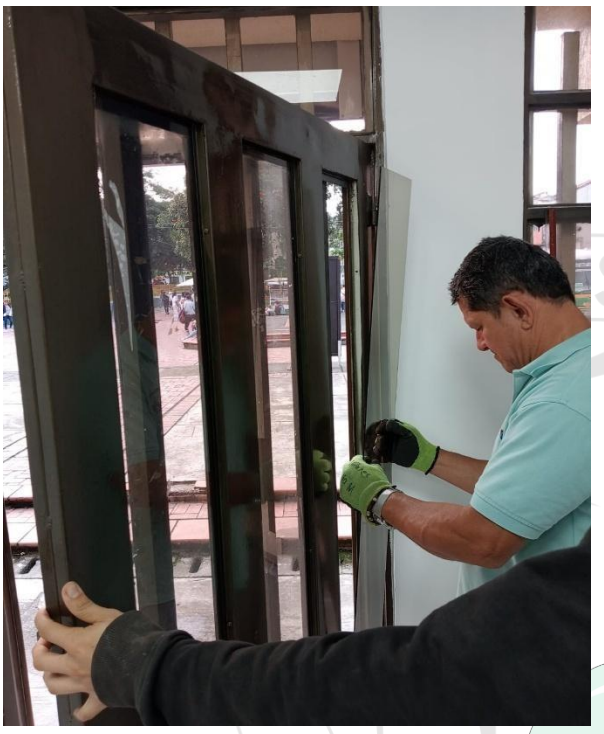




- **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍA FIJA Alto: 2.00 m Ancho: 2,06 m. (Bodega):**



- **PINTURA 3 MANOS DE PINTURA PARA CIELO RASOS (2 MANOS DE VINILO TIPO 2):**

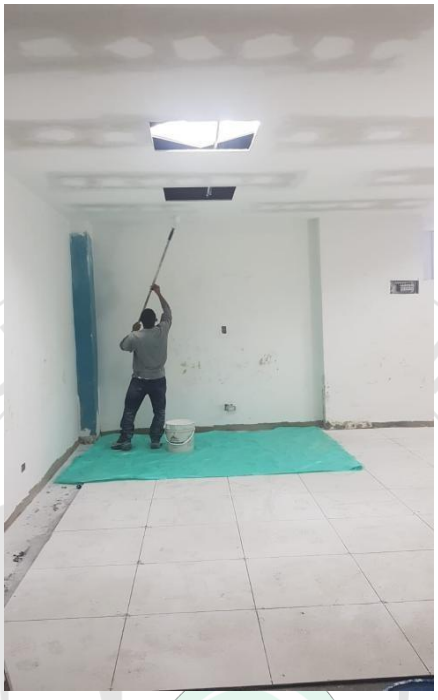

- **RESANE, LIJADA Y PINTURA TIPO KORAZA, 3 MANOS PARA EXTERIORES**





SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com

Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

- **RESANE, LIJADA Y PINTURA VINILO 3 MANOS SOBRE MUROS INTERIORES, IGUAL O SUPEROR A VINILTEX TIPO:**





- **ESTUCO INTERIOR:**




- **FILOS Y DILATACIONES:**





- **ASEO GENERAL**

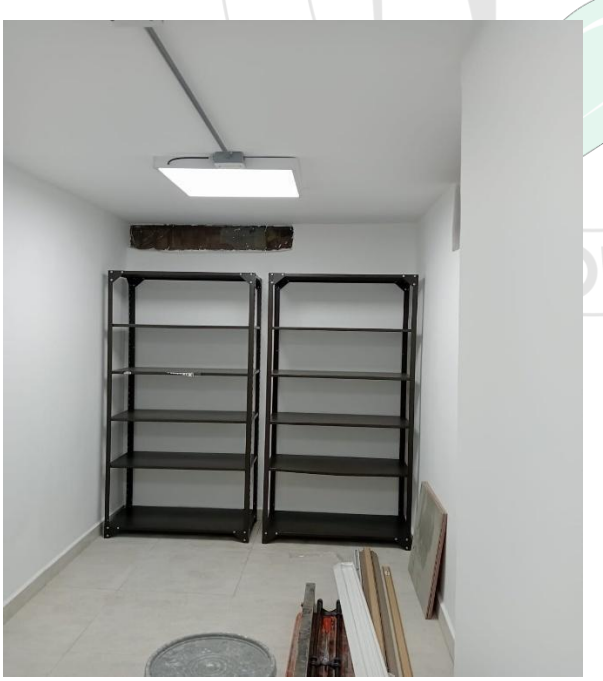



SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com

Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

- **COMBO SANITARIO SMART:**





- **SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO COMPLETO DE DISCAPACITADOS:**





- **GUARDAESCOBA CERÁMICA 9X60CM**




PISO CERÁMICA 55.2X55.2CM BAÑOS



SERVIINSTITUCIONALES SAS
SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
NIT. 900.422.291-2
Calle 114 No. 50 - 51 Bogotá - Tel. 926 13 08 - 312 509 69 81
E-mail serviinstitucionales.ing@gmail.com

Obras de ingeniería civil, construcción, reforma y reacondicionamiento de edificaciones, oficinas, bodegas e inmuebles en general, trabajos de pintura y acabados, construcción y mantenimiento de cerramientos perimetrales, servicio de limpieza y lavado de fachadas, impermeabilización y mantenimiento de cubiertas, mantenimiento de zonas verdes, trabajos de jardinería y forestales, suministros en general.

PISO CERÁMICA 45.8X45.8CM:

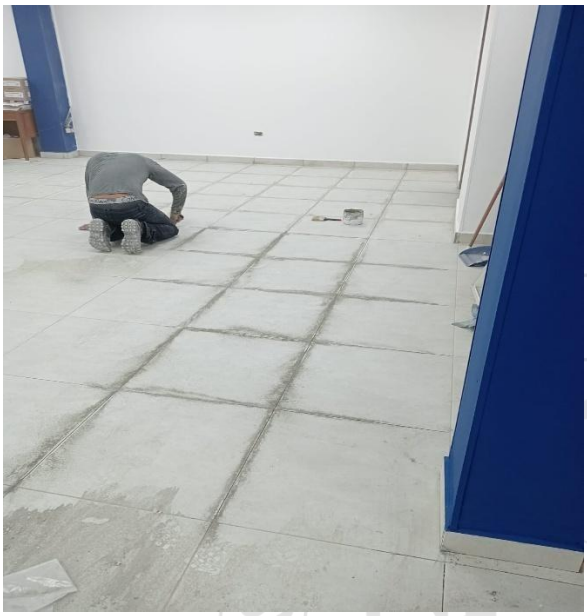



Ricardo Torres González
C.C. 1.094.964.730 de Armenia
Residente de obra

Luz Miryam Rodriguez Vega
C.C. 39.658.729 de Bogota
Representante Legal

SERVICIOS Y SUMINISTROS INSTITUCIONALES SAS
Nit. 900.422.291-2
