Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 1 de 3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	26 / 10 / 2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD / MM / AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No. 449 DE 2026

INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL

Mes Número: 3 del : 21/09/2026 al 20/10/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 90 días

CONTRATO No. 449 (Número de contrato) DE 15 de julio del 2026 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 489.805.084,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA TRANSPORTE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S

INTERVENTOR N/A

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN N/A

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programado (%)	7,69%	92,31%
Valor programado:	37.677.314,15	452.127.769,85

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra ejecutada (%)	0,00%	90,12%
Valor ejecutado:	-	441.412.341,70

CONTRATO DE OBRA No.:	449 de 2026
Contrato No.	449 de 2026
Valor Inicial:	$ 489.805.084,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 489.805.084,00
Plazo Inicial:	Tres(03) meses
Fecha de Iniciación:	21 de julio de 2026
Fecha de Terminación inicial	20 de octubre de 2026
Estado Actual:	Suspendido

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
SEGUROS MUNDIAL	COQ-100009761	CUMPLIMIENTO	$ 48.970.508,40	21/07/2026	26/04/2027
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 244.902.542,00	21/07/2026	26/04/2027
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 24.490.254,20	21/07/2026	23/10/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 48.970.508,40	21/07/2026	21/04/2027
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 48.970.508,40	21/07/2026	21/07/2027
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 146.941.525,20	21/07/2026	21/07/2027
	COQ-100002427	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	21/07/2026	26/10/2026

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	97.961.016,80	244.902.542,00
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de combustible diésel y compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria)	146.941.525,20	
TOTAL		$ 244.902.542,00	$ 244.902.542,00

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO — SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
N/A	N/A	N/A

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN — SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
N/A	N/A	N/A

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR — SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES — SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
			N/A

4.5 SANCIONES — SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES — SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	01/07/2026
2	ANTICIPO	28/07/2026
3	ACTA PARCIAL 1	25/09/2026

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 21 (Día) DE septiembre (Mes) DE 2026 (Año)

AL 20 DE octubre DE 2026

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 489.805.084,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			$ 244.902.542,00
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 441.412.341,70	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 489.805.084,00**	**$ 441.412.341,70**	**$ 244.902.542,00**
VALOR SALDO POR EJECUTAR			**$ 48.392.742,30**

Alcaldía de Aguazul	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	3	de	3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	26	10		2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM		AA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	449	DE	2026

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	90,12%
Avance financiero ($):	$ 441.412.341,70

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 21/09/2026 al 20/10/2026,se ejecutaron actividades de mantenimiento vial en la vereda Bella Vista sector Agrotinige, donde se ejecutaron 5,00 km de los 5.00 km programados y en la vereda Bella Vista sector corral comunitario, se ejecutaron 1,50 km de mantenimiento de los 2.50 km programados. El contrato de obra No. 449 se suspendió el 15/10/2026, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones por parte del contratista: 1.) Que durante la segunda semana del mes de octubre del presente año se ha presentado precipitaciones constantes de lluvias en el municipio de Aguazul, Casanare, ocasionando el aumento del nivel de los ríos dificultando la extracción de material necesario para realizar los mantenimientos proyectados en las veredas Bella Vista sector corral comunitario y Valle Verde lo cual ha generado condiciones desfavorables para el desarrollo de las actividades previstas en el contrato de obra No. 449 del 15 de julio 2026. 2.) Que la ola invernal ha producido atascamiento de las volquetas por el nivel freático muy alto por causa de las lluvias. El plazo de suspension es a partir de los quince(15) días del mes de octubre de 2026 por un plazo de veinte (20) días calendario, o antes si las condiciones que justificaron la suspensión sean superadas.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

MANTENIMIENTO A LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BELLA VISTA SECTOR AGROTINIGE

Antes








Transporte de material con volquetas del municipio




Transporte de material con volquetas particulares

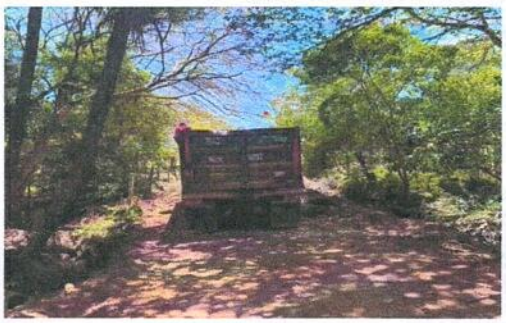Cuneteo y extendida de material



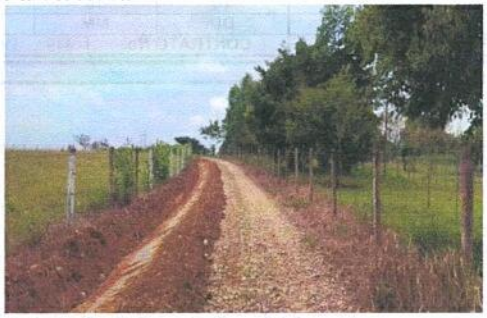

Riego y Vibro compactacion





El despues





AGROTINIGE


Transporte de material con volquetas del municipio





Transporte de material con volquetas particulares



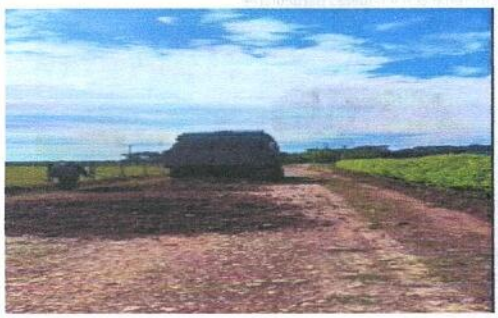

Cuneteo y extendida de material





Riego y Vibro compactacion






El despues





MANTENIMIENTO VIAL VEREDA BELLA VISTA SECTOR CORRAL COMUNITARIO

Antes

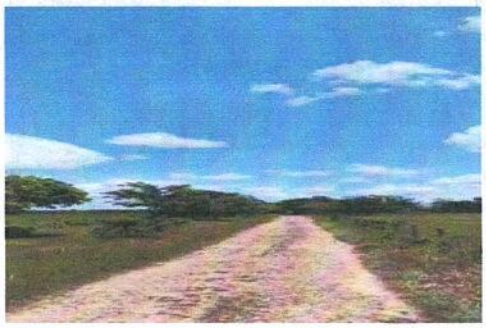



Transporte de material con volquetas del municipio





Transporte de material con volquetas particulares





Cuneteo y extendida de material






Vibro compactacion





El despues

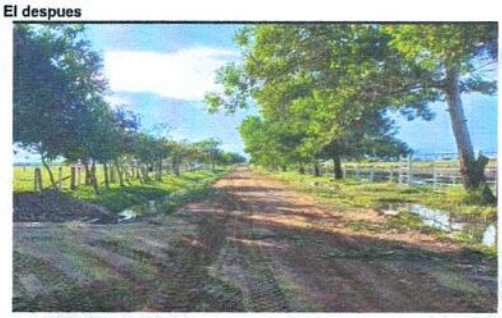



JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
Secretario de Infraestructura

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado SIA

Alcaldía de Aguazul

MUNICIPIO DE AGUAZUL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



RESUPUESTO EJECUTADO PERIODO DEL 23/09/2026 AL 30/10/2026

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

No.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				MANTENIMIENTO VIAL				
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO				
1	101		101	Conformación de la banca existente con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: Escarificar, perfilar, extender, cunetear, riego y compactación)	Km	6,50	$ 2.270.551,00	$ 14.758.582,00
2	102		102	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio TM6" con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: extender, riego y compactación)	M3	1.205,00	$ 6.771,00	$ 8.159.055,00
3	103		103	Remoción y cargue de derrumbes con maquinaria del municipio de Aguazul (incluye transporte y disposición final)	M3	0,00	$ 5.896,00	$ 0,00
4	104		104	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía pavimentada)	m³-km	16.103,00	$ 1.750,00	$ 28.180.250,00
5	105		105	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada)	m³-km	8.270,00	$ 1.983,00	$ 16.399.410,00
6	106		106	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada en montaña)	m³-km	0,00	$ 2.541,00	$ 0,00
7	107		107	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado con maquinaria municipio de Aguazul	Km	172,00	$ 14.280,00	$ 2.456.160,00
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO Y PARTICULAR				
8	108		108	Excavación de cortes, canales y préstamo(acarreo a 1 km) con maquinaria municipio de Aguazul y maquinaria particular	M3	0,00	$ 14.405,00	$ 0,00
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA PARTICULAR				
9	109		109	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	m³-km	16.268,00	$ 3.089,00	$ 50.251.852,00
10	110		110	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	m³-km	8.435,00	$ 3.212,00	$ 27.093.220,00
							PRESUPUESTO EJECUTADO MANTENIMIENTO VIAL	**$ 147.298.529,00**
				MANTENIMIENTO MAQUINARIA				
				Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo maquinaria del municipio	Unidad	0	$ 99.805.084,00	$ 0,00
							PRESUPUESTO EJECUTADO MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA	**$ -**
							TOTAL	**$ 147.298.529,00**

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	28,50%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1,00%
NOTA 4: Se anexa el estudio de mercado, donde se establece las variables utilizadas en los APU para las actividades del capitulo de MANTENIMIENTO VIAL, como tambien, los insumos y actividades del capitulo de MANTENIMIENTO MAQAUINARIA.	**UTILIDAD**	**U=**	5,00%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	34,50%

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
PROFESIONAL CONTRATADO SIA

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de	3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	23	10		2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM		AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	449	DE	2026

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: SUSPENDIDO del : 16/10/2026 al 22/10/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 90 días

CONTRATO No. 449 (Número de contrato) DE 15 de julio del 2026 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 489.805.084,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA TRANSPORTE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S

INTERVENTOR N/A

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN N/A

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programado (%)	7,69%	92,31%
Valor programado:	37.677.314,15	452.127.769,85

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra ejecutada (%)	0,00%	90,12%
Valor ejecutado:	-	441.412.341,70

CONTRATO DE OBRA No.:	449 de 2026
Contrato No.	449 de 2026
Valor Inicial:	$ 489.805.084,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 489.805.084,00
Plazo Inicial:	Tres(03) meses
Fecha de Iniciación:	21 de julio de 2026
Fecha de Terminación inicial	20 de octubre de 2026
Estado Actual:	Suspendido

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	931 de 2024
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
SEGUROS MUNDIAL	COQ-100009761	CUMPLIMIENTO	$ 48.970.508,40	21/07/2026	26/04/2027
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 244.902.542,00	21/07/2026	26/04/2027
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 24.490.254,20	21/07/2026	23/10/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 48.970.508,40	21/07/2026	21/04/2027
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 48.970.508,40	21/07/2026	21/07/2027
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 146.941.525,20	21/07/2026	21/07/2027
	COQ-100002427	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	21/07/2026	26/10/2026

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 2 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	23	10	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	449	DE 2026

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	97.961.016,80	244.902.542,00
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de combustible diésel y compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria)	146.941.525,20	
TOTAL		$ 244.902.542,00	$ 244.902.542,00

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
N/A	N/A	N/A

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
N/A	N/A	N/A

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
			N/A

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	01/07/2026
2	ANTICIPO	28/07/2026
3	ACTA PARCIAL 1	25/09/2026

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 16 (Día) DE octubre (Mes) DE 2026 (Año)

AL 22 DE octubre DE 2026

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 489.805.084,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			$ 244.902.542,00
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 441.412.341,70	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 489.805.084,00**	**$ 441.412.341,70**	**$ 244.902.542,00**
VALOR SALDO POR EJECUTAR			**$ 48.392.742,30**

Alcaldía de Aguazul	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	3	de	3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	23	10		2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM		AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	449	DE	2026

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	90,12%
Avance financiero ($):	$ 441.412.341,70

7. OBSERVACIONES

El contrato de obra No. 449 se suspendió el 15/10/2026, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones por parte del contratista: 1.) Que durante la segunda semana del mes de octubre del presente año se ha presentado precipitaciones constantes de lluvias en el municipio de Aguazul, Casanare, ocasionando el aumento del nivel de los ríos dificultando la extracción de material necesario para realizar los mantenimientos proyectados en las veredas Bella Vista sector corral comunitario y Valle Verde lo cual ha generado condiciones desfavorables para el desarrollo de las actividades previstas en el contrato de obra No. 449 del 15 de julio 2026. 2.) Que la ola invernal ha producido atascamiento de las volquetas por el nivel freático muy alto por causa de las lluvias. El plazo de suspension es a partir de los quince(15) días del mes de octubre de 2026 por un plazo
de veinte (20) días calendario, o antes si las condiciones que justificaron la suspensión sean superadas.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

NO APLICA - CTO SUSPENDIDO

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado SIA

FORMATO MA-C-17

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de	3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	16	10		2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM		AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	449	DE	2026

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 12 del : 09/10/2026 al 15/10/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 83 días

CONTRATO No. 449 (Número de contrato) DE 15 de julio del 2026 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 489.805.084,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA TRANSPORTE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S

INTERVENTOR N/A

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN N/A

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programado (%)	7,69%	92,31%
Valor programado:	37.677.314,15	452.127.769,85

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra ejecutada (%)	7,90%	90,12%
Valor ejecutado:	38.696.747,00	441.417.337,54

CONTRATO DE OBRA No.:	449 de 2026
Contrato No.	449 de 2026
Valor Inicial:	$ 489.805.084,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 489.805.084,00
Plazo Inicial:	Tres(03) meses
Fecha de Iniciación:	21 de julio de 2026
Fecha de Terminación inicial	20 de octubre de 2026
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	931 de 2024
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
SEGUROS MUNDIAL	COQ-100009761	CUMPLIMIENTO	$ 48.970.508,40	21/07/2026	26/04/2027
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 244.902.542,00	21/07/2026	26/04/2027
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 24.490.254,20	21/07/2026	23/10/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 48.970.508,40	21/07/2026	21/04/2027
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 48.970.508,40	21/07/2026	21/07/2027
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 146.941.525,20	21/07/2026	21/07/2027
	COQ-100002427	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	21/07/2026	26/10/2026

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 2 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	16	10	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	449	DE 2026

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	97.961.016,80	244.902.542,00
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de combustible diésel y compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria)	146.941.525,20	
TOTAL		$ 244.902.542,00	$ 244.902.542,00

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
N/A	N/A	N/A

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
N/A	N/A	N/A

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
			N/A

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	01/07/2026
2	ANTICIPO	28/07/2026
3	ACTA PARCIAL 1	25/09/2026

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 09 (Día) DE octubre (Mes) DE 2026 (Año)

AL 15 DE octubre DE 2026

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 489.805.084,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			$ 244.902.542,00
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 441.417.337,54	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 489.805.084,00**	**$ 441.417.337,54**	**$ 244.902.542,00**
VALOR SALDO POR EJECUTAR			**$ 48.387.746,46**

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 3 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	16	10	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	449 DE	2026

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	90,12%
Avance financiero ($):	$ 441.417.337,54


7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 09/10/2026 al 15/10/2026, se ejecutaron actividades de mantenimiento vial en la vereda Bella Vista sector corral comunitario, donde se ejecutaron 1,50 km de mantenimiento de los 2.50 km programados. El contrato de obra No. 449 se suspendió el 15/10/2026, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones por parte del contratista: 1.) Que durante la segunda semana del mes de octubre del presente año se ha presentado precipitaciones constantes de lluvias en el municipio de Aguazul, Casanare, ocasionando el aumento del nivel de los ríos dificultando la extracción de material necesario para realizar los mantenimientos proyectados en las veredas Bella Vista sector corral comunitario y Valle Verde lo cual ha generado condiciones desfavorables para el desarrollo de las actividades previstas en el contrato de obra No. 449 del 15 de julio 2026. 2.) Que la ola invernal ha producido atascamiento de las volquetas por el nivel freático muy alto por causa de las lluvias.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

MANTENIMIENTO VIAL VEREDA BELLA VISTA SECTOR CORRAL COMUNITARIO

Antes

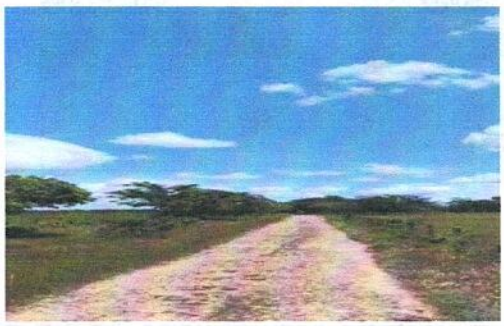



Transporte de material con volquetas del municipio





Transporte de material con volquetas particulares






Cuneteo y extendida de material





Vibro compactacion

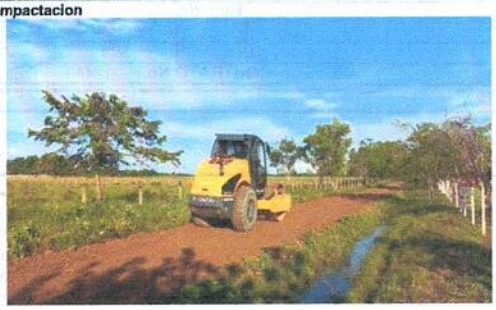



El despues





DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado SIA

FORMATO MA-C-17

Alcaldía de Aguazul

MUNICIPIO DE AGUAZUL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



RESUPUESTO EJECUTADO PERIODO DEL 09/10/2026 AL 15/10/2026

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

No.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				MANTENIMIENTO VIAL				
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO				
1	101		101	Conformación de la banca existente con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: Escarificar, perfilar, extender, cunetear, riego y compactación)	Km	1,50	$ 2.270.551,00	$ 3.405.827,00
2	102		102	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio TM6" con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: extender, riego y compactación)	M3	330,00	$ 6.771,00	$ 2.234.430,00
3	103		103	Remoción y cargue de derrumbes con maquinaria del municipio de Aguazul (incluye transporte y disposición final)	M3	0,00	$ 5.896,00	$ 0,00
4	104		104	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía pavimentada)	m³-km	4.290,00	$ 1.750,00	$ 7.507.500,00
5	105		105	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada)	m³-km	2.145,00	$ 1.983,00	$ 4.253.535,00
6	106		106	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada en montaña)	m³-km	0,00	$ 2.541,00	$ 0,00
7	107		107	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado con maquinaria municipio de Aguazul	Km	8,00	$ 14.280,00	$ 114.240,00
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO Y PARTICULAR				
8	108		108	Excavación de cortes, canales y préstamo(acarreo a 1 km) con maquinaria municipio de Aguazul y maquinaria particular	M3	0,00	$ 14.405,00	$ 0,00
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA PARTICULAR				
9	109		109	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	m³-km	4.455,00	$ 3.089,00	$ 13.761.495,00
10	110		110	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	m³-km	2.310,00	$ 3.212,00	$ 7.419.720,00
							PRESUPUESTO EJECUTADO MANTENIMIENTO VIAL	**$ 38.696.747,00**
				MANTENIMIENTO MAQUINARIA				
				Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo maquinaria del municipio	Unidad	0	$ 99.805.084,00	$ 0,00
							PRESUPUESTO EJECUTADO MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA	**$ -**
							TOTAL	**$ 38.696.747,00**

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	28,50%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**IMPREVISTO**	**I=**	1,00%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**UTILIDAD**	**U=**	5,00%
NOTA 4: Se anexa el estudio de mercado, donde se establece las variables utilizadas en los APU para las actividades del capitulo de MANTENIMIENTO VIAL, como tambien, los insumos y actividades del capitulo de MANTENIMIENTO MAQAUINARIA.	**TOTAL A.I.U**	**A.I.U.=**	34,50%

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
PROFESIONAL CONTRATADO SIA

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CÁLCULO OBRA EJECUTADA						
REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**L**	**A**	**H**	**TOTAL**
			METROS			
VEREDA BELLA VISTA SECTOR CORRAL COMUNITARIO						
ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO						
1	Conformación de la banca existente con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: Escarificar, perfilar, extender, cunetear, riego y compactación)	KM	1,50			1,50
2	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio TM6" con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: extender, riego y compactación)	M3	1.500,00	5,00	0,044	330,00
3	Remoción y cargue de derrumbes con maquinaria del municipio de Aguazul (incluye transporte y disposición final)	M3	-			
4	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía pavimentada)	M3-KM	26,00			4.290,00
5	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada)	M3-KM	13,00			2.145,00
6	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada en montaña)	M3-KM				
7	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado con maquinaria municipio de Aguazul	KM	8,00			8,00
	ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO Y PARTICULAR					
8	Excavación de cortes, canales y préstamo(acarreo a 1 km) con maquinaria municipio de Aguazul y maquinaria particular	M3				-
	ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA PARTICULAR					-
9	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	27,00			4.455,00
10	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	14,00			2.310,00

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

PROFESIONAL CONTARTADO SIA

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 1 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	9	10	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	449	DE 2026

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 10,7 del : 01/10/2026 al 08/10/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 76 días

CONTRATO No. 449 (Número de contrato) DE 15 de julio del 2026 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 489.805.084,00 (Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA TRANSPORTE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S

INTERVENTOR N/A

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN N/A

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programado (%)	7,69%	82,31%
Valor programado:	37.677.314,15	403.147.261,45

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra ejecutada (%)	9,16%	82,22%
Valor ejecutado:	44.844.897,00	402.720.590,54

CONTRATO DE OBRA No.:	449 de 2026
Contrato No.	449 de 2026
Valor Inicial:	$ 489.805.084,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 489.805.084,00
Plazo Inicial:	Tres(03) meses
Fecha de Iniciación:	21 de julio de 2026
Fecha de Terminación inicial	20 de octubre de 2026
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	931 de 2024
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
SEGUROS MUNDIAL	COQ-100009761	CUMPLIMIENTO	$ 48.970.508,40	21/07/2026	26/04/2027
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 244.902.542,00	21/07/2026	26/04/2027
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 24.490.254,20	21/07/2026	23/10/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 48.970.508,40	21/07/2026	21/04/2027
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 48.970.508,40	21/07/2026	21/07/2027
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 146.941.525,20	21/07/2026	21/07/2027
	COQ-100002427	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	21/07/2026	26/10/2026

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	97.961.016,80	244.902.542,00
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de combustible diésel y compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria)	146.941.525,20	
TOTAL		$ 244.902.542,00	$ 244.902.542,00

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
N/A	N/A	N/A

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
N/A	N/A	N/A

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
			N/A

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	01/07/2026
2	ANTICIPO	28/07/2026
3	ACTA PARCIAL 1	25/09/2026

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 01 (Día) DE octubre (Mes) DE 2026 (Año)

AL 08 DE octubre DE 2026

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 489.805.084,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			$ 244.902.542,00
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 402.720.590,54	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 489.805.084,00**	**$ 402.720.590,54**	**$ 244.902.542,00**
VALOR SALDO POR EJECUTAR			**$ 87.084.493,46**

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No. 3 de 3		
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	9	10	2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM	AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	449 DE	2026

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	82,22%
Avance financiero ($):	$ 402.720.590,54

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 01/10/2026 al 08/10/2026, se ejecutaron actividades de mantenimiento vial en la vereda Bella Vista sector Agrotinige, donde se ejecutaron 2,00 km faltantes de los 5.00 km programados. Se termino las actividades de mantenimiento vial en el sector Agrotinige y se traslado la maquinaria al sector Corral Comunitario de la vereda Bella Vista para ejecutar las actividades de mantenimiento vial

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

AGROTINIGE

Transporte de material con volquetas del municipio






Transporte de material con volquetas particulares





Cuneteo y extendida de material



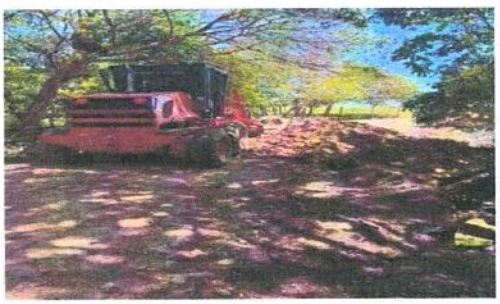


Riego y Vibro compactacion





El despues

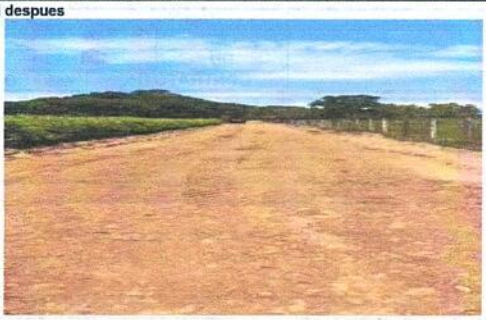



DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado SIA

FORMATO MA-C-17

Alcaldía de Aguazul

MUNICIPIO DE AGUAZUL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

RESUPUESTO EJECUTADO PERIODO DEL 01/10/2026 AL 08/10/2026

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

No.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				MANTENIMIENTO VIAL				
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO				
1	101		101	Conformación de la banca existente con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: Escarificar, perfilar, extender, cunetear, riego y compactación)	Km	2,00	$ 2.270.551,00	$ 4.541.102,00
2	102		102	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio TM6" con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: extender, riego y compactación)	M3	350,00	$ 6.771,00	$ 2.369.850,00
3	103		103	Remoción y cargue de derrumbes con maquinaria del municipio de Aguazul (incluye transporte y disposición final)	M3	0,00	$ 5.896,00	$ 0,00
4	104		104	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía pavimentada)	m³-km	4.725,00	$ 1.750,00	$ 8.268.750,00
5	105		105	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada)	m³-km	2.450,00	$ 1.983,00	$ 4.858.350,00
6	106		106	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada en montaña)	m³-km	0,00	$ 2.541,00	$ 0,00
7	107		107	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado con maquinaria municipio de Aguazul	Km	164,00	$ 14.280,00	$ 2.341.920,00
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO Y PARTICULAR				
8	108		108	Excavación de cortes, canales y préstamo(acarreo a 1 km) con maquinaria municipio de Aguazul y maquinaria particular	M3	0,00	$ 14.405,00	$ 0,00
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA PARTICULAR				
9	109		109	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	m³-km	4.725,00	$ 3.089,00	$ 14.595.525,00
10	110		110	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	m³-km	2.450,00	$ 3.212,00	$ 7.869.400,00
							PRESUPUESTO EJECUTADO MANTENIMIENTO VIAL	**$ 44.844.897,00**
				MANTENIMIENTO MAQUINARIA				
				Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo maquinaria del municipio	Unidad	0	$ 99.805.084,00	$ 0,00
							PRESUPUESTO EJECUTADO MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA	**$ -**
							TOTAL $	**44.844.897,00**

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproxmara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	28,50%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1,00%
NOTA 4: Se anexa el estudio de mercado, donde se establece las variables utilizadas en los APU para las actividades del capitulo de MANTENIMIENTO VIAL, como tambien, los insumos y actividades del capitulo de MANTENIMIENTO MAQAUINARIA.	**UTILIDAD**	**U=**	5,00%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	34,50%

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
PROFESIONAL CONTRATADO SIA

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CÁLCULO OBRA EJECUTADA

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	L	A	H	TOTAL
			METROS			
VEREDA BELLA VISTA SECTOR AGROTINIGE						
ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO						
1	Conformación de la banca existente con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: Escarificar, perfilar, extender, cunetear, riego y compactación)	KM	2,00			2,00
2	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio TM6" con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: extender, riego y compactación)	M3	2.000,00	5,00	0,035	350,00
3	Remoción y cargue de derrumbes con maquinaria del municipio de Aguazul (incluye transporte y disposición final)	M3	-			
4	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía pavimentada)	M3-KM	27,00			4.725,00
5	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada)	M3-KM	14,00			2.450,00
6	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada en montaña)	M3-KM				
7	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado con maquinaria municipio de Aguazul	KM	164,00			164,00
	ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO Y PARTICULAR					
8	Excavación de cortes, canales y préstamo(acarreo a 1 km) con maquinaria municipio de Aguazul y maquinaria particular	M3				-
	ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA PARTICULAR					-
9	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	27,00			4.725,00
10	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	14,00			2.450,00

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

PROFESIONAL CONTARTADO SIA

Alcaldía de Aguazul	REPÚBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	1	de	3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	2	10		2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM		AA
	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	449	DE	2026

INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL - CONTRATO DE OBRA

1. INFORMACIÓN GENERAL

Semana Número: 9,68 del : 23/09/2026 al 30/09/2026

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 68 días

CONTRATO No. 449 (Número de contrato) DE 15 de julio del 2026 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 489.805.084,00
(Indique el valor del contrato suscrito en números)

CONTRATISTA DE OBRA TRANSPORTE, INGENIERIA Y CONSTRUCCION CANAGUAROS S.A.S

INTERVENTOR N/A

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA - SUPERVISOR JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ

APOYO A LA SUPERVISIÓN N/A

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programado (%)	7,69%	74,46%
Valor programado:	37.677.314,15	364.716.401,01

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra ejecutada (%)	13,49%	73,06%
Valor ejecutado:	66.098.805,00	357.875.693,54

CONTRATO DE OBRA No.:	449 de 2026
Contrato No.	449 de 2026
Valor Inicial:	$ 489.805.084,00
valor adicional:	$ -
Valor Actualizado:	$ 489.805.084,00
Plazo Inicial:	Tres(03) meses
Fecha de Iniciación:	21 de julio de 2026
Fecha de Terminación inicial	20 de octubre de 2026
Estado Actual:	En ejecucion

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	931 de 2024
Contrato No.	
Valor Inicial:	
valor adicional:	
Valor Actualizado:	
Plazo Inicial:	
Fecha de Iniciación:	
Fecha de Terminación actual	
Estado Actual:	

2. CONTROL DE GARANTÍAS

COMPAÑÍA	PÓLIZA O CERT MODIFICA No.	RIESGO	V/R. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
SEGUROS MUNDIAL	COQ-100009761	CUMPLIMIENTO	$ 48.970.508,40	21/07/2026	26/04/2027
		BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	$ 244.902.542,00	21/07/2026	26/04/2027
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 24.490.254,20	21/07/2026	23/10/2029
		CALIDAD DEL SERVICIO	$ 48.970.508,40	21/07/2026	21/04/2027
		ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 48.970.508,40	21/07/2026	21/07/2027
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	$ 146.941.525,20	21/07/2026	21/07/2027
	COQ-100002427	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 350.181.000,00	21/07/2026	26/10/2026

3. INVERSIÓN DEL ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	PROGRAMACIÓN INICIAL	INVERSIÓN EJECUTADA
1	Pago de salarios y jornales (pago de nómina operarios y personal administrativo), servicios de mano de obra especializada, dotación, exámenes, seguridad social y prestaciones sociales	97.961.016,80	244.902.542,00
2	Compra de materiales y accesorios (Compra de combustible diésel y compra de repuestos e insumos para mantenimientos preventivos y correctivos de la maquinaria)	146.941.525,20	
TOTAL		$ 244.902.542,00	$ 244.902.542,00

4. CONTROL LEGAL

4.1 CONTRATOS ADICIONALES AL PLAZO SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
N/A	N/A	N/A

4.2 SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN SI ☐ NO ☑

OBJETO ACTA	FECHA	TIEMPO (DÍAS, MESES)
N/A	N/A	N/A

4.3 CONTRATOS ADICIONALES AL VALOR SI ☐ NO ☑

CONTRATO ADICIONAL No.	FECHA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

4.4 MODIFICACIONES CONTRACTUALES SI ☐ NO ☑

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO	No.	OBJETO	FECHA
			N/A

4.5 SANCIONES SI ☐ NO ☑

RESOLUCIÓN No.	OBJETO	VALOR	FECHA
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.6 ACCIONES LEGALES SI ☐ NO ☑

CLASE	ETAPA PROCESAL	FECHA	DESPACHO	No. EXPEDIENTE
N/A.	N/A.	N/A.	N/A.	N/A.

4.7 ACTAS LEGALES TRAMITADAS

ACTA No.	OBJETO	FECHA
1	ACTA 1 - INICIO	01/07/2026
2	ANTICIPO	28/07/2026

PERIODO QUE COMPRENDE EL CONTROL DE LEGALIDAD: DEL 23 (Día) DE septiembre (Mes) DE 2026 (Año)

AL 30 DE septiembre DE 2026

5. BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR INICIAL	$ 489.805.084,00		
VALOR ADICIONAL	$ -		
VALOR TRANSFERENCIA INICIAL ANTICIPO			$ 244.902.542,00
DESCUENTO ANTICIPO			
VALOR EJECUTADO		$ 357.875.693,54	
VALOR ACTAS PARCIALES PAGADAS			
VALOR POR EJECUTAR			
VALOR POR PAGAR ACTA DE LIQUIDACION			
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO			
SUMAS IGUALES	**$ 489.805.084,00**	**$ 357.875.693,54**	**$ 244.902.542,00**
VALOR SALDO POR EJECUTAR			**$ 131.929.390,46**

Alcaldía de Aguazul	REPUBLICA DE COLOMBIA	Hoja No.	3	de	3
	DEPARTAMENTO DE CASANARE	2	10		2026
	MUNICIPIO DE AGUAZUL	DD	MM		AA
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	CONTRATO No.	449	DE	2026

6. AVANCE DE OBRA

Obra física ejecutada (%):	73,06%
Avance financiero ($):	$ 357.875.693,54

7. OBSERVACIONES

Para el periodo del 23/09/2026 al 30/09/2026, se ejecutaron actividades de mantenimiento vial en la vereda Bella Vista sector Agrotinige, donde se ejecutaron 3,00 km de los 5.00 km programados.

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

MANTENIMIENTO A LA VIA QUE COMUNICA LA VEREDA BELLA VISTA SECTOR AGROTINIGE

Antes







Transporte de material con volquetas del municipio




Transporte de material con volquetas particulares

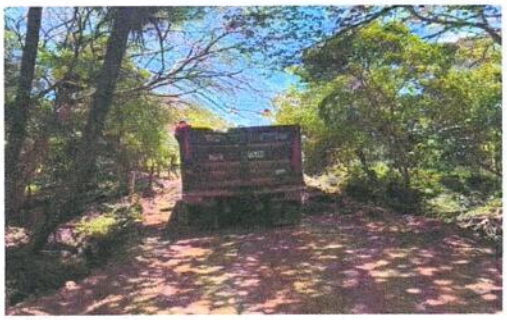Cuneteo y extendida de material





Riego y Vibro compactacion





El despues





DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
Profesional contratado SIA

FORMATO MA-C-17

Alcaldía de Aguazul

MUNICIPIO DE AGUAZUL

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



RESUPUESTO EJECUTADO PERIODO DEL 23/09/2026 AL 30/09/2026

REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE

No.	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				MANTENIMIENTO VIAL				
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO				
1	101		101	Conformación de la banca existente con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: Escarificar, perfilar, extender, cunetear, riego y compactación)	Km	3,00	$ 2.270.551,00	$ 6.811.653,00
2	102		102	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio TM6" con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: extender, riego y compactación)	M3	525,00	$ 6.771,00	$ 3.554.775,00
3	103		103	Remoción y cargue de derrumbes con maquinaria del municipio de Aguazul (incluye transporte y disposición final)	M3	0,00	$ 5.896,00	$ 0,00
4	104		104	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía pavimentada)	m³-km	7.088,00	$ 1.750,00	$ 12.404.000,00
5	105		105	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada)	m³-km	3.675,00	$ 1.983,00	$ 7.287.525,00
6	106		106	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada en montaña)	m³-km	0,00	$ 2.541,00	$ 0,00
7	107		107	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado con maquinaria municipio de Aguazul	Km	164,00	$ 14.280,00	$ 2.341.920,00
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO Y PARTICULAR				
8	108		108	Excavación de cortes, canales y préstamo(acarreo a 1 km) con maquinaria municipio de Aguazul y maquinaria particular	M3	0,00	$ 14.405,00	$ 0,00
				ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA PARTICULAR				
9	109		109	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	m³-km	7.088,00	$ 3.089,00	$ 21.894.832,00
10	110		110	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	m³-km	3.675,00	$ 3.212,00	$ 11.804.100,00
							PRESUPUESTO EJECUTADO MANTENIMIENTO VIAL	**$ 66.098.805,00**
				MANTENIMIENTO MAQUINARIA				
				Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo maquinaria del municipio	Unidad	0	$ 99.805.084,00	$ 0,00
							PRESUPUESTO EJECUTADO MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA	**$ -**
							TOTAL	**$ 66.098.805,00**

	DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU.			
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACIÓN**	**A=**	28,50%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1,00%
NOTA 4: Se anexa el estudio de mercado, donde se establece las variables utilizadas en los APU para las actividades del capitulo de MANTENIMIENTO VIAL, como tambien, los insumos y actividades del capitulo de MANTENIMIENTO MAQAUINARIA.	**UTILIDAD**	**U=**	5,00%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	34,50%

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA
PROFESIONAL CONTRATADO SIA

JUAN MIGUEL SANDOVAL GUTIERREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

MEMORIAS DE CÁLCULO OBRA EJECUTADA						
REALIZAR POR MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL RURAL SIN PAVIMENTAR, CON LA MAQUINARIA ADSCRITA A LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UN**	**L**	**A**	**H**	**TOTAL**
			METROS			
VEREDA BELLA VISTA SECTOR AGROTINIGE						
ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO						
1	Conformación de la banca existente con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: Escarificar, perfilar, extender, cunetear, riego y compactación)	KM	3,00			3,00
2	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio TM6" con maquinaria municipio de Aguazul (Incluye: extender, riego y compactación)	M3	3.000,00	5,00	0,035	525,00
3	Remoción y cargue de derrumbes con maquinaria del municipio de Aguazul (incluye transporte y disposición final)	M3	-			
4	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía pavimentada)	M3-KM	27,00			7.088,00
5	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada)	M3-KM	14,00			3.675,00
6	Sobreacarreos o transporte de material Pétreo con maquinaria municipio de Aguazul (vía destapada en montaña)	M3-KM				
7	Movilizacion y desmovilizacion de equipo pesado con maquinaria municipio de Aguazul	KM	164,00			164,00
	ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA DEL MUNICIPIO Y PARTICULAR					
8	Excavación de cortes, canales y préstamo(acarreo a 1 km) con maquinaria municipio de Aguazul y maquinaria particular	M3				-
	ACTIVIDADES DE OBRA CON MAQUINARIA PARTICULAR					-
9	Transporte de material Pétreo (vía pavimentada)	M3-KM	27,00			7.088,00
10	Transporte de material Pétreo (vía destapada)	M3-KM	14,00			3.675,00

DANULFO AGUILAR ECHEVERRIA

PROFESIONAL CONTARTADO SIA
