GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	**GOBERNACIÓN DEL TOLIMA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTION** **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT** **INFORME DE SUPERVISIÓN No 1**	@gobertolima www.tolima.gov.co

Fecha:	**21**	**de**	**agosto**	**de**	**2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CONTRATO		**X**	**ORDEN**			**CONVENIO**	
Contrato número:	4197			de	10 de noviembre de 2025		

Objeto del contrato: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y MOVILLGAS S.A.S E.S.P PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION E INSTALACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ATACO, TOLIMA".	
Periodo del Informe:	22 de julio de 2026 al 21 de agosto de 2026
Supervisor:	**FERNANDO AUGUSTO BONILLA PORTILLO** Resolución 254 de 22 de julio de 2026
Contratista:	**MOVILLGAS S.A.S E.S.P - NIT: 901.747.670-1** RL: LUZ MARINA DURAN NONATTO **c.c 28.636.849**
Interventoría:	**GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES SAS - Nit: 901.707.294-2** RL: NORTON FERNANDO ARENAS PRADA **c.c 93.396.792**
Valor Total del contrato:	**MIL SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVESIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRECE PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS MCTE** ($ 1.079.958.013,71); de los cuales: EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA aporta la suma de: **NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS CON QUINCE CENTAVOS MCTE** ($ 947.264.194,15). MOVILLGAS S.A.S E.S.P aporta la suma de: **CIENTO TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE** ($ 132.693.819,56)
Plazo inicial de ejecución:	El plazo del convenio es de CIENTO OCHENTA (**150**) días calendario
CDP Inicial:	5042 del SIAF 11 de Septiembre de 2025
RP Inicial:	16170 del 28 de Noviembre de 2025
Fecha legalización:	23 de Enero de 2026
Fecha acta de Inicio:	22 de julio de 2026
Finalización contrato:	18 de diciembre de 2026

DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN

- **ESTADO A LA FECHA:** El contrato a la fecha se encuentra en ejecución.

- **META POR IMPACTAR:** P2S21MP9 – 6000 usuarios nuevos conectados a la red de distribución de gas domiciliario para dignificar la calidad de vida de los Tolimenses

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO Y EVALUACIÓN DEL PERIODO:

El presente informe rinde cuenta del seguimiento efectuado por la Supervisión al Contrato No. 4197 de 2025, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de julio y el 21 de agosto de 2026. El contenido presentado se fundamenta en la documentación contractual disponible, el Informe Mensual No. 01 del Contratista y el Informe Mensual de Interventoría No. 01 del mismo periodo.

Durante este primer periodo de ejecución, se adelantaron las siguientes actividades de alistamiento:

- El contratista entregó la programación de trabajo a la Interventoría para su correspondiente revisión y aprobación.
- Se gestionó la ubicación y adecuación de un centro de acopio en el sector, garantizando el almacenamiento seguro del material e insumos de obra.
- La Supervisión solicitó al operador (MOVILLGAS S.A. E.S.P.) la actualización de las pólizas de garantía, quedando pendiente su recepción para la respectiva revisión, aprobación y radicación formal.

En el componente técnico y de infraestructura, las actividades en campo se desarrollaron de la siguiente manera:

- El operador inició el replanteo topográfico en las veredas Mesa de Pole y Las Señoritas (municipio de Ataco, Tolima), actividad preliminar indispensable para el desarrollo de las excavaciones.
- Se avanzó en la construcción de redes internas, la colocación de centros de medición y la canalización de tubería en zona verde en las veredas Mesa de Pole y Las Señoritas.

La Supervisión realizó el control del proyecto mediante la verificación de la información reportada por el Contratista y la Interventoría, los reportes operativos diarios del grupo de comunicación («CONVENIO 4197 – ATACO»), el análisis al comportamiento del cronograma y la revisión de las actuaciones administrativas. Durante este primer mes, se monitoreó la continuidad de los frentes de trabajo, enfatizando la necesidad de sostener y fortalecer los rendimientos de ejecución.


Al cierre del periodo evaluado, el proyecto alcanzó un avance físico ejecutado del 1.02 %, representado en los siguientes logros operativos:

- Instalación de 4 redes internas con sus respectivos centros de medición.
- Canalización de 95 metros lineales de tubería en zona verde.

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Cumplimiento del Objeto del Contrato: PARCIAL, Durante este periodo no se proyectó la ejecución de ninguna actividad de obra, por lo tanto, respecto a esto se encontraría al día la programación.

Calidad de las especificaciones de la obra: SATISFACTORIA CON SEGUIMIENTO. El contratista presenta en este periodo el certificado de calidad del lote de medidores a utilizar en el proyecto. De acuerdo con la información técnica reportada y las verificaciones realizadas durante el periodo, no se identificaron no conformidades específicas de calidad que afectaran la continuidad de las actividades ejecutadas.

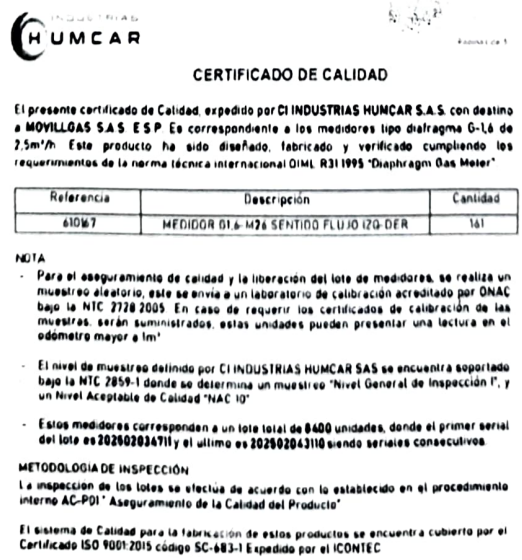

HUMCAR

CERTIFICADO DE CALIDAD

El presente certificado de Calidad, expedido por CI INDUSTRIAS HUMCAR S.A.S. con destino a MOVILLGAS S.A.S E.S.P. Es correspondiente a los medidores tipo diafragma G-1.6 de 2.5m³/h. Este producto ha sido diseñado, fabricado y verificado cumpliendo los requerimientos de la norma técnica internacional OIML R31:1995 "Diaphragm Gas Meter"

Referencia	Descripción	Cantidad
610167	MEDIDOR G1.6-M26 SENTIDO FLUJO IZQ-DER	161

NOTA

- Para el aseguramiento de calidad y la liberación del lote de medidores, se realiza un muestreo aleatorio, este se envía a un laboratorio de calibración acreditado por ONAC bajo la NTC 2728:2005. En caso de requerir los certificados de calibración de las muestras, serán suministrados, estas unidades pueden presentar una lectura en el odómetro mayor a 1m³
- El nivel de muestreo definido por CI INDUSTRIAS HUMCAR SAS se encuentra soportado bajo la NTC 2859-1 donde se determina un muestreo "Nivel General de Inspección I", y un Nivel Aceptable de Calidad "NAC 10"
- Estos medidores corresponden a un lote total de 8400 unidades, donde el primer serial del lote es 2025020347II y el ultimo es 2025020431I0 siendo seriales consecutivos.

METODOLOGIA DE INSPECCIÓN

La inspeccion de los lotes se efectúa de acuerdo con lo establecido en el procedimiento interno AC-P01 " Aseguramiento de la Calidad del Producto"

El sistema de Calidad para la fabricación de estos productos se encuentra cubierto por el Certificado ISO 9001:2015 código SC-683-1 Expedido por el ICONTEC

Atención y cumplimiento de requerimientos: PARCIAL. Durante este periodo se evidencio baja recepción a requerimientos solicitados al operador por parte de la interventoría, como él envió de avances diarios y fotografías diarias, se mantuvo la recomendación de implementar medidas de recuperación y fortalecer los rendimientos. Con el fin de siempre estar acorde a la programación de obra

Cumplimiento del cronograma: PENDIENTE DE APROBACION AL CRONOGRAMA. Al momento el cronograma presenta observaciones por parte de la interventoría por lo tanto el operador debe ajustar con el fin de ser aprobado.


Cumplimiento contractual y documental: PARCIAL CON SEGUIMIENTO. Durante este periodo el contratista presento el informe de obra N°1, la planilla de seguridad del personal, La resolución N° 001 del 25 de julio de 2026 Anexo 2 del permiso de intervención espacio público, El certificado de calidad de los medidores y Resolución Creg179-2020.
El contratista tiene pendiente el envió de las hojas de vida del personal

Gestión financiera: PENDIENTE DOCUMENTACION ANTICIPO. A la fecha no ha sido presentada la documentación requerida para solicitud de anticipo.

Verificación Actividades Ejecutadas:

Durante el periodo reportado, las actividades operativas en campo se centraron en las veredas Mesa de Pole y Las Señoritas con la construcción e instalación de las redes internas y la canalización de tubería ¾" en zona verde.

Registro Fotográfico Ejecución: Registro fotográfico tomado del informe N°1 del contratista

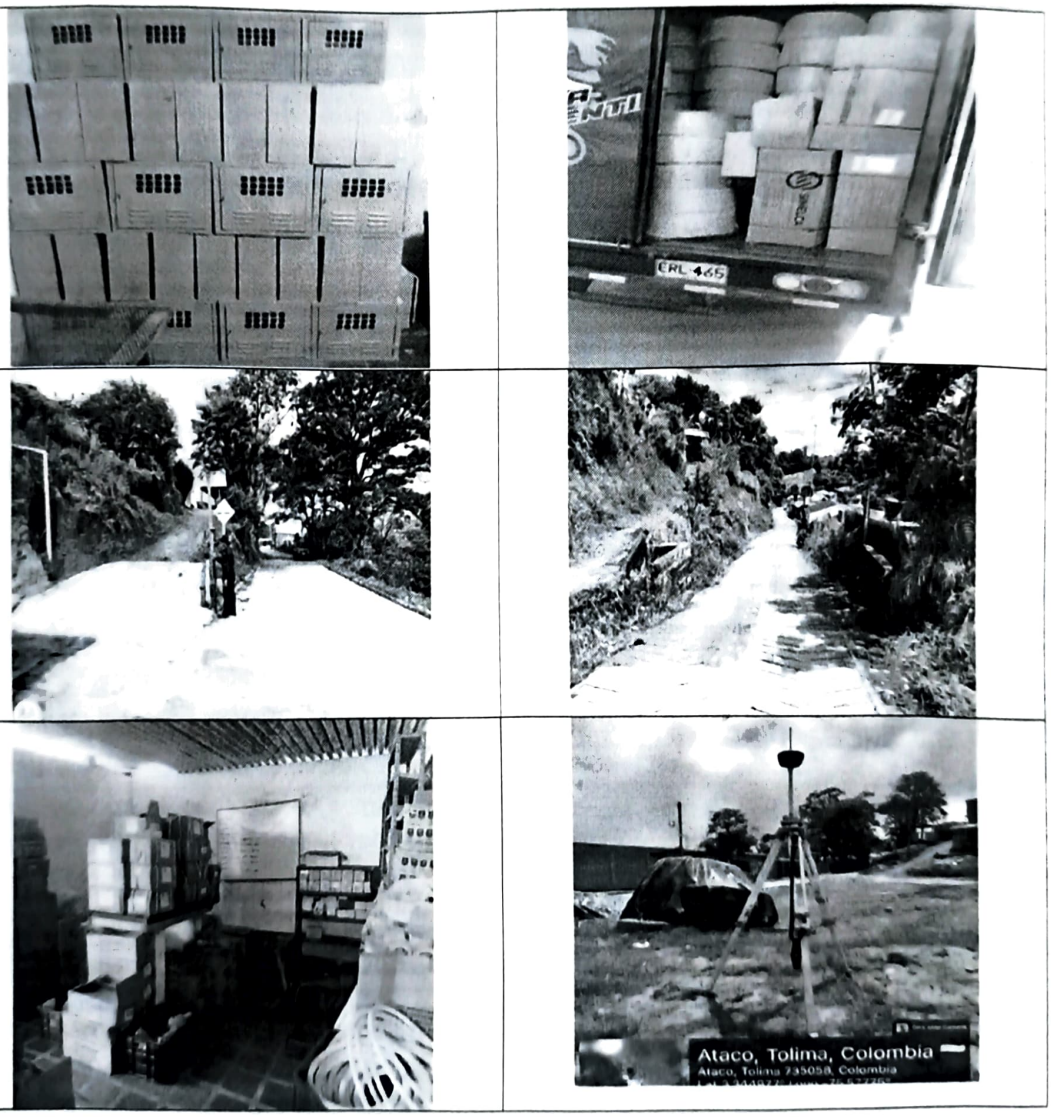

Acciones de seguimiento y control adoptadas por la Supervisión:

- Se evaluó permanentemente la evolución de la obra y el cumplimiento de la programación, contrastando el avance acumulado frente a las metas proyectadas para el periodo.

- Se analizó el Informe Mensual de No. 01 del operador, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de julio y el 21 de agosto de 2026, validando sus aspectos técnicos y administrativos.

- Se mantuvo seguimiento a las actividades desarrolladas en los frentes de obra reportados y a las condiciones de ejecución verificadas por la Interventoría.

- Se verificó la atención dada a las recomendaciones de la Interventoría orientadas al fortalecimiento de los frentes de trabajo, la optimización de recursos, el incremento de rendimientos y la adopción de medidas correctivas.

- Se mantuvo un canal de comunicación continuo y constante tanto con el contratista de obra como con la Interventoría, facilitando la toma oportuna de decisiones.

❖ **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 947.264.194,15
Valor Adición	$ 0
Valor total aporte Gobernación del Tolima	$ 947.264.194,15
Valor pagado	$ 0
Saldo Contractual pendiente de ejecución	$ 947.264.194,15

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Compromiso de pago**	**Fecha**	**Valor**
Valor Total Pagado			**$ 0**

Acciones de seguimiento y control adoptadas por la Supervisión:

- Se evaluó permanentemente la evolución de la obra y el cumplimiento de la programación, contrastando el avance acumulado frente a las metas proyectadas para el periodo.

- Se analizó el Informe Mensual de No. 01 del operador, correspondiente al periodo comprendido entre el 22 de julio y el 21 de agosto de 2026, validando sus aspectos técnicos y administrativos.

- Se mantuvo seguimiento a las actividades desarrolladas en los frentes de obra reportados y a las condiciones de ejecución verificadas por la Interventoría.

- Se verificó la atención dada a las recomendaciones de la Interventoría orientadas al fortalecimiento de los frentes de trabajo, la optimización de recursos, el incremento de rendimientos y la adopción de medidas correctivas.

- Se mantuvo un canal de comunicación continuo y constante tanto con el contratista de obra como con la Interventoría, facilitando la toma oportuna de decisiones.

❖ **BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Balance General del Contrato	
Concepto	**Valor**
Valor inicial del contrato	$ 947.264.194,15
Valor Adición	$ 0
Valor total aporte Gobernación del Tolima	$ 947.264.194,15
Valor pagado	$ 0
Saldo Contractual pendiente de ejecución	$ 947.264.194,15

Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	**Compromiso de pago**	**Fecha**	**Valor**
Valor Total Pagado			**$ 0**

- **SEGUIMIENTO AL AVANCE FÍSICO Y AL CRONOGRAMA**:

De acuerdo con la programación de obra presentada por el operador MOVILLGAS actualmente en proceso de revisión y aprobación por parte de la Interventoría y la Supervisión, la ejecución del proyecto cumple con el rango de avance esperado para el periodo reportado. Sin embargo, la Supervisión advierte una alta concentración de metas físicas programadas para los meses de octubre, noviembre y diciembre.

Indicador	3 julio – 2 Agosto	Evaluación
Avance físico acumulado	1.02%	Por encima 1.02%
Avance programado	0.00%	Programación pendiente de aprobar
Atraso acumulado	0%	NO
Cronograma	Por aprobar	
Frentes activos	1	

Ante esta distribución, resulta indispensable incrementar los rendimientos operativos desde el mes de septiembre, evitando así acumulaciones de trabajo que pongan en riesgo la ruta crítica del proyecto en el último trimestre.

En consecuencia, la Supervisión mantendrá un control riguroso a la ejecución física y financiera, verificará la suficiencia de los recursos humanos, técnicos y materiales asignados por el contratista, y realizará un monitoreo permanente al desarrollo de los frentes de trabajo y a los planes de contingencia requeridos hasta la culminación del objeto contractual.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con base en la revisión de la documentación contractual disponible, el Informe Mensual N° 01 del Operador y el Informe Mensual de Interventoría No. 01 (correspondiente al periodo del 22 de julio al 21 de agosto de 2026), la Supervisión concluye que:

- Durante este primer mes de ejecución, las actividades avanzaron de conformidad con la planificación entregada a la Interventoría.
- Se dio inicio a los frentes de trabajo en las veredas Mesa de Pole y Las Señoritas, logrando:
  - Instalación de 4 redes internas con sus respectivos centros de medición.
  - Canalización e instalación de 95 metros lineales de tubería en zona verde.
  - Un avance físico ejecutado del 1.02 % al corte del periodo.

Con el propósito de consolidar la fase inicial de ejecución y prevenir desviaciones futuras en el cronograma, la Supervisión recomienda:

- Mantener un control riguroso e interdisciplinario en los componentes técnico, administrativo, contractual y financiero, orientado a afianzar los rendimientos alcanzados, asegurar la permanencia del personal en obra y avanzar sostenidamente hacia el cumplimiento del objeto contractual.
- Monitorear con especial rigor los rendimientos esperados para el último trimestre del proyecto, considerando la alta concentración de actividades y metas físicas programadas para dicho periodo.
- Dar seguimiento prioritario a la entrega para revisión, aprobación y radicación formal de las pólizas de garantía actualizadas por parte del operador (MOVILLGAS).
- Tramite de la documentación para el anticipo

FERNANDO AUGUSTO BONILLA PORTILLO
SUPERVISOR DEL CONVENIO 4197
CONVENIO 4197

ERICK JHOAN RODRIGUEZ ZABALA
CONTRATISTA SIH
APOYO A LA SUPERVISION
