INFORME DE ACTIVIDADES MES DE OCTUBRE DE 2026 – PEDRO NEL CASAS TRUJILLO

PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SUPERVISION

Informe de Actividades No. 03 -2026

Contrato No. 252 de 2025

Objeto de Contrato: Prestar sus servicios de apoyo realizando actividades de verificación y acompañamiento a la supervisión en el desarrollo de las obras que ejecuta el proceso de infraestructura de la entidad, especialmente en el área de Salud Y Saneamiento Básico en el marco de la ejecución del proyecto de inversión "Implementación de acciones de intervención para la cobertura de las necesidades básicas de la población de los municipios de la jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe, vigencia 2026.

Periodo reportado: octubre de 2026

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA
1: Brindar acompañamiento en las visitas periódicas a los sitios de ejecución contractual de obra que adelanta el área de Salud y Saneamiento Básico de la entidad, 2. Brindar acompañamiento en la socialización de actividades o reuniones que se adelantan con la comunidad para esclarecer inquietudes que estas tengan el desarrollo contractual y alcances. 3. Informar a la Verificación y acompañamiento o profesional de apoyo, aspectos relevantes en el desarrollo de la ejecución contractual con el fin de tomar medidas a las que	Según las acciones programadas a desarrollar por parte del área de Salud y SB para la vigencia y a las cuales se apoyan en la verificación y acompañamiento realizando visitas a las obras que se encuentran en ejecución a la fecha, las cuales se relaciona a continuación: • Construcción UAS para la localidad de Tóez y sectores aledaños - Resguardo de Tóez – Páez. Avance de ejecución física aprox. del **100 %** al finalizar el corte. • Construcción de la UAS para la localidad de la Villa y sectores aledaños Resguardo de Pickwe Tha Fiw – Páez. Avance de ejecución física del **39 %** a la fecha de corte del presente informe. Se relacionan a continuación las visitas y actividades adelantadas en el periodo de Acompañamiento a supervisión para verificar avances y el estado actual de la obra, según obligaciones contractuales.

haya lugar para el adecuado desarrollo de la obra 4, Brindar acompañamiento en la verificación de las medidas y cantidades adelantadas en obra. 5, Brindar acompañamiento en las visitas que se adelanten en el seguimiento y control de la obra. 6. Brindar acompañamiento en las actividades donde se verifique la calidad y cantidad de materiales existentes en obra. 7. Adelantar registros fotográficos. 8. Brindar acompañamiento en la verificación de la existencia de personal suficiente que garantice el cumplimiento de los plazos estimados.	**OCTUBRE 1 Y 2 DE 2026** **PUESTO DE SALUD LA VILLA DE ITAIBE.** Apoyo a supervisión técnica para verificar avances y el estado actual de la obra. **PERSONAL EN OBRA:** 2 oficiales. **ACTIVIDADES:** Pega de ladrillo para muro en el área de sala de espera. Se revisan plomos, niveles y lineamientos, cumpliendo con los criterios de aceptación. Se llama al Ingeniero residente y se le recomienda hablar con el personal de trabajo para que realicen la actividad de fragua en los ladrillos ya que unos no están bien figurados con mortero. **OCTUBRE 2 DE 2026.** **ACUEDUCTO ARANZÁZU.** Apoyo a supervisión técnica y acompañamiento al Ingeniero Jesús Alver Velazco y miembros de la comunidad, con el fin de realizar reinducción en capacitación teórica y práctica en el manejo de la PTAP del sistema de acueducto. En obra están realizando el manejo de válvulas de lavado, control de los caudales y limpieza de arenas de una línea de los dos existentes. Se adelanta limpieza de 1era línea de filtro en arena etapa iniciada. **OCTUBRE 6 DE 2026** **PUESTO DE SALUD LA VILLA DE ITAIBE.** Apoyo a supervisión técnica para verificar avances y el estado actual de la obra. **PERSONAL EN OBRA:** 3 oficiales y 1 ayudante los cuales usan de forma adecuada los E.P.P y están afiliados a salud y pensión. **ACTIVIDADES:** Se encuentran realizando el desencofrados de vigas en los ejes A al A´´ del 2 al 5. Otro personal continúa con pega de ladrillos para muro en el área de sala de espera y recepción, se verifican lineamientos, plomos y espaciamientos los cuales cumplen con criterios de aceptación.

OCTUBRE 7 DE 2026.
PUESTO DE SALUD TOEZ.
Apoyo a supervisión técnica para verificar realización de ajustes

ACTIVIDADES: Se observa ya instalada la mayoría de dotación en cada área del establecimiento e instalados los dispensadores de jabón y gel.
Se realizó la instalación del cambia pañales al muro. Actividad por fuera de ejercicio contractual

OCTUBRE 8 DE 2026.
PUESTO DE SALUD LA VILLA DE ITAIBE.
Apoyo a supervisión técnica.
Acompañamiento a la Ingeniera Interventora de la C.N.K para supervisar avances y estado actual de la obra.

PERSONAL EN OBRA: Ingeniero residente, 1 maestro, 2 oficiales y 3 ayudantes los cuales usan de forma adecuada los E.P.P y están afiliados a salud y pensión.

ACTIVIDADES: se encuentran pegando ladrillos para muro en el eje 2´desde el A hasta H y otro personal inicia con pegue de ladrillos en los muros del eje A.

OCTUBRE 9 DE 2026.
ACUEDUCTO ARANZAZU.
Apoyo a supervisión técnica y acompañamiento al Ingeniero de medio ambiente de la C.N.K y miembros de la comunidad.

ACTIVIDADES: Se continua con la capacitación teórico-práctico en manejo y operación PTAP, filtro lento del sistema en una de sus dos líneas.

OCTUBRE 13 Y 14 DE 2026.
ACUEDUCTO ARANZÁZU.
Apoyo a supervisión técnica y acompañamiento al Ingeniero de medio ambiente de la C.N.K y miembros de la comunidad.

ACTIVIDADES: Se constata que han conformado grupos para continuar con la capacitación teórico-práctico sobre el manejo del sistema PTAP, Filtro lenta en arena, especialmente en el manejo de válvulas, lavado e instalación de arenas y limpieza de cada módulo del sistema.

OCTUBRE 15 Y 16 DE 2026.
ACUEDUCTO ARANZÁZU.

Apoyo a supervisión técnica y acompañamiento al Ingeniero de medio ambiente de la C.N.K y miembros de la comunidad.

ACTIVIDADES: Se continuar con la capacitación teórico-práctico sobre el manejo del sistema, como manejo de válvulas, lavado e instalación de arenas y limpieza de cada módulo de este sistema.

OCTUBRE 19 Y 20 DE 2026.
PUESTO DE SALUD LA VILLA DE ITAIBE.

Apoyo a supervisión técnica para verificar avances y el estado actual de la obra.

PERSONAL EN OBRA: 1 maestro, 2 oficiales y 3 ayudantes los cuales usan de forma adecuada los E.P.P y están afiliados a salud y pensión.

ACTIVIDADES: Se encuentran realizando la instalación de mampostería sobre el eje C, A´, D´ eje D y eje E.
Se hacen rellenos y nivelación del terreno y compactación con rana para posterior fundición de piso primario en el área de sala de espera.
Se retiran camillas, gatos y cerchas de la obra.
Por otra parte, continúan con fundición de dovelas e instalación de grafiles.
Se realiza verificación del bajante de aguas lluvias, el pasante de la placa y se recomienda aplicar productos para evitar posteriores filtraciones.

OCTUBRE 21 DE 2026.
ACUEDUCTO ARANZÁZU.


Apoyo a supervisión técnica acompañamiento a miembros de la comunidad, para continuar con capacitación teórico-práctico sobre la operatividad de este sistema en especial en Filtro Lento en Arena


	Se comienza con otro grupo la capacitación para el manejo de la segunda línea. Se pone a operar la primera línea nuevamente, ya que el sistema se saturo por malos manejos e inadecuada operación por la comunidad . **OCTUBRE 22 DE 2026.** **PUESTO DE SALUD LA VILLA DE ITAIBE.** Apoyo a supervisión técnica para verificar avances y el estado actual de la obra. **PERSONAL EN OBRA:** Ingeniero residente, 2 maestros, 2 oficiales y 2 ayudantes los cuales usan de forma adecuada los E.P.P y están afiliados a salud y pensión. **ACTIVIDADES:** Pegando ladrillos en los ejes H entre 3´y 4 en el eje 2 entre B y D. Terminaron de nivelar terreno para fundición de piso primario, el cual ya tiene instalada la malla electro soldado en los ejes 1 al 2´entre eje A al I. Falta por instalar ductos eléctricos para fundir pisos y realizar la prueba hidráulica.

AVANCE A PLAN DE TRABAJO (Avances de ejecución Vs avance programado)


PROYECTO	% de verificación	AGOSTO	SEPTIEMB	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Construcción Unidad de atención en salud -UAS – Tóez	**PROGRAMADO OBRA/INSPECCION (%)**	**50%**	**100%**	-	-	-
	EJECUTADO (%)	50%	**100%**			
Construcción Unidad de atención en salud -UAS – La Villa.	**PROGRAMADO OBRA/INSPECCION (%)**	**20%**	**40%**	**60%**	**80%**	**100%**
	EJECUTADO (%)	20%	**40%**	**60%**		


SERIAL FOTOGRAFICO

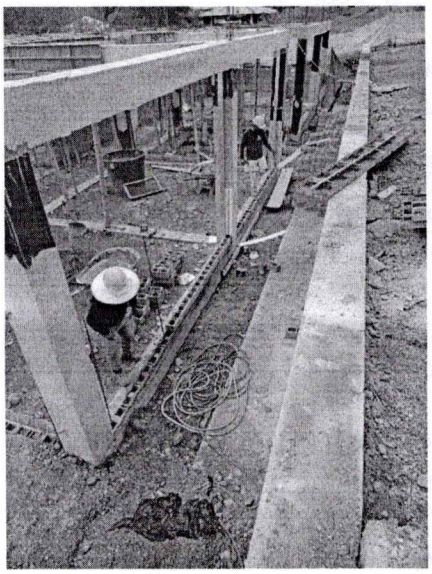

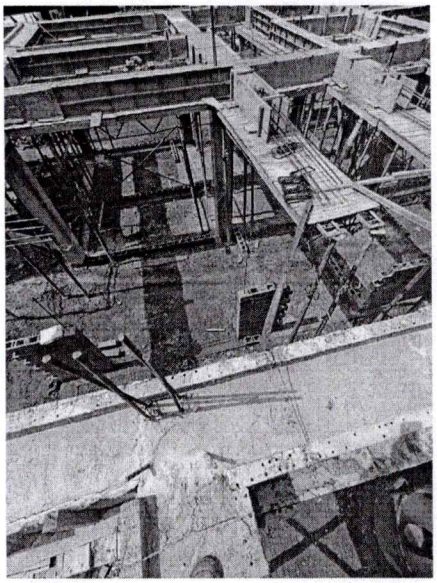



OCTUBRE 1 Y 2 DE 2026 - PUESTO DE SALUD LA VILLA DE ITAIBE.

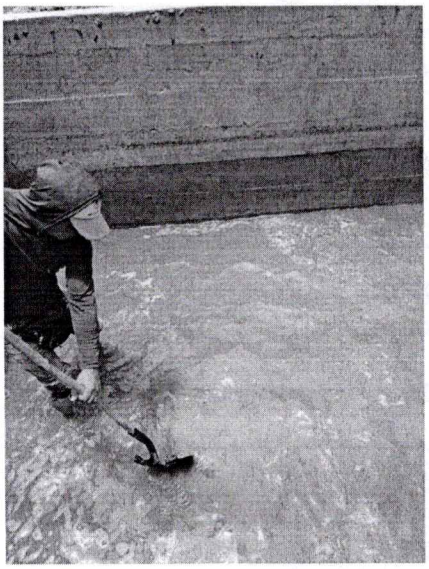

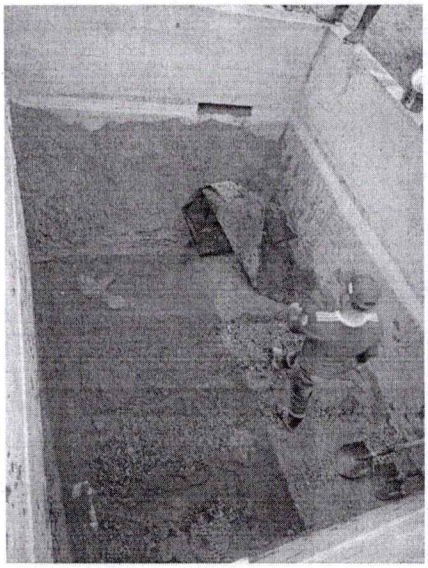


OCTUBRE 2 DE 2026 - ACUEDUCTO ARANZÁZU.

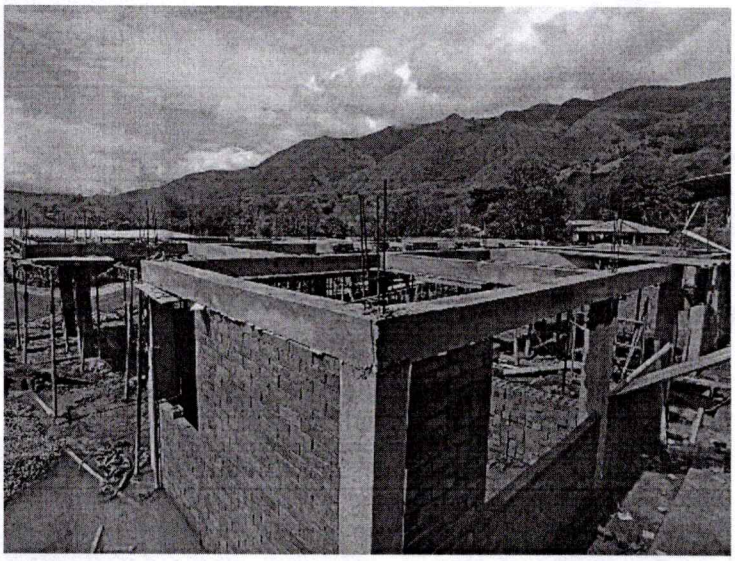

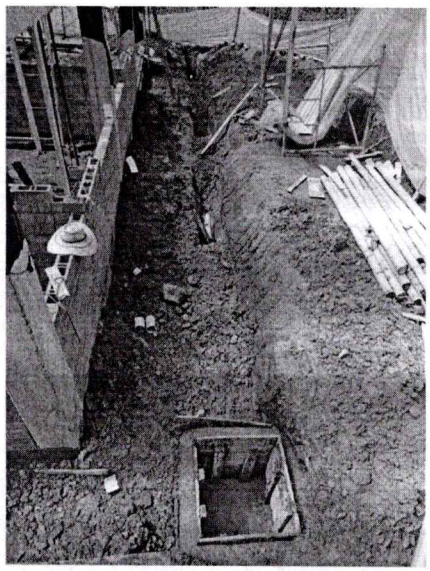



OCTUBRE 6 DE 2026 - PUESTO DE SALUD LA VILLA DE ITAIBE.

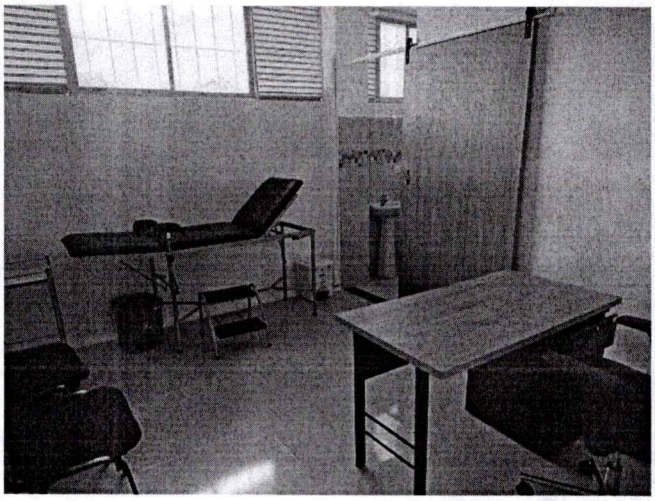



OCTUBRE 7 DE 2026 - PUESTO DE SALUD TOEZ.

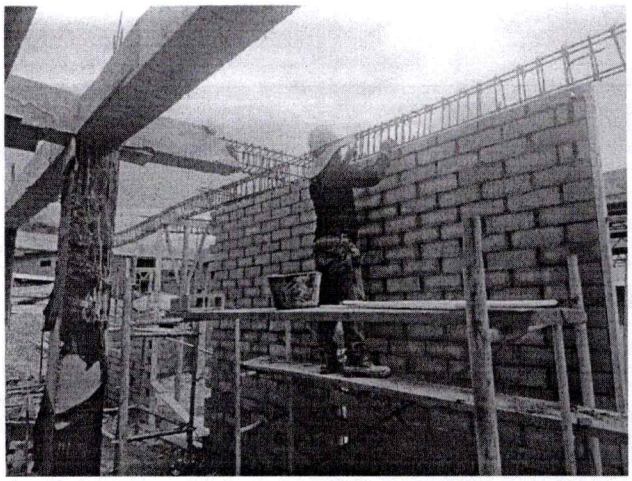

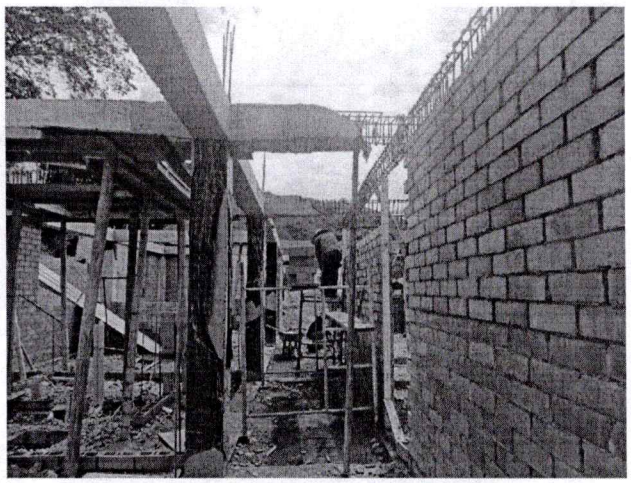



OCTUBRE 8 DE 2026 - PUESTO DE SALUD LA VILLA DE ITAIBE.







OCTUBRE 9 DE 2026 - ACUEDUCTO ARANZAZU.

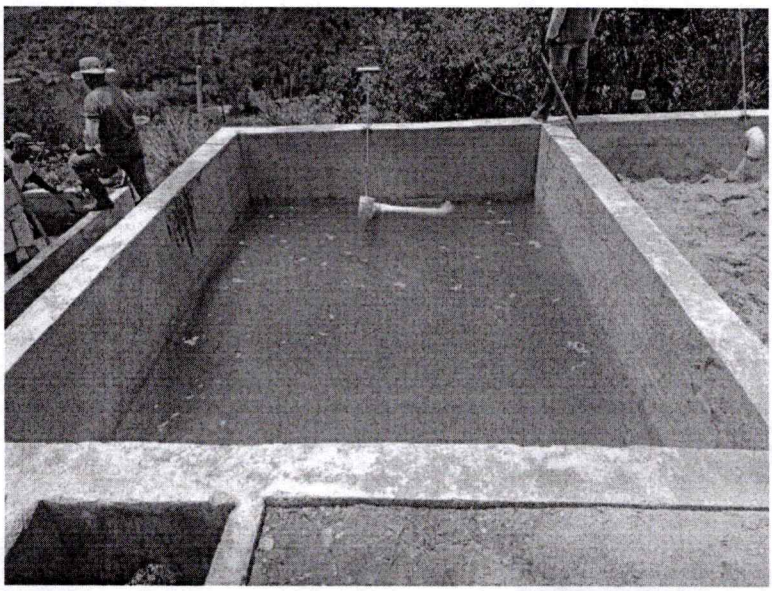

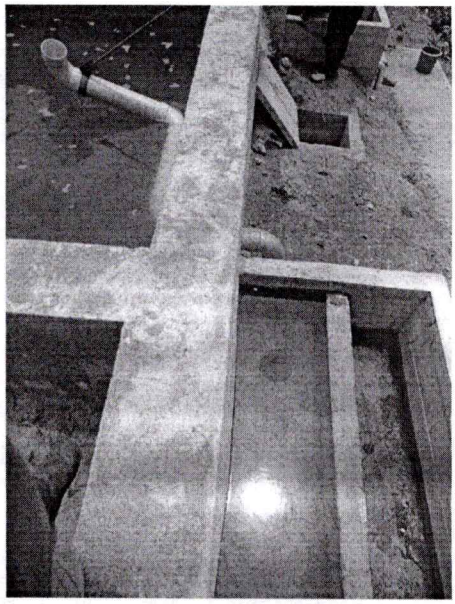



OCTUBRE 13 Y 14 DE 2026 - ACUEDUCTO ARANZÁZU.

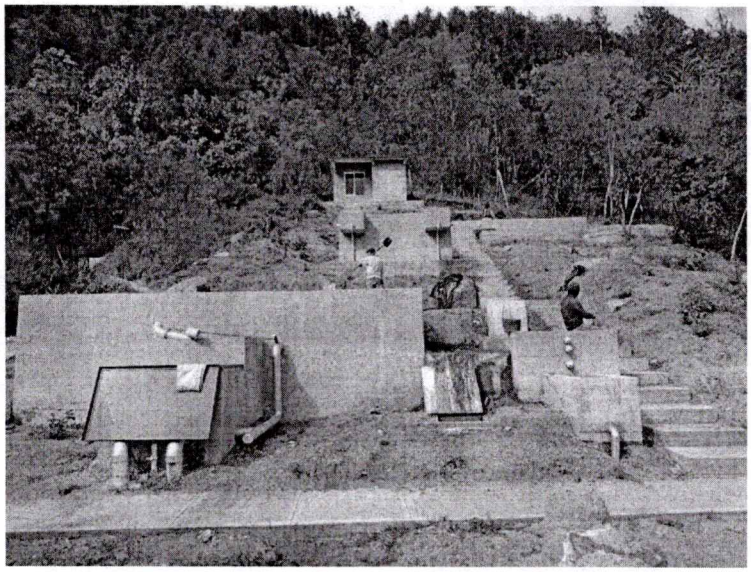

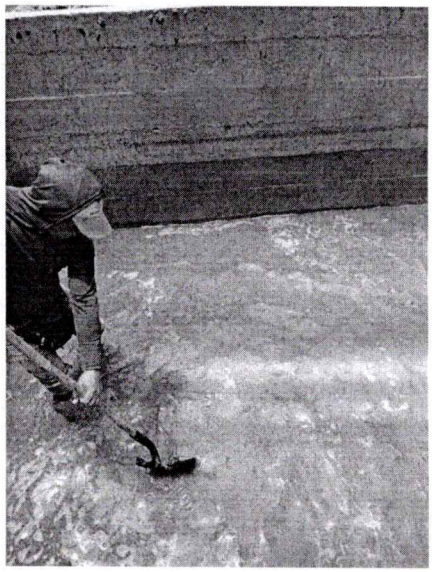


OCTUBRE 15 Y 16 DE 2026 - ACUEDUCTO ARANZÁZU.

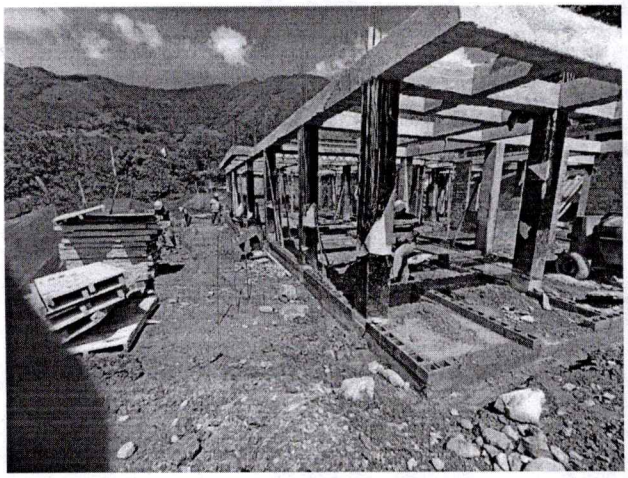

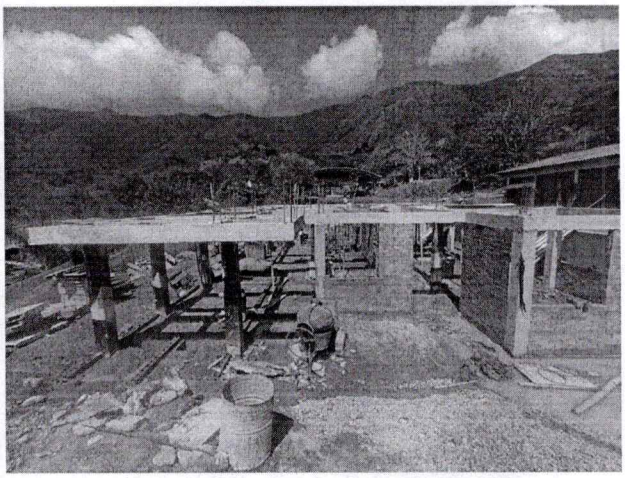


OCTUBRE 19 Y 20 DE 2026 - PUESTO DE SALUD LA VILLA DE ITAIBE.

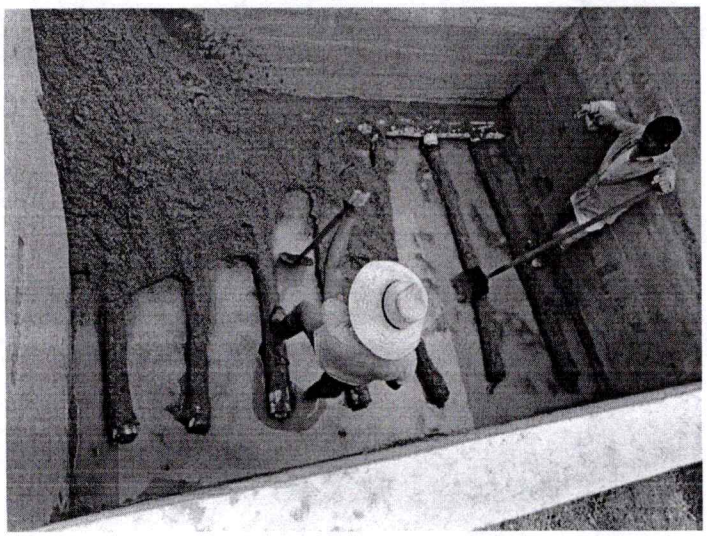




OCTUBRE 21 DE 2026 - ACUEDUCTO ARANZÁZU.

Interior | CORPORACIÓN NASA KIWE	**PROCESO: CONTRATACION**
	PRESENTACION DE INFORMES DE CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES O DE APOYO A LA GESTION

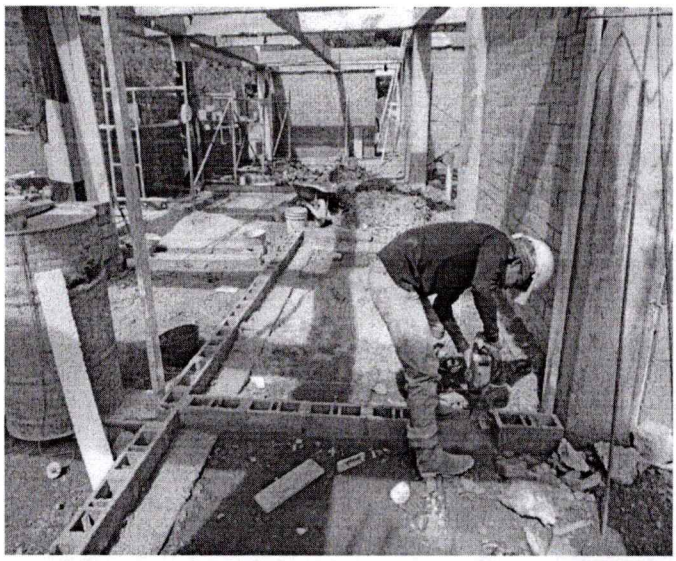

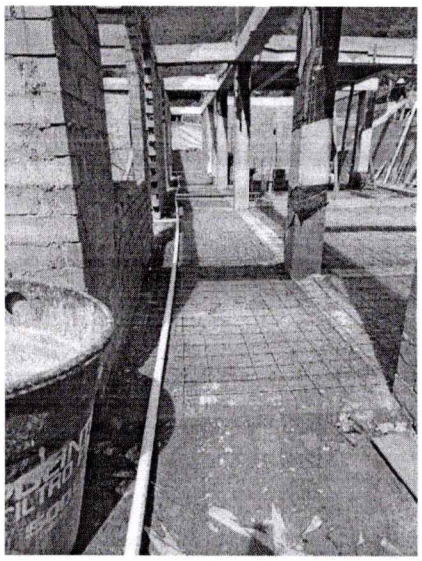

SEPTIEMBRE 22 DE 2026 - ACUEDUCTO PLANADA DE AVIRAMA.

PEDRO NEL CASAS
Contratista

Ing. DIEGO FELIPE CUERVO GONZALEZ
Asesor Área de Salud y Saneamiento Básico
