
	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 1 de 40

26 DE OCTUBRE 2026

INFORME DE EJECUCIÓN No. 2

CONVENIO SOLIDARIO No. 007 DE 2026"OBRAS DE CONFORMACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ETAPA 1 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA"

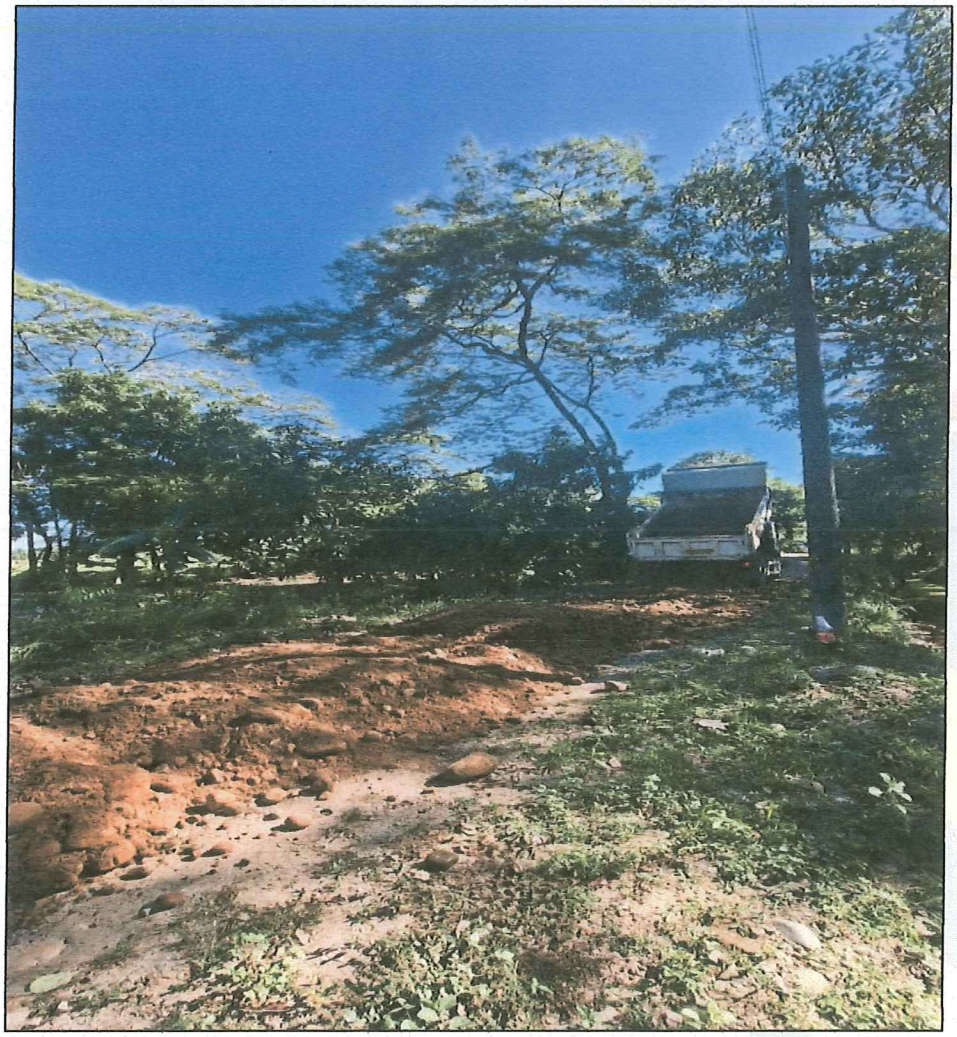

EJECUTOR: ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"

R/L: HENRY PAUL ALFONSO

TAURAMENA – CASANARE

23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 A 25 DE OCTUBRE DE 2026

PRESENTACIÓN

El presente informe refleja las actuaciones de la Contratación directa No. CDMT-SI-024-2026 que tiene por objeto "OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, ETAPA 1 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA" durante el período de ejecución del convenio y la supervisión, seguimiento, control y acompañamiento del mismo.

ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y VIABILIZACIÓN.

De acuerdo a lo expuesto, el presente proceso contractual se realizó conforme al cumplimiento de los estatutos de La Asociación en *él Articulo 20, numeral 26, según naturaleza de los contratos o Convenios, ítem 2, "Junta Directiva: desde (140) salarios mínimos legales mensuales vigentes, más un peso ($1,00) hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes.* La Junta Directiva autoriza para que el presidente HENRY PAUL ALFONSO celebre el convenio cuyo objeto es: "OBRAS DE CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE PARA LA RED VIAL TERCIARIA, ETAPA 1 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA" por valor de CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISIENTOS CUARENTA PESOS ($415.919.640) CON EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, , elaborado y aprobado para tal fin, con un concepto favorable de las siguientes características:

ALCANCE.

Teniendo en cuenta que el mejoramiento de vías terciarias tiene como objetivo mejorar la intercomunicación terrestre de la población rural, a través de intervenciones lineales y puntuales, para el presente convenio y empleando la maquinaria amarilla de propiedad del Municipio, Asojuntas deberá adelantar los trabajos de conformación de cada uno de los sitios y vías que estén definidos previamente, a través de la Secretaría de Infraestructura, para lo cual se realizará el traslado de la maquinaria, de los operadores y del personal profesional vinculados en el convenio y se adelantarán las labores principales que son: reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica de cunetas, escarificación del material de afirmado existente, extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales, todo esto en aras de brindar, a los habitantes de cada uno de los sectores, las posibilidades de contar con vías que permitan el desarrollo adecuado de sus labores agrícolas, pecuarias y comerciales, entre otras.

Bajo el conocimiento de lo anterior, el municipio de Tauramena aprobó el Plan de Desarrollo 2024-2027, en su línea estratégica: "Tauramena Es Conectividad Territorial Para El Desarrollo", Sector de inversión: "TRANSPORTE" con el objetivo priorizado: "Fortalecer la infraestructura de servicios para impulsar la conectividad física y digital, de la población del municipio, como soporte del desarrollo integral de territorio", Programa: INFRAESTRUCTURA RED VIAL REGIONAL, Subprograma: INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE, teniendo como una de sus metas de producto la "VIA TERCIARIA MEJORADA". Todo lo anterior, En general, las actividades que se van a desarrollar para la ejecución del presente convenio solidario corresponden a la conformación de la subrasante

mejorada que incluye: escarificar, perfilar, conformar, extender y compactar 126 Km de vías terciarias a nivel de destapada del Municipio de Tauramena.

BENEFICIARIOS. Habitantes Municipio de Tauramena.

TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: CINCO (05) MESES

PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL A LA FECHA APORTE MUNICIPIO: 52.74%

PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL A LA FECHA APORTE ASOJUNTAS: 40.00%

PLAN FINANCIERO: el proyecto corresponde a $ 415.919.640 (Aporte del Municipio: $373.881.690 y Aporte de la asociación $ 42.037.950)

CÓDIGO	PROYECTO	VALOR A EJECUTAR	R.P. No.	ORIGEN RECURSOS
2.3.24.2402.0600.2024854100009	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL Y CAMINOS ANCESTRALES EN EL MUNICIPO DE TAURAMENA.	$373.881.690	884 19/08/2026	1.2.4.3.03 SGP PROPOSITO GENERAL-LIBRE INVERSIÓN
VALOR TOTAL		**$373.881.690**		

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO

GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONVENIO SOLIDARIO N.º	007 DEL 18 AGOSTO DE 2026
OBJETO:	OBRAS DE CONFORMACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ETAPA 1 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.
CONTRATISTA	ASOJUNTAS TAURAMENA
REPRESENTANTE LEGAL	HENRY PAUL ALFONSO
SUPERVISOR	ING. LINO RODRIGUEZ OCHOA
TIEMPO DE EJECUCIÒN	CINCO (05) MESES
ACTA DE INICIO	27 DE AGOSTO DE 2026
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN	27 DE ENERO DE 2027
VALOR DEL CONTRATO	CUATROCIENTOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($415.919.640)
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA PESOS ($373.881.690)
VALOR APORTE DE LA ASOCIACIÓN	CUARENTA Y DOS MILLONES TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($42.037.950)

INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DE LAS GARANTÍAS APROBADAS DEL CONVENIO SOLIDARIO

ESTADIO FINANCIERO ACTUAL DEL PROYECTO

VALOR TOTAL DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN	VALOR	FECHA ACTA DE INICIO
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	$373.881.690	27/08/2026
APORTE DE LA ASOCIACIÓN	$ 42.037.950	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$415.919.640**	

N° DE PÓLIZA	CONCEPTO	%	ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
					DESDE	HASTA
179340	CUMPLIMIENTO	20%	SEGUROS MUNDIAL	$ 83.183.928	18/08/2026	28/05/2027
	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	SEGUROS MUNDIAL	$ 41.591.964	18/08/2026	28/01/2030
18994	RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL	200S MLV	SEGUROS MUNDIAL	$ 350.181.000	18/08/2026	27/01/2027

ACTIVIDADES ADELANTADAS DURANTE LA EJECUCION DEL CONVENIO.

- Se realizó visita de control y seguimiento con el coordinador de maquinaria e Inspector SST para evaluar las condiciones de las vías terciarias, debido a las condiciones climáticas presentadas en el municipio de Tauramena y a las características del relieve de la vereda Iquía, se hizo necesario realizar nuevamente labores de mantenimiento en sus vías terciarias, también debido a condiciones climáticas fue necesario intervenir tramos de las veredas Carupana y Tunupe, y los barrios La Libertar y Paraíso, atendiendo las solicitudes de la comunidad y con el fin de mejorar estos tramos. Así mismo se realizó inspección de las condiciones de la maquinaria amarilla de acuerdo al formato preoperacional de cada equipo por cada semana.

- La inspectora SST se verificaron las afiliaciones al SGSS, Planilla de pagos SGSS, se organizó un cronograma de actividades y charlas al SST, actividades de Seguridad y Salud en el trabajo, inspección de seguridad, registro de asistencia y estadísticas de accidentalidad. (se anexa informe de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo);

- Se realizó visita técnica de supervisión por parte de la ingeniera Residente de Obra, Coordinador de maquinaria y el Inspector SST para hacer el recorrido de los kilómetros intervenidos y terminados.

MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA AMARILLA POR CUMPLIMIENTO DE KILOMETRAJE Y HORAS

RETROEXCAVADORA;


Se realizó el mantenimiento de la Retroexcavadora, se realizó cambio de correas, cambio de bateria, mantenimiento del aire acondicionado y arreglo de fisura de manguera del tubo racort, con el fin de evitar obstrucciones, deterioro, o daño, y así mantener en buenas condiciones la maquina y prolongar su vida útil.

CAMBIO DE CORREAS






24/09/2026

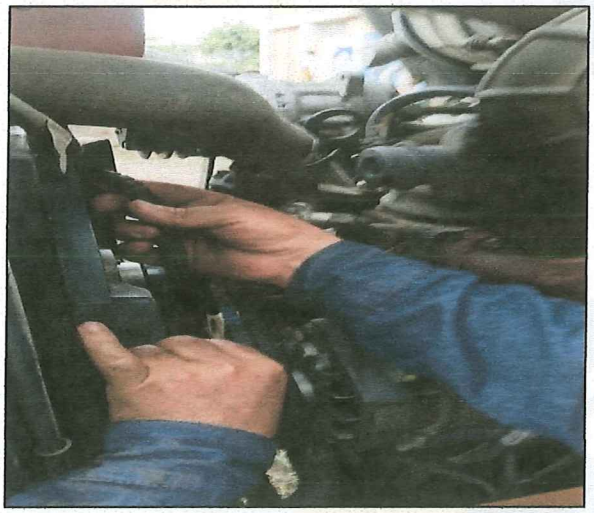

24/09/2026


	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 7 de 40

CAMBIO DE BATERIA

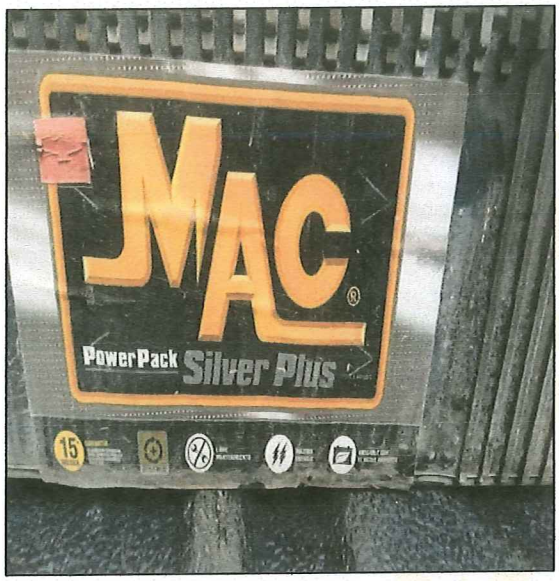



25/09/2026

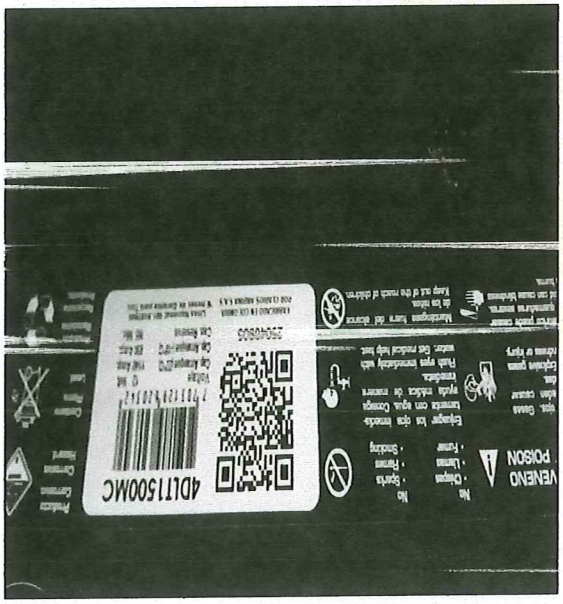





25/09/2026


MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO



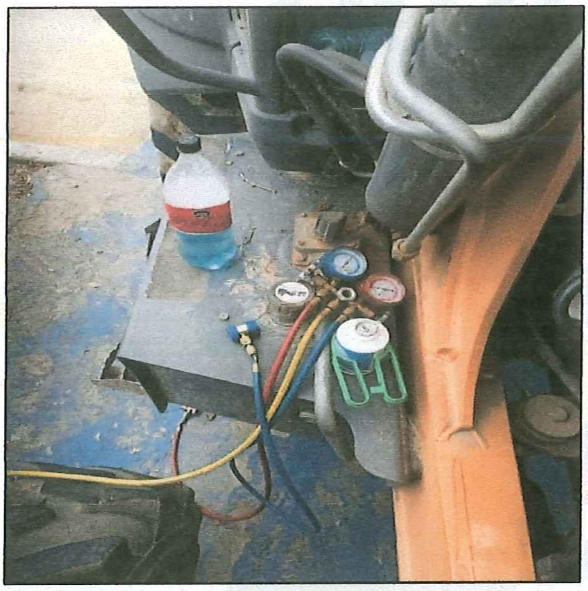

01/10/2026

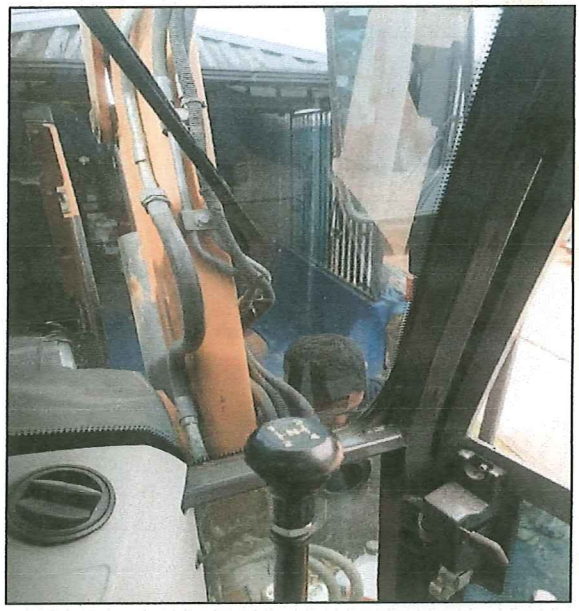

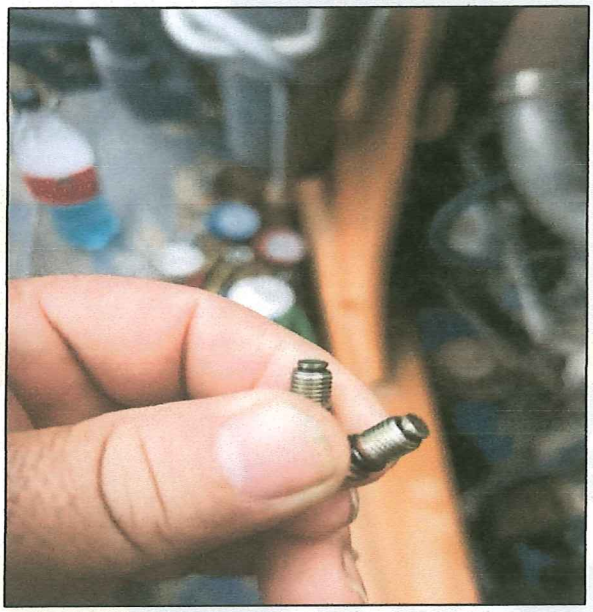

01/10/2026

ARREGLO FISURA MANGERA TUBO RACORT






06/10/02026

MOTONIVELADORA

Se realizó la movilizacion de la motoniveladora al área de trabajo correspondiente, tambien se hizo mantenimiento al aire acondicionado, se despincho una llanta,se hizo cambio de los esparragos y cambio de aceite y filtros, todo esto para mantener en buenas condiciones la maquina y prolongar su vida útil.

MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO



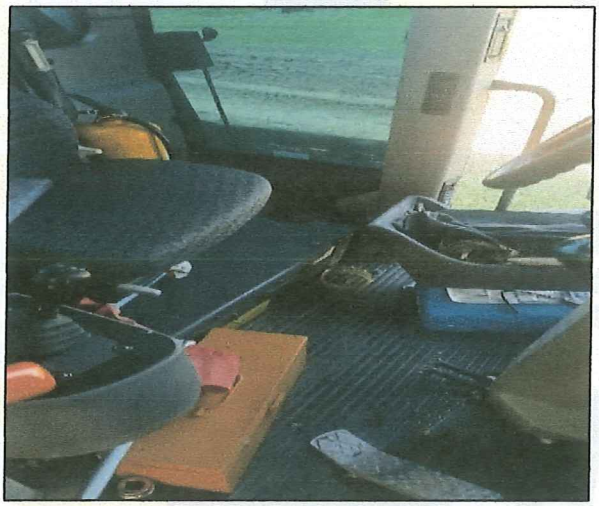

28/09/2026






28/09/2026

DESPINCHADA




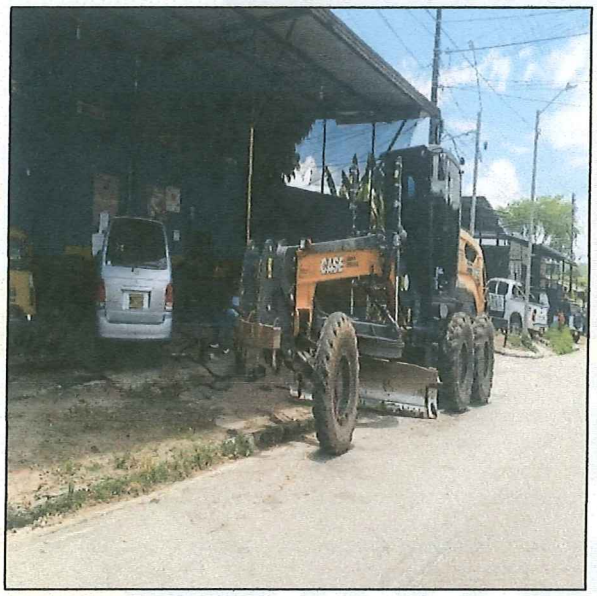

28/09/2026


	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 11 de 40

MOVILIZACIÓN DE MOTONIVELADORA

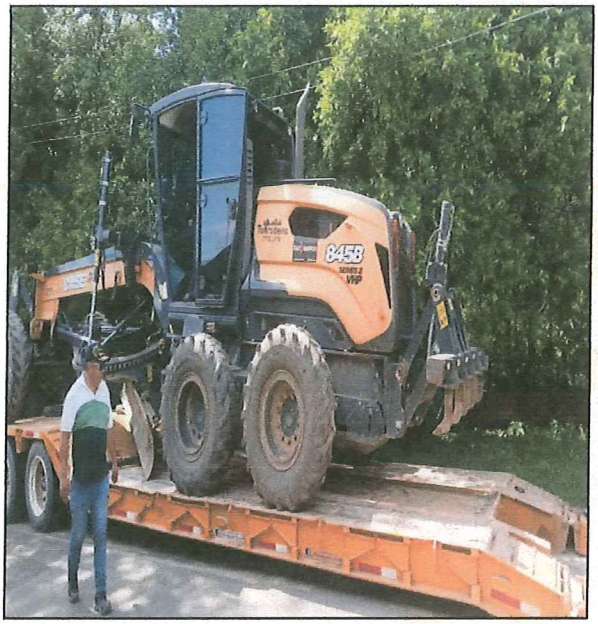



30/09/2026

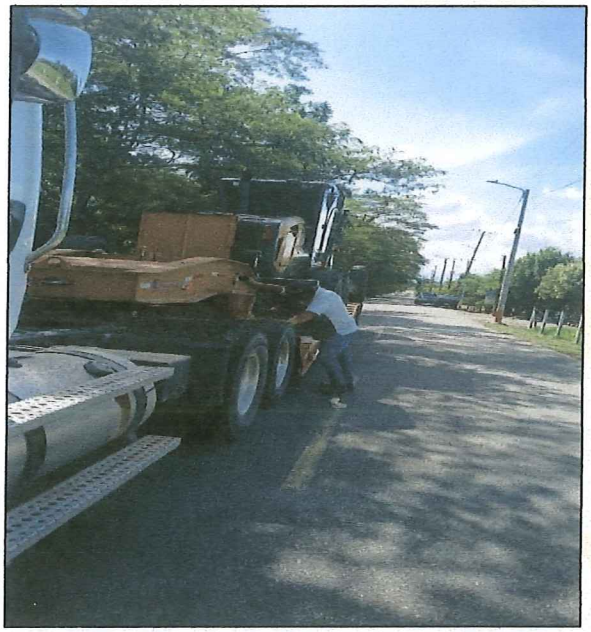



30/09/2026

CAMBIO DE ESPARRAGOS






30/09/2026




30/09/2026

CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS



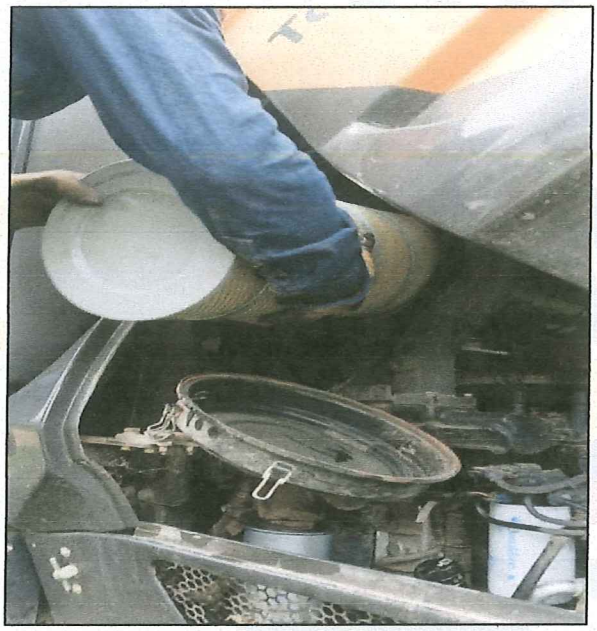

21/10/2026

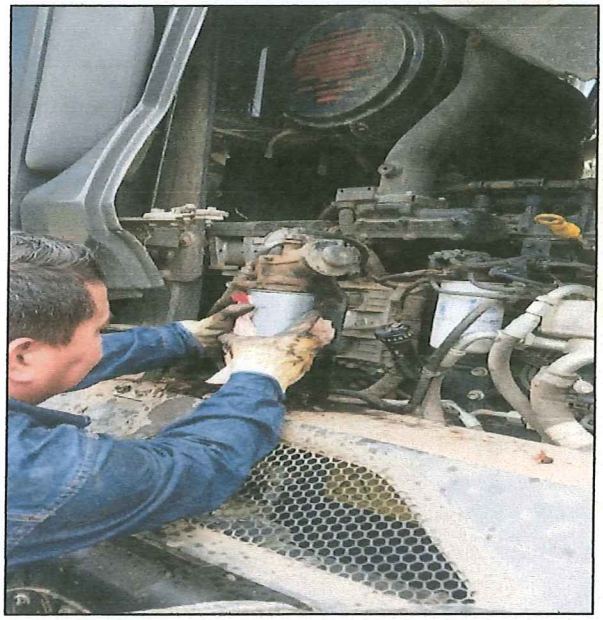



21/10/2026

VIBRO COMPACTADOR

Se realizó la movilización de la maquina, para seguir trabajando en los tramos de las veredas correspondientes al cronograma.

MOVILIZACIÓN DE VIBRO COMPACTADOR






30/09/2026

VOLQUETA

Se realizo despinchada de una llanta, se hizo cambio de parche, se vulcanizo y se hizo el respectivo engrase y revisión de crucetas, también se realizó cambio de neumático. Se cumplió con el mantenimiento requerido de la volqueta para prolongar el buen estado y vida útil de esta.

DESPINCHADA



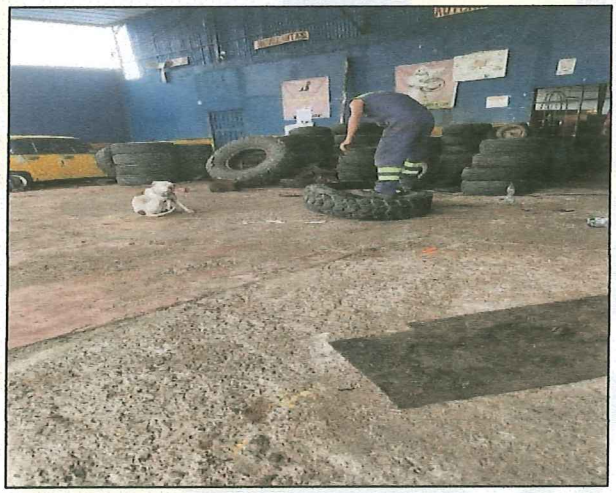


23/09/2026

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 15 de 40

CAMBIO PARCHE




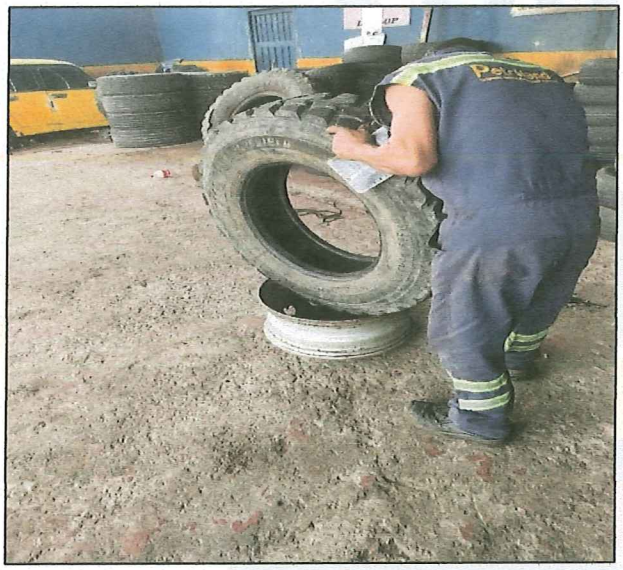

23/09/2026

VULCANIZADA




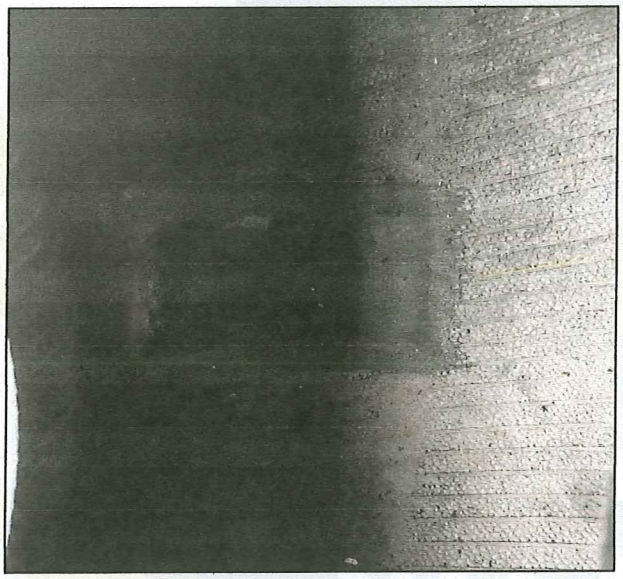

23/09/2026

ENGRASE Y REVISIÓN DE CRUCETAS




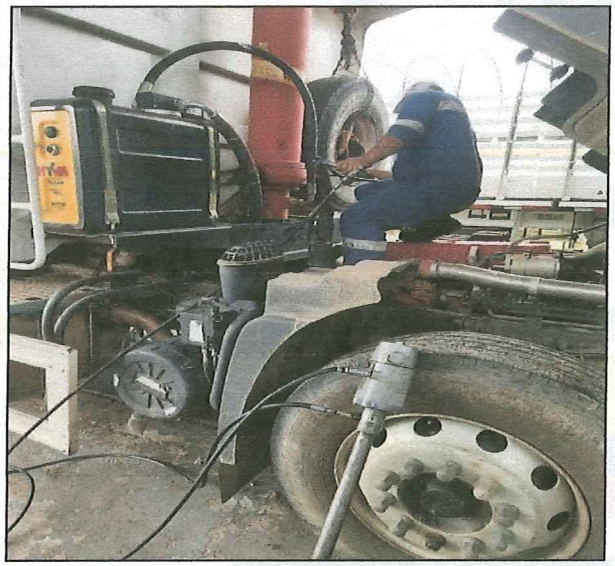

24/092026

CAMBIO DE NEUMATICO



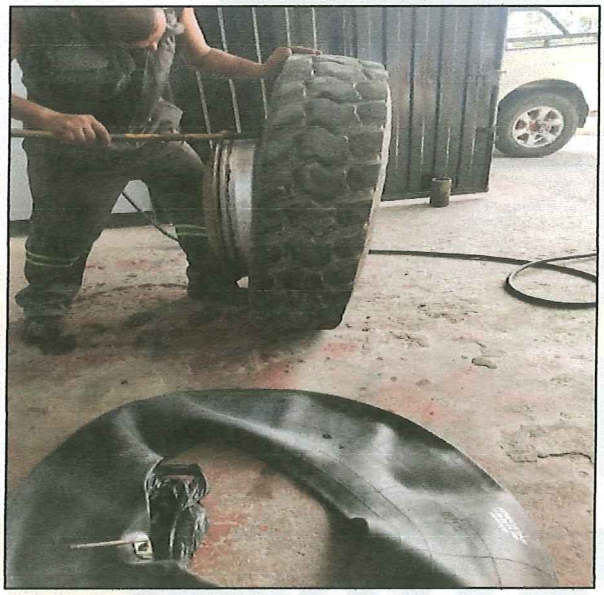

22/10/2026

EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

Se ejecutaron los siguientes ítems contractuales dando óptimo cumplimiento al Convenio Solidario con el fin de satisfacer las necesidades del Municipio de Tauramena;

AVANCE DE EJECUCIÓN - APORTE MUNICIPIO

ITEM 1. Conformación de las vías terciarias mediante trabajos en la subrasante (incluye: escarificar, perfilar, conformar, extender y compactar.). (las maquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo) 126 km.

Se adelantaron actividades de reconformación y recuperación de la banca, limpieza mecánica de cunetas, escarificación del material de afirmado existente, extensión y compactación de material para recuperación de los espesores de afirmado iniciales, todo esto en aras de brindar a los habitantes de cada uno de los sectores, las posibilidades de contar con vías que permitan el desarrollo adecuado de sus labores agrícolas, pecuarias y comerciales, mediante las siguientes actividades:

Se adelantaron actividades de reconformación y recuperación de la banca, mediante el empleo de la maquinaria amarilla, la motoniveladora inicio su operación de escarificación ubicándose en uno de los extremos del área donde baja los escarificadores hasta ponerlos en contacto con el material. Iniciará su maniobra lentamente hasta lograr penetrarlos a una profundidad adecuada de acuerdo con el tipo de material en tratamiento hasta llegar al extremo opuesto donde se da la vuelta y se regresa cubriendo la franja continua. Este proceso se repite hasta lograr cubrir toda el área.

Una vez se escarifico, la motoniveladora repitió la operación similar a la del escarificado, pero con la cuchilla ligeramente sesgada con el fin de acordonar el material a lo largo del área en tratamiento.

El Vibrocompactador inicio su maniobra de compactación previa preparación del área con la motoniveladora. Se ubicó en uno de los extremos de la vía hacia el borde y comenzó a desplazarse lentamente hasta llegar al otro extremo en donde se gira y se devuelve, este proceso se repite las veces que sea necesario hasta que se obtiene el grado de compactación adecuado.

Para el periodo comprendido entre el 23 de Septiembre al 25 de Octubre de 2026, se obtuvo un avance del 30,04% evidenciado en 37,85 km intervenidos.

- A continuación, se encuentra el registro fotográfico y mapeo de los tramos intervenidos.
- Vereda Iquia, Vereda Carupana, Vereda Tunupe, Barro libertad y Barrio Paraíso, del Municipio de Tauramena.

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA IQUIA – ANTES







REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA IQUIA - DURANTE








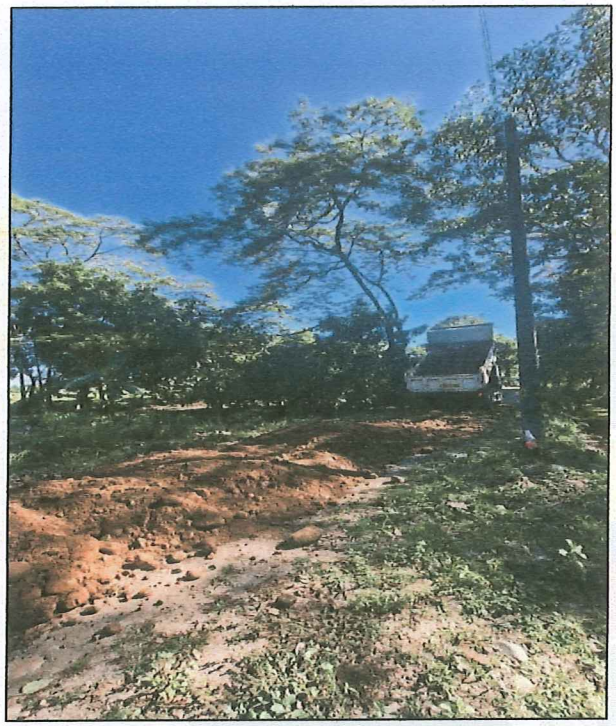

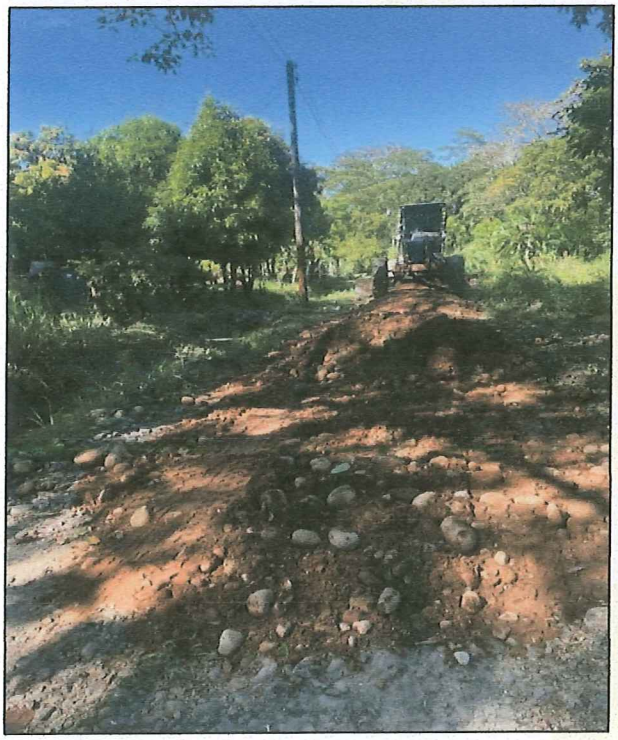

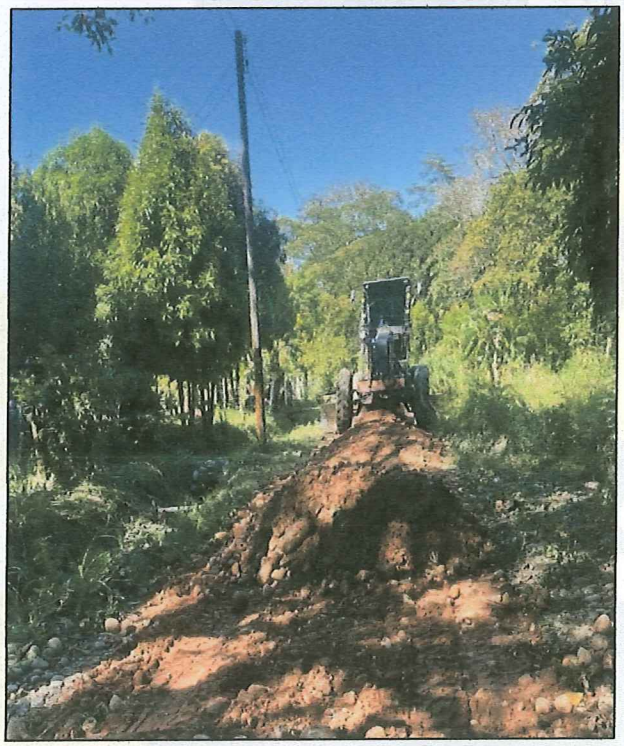

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA IQUIA – DESPUÉS





REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA CARUPANA – ANTES



REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA CARUPANA – DURANTE






	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 23 de 40

REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA CARUPANA –DESPUES



REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA TUNUPE-ANTES

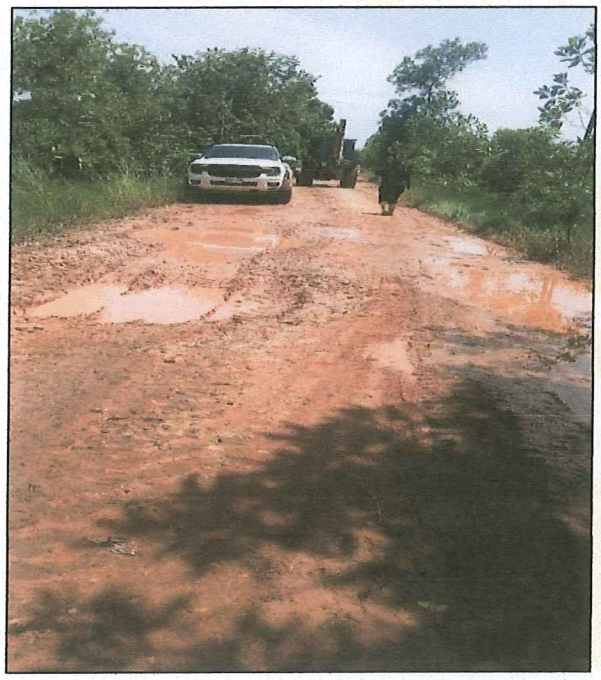





REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA TUNUPE-DURANTE




REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN VEREDA TUNUPE-DESPUES

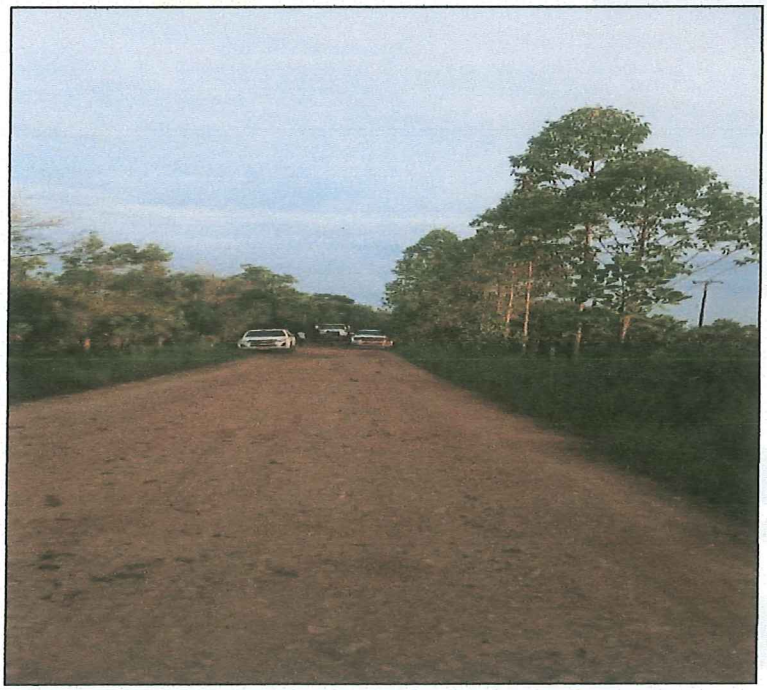



REGISTRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN BARRIO PARAÍSO-ANTES

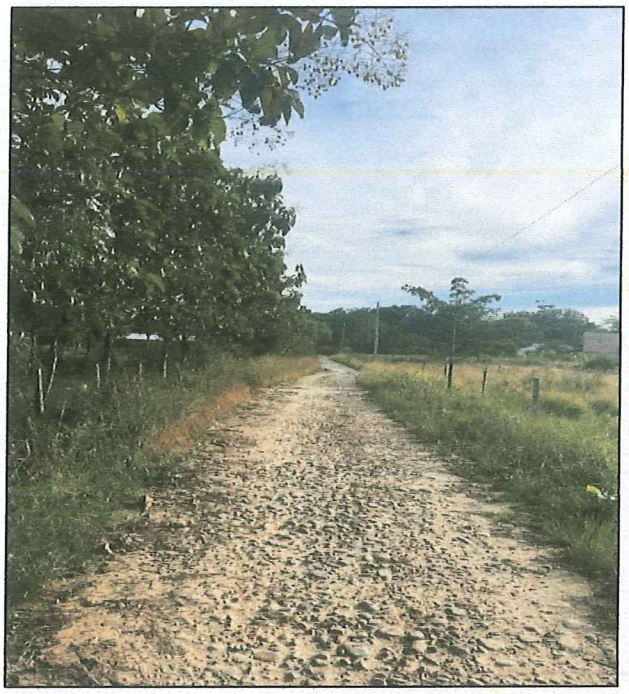

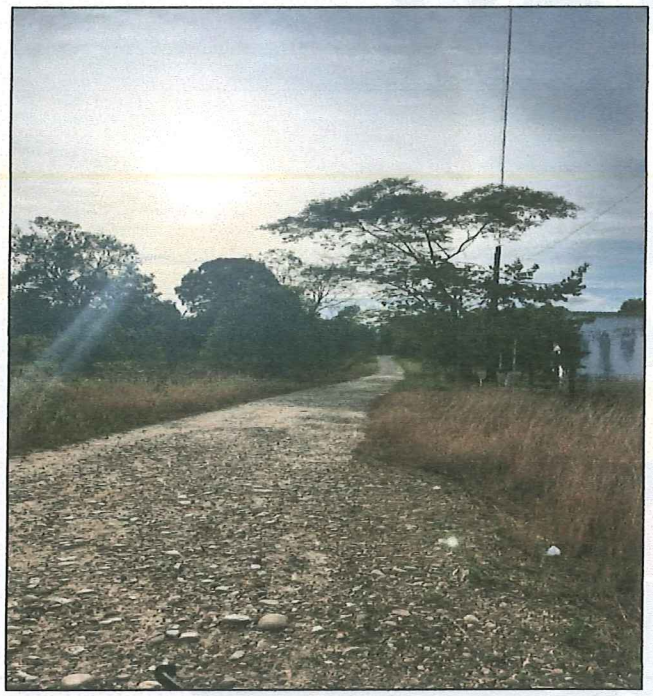



TRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN BARRIO PARAÍSO-DESPUES

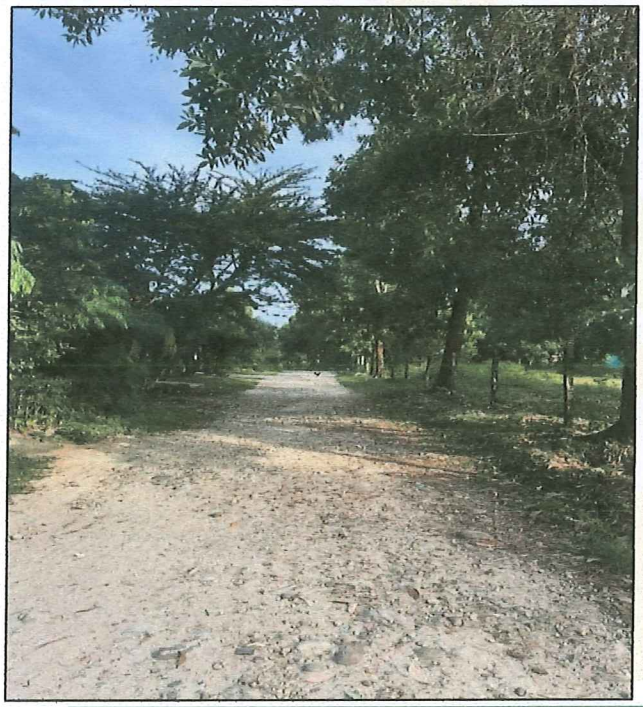

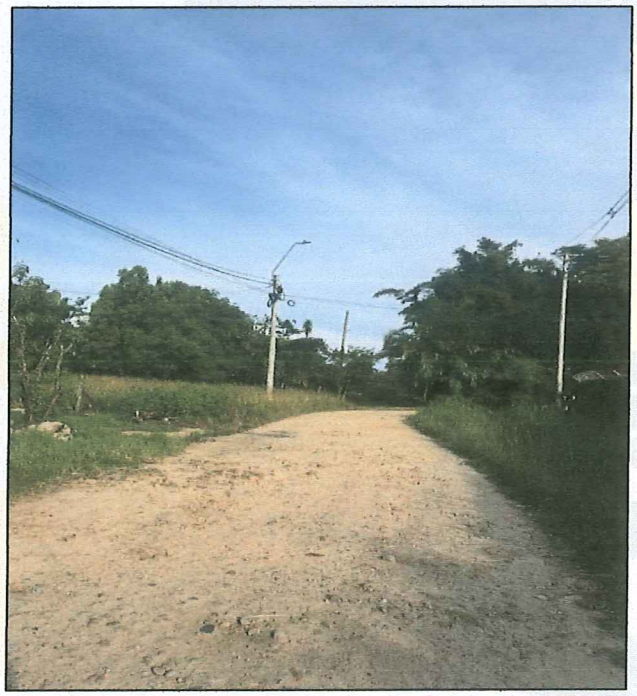


TRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN BARRIO LA LIBERTAD-ANTES

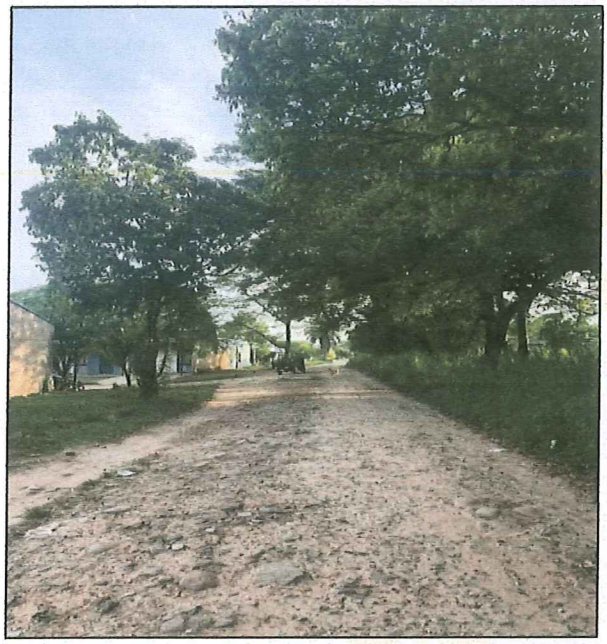

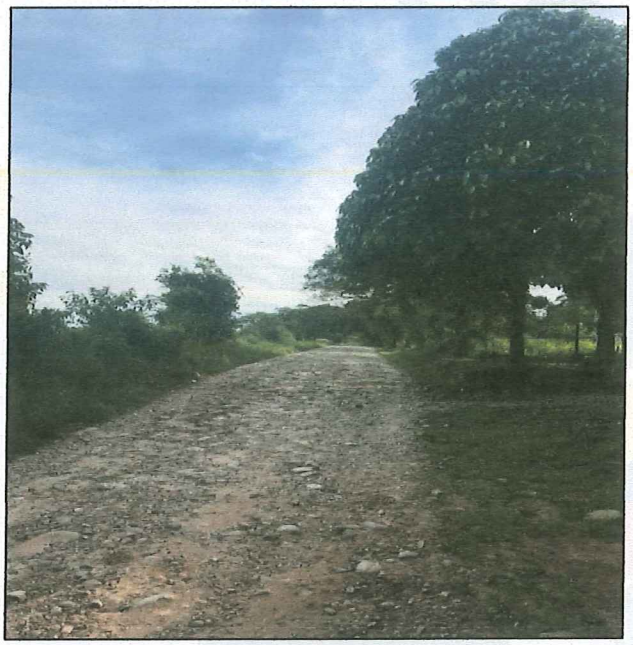

TRO FOTOGRÁFICO INTERVENCIÓN BARRIO PARAÍSO-DESPUES

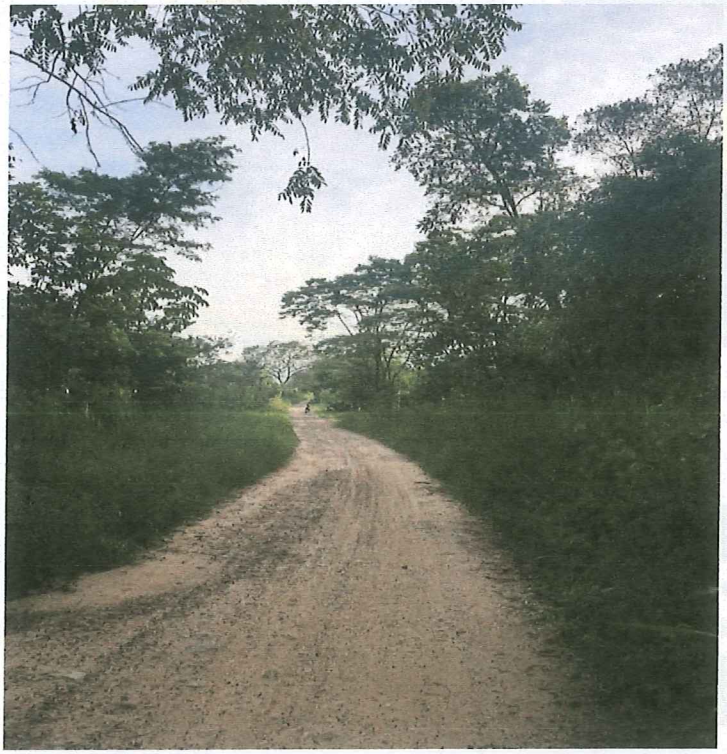

AVANCE DE EJECUCIÓN - APORTE POR PARTE DE ASOJUNTAS TAURAMENA

ITEM 2. Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m de cada lado).

El aporte por parte de la ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL "ASOJUNTAS TAURAMENA" Se evidencio mediante el apoyo en la ejecución de la actividad del mejoramiento de las vías terciarias del Municipio de Tauramena con el fin de garantizar la accesibilidad del área rural hacia la urbana y viceversa en donde se garantiza el tránsito de los usuarios en forma aceptable, permanente y que la circulación sufra las mínimas interrupciones, promoviendo más movilidad de bienes y pasajeros de este modo haciendo parte a las comunidades el proceso de desarrollo local, así mismo dar seguridad y comodidad a los vehículos que transitan por las vías, y que se vea reflejado en la economía, reducción en los tiempos de viaje y el deterioro que puedan tener.

Son actividades que de acuerdo con sus especificaciones no son complejas, no requieren tecnología avanzadas y se realizan con mano de obra local. Buscan dar cumplimiento a las metas establecidas en el plan de desarrollo nacional y territorial y propender por mejorar el acceso vehicular y peatonal de la población para el acceso a bienes y servicios en la población del Municipio, de igual modo mejorando la calidad de vida de los usuarios de estas vías.

- **Para el periodo comprendido entre el 23 de Septiembre al 25 de Octubre de 2026, para el desarrollo de este Ítem se obtuvo un avance del 20.00 % y 6 km.**

evidenciado en el siguiente registro fotográfico;




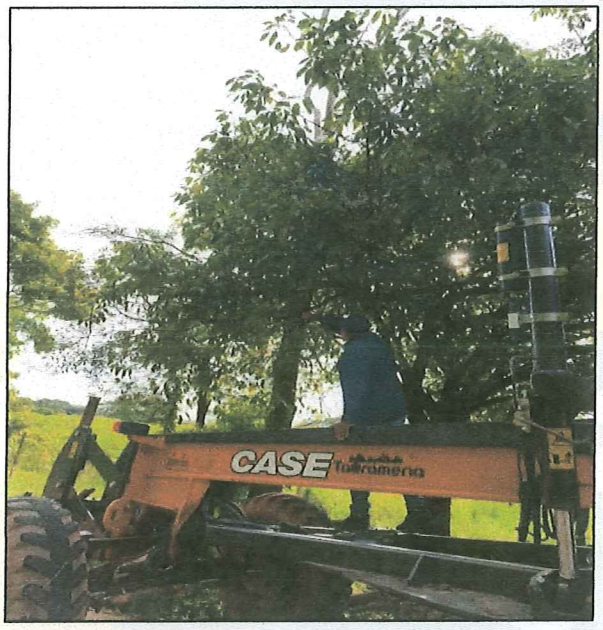


Fig. 1 intervención municipio tauramena, Vereda Iquia, se Intervinieron **25,2 kms.**



Fuente: Google Eart

Fig. 2 intervención municipio tauramena, Barrio La Libertad , se Intervinieron **1,30kms.**

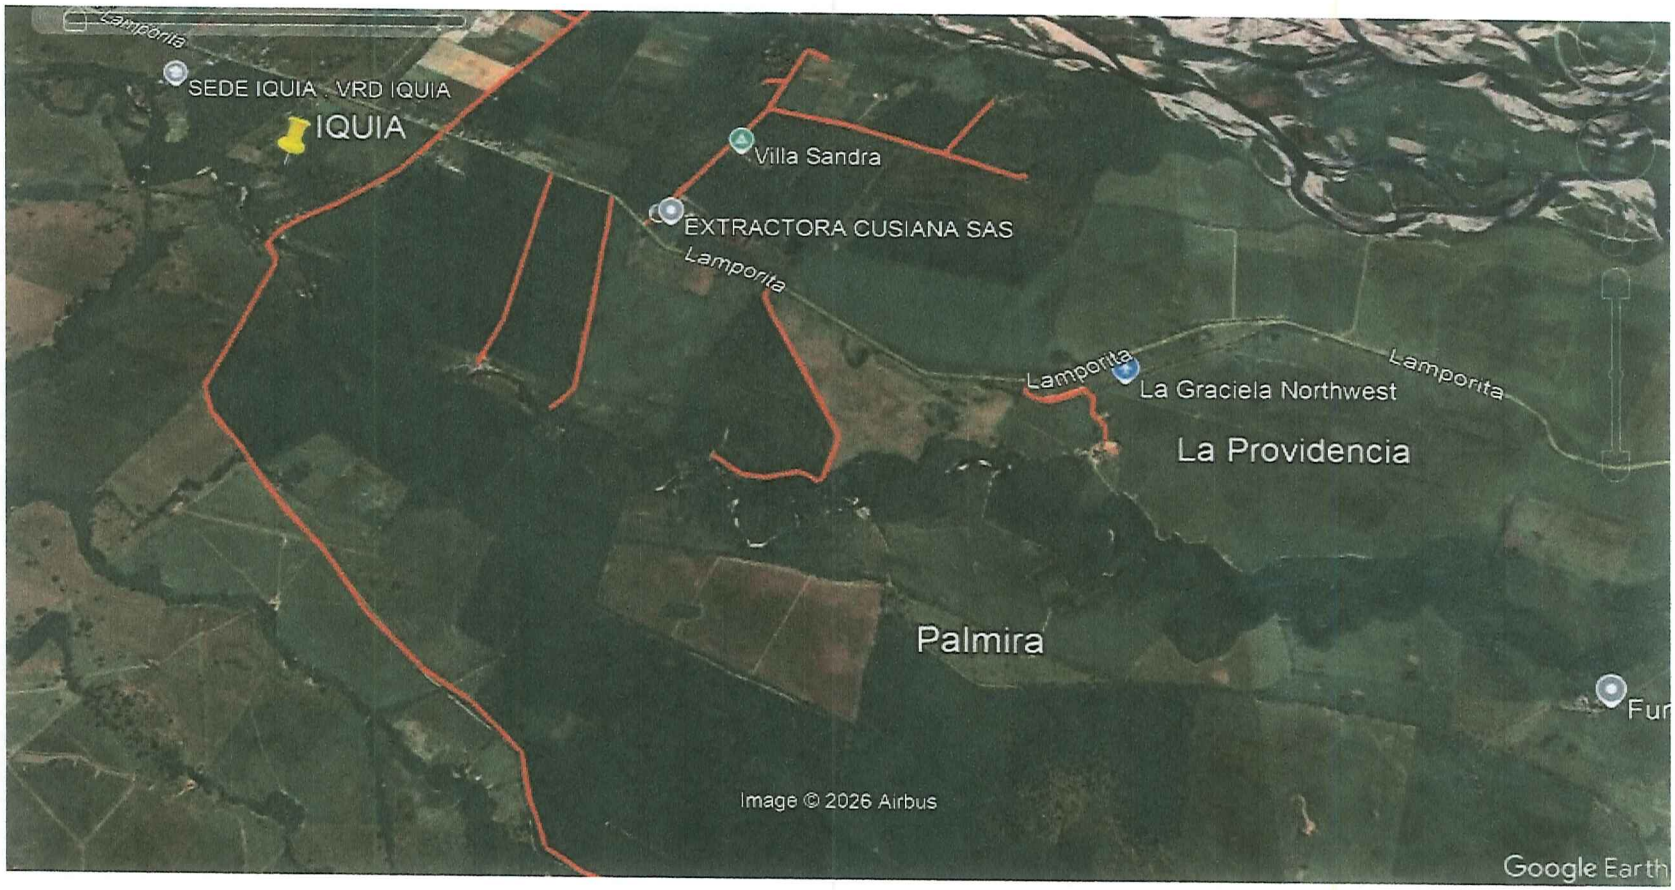

Fuente: Google Eart

Fig. 3 intervención municipio tauramena, Barrio Paraíso , se Intervinieron **0,77kms.**



Fuente: Google Eart

Fig. 4 intervención municipio tauramena, Vereda Carupana , se Intervinieron **3,79kms.**



Fuente: Google Eart

Fig. 5 intervención municipio tauramena, Vereda Tunupe , se Intervinieron **6,76kms.**



Fuente: Google Eart

INCOVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO.

La ejecución de los ítems contractuales del presente Convenio ha sido favorable gracias a las condiciones climáticas, el avance en kilometraje para el periodo comprendido desde el 23 de Septiembre al 25 de Octubre de 2026, mostró un mayor rendimiento en el avance de kilometraje.

AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO.

El presente Convenio Solidario No. 007 del 18 de Agosto de 2026 presenta el siguiente avance de ejecución:

Para el periodo comprendido entre el **23 de Septiembre al 25 de Octubre de 2026**:

- Kilometro intervenido diario:

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8

DESDE EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2026 AL 25 DE OCTUBRE DE 2026

DÍAS	KM INTERVENIDO DIARIO		DIA	TRAMOS INTERVENIDOS kms	LUGAR
1	1,50	km	23/09/2026		
2	1,48	km	24/09/2026		
3	1,45	km	25/09/2026		
DESCANSO			26/08/2026		
5	1,51	km	27/09/2026		
6	1,52	km	28/09/2026		
7	1,54	km	29/09/2026		
8	1,57	km	30/09/2026		
9	1,51	km	1/10/2026		
10	1,60	km	2/10/2026	25,23	IQUIA
DESCANSO			3/10/2026		
12	1,48	km	4/10/2026		
13	1,52	km	5/10/2026		
14	1,47	km	6/10/2026		
15	1,40	km	7/10/2026		
16	1,50	km	8/09/2026		
17	1,45	km	9/09/2026		
DESCANSO			10/10/2026		
19	1,40	km	11/10/2026		
20	1,33	km	12/10/2026		
21	1,35	km	13/10/2026		
22	1,30	km	14/10/2026		
23	1,40	km	15/10/2026	6,76	TUNUPE
24	1,35	km	16/10/2026		
DESCANSO			17/10/2026		
26	1,36	km	18/10/2026		
27	1,26	km	19/10/2026		
28	1,27	km	20/10/2026	3,79	CARUPANA
29	1,26	km	21/10/2026		
30	0,64	km	22/10/2026	1,30	LIBERTAD
31	0,66	km	23/10/2026		
DESCANSO			24/10/2026	0,77	PARAÍSO
33	0,77	km	25/10/2026		
TOTAL	37,85	km			

Bernabe V

BERNABE VIVAS BAUTISTA
Coordinador de Maquinaria
C.S. 007/2026

- Se presentan los siguientes Horómetros diarios:

HOROMETROS Y KILOMETRAJE MAQUINARIA CONVENIO 007 DE 2026											
MOTONIVELADORA			RETROEXCAVADORA			VIBROCOMPACTADOR			VOLQUETA		
FECHA	HORA	HM	FECHA	HORA	HM	FECHA	HORA	HM	FECHA	HORA	KM
22/09/2026	7:00 a. m.	2968	22/09/2026	7:00 a. m.	3332	22/09/2026	7:00 a. m.	2633	22/09/2026	7:00 a. m.	31852
23/09/2026	7:00 a. m.	2970	23/09/2026	7:00 a. m.	3335	23/09/2026	7:00 a. m.	2636	23/09/2026	7:00 a. m.	31947
24/09/2026	7:00 a. m.	2978	24/09/2026	7:00 a. m.	3343	24/09/2026	7:00 a. m.	2644	24/09/2026	7:00 a. m.	31990
25/09/2026	7:00 a. m.	2982	25/09/2026	7:00 a. m.	3347	25/09/2026	7:00 a. m.	2650	25/09/2026	7:00 a. m.	32015
-	-	-	28/09/2026	7:00 a. m.	3354	-	-	-	28/09/2026	7:00 a. m.	32072
-	-	-	29/09/2026	7:00 a. m.	3358	-	-	-	29/09/2026	7:00 a. m.	32160

TAURAMENA ACCION COMUNAL ASOJUNTAS	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 30 de 40

HOROMETROS Y KILOMETRAJE MAQUINARIA CONVENIO 007 DE 2026

MOTONIVELADORA			RETROEXCAVADORA			VIBROCOMPACTADOR			VOLQUETA		
FECHA	HORA	HM	FECHA	HORA	HM	FECHA	HORA	HM	FECHA	HORA	KM
30/09/2026	7:00 a. m.	_	30/09/2026	7:00 a. m.	3363	30/09/2026	7:00 a. m.	_	30/09/2026	7:00 a. m.	_
1/10/2026	7:00 a. m.	2990	1/10/2026	7:00 a. m.	_	1/10/2026	7:00 a. m.	2654	1/10/2026	7:00 a. m.	32301
2/10/2026	7:00 a. m.	2995	2/10/2026	7:00 a. m.	3372	2/10/2026	7:00 a. m.	2661	2/10/2026	7:00 a. m.	
5/10/2026	7:00 a. m.	2998	5/10/2026	7:00 a. m.	3377	5/10/2026	7:00 a. m.	2664	5/10/2026	7:00 a. m.	32367
6/10/2026	7:00 a. m.	3006	6/10/2026	7:00 a. m.	3383	6/10/2026		2671	6/10/2026	7:00 a. m.	32382
7/10/2026	7:00 a. m.	3014	7/10/2026	7:00 a. m.	3391	7/10/2026		2677	7/10/2026	7:00 a. m.	32398

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		Página 31 de 40

HOROMETROS Y KILOMETRAJE MAQUINARIA CONVENIO 007 DE 2026											
MOTONIVELADORA			RETROEXCAVADORA			VIBROCOMPACTADOR			VOLQUETA		
FECHA	HORA	HM	FECHA	HORA	HM	FECHA	HORA	HM	FECHA	HORA	KM
9/10/2026	7:00 a. m.	3020	9/10/2026	7:00 a. m.	3399	9/10/2026	7:00 a. m.	2682	9/10/2026	7:00 a. m.	32407
13/10/2026	7:00 a. m.	3023	13/10/2026	7:00 a. m.	3403	13/10/2026	7:00 a. m.	2687	13/10/2026	7:00 a. m.	32548
14/10/2026	7:00 a. m.	3030	14/10/2026	7:00 a. m.	3410	14/10/2026	7:00 a. m.	2693	14/10/2026	7:00 a. m.	32607
15/10/2026	7:00 a. m.	3035	15/10/2026	7:00 a. m.	3416	15/10/2026	7:00 a. m.	2699	15/10/2026	7:00 a. m.	32654
16/10/2026	7:00 a. m.	3040	16/10/2026	7:00 a. m.	3421	16/10/2026		2705	16/10/2026	7:00 a. m.	32708
19/10/2026	7:00 a. m.	3047	19/10/2026	7:00 a. m.	3427	19/10/2026		2710	19/10/2026	7:00 a. m.	32821

- Presupuesto y memorias acta de recibo:

ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA "ASOJUNTAS"
CAMARA DE COMERCIO No. 1077 DE MARZO DE 1999
Nit. 900.022.220-8


CONDICIONES CONTRACTUALES						EJECUTADO ACTAS ANTERIORES		EJECUTADO PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL	CANT	VR.PARCIAL	CANT	VR. PARCIAL
A	APORTE DEL MUNICIPIO										
1	Conformación de las vías terciarias mediante trabajos en la subrasante (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, extender y compactar). (Las máquinas son del Municipio de Tauramena, no incluye costo equipo)	km	126,00	$ 2.967.315,00	$ 373.881.690,00	28,60	$ 84.865.209,00	37,85	$ 112.312.873,00	66,45	$ 197.178.082,00
COSTO TOTAL APORTE MUNICIPIO					$ 373.881.690,00		$ 84.865.209,00		$ 112.312.873,00		$ 197.178.082,00
B.	APORTE ASOJUNTAS										
2	Limpieza y desmonte para el mantenimiento de la franja vial (a=3m a cada lado)	km	30,00	$ 1.401.265,00	$ 42.037.950,00	6,00	$ 8.407.590,00	6,00	$ 8.407.590,00	12,000	$ 16.815.180,00
COSTO TOTAL APORTE ASOJUNTAS					$ 42.037.950,00		$ 8.407.590,00		$ 8.407.590,00		$ 16.815.180,00
COSTO TOTAL CONVENIO SOLIDARIO					$ 415.919.640,00		$ 93.272.799,00		$ 120.720.463,00		$ 213.993.262,00


VALOR TOTAL EJECUTADO APORTE MUNICIPIO PRESENTE ACTA	$ 112.312.873,00
ANTICIPO / AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO APORTE MUNICIPIO (0%)	$ 0,00
SALDO POR EJECUTAR APORTE MUNICIPIO	$ 176.703.608,00
VALOR POR PAGAR DEL APORTE DEL MUNICIPIO	$ 112.312.873,00

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		PAGINA 1 DE 1

- **Aporte Municipio** se obtuvo un avance del **30.04%** evidenciado en **37.85 km** intervenidos.

Aporte Asojuntas Tauramena se obtuvo un avance del **20.00%** evidenciado en 6 **km** intervenidos.

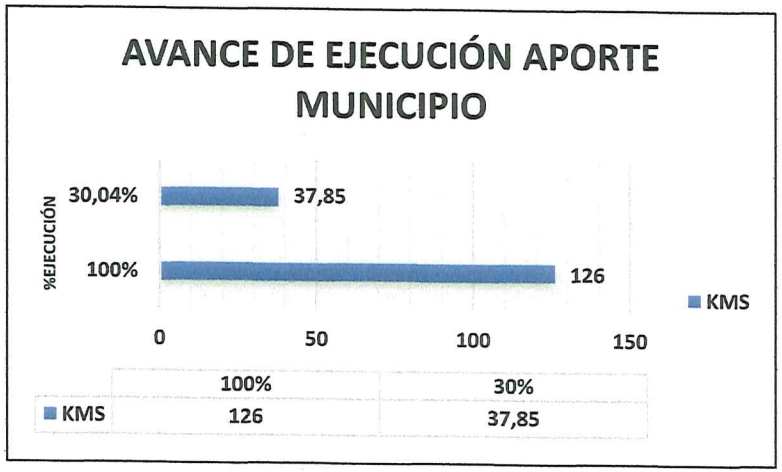

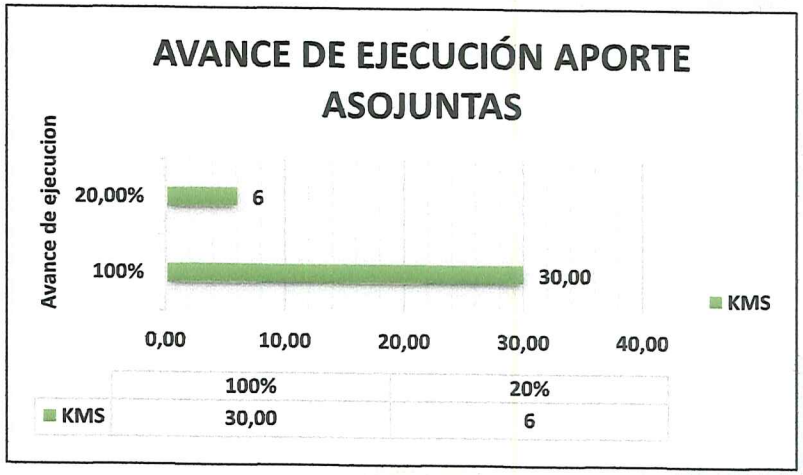


HENRY PAUL ALFONSO
Representante legal ASOJUNTAS
NIT. No. 900.002.220-8

	INFORME DE EJECUCION	**COD: AJC-HSEQ-FO-16**
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	**Versión: 00**
		PAGINA 1 DE 1

ANEXO No.1

BITÁCORA

tación en 0,80 Km de la vereda Agua blanca
Responsable.



Ing. Residente


23-04-2026

Mañana = Soleado
Tarde = Soleado ← Clima

Personal : 4 operadores
1 Coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades de escarificación disgregación. Compactación y limpieza de la vía a lado y lado en 150 Km de la vereda iquira.

Responsable.



Ing. Residente


24-04-2026

Clima : Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal : 4 operadores
1 Coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades de escarificar, Perfilar, Conformar, extender y Compactar, limpieza a lado y lado de la vía en 1,48 Km de la Vereda Iquira

Responsable.



Ing. Residente

25-04-2026

Clima : Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal : 4 operadores
1 Coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se llevan acabo actividades de escarificar, Perfilar, Conformar, extender y Compactar, tambien se hace limpieza a lado y lado de la vía

en 1,45 Km de la Vereda Iquira.

Responsable.

Ing Residente

28-04-2026

Clima: Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal: 4 Operadores
1 Coordinador Maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades de escarificacion, Perfilacion, Conformacion, y Compactacion, se realiza Limpieza de la via a lado y lado en 1,52 Km de la Vereda Iquira.

Responsable.

Ing Residente

29-04-2026

Clima: Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal: 4 Operadores
1 Coordinador Maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades de escarificacion, Perfilacion, Conformacion, y Compactacion, tambien se realiza Limpieza a lado y lado de la via en 1,54 Km de la Vereda Iquira.

Responsable.

Ing Residente

30-04-2026

Clima: Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal: 4 Operadores
1 Coordinador Maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades de escarifi-
cacion, perfilacion, conformacion, y
compactacion, se realiza limpie-
za a lado y lado de la via en
1,57 km de la vereda iquira.
Responsable.

Ing. Residente

01-10-2026

Clima: mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal: 4 Operadores
1 Coordinador Maquinaria
1 Inspector SST

Se llevan acabo actividades de
escarificacion, perfilacion, conforma-
cion y compactacion, tambien
se hace limpieza de la via a
lado y lado, en 15,1 km de
la vereda iquira.
Responsable.

Ing. Residente

02-10-2026

Clima: mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal: 4 Operadores
1 Coordinador Maquinaria
1 Inspector SST

Se llevan acabo actividades de escari-
ficacion, perfilacion, conformacion
y compactacion en la via, tambien
se hace respectiva limpieza a lado
y lado de la via, en 1,60 km
de la vereda iquira.
Responsable.

Ing. Residente

05-10-2026

Clima: Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal: 4 operadores
1 Coordinador Maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades de escarificación, Perfilación, Conformación y Compactación en la vía, tambien se hizo limpieza de esta a lado y lado en 1,52 Km de la vereda Iquira.

Responsable.

Ing. Residente

06-10-2026

Clima: mañana = Soleado
Tarde = Soleado

4 operadores

Personal: 1 Coordinador Maquinaria
1 Inspector SST

Se llevan acabo actividades de escarificación, Perfilación, Conformación y Compactación, limpieza a lado y lado de la vía, en 1,47 Km de la vereda Iquira.

Responsable.

Ing. Residente

07-10-2026

Clima: Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

4 operadores

Personal: 1 Coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades en la vía de escarificación, Perfilación, Conforma-

ción y Compactación, además se hizo limpieza de la vía, en 1,40 km de la vereda Iquira.

Responsable.

Ing. Residente

8-10-26

Clima= Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal= 4 Operadores
1 Coordinador Maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades de escarificación, Perfilación, Conformación y Compactación, también se realizó limpieza a lado y lado de la vía en 1,50 km de la vereda Iquira

Responsable

Ing. Residente

10-10-2026

Clima: Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal: 4 Operadores
1 Coordinador Maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades de escarificación, Perfilación, Conformación y Compactación en la vía, también se hace Limpieza a lado y lado, en 1,45 km de la vereda Iquira.

Responsable

Ing. Residente

13-10-2026

Clima= Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal= 4 Operadores
1 Coordinador Maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan acabo actividades de ercaRificacion, Perfilacion, Conformacion y Compactacion, limpieza a lado y lado de la via, en 1,35 km de la vereda iguia.

Responsable. Ing Residente.

14-10-2026

Clima: Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal: 4 operadores
1 Coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se realizaron actividades de ercaRificacion, Perfilacion, Conformacion y Compactacion, tambien se hizo limpieza a lado y lado de la via en 1,30 km de la vereda iguia.

Responsable. Ing. Residente

15-10-2026

Clima: Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal: 4 operadores
1 Coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se llevan acabo actividades de ercaRificacion, Perfilacion, Conformacion y Compactacion en la via, tambien se hace limpieza a lado y lado en 1,40 km de la vereda iguia.

Responsable. Ing. Residente

16-10-2026

Clima: Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal: 4 operadores
1 Coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan actividades de escarificación, Perfilación, Conformación y Compactación en la vía, también se hace limpieza a lado y lado de la vía en 1,35 km de la vereda Iguira.

Responsable.

Ing. Residente

10-10-2026

Clima: Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

4 operadores

Personal: 1 Coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se realizan las correspondientes actividades de escarificación, Perfilación, Conformación y Compactación en la vía, se hizo limpieza a lado y lado de la vía, en 1,25 km de la vereda Iguira.

Responsable.

Ing. Residente

20-10-2026

Clima: Mañana = Soleado
Tarde = Soleado

Personal: 4 operadores
1 Coordinador maquinaria

1 Inspector SST

Se llevan acabo actividades de escarificacion, Perfilacion, Conformacion y Compactacion en la via, tambien se hace limpieza a lado y lado de la via en 1,27 km de la Vereda Iquia.

Responsable.

Ing Residente.

21-10-2026

Clima: mañana= soleado
tarde = soleado

Personal: 4 operadores
1 Coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se llevan acabo actividades de escarificacion, Perfilacion, Conformacion y Compactacion en la via, tambien se hace limpieza a lado y lado de la via, en 1,26 km de la Vereda Iquia Responsable.

Ing. Residente

22-10-2026

Clima: mañana= soleado
tarde = soleado

Personal: 4 operadores
1 Coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se llevan acabo actividades de escarificacion, Perfilacion, Conformacion y Compactacion en la via, tambien se hace la respectiva limpieza a lado y

lado de la via en 0+64 km de la vereda Iquira.

Responsable.

Ing. Residente

23-10-2026

Clima: Mañana= Soleado
Tarde= Soleado

Personal: 4 operadores
1 Coordinador maquinaria
1 Inspector SST

Se llevan acabo actividades de escarificacion, perfilacion, conformacion y compactacion en la via y limpieza a lado y lado de la via en 0+66 km de la vereda Iquira.

Responsable.

Ing. Residente

	INFORME DE EJECUCION	COD: AJC-HSEQ-FO-16
		01/10/2024
	SISTEMA DE GESTION HSEQ	Versión: 00
		PAGINA 1 DE 1

ANEXO No.2

INFORME DE GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTA DE REVISIÓN TÉCNICA

RECEPCIÓN DE INFORMES COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
OBRA: Obras de conformación de la red vial terciaria, etapa 1 2026, del Municipio de Tauramena Casanare.	**CONVENIO:** 007 DEL 2026	
	INFORME N°: **2**	**FECHA RECEPCIÓN:** 22/10/2026
DESCRIPCIÓN DE LA RECEPCIÓN		
Se recibe para revisión técnica el Informe de Gestión del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), correspondiente al período del 23 septiembre de 2026 al 25 de octubre 2026, junto con sus respectivos soportes documentales para verificación de cumplimiento y trazabilidad.		
REMITENTE: DAYANNA PINEDA	**FIRMA:** Dayanna Pineda.	
DEPENDENCIA: Profesional SST		
ASPECTOS DE CONTROL		
OBSERVACIONES	**CIERRE Y SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES DEL PRIMER INFORME** En el marco de la revisión documental del segundo informe, se efectuó la verificación de las observaciones identificadas en el periodo anterior, relacionadas con la vinculación del personal operativo, los ajustes a los aportes al Sistema General de Seguridad Social y la consolidación de los soportes de pago correspondientes. Como resultado del seguimiento, se dio cierre a las observaciones que fueron debidamente subsanadas, previa validación de los documentos aportados y su correspondencia con las obligaciones contractuales en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Los soportes asociados a periodos de liquidación posteriores continuarán sujetos a seguimiento hasta su presentación y validación, garantizando la trazabilidad documental y el control del cumplimiento de los requisitos aplicables.	
RESULTADO DE LA REVISIÓN		
ACEPTADO ☐	**EN OBSERVACION** ☐	**RECHAZADO** ☐
REGISTRO VISTO BUENO		
NOMBRE: CRISTHIAN ANGEL		
FIRMA:	**FECHA:**26/10/2026	

642

INFORME DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CONVENIO N.º 007 DEL 2026

''OBRAS DE CONFORMACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ETAPA 1 2026, MUNICIPIO 'DE TAURAMENA''

ALCALDIA MUNICIPAL DE TAURAMENA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

INFORME N° 02

TAURAMENA – CASANARE

23 SEPTIEMBRE DE 2026 A 25 DE OCTUBRE DE 2026

CONTENIDO

OBJETO....3

1. EJECUCIÓN INICIO DEL CONTRATO....3

1.1. Exámenes Médicos Ocupacionales:....4

1.2. Afiliaciones al SGSS y/o pago de planilla....4

2. CRONOGRAMA ACTIVIDADES Y CHARLAS DE SST....4

2.1. Registro de asistencia....6

3. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO....6

3.1. Análisis Seguro de Trabajo AST....6

3.2. Política SST....6

4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD....6

4.1. Inspección preoperacional de herramientas manuales, eléctricas y maquinaria....7

4.2. Inspección de botiquín....7

4.3. Reportes a ARL e Inspecciones en primeros auxilios....7

4.4. Estadísticas de accidentalidad....7

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO....9

6. NOVEDAD....9

7. ANEXOS....10

Periodo del informe: Del 23 de septiembre de 2026 a 25 de octubre del 2026

Fecha de presentación: 26 de octubre de 2026

Contrato: 007 del 2026

OBJETO: OBRAS DE CONFORMACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA, ETAPA 1 2026, MUNICIPIO DE TAURAMENA.

1. EJECUCIÓN INICIO DEL CONTRATO

Relación del personal vinculado a las actividades del contrato

- **Personal administrativo**

ITEM	NOMBRES	N° DE DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	Dayanna Karina Pineda Sarmiento	C.C. 1115.918051	Profesional SST	27/08/2026	ACTIVO
2	María Guadalupe Romero Acevedo	C.C. 1.121.938.210	Ingeniera civil	27/08/2026	ACTIVO

- **Personal operativo.**

ITEM	NOMBRES	N° DE DOCUMENTO	CARGO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
1	José Isidro Alfonso Alfonso	C.C. 74.856.553	Operador Retroexcavadora	27/08/2026	ACTIVO
2	Yimi Andrés Ramírez Sasa	C.C. 1.030.583.013	Operador Motoniveladora	27/08/2026	ACTIVO
3	Bernabé Vivas Bautista	C.C. 74.856.459	Coordinador de maquinaria	27/08/2026	ACTIVO
4	Anderson Carvajal Duque	C.C 1.115.914.394	Operador Volqueta	09/09/2026	ACTIVO
5	Wilman Herney Melo Lozano	C.C. 80129998	Operador Vibrocompactador	27/08/2026	ACTIVO

1.1. Exámenes Médicos Ocupacionales:

En cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, se deja constancia de que los exámenes médicos ocupacionales de ingreso del personal vinculado al Convenio Solidario No. 007 de 2026 fueron realizados y reportados en el **Informe No. 1**, junto con sus respectivos soportes. A la fecha del presente informe, no se registran novedades ni modificaciones relacionadas con este aspecto. Por lo anterior, y con el fin de evitar la duplicación de información, se mantiene como referencia la documentación presentada en el informe anteriormente mencionado.

1.2. Afiliaciones al SGSS y/o pago de planilla.

En cumplimiento de la normatividad vigente y de las obligaciones establecidas para la ejecución del Convenio Solidario N.° 007 de 2026, se informa que los soportes de afiliación del personal vinculado al Sistema General de Seguridad Social (SGSS) fueron presentados en el Informe No. 1. A la fecha del presente informe, se mantiene el mismo personal relacionado anteriormente, sin novedades en cuanto a su vinculación. Por lo anterior, no se anexan nuevamente los documentos de afiliación; sin embargo, se adjunta el soporte de pago de la planilla de seguridad social correspondiente al mes de septiembre reportado, como evidencia del cumplimiento de las obligaciones respectivas. *(Ver **Anexo 1.** Pago de Planilla de SGSS).*

2. CRONOGRAMA ACTIVIDADES Y CHARLAS DE SST.

El cronograma de actividades es una herramienta de planificación que organiza de manera diaria las charlas y capacitaciones dirigidas a los trabajadores, con el propósito de fomentar el autocuidado, prevenir accidentes y fortalecer las medidas de seguridad y salud en el trabajo. *(Ver **Anexo 2.** Registro de asistencia a las charlas diarias y cronograma).*

FECHA	TEMATICA CHARLA
23 septiembre 2026	Operación segura de maquinaria pesada
24 septiembre 2026	Reporte oportuno de fallas mecánicas
25 septiembre 2026	Distancias de seguridad en obra
26 septiembre 2026	Bloqueo y aseguramiento del equipo

28 septiembre 2026	Fatiga y pausas activas en operadores
29 septiembre 2026	Señalización en maniobras de maquinaria
30 septiembre 2026	Puntos ciegos en maquinaria
01 octubre 2026	Comunicación asertiva entre operadores
02 octubre 2026	Uso adecuado de EPP en operación de maquinaria
05 octubre 2026	Riesgo de volcamiento
06 octubre 2026	Control de derrames de combustible
07 octubre 2026	Revisión de frenos y sistema hidráulico
08 octubre 2026	Trabajo seguro en cargue y descargue
09 octubre 2026	Revisión de luces
10 octubre 2026	Uso correcto del cinturón de seguridad
13 octubre 2026	Arranque y apagado seguro del equipo
14 octubre 2026	Señales manuales para maniobras
15 octubre 2026	Ingreso y salida segura del área de trabajo
16 octubre 2026	Prevención de choques
19 octubre 2026	Uso seguro de estabilizadores
20 octubre 2026	Trabajo en equipo
21 octubre 2026	Autocuidado laboral.
22 octubre 2026	Trabajo en equipo.
23 octubre 2026	Comunicación asertiva.

2.1. Registro de asistencia

En el marco de la ejecución del Convenio Solidario No. 007 de 2026, se llevó un registro de asistencia del personal vinculado a las diferentes jornadas de trabajo, inducción, reinducción, capacitaciones y actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Este control permitió documentar la participación del personal en las actividades programadas y verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el desarrollo seguro de las labores operativas.

3. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

3.1. Análisis Seguro de Trabajo AST.

La implementación y socialización del Análisis Seguro de Trabajo (AST) correspondiente a las actividades operativas del Convenio Solidario N.° 007 de 2026 fue reportada en el **Informe No. 1**, junto con las respectivas evidencias de socialización. A la fecha del presente informe, no se registran novedades que requieran actualizar la información previamente presentada. Por lo anterior, y con el fin de evitar la duplicación de información y soportes, no se anexan nuevamente las evidencias, las cuales reposan en el informe anteriormente mencionado.

3.2. Política SST

La Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Tauramena fue socializada con el personal vinculado al Convenio Solidario N.° 007 de 2026 al inicio de su ejecución. La documentación y las evidencias correspondientes fueron presentadas en el **Informe No. 1**. A la fecha del presente informe, no se registran novedades ni modificaciones relacionadas con esta política, por lo cual, con el fin de evitar la duplicación de información y soportes, no se anexan nuevamente los documentos previamente entregados.

4. INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Durante la ejecución del Convenio Solidario N.° 007 de 2026, se realizaron inspecciones de seguridad en el frente de maquinaria, con el propósito de verificar el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas, identificar condiciones y/o actos inseguros y definir las acciones correctivas correspondientes. Estas inspecciones permitieron evaluar el estado

general de la maquinaria, la operación segura de los equipos, el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), las condiciones del área de trabajo y el cumplimiento de los procedimientos operativos durante el desarrollo de las actividades.

4.1. Inspección preoperacional de herramientas manuales, eléctricas y maquinaria

En el marco del Convenio Solidario No. 007 de 2026, se efectuaron inspecciones preoperacionales a la maquinaria empleada en las obras de conformación de la red vial terciaria, etapa 1 2026, municipio de Tauramena. Dichas inspecciones, registradas en el formato correspondiente de control de maquinaria, permitieron verificar el estado general, funcionamiento y condiciones de seguridad de los equipos, garantizando su uso adecuado y la prevención de riesgos durante la ejecución de las actividades. *(Ver **Anexo 3.** Inspección preoperacional).*

4.2. Inspección de botiquín

En el marco de la ejecución del Convenio Solidario N.° 007 de 2026, la inspección del botiquín de primeros auxilios asignado a la maquinaria utilizada en las obras de conformación de la red vial terciaria, etapa 1 de 2026, en el municipio de Tauramena, fue reportada en el **Informe No. 1**, junto con su respectiva evidencia. A la fecha del presente informe, el botiquín se encuentra en condiciones adecuadas para su uso, con los elementos disponibles en buen estado, sin insumos vencidos ni novedades que requieran reposición. Por lo anterior, no se anexan nuevamente los soportes de la inspección, con el fin de evitar la duplicación de información.

4.3. Reportes a ARL e Inspecciones en primeros auxilios


No se presentaron accidentes entre el mes de septiembre y octubre del presente año.

4.4. Estadísticas de accidentalidad

La siguiente gráfica muestra que, durante los días laborados en los meses de septiembre y octubre, en el marco del Convenio Solidario No. 007-2026, no se presentaron incidentes ni accidentes laborales asociados a la operación de maquinaria, ni del personal administrativo. Este resultado evidencia la efectividad de las medidas preventivas implementadas, así como el compromiso de los operadores y del personal de apoyo con la aplicación de prácticas seguras durante la ejecución de las actividades de conformación de subrasante para la red

vial terciaria. Durante la ejecución del convenio se realizó un seguimiento permanente a las estadísticas de accidentalidad y eventos laborales relacionados con la operación de maquinaria, lo cual permitió evidenciar un comportamiento favorable en materia de prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales derivadas de la manipulación y operación de los equipos. No obstante, se continúa fortaleciendo la sensibilización frente a los riesgos y peligros propios de la operación de maquinaria, con el fin de mantener y consolidar una cultura de prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo.

A continuación, se presenta la tabla con los datos consolidados correspondientes a este ítem:

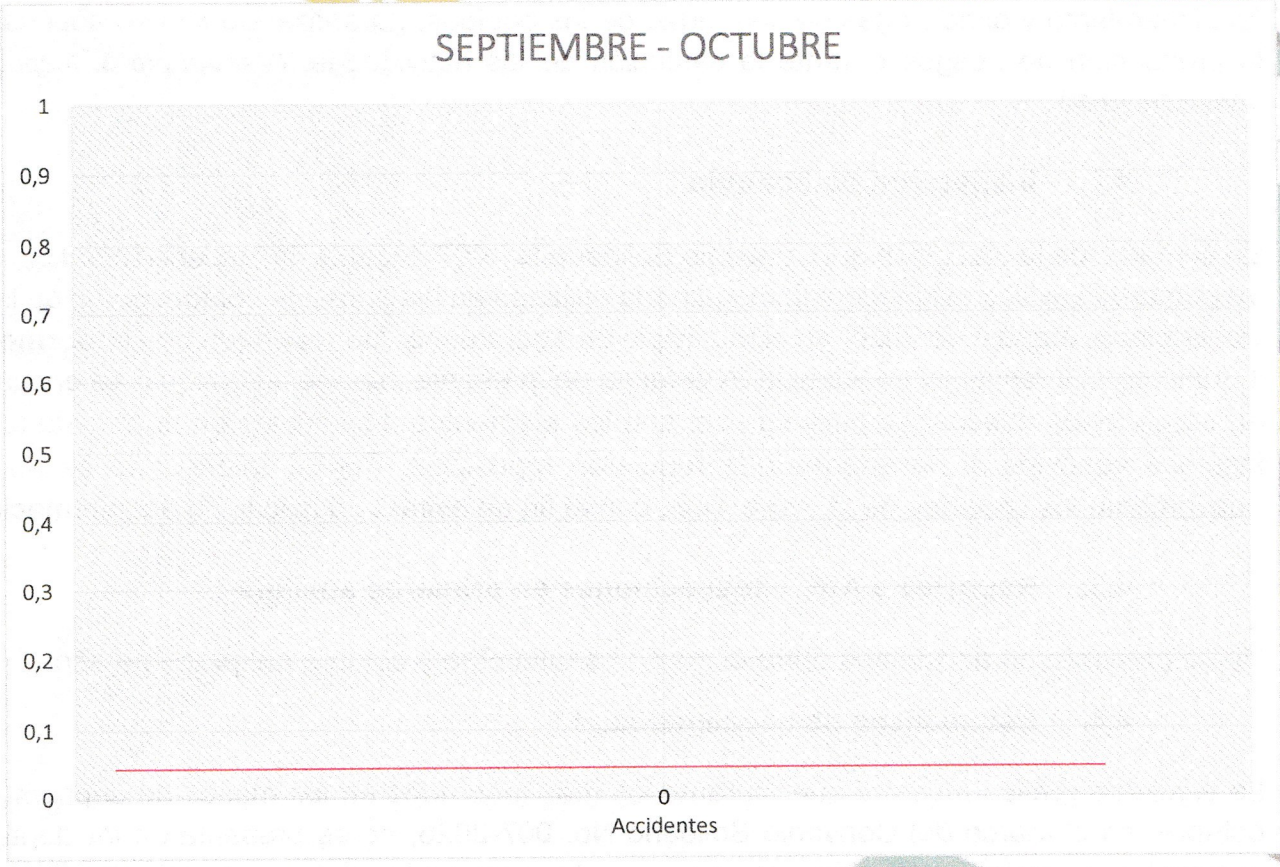

NÚMERO DE DÍAS LABORADOS PERSONAL OPERATIVO	**24**
NÚMERO DE DÍAS LABORADOS PERSONAL ADMINISTRATIVO	**24**
Días sin Accidentes laborales Registrables	**24**
Horas hombre laboradas (contemplando personal operativo y administrativo 24 días trabajados a la fecha)	**1.344**
Accidentes de trabajo reportados en el periodo	**0**
Enfermedades laborales registradas	**0**
Casos de primeros auxilios registrados	**0**

5. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

El registro fotográfico evidencia las actividades realizadas durante la ejecución del Convenio N.° 007 de 2026, así como la aplicación de las medidas HSE y el uso adecuado de los equipos de protección personal en campo. *(Ver **Anexo 4.** Registro fotográfico.)*

6. NOVEDAD.

Durante la ejecución del Convenio Solidario N.° 007 de 2026, el operador del vibrocompactador reportó la necesidad de realizar el cambio de bujes y pasadores de los gatos cilíndricos del equipo, con el propósito de mantener su adecuado funcionamiento y garantizar condiciones seguras durante el desarrollo de las actividades operativas. Ante esta novedad, la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Tauramena adelantó las gestiones correspondientes y realizó la compra de los repuestos requeridos para efectuar las reparaciones necesarias. A la fecha del presente informe, se encuentra pendiente la instalación de dichos repuestos y la ejecución de los trabajos de mantenimiento correspondientes, los cuales están próximos a realizarse. Con estas acciones se busca atender oportunamente la novedad reportada, conservar el equipo en condiciones adecuadas de operación y contribuir a la seguridad del trabajador durante el uso de la maquinaria. *(Ver **Anexo 5.** Novedad.)*

7. ANEXOS

Anexo 1. *Soportes de pagos de planilla.*
Anexo 2. *Registro de asistencia a las charlas diarias y cronograma*
Anexo 3. *Inspección preoperacional maquinaria.*
Anexo 4. *Registro Fotográfico.*
Anexo 5. *Novedad.*

Agradezco su atención y manifiesto la disposición de ampliar información de ser necesario.

Atentamente,

DAYANNA KARINA PINEDA SARMIENTO
ESPECIALISTA EN SST
LICENCIA SST N° 2010– 27/11/2024
PROFESIONAL HSE – CONVENIO 007 DE 2026
ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE.
