PASO	DESCRIPCIÓN
EJECUCIÓN	- Se realizó el corte, doblado, figurado y armado del acero de refuerzo, conforme a los planos estructurales. - Se verificaron la ubicación, alineación y recubrimientos del acero. - Se instalaron y aseguraron las formaletas metálicas, verificando plomos, niveles y dimensiones. - Se preparó en obra el concreto, de acuerdo con el diseño de mezcla presentado, adicionando la fibra de polipropileno; y se realizó su vaciado y vibrado mecánico. - Se verificó durante el vaciado la estabilidad de la formaleta y la correcta posición del refuerzo.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se realizó el curado del concreto y posteriormente se retiraron las formaletas, una vez cumplidas las condiciones requeridas. - Se verificaron los plomos, niveles, alineación y dimensiones de las columnas terminadas. - Se realizaron los controles de calidad y ensayos establecidos para el concreto. - Se efectuó la limpieza del área y el retiro de materiales sobrantes.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Las columnas se ejecutaron para el muro cerramiento del cementerio.

SUMINISTRO

12.2 SUMINISTRO DE REDUCTOR DE GRIETAS POR CONTRACCION EN MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO PARA ELEMENTOS ESTRUCTURALES EN CONCRETO Y PLACAS.

PASO	DESCRIPCIÓN
PREPARACIÓN Y PLANIFICACIÓN	- Se revisaron las especificaciones técnicas y el diseño estructural para determinar la cantidad de fibra requerida. - Se verificó la ficha técnica y el certificado de calidad del producto. - Se verificó la disponibilidad de las microfibras de monofilamento de polipropileno antes de la preparación del concreto.
EJECUCIÓN	- Se incorporaron las microfibras de polipropileno directamente en el concreto fresco, durante su mezclado en obra. - Se aplicó la dosificación establecida para el volumen de concreto a ejecutar. - Se verificó la adecuada dispersión de las fibras dentro de la mezcla. - Se garantizó que la fibra utilizada funcionara como reductor de fisuras por contracción plástica, sin sustituir el acero de refuerzo estructural.
ACTIVIDADES POSTERIORES	- Se verificó el cumplimiento de la dosificación y correcta incorporación del producto en el concreto. - Se recopilaron y verificaron los certificados de calidad y la ficha técnica del fabricante.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

PASO	DESCRIPCIÓN
	- Se realizaron, cuando fueron requeridos, los controles de desempeño relacionados con resistencia a tracción, dispersión y módulo elástico. - Se dejó registro del material utilizado para los controles de calidad y seguimiento de la actividad.
UBICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	- Se suministró el reductor de grietas por contracción, en el concreto de los elementos como: zapatas y columnas del muro ubicado en el cementerio.

2. MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

El presente numeral tiene como objetivo describir el control de calidad de los materiales utilizados en el proyecto, de acuerdo con los certificados de calidad suministrados por los proveedores y la normatividad técnica vigente aplicable. En este apartado se relacionan los materiales empleados durante el periodo evaluado, así como la correspondiente verificación documental, conforme a los registros disponibles.

Dentro del periodo comprendido entre el 01 de julio de 2026 al 31 de julio de 2026, correspondiente al presente informe, se realizó la revisión y análisis de la documentación asociada a los materiales utilizados en obra.

A continuación, se relacionan algunos de los materiales empleados durante el periodo evaluado, junto con su respectivo control de calidad y verificación documental, de conformidad con los certificados aportados y los requisitos técnicos establecidos para el proyecto.

MATERIAL	CERTIFICADO DE CALIDAD	USO EN LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
CEMENTO	*SI*	*SOLADOS Y CONCRETOS*	*CUMPLE (✔)*
ACERO DE REFUERZO	*SI*	*ELEMENTOS ESTRUCTURALES*	*CUMPLE (✔)*
MICROFIBRAS MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO	*SI*	*ELEMENTOS ESTRUCTURALES*	*CUMPLE (✔)*

CONTROL DE EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPO - MAQUINARIA	REFERENCIA - IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	ESTADO	NOVEDAD
BENETIN	*ECOROAD / EC 70D*	*COSTADO IZQUIERDO: ENTRE EL ACCESO AL PARQUEADERO DE LA*	*OPERTATIVO*	*PERIODO EN USO*

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

EQUIPO - MAQUINARIA	REFERENCIA - IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	ESTADO	NOVEDAD
		BIBLIOTECA Y LA CALLE 7.		
CANGURO	MAQUIEQUIPOS DE COLOMBIA SAS / MR70H	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9A.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
CORTADORA DE CONCRETO	HYDROEQUIPOS SA / CP-10	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE EL ACCESO AL PARQUEADERO DE LA BIBLIOTECA Y LA CALLE 7.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
MARTILLO DEMOLEDOR	DEWALT / 20006	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9A.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
MEZCLADORA	MAQUISTORE / 2022	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9A.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
MINICARGADOR	CATERPILLAR / CAT0236DVR4D0 1743	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9A, ENTRE EL ACCESO AL PARQUEADERO DE LA BIBLIOTECA Y LA CALLE 7.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
MOTOSOLDADOR	EXTREME WELDS / FIELD POWER 190	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9A, ENTRE EL ACCESO AL PARQUEADERO DE LA BIBLIOTECA Y LA CALLE 7.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
PULIDORA	BOSCH / GWS 700	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9A, ENTRE EL ACCESO AL PARQUEADERO DE LA BIBLIOTECA Y LA CALLE 7.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
PULIDORA	BOSCH / GWS 710	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA	OPERTATIVO	PERIODO EN USO

NIT. 902031418-3
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

EQUIPO - MAQUINARIA	REFERENCIA - IDENTIFICACIÓN	ACTIVIDAD	ESTADO	NOVEDAD
		10 Y CARRERA 9A, ENTRE EL ACCESO AL PARQUEADERO DE LA BIBLIOTECA Y LA CALLE 7.		
RANA VIBROCOMPACTADORA	CERMAC SAS / DIESEL 6HP	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE EL ACCESO AL PARQUEADERO DE LA BIBLIOTECA Y LA CALLE 7.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
RETROEXCAVADORA	JOHN DEERE / 1BZ310PAVSFX0 4801/2025	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9A, ENTRE EL ACCESO AL PARQUEADERO DE LA BIBLIOTECA Y LA CALLE 7.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
SIERRA CIRCULAR	BOSCH / GDC 151 TITAN	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9A.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
SIERRA CIRCULAR	DEWALT / DWE 5615-B3	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9A.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
CORTADORA	DEWALT / D28730-B3	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9A.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
VIBRADOR DE CONCRETO	MASALTA / Z0104212346/MV DM	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9A.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO
TALADRO	DEWALT / 18777	COSTADO IZQUIERDO: ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 9A.	OPERTATIVO	PERIODO EN USO

Nota: UTU-FO-47 Registro Mensual de Maquinaria, Equipas y Herramientas, anexo al presente informe.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

TOMA DE MUESTRAS

En el período del presente informe se llevaron a cabo las siguientes pruebas de laboratorio:

DESCRIPCIÓN / ENSAYO	*LOCALIZACIÓN*	*FECHA DE EMISIÓN*	*NORMA*
Resistencia a la compresión de cilindros en concreto	*Solado zapatas muro cementerio.*	*24/07/2026*	*INV-E.410*
Resistencia a la compresión de cilindros en concreto	*Zapatas muro cementerio*	*27/07/2026*	*INV-E.410*
Resistencia a la compresión de cilindros en concreto	*Columnas muro cementerio*	*29/07/2026*	*INV-E.410*

Nota: F- 251 Acta Resumen de Ensayos y Pruebas de Laboratorio, anexo al presente informe.

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO					
FECHA DE TOMA	*N° MUESTRA*	*LOCALIZACIÓN*	*DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO*	*DIAS DE ROTURA*	*FECHA ROTURA*
24/07/2026	*1*	*MURO CEMENTERIO*	*SOLADO ZAPATAS*	*7*	*31/07/2026*
				14	*07/08/2026*
				28	*24/08/2026*
27/07/2026	*2*	*MURO CEMENTERIO*	*ZAPATAS*	*7*	*03/08/2026*
				14	*10/08/2026*
				28	*24/08/2026*
29/07/2026	*3*	*MURO CEMENTERIO*	*COLUMNAS*	*7*	*05/08/2026*
				14	*12/08/2026*
				28	*26/08/2026*

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

RESULTADOS ENSAYOS DE LABORATORIO

FECHA DE TOMA	N° MUESTRA	LOCALIZACIÓN	NOMBRE DE ELEMENTO	DIAS DE ROTURA	FECHA ROTURA	DISEÑO		RESULTADOS		ANÁLISIS DE RESULTADOS
						RESISTENCIA DISEÑO (PSI)	RANGO CUMPLIMIENTO %	RESISTENCIA OBTENIDA (PSI)	PORCENTAJE OBTENIDO %	CUMPLE S/N
24/07/2026	1	MURO CEMENTERIO	SOLADO ZAPATAS	7	31/07/2026	2000	70% - 100%	1577	79%	S
				14	07/08/2026	2000	80% - 100%	1818	91%	S
27/07/2026	2	MURO CEMENTERIO	ZAPATAS	7	03/08/2026	3000	70% - 100%	2569	86%	S
				14	10/08/2026	3000	80% - 100%	3238	108%	S
29/07/2026	3	MURO CEMENTERIO	COLUMNAS	7	05/08/2026	3000	70% - 100%	2469	82%	S
				14	12/08/2026	3000	80% - 100%	3091	103%	S

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

22

3. SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Para este periodo se presenta la aplicación de la normatividad vigente sobre seguridad industrial, salud ocupacional y señalización.

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
01 al 31 de Julio 2026	Designación de la responsable del SG-SST y personal de apoyo SST	Durante el período evaluado se dio continuidad al liderazgo y administración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), garantizando el seguimiento a su implementación, el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y la ejecución de las actividades programadas para la obra. Asimismo, no se presentaron modificaciones en la designación, perfil profesional, licencia o certificaciones de la responsable del SG-SST respecto al período anterior.
01 al 31 de Julio 2026	Verificación de afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral	Se verificó que el personal vinculado contara con afiliación vigente a EPS, AFP y ARL previo al inicio de actividades.
01 al 31 de Julio 2026	Realización de exámenes médicos ocupacionales de ingreso	Se realizaron los exámenes ocupacionales de ingreso al personal vinculado al proyecto.
01 al 31 de Julio 2026	Conformación del COPASST	Durante el mes de julio de 2026 se realizó seguimiento al COPASST, el cual se encuentra debidamente conformado y activo, fortaleciendo la participación de los trabajadores en las actividades de promoción y prevención en Seguridad y Salud en el Trabajo.
01 al 31 de Julio 2026	Convocatoria para conformación del Comité de Convivencia Laboral	Durante el mes de julio de 2026, se realizó seguimiento al COCOLAB, el cual se encuentra debidamente conformado y activo, fortaleciendo las acciones de promoción de una adecuada convivencia laboral y prevención de situaciones que puedan afectar el ambiente de trabajo.
01 al 31 de Julio 2026	Capacitaciones	Durante el mes de julio de 2026 se ejecutaron las cuatro capacitaciones programadas, abordando temas de Plan de Emergencias y Evacuación, Señalización y Demarcación, Protección de Cobertura Vegetal y seguimiento al COPASST, dando cumplimiento a las actividades establecidas para el período.
01 al 31 de Julio 2026	Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo	Se socializaron los riesgos, controles, políticas SST, reglamento de higiene y seguridad y procedimientos de reporte al personal vinculado.
01 al 31 de Julio 2026	Políticas y reglamento de higiene y seguridad	Las políticas institucionales y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial no se anexan nuevamente al

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

FECHA	ACTIVIDAD SST REALIZADA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
		presente informe, toda vez que fueron presentados y documentados en el informe del período anterior. No obstante, durante el mes de julio permanecieron socializados y disponibles para consulta de todo el personal, como parte de las actividades permanentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
01 al 31 de Julio 2026	Identificación de peligros, valoración del riesgo y determinación de controles	La Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos (IPER) no se presenta como anexo en el presente informe, debido a que fue entregada en el informe correspondiente al período anterior y, durante el mes de julio de 2026, no se presentaron cambios en las actividades, procesos, condiciones de trabajo o factores de riesgo que hicieran necesaria su actualización. Por tal motivo, la matriz permanece vigente y continúa siendo el instrumento de referencia para la identificación, evaluación y control de los riesgos asociados a la ejecución del proyecto.
01 al 31 de Julio 2026	Inspecciones	Durante el mes se realizaron inspecciones a equipos, herramientas y elementos para atención de emergencias, permitiendo verificar su estado general, condiciones de funcionamiento, disponibilidad y cumplimiento de los requisitos de seguridad para su utilización en las actividades constructivas.
01 al 31 de Julio 2026	Entrega de dotación y elementos de protección personal	Se suministraron los elementos requeridos para el desarrollo seguro de las actividades y se capacitó al personal sobre su uso adecuado.
01 al 31 de Julio 2026	Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias	Durante el mes no se presentaron situaciones de emergencia, incidentes de gran magnitud ni eventos que requirieran la activación del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. Como parte de las acciones preventivas, se realizó el acta de creación y conformación de la Brigada de Emergencias, fortaleciendo la preparación y capacidad de respuesta del proyecto ante posibles situaciones de emergencia.
01 al 31 de Julio 2026	Seguimiento a la gestión de accidentes de trabajo	Durante el período evaluado se presentó un (1) accidente de trabajo, el cual fue atendido y contó con su respectiva investigación y seguimiento, con el fin de identificar las causas y establecer las acciones de mejora y prevención necesarias. No se presentaron casos de enfermedad laboral durante el período.
01 al 31 de Julio 2026	Gestión de productos químicos	No se utilizaron ni almacenaron productos químicos durante la etapa de pre-construcción.

Nota: F- 261 Control de Seguridad Industrial, anexo al presente informe.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

4. MANEJO AMBIENTAL

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
PAGA-GSA-01 Gestión ambiental y social	100%	Se ejecutó la totalidad de las actividades programadas para la conformación y funcionamiento del Grupo de Gestión Ambiental y Social, garantizando la coordinación, seguimiento y control de las medidas ambientales y sociales aplicables durante el período evaluado.
PAGA-GSA-02 Capacitación y sensibilización ambiental	100%	Se realizó la totalidad de la capacitación ambiental programada para el período, correspondiente a "Protección de Cobertura Vegetal", alcanzando un cumplimiento del 100 % y fortaleciendo las buenas prácticas ambientales del personal durante la ejecución de las actividades de obra.
PAGA-MAO-01 Manejo de materiales	100%	Durante el período evaluado se realizó seguimiento a las condiciones de manejo de los materiales y herramientas presentes en los frentes de obra, verificando almacenamiento, transporte seguro, organización, orden y aseo y condiciones generales de manejo. De acuerdo con las verificaciones realizadas, se evidenció el cumplimiento de los lineamientos establecidos, obteniendo un resultado del 100 %.
PAGA-MAO-02 Manejo de materiales provenientes de terceros	100%	Durante el período comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2026, se realizó seguimiento al manejo de los materiales provenientes de terceros utilizados en las actividades de obra, correspondientes a 749 toneladas de grava, arena, base, subbase, crudo de acopio y arena de río. De acuerdo con las verificaciones realizadas, los materiales fueron gestionados conforme a los lineamientos establecidos, alcanzando un cumplimiento del 100 %.
PAGA-MAO-03 Señalización ambiental y PMT	100%	Durante el período evaluado se implementaron las medidas de señalización y manejo de tránsito requeridas para las actividades desarrolladas en los frentes de obra, verificando la instalación, ubicación, visibilidad y condiciones de la señalización preventiva y de seguridad. Se obtuvo un cumplimiento del 100 % frente a las medidas requeridas durante el periodo.
PAGA-MAO-04 Campamentos y áreas temporales	100%	Durante el presente mes se continuó con la implementación de las medidas establecidas en el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA), de acuerdo con las necesidades presentadas durante el desarrollo del proyecto. Se complementó la adecuación y organización de la bodega con motivo del ingreso de nuevos materiales y elementos requeridos para las actividades, y se adecuó y organizó el punto de acopio temporal para el manejo de los materiales
PAGA-MAO-05 Manejo integral de residuos y RCD	100%	Durante el período evaluado se realizó la gestión adecuada de los residuos generados en las actividades del proyecto. Para los residuos de construcción y demolición (RCD) se registraron 57 viajes, equivalentes a 342 m³, transportados mediante 6 vehículos y dispuestos en el Complejo Ganadero del municipio de Puerto López, Avenida 14, predio autorizado para su disposición. La gestión realizada se encuentra respaldada

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
		mediante el oficio de disposición quincenal y el anexo de la relación o bitácora de viajes, permitiendo verificar el retiro, transporte y disposición de los RCD generados durante el período.
PAGA-MAO-06 Control de emisiones y material particulado	100%	Durante el periodo evaluado se implementaron las medidas de control previstas para las actividades desarrolladas en esta etapa del proyecto. Se realizó la instalación de cerramientos y señalización en las áreas de trabajo, con el propósito de delimitar las zonas de intervención y contribuir al control de la dispersión de polvo y material particulado hacia las áreas cercanas y el personal. Las medidas implementadas fueron objeto de seguimiento durante el periodo y cuentan con registro fotográfico como soporte.
PAGA-MAO-07 Control de ruido y vibraciones	100%	No se desarrollaron actividades que generaran ruido o vibraciones asociadas Durante el periodo evaluado se realizó la revisión e inspección de los equipos y herramientas utilizados en las actividades desarrolladas en el proyecto, como medida preventiva para el control de posibles fuentes de ruido y vibraciones. Se verificaron sus condiciones generales de funcionamiento, con el fin de identificar oportunamente situaciones que pudieran generar afectaciones al personal o al entorno.
PAGA-MAO-08 Manejo de aguas lluvias y escorrentías	N/A	Durante el periodo evaluado se realizó la verificación de las condiciones de las áreas intervenidas por las actividades de excavación y demolición, así como el seguimiento a las condiciones de drenaje superficial. No fue necesaria la implementación de medidas específicas para el manejo de aguas lluvias o escorrentías durante el periodo. Se continuará con el seguimiento de estas condiciones de acuerdo con el avance de las actividades y las necesidades que se presenten en obra.
PAGA-MAO-09 Excavaciones y movimientos de tierra	En seguimiento	Durante el periodo evaluado se ejecutaron actividades de excavación manual en material común, correspondientes a 5.907,48 m³ en el frente de urbanismo y 39,45 m³ asociados a la construcción del muro de cerramiento del cementerio, para un total de 5.946,93 m³ de material excavado. Se realizó seguimiento al manejo del material producto de las excavaciones y a las condiciones de las áreas intervenidas, de acuerdo con las medidas establecidas para el proyecto. El seguimiento continuará durante los siguientes periodos, conforme avance la ejecución y se realice el manejo y disposición del material excavado.
PAGA-MAQ-01 Manejo de maquinaria y vehiculos	100%	Durante el periodo evaluado se realizó la revisión e inspección de los equipos y herramientas utilizados para el desarrollo de las actividades de obra, verificando sus condiciones generales de funcionamiento y operación. Las inspecciones realizadas permitieron realizar el seguimiento a las condiciones de los equipos y prevenir posibles situaciones asociadas a ruido, emisiones, fugas o derrames. Los registros y soportes de las inspecciones efectuadas durante el periodo se encuentran incluidos en el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) correspondiente al mes de julio

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

ACTIVIDAD PROPUESTA PARA EL MANEJO AMBIENTAL	AVANCE DE LA ACTIVIDAD A LA FECHA	OBSERVACIÓN / ACCIÓN
PAGA-GS-01 Mano de obra y enfoque diferencial	100%	La totalidad de la mano de obra no calificada vinculada durante el período evaluado corresponde a personal residente del municipio de Puerto López, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en el PAGA respecto a la promoción y vinculación de mano de obra local.
PAGA-GS-02 Participación comunitaria	100%	Durante el periodo evaluado se ejecutó la actividad de participación comunitaria programada, relacionada con el proceso de socialización, concertación y articulación con los propietarios de las estructuras comerciales ubicadas en las inmediaciones del Cementerio Central. La actividad incluyó la coordinación con las entidades municipales, la socialización de las condiciones del desmonte, la concertación con los propietarios, el acompañamiento durante la ejecución y la entrega formal de los elementos recuperados mediante las respectivas actas.
PAGA-GS-03 Accesibilidad y movilidad peatonal	100%	Durante el periodo evaluado se realizó la identificación y evaluación de las condiciones de accesibilidad y movilidad peatonal en los frentes de intervención priorizados. Se efectuó el seguimiento a los cerramientos perimetrales, senderos peatonales temporales y señalización implementada en los sectores de la Biblioteca Municipal y el Cementerio Municipal, verificando las condiciones de circulación y seguridad para los transeúntes. Estas acciones permitieron mantener condiciones adecuadas de movilidad y reducir los posibles riesgos asociados a la intervención temporal del espacio público.
PAGA-GS-04 Atención a comunidad y PQRS	N/A	No se recibieron PQRS durante el período evaluado; se mantuvieron habilitados los canales de comunicación con la comunidad.
PAGA-GS-05 Información y divulgación	100%	Durante el periodo evaluado se ejecutaron la totalidad de las actividades de información y divulgación programadas. Se realizaron acciones de comunicación directa mediante diálogo itinerante, socialización y atención a habitantes, comerciantes, líderes comunitarios y transeúntes de los sectores de la Biblioteca Municipal y el Cementerio Central. Estas actividades permitieron brindar información sobre el desarrollo de las obras, cronograma y frentes de intervención, fortaleciendo la comunicación y el relacionamiento con la comunidad.
PAGA-MB-01 Protección de cobertura vegetal urbana	N/A	No se realizaron intervenciones sobre árboles, zonas verdes o coberturas vegetales presentes en el área de influencia.
PAGA-MB-02 Paisajismo y recuperación de áreas intervenidas	N/A	No se requirieron actividades de recuperación ambiental o paisajística debido a la ausencia de intervenciones físicas.

Nota: F- 253 Implementación Plan de Manejo Ambiental, anexo al presente informe.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

C. INFORME ADMINISTRATIVO

1. PERSONAL ACTUAL PROFESIONAL VIGENTE

NOMBRE	CARGO	DEDICACION PERSONA- MES
CRISTINA GIRALDO GONZALEZ	DIRECTOR DE OBRA	25%
JUAN DAVID MARTINEZ BACCA	RESIDENTE DE OBRA	100%
SANDRA MILENA CASTRO HERRERA	PROFESIONAL SALUD OCUPACIONAL	100%
JUAN FERNANDO GALVEZ FLOREZ	INGENIERO ELECTRICISTA	50%

2. APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

UNION TEMPORAL URBANO 2026

NUMERO DE PLANILLA:		9508817955				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DÍAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
CASTRO HERRERA SANDRA MILENA	PROFESIONAL SST	1122646157	30	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
GALVEZ FLOREZ JUAN FERNANDO	INGENIERO ELECTRICO	80112917	30	SANITAS	COLPENSIONES	SEGUROS BOLIVAR
GIRALDO GONZALEZ CRISTINA	DIRECTOR DE OBRA	1121833213	30	SALUD TOTAL	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
MARTINEZ BACCA JUAN DAVID	RESIDENTE DE OBRA	1119892740	30	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
PINEDA NOVOA DANIEL FERNANDO	COORDINADOR DE OBRA	17389742	16	FAMISANAR	COLPENSIONES	SEGUROS BOLIVAR
RUIZ TURRIAGO DAVID FERNANDO	TRABAJADOR SOCIAL	1122648237	30	SALUD TOTAL	PROTECCION	SEGUROS BOLIVAR
TERAN TELLEZ PEDRO ANTONIO	AYUDANTE	1120871321	30	FAMISANAR	PROTECCION	SEGUROS BOLIVAR
ORTIZ RODRIGUEZ EDISON LEONARDO	INGENIERO AMBIENTAL	1118550393	30	NUEVA EPS	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
ALVARADO ROMERO JULIO	CELADOR	86002018	30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SEGUROS BOLIVAR
CASTRILLON MARTINEZ CARLOS ARTURO	MAESTRO	80513402	30	SANITAS	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
GONZALEZ LOPEZ DEIVID MAURICIO	AUXILIAR SST-A	1019983990	30	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SEGUROS BOLIVAR
QUEVEDO PARDO ANGELO SEBASTIAN	AUXILIAR DE TRANSITO	1121831632	30	NUEVA EPS	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
RAMOS RAMOS JHONATAN FRANCISCO	AUXILIAR DE TRANSITO	1120866347	30	CAPITAL SALUD	PROTECCION	SEGUROS BOLIVAR

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

NUMERO DE PLANILLA:		9508817955				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DIAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
RIVEROS VILLABON WILMER	ALMACENISTA	1122626406	30	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
ROMERO GUTIERREZ EDWIN ALONSO	AYUDANTE	17391180	30	SALUD TOTAL	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
RUIZ PARRA MANUEL IGNACIO	OFICIAL	17267892	30	SALUD TOTAL	COLPENSIONES	SEGUROS BOLIVAR
SIERRA GONZALEZ DUVAN ANDREY	AUXILIAR DE TRANSITO	1012435978	30	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SEGUROS BOLIVAR
TORRES NARANJO JOHN FREDY	OFICIAL	86059482	30	NUEVA EPS	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
BONILLA ENCISO DANIEL	TOPOGRAFO	1120387154	17	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
CALDERON HERNANDEZ CARLOS REYNEL	AYUDANTE DE OBRA	17390915	17	NUEVA EPS	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
FIGUEREDO CORREDOR ROLANDO SAMIR	AYUDANTE DE OBRA	1120870490	10	SALUD TOTAL	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
HENAO GOMEZ DANIEL SANTIAGO	AYUDANTE DE OBRA	1005856716	7	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
HERRERA BAYONA IVAN CAMILO	AUXILIAR SST A	1122652199	10	FAMISANAR	COLPENSIONES	SEGUROS BOLIVAR
JIMENEZ VERA ALIRIO	AYUDANTE DE OBRA	86042914	10	CAPITAL SALUD	COLFONDOS	SEGUROS BOLIVAR
LEYTON VALENCIA DIEGO FERNANDO	AYUDANTE DE OBRA	1006719380	10	NUEVA EPS	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
MACHADO VILLARRUEL HUBER ARLEY	AYUDANTE DE OBRA	1000571940	23	NUEVA EPS	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
MANRIQUE LARGO SANTIAGO	AYUDANTE DE OBRA	1120358074	10	NUEVA EPS	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
MARTINEZ BAUTISTA LUIS ALFREDO	AYUDANTE DE OBRA	1120869837	10	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
MENDIETA ROMERO PEDRO ANTONIO	AYUDANTE DE OBRA	68486606	7	SALUD TOTAL	PROTECCION	SEGUROS BOLIVAR
OVIEDO SAENZ JORGE ESTEBAN	AYUDANTE DE OBRA	1005712795	8	SALUD TOTAL	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
PEÑA GABANZO WILSON LEONARDO	AYUDANTE DE OBRA	1119888239	23	NUEVA EPS	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
QUIROZ HERNANDEZ CARLOS ARTURO	AYUDANTE DE OBRA	1063493000	10	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
RAMIREZ RAMIREZ MICHEL ALEXANDER	AYUDANTE DE OBRA	1120868076	8	NUEVA EPS	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
RODRIGUEZ ROSAS JOLMAN OSVALDO	ALMACENISTA	1117322959	22	SANITAS	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
RODRIGUEZ MANCHAY LOW BRANDO	AYUDANTE DE OBRA	1121875879	8	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
RUIZ MUÑOZ JUAN DAVID	AYUDANTE DE OBRA	1120864598	7	FAMISANAR	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
SANABRIA DIAZ MICHAEL FABIAN	AYUDANTE DE OBRA	1123803301	17	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR
VALENCIA GOMEZ MARYLIN YULECCY	AYUDANTE DE OBRA	1121936228	17	NUEVA EPS	PORVENIR	SEGUROS BOLIVAR

Nota: F- 252 Acta Control y Seguimiento Seguridad Social y Parafiscales, anexo al presente informe.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

MARSANHG S.A.S

NUMERO DE PLANILLA:		9508891735				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DIAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
DIAZ MICAN HERNAN ELVECIO	CONDUCTOR	79123498	30	FAMISANAR	PORVENIR	SURA
GARCES PARRA ELIAS	CONDUCTOR	86050471	7	SANITAS	PORVENIR	SURA
PEREZ SORIANO JOSE AVISELVIS	OPERADOR DE MAQUINARIA	1121921792	29	PROTEGER	PORVENIR	SURA
QUEZADA FLOREZ EDINSON	OPERADOR DE MAQUINARIA	1083924090	30	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA

Nota: F- 252 Acta Control y Seguimiento Seguridad Social y Parafiscales, anexo al presente informe.

INGELMEC DEL META S.A.S - SUBCONTRATISTA

NUMERO DE PLANILLA:		9509138272				
NOMBRE PERSONAL	CARGO Y/O OFICIO	CEDULA	DIAS COT	RELACIONAR EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO		
				SALUD	PENSIÓN	ARL
TORO LOAIZA JEHISON	INGENIERO SUB-CONTRATISTA	75086583	14	FAMISANAR	COLPENSIONES	POSITIVA
BADOS SANCHEZ EDGAR SEBASTIAN	INGENIERO SUB-CONTRATISTA	1006719153	14	FAMISANAR	PORVENIR	POSITIVA

Nota: F- 252 Acta Control y Seguimiento Seguridad Social y Parafiscales, anexo al presente informe.

D. *INFORME GESTIÓN CONTRACTUAL Y JURIDICA DEL PROYECTO*

1. *ACTOS ADMINISTRATIVOS CELEBRADOS*

PRORROGAS, SUSPENSIONES, AMPLIACIONES DE SUSPENSION Y REINICIO		
ACTA N° Y FECHA	TIEMPO (MESES / DIAS)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

ADICIÓN		
CONTRATO ADICIONAL N° Y FECHA	VALOR ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

MODIFICACIÓN		
ACTA N° Y FECHA	VALOR ACTUALIZADO ($)	JUSTIFICACIÓN
N/A	N/A	N/A

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

2. *GARANTIAS:*

Pólizas aprobadas según actos administrativos del contrato 103.13.09.003-2026 de 2026.

- **CONTRATO**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*SGPL-252189459-1*
ANEXO N°	*0*
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	*LBCO-252190821-1*
ANEXO N°	*0*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	*C*
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	*133*
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.*

GARANTIAS	*VIGENCIA*		*VALOR ASEGURADO*
	DESDE	*HASTA*	
Cumplimiento del contrato	*06/04/2026*	*06/02/2028*	*$ 8.342.118.102,40*
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	*06/04/2026*	*06/02/2028*	*$ 18.769.765.730,40*
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	*06/04/2026*	*06/10/2030*	*$ 2.085.529.525,60*
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	*06/04/2027*	*06/10/2032*	*$ 8.342.118.102,40*
Predios, laborales y operaciones.	*06/04/206*	*06/10/2027*	*$ 2.085.529.525,60*
Daño moral	*06/04/206*	*06/10/2027*	*$ 2.085.529.525,60*
Lucro cesante	*06/04/206*	*06/10/2027*	*$ 2.085.529.525,60*
RC contratistas y subcontratistas independientes	*06/04/206*	*06/10/2027*	*$ 2.085.529.525,60*
RC patronal	*06/04/206*	*06/10/2027*	*$ 2.085.529.525,60*

- **ACTA DE INICIO**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	*SGPL-252189459-1*
ANEXO N°	*1*
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	*LBCO-252190821-1*
ANEXO N°	*1*
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	*19/05/2026*
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	*158*
COMPAÑÍA DE SEGUROS	*ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.*

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11/05/2026	11/03/2028	$ 8.342.118.102,40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	11/05/2026	11/03/2028	$ 18.769.765.730,40
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/05/2026	11/11/2030	$ 2.085.529.525,60
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	11/11/2027	11/11/2032	$ 8.342.118.102,40
Predios, laborales y operaciones.	06/04/206	11/11/2027	$ 2.085.529.525,60
Daño moral	06/04/206	11/11/2027	$ 2.085.529.525,60
Lucro cesante	06/04/206	11/11/2027	$ 2.085.529.525,60
RC contratistas y subcontratistas independientes	06/04/206	11/11/2027	$ 2.085.529.525,60
RC patronal	06/04/206	11/11/2027	$ 2.085.529.525,60

- **OTROSI**

POLIZA DE CUMPLIMIENTO N°	SGPL-252189459-1
ANEXO N°	2
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO N°	LBCO-252190821-1
ANEXO N°	2
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	23/07/2026
NUMERO DE RESOLUCION DE APROBACION	211
COMPAÑÍA DE SEGUROS	ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.

GARANTIAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	11/05/2026	11/03/2028	$ 8.342.118.102,40
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	11/05/2026	11/03/2028	$ 18.769.765.730,40
Pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/05/2026	11/11/2030	$ 2.085.529.525,60
Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción	11/11/2027	11/11/2032	$ 8.342.118.102,40
Predios, laborales y operaciones.	06/04/206	11/11/2027	$ 2.085.529.525,60
Daño moral	06/04/206	11/11/2027	$ 2.085.529.525,60
Lucro cesante	06/04/206	11/11/2027	$ 2.085.529.525,60
RC contratistas y subcontratistas independientes	06/04/206	11/11/2027	$ 2.085.529.525,60
RC patronal	06/04/206	11/11/2027	$ 2.085.529.525,60

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

E. *INFORME FINANCIERO*

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
00387	*30/01/2026*	*03.2.3.40.4002.1400-4*	*$ 25.882.326.184,32*
01031	*3/06/2026*	*03.2.3.40.4002.1400-4*	*$ 249.976.981,29*
00001	*4/01/2027*	*03.2.3.40.4002.1400-4*	*$ 15.579.880.232,58*

REGISTRO PRESUPUESTAL

No.	*FECHA*	*RUBRO*	*VALOR*
00869	*13/04/2026*	*03.2.3.40.4002.1400-4*	*$25.880.733.298,13*
01213	*04/06/2026*	*03.2.3.40.4002.1400-4*	*$ 249.976.981,29*
00001	*4/01/2027*	*03.2.3.40.4002.1400-4*	*$ 15.829.857.213,87*


PAGOS REALIZADOS

ACTA No.	*EGRESO No.*	*FECHA*	*% EJECUCION*	*VALOR PAGO*	*VALOR AMORTIZADO*	*VALOR DESCUENTO*	*VALOR ACUMULADO*
-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALES	-	-	-	-	-

PERIODO QUE COMPRENDE EL INFORME FINANCIERO: 01/07/2026 AL 31/07/2026

Durante el periodo correspondiente al presente informe no se realizó cobro mediante acta parcial de obra, por lo cual el avance físico ejecutado acumulado es 0,62 %, mientras que el avance financiero ejecutado se mantuvo en 0,00 %.

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

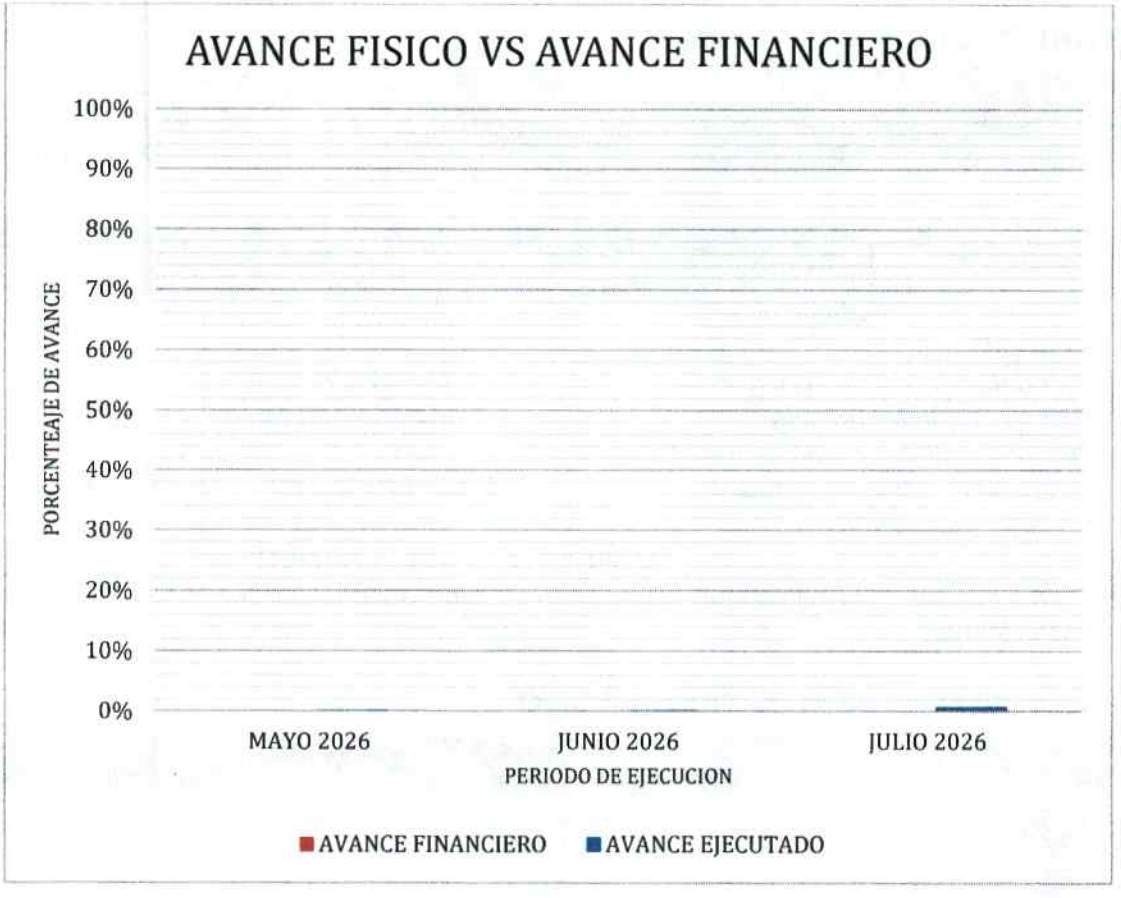

INFORMACIÓN DE AVANCE FINANCIERO

VALOR CONDICIONES INICIALES	*$ 41.710.590.512,00*
VALOR ADICIONAL	*$ 0,00*
VALOR DEL ANTICIPO 45%	*$ 18.769.765.730,40*
VALOR ACTUALIZADO DEL ANTICIPO	*$ 17.831.277.430,40*
VALOR CONDICIONES ACTUALIZADAS	*$ 41.710.590.512,00*

INVERSION ANTICIPO

PLAN DE INVERSIÓN			
No.	*DESCRIPCIÓN*	*VALOR*	*%*
1	*Mano de obra Eléctrica, civil, arquitectónica*	*$ 4.692.441.432,60*	*25.00%*
2	*Materiales varios de construcción*	*$ 11.956.340.770,26*	*63.70%*
3	*Transporte de Materiales*	*$ 1.689.278.915,74*	*9.00%*
4	*Compra, Alquiler y mantenimiento de Maquinaria, equipos, formaleta metálica entre otros.*	*$ 431.704.611,80*	*2.30%*
	TOTAL	***$ 18.769.765.730,40***	***100.00%***

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com

INVERSION ANTICIPO (ACTUALIZACIÓN)

VALOR DEL ANTICIPO	*$ 18.769.765.730,40*
VALOR DEDUCCIONES	*$ 938.488.300,00*
VALOR ACTUALIZADO DEL ANTICIPO	*$ 17.831.277.430,40*

PLAN DE INVERSIÓN AJUSTADO			
No.	*DESCRIPCIÓN*	*VALOR*	*%*
1	*Mano de obra Eléctrica, civil, arquitectónica*	*$ 4.457.819.357,60*	*25.00%*
2	*Materiales varios de construcción*	*$ 11.358.523.723,16*	*63.70%*
3	*Transporte de Materiales*	*$ 1.604.814.968,74*	*9.00%*
4	*Compra, Alquiler y mantenimiento de Maquinaria, equipos, formaleta metálica entre otros.*	*$ 410.119.380,90*	*2.30%*
	TOTAL	***$ 17.831.277.430,40***	***100.00%***

NOTA: El Plan de Inversión del Anticipo fue actualizado considerando las deducciones aplicadas por la entidad contratante.

RESUMEN INFORME PLAN DE INVERSION ANTICIPO

ITEM	DESCRIPCIÓN	ANTICIPO INICIAL	ANTICIPO ADICIONAL	TOTAL ANTICIPO	VALOR EJECUTADO	SALDO ANTICIPO
1	*MANO OBRA ELECTRICA, CIVIL, ARQUITECTONICA*	*$ 4,457,819,357.60*	*$ 0.00*	*$ 4,457,819,357.60*	*$ 2,654,206,901.29*	*$ 1,803,612,456.31*
2	*MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCIÓN*	*$ 11,358,523,723.16*	*$ 0.00*	*$ 11,358,523,723.16*	*$ 2,089,539,885.34*	*$ 9,268,983,837.82*
3	*TRANSPORTE DE MATERIALES*	*$ 1,604,814,968.74*	*$ 0.00*	*$ 1,604,814,968.74*	*$ 49,817,871.90*	*$ 1,554,997,096.84*
4	*COMPRA, ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, FORMALETA METALICA ENTRE OTROS*	*$ 410,119,380.90*	*$ 0.00*	*$ 410,119,380.90*	*$ 374,017,214.00*	*$ 36,102,166.90*
	TOTALES	*$ 17,831,277,430.40*	*$ 0.00*	*$ 17,831,277,430.40*	*$ 5,167,581,872.53*	*$ 12,663,695,557.87*

Nota: F- 259 Informe Plan de Inversión del Anticipo, es remitido como anexo al presente informe.

ORDENES DE PAGO

A la fecha de corte del presente informe, el contratista, UNIÓN TEMPORAL URBANO 2026, recibió desembolsos correspondientes al anticipo del contrato 103.13.09.003 de 2026.

CHEQUE/COMPROBANTE No.	*FECHA CHEQUE/COMPROB.*	*BENEFICIARIO*	*VALOR*	*ITEM*	*DESCRIPCIÓN EGRESO*
ORDEN DE PAGO #1	*23/06/2026*	*UNION TEMPORAL URBANO 2026*	*$ 2.600.000.000,00*	*1*	*MANO DE OBRA ELECTRICA, CIVIL, ARQUITECTONICA*
ORDEN DE PAGO #2	*06/07/2026*	*UNION TEMPORAL URBANO 2026*	*$ 54.206.901,29*	*1*	*MANO DE OBRA ELECTRICA, CIVIL, ARQUITECTONICA*

NIT: 902051418-5
Calle 45 No. 45 – 76
Teléfono 3177755835
Email: uniontemporalpuertolopez@gmail.com
