ACTA No. 08			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Necesidad de contratación: "ADECUACIÓN DEL PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y ZONAS CONEXAS PARA LA SEDE PRINCIPAL DEL CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA, SENA REGIONAL HUILA."			
CIUDAD Y FECHA:	La Plata Huila, 14 de julio de 2026	**HORA INICIO:** 11:00 a.m.	**HORA FIN:** 12:00 m
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficina Coordinación Administrativa	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** SENA / HUILA / Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila.	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Presentar necesidad y justificación para la contratación
2. Establecer los requerimientos específicos de adecuación del punto de atención al ciudadano y zonas conexas para la sede principal.
3. Plan Anual de Adquisiciones y códigos UNSPSC.
4. Verificar la disponibilidad presupuestal.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Presentar necesidad de contratación para realizar la "adecuación del Punto de Atención al Ciudadano y zonas conexas para la sede principal del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sena Regional Huila."

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Una vez iniciada la reunión y verificada la asistencia, el Arquitecto Marlon Arias Nasayo de infraestructura expone la necesidad de contratar el servicio de la "adecuación del Punto de Atención al Ciudadano y zonas conexas para la sede principal del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sena Regional Huila."

1. OBJETO DE LA NECESIDAD

Establecer y fortalecer el Punto de Atención al Ciudadano en el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila – SENA, sede La Plata, con el fin de garantizar una atención oportuna, eficiente, accesible y de calidad a los ciudadanos, aprendices, egresados, empresarios y demás grupos de interés, facilitando el acceso a la información, la orientación, la recepción y gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRS), en cumplimiento de los principios de transparencia, participación ciudadana, mejora continua y normatividad vigente.

DESCRIPCIÓN INICIAL DEL PROYECTO (NECESIDAD)

Realizar la adecuación del Punto de Atención al Ciudadano del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, teniendo en cuenta que actualmente no se cuenta con un espacio destinado exclusivamente para esta función. En la actualidad, la atención es realizada por el personal de gestión documental desde el área administrativa ubicada en el segundo piso de la edificación, situación que no se ajusta a los lineamientos establecidos en el Manual de Atención al Ciudadano del SENA.

DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL PROYECTO

Realizar la adecuación del Punto de Atención al Ciudadano del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, teniendo en cuenta que actualmente no se cuenta con un espacio destinado exclusivamente para esta función. En la actualidad, la atención es realizada por el personal de gestión documental desde el área administrativa ubicada en el segundo piso de la edificación, situación que no se ajusta a los lineamientos establecidos en el Manual de Atención al Ciudadano del SENA.
Dicha ubicación limita el acceso universal, la visibilidad del servicio y la adecuada prestación de la atención preferencial a los usuarios. Esta condición genera barreras físicas y operativas para personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes y usuarios con movilidad reducida, afectando los principios de accesibilidad, oportunidad, eficiencia y calidad en la prestación del servicio.

En atención a lo anterior, se justifica la reubicación y adecuación del Punto de Atención al Ciudadano en un área de fácil acceso, preferiblemente en el primer nivel de la edificación, con señalización visible desde el ingreso principal, circulación libre de barreras arquitectónicas y cercanía a zonas de alto flujo de usuarios. Esta intervención permitirá garantizar una atención incluyente, oportuna y digna, en concordancia con los lineamientos institucionales del SENA, la Política de Servicio al Ciudadano y el enfoque de atención diferencial.

2. DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES A INTERVENIR

La infraestructura física del sitio donde se proyecta la adecuación presenta un estado general regular, por lo que se hace necesario ejecutar diversas intervenciones. Entre estas se incluyen: cambio de cielo raso y pisos, demoliciones para la ampliación del espacio, desmonte de ventanas y traslado de tableros eléctricos, así como otras actividades indispensables para la puesta en marcha del Punto de Atención al Ciudadano.

Adicionalmente, se requiere mejorar el acceso al centro de formación mediante la adecuación de la puerta de ingreso, el área de recibo, la optimización de las conexiones eléctricas y la instalación de cielo raso, con el fin de contribuir a la regulación térmica del espacio.

2.1 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



Figura 1.1. Sede principal del CDATH ubicada entre las carreras 7 entre las calles 5 y 6. Se localizan las zonas de intervención del proyecto de adecuaciones.

2.2 REQUERIMIENTOS ESPECIFIFICOS

A continuación, se presenta la descripción técnica que se tiene destinado para las adecuaciones del punto de atención al ciudadano.

OBRAS DE ADECUACIONES				
CAPITULO	**ITEM**	**DESCRIPCION**		**CANTIDAD**
PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
	1	**LOCALIZACION, DEMOLICIÓN Y DESMONTES**		
72153900	1,1	Localización replanteo y cerramiento.	M2	60,00
72153507	1,2	Desmonte de ventana en aluminio de 2,32mx 1,50m	UND	1,00
72153507	1,3	Desmonte y retiro marco y puerta metálica de 2,14x1,0m y 0,72 x2,03m	UND	2,00
72153507	1,4	Desmonte y retiro marco, rejilla metálica de 0,80mx 0,35m	UND	2,00
72153507	1,5	Desmonte de inodoro y lavamanos	UND	1,00
72153507	1,6	Desmonte de cielo raso en icopor, incluye lamina y estructura, Incluye retiro de escombros)	M2	75,00
72141510	1,7	Demolición de muros e=0,20 mts, y enchape de pared de baño existente incluye retiro de escombros a escombrera autorizada por autoridad ambiental, (incluye cargue y transporte)	M2	30,00

72141510	1,8	Demolición de piso cerámica o tablón y alistado incluye retiro de escombros a escombrera autorizada por autoridad ambiental, (incluye cargue y transporte)	M2	60,00
72141510	1,9	Demolición de mesón de recibidor en ladrillo a la vista, mesada en concreto, bordillo de andén. Incluye retiro, cargue, transporte y disposición final de escombros, así como limpieza del área intervenida.	M2	5,00
72141510	1,10	Desmonte y retiro de baranda pasamanos.	UND	1,00
	2	**CIMIENTOS**		
72152710	2,1	Suministro e instalación de recebo b-400 e=12 cm, (suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	1,00
72152710	2,2	Suministro e instalación de Placa de piso en concreto de 2500 PSI de e = 0,10m.	M2	2,00
72152710	2,3	Suministro e instalación alistado de pisos con mortero 1:4 e= 0,06 m.	M3	3,60
	3	**PUERTAS Y DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO**		
72153002	3,1	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado de 10mm. y película de seguridad Sanblasteado (según diseño escogido por supervisión), con estructura de tubo de acero de 2" y tocetos Medidas Ancho 1.00m x Alto 2.40m Incluye bisagras hidráulicas, balineras, chapa de seguridad y accesorios.	M2	2,48
72153002	3,2	Suministro e instalación de puerta en vidrio templado acceso principal según diseño de 10mm. y película de seguridad Sanblasteado (logo SENA) fondo gris, letras transparentes. con estructura de tubo de acero de 2" y tocetos. Medidas Ancho 3.00m x Alto 2.48m Incluye bisagras hidráulicas, balineras, chapa de seguridad y accesorios– Manijas en acero inoxidable. – Cerradura de seguridad doble cilindro.	M2	7,45
72153002	3,3	Suministro e instalación de división vidrio templado de 10mm. y película de seguridad Sanblasteado (logo SENA) fondo gris, letras transparentes. con estructura de tubo de acero de 2" y tocetos. Medidas Ancho 5,70m x Alto 2.48m Incluye bisagras hidráulicas y accesorios.	M2	15,00
	4	**PISOS**		
72152504	4,1	Suministro e instalación de piso en porcelanato rectificado, color gris claro, en formato 60 x 60 cm, con caras diferenciadas y acabado mate, previamente seleccionado por la supervisión. Incluye la correcta instalación, ajuste y nivelación de la tapa para cajilla eléctrica, así como los cortes, alineación y acabados necesarios para garantizar una adecuada terminación, funcionalidad y presentación del piso.	M2	60,00
72152504	4,2	Suministro e instalación de guarda escoba en porcelanato rectificado color gris claro, con acabado mate, acorde con el piso en formato 60 x 60 cm de caras diferenciadas, garantizando uniformidad estética y correcta terminación.	ML	20,00
72152203	4,3	Suministro e instalación de cenefa en Granito lavado similar al existente.	ML	40,00

72152203	4,4	Suministro e instalación de piso en Granito lavado ampliación rampa acceso portería, similar al existente.	M2	5,00
	5	**MAMPOSTERIA Y PAÑETES**		
72151401	5,1	Suministro e instalación de pañete liso 1:4 para áreas de vanos demolidos, Incluye filos, esquinas y dilataciones.	M2	10,00
72151903	5,2	Suministro e instalación de muro ladrillo prensado e=0.12m rejilla tipo Santafé o calidad superior, visto por dos caras para abertura rejilla sobre muro.	M2	2,00
72151903	5,3	Suministro e instalación de ladrillo bloque No. 4,	M2	9,00
	6	**ESTUCO Y PINTURAS**		
72152005	6,1	Mantenimiento, reposición y aplicación de estuco muros interiores y exteriores, incluye rasqueteo y limpieza previa de la pared antes de aplicación de productos.	M2	10,00
73181104	6,2	Suministro e instalación de vinilo tipo 1 (superlavable) muros interiores, a tres (3) manos.	M2	40,00
	7	**AIRE ACONDICIONADO**		
72101511	7,1	Suministro e instalación Aire acondicionado mini Split, Ancho 42 cm, Alto 99 cm, Tipo de aire acondicionado Inverter, Tipo de refrigerante R410A, Capacidad de refrigeración 24.000 BTU, Voltaje 220 V, Sistema de enfriamiento Compresor, Alimentación AC/DC, Eléctrica, Eficiencia energética A, y que contengan la etiqueta de eficiencia energética, Consumo energético 228.1 kWh/mes, Potencia nominal, 3.75 W, porcentaje de ahorro de energía mayor igual al 70%, tiempo de garantía, 4 años a partir de la fecha de instalación, incluye tuberías, mangueras, recubrimiento aislante de alta calidad y todo el material de instalación, incluye accesorios y material de soporte requerido para instalar condensador toma 220 v y unidad sobre el techo, con certificación RETIE, desagüe interno sobre pared.	UND	1,00
72101512	7,2	Traslado de aire acondicionado existente incluye accesorios y material de soporte requerido para instalar condensador toma 220 v y unidad sobre cubierta.	UND	1,00
	8	**CIELO RASO**		
72152605	8,1	Suministro e instalación de cielo raso con nicho en superboard 6mm según diseño establecido por la supervisión.	M2	50,00
72152605	8,2	Suministro e instalación de cielo raso PVC según diseño y especificaciones escogidas por la supervisión para pasillos.	M2	40,00
72152605	8,3	Suministro e instalación muro superboard 8mm por las dos caras.	M2	20,00
	9	**REVESTIMIENTOS**		
73151801	9,1	Suministro e instalación de porcelanato rectificado color fondo blanco y vetas grises formato 61 x 121,5 cm, de caras diferenciadas, acabado mate con sutiles destellos aplicados sobre las vetas, para revestimiento de pared exterior en el punto de atención, incluyendo cortes, nivelación y acabados para una correcta instalación.	M2	10,00

72153608	9,2	Suministro e instalación de persiana enrollable en poliéster color beige, tipo decorativa y blackout. Dimensiones: 1,30 x 1,65 m. Incluye soportes, anclajes, mecanismos de accionamiento y correcta instalación.	UND	10,00
72151401	9,3	Suministro e instalación de paneles laminados en melamina sobre MDF RH de 15 mm, de alta calidad, color nogal cenizo, dispuestos en módulos cada 0,50 m, con junta de dilatación de 1 cm en color negro, instalados sobre pared según diseño. Incluye fijación, nivelación y acabados para una correcta terminación	M2	31,00
	10	**SISTEMAS ELECTRICOS**		
72151501	10,1	Suministro e instalación de luminarias tipo panel para interior LED de 0,60 x 0,60 m, factor de potencia 0.9 V o superior, temperatura de color mínimo entre 3000 y 6500 Kelvin (K), eficacia luminosa de la luminaria debe ser mínimo de 85 lm/w para iluminación, indice de Reproducción Cromática mínimo >80 en Iluminación. Incluye luminarias, accesorios, marco en aluminio blanco, punto de salida eléctrica y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Cumpliendo con las normas RETIE y RETILAP vigentes.	UND	9,00
72151500	10,2	Suministro y montaje de Punto toma doble sencillo, incluye regateo, ductos, cableado y accesorios.	UND	8,00
72151501	10,3	Suministro e instalación de Salida lampara decorativa empotrada cuadrada sobre cielo raso de 10,5 * 10,5 LED, 6 W, Color Blanco, Luz Cálida 3 000 k. Incluye luminarias, accesorios, marco en aluminio blanco, punto de salida eléctrica y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Cumpliendo con las normas RETIE y vigentes.	UND	8,00
72151501	10,4	Suministro e instalación de perfil LED para cielo raso, con iluminación cálida. Incluye perfiles, difusores, soportes, fuentes de alimentación y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, cumpliendo con las normas RETIE vigentes.	ML	35,00
72151501	10,5	Suministro e instalación de Luminaria Led Light Solar Tipo Faroles de pared solar, Voltaje 5 V, Potencia nominal 50 W, LED Solar Integrada S, Eficacia Luminosa 120, Índice de reproducción cromática (CRI) 80, Grado de protección IK 08 Rosca, Temperatura de color 6000 K, Vida útil 50000 horas, Ancho 51 cm Alto 10 cm, Profundidad 23 cm, Tipo de uso Exterior, Material de la base Aluminio, Alimentación – Eléctrica Energía Solar Flujo luminoso 6000 Lúmenes Nivel de protección IP 65	UND	5,00
	11	**OTROS**		
72154028	11,1	Suministro e instalación de logo institucional SENA en acero inoxidable, dimensiones 1,00 m x 1,00 m x 0,05 m, con iluminación mediante módulos LED. Cara frontal y laterales en acero inoxidable con acabado plata satinada, espesor de 10 mm. Incluye sistema de fijación sobre pared, conexiones eléctricas, accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	1,00

72154028	11,2	Suministro e instalación de letrero institucional para exteriores en acero inoxidable, conformado por letras individuales de 0,20 m x 0,20 m x 0,05 m, con el texto: “CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA”. Iluminación mediante módulos LED. Incluye fabricación, instalación, montaje sobre pared, conexiones eléctricas, fijaciones y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento y acabado.	UND	1,00
72152300	11,3	Suministro e instalación de pasamanos en acero inoxidable tipo 304 con acabado satinado, compuesto por parales en tubería redonda de 1 1/2”, roda mano (bolillo) en tubería redonda de 2” y tres (3) hilos en tubería redonda de 1/2”. Incluye bridas de sujeción para anclaje a pared, tapa-bridas, chazos y todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Los parales de soporte se dispondrán cada 1,00 m aproximadamente, garantizando estabilidad, seguridad y adecuada terminación.	ML	7,00
72154024	11,4	Suministro e instalación de cubierta tipo pérgola acceso principal en estructura metálica con policarbonato según diseño.	M2	10,00
72153603	11,5	Suministro e instalación de módulo de recibidor tipo recepción empotrado, fabricado en madecor (melamina sobre MDF RH de 15 mm), reengrosado a 9 cm, con acabado en color nogal ceniza combinado con gris grafito, según diseño aprobado por la supervisión. Incluye dos (2) cajoneras tipo archivador (configuración 2x1), mesón en “L” en granito negro con borde redondeado, y dos (2) grommets eléctricos tipo caja de conectividad FLIP, cada uno con 2 tomas de corriente, puertos USB-A, USB-C, LAN Cat.6 y HDMI. Se incluye fabricación, transporte, instalación, nivelación, fijación y todos los accesorios necesarios para su correcta operación y acabado final.	UND	1,00
72153608	11,6	Suministro e instalación de celosía fija en aluminio extruido, conformada por lamas verticales orientables machihembradas entre sí, con ancho de 150 a 200 mm, acabado lacado con espesor mínimo de 60 micras en color a definir. Incluye testeros de nylon de alta resistencia, pivotes de aluminio de mínimo 6 mm de diámetro, marco perimetral en aleación 6063 con tratamiento térmico T5 y sistema de accionamiento manual, así como todos los elementos de fijación, marcos, anclajes, mano de obra, equipos y accesorios necesarios para su correcta instalación en posición horizontal inclinada sobre superficie de ladrillo a la vista.	M2	24,00
72154032	11,7	Suministro e instalación de marco puerta metálica existente, incluye instalación de puerta y pintura.	UND	1,00

El alcance del proyecto comprende la ejecución de las siguientes actividades, organizadas por componentes:

- Obras preliminares, demoliciones y desmontes

Comprende la ejecución de actividades iniciales destinadas a la adecuación y preparación de las áreas objeto de intervención. Estas incluyen el desmonte, retiro y almacenamiento temporal o disposición de elementos existentes tales como puertas, ventanas, divisiones, cielos rasos, luminarias y equipos instalados.

De igual manera, se contempla la demolición de pisos, muros y demás elementos constructivos que se requieran intervenir, garantizando en todo momento la estabilidad de las estructuras adyacentes. Incluye además el cargue, transporte, retiro y disposición final de los escombros y residuos de obra en sitios debidamente autorizados, conforme a la normatividad ambiental vigente.

- Intervención arquitectónica y constructiva

Este componente comprende la adecuación física y funcional de los espacios mediante la construcción, modificación, rehabilitación y/o reposición de elementos arquitectónicos y constructivos. Incluye la ejecución de cimientos, demolición de pisos, levantamiento y/o adecuación de muros en mampostería, divisiones en vidrio templado, instalación de pérgola cubierta acceso principal, así como el suministro e instalación de puertas en vidrio templado.

De igual manera, contempla la implementación de elementos arquitectónicos y acabados tanto en fachadas como en espacios interiores, en concordancia con el diseño aprobado, garantizando condiciones de calidad, funcionalidad y cumplimiento de la normatividad técnica vigente.

- Acabados arquitectónicos y dotación fija

Se contempla la ejecución de los acabados requeridos para la adecuada puesta en funcionamiento de los espacios intervenidos. Incluye el suministro e instalación de pisos en porcelanato de tráfico comercial, guarda escobas, sistemas de cielo raso en PVC y en superboard, así como la aplicación de estuco y pintura en muros interiores. De igual manera, se consideran recubrimientos especiales (revestimientos) conforme a las necesidades del diseño y uso de los espacios.

Así mismo, se incorpora la instalación de paneles decorativos, elementos de fachada, señalización institucional y mobiliario fijo, como el módulo de atención general tipo recepción, contribuyendo al cumplimiento de condiciones de funcionalidad, durabilidad y calidad estética del proyecto, en concordancia con el diseño.

- Instalaciones eléctricas e iluminación.

Se contempla la adecuación, actualización y puesta a punto de las redes eléctricas existentes, incluyendo el suministro e instalación de luminarias tipo panel LED, puntos eléctricos, interruptores y tomacorrientes y lámparas solares para exteriores.

Las actividades deberán ejecutarse garantizando el cumplimiento de la normatividad técnica vigente, así como condiciones óptimas de seguridad, eficiencia energética y correcto funcionamiento de las instalaciones.

- Alcance del proyecto

La ejecución del proyecto del Punto de Atención al Ciudadano del SENA La Plata generará beneficios directos y sostenibles para la oferta formativa, la capacidad operativa institucional y la atención integral de los usuarios, al fortalecer un espacio estratégico para la orientación, información y gestión de

trámites, conforme a los lineamientos del Manual de Atención al Ciudadano del SENA.

En términos de oferta formativa, el proyecto permitirá mejorar la divulgación oportuna y clara de los programas de Formación Profesional Integral, facilitando el acceso equitativo de la comunidad a los servicios de formación, inscripción, certificación y orientación ocupacional. Esto contribuirá al aumento de la cobertura, permanencia y satisfacción de los aprendices y aspirantes.

Respecto a la capacidad operativa, la adecuación y puesta en funcionamiento del punto de atención optimizará los procesos administrativos y de servicio al ciudadano, reduciendo tiempos de respuesta, descongestionando áreas administrativas y garantizando condiciones adecuadas de accesibilidad, comodidad y seguridad para usuarios y servidores públicos. Asimismo, permitirá una mejor articulación entre las dependencias del Centro y una atención más eficiente y estandarizada.


En cuanto a la atención de usuarios, el proyecto fortalecerá la calidad del servicio, asegurando una atención presencial digna, incluyente y conforme a los principios de oportunidad, transparencia y eficiencia, mejorando la percepción institucional y la confianza de la ciudadanía en el SENA.

Fotos de espacio a intervenir

Se determinó adecuar el Centro de Atención al Ciudadano en el espacio más cercano al acceso principal, el cual anteriormente estaba destinado a cuarto de mantenimiento y red eléctrica.





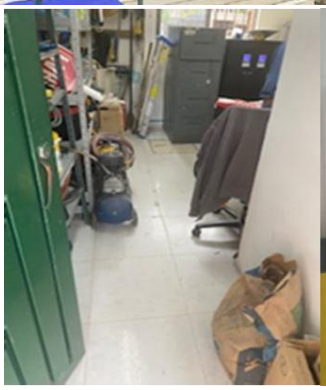



Imágenes de proyección de espacios y diseño.





Alzados en 3 dimensiones.




Localización en planta.


LOCALIZACIÓN ACTUAL

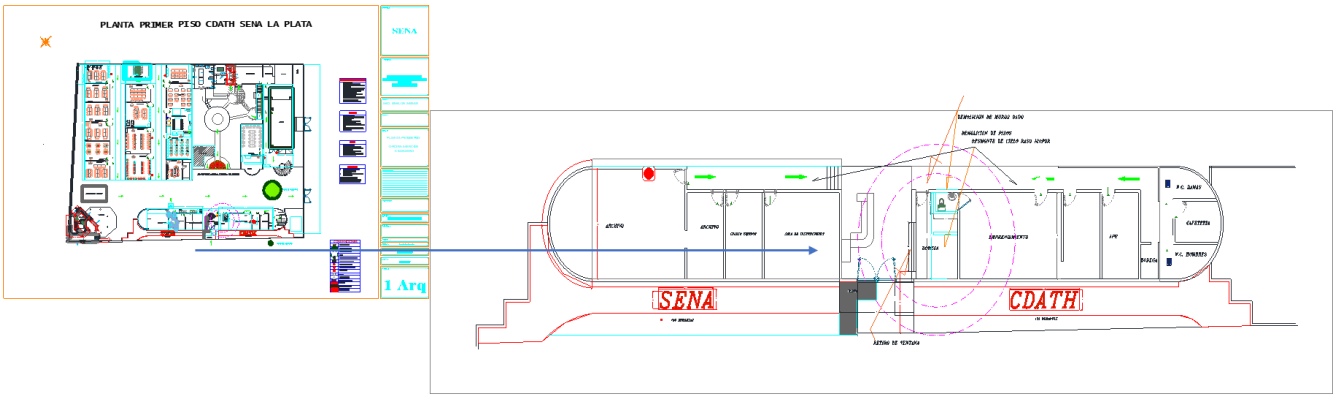


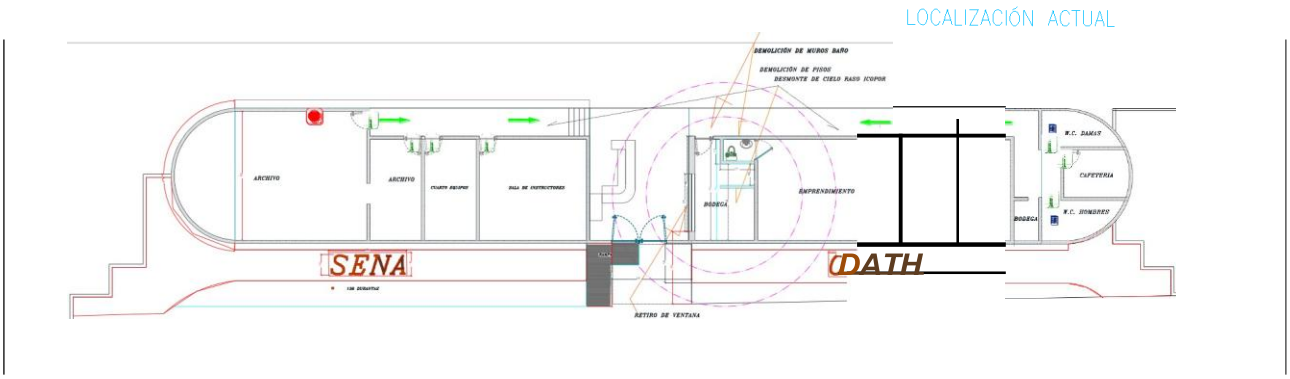


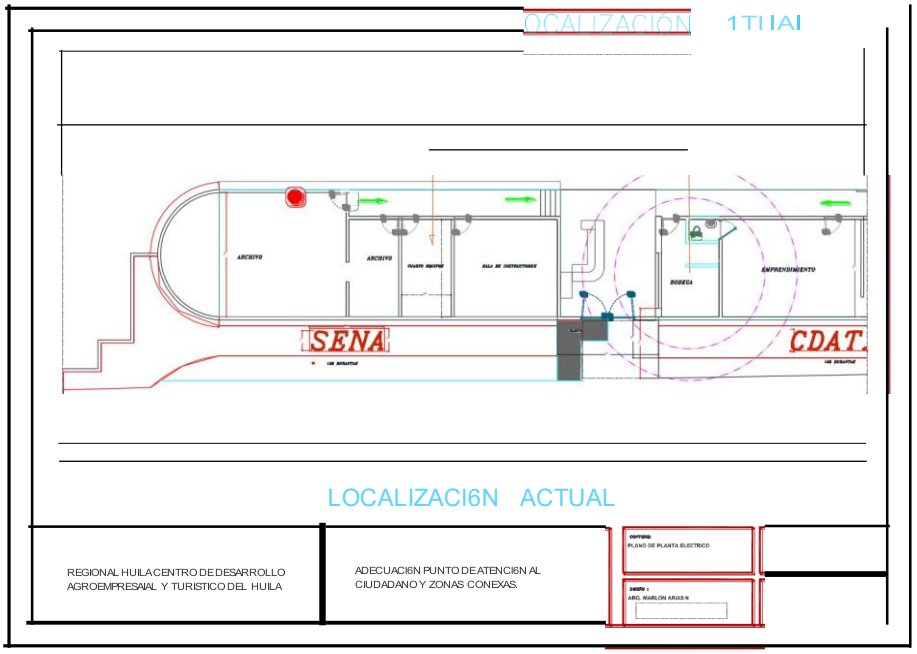


DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN

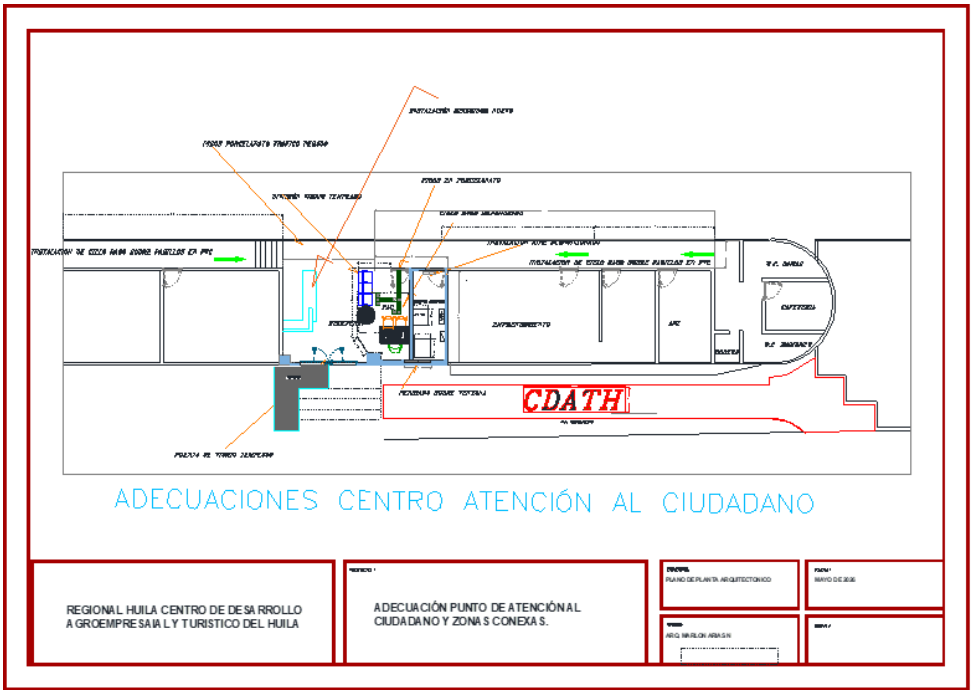

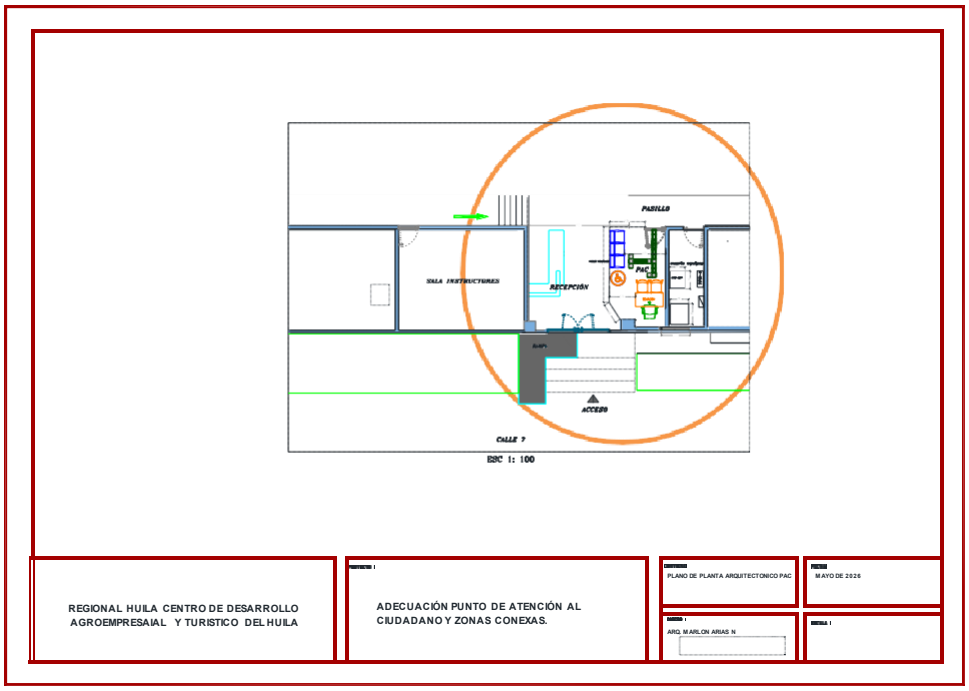

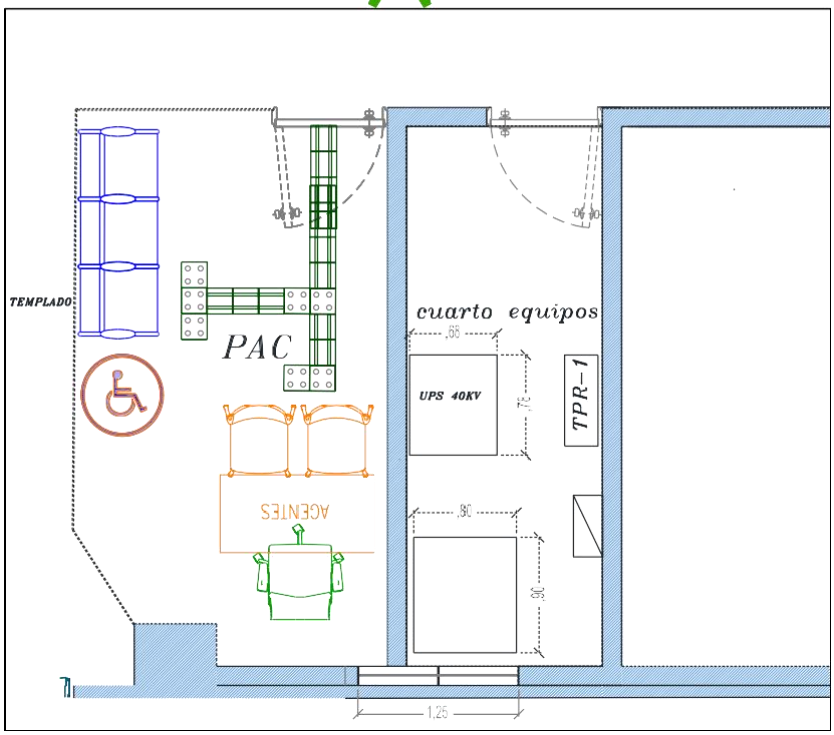


Diseño de planta Arquitectónico.

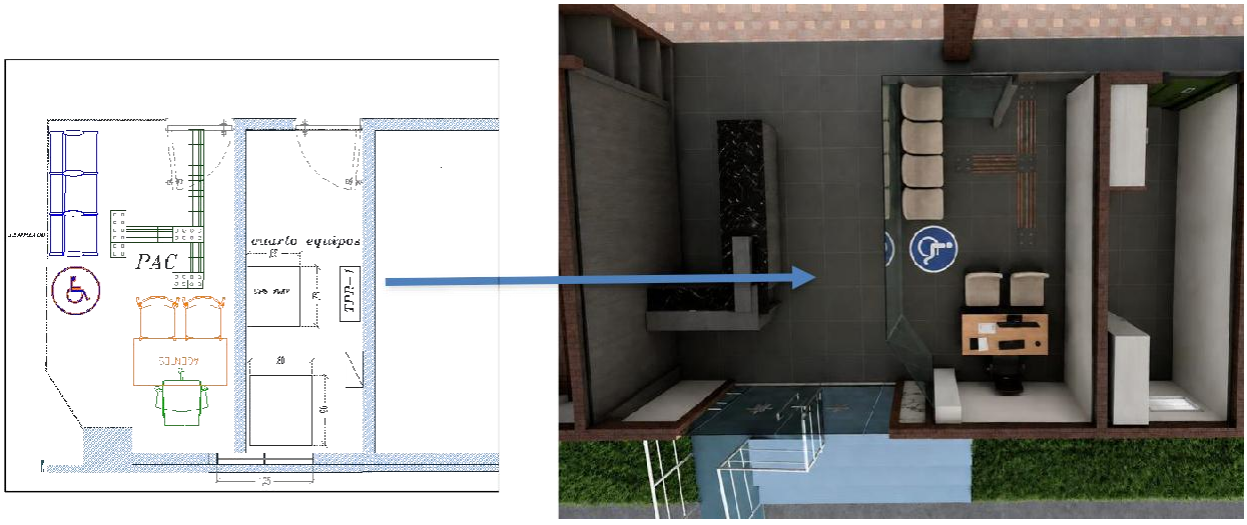

Imágenes de proyección de espacios y diseño.

Diseño de mueble fijo recibidor



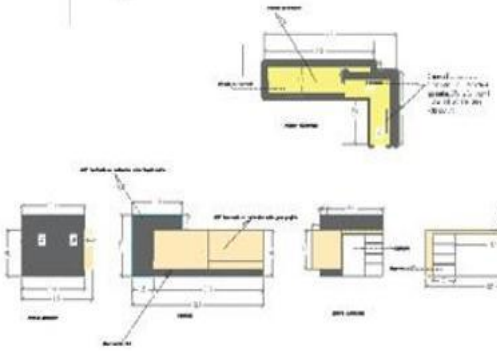



Logo institucional SENA en acero inoxidable, dimensiones 1,00 m x 1,00 m x 0,05 m, con iluminación mediante módulos LED.



Paneles laminados en melamina sobre MDF RH de 15 mm, de alta calidad




porcelanato rectificado color fondo blanco y vetas grises formato 61 x 121,5 cm

Cubierta tipo pérgola acceso principal en estructura metálica y policarbonato.





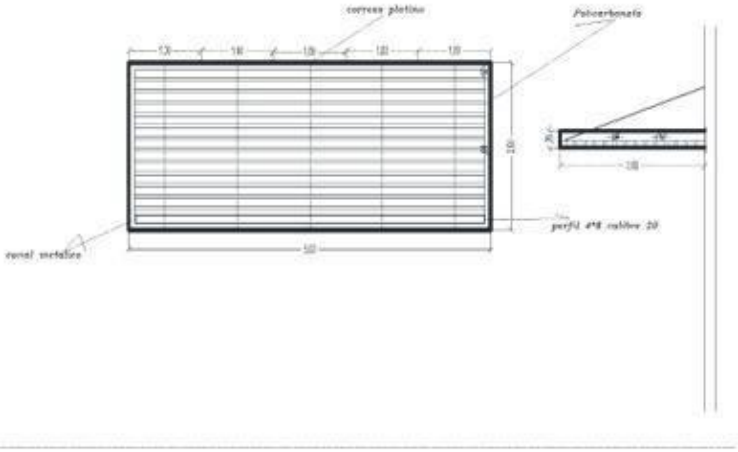

Puertas en vidrio templado y baranda pasamanos acero inoxidable.





Letrero institucional para exteriores en acero inoxidable, conformado por letras individuales de 0,20 m x 0,20 m x 0,05





En virtud de lo expuesto, se considera pertinente adelantar un estudio de mercado que permita identificar proveedores idóneos y con capacidad técnica para la prestación del servicio requerido, así como establecer un presupuesto oficial acorde con las condiciones del sector. Este análisis garantiza la selección de una oferta favorable en términos de calidad y costo, promoviendo la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos. En consecuencia, la necesidad podrá ser atendida mediante un proceso de contratación de mínima cuantía, conforme a la normatividad vigente y haciendo uso de documentos tipo que estandarizan y agilizan el proceso contractual.

Se justifica la adopción del modelo de documentos tipo en el presente proceso de contratación, en la medida en que estos instrumentos estandarizados permiten establecer condiciones claras, objetivas y uniformes para todos los proponentes, garantizando principios de transparencia, igualdad y selección objetiva. Asimismo, su utilización contribuye a optimizar los tiempos del proceso contractual, reducir riesgos de errores u omisiones en la estructuración de los pliegos y asegurar el cumplimiento de la normativa vigente en materia de contratación pública.

En este sentido, una vez realizado el estudio de mercado para identificar proveedores idóneos y definir el presupuesto oficial, la necesidad podrá ser atendida mediante un proceso de mínima cuantía soportado en documentos tipo, lo cual facilita la participación plural de oferentes, promueve la eficiencia administrativa y fortalece la adecuada gestión de los recursos públicos.

3. PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

41_9526_175 Adecuación a todo costo de la infraestructura de la oficina de atención al ciudadano y zonas conexas para la sede principal del Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila, Sena, Regional Huila.

Códigos UNSPSC:
72153507, 72141510, 72153002, 72152504, 72152203, 72151401, 72151903, 72152005, 73181104, 72101511, 72152605, 73151801, 72153608, 72151401, 72151501, 72151500, 72151501, 72154028, 72152300, 72154024, 72153603, 72153608, 72153603, 72154032.

4. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Dependencia SIIF: 952624 CENTRO DE DESARROLLO AGROEMPRESARIAL Y TURISTICO DEL HUILA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
Posición del Gasto: C-3699-1300-17-53105B-3699011-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES ADECUADAS - DESARROLLO INTEGRAL DE LA PLANTA FISICA DEL SENA A NIVEL NACIONAL
Concepto Interno SENA: Adecuaciones y construcciones
Valor Asignado: $137.308.861
Certificado de disponibilidad presupuestal: 2726 de 2026.


CONCLUSIONES

Por las razones anteriormente expuestas, resulta necesario que el Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila realice el proceso de estudio de mercado con proveedores que cumplan con las condiciones jurídicas, económicas y de calidad para La adecuación del punto de atención al ciudadano y zonas conexas.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Remitir correo con la necesidad para dar inicio al proceso de contratación.	14/07/2026	Maura Lorena Nuñez Sanabria	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/ NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Diego Fernando Villalba Artunduaga	Subdirector (E)	SI	N/A	
Maura Lorena Nuñez Sanabria	Coordinación Administrativa	SI	N/A	
Marlon Arias Nasayo	Arquitecto	SI	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

Outlook

RV: CPE No. 41-9-2026-023134 - SOLICITUD DE AVAL PARA DAR INICIO AL TRÁMITE CONTRACTUAL PERTINENTE

Desde Diego Fernando Villalba Artunduaga <dvillalba@sena.edu.co>
Fecha Lun 24/08/2026 8:25
Para Maura Lorena Nuñez Sanabria <mlnunez@sena.edu.co>; Lida Fernanda Rivera Ledesma <lriveral@sena.edu.co>; Yamilet Martinez Jaramillo <ymartinezj@sena.edu.co>

3 archivos adjuntos (2 MB)
1. ﷺREA REQUIRENTE.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-023134 - NIS 2026-02-368034 -.pdf; C.I.(FRM)-9-2026-023134-(41)-419526-+ DIEGO FERNANDO VILLALBA ARTUNDUAGA--SOL.html; 2. ACTA DE NECESIDAD.PDF 01-MAIL-Anexos Respuestas Internas - No. 9-2026-023134 - NIS 2026-02-368034.pdf;

Cordial saludo estimados,

Doy aval para el inicio del trámite contractual, favor proceder.

@Diana Paola Bustamante Laguna , me permito informar que la comunicación relacionada no amerita respuesta, favor archivar. Gracias

Atentamente,

De: grupoadmondocumentos@sena.edu.co <grupoadmondocumentos@sena.edu.co>
Enviado: viernes, 21 de agosto de 2026 17:00
Para: Diego Fernando Villalba Artunduaga <dvillalba@sena.edu.co>; Diana Paola Bustamante Laguna <dbustamante@sena.edu.co>
Cc: Maura Lorena Nuñez Sanabria <mlnunez@sena.edu.co>; Lida Fernanda Rivera Ledesma <lriveral@sena.edu.co>; Yamilet Martinez Jaramillo <ymartinezj@sena.edu.co>
Asunto: CPE No. 41-9-2026-023134 - SOLICITUD DE AVAL PARA DAR INICIO AL TRÁMITE CONTRACTUAL PERTINENTE

Apreciado(a) * DIEGO FERNANDO VILLALBA ARTUNDUAGA
Para su respectivo trámite se ha radicado la siguiente comunicación electrónica:

Radicado	N.I.S.	Fecha
41-9-2026-023134	2026-02-368034	8/21/2026 5:00:02 PM

Asunto	Descripción del asunto
SOLICITUDES SENA	SOLICITUD DE AVAL PARA DAR INICIO AL TRÁMITE CONTRACTUAL PERTINENTE

M E M O R A N D O

41-9526-103-

La Plata,

PARA: Diego Fernando Villalba Artunduaga
DE:

ASUNTO: Solicitud de aval para dar inicio al trámite contractual pertinente

De conformidad con lo dispuesto en el Manual de Contratación V7, me permito enviar para su revisión y consideración de firma el acta de necesidad, así como solicitud de aval para la contratación del siguiente objeto contractual:

“41_9526_175 Adecuación a todo costo de la infraestructura de la oficina de atención al ciudadano y zonas conexas para la sede principal del centro de desarrollo agroempresarial y turístico del huila, Sena regional Huila”.

Cordialmente,

Maura Lorena Nuñez Sanabria
Coordinadora administrativa

Atentamente,

NOTA: Este correo es generado por medios automáticos, por favor no dar respuesta al remitente

Administracion Documentos
- Cuenta Generica: Planta
grupoadmondocumentos@sena.edu.co

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Diego Fernando Villalba Artunduaga
Centro De Desarrollo Agroempresarial Y Turistico Del Huila - Subdirector de Centro (E)
dvillalba@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500
Carrera 7 # 5-67

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Este mensaje y cualquier archivo adjunto pueden contener información pública clasificada y/o reservada bajo custodia o propiedad del SENA, destinada exclusivamente a su(s) destinatario(s). Dicha información debe ser utilizada únicamente para la finalidad con la que fue enviada y en cumplimiento de la normativa aplicable.

Si usted no es el destinatario autorizado o ha recibido este mensaje por error, le solicitamos que omita su contenido, informe de inmediato al remitente por correo electrónico con copia a servicioalciudadano@sena.edu.co y elimine el mensaje. La retención, difusión, distribución o copia de este mensaje está prohibida y puede acarrear sanciones legales.

Para más información, consulte nuestras Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información y las Políticas de Tratamiento para la Protección de Datos Personales, disponibles en el sitio web del SENA.
