

Id	Id		Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1	**1**				**PROYECTO**	**300 días**	**lun 1/06/26**	**dom 25/07/2**	
2	**2**			**1**	**OBRA**	**214 días**	**mar 30/06/2**	**dom 25/04/2**	
3	**3**			**1.1**	**PRELIMINARES**	**91 días**	**mar 30/06/2**	**mié 4/11/26**	
4	**4**			**1.1.1**	**DESMONTE Y DEMOLICION**	**91 días**	**mar 30/06/26**	**mié 4/11/26**	
5	5			1.1.1.01	DESMONTE	5,13 días	mar 30/06/2	lun 6/07/26	433CF
6	6			1.1.1.02	DESMONTE	5,13 días	mar 30/06/2	lun 6/07/26	5CC
7	7			1.1.1.03	DESMONTE	16,13 días	lun 6/07/26	sáb 25/07/26	6CF
8	8			1.1.1.04	DESMONTE	14,13 días	jue 2/07/26	mar 21/07/2	5CC+2 días
9	9			1.1.1.05	DESMONTE	15,13 días	mar 21/07/2	dom 9/08/26	8CF
10	10			1.1.1.06	DESMONTE	14,13 días	jue 23/07/26	mar 11/08/2	8CF+2 días
11	11			1.1.1.07	DEMOLICIC	27,13 días	dom 9/08/26	sáb 12/09/26	9CF
12	12			1.1.1.08	DEMOLICIC	22,13 días	sáb 12/09/26	dom 11/10/2	11CF
13	13			1.1.1.09	DEMOLICIC	19,13 días	dom 11/10/2	mié 4/11/26	12CF
14	14			1.1.1.10	DESMONTE	11,13 días	jue 23/07/26	jue 6/08/26	10CC
15	**15**			**1.1.2**	**MOVIMIENTC DE TIERRA**	**51 días**	**mar 30/06/26**	**mié 9/09/26**	
16	16			1.1.2.1	DESCAPOTE	22,13 días	mar 30/06/2	mié 29/07/2	5CC
17	17			1.1.2.2	EXCAVACIO	33,13 días	jue 2/07/26	sáb 15/08/26	16CC+2 días
18	18			1.1.2.3	TRANSPOR	25,13 días	jue 2/07/26	mié 5/08/26	17CC
19	19			1.1.2.4	RELLENO C	33,13 días	lun 27/07/26	mié 9/09/26	14CC+4 días
20	**20**			**1.2**	**MODULO PRINCIPAL**	**124 días**	**jue 3/09/26**	**mié 24/02/27**	
21	**21**			**1.2.1**	**CIMENTACIOI**	**26 días**	**jue 3/09/26**	**vie 9/10/26**	
22	22			1.2.1.1	SOLADO, LI	8,13 días	jue 3/09/26	sáb 12/09/26	17CF+19 días
23	23			1.2.1.2	ZAPATA EN	8,13 días	mié 30/09/2	vie 9/10/26	26CF+1 día
24	24			1.2.1.3	ACERO DE F	12,13 días	dom 13/09/2	dom 27/09/2	22CF+1 día
25	25			1.2.1.4	VIGA EN CC	8,13 días	mié 30/09/2	vie 9/10/26	26CF+1 día
26	26			1.2.1.5	ACERO DE F	11,13 días	mar 15/09/2	mar 29/09/2	22CF+3 días
27	**27**			**1.2.2**	**ESTRUCTURA EN CONCRETO Y**	**55 días**	**vie 16/10/26**	**vie 1/01/27**	
28	28			1.2.2.01	COLUMNA	15,13 días	sáb 14/11/26	jue 3/12/26	29CF
29	29			1.2.2.02	ACERO DE F	22,13 días	vie 16/10/26	sáb 14/11/26	25CF+7 días
30	30			1.2.2.03	VÍGA AÉRE/	8,13 días	dom 29/11/2	mar 8/12/26	31CC
31	31			1.2.2.04	ACERO DE F	16,13 días	dom 29/11/2	vie 18/12/26	28CC+15 días
32	32			1.2.2.05	VÍGA AÉRE/	4,13 días	mié 23/12/2	lun 28/12/26	33CC
33	33			1.2.2.06	ACERO DE F	8,13 días	mié 23/12/2	vie 1/01/27	30CF+15 días
34	34			1.2.2.07	DINTELES E	2,13 días	sáb 19/12/26	lun 21/12/26	35CF

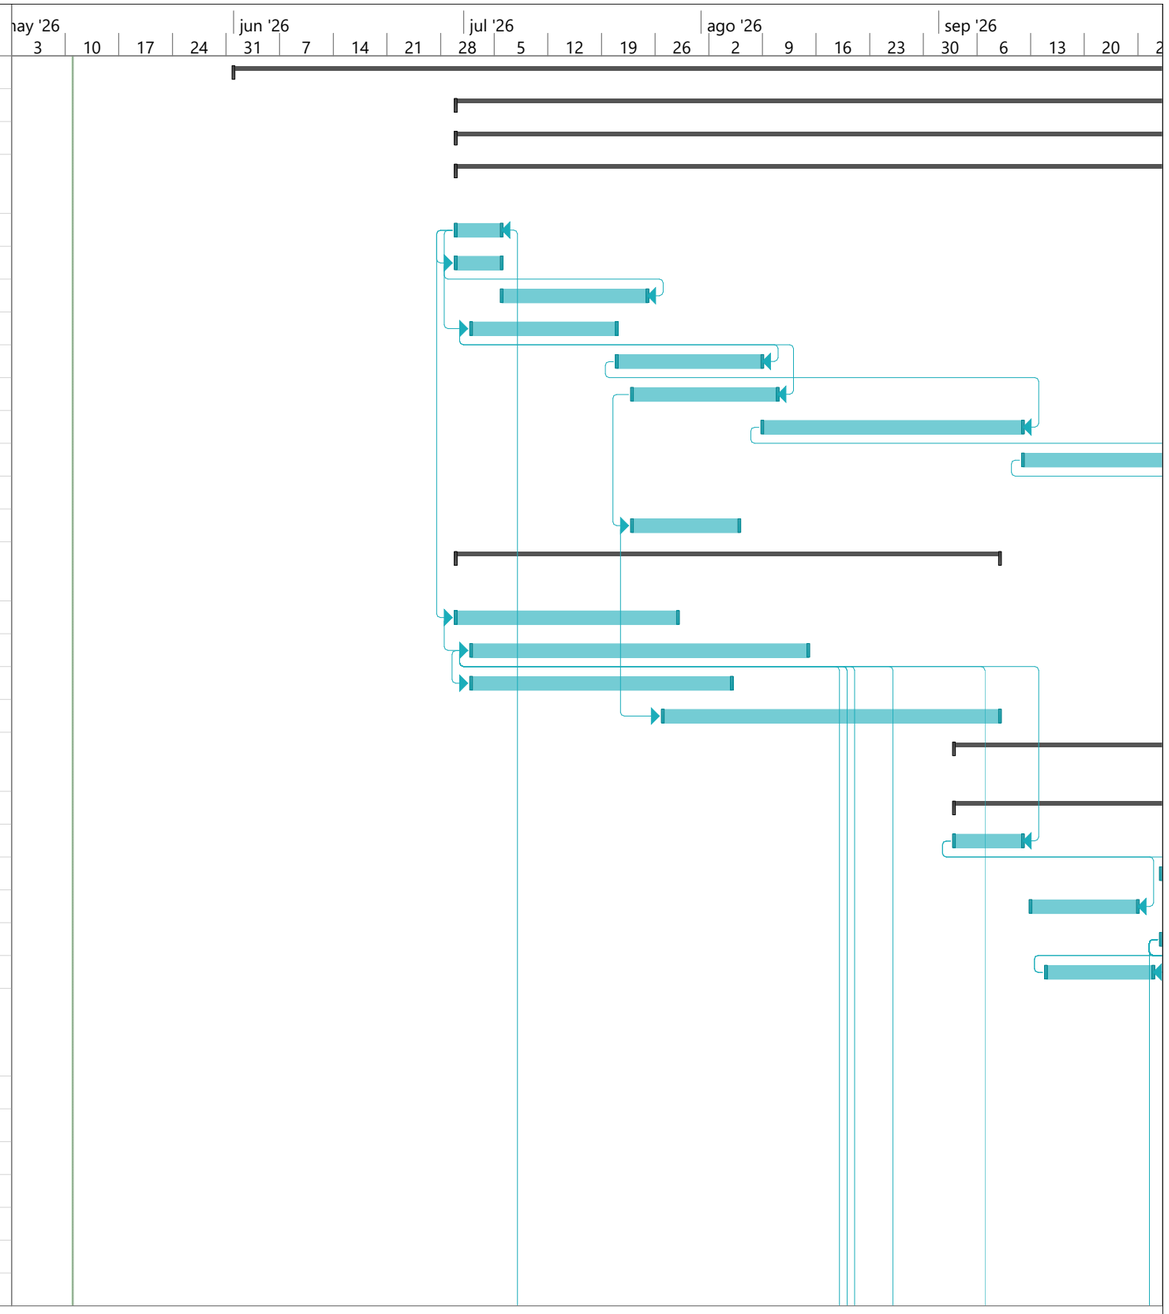

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Id		Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
35	35			1.2.2.08	ACERO DE F	5,13 días	mar 15/12/2(	sáb 19/12/26	44CC+7 días
36	36			1.2.2.09	ALFAJÍAS EI	4,13 días	mié 23/12/2(	dom 27/12/2	37CC
37	37			1.2.2.10	ACERO DE F	5,13 días	mié 23/12/2(	mar 29/12/2(	44CC+15 días
38	38			1.2.2.11	ACERO DE F	5,13 días	mié 23/12/2(	mar 29/12/2(	44CC+15 días
39	**39**			**1.2.3**	**ESTRUCTURA**	**7 días**	**jue 31/12/26**	**dom 10/01/2**	
40	40			1.2.3.1	ESTRUCTUF	6,13 días	lun 4/01/27	dom 10/01/2	32CF+7 días
41	41			1.2.3.2	SUMINISTR	5,13 días	jue 31/12/26	mié 6/01/27	156CF
42	42			1.2.3.3	BARANDA M	5,13 días	jue 31/12/26	mié 6/01/27	156CF
43	**43**			**1.2.4**	**MAMPOSTER**	**54 días**	**mar 8/12/26**	**sáb 20/02/27**	
44	44			1.2.4.1	MURO EN E	15,13 días	mar 8/12/26	dom 27/12/2	54CF
45	45			1.2.4.2	PAÑETE MU	8,13 días	dom 27/12/2	mar 5/01/27	44CF
46	46			1.2.4.3	PAÑETE MU	8,13 días	mar 29/12/2(	jue 7/01/27	44CF+2 días
47	47			1.2.4.4	ESTUCO PR	8,13 días	mar 2/02/27	jue 11/02/27	64CC
48	48			1.2.4.5	ESTUCO PL	8,13 días	mar 2/02/27	jue 11/02/27	64CC
49	49			1.2.4.6	PINTURA VI	8,13 días	jue 11/02/27	sáb 20/02/27	69CC
50	50			1.2.4.7	PINTURA VI	8,13 días	jue 11/02/27	sáb 20/02/27	69CC
51	51			1.2.4.8	BALDOSA C	14,13 días	jue 7/01/27	mar 26/01/2	56CC+30 días
52	52			1.2.4.9	MESÓN EN	3,13 días	vie 18/12/26	mar 22/12/2(	44CC+10 días
53	**53**			**1.2.5**	**PISOS**	**38 días**	**jue 3/12/26**	**mar 26/01/2**	
54	54			1.2.5.1	PLACA DE C	4,13 días	jue 3/12/26	mar 8/12/26	55CC
55	55			1.2.5.2	MALLA ELE(	6,13 días	jue 3/12/26	jue 10/12/26	28CF
56	56			1.2.5.3	AFINADO P	6,13 días	mar 8/12/26	mar 15/12/2(	54CF
57	57			1.2.5.4	GUARDAES	5,13 días	jue 7/01/27	mié 13/01/27	51CC
58	58			1.2.5.5	PISO BALDO	14,13 días	jue 7/01/27	mar 26/01/2	56CC+30 días
59	59			1.2.5.6	PISO EN CE	8,13 días	mar 29/12/2(	jue 7/01/27	45CC+2 días
60	**60**			**1.2.6**	**CUBIERTA**	**33 días**	**lun 4/01/27**	**jue 18/02/27**	
61	61			1.2.6.1	SUMINISTR	22,13 días	lun 4/01/27	mar 2/02/27	40CC
62	62			1.2.6.2	CIELO RASC	8,13 días	mar 9/02/27	jue 18/02/27	64CF
63	63			1.2.6.3	CANAL LAM	6,13 días	mar 2/02/27	mar 9/02/27	61CF
64	64			1.2.6.4	SUMINISTR	6,13 días	mar 2/02/27	mar 9/02/27	61CF
65	**65**			**1.2.7**	**CARPINTERIA**	**9 días**	**jue 11/02/27**	**mié 24/02/2**	
66	66			1.2.7.1	SUMINISTR	8,13 días	jue 11/02/27	sáb 20/02/27	48CF
67	67			1.2.7.2	SUMINISTR	8,13 días	jue 11/02/27	sáb 20/02/27	48CF
68	68			1.2.7.3	SUMINISTR	4,13 días	sáb 20/02/27	mié 24/02/27	49CF
69	69			1.2.7.4	SUMINISTR	8,13 días	jue 11/02/27	sáb 20/02/27	48CF
70	70			1.2.7.5	ESPEJO 3M	4,13 días	sáb 20/02/27	mié 24/02/27	49CF
71	**71**			**1.3**	**MODULO ADMI**	**68 días**	**sáb 15/08/2(**	**jue 19/11/26**	
72	**72**			**1.3.1**	**CIMENTACIO**	**20 días**	**sáb 15/08/2(**	**sáb 12/09/2(**	

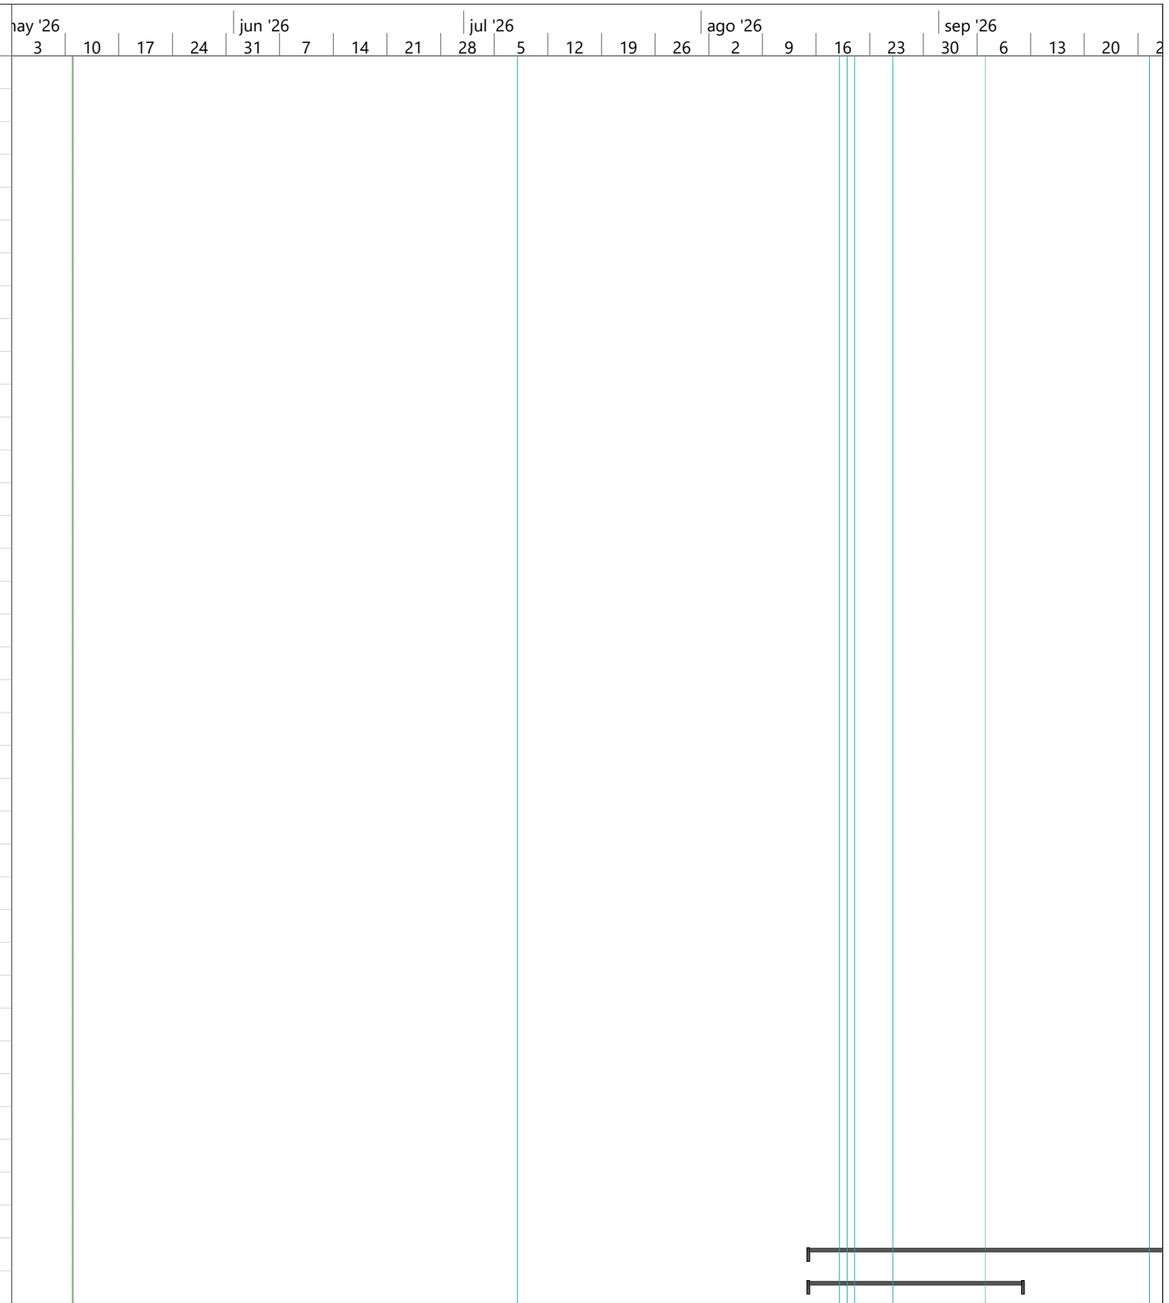

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Id		Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
73	73			1.3.1.1	SOLADO, LI	3,13 días	sáb 15/08/26	mar 18/08/2(	17CF
74	74			1.3.1.2	ZAPATA EN	4,13 días	lun 24/08/26	jue 27/08/26	75CF
75	75			1.3.1.3	ACERO DE F	5,13 días	mar 18/08/2(	lun 24/08/26	73CF
76	76			1.3.1.4	VIGA EN CC	4,13 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	77CF
77	77			1.3.1.5	ACERO DE F	5,13 días	jue 3/09/26	mié 9/09/26	74CF+7 días
78	**78**			**1.3.2**	**ESTRUCTURA**	**26 días**	**sáb 12/09/2(**	**mar 20/10/2**	
79	79			1.3.2.1	COLUMNA	4,13 días	sáb 12/09/26	mié 16/09/2(	76CF
80	80			1.3.2.2	ACERO DE F	7,13 días	sáb 19/09/26	lun 28/09/26	76CF+7 días
81	81			1.3.2.3	VÍGA AÉRE/	4,13 días	mié 7/10/26	sáb 10/10/26	82CF
82	82			1.3.2.4	ACERO DE F	5,13 días	jue 1/10/26	mié 7/10/26	79CF+15 días
83	83			1.3.2.5	DINTELES E	3,13 días	vie 9/10/26	mar 13/10/2(	89CC
84	84			1.3.2.6	ACERO DE F	3,13 días	jue 15/10/26	lun 19/10/26	89CC+6 días
85	85			1.3.2.7	ACERO DE F	3,13 días	vie 16/10/26	mar 20/10/2(	89CC+7 días
86	**86**			**1.3.3**	**ESTRUCTURA**	**5 días**	**sáb 10/10/2(**	**lun 19/10/26**	
87	87			1.3.3.1	CORREA PE	7,13 días	sáb 10/10/26	lun 19/10/26	81CF
88	**88**			**1.3.4**	**MAMPOSTER**	**29 días**	**vie 9/10/26**	**jue 19/11/26**	
89	89			1.3.4.1	MURO EN E	7,13 días	vie 9/10/26	dom 18/10/2	98CF+7 días
90	90			1.3.4.2	PAÑETE MU	12,13 días	dom 18/10/2	dom 1/11/26	89CF
91	91			1.3.4.3	PAÑETE MU	12,13 días	dom 18/10/2	dom 1/11/26	89CF
92	92			1.3.4.4	ESTUCO PR	7,13 días	vie 23/10/26	dom 1/11/26	105CF
93	93			1.3.4.5	ESTUCO PL/	8,13 días	dom 1/11/26	mar 10/11/2(	106CF
94	94			1.3.4.6	PINTURA VI	8,13 días	dom 1/11/26	mar 10/11/2(	92CF
95	95			1.3.4.7	PINTURA VI	8,13 días	mar 10/11/2(	jue 19/11/26	93CF
96	96			1.3.4.8	BALDOSA C	8,13 días	dom 1/11/26	mar 10/11/2(	91CF
97	**97**			**1.3.5**	**PISOS**	**40 días**	**sáb 19/09/2(**	**sáb 14/11/2(**	
98	98			1.3.5.1	PLACA DE C	5,13 días	lun 28/09/26	vie 2/10/26	99CF
99	99			1.3.5.2	MALLA ELE(	7,13 días	sáb 19/09/26	lun 28/09/26	76CF+7 días
100	100			1.3.5.3	AFINADO P	5,13 días	vie 9/10/26	jue 15/10/26	98CF+7 días
101	101			1.3.5.4	GUARDAES	5,13 días	mar 10/11/2(	sáb 14/11/26	96CF
102	102			1.3.5.5	PISO BALDO	5,13 días	jue 15/10/26	mié 21/10/2(	100CF
103	103			1.3.5.6	PISO EN CE	5,13 días	jue 15/10/26	mié 21/10/2(	100CF
104	**104**			**1.3.6**	**CUBIERTA**	**10 días**	**lun 19/10/26**	**dom 1/11/2(**	
105	105			1.3.6.1	SUMINISTR	5,13 días	lun 19/10/26	vie 23/10/26	87CF
106	106			1.3.6.2	CIELO RASC	7,13 días	vie 23/10/26	dom 1/11/26	105CF
107	**107**			**1.3.7**	**CARPINTERIA**	**5 días**	**dom 1/11/2(**	**sáb 7/11/26**	
108	108			1.3.7.1	SUMINISTR	7,13 días	dom 1/11/26	sáb 7/11/26	91CF
109	109			1.3.7.2	SUMINISTR	7,13 días	dom 1/11/26	sáb 7/11/26	91CF
110	110			1.3.7.3	SUMINISTR	7,13 días	dom 1/11/26	sáb 7/11/26	91CF

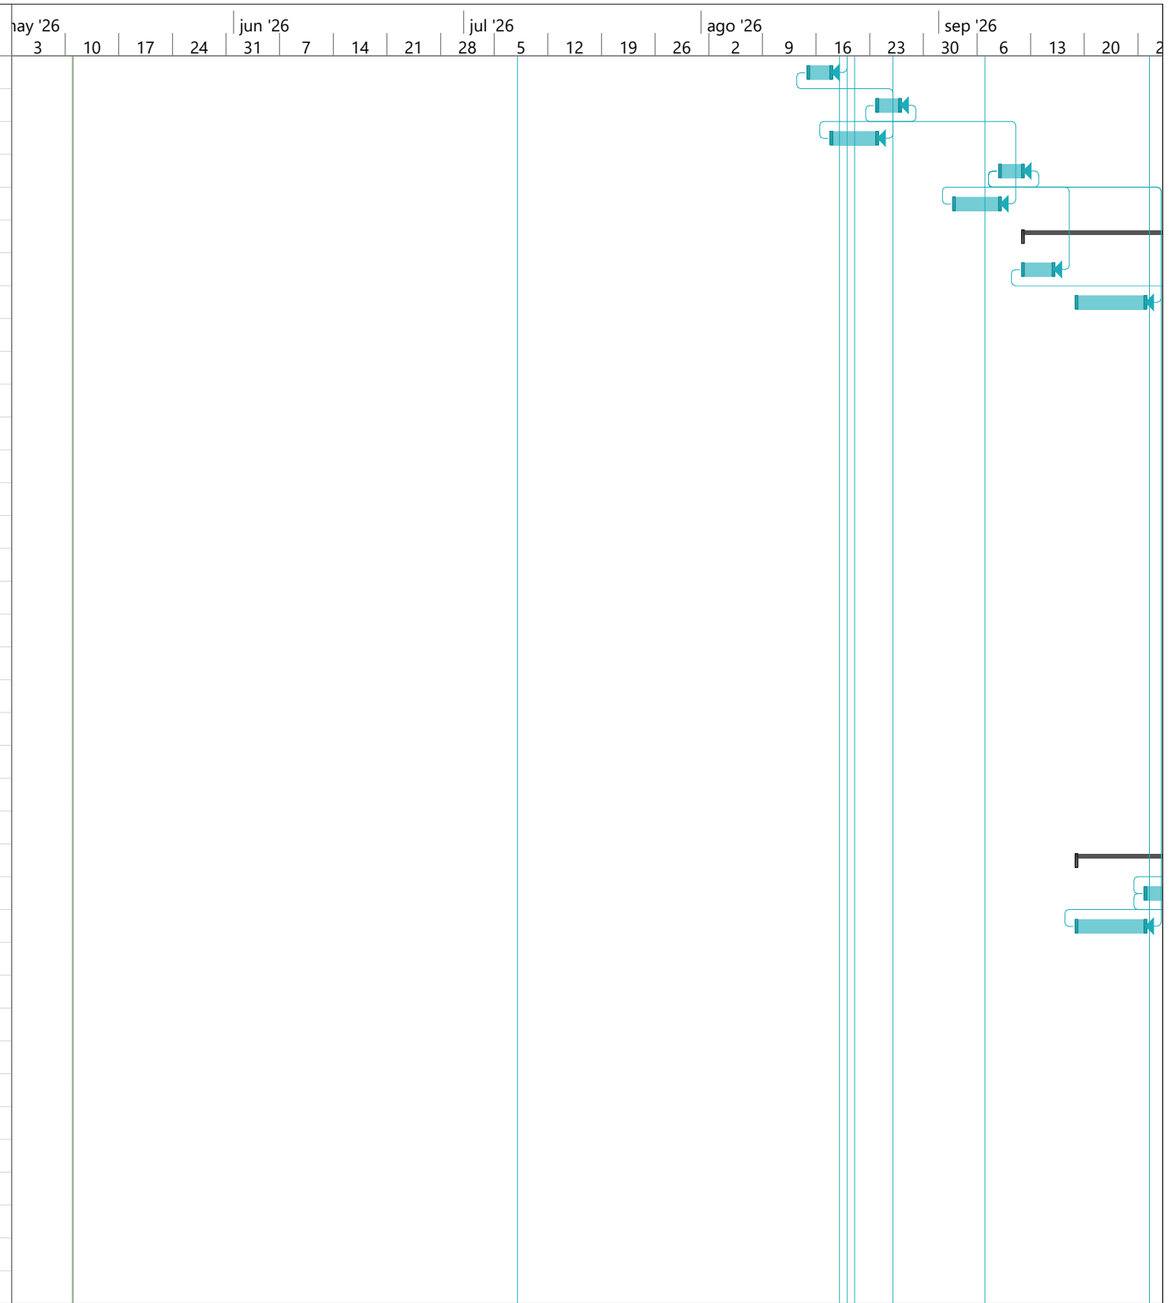

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
111	111		1.3.7.4	SUMINISTR	7,13 días	dom 1/11/26	sáb 7/11/26	91CF
112	**112**		**1.4**	**MODULO SERVI**	**66 días**	**sáb 15/08/26**	**mar 17/11/2**	
113	**113**		**1.4.1**	**CIMENTACIOI**	**20 días**	**sáb 15/08/26**	**sáb 12/09/26**	
114	114		1.4.1.1	SOLADO, LI	3,13 días	sáb 15/08/26	mar 18/08/2	17CF
115	115		1.4.1.2	ZAPATA EN	4,13 días	lun 24/08/26	jue 27/08/26	116CF
116	116		1.4.1.3	ACERO DE F	5,13 días	mar 18/08/2	lun 24/08/26	114CF
117	117		1.4.1.4	VIGA EN CC	4,13 días	mié 9/09/26	sáb 12/09/26	118CF
118	118		1.4.1.5	ACERO DE F	5,13 días	jue 3/09/26	mié 9/09/26	115CF+7 días
119	**119**		**1.4.2**	**ESTRUCTURA**	**64 días**	**sáb 15/08/26**	**vie 13/11/26**	
120	120		1.4.2.01	COLUMNA	5,13 días	lun 21/09/26	vie 25/09/26	121CF
121	121		1.4.2.02	ACERO DE F	7,13 días	sáb 12/09/26	lun 21/09/26	117CF
122	122		1.4.2.03	VÍGA AÉRE/	2,13 días	vie 16/10/26	lun 19/10/26	123CF
123	123		1.4.2.04	ACERO DE F	6,13 días	sáb 10/10/26	vie 16/10/26	120CF+15 días
124	124		1.4.2.05	DINTELES E	3,13 días	jue 22/10/26	lun 26/10/26	139CF+5 días
125	125		1.4.2.06	ACERO DE F	3,13 días	jue 22/10/26	lun 26/10/26	139CF+5 días
126	126		1.4.2.07	PLACA DE E	5,13 días	lun 9/11/26	vie 13/11/26	127CF
127	127		1.4.2.08	ACERO DE F	5,13 días	mar 3/11/26	lun 9/11/26	122CF+15 días
128	128		1.4.2.09	ALFAJÍAS EI	3,13 días	mié 21/10/26	vie 23/10/26	129CF
129	129		1.4.2.10	ACERO DE F	4,13 días	sáb 17/10/26	mié 21/10/26	139CF
130	130		1.4.2.11	SOLADO, LI	4,13 días	sáb 15/08/26	mié 19/08/26	17CF
131	131		1.4.2.12	PLACA DE C	5,13 días	mié 2/09/26	mar 8/09/26	132CF
132	132		1.4.2.13	ACERO DE F	11,13 días	mié 19/08/26	mié 2/09/26	130CF
133	133		1.4.2.14	ACERO DE F	11,13 días	mar 15/09/26	mar 29/09/26	131CF+7 días
134	134		1.4.2.15	MURO DE C	11,13 días	mar 29/09/26	mar 13/10/26	133CF
135	135		1.4.2.16	PLACA DE E	5,13 días	mar 6/10/26	lun 12/10/26	134CC+7 días
136	136		1.4.2.17	SELLADO DI	2,13 días	mar 29/09/26	mié 30/09/26	134CC
137	137		1.4.2.18	RECUBRIMI	6,13 días	lun 19/10/26	dom 25/10/2	135CF+7 días
138	**138**		**1.4.3**	**MAMPOSTER**	**28 días**	**jue 8/10/26**	**mar 17/11/2**	
139	139		1.4.3.1	MURO EN E	8,13 días	jue 8/10/26	sáb 17/10/26	147CF+7 días
140	140		1.4.3.2	PAÑETE MU	5,13 días	lun 19/10/26	vie 23/10/26	139CF+2 días
141	141		1.4.3.3	PAÑETE MU	4,13 días	sáb 17/10/26	mié 21/10/26	139CF
142	142		1.4.3.4	ESTUCO PR	3,13 días	vie 23/10/26	mar 27/10/2	140CF
143	143		1.4.3.5	ESTUCO PL/	4,13 días	mié 21/10/26	dom 25/10/2	141CF
144	144		1.4.3.6	PINTURA VI	3,13 días	vie 13/11/26	mar 17/11/2	126CF
145	145		1.4.3.7	PINTURA VI	3,13 días	vie 13/11/26	mar 17/11/2	126CF
146	**146**		**1.4.4**	**PISOS**	**15 días**	**sáb 19/09/26**	**dom 11/10/2**	
147	147		1.4.4.1	PLACA DE C	5,13 días	vie 25/09/26	jue 1/10/26	148CF
148	148		1.4.4.2	MALLA ELE	6,13 días	sáb 19/09/26	vie 25/09/26	117CF+7 días

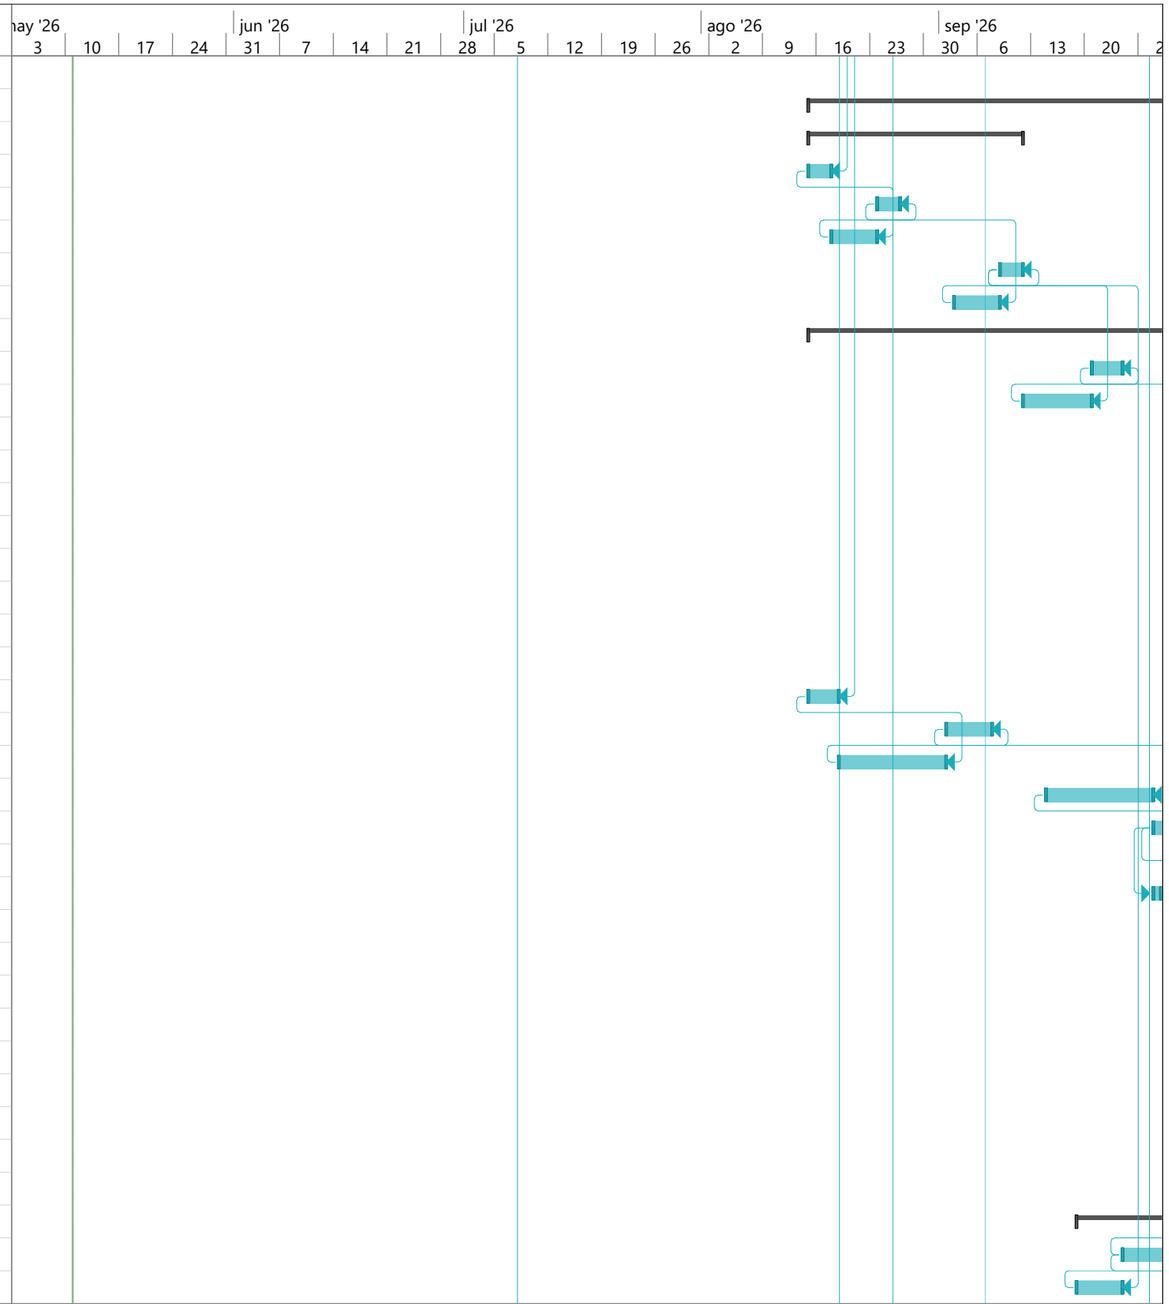

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
149	149		1.4.4.3	AFINADO P	3,13 días	jue 1/10/26	lun 5/10/26	147CF
150	150		1.4.4.4	GUARDAES	4,13 días	mié 7/10/26	dom 11/10/2	149CF+2 días
151	151		1.4.4.5	PISO EN CE	4,13 días	mié 7/10/26	dom 11/10/2	149CF+2 días
152	**152**		**1.4.5**	**CARPINTERIA**	**3 días**	**mié 21/10/2**	**sáb 24/10/2**	
153	153		1.4.5.1	SUMINISTR	4,13 días	mié 21/10/2	sáb 24/10/26	141CF
154	**154**		**1.5**	**OBRAS EXTERIO**	**119 días**	**sáb 15/08/2**	**vie 29/01/27**	
155	**155**		**1.5.1**	**ANDENES**	**20 días**	**mar 8/12/26**	**mar 5/01/27**	
156	156		1.5.1.1	PLACA DE C	8,13 días	mar 22/12/2	jue 31/12/26	157CC
157	157		1.5.1.2	MALLA ELE	11,13 días	mar 22/12/2	mar 5/01/27	158CF
158	158		1.5.1.3	BORDILLO I	11,13 días	mar 8/12/26	mar 22/12/2	56CC
159	**159**		**1.5.2**	**PARQUEADEF**	**10 días**	**mar 22/12/2**	**mar 5/01/27**	
160	160		1.5.2.1	SUMINISTR	11,13 días	mar 22/12/2	mar 5/01/27	158CF
161	**161**		**1.5.3**	**CERRAMIENT**	**60 días**	**sáb 15/08/2**	**lun 9/11/26**	
162	162		1.5.3.1	SOLADO, LI	7,13 días	sáb 15/08/26	lun 24/08/26	17CF
163	163		1.5.3.2	ZAPATA EN	11,13 días	lun 24/08/26	lun 7/09/26	162CF
164	164		1.5.3.3	VIGA EN CC	11,13 días	lun 14/09/26	lun 28/09/26	163CF+7 días
165	165		1.5.3.4	COLUMNA	11,13 días	lun 5/10/26	lun 19/10/26	164CF+7 días
166	166		1.5.3.5	ACERO DE F	16,13 días	lun 24/08/26	sáb 12/09/26	162CF
167	167		1.5.3.6	SUMINISTR	11,13 días	lun 26/10/26	lun 9/11/26	165CF+7 días
168	**168**		**1.5.4**	**PORTERIA**	**119 días**	**sáb 15/08/2**	**vie 29/01/27**	
169	**169**		**1.5.4.1**	**ESTRUCTUI**	**27 días**	**sáb 15/08/2**	**mié 23/09/2**	
170	170		1.5.4.1.01	SOLADO,	2,13 días	sáb 15/08/26	lun 17/08/26	17CF
171	171		1.5.4.1.02	ZAPATA I	3,13 días	dom 23/08/2	mar 25/08/2	172CF
172	172		1.5.4.1.03	ACERO D	6,13 días	lun 17/08/26	dom 23/08/2	170CF
173	173		1.5.4.1.04	VIGA EN	3,13 días	mar 25/08/2	jue 27/08/26	171CF
174	174		1.5.4.1.05	ACERO D	5,13 días	mar 1/09/26	sáb 5/09/26	171CF+7 días
175	175		1.5.4.1.06	COLUMN	5,13 días	lun 7/09/26	vie 11/09/26	176CF
176	176		1.5.4.1.07	ACERO D	3,13 días	jue 3/09/26	lun 7/09/26	173CF+7 días
177	177		1.5.4.1.08	VÍGA AÉF	3,13 días	vie 18/09/26	mar 22/09/2	178CF
178	178		1.5.4.1.09	ACERO D	5,13 días	lun 14/09/26	vie 18/09/26	176CF+7 días
179	179		1.5.4.1.10	DINTELES	4,13 días	sáb 19/09/26	mié 23/09/2	180CF+3 días
180	180		1.5.4.1.11	ACERO D	4,13 días	sáb 12/09/26	mié 16/09/2	183CF+3 días
181	181		1.5.4.1.12	ACERO D	4,13 días	sáb 12/09/26	mié 16/09/2	183CF+3 días
182	**182**		**1.5.4.2**	**MAMPOST**	**16 días**	**jue 3/09/26**	**vie 25/09/26**	
183	183		1.5.4.2.1	MURO EI	5,13 días	jue 3/09/26	mié 9/09/26	192CF+3 días
184	184		1.5.4.2.2	PAÑETE I	4,13 días	mié 9/09/26	dom 13/09/2	183CF
185	185		1.5.4.2.3	PAÑETE I	5,13 días	dom 13/09/2	jue 17/09/26	184CF
186	186		1.5.4.2.4	ESTUCO	3,13 días	jue 17/09/26	lun 21/09/26	185CF

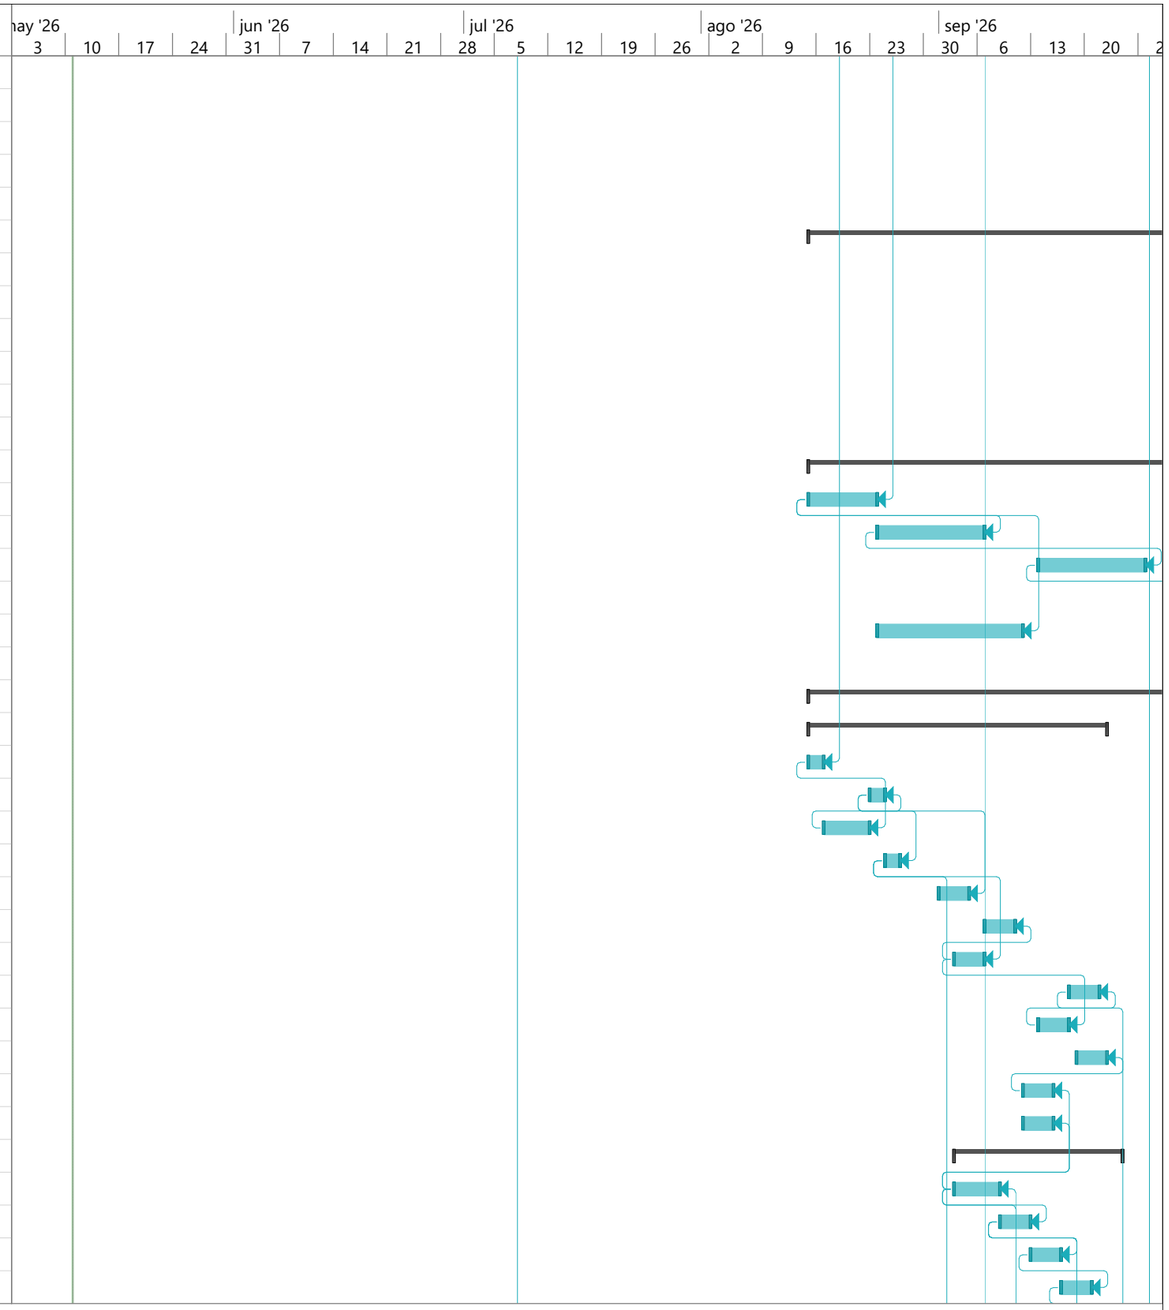

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
187	187		1.5.4.2.5	ESTUCO	5,13 días	lun 21/09/26	vie 25/09/26	186CF
188	188		1.5.4.2.6	PINTURA	5,13 días	dom 13/09/2	jue 17/09/26	184CF
189	189		1.5.4.2.7	PINTURA	5,13 días	dom 13/09/2	jue 17/09/26	184CF
190	**190**		**1.5.4.3**	**PISOS**	**17 días**	**jue 27/08/26**	**lun 21/09/26**	
191	191		1.5.4.3.1	PLACA D	5,13 días	lun 7/09/26	vie 11/09/26	192CF+7 días
192	192		1.5.4.3.2	MALLA E	3,13 días	jue 27/08/26	lun 31/08/26	173CF
193	193		1.5.4.3.3	AFINADC	2,13 días	vie 11/09/26	dom 13/09/2	191CF
194	194		1.5.4.3.4	GUARDA	3,13 días	mar 15/09/2	jue 17/09/26	193CF+2 días
195	195		1.5.4.3.5	PISO EN	2,13 días	sáb 19/09/26	lun 21/09/26	194CF+2 días
196	**196**		**1.5.4.4**	**CUBIERTA**	**2 días**	**mar 22/09/2**	**jue 24/09/26**	
197	197		1.5.4.4.1	SUMINIS	2,13 días	mar 22/09/2	mié 23/09/2	177CF
198	198		1.5.4.4.2	CIELO RA	2,13 días	mié 23/09/2	jue 24/09/26	197CF
199	**199**		**1.5.4.5**	**CARPINTER**	**0 días**	**mié 9/09/26**	**mié 9/09/26**	
200	200		1.5.4.5.1	SUMINIS	0 días	mié 9/09/26	mié 9/09/26	183CF
201	**201**		**1.5.4.6**	**PAISAJISM**	**7 días**	**mié 20/01/2**	**vie 29/01/27**	
202	202		1.5.4.6.1	ROCERÍA	8,13 días	mié 20/01/2	vie 29/01/27	160CF+15 días
203	**203**		**1.6**	**REDES HIDROSA**	**134 días**	**sáb 22/08/2**	**vie 26/02/27**	
204	**204**		**1.6.1**	**RED HIDRAUL**	**38 días**	**sáb 24/10/2**	**jue 17/12/26**	
205	205		1.6.1.01	CAMADA E	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
206	206		1.6.1.02	RELLENO E	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
207	207		1.6.1.03	TUBERÍA CF	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
208	208		1.6.1.04	TUBERIA CF	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
209	209		1.6.1.05	TUBERÍA CF	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
210	210		1.6.1.06	TUBERÍA CF	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
211	211		1.6.1.07	TUBERÍA CF	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
212	212		1.6.1.08	TUBERÍA CF	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
213	213		1.6.1.09	CODO 90° F	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
214	214		1.6.1.10	CODO 90° F	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
215	215		1.6.1.11	CODO 90° F	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
216	216		1.6.1.12	CODO 90° F	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
217	217		1.6.1.13	CODO 90° F	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
218	218		1.6.1.14	CODO 90° F	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
219	219		1.6.1.15	TEE PVCP 1	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
220	220		1.6.1.16	TEE PVCP 3	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
221	221		1.6.1.17	TEE PVCP 1	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
222	222		1.6.1.18	TEE PVCP 1	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
223	223		1.6.1.19	TEE PVCP 2	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
224	224		1.6.1.20	VALVULA C	8,13 días	mar 8/12/26	jue 17/12/26	44CC

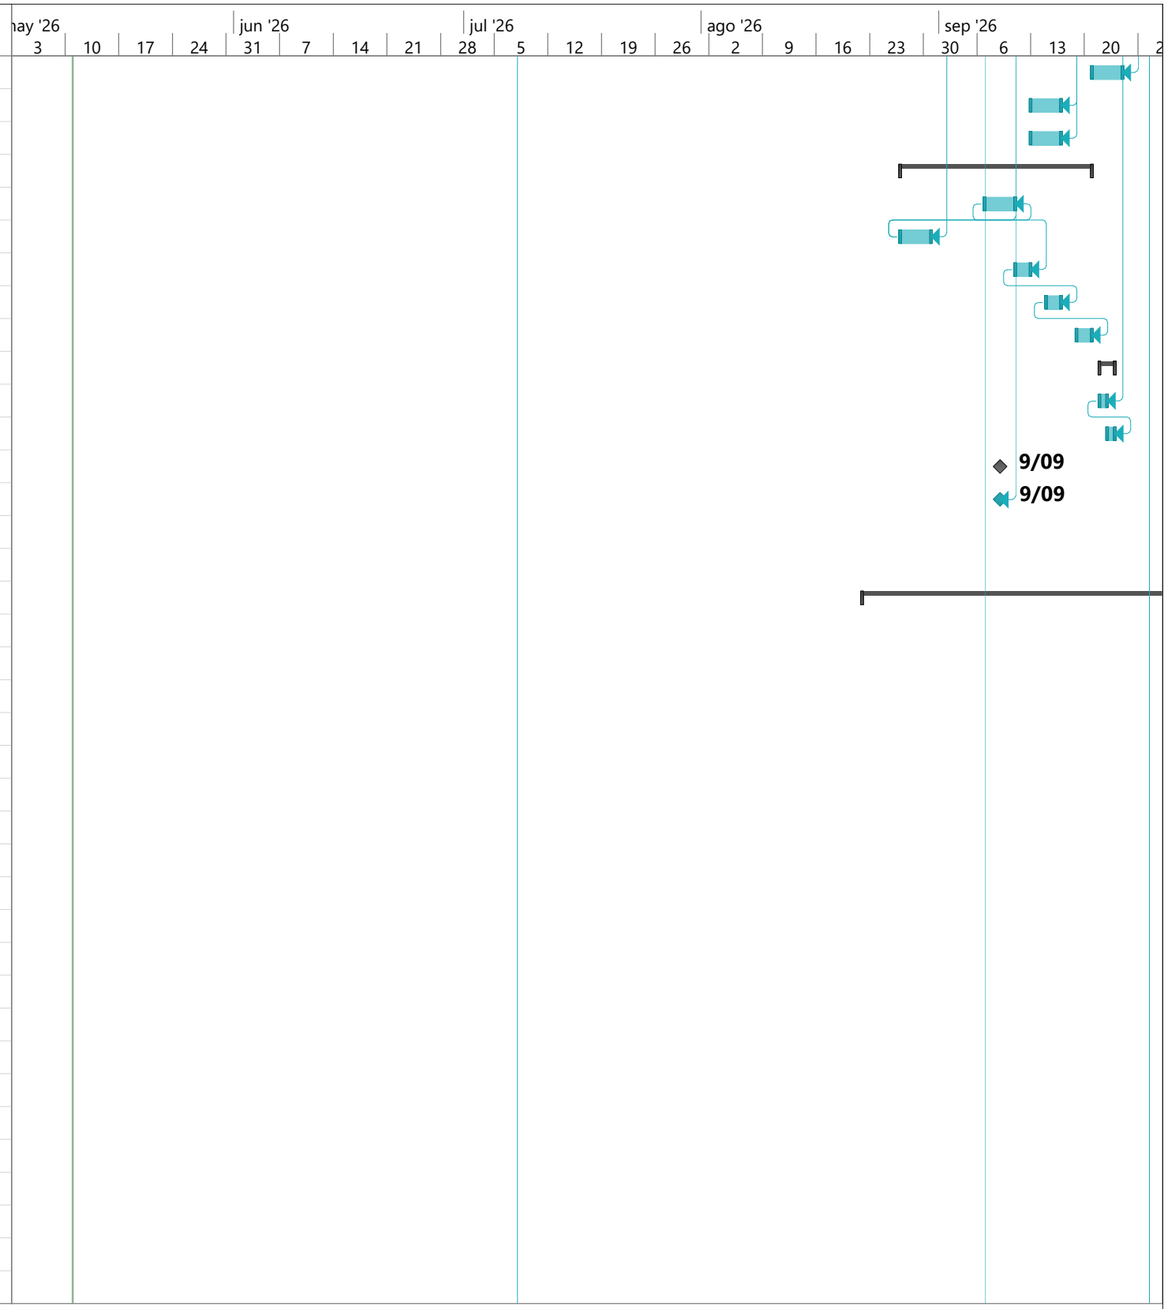

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
225	225		1.6.1.21	VALVULA D	8,13 días	mar 8/12/26	jue 17/12/26	44CC
226	226		1.6.1.22	VALVULA D	8,13 días	mar 8/12/26	jue 17/12/26	44CC
227	227		1.6.1.23	VALVULA D	8,13 días	mar 8/12/26	jue 17/12/26	44CC
228	228		1.6.1.24	VALVULA D	8,13 días	mar 8/12/26	jue 17/12/26	44CC
229	229		1.6.1.25	BUJE SOLD/	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
230	230		1.6.1.26	BUJE SOLD/	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
231	231		1.6.1.27	BUJE SOLD/	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
232	232		1.6.1.28	BUJE SOLD/	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
233	233		1.6.1.29	BUJE SOLD/	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
234	234		1.6.1.30	BUJE SOLD/	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
235	235		1.6.1.31	BUJE SOLD/	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
236	236		1.6.1.32	BUJE SOLD/	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
237	237		1.6.1.33	BUJE SOLD/	29,13 días	sáb 24/10/26	mié 2/12/26	25CF+15 días
238	238		1.6.1.34	TANQUE A(	6,13 días	sáb 28/11/26	vie 4/12/26	126CF+15 días
239	239		1.6.1.35	SUMINISTR	6,13 días	sáb 28/11/26	vie 4/12/26	126CF+15 días
240	240		1.6.1.36	PUNTO HID	6,13 días	sáb 28/11/26	vie 4/12/26	126CF+15 días
241	241		1.6.1.37	SUMINITRC	6,13 días	sáb 28/11/26	vie 4/12/26	126CF+15 días
242	242		1.6.1.38	NIPLE PASA	5,13 días	vie 13/11/26	jue 19/11/26	126CF
243	243		1.6.1.39	SANITARIO	6,13 días	lun 26/10/26	dom 1/11/26	103CF+5 días
244	244		1.6.1.40	SANITARIO	6,13 días	lun 26/10/26	dom 1/11/26	103CF+5 días
245	245		1.6.1.41	LAVAMANC	6,13 días	lun 26/10/26	dom 1/11/26	103CF+5 días
246	246		1.6.1.42	CONJUNTO	6,13 días	lun 26/10/26	dom 1/11/26	103CF+5 días
247	247		1.6.1.43	ORINAL GO	6,13 días	lun 26/10/26	dom 1/11/26	103CF+5 días
248	248		1.6.1.44	LAVAPLATC	6,13 días	lun 26/10/26	dom 1/11/26	103CF+5 días
249	249		1.6.1.45	LAVADERO	6,13 días	lun 26/10/26	dom 1/11/26	103CF+5 días
250	250		1.6.1.46	LLAVE TERI	6,13 días	lun 26/10/26	dom 1/11/26	103CF+5 días
251	**251**		**1.6.2**	**RED SANITAR**	**108 días**	**sáb 22/08/26**	**jue 21/01/27**	
252	252		1.6.2.01	CAMADA EI	12,13 días	sáb 22/08/26	sáb 5/09/26	17CF+7 días
253	253		1.6.2.02	RELLENO EI	11,13 días	vie 9/10/26	vie 23/10/26	254CF+10 días
254	254		1.6.2.03	TUBERÍA P\	11,13 días	mar 15/09/2(	mar 29/09/2(	252CF+10 días
255	255		1.6.2.04	TUBERIA P\	11,13 días	mar 15/09/2(	mar 29/09/2(	252CF+10 días
256	256		1.6.2.05	TUBERIA P\	11,13 días	mar 15/09/2(	mar 29/09/2(	252CF+10 días
257	257		1.6.2.06	TUBERIA P\	11,13 días	mar 15/09/2(	mar 29/09/2(	252CF+10 días
258	258		1.6.2.07	TUBERÍA P\	11,13 días	mar 15/09/2(	mar 29/09/2(	252CF+10 días
259	259		1.6.2.08	SIFON 180°	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
260	260		1.6.2.09	ACCESORIO	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
261	261		1.6.2.10	ACCESORIO	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
262	262		1.6.2.11	ACCESORIO	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días

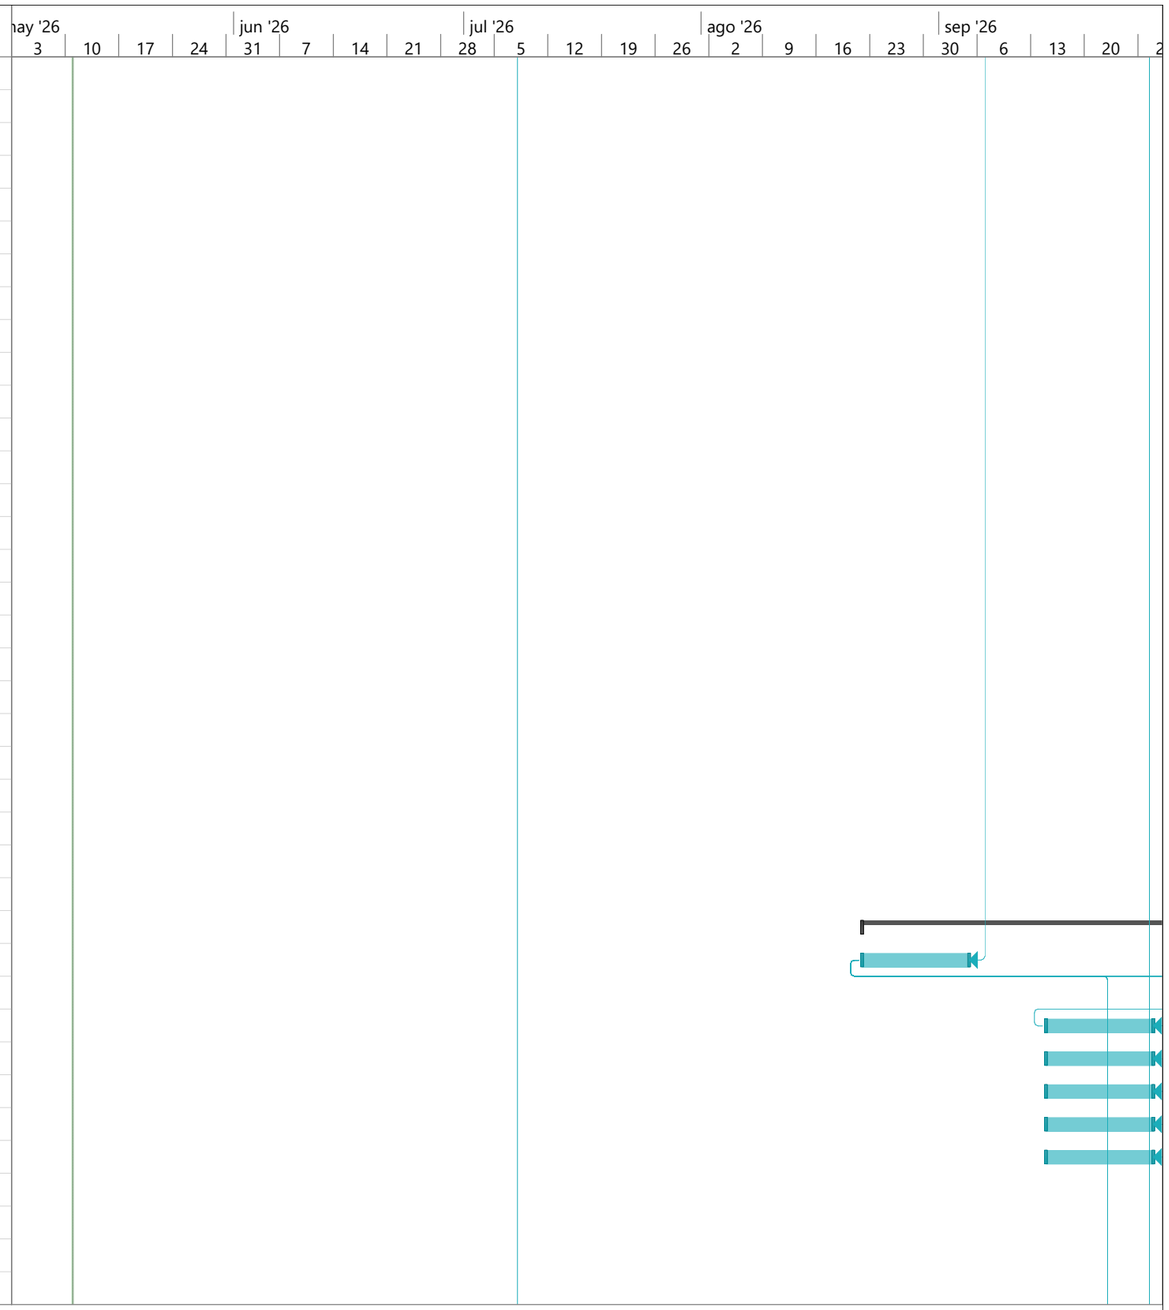

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Id		Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
263	263			1.6.2.12	ACCESORIO	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
264	264			1.6.2.13	ACCESORIO	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
265	265			1.6.2.14	SALIDA SAN	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
266	266			1.6.2.15	SALIDA SAN	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
267	267			1.6.2.16	SUMINISTR	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
268	268			1.6.2.17	SUMINISTR	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
269	269			1.6.2.18	SUMINISTR	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
270	270			1.6.2.19	SUMINISTR	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
271	271			1.6.2.20	SUMINISTR	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
272	272			1.6.2.21	SUMINISTR	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
273	273			1.6.2.22	SUMINISTR	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
274	274			1.6.2.23	CAJA DE IN	5,13 días	mar 15/09/2	lun 21/09/26	252CF+10 días
275	275			1.6.2.24	CAJA DE IN	5,13 días	mar 15/09/2	lun 21/09/26	252CF+10 días
276	276			1.6.2.25	CAJA DE IN	5,13 días	mar 15/09/2	lun 21/09/26	252CF+10 días
277	277			1.6.2.26	CAJA DE IN	5,13 días	mar 15/09/2	lun 21/09/26	252CF+10 días
278	278			1.6.2.27	TUBERÍA P\	11,13 días	jue 7/01/27	jue 21/01/27	45CF+2 días
279	279			1.6.2.28	SALIDA SAN	11,13 días	jue 7/01/27	jue 21/01/27	45CF+2 días
280	280			1.6.2.29	SALIDA SAN	11,13 días	jue 7/01/27	jue 21/01/27	45CF+2 días
281	281			1.6.2.30	SALIDA SAN	11,13 días	jue 10/12/26	jue 24/12/26	44CC+2 días
282	282			1.6.2.31	SALIDA SAN	11,13 días	jue 10/12/26	jue 24/12/26	44CC+2 días
283	283			1.6.2.32	SALIDA SAN	11,13 días	jue 10/12/26	jue 24/12/26	44CC+2 días
284	284			1.6.2.33	SALIDA SAN	11,13 días	jue 10/12/26	jue 24/12/26	44CC+2 días
285	285			1.6.2.34	REJILLA PLA	11,13 días	jue 10/12/26	jue 24/12/26	44CC+2 días
286	286			1.6.2.35	LAVAMANC	11,13 días	jue 10/12/26	jue 24/12/26	44CC+2 días
287	287			1.6.2.36	ORINAL PAI	11,13 días	jue 10/12/26	jue 24/12/26	44CC+2 días
288	288			1.6.2.37	JUEGO ACC	11,13 días	jue 10/12/26	jue 24/12/26	44CC+2 días
289	289			1.6.2.38	SANITARIO	11,13 días	jue 10/12/26	jue 24/12/26	44CC+2 días
290	290			1.6.2.39	SANITARIO	11,13 días	jue 10/12/26	jue 24/12/26	44CC+2 días
291	291			1.6.2.40	SILLA DE SE	11,13 días	jue 10/12/26	jue 24/12/26	44CC+2 días
292	292			1.6.2.41	ESPEJO 3M	11,13 días	jue 10/12/26	jue 24/12/26	44CC+2 días
293	**293**			**1.6.3**	**RED PLUVIAL**	**13 días**	**vie 18/12/26**	**mié 6/01/27**	
294	294			1.6.3.01	TUBERIA P\	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
295	295			1.6.3.02	TUBERIA P\	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
296	296			1.6.3.03	TUBERÍA P\	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
297	297			1.6.3.04	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
298	298			1.6.3.05	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
299	299			1.6.3.06	ACCESORIO	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
300	300			1.6.3.07	ACCESORIO	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días

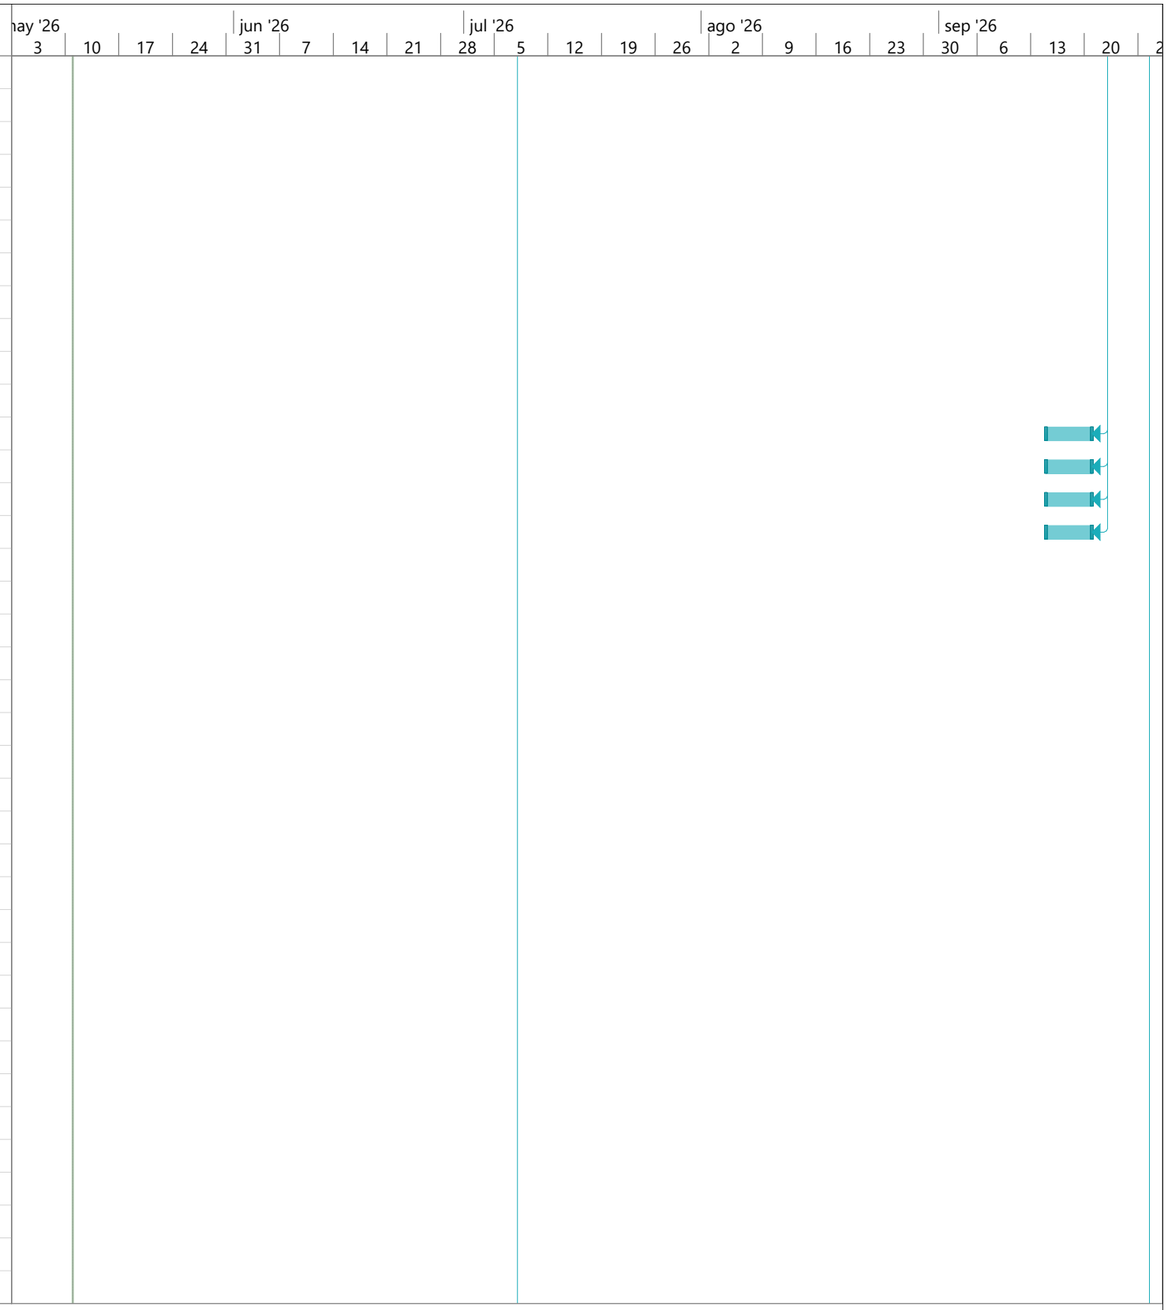

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	


Id	Id		Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
301	301			1.6.3.08	ACCESORIO	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
302	302			1.6.3.09	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
303	303			1.6.3.10	CAJA DE IN	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
304	304			1.6.3.11	BAJANTE RI	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
305	305			1.6.3.12	BAJANTE RI	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
306	306			1.6.3.13	REJILLA CÚ	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
307	307			1.6.3.14	REJILLA C6	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
308	308			1.6.3.15	CAJA DE SU	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
309	309			1.6.3.16	REJILLA SUI	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
310	310			1.6.3.17	CONSTRUC	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
311	311			1.6.3.18	MURO DE C	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
312	312			1.6.3.19	REJILLA SUI	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
313	**313**			**1.6.4**	**RED CONTRAI**	**50 días**	**vie 18/12/26**	**vie 26/02/27**	
314	314			1.6.4.01	CAMADA EI	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
315	315			1.6.4.02	RELLENO EI	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
316	316			1.6.4.03	TUBERIA P\	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
317	317			1.6.4.04	TUBERIA A(	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
318	318			1.6.4.05	TUBERIA A(	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
319	319			1.6.4.06	TUBERIA A(	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
320	320			1.6.4.07	ACCESORIO	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
321	321			1.6.4.08	ACCESORIO	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
322	322			1.6.4.09	REDUCCION	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
323	323			1.6.4.10	GABINETE (	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
324	324			1.6.4.11	ROCIADOR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
325	325			1.6.4.12	ABRAZADEI	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
326	326			1.6.4.13	ABRAZADEI	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
327	327			1.6.4.14	NIPLE PASA	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
328	328			1.6.4.15	VALVULA C	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
329	329			1.6.4.16	VALVULA M	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
330	330			1.6.4.17	VALVULA M	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
331	331			1.6.4.18	EQUIPO DE	22,13 días	jue 28/01/27	vie 26/02/27	61CC+24 días
332	332			1.6.4.19	ESTACION I	14,13 días	jue 14/01/27	mar 2/02/27	61CC+10 días
333	333			1.6.4.20	SIAMESA 4'	14,13 días	jue 14/01/27	mar 2/02/27	61CC+10 días
334	334			1.6.4.21	KIT ADAPTA	14,13 días	jue 14/01/27	mar 2/02/27	61CC+10 días
335	**335**			**1.6.5**	**RED GAS**	**10 días**	**sáb 24/10/26**	**sáb 7/11/26**	
336	336			1.6.5.1	CENTRO DE	12,13 días	sáb 24/10/26	sáb 7/11/26	25CF+15 días
337	337			1.6.5.2	SUMINISTR	12,13 días	sáb 24/10/26	sáb 7/11/26	25CF+15 días
338	338			1.6.5.3	SUMINISTR	12,13 días	sáb 24/10/26	sáb 7/11/26	25CF+15 días

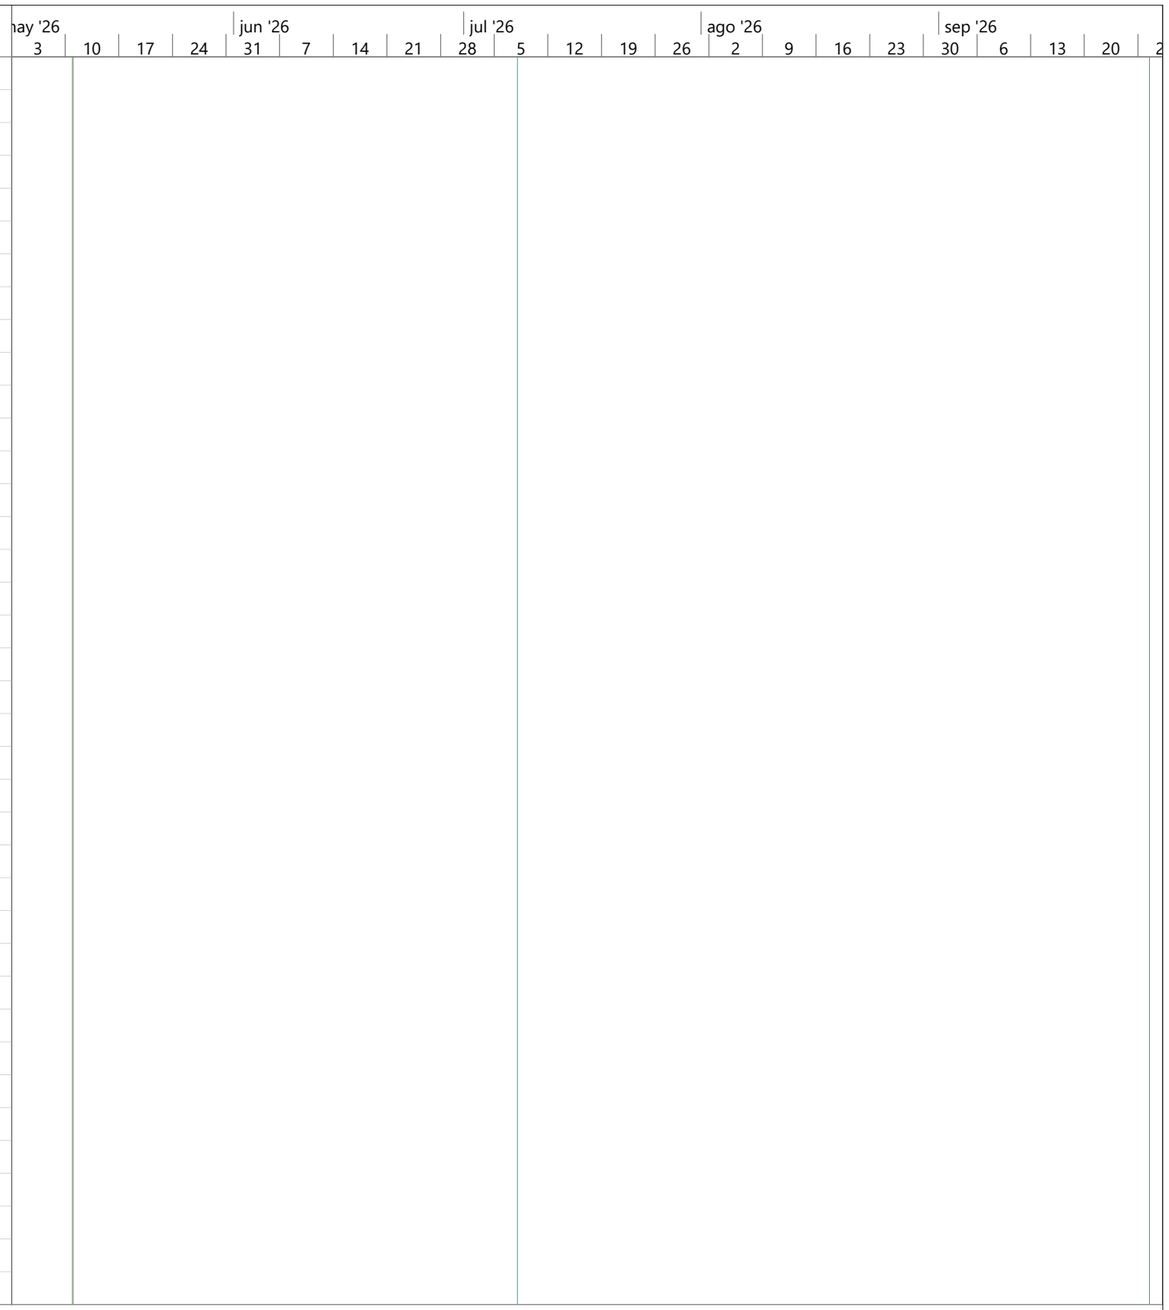

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo				


Id	Id		Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
339	339			1.6.5.4	TUBERIA EN	12,13 días	sáb 24/10/26	sáb 7/11/26	25CF+15 días
340	340			1.6.5.5	CERTIFICAC	12,13 días	sáb 24/10/26	sáb 7/11/26	25CF+15 días
341	**341**			**1.7**	**INSTALACIONES**	**119 días**	**sáb 10/10/26**	**vie 26/03/27**	
342	**342**			**1.7.1**	**RED MEDIA TI**	**24 días**	**vie 18/12/26**	**jue 21/01/27**	
343	343			1.7.1.01	CAJA DE INS	25,13 días	vie 18/12/26	jue 21/01/27	44CC+10 días
344	344			1.7.1.02	POSTE DE C	25,13 días	vie 18/12/26	jue 21/01/27	44CC+10 días
345	345			1.7.1.03	ESTRUCTUF	25,13 días	vie 18/12/26	jue 21/01/27	44CC+10 días
346	346			1.7.1.04	ESTRUCTUF	25,13 días	vie 18/12/26	jue 21/01/27	44CC+10 días
347	347			1.7.1.05	ESTRUCTUF	25,13 días	vie 18/12/26	jue 21/01/27	44CC+10 días
348	348			1.7.1.06	ESTRUCTUF	25,13 días	vie 18/12/26	jue 21/01/27	44CC+10 días
349	349			1.7.1.07	TRANSFORI	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
350	350			1.7.1.08	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
351	351			1.7.1.09	PUESTA A T	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
352	352			1.7.1.10	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
353	353			1.7.1.11	CABLE SEM	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
354	**354**			**1.7.2**	**RED BAJA TEN**	**13 días**	**vie 18/12/26**	**mié 6/01/27**	
355	355			1.7.2.01	BAJANTE C	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
356	356			1.7.2.02	CAJA DE INS	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
357	357			1.7.2.03	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
358	358			1.7.2.04	ACOMETID/	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
359	359			1.7.2.05	ACOMETID/	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
360	360			1.7.2.06	ACOMETID/	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
361	361			1.7.2.07	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
362	362			1.7.2.08	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
363	363			1.7.2.09	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
364	364			1.7.2.10	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
365	365			1.7.2.11		14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
366	366			1.7.2.12	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
367	367			1.7.2.13	CANALIZAC	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
368	368			1.7.2.14	CANALIZAC	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
369	**369**			**1.7.3**	**TABLEROS**	**13 días**	**vie 18/12/26**	**mié 6/01/27**	
370	370			1.7.3.1	TABLERO P/	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
371	371			1.7.3.2	TABLERO P/	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
372	372			1.7.3.3	TABLERO P/	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
373	373			1.7.3.4	TABLERO P/	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
374	374			1.7.3.5	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
375	375			1.7.3.6	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
376	**376**			**1.7.4**	**INSTALACION**	**13 días**	**vie 18/12/26**	**mié 6/01/27**	

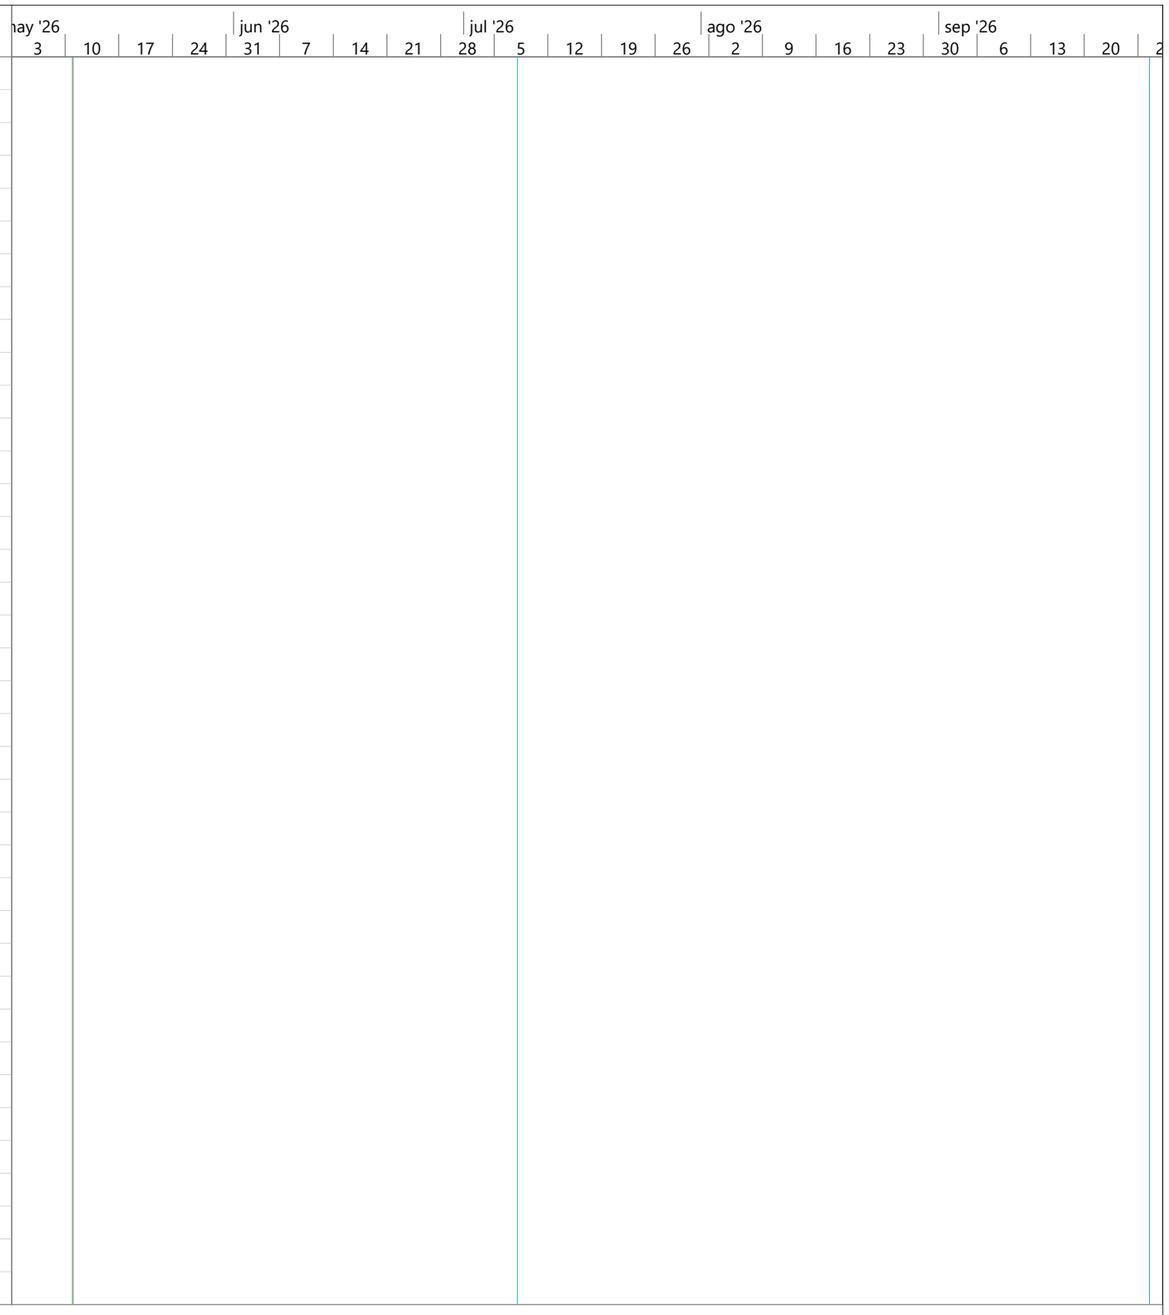

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite			
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso			
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual			
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo				


Id	Id	Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
377	377		1.7.4.1	SALIDA PAR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
378	378		1.7.4.2	SALIDA PAR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
379	379		1.7.4.3	SALIDA PAR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
380	380		1.7.4.4	SALIDA TOM	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
381	381		1.7.4.5	ACOMETIDA	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
382	**382**		**1.7.5**	**INSTALACION**	**13 días**	**vie 18/12/26**	**mié 6/01/27**	
383	383		1.7.5.1	PANEL LED	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
384	384		1.7.5.2	PANEL LED	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
385	385		1.7.5.3	PANEL LED	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
386	386		1.7.5.4	LUMINARIA	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
387	387		1.7.5.5	SENSOR DE	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
388	388		1.7.5.6	SEÑALIZACI	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
389	389		1.7.5.7	LUMINARIA	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
390	390		1.7.5.8	MÁSTIL ME	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
391	391		1.7.5.9	CAJA DE INS	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
392	**392**		**1.7.6**	**SISTEMA REG**	**13 días**	**vie 18/12/26**	**mié 6/01/27**	
393	393		1.7.6.1	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
394	394		1.7.6.2	PUESTA A T	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
395	395		1.7.6.3	STRIP TELE	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
396	396		1.7.6.4	SISTEMA PA	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
397	397		1.7.6.5	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
398	398		1.7.6.6	CANALIZAC	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
399	399		1.7.6.7	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
400	**400**		**1.7.7**	**DETECCION D**	**32 días**	**vie 18/12/26**	**mar 2/02/27**	
401	401		1.7.7.1	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
402	402		1.7.7.2	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
403	403		1.7.7.3	SUMINISTR	14,13 días	vie 18/12/26	mié 6/01/27	44CC+10 días
404	404		1.7.7.4	SUMINISTR	14,13 días	jue 14/01/27	mar 2/02/27	61CC+10 días
405	405		1.7.7.5	SUMINISTR	14,13 días	jue 14/01/27	mar 2/02/27	61CC+10 días
406	406		1.7.7.6	SUMINISTR	14,13 días	jue 14/01/27	mar 2/02/27	61CC+10 días
407	**407**		**1.7.8**	**SISTEMA DE P**	**5 días**	**sáb 10/10/26**	**lun 19/10/26**	
408	408		1.7.8.1	SUMINISTR	7,13 días	sáb 10/10/26	lun 19/10/26	25CC+10 días
409	409		1.7.8.2	SUMINISTR	7,13 días	sáb 10/10/26	lun 19/10/26	25CC+10 días
410	**410**		**1.7.9**	**LLAMADO DE**	**38 días**	**mar 2/02/27**	**vie 26/03/27**	
411	411		1.7.9.1	DISEÑO E IN	39,13 días	mar 2/02/27	vie 26/03/27	61CF
412	412		1.7.9.2	SUMINISTR	39,13 días	mar 2/02/27	vie 26/03/27	61CF
413	**413**		**1.8**	**PLANTA DE TRA**	**95 días**	**sáb 12/12/26**	**dom 25/04/2**	
414	414		1.8.1	SOLADO, LIMI	37,13 días	dom 7/03/27	dom 25/04/2	412CC+33 días

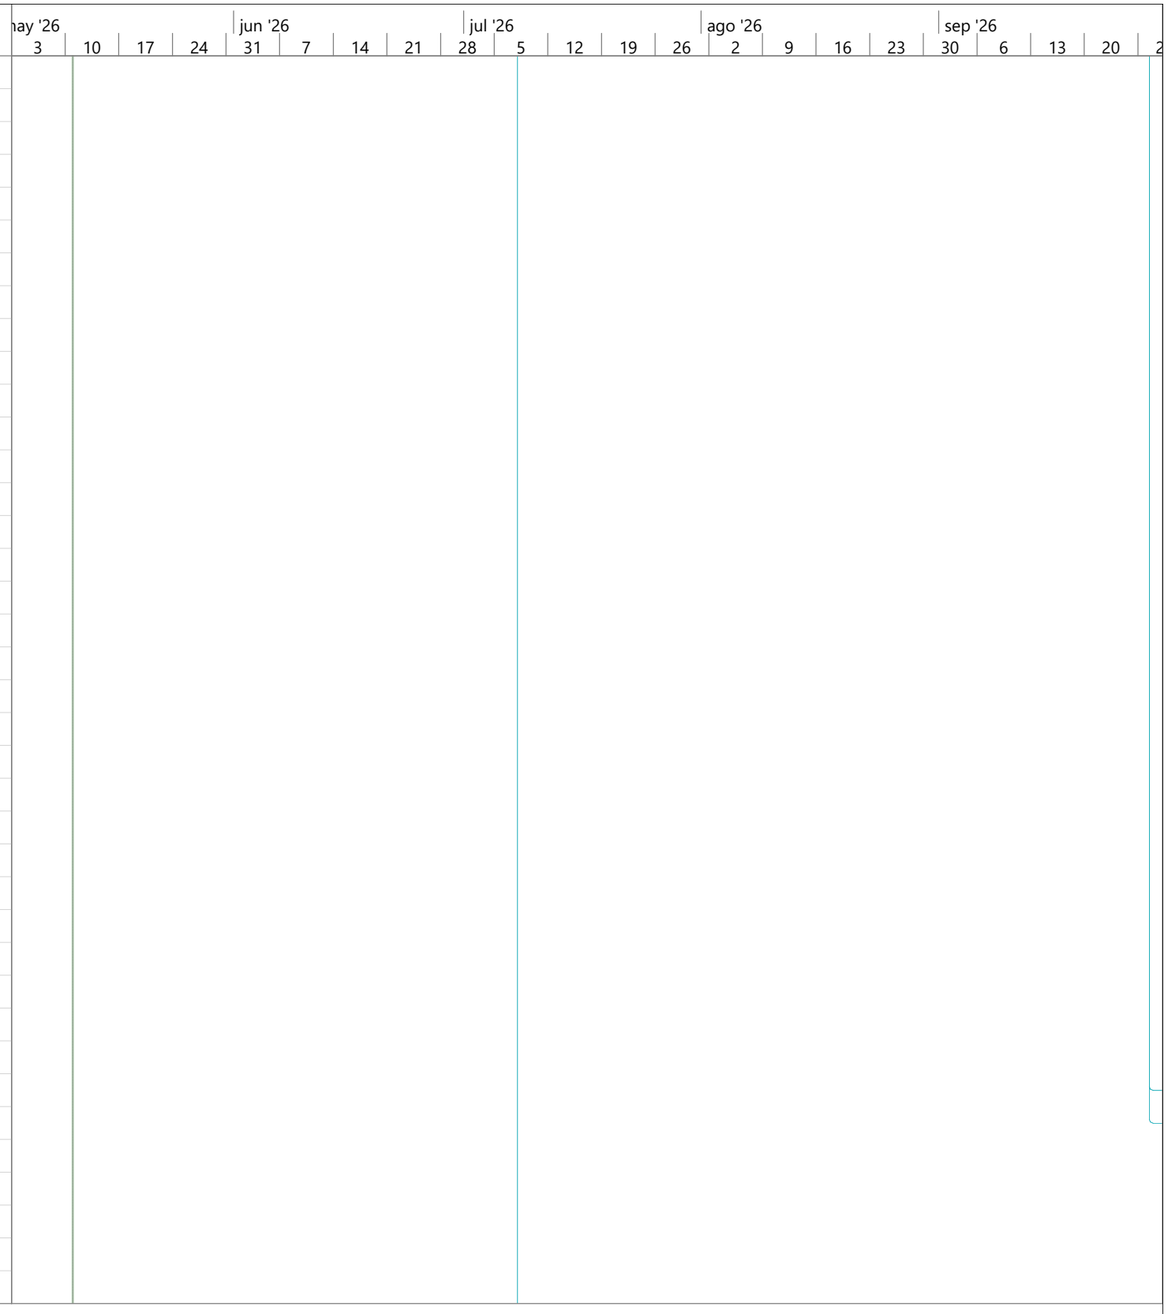

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26


Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

Id	Id		Modo de tarea	Texto1	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
415	415			1.8.2	PLACA DE CO	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
416	416			1.8.3	ACERO DE RE	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
417	417			1.8.4	MURO DE CO	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
418	418			1.8.5	SELLADO DE J	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
419	419			1.8.6	TAPA EN CON	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
420	420			1.8.7	SUMINISTRO I	12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
421	421			1.8.8		12,13 días	sáb 12/12/26	sáb 26/12/26	55CF+2 días
422	**422**			**2**	**BIENES O SERVICIC**	**195 días**	**lun 1/06/26**	**dom 28/02/2**	
423	423			2.1	SISTEMA DE GES	196,13 días	lun 1/06/26	dom 28/02/2	433CC
424	424			2.2	PLAN DE GESTIÓ	196,13 días	lun 1/06/26	dom 28/02/2	433CC
425	425			2.3	PLAN DE MANEJ	196,13 días	lun 1/06/26	dom 28/02/2	433CC
426	426			2.4	OTROS BIENES C	196,13 días	lun 1/06/26	dom 28/02/2	433CC
427	427			2.5	PLAN DE CALIDA	196,13 días	lun 1/06/26	dom 28/02/2	433CC
428	**428**			**3**	**INTERVENTORÍA**	**195 días**	**lun 1/06/26**	**dom 28/02/2**	
429	429			3.1	INTERVENTORÍA	196,13 días	lun 1/06/26	dom 28/02/2	432CC
430	**430**			**4**	**APOYO A LA GESTI**	**300 días**	**lun 1/06/26**	**dom 25/07/2**	
431	431			4.1	APOYO A LA GES	301,13 días	lun 1/06/26	dom 25/07/2	432CC
432	**432**			**5**	**GASTOS DE LEGALI**	**21 días**	**lun 1/06/26**	**mar 30/06/2**	
433	433			5.1	GASTOS DE LEGA	22,13 días	lun 1/06/26	mar 30/06/2	

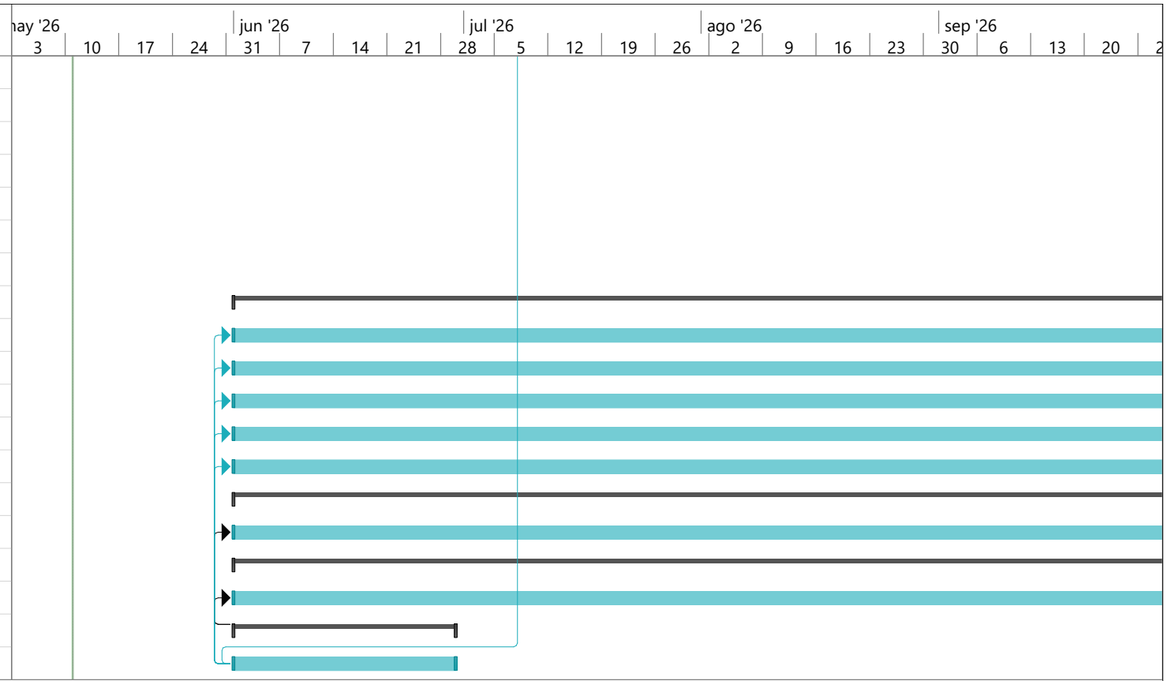


Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

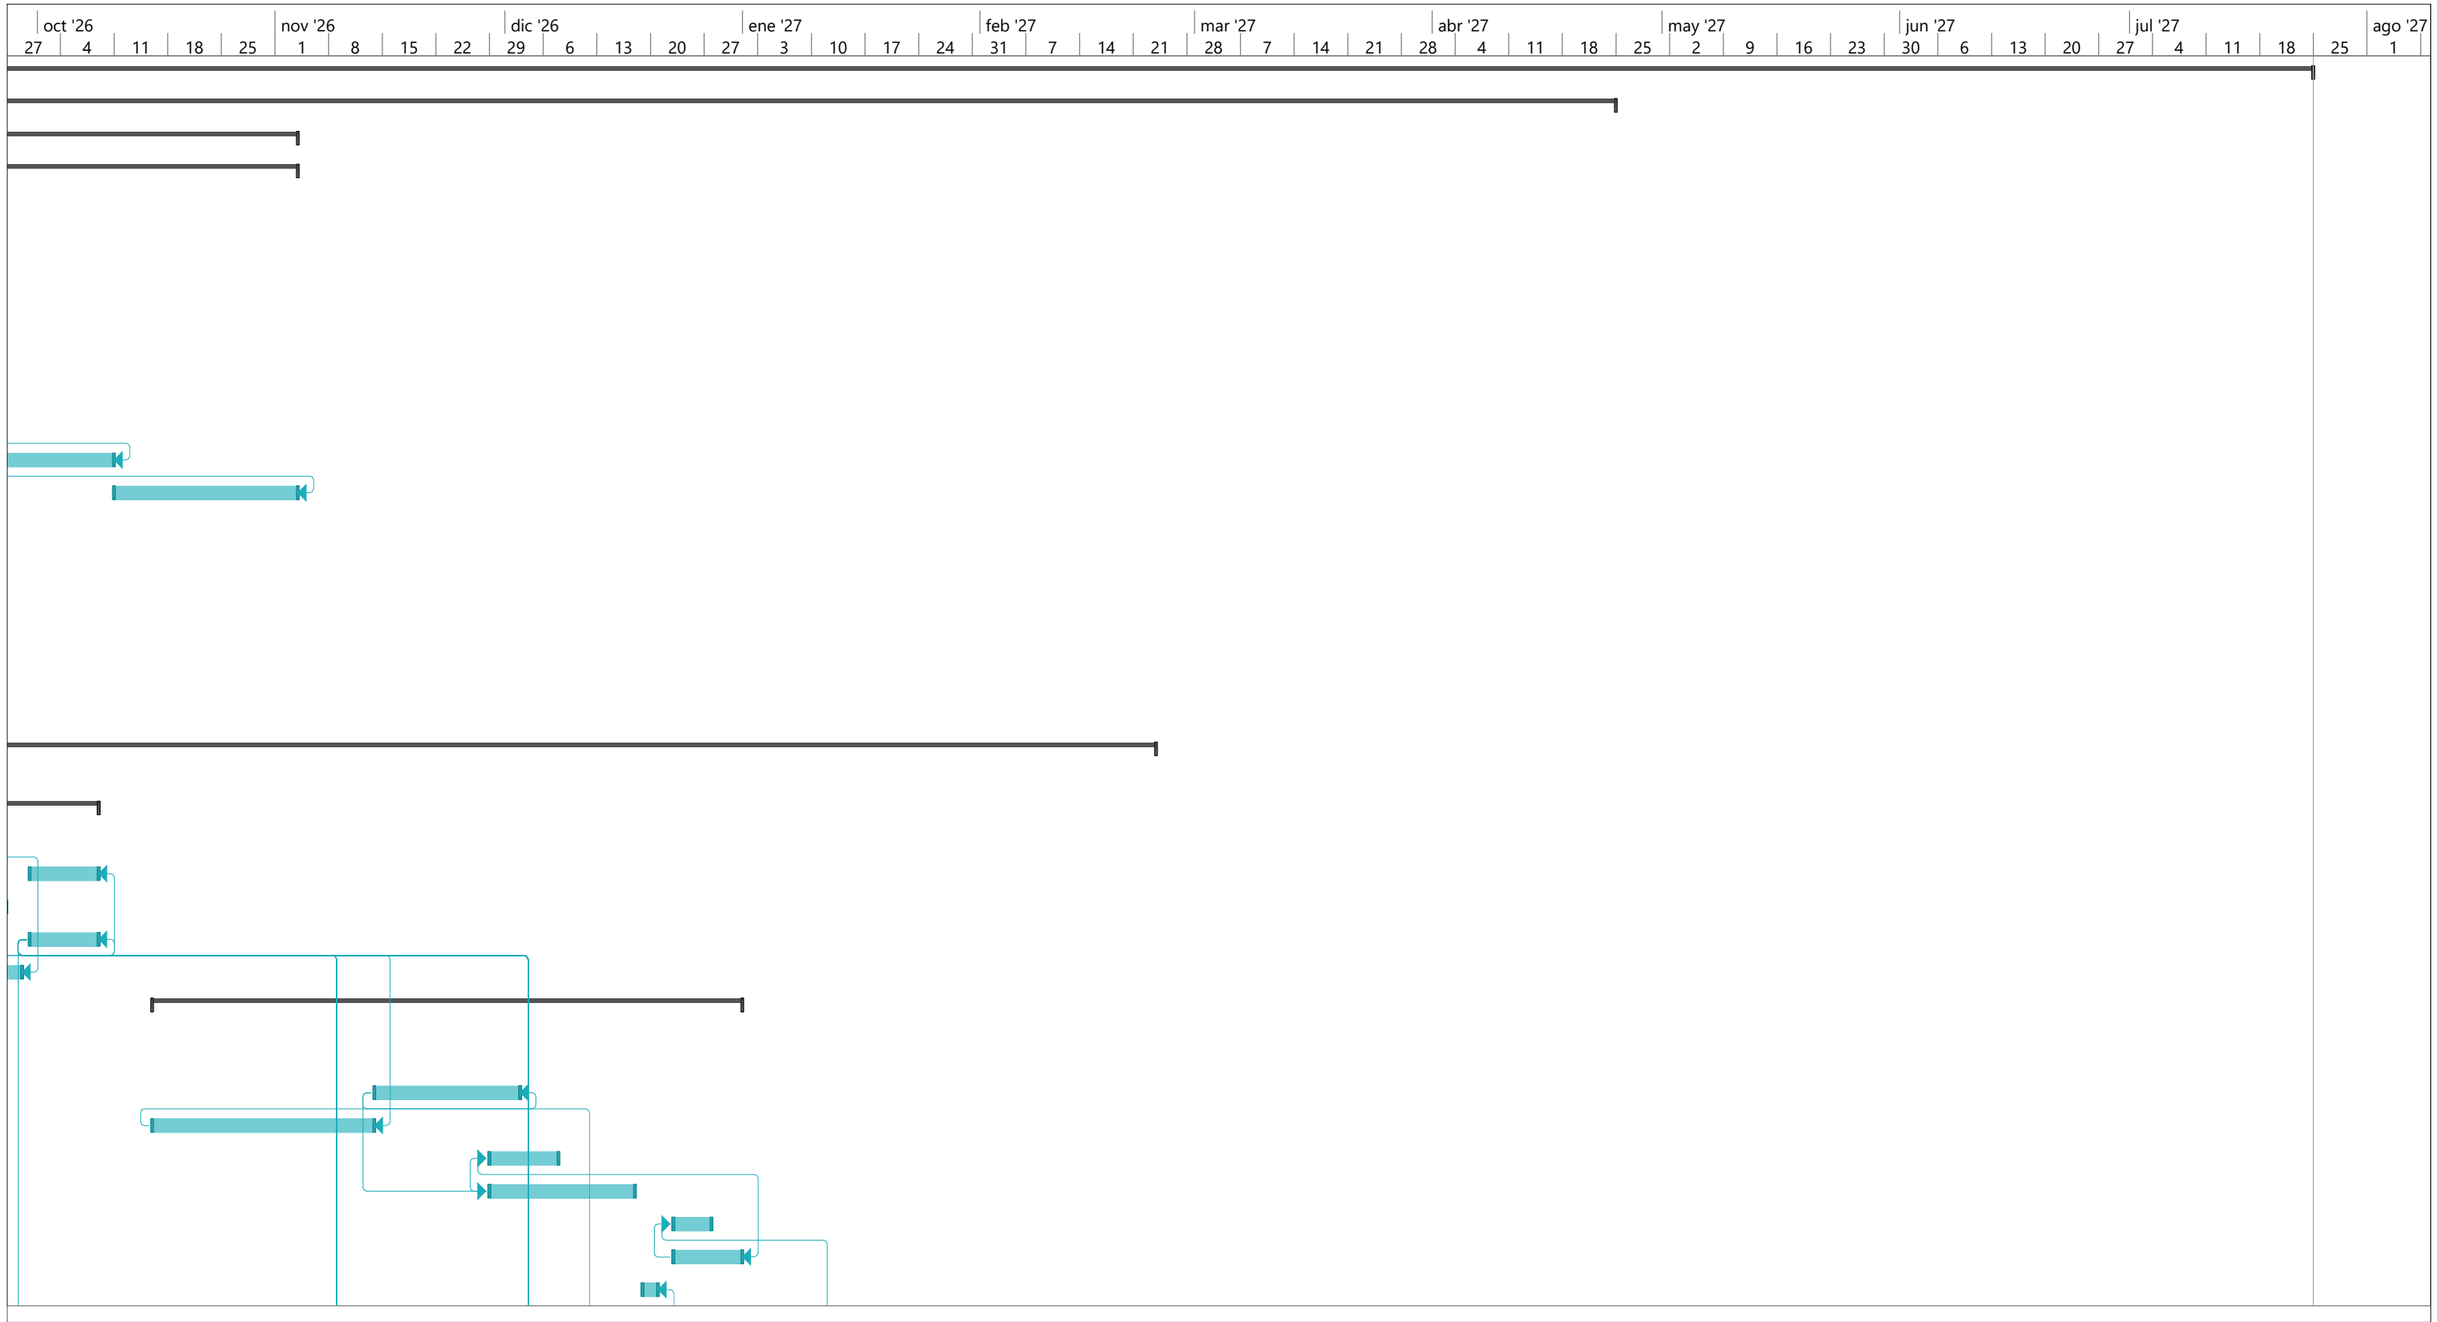


Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

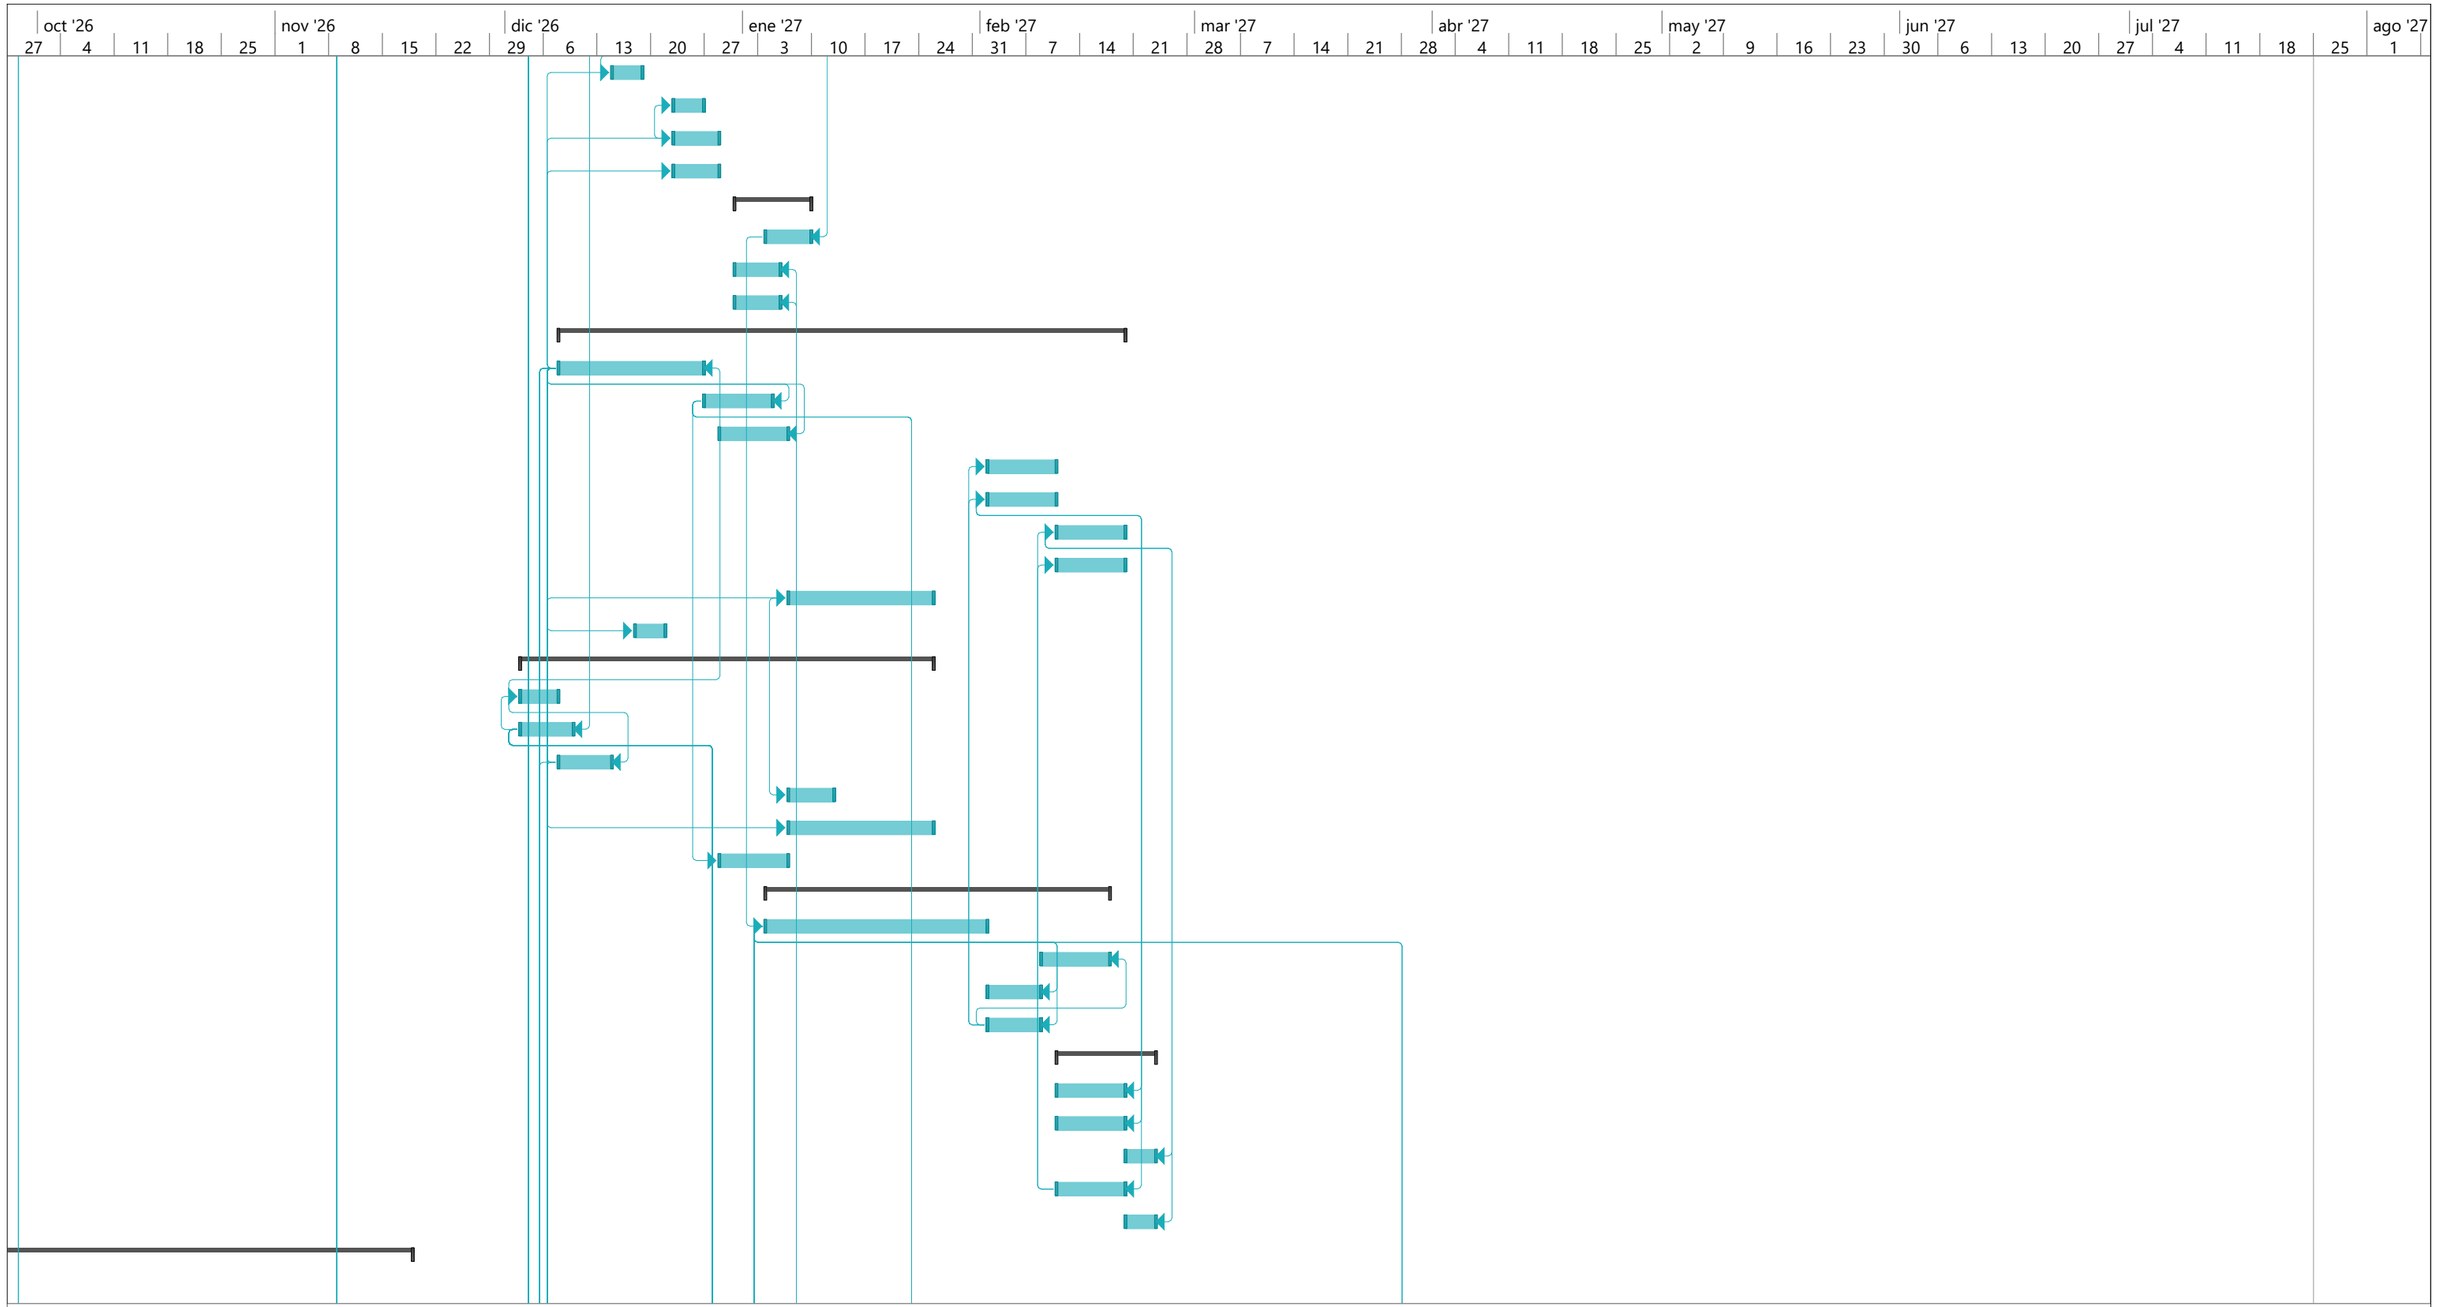


Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

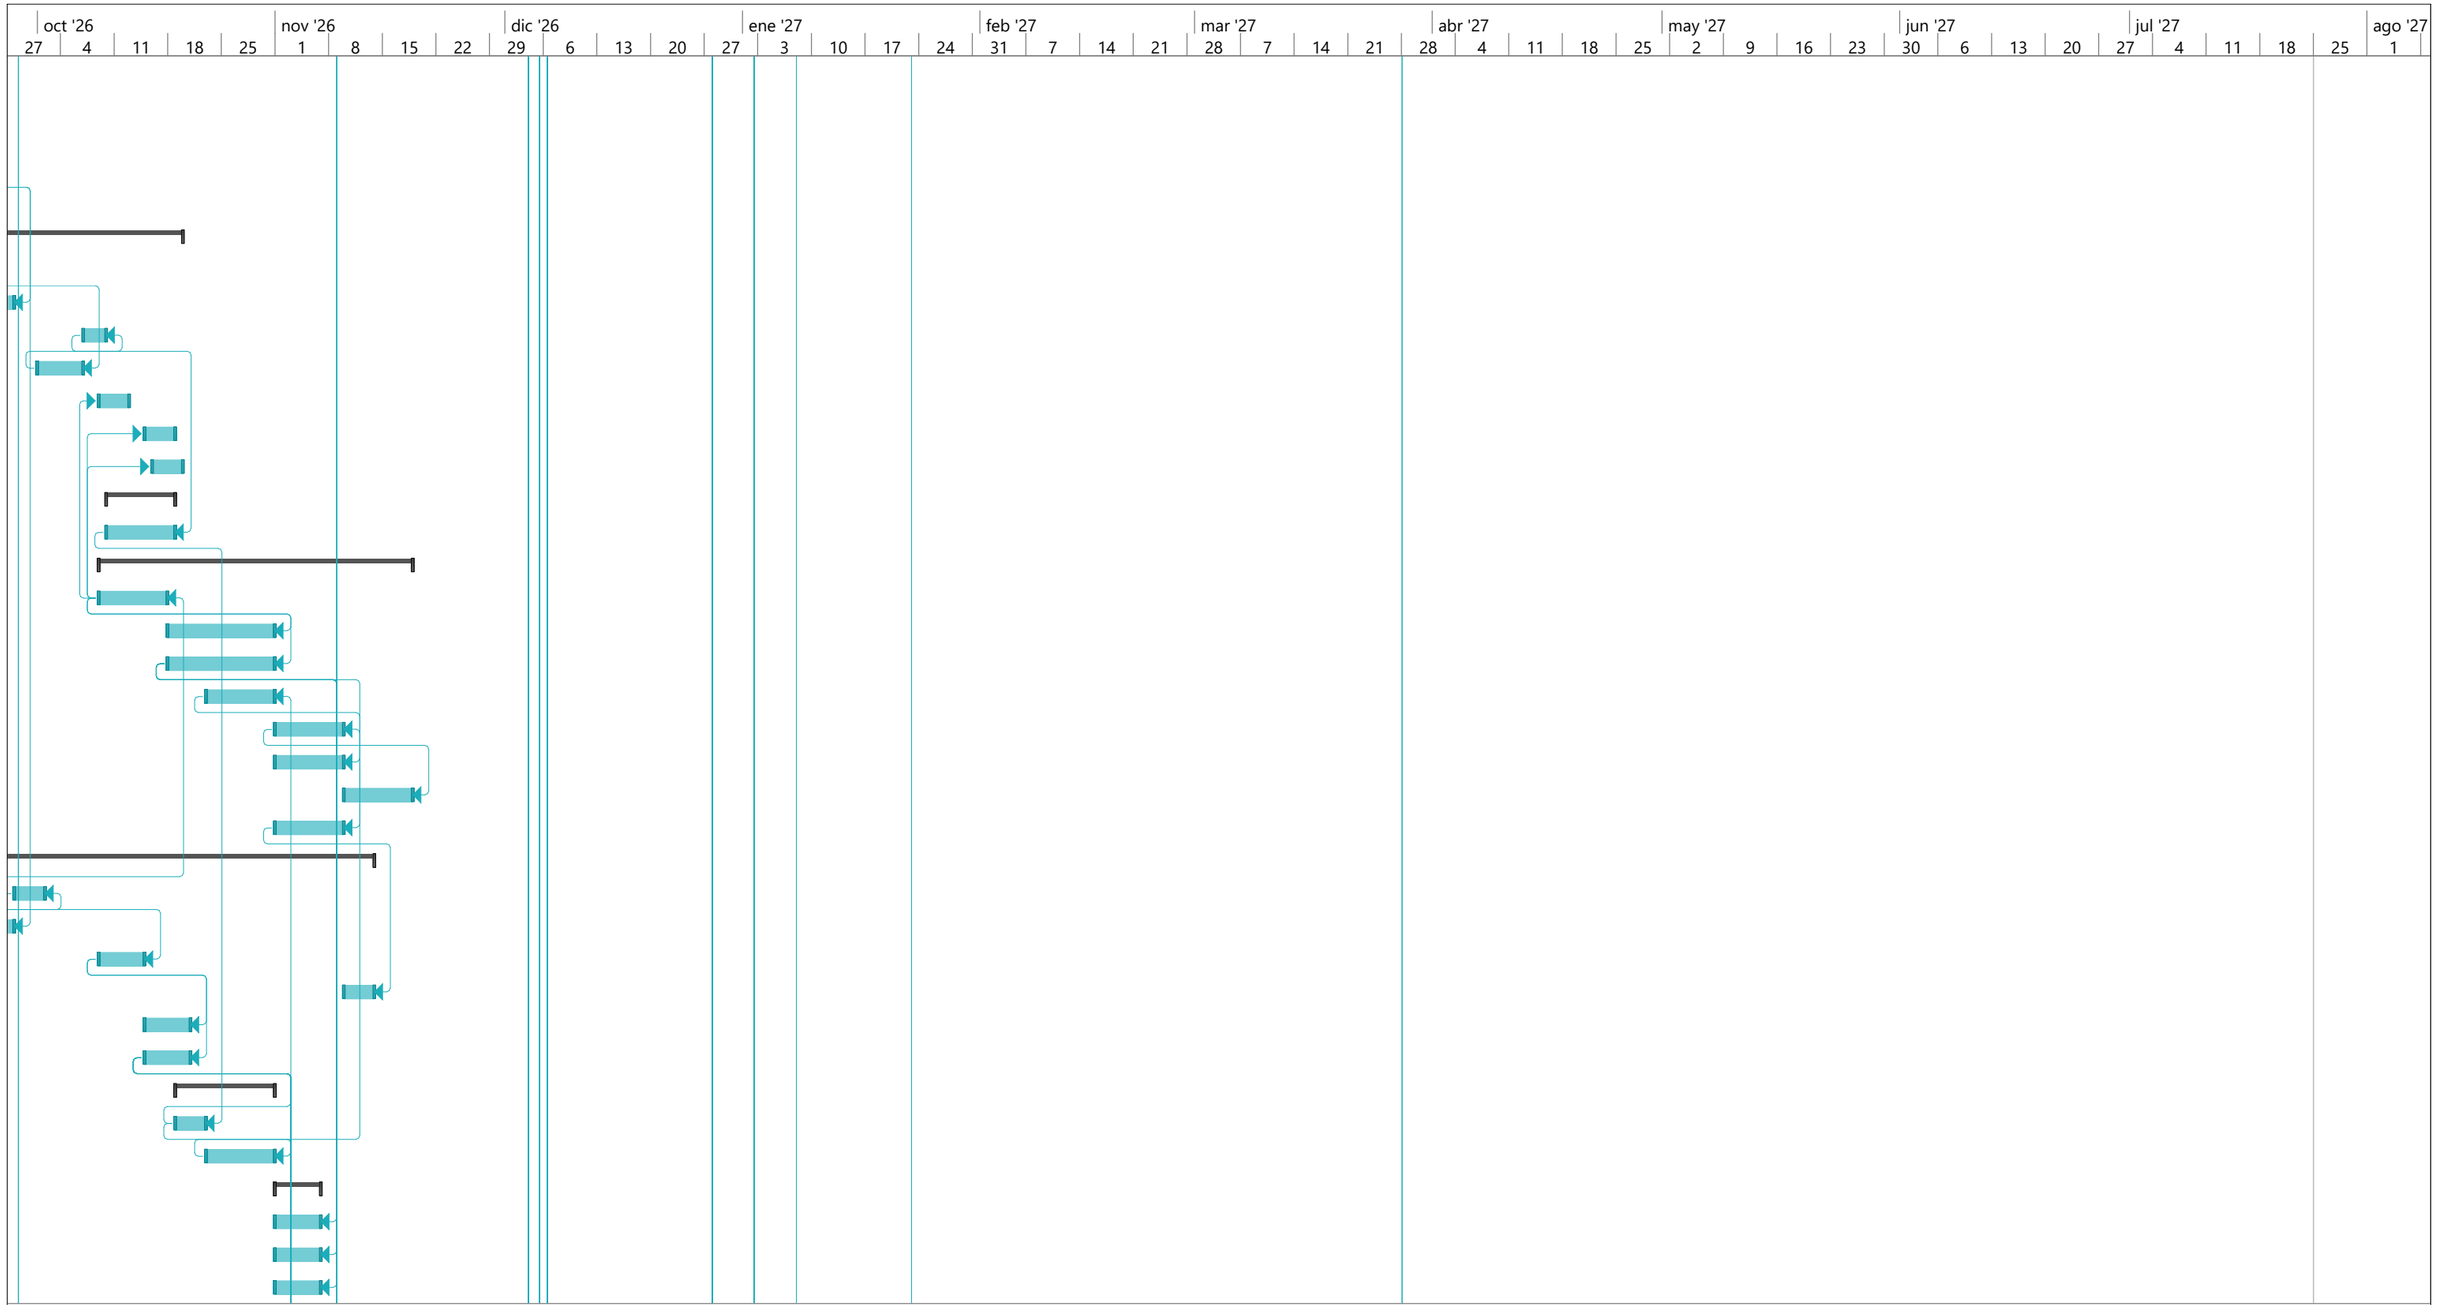


Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

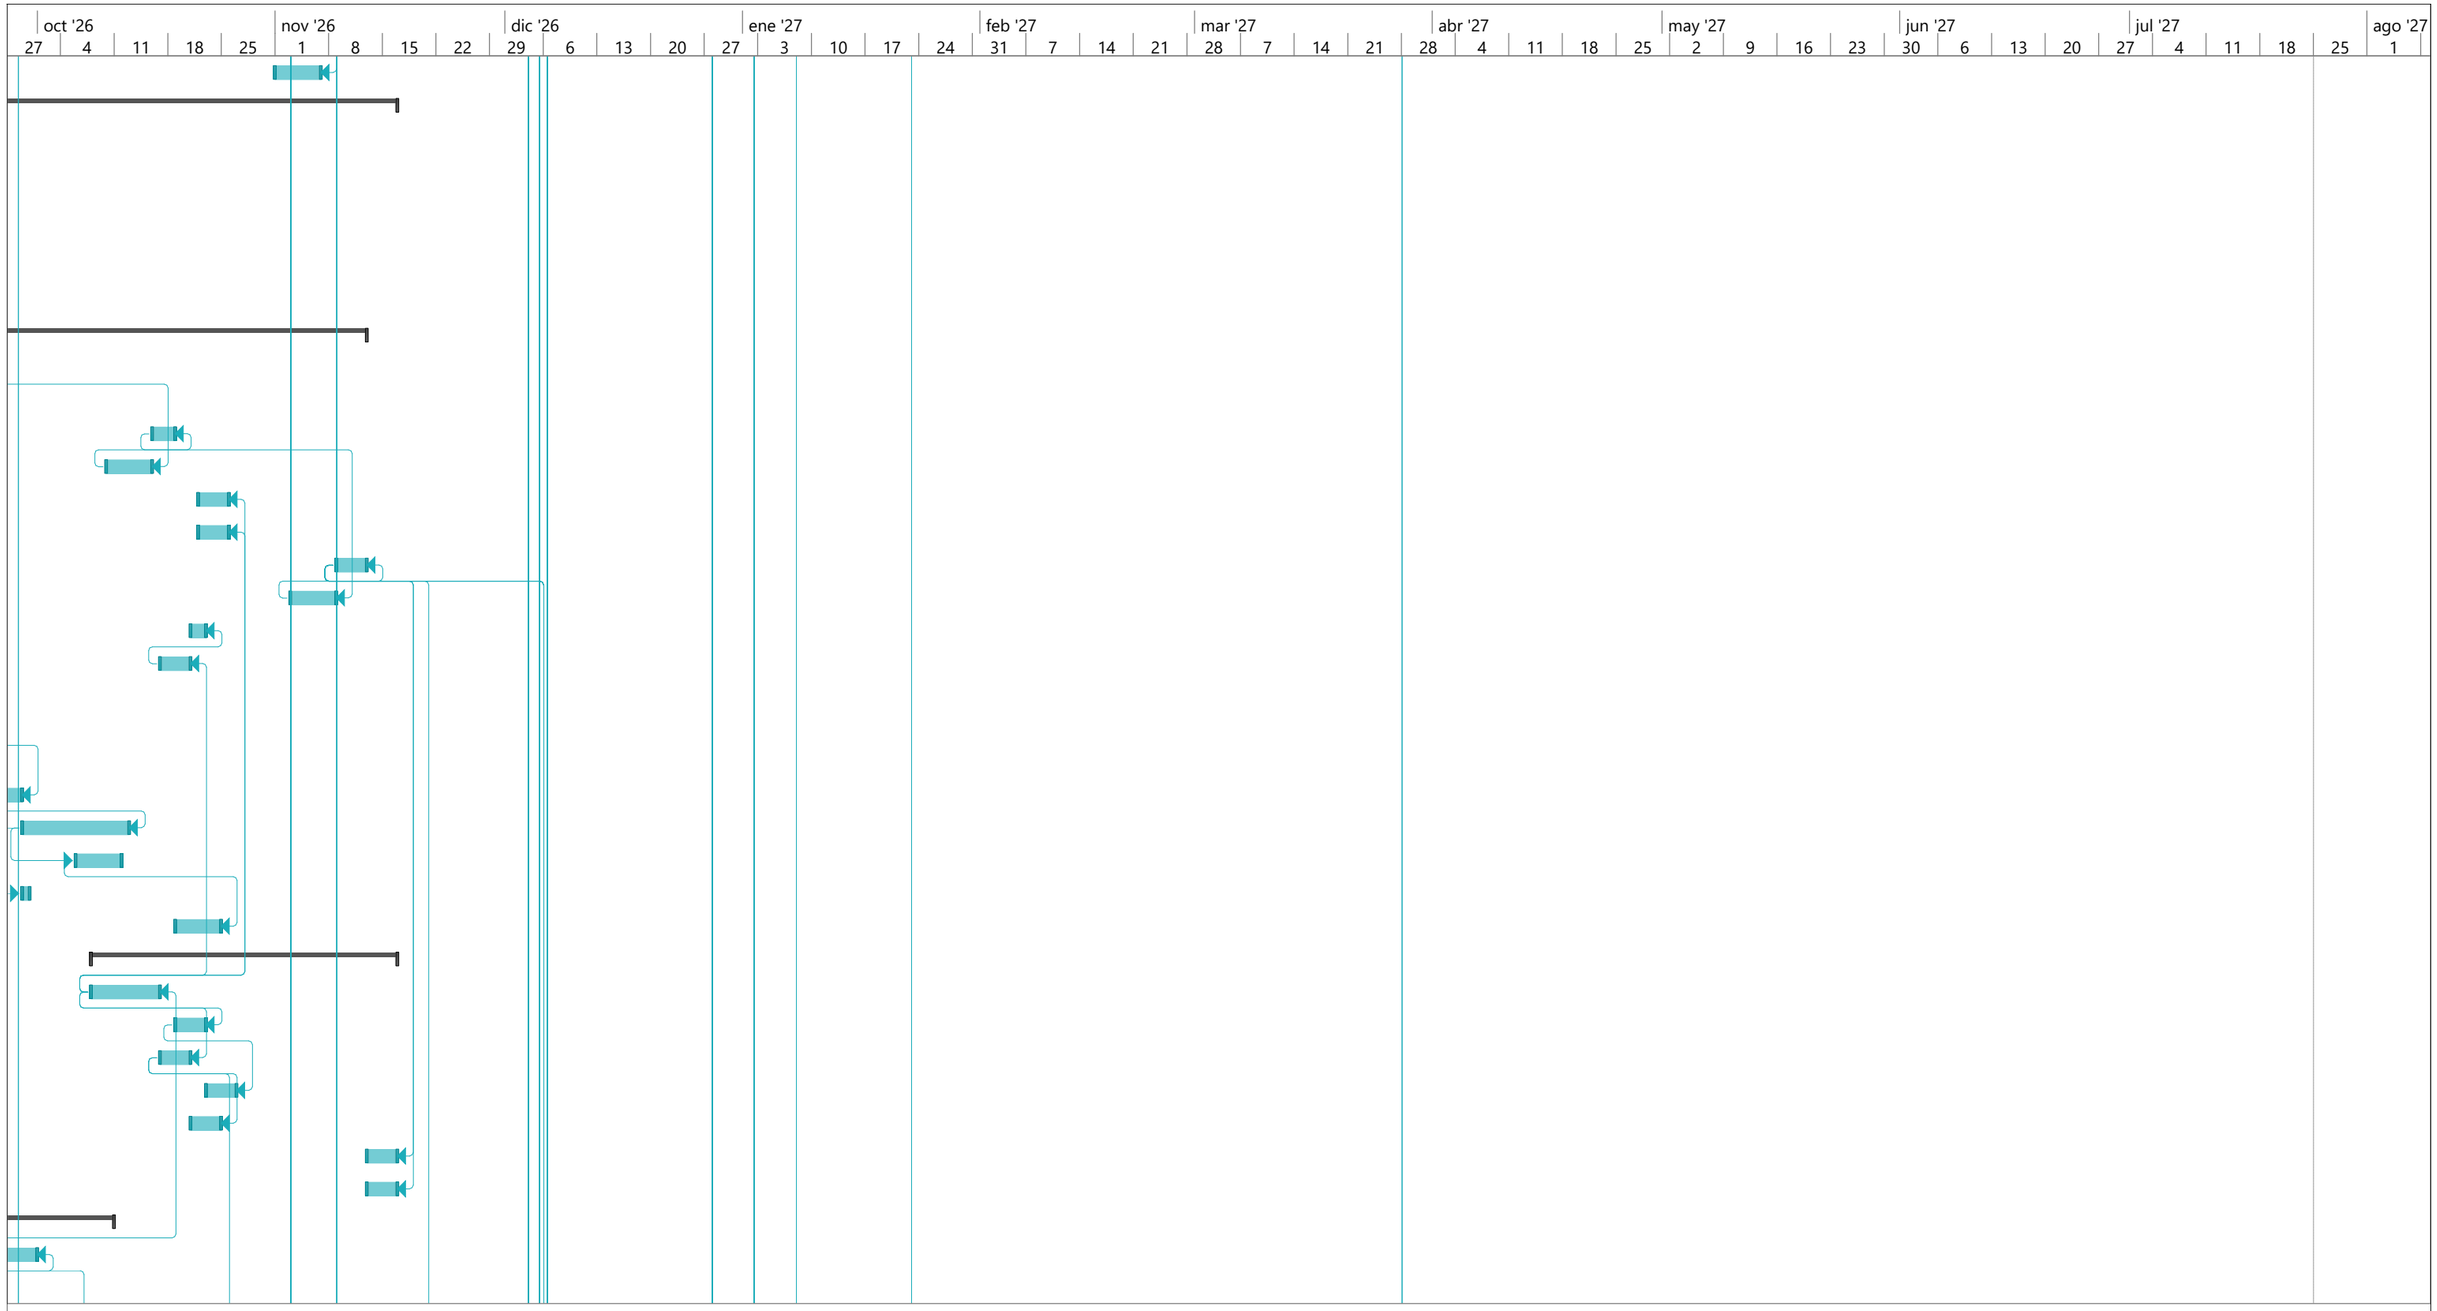


Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

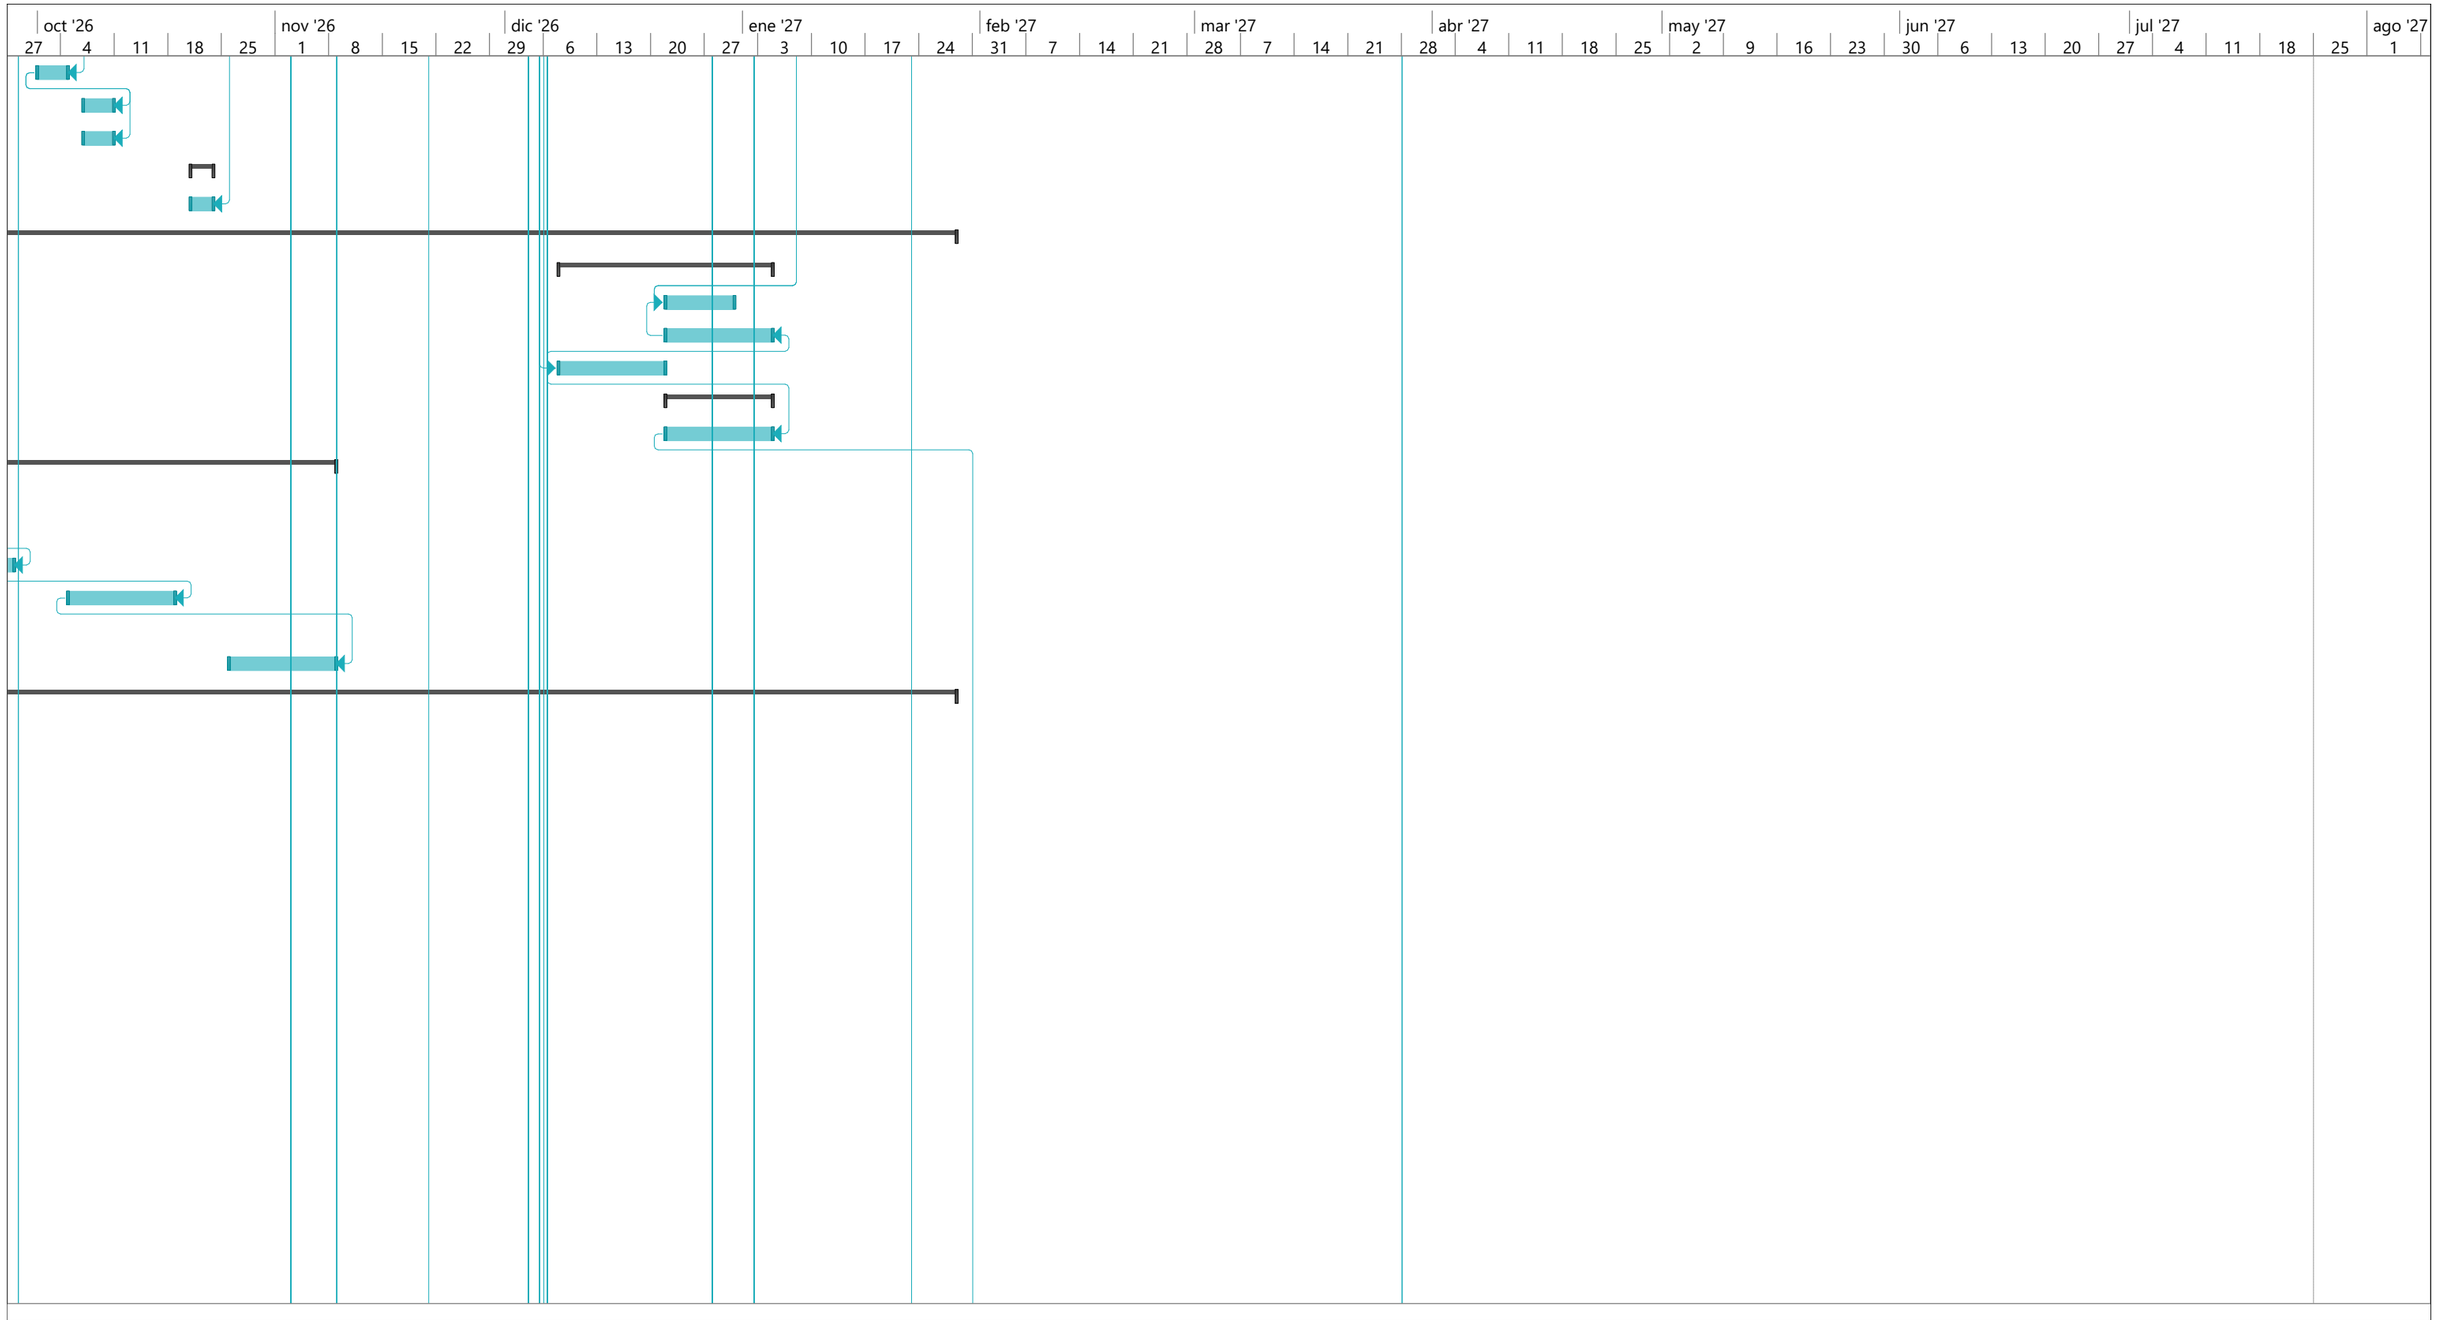


Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

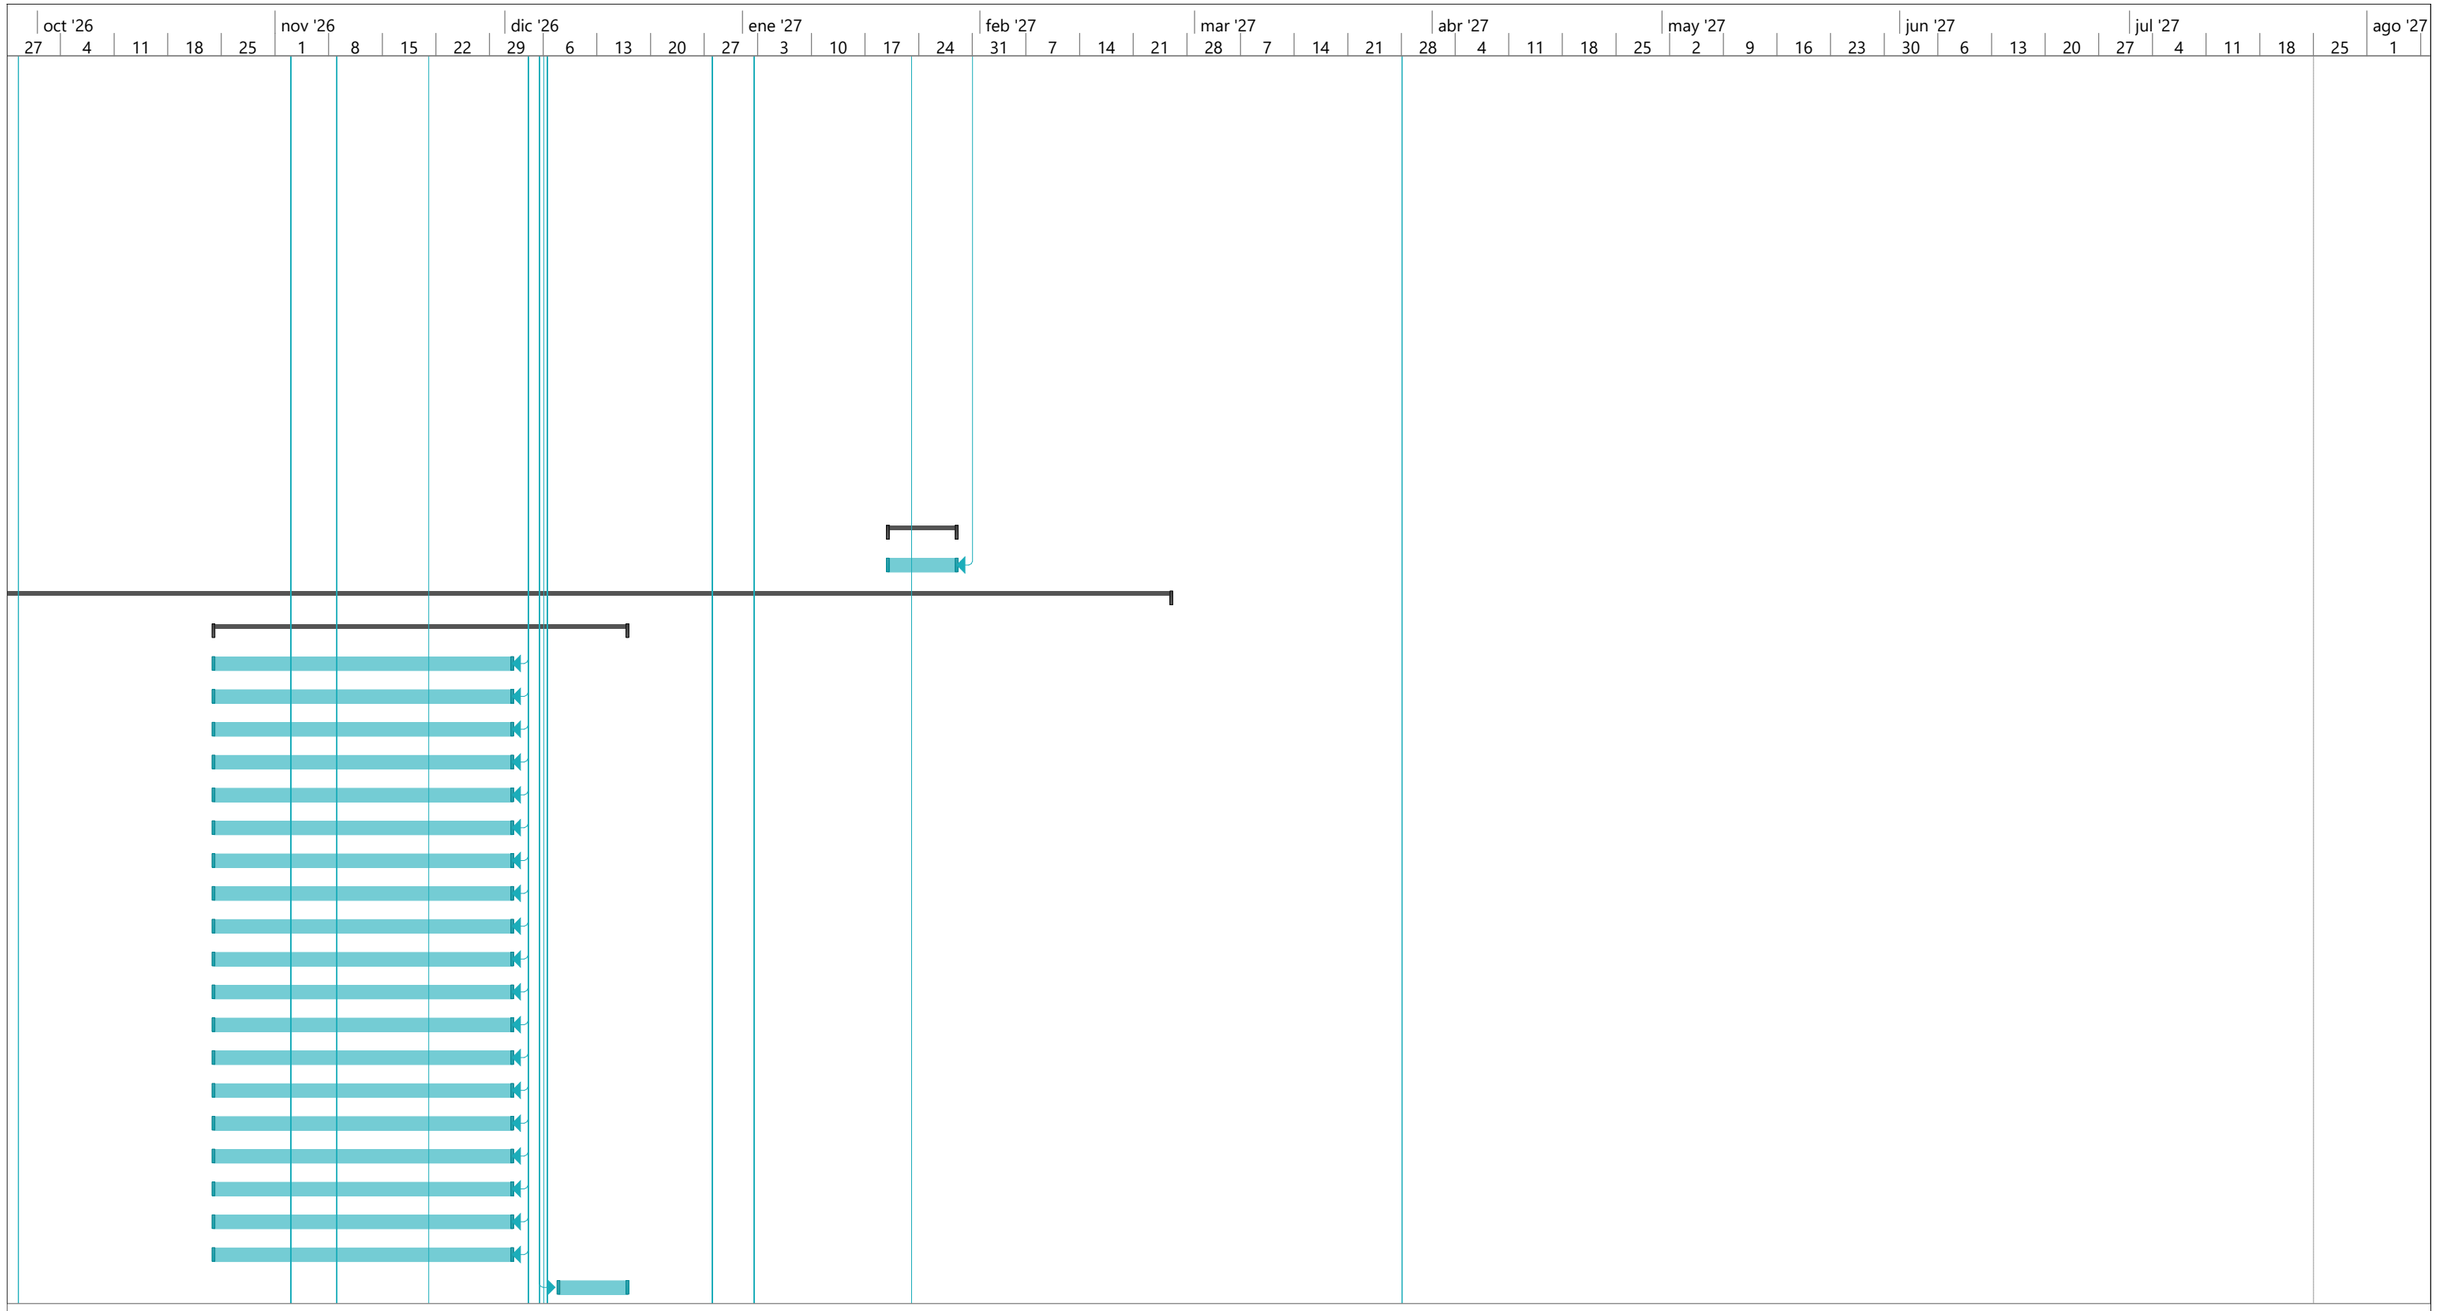


Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

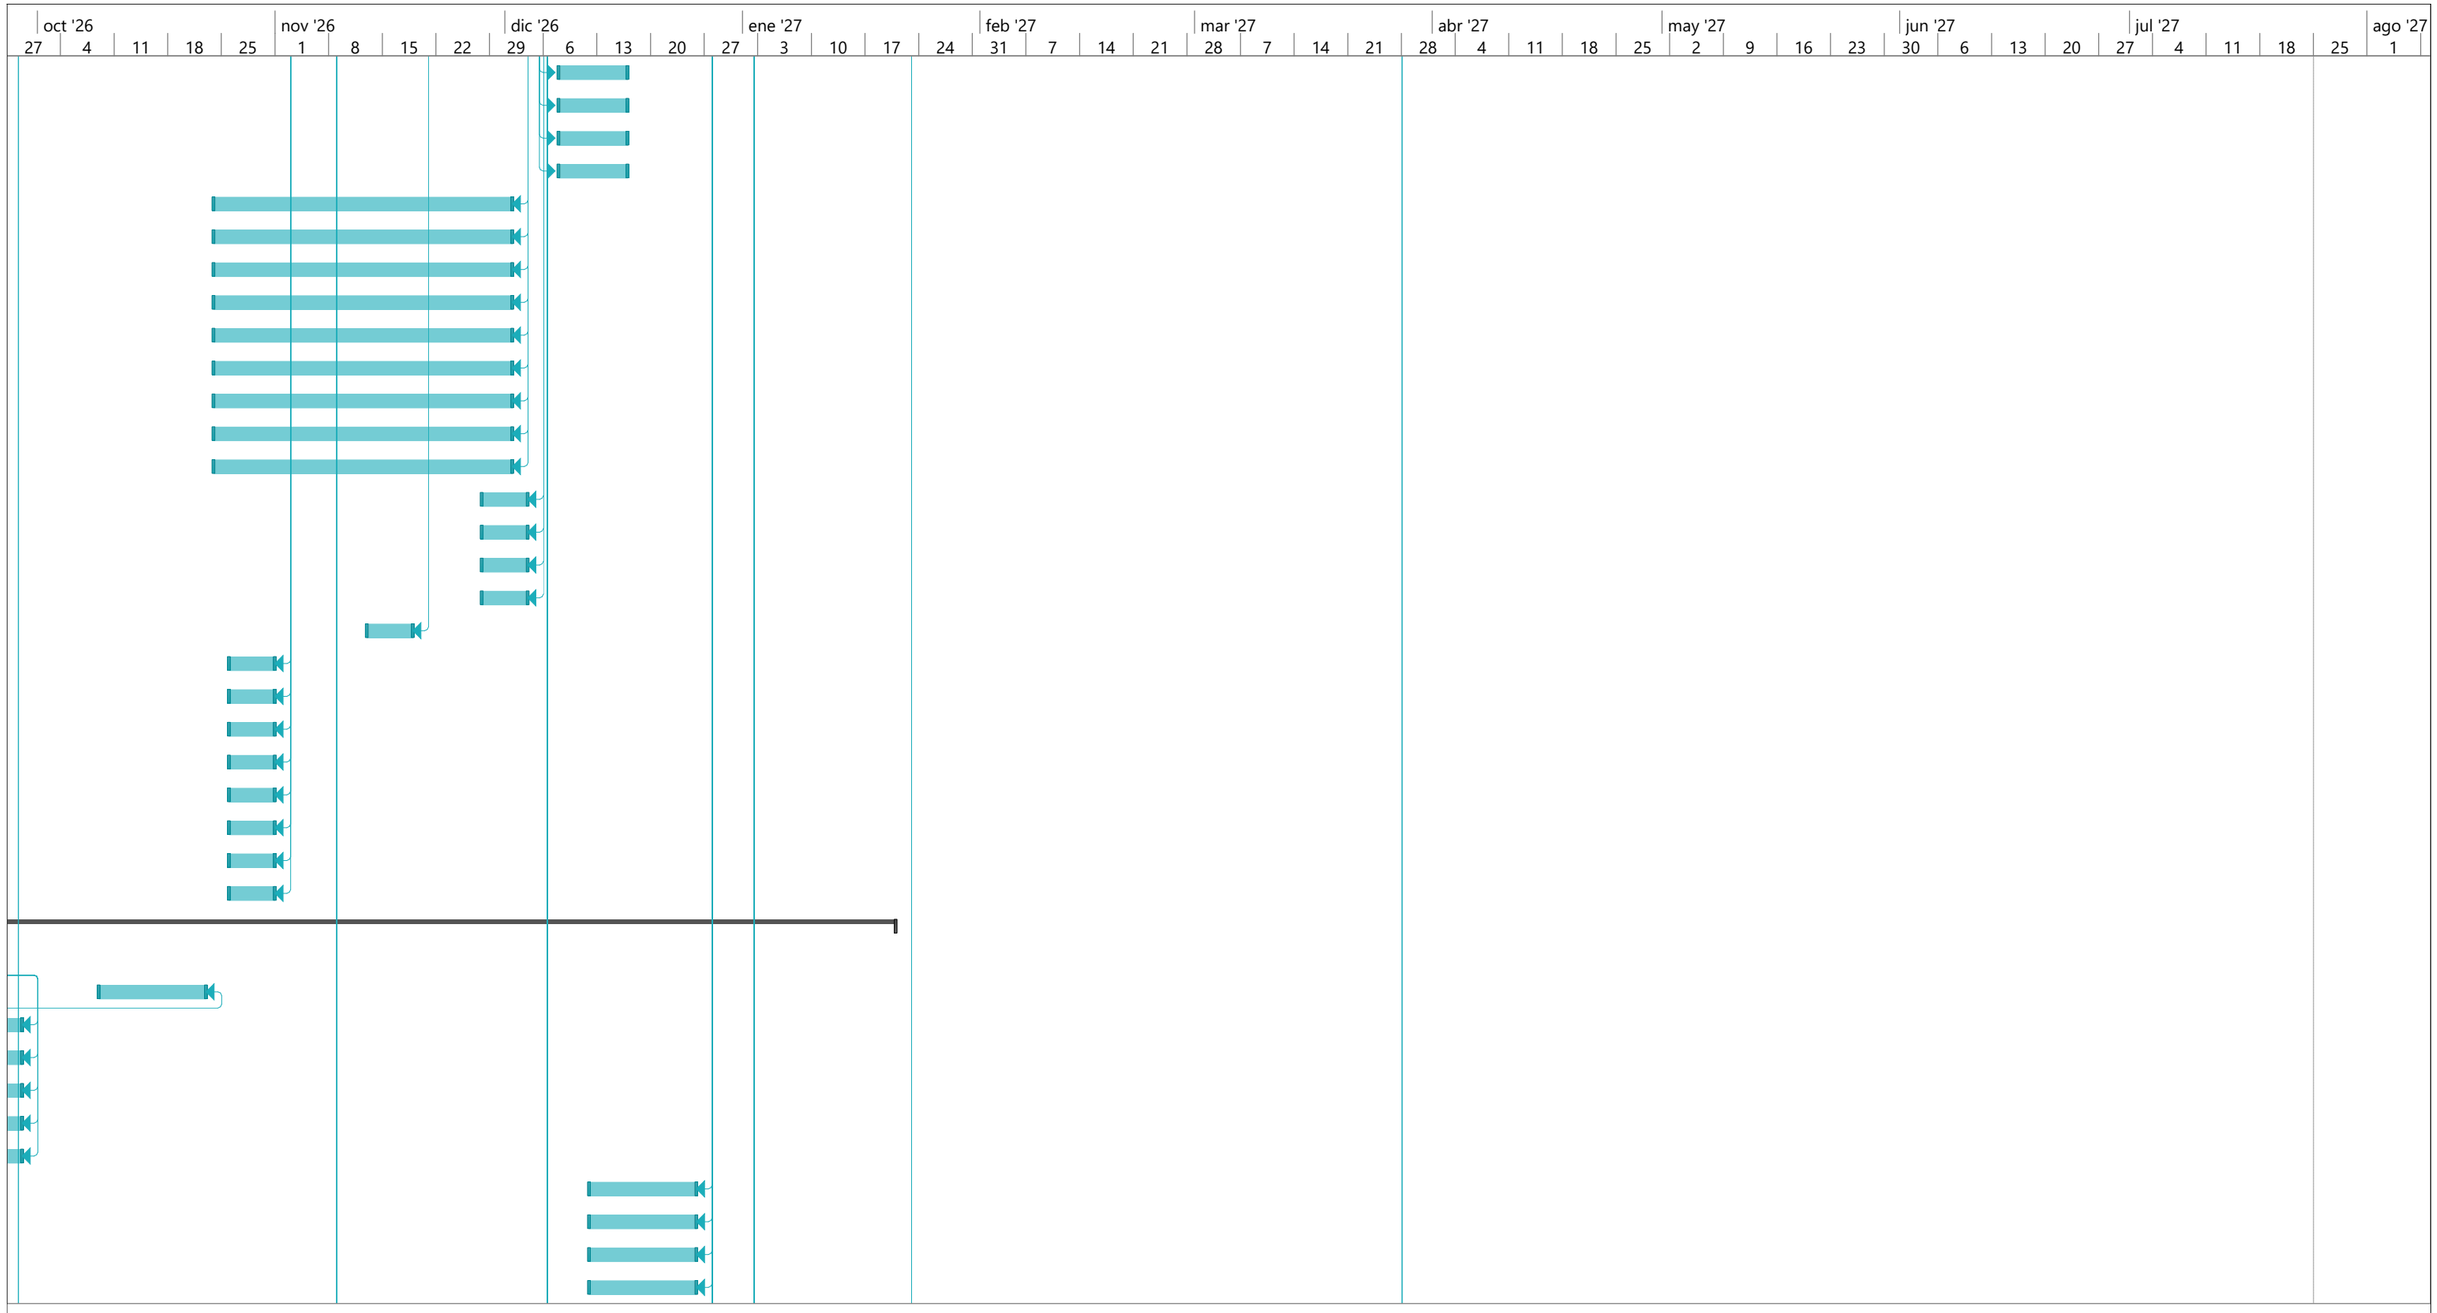


Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

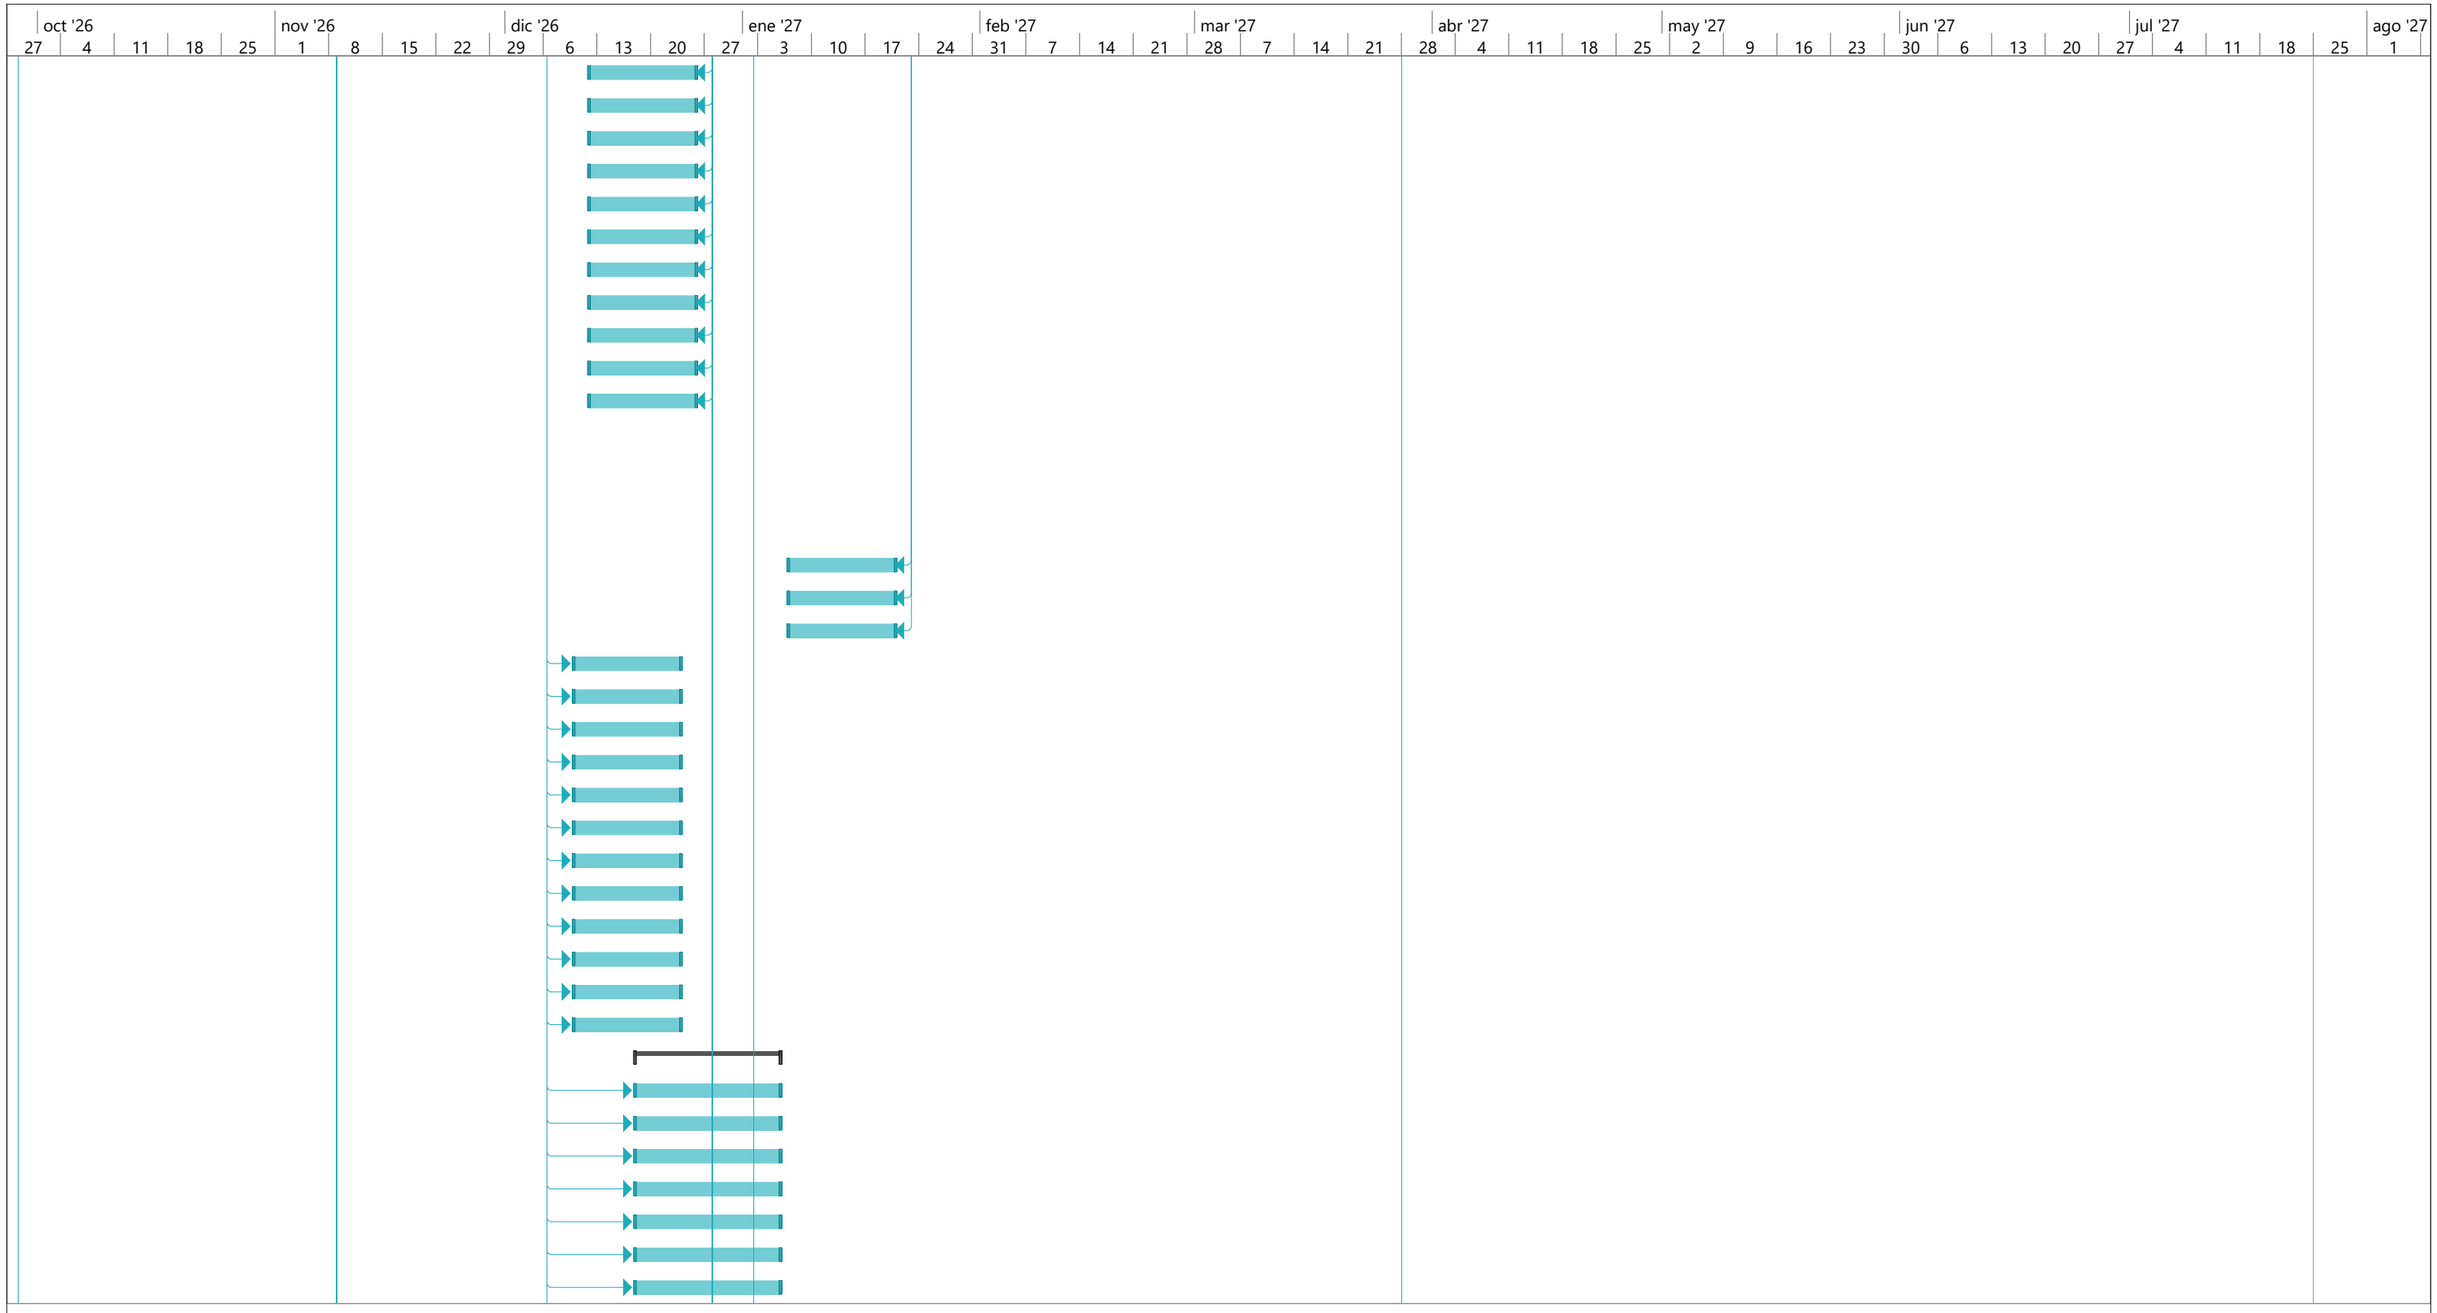


Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

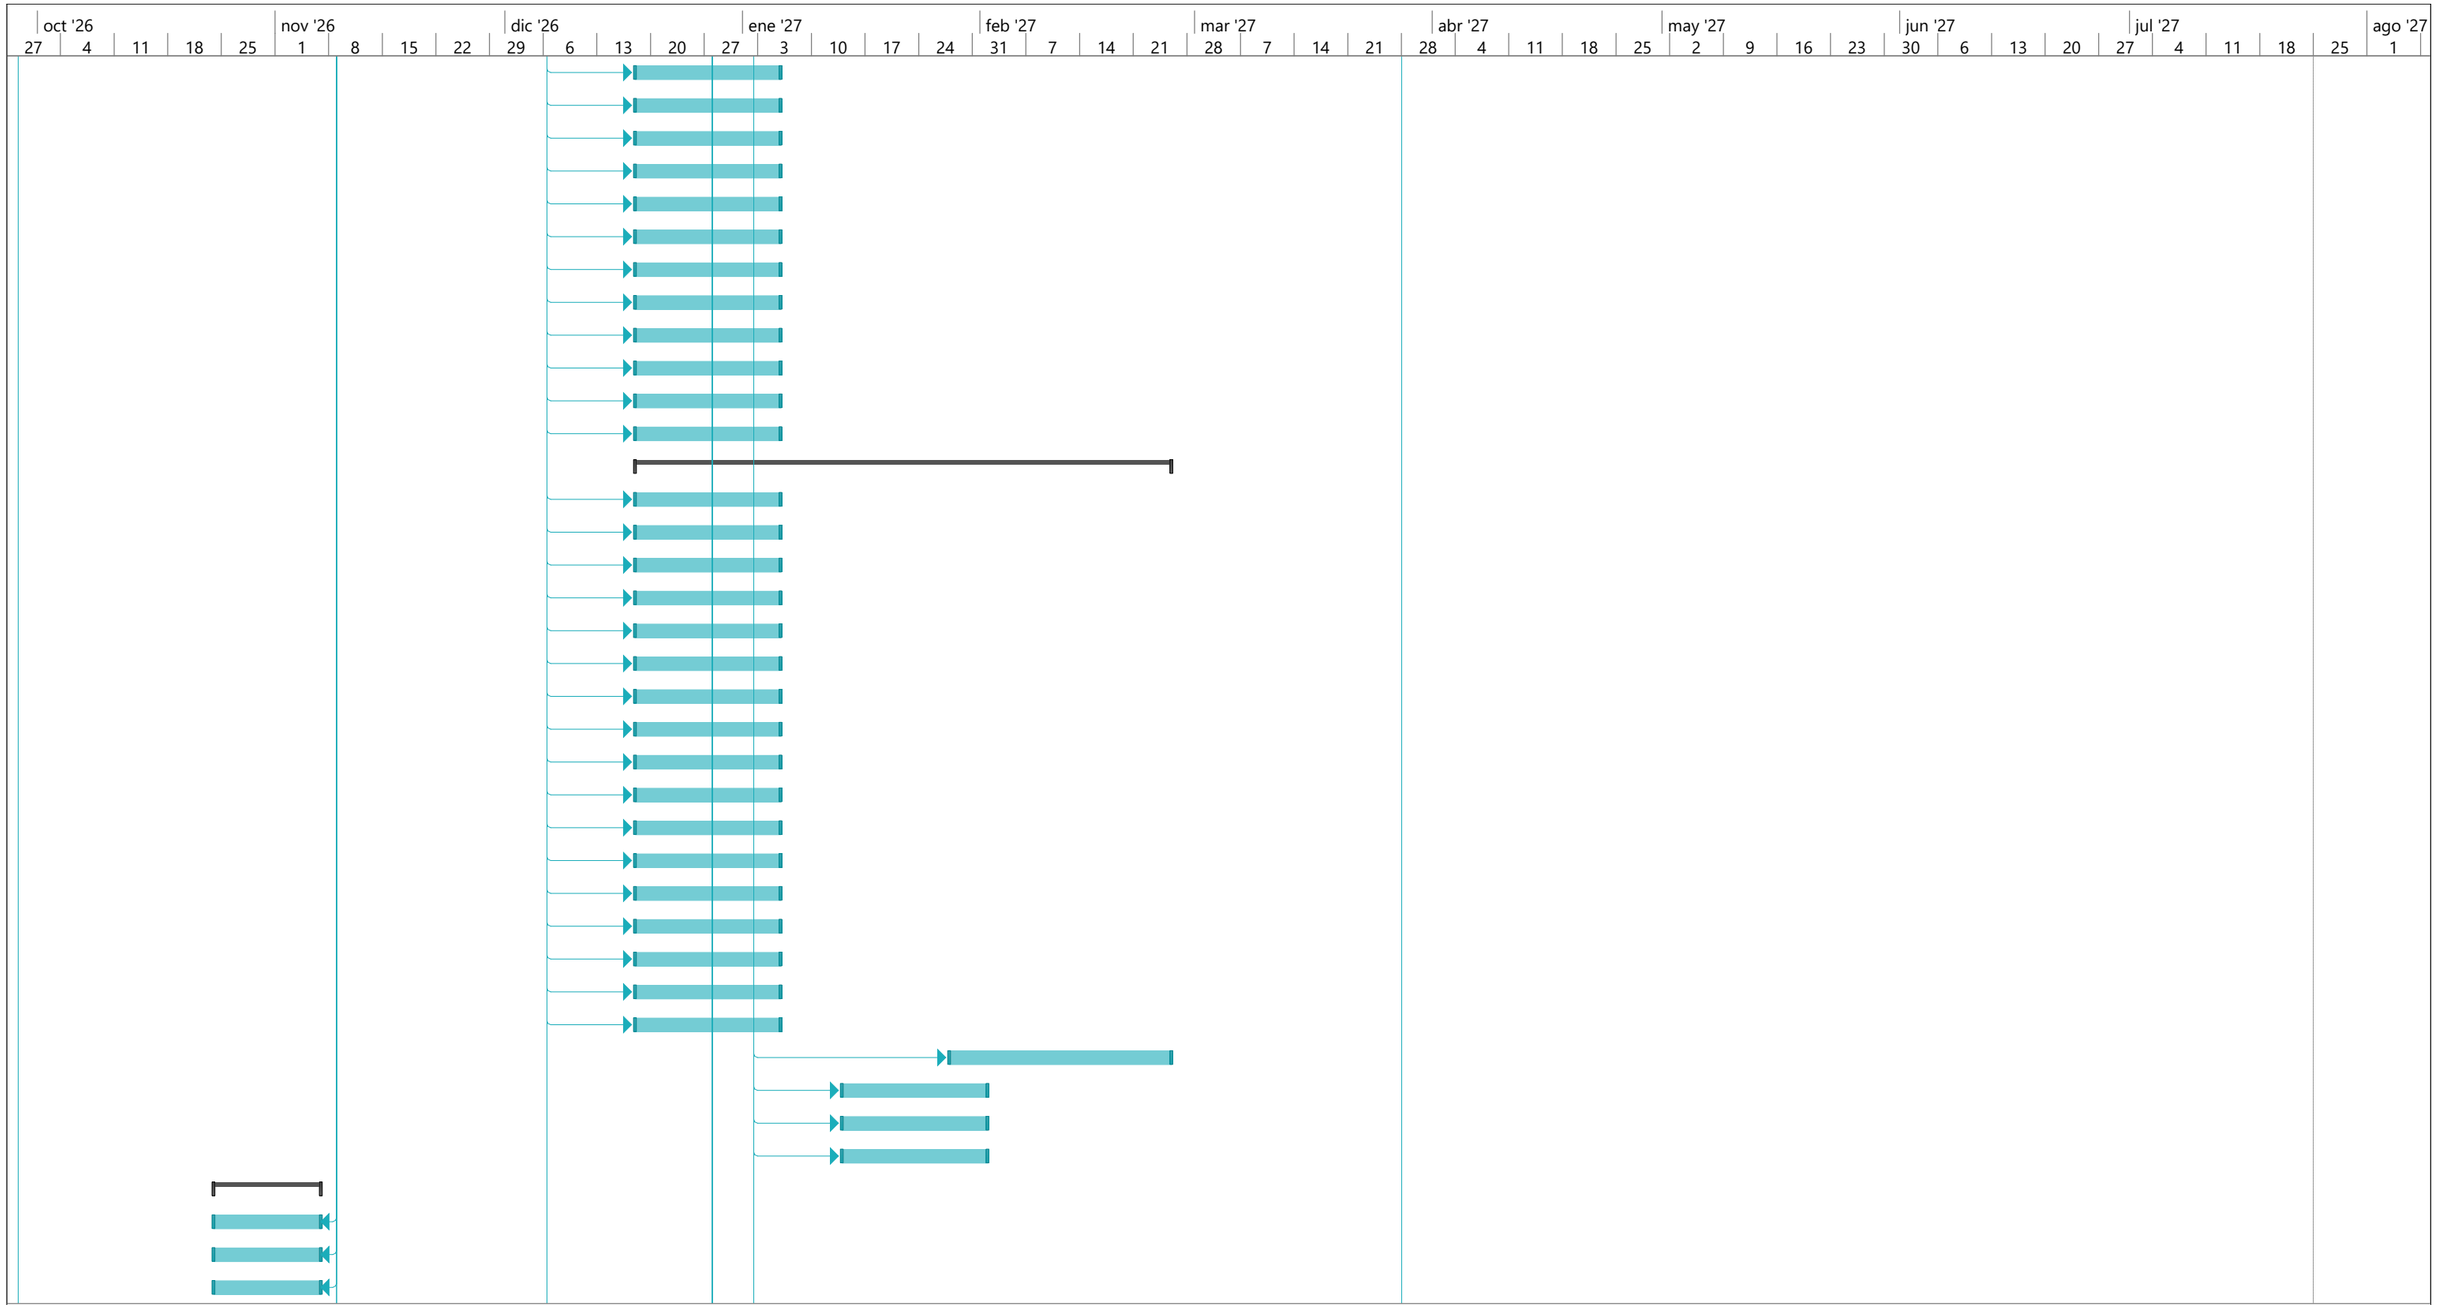


Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

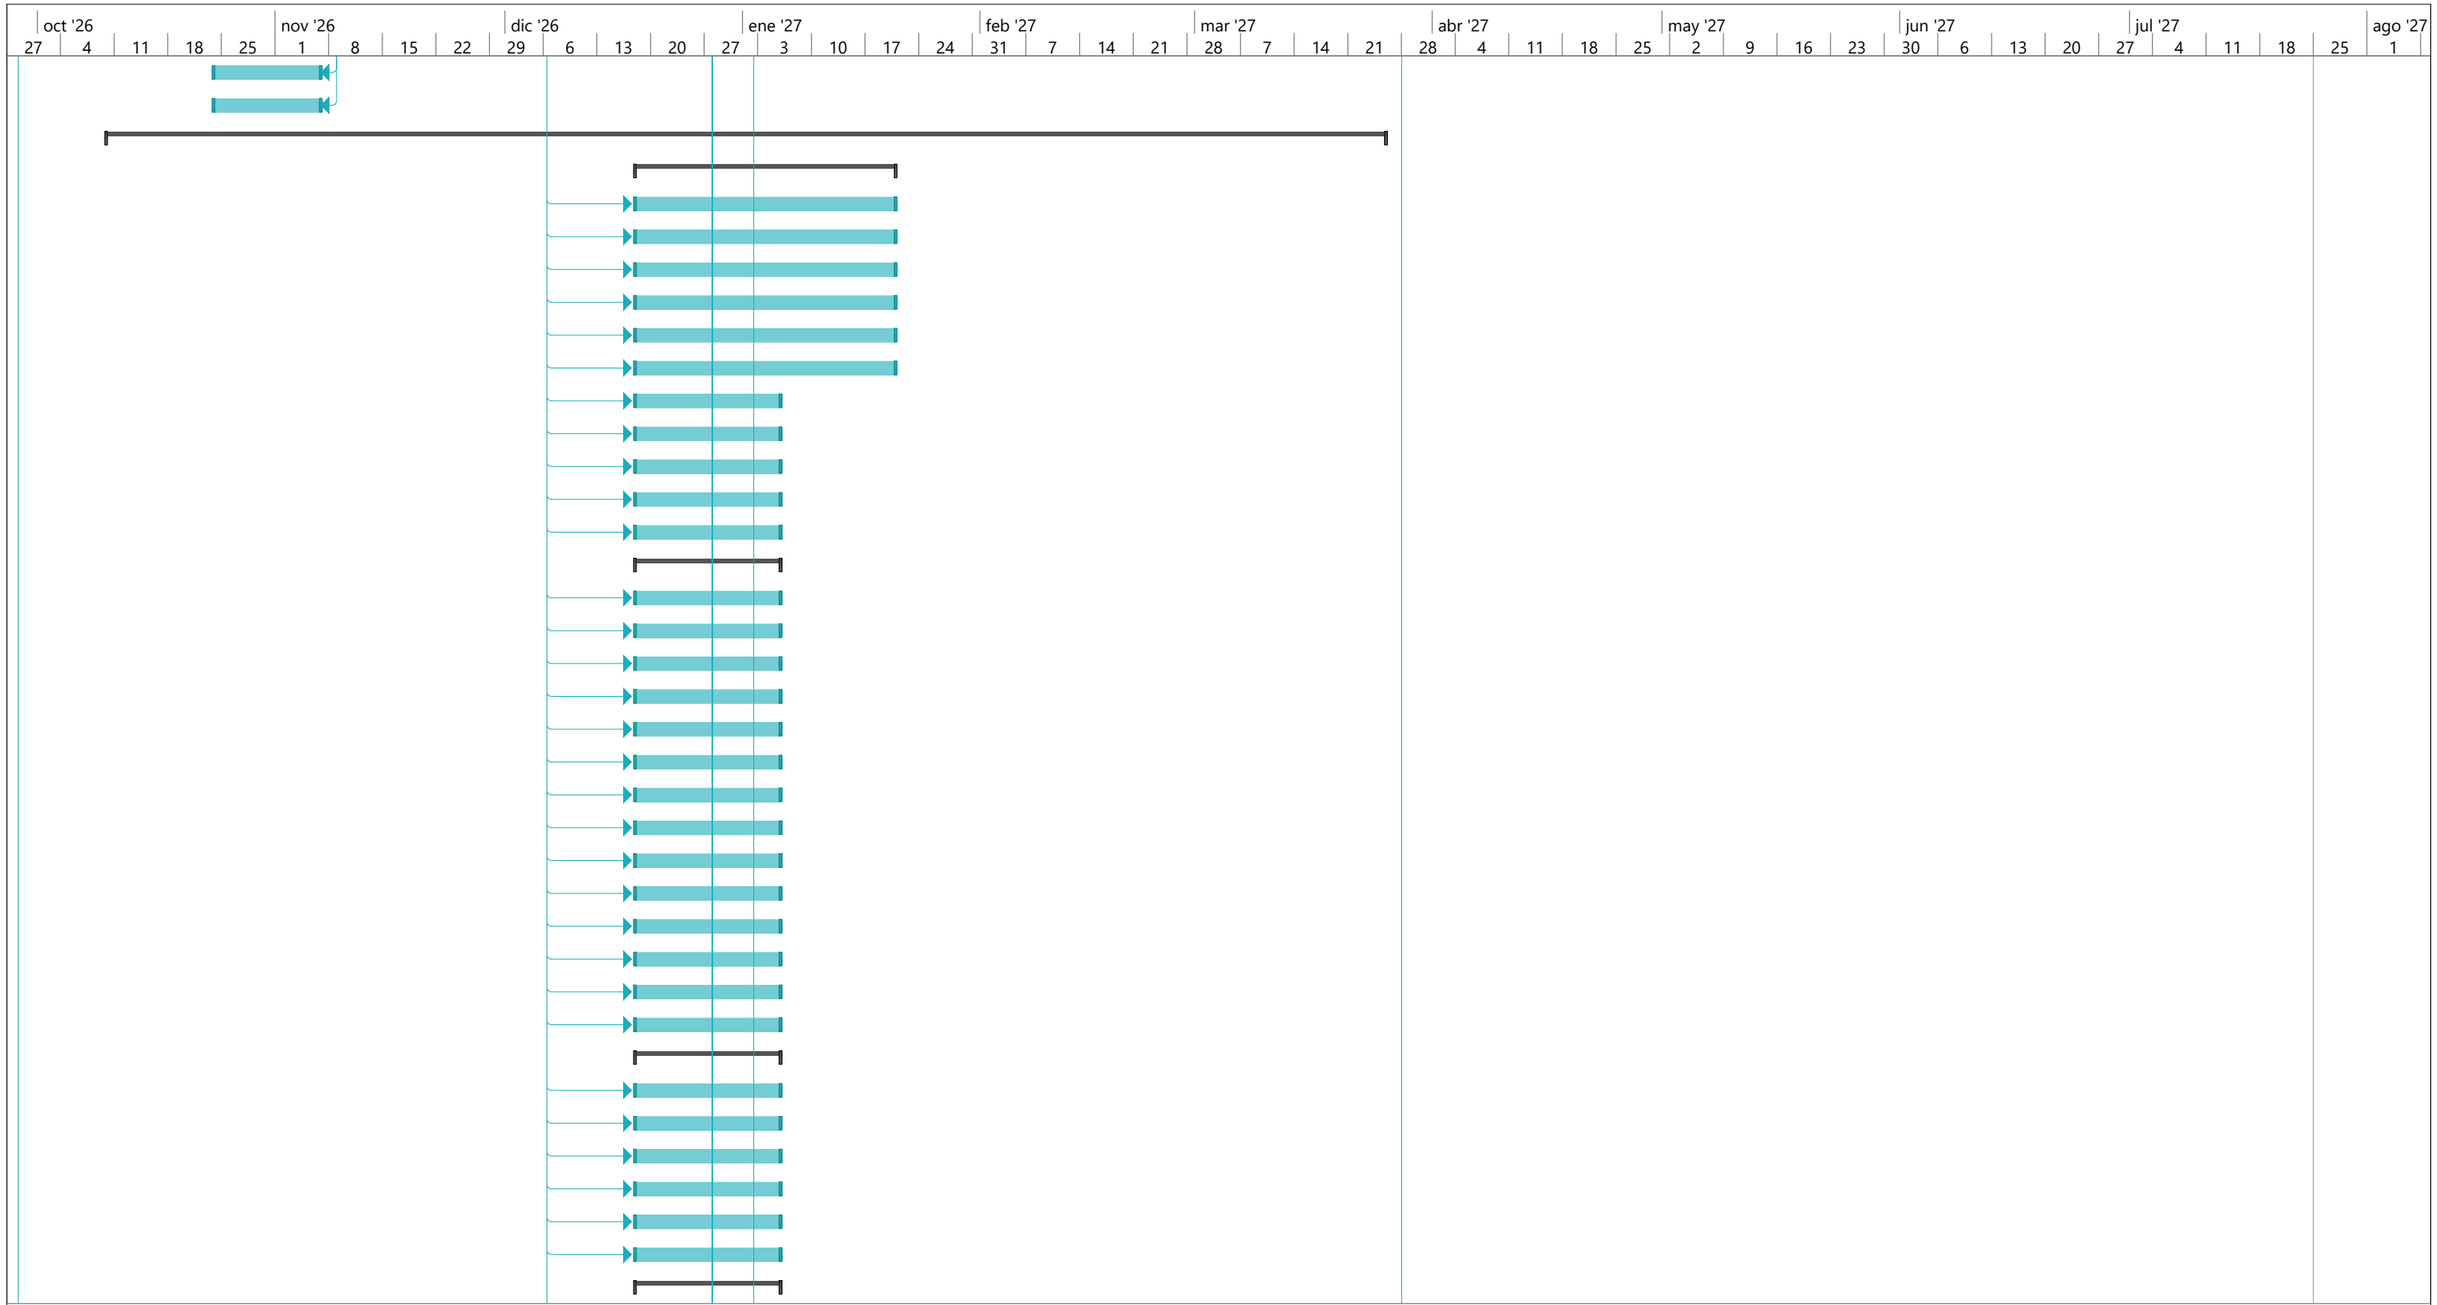


Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo

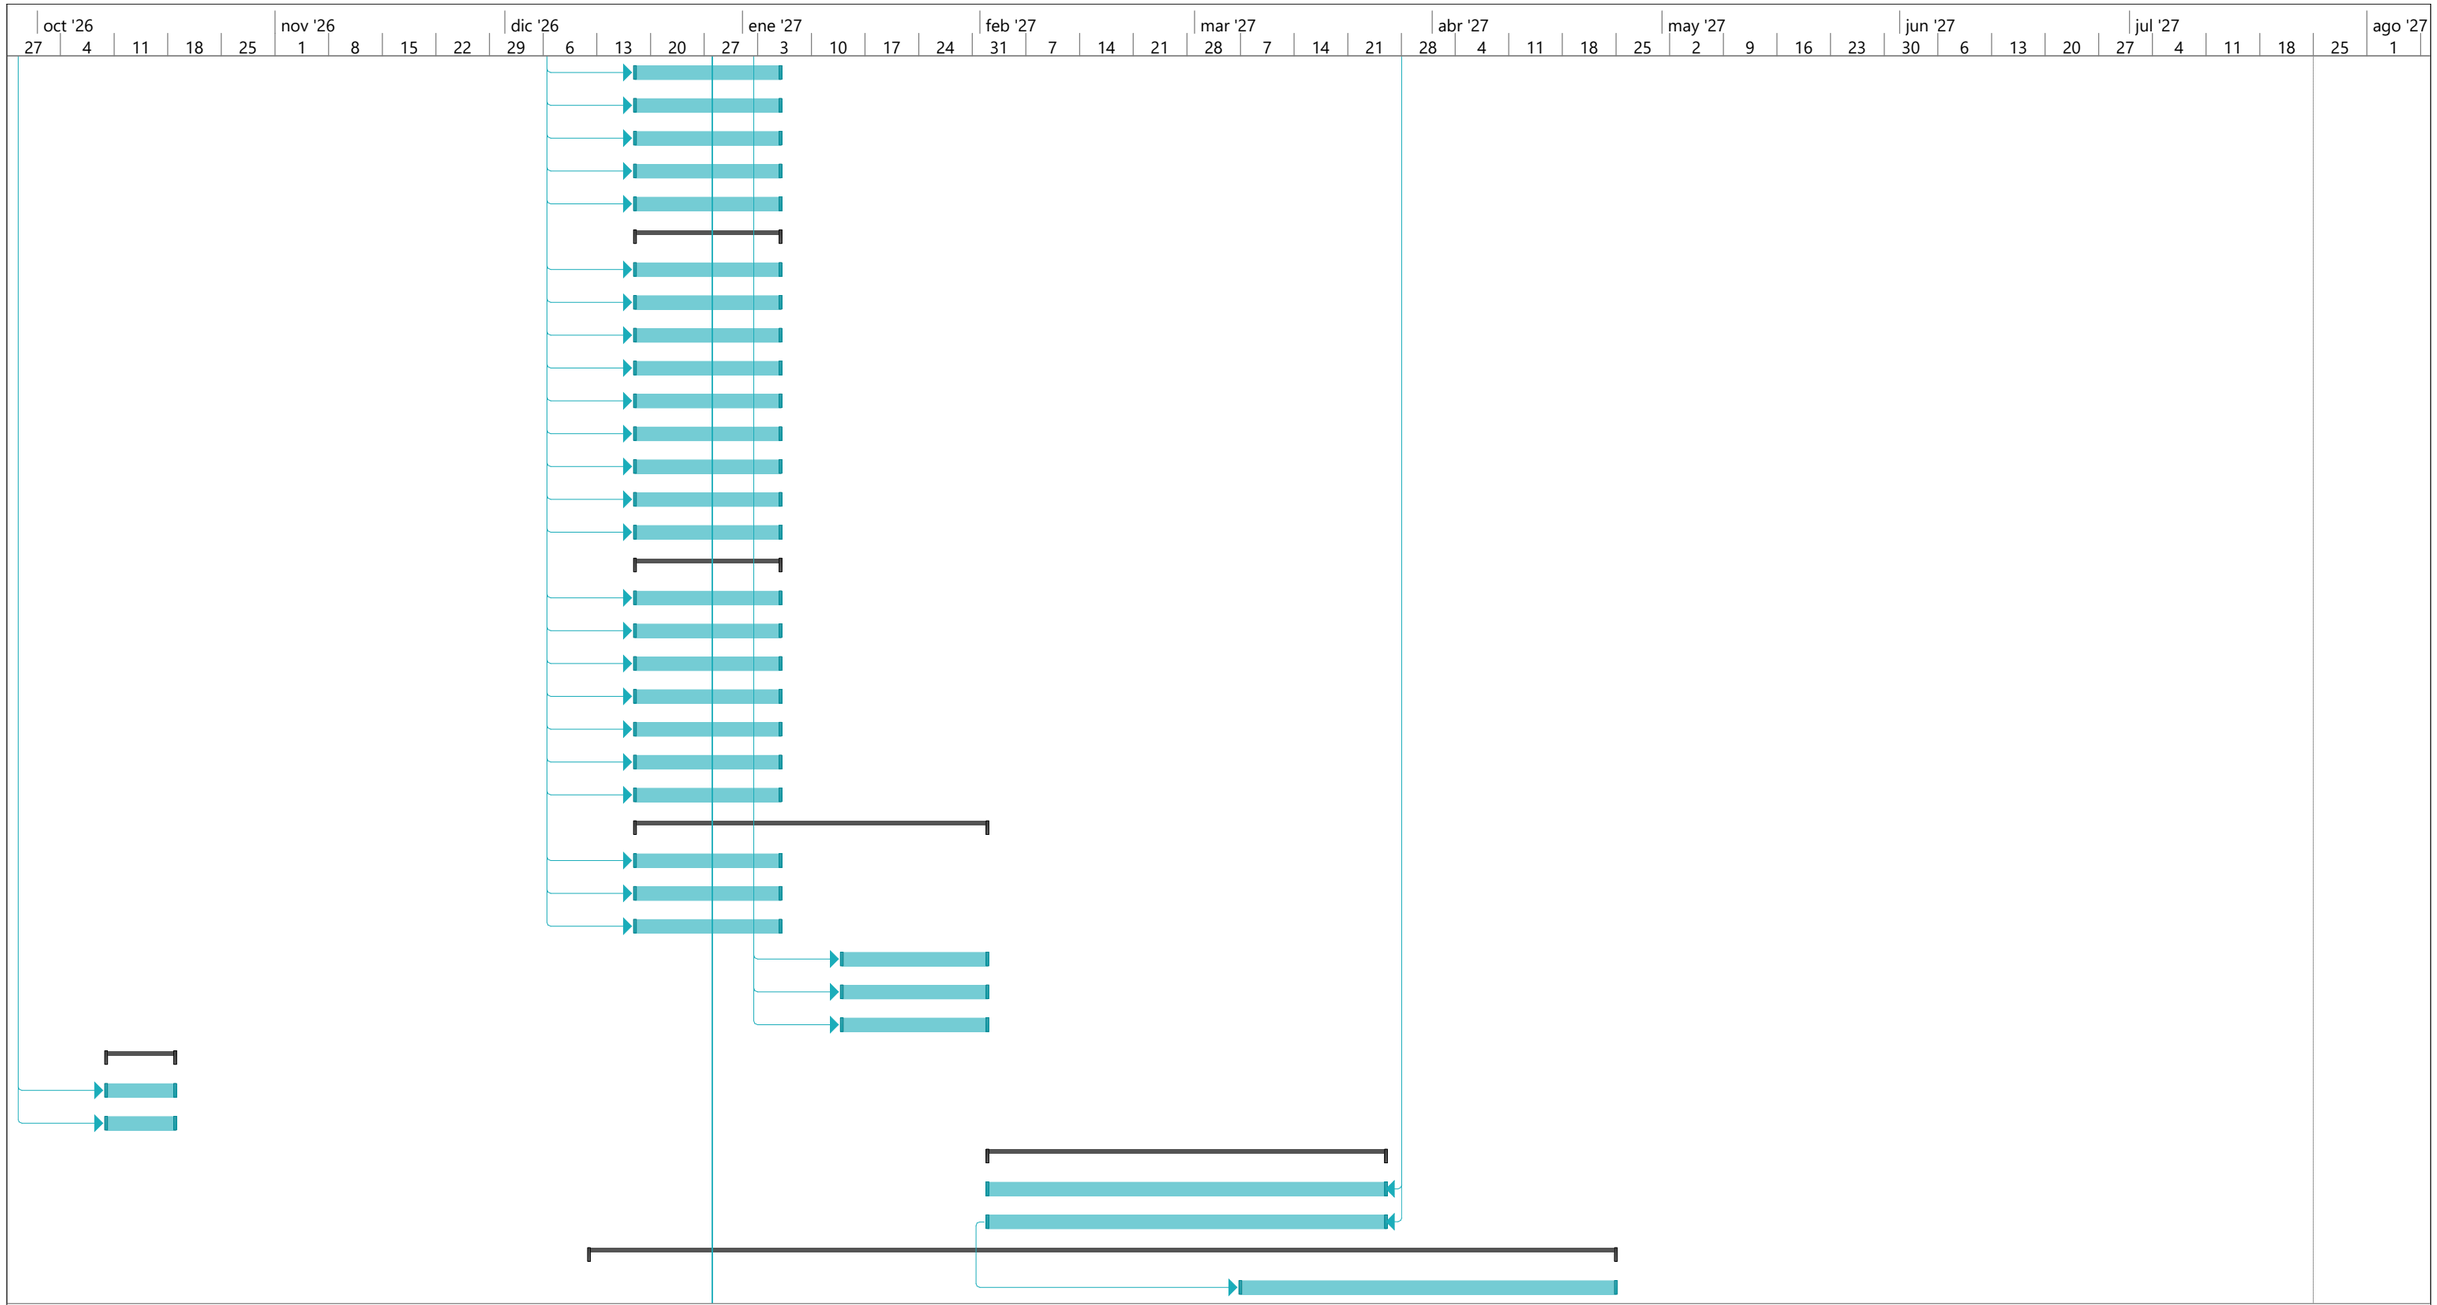

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea	Resumen del proyecto	Tarea manual	solo el comienzo	Fecha límite
División	Tarea inactiva	solo duración	solo fin	Progreso
Hito	Hito inactivo	Informe de resumen manual	Tareas externas	Progreso manual
Resumen	Resumen inactivo	Resumen manual	Hito externo	

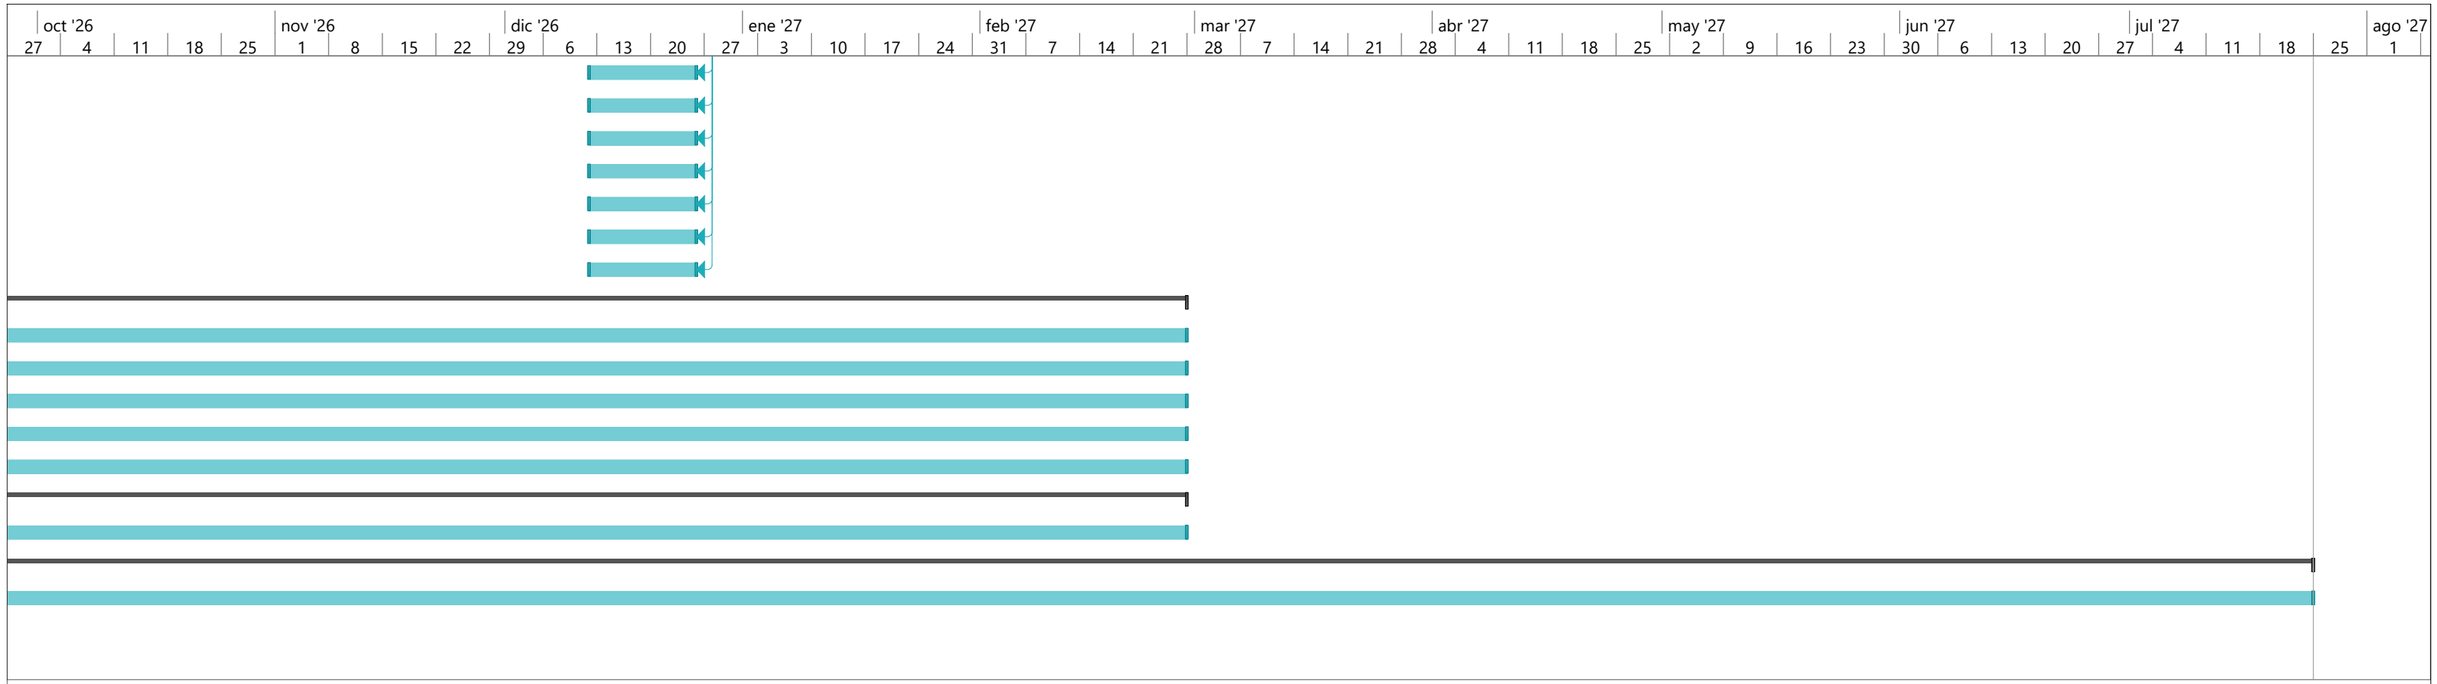

Proyecto: planos
Fecha: lun 11/05/26

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			
