**INFORME DE EJECUCIÓN DE AVANCE DE INTERVENTORIA DEL 21 DE MARZO DEL 2024 AL 30 DE ABRIL DEL 2024**

**PROYECTO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIARA, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LIC 1032-2023, CUYO OBJETO ES: "ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO- ABARCO-PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".**

## 1. ANTECEDENTES

### 1.1. GENERALIDADES

A partir de uno de los objetivos del Plan de Acción del Plan de Zonificación Ambiental: Orientar alternativas productivas equilibradas entre el medio ambiente, el bienestar y buen vivir de la población que ocupa y/o que colinda con las Áreas de Especial Interés Ambiental - AEIA en las subregiones y municipios PDET y con base en la zonificación ambiental a escala 1:100.000 (Base técnica del PZA) y en la zonificación de conflictos de uso del suelo en la jurisdicción de CORPONOR (PGAR 2016 – 2035), se implementarán 25 parcelas de una (1) hectárea cada una en modelo agroforestal (cacao – abarco – plátano) como proyectos productivos alternativos y sostenibles con comunidades rurales del Corregimiento de La Gabarra, Municipio de Tibú, Departamento Norte de Santander, con el fin de promover el cierre y estabilización de la frontera agrícola y la protección efectiva de las AEIA.

### 1.2 ALCANCES DEL PROYECTO

El objetivo principal de este proyecto es el establecimiento de 25 parcelas de una (1) hectárea con el fin de desarrollar modelo agroforestal (Cacao –abarco – plátano) como proyectos productivos alternativos y sostenibles con comunidades rurales del Corregimiento de La Gabarra, Municipio de Tibú, Departamento Norte de Santander, con el fin de promover el cierre y estabilización de la frontera agrícola y la protección efectiva de las AEIA.

El sistema agroforestal implica la asociación en el tiempo y el espacio de dos o más especies en una misma área, siendo por lo menos, una de ellas leñosa perenne y caracterizada por la ocurrencia de interacciones ecológicas y económicas entre sus componentes (FEDECACAO, 2012).

De acuerdo con FEDECACAO (2012), existen diversos tipos de sistemas agroforestales con cacao, sin embargo, para el desarrollo de este proyecto se plantea un sistema transitorio simple, el cual consiste en el establecimiento de los árboles de cacao jóvenes bajo un sistema de sombreamiento transitorio (plátano), el cual le da protección al cultivo hasta que crecen los árboles de sombrío permanente. Las plantas de protección temporal

(plátano) son eliminadas progresivamente a medida que los árboles de cacao requieren más luz.

Teniendo en cuenta la información conceptual de lo que se considera un sistema agroforestal transitorio simple, en la siguiente tabla, se presenta la información referente al modelo propuesto, por hectárea, para el desarrollo del proyecto productivo. El proyecto implica el establecimiento de un sistema agroforestal Cacao + Plátano + Maderables.

| **Ítem** | **Sombrío transitorio (plátano)** | **Cacao** | **Sombrío permanente (maderable)** |
|---|---|---|---|
| Material | Hartón o Dominico Hartón | Clones | Varios (nativos) |
| Distancia de siembra(m) | 3 x 3 (aproximado) | 3 x 3 (aproximado) | 15 metros entre hilerasx 4 metros entre plantas (aproximado) |
| Población por hectárea | 1000 | 1000 | 160 |
| Horizonte de producción | Tres ciclos | 30 años | 15 años (promedio) |

**Fuente:** FEDECACAO (2012), ajustado de acuerdo con información de ASOPROCANOR

Es de resaltar que, las distancias de siembra y el trazado pueden ser ajustados de acuerdo con las condiciones del terreno (plano, ladera), de la realidad particular de la zona y de cada predio, de las recomendaciones del profesional encargado del desarrollo de las actividades agronómicas, de las preferencias del agricultor (experiencia), recomendaciones de FEDECACAO, ASOPROCANOR, entre otras.

## 1.3 LOCALIZACION DEL PROYECTO




Localización corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú en Norte de Santander

Coordenadas: 9°00′01″N 72°53′49″O


## 1.4 POBLACION BENEFICIADA

25 beneficiarios de la Asociación de Cacaoteros del Catatumbo ASOCADELCAT del corregimiento la gabarra del municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander, que se describen a continuación:

| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | VEREDA | FINCA | COORDENADAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ESTE | NORTE |
| 1 | BLANCA YANETH ALBARRACIN | CUERVOS | LOS ORTEGAS | 5.008.027 | 2.549.803 |
| 2 | LUIS TORRES RODRIGUEZ | CAÑO GUADUA | LA PONDEROSA | 5.006.379 | 2.551.399 |
| 3 | TERESA ROBLES MARTINEZ | CAÑO GUADUA | VISTA HERMOSA | 5.008.637 | 2.550.785 |
| 4 | KAREN DAYANA CARRILLO | CAÑO GUADUA | EL PORVENIR | 5.008.240 | 2.551.921 |
| 5 | YOLEYDIS MORALES TAFUR | CAÑO GUADUA | LA CAMELIA | 5.006.470 | 2.550.539 |
| 6 | MARILSE DELGADO LEON | CAÑO GUADUA | EL SILENCIO | 5.008.698 | 2.550.755 |
| 7 | NEREIDA PEREZ CONTRERAS | CAÑO GUADUA | LA COLMENA | 5.007.050 | 2.551.890 |
| 8 | ARACELY CONTRERAS CANONIGO | CAÑO GUADUA | EL CEDRAL | 5.006.714 | 2.551.737 |
| 9 | ROSA AMELIA BAUTISTA DURAN | CAÑO GUADUA | LA POSA | 5.006.531 | 2.552.443 |
| 10 | SULEIMA DURAN CONTRERAS | CAÑO GUADUA | VILLA MORA | 5.006.470 | 2.551.368 |
| 11 | YOVANNA ZAPATA ARBOLEDA | CAÑO GUADUA | LEON | 5.003.998 | 2.552.995 |
| 12 | CARLOS ALFONSO RODRIGUEZ M. | CAÑO GUADUA | TRES VIENTOS | 5.005.707 | 2.554.070 |
| 13 | JUAN PABLO GALVIS ANGARITA | CAÑO GUADUA | LOS LIMONES | 5.004.822 | 2.553.916 |
| 14 | ELIAS DAVID CABRERA MENDOZA | CAÑO GUADUA | EL DIVISO | 5.006.440 | 2.552.934 |
| 15 | JOSE JOAQUIN SILVA | CAÑO GUADUA | PRADO VERDE | 5.005.005 | 2.551.000 |
| 16 | VICTOR JULIO FUENTES ARDILA | CHORRO DE LOS GALVIS | ESPERANZA | 5.004.029 | 2.549.219 |
| 17 | ANA EMILIA HEREDIA AGUAS | NUEVO HORIZONTE | LA ESPERANZA | 5.007.814 | 2.545.689 |
| 18 | VICENTE ARIZA | NUEVO HORIZONTE | LA FORTUNA | 5.007.662 | 2.545.720 |
| 19 | ELIAS MANOSALVA LASSO | NUEVO HORIZONTE | LAS MARÍAS | 5.008.211 | 2.544.861 |
| 20 | JOSE NAHUN QUINTERO CHONA | NUEVO HORIZONTE | BELLA LUZ | 5.007.845 | 2.542.865 |

| ITEM | NOMBRES Y APELLIDOS | VEREDA | FINCA | COORDENADAS ESTE | NORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | HERNAN VILLAMIZAR PINTO | EL SILENCIO | EL CEDRAL | 5.003.083 | 2.541.023 |
| 22 | DANIEL MONTOYA REYES | BARRANCAS | LA PALMA | 5.002.870 | 2.540.439 |
| 23 | ALEXIS ORTEGA ACEVEDO | SAN JOSÉ | LA VEGUITA | 5.011.444 | 2.555.115 |
| 24 | FIDELINA ACEVEDO ESPINEL | SAN JOSÉ | LA PISCINA | 5.011.017 | 2.554.930 |
| 25 | PEDRO JOSIAS BUITRAGO MORA | TROCHA GANADERA | LA PRADERA | 5.017.181 | 2.555.270 |

**DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS PREDIOS BENEFICIARIOS**

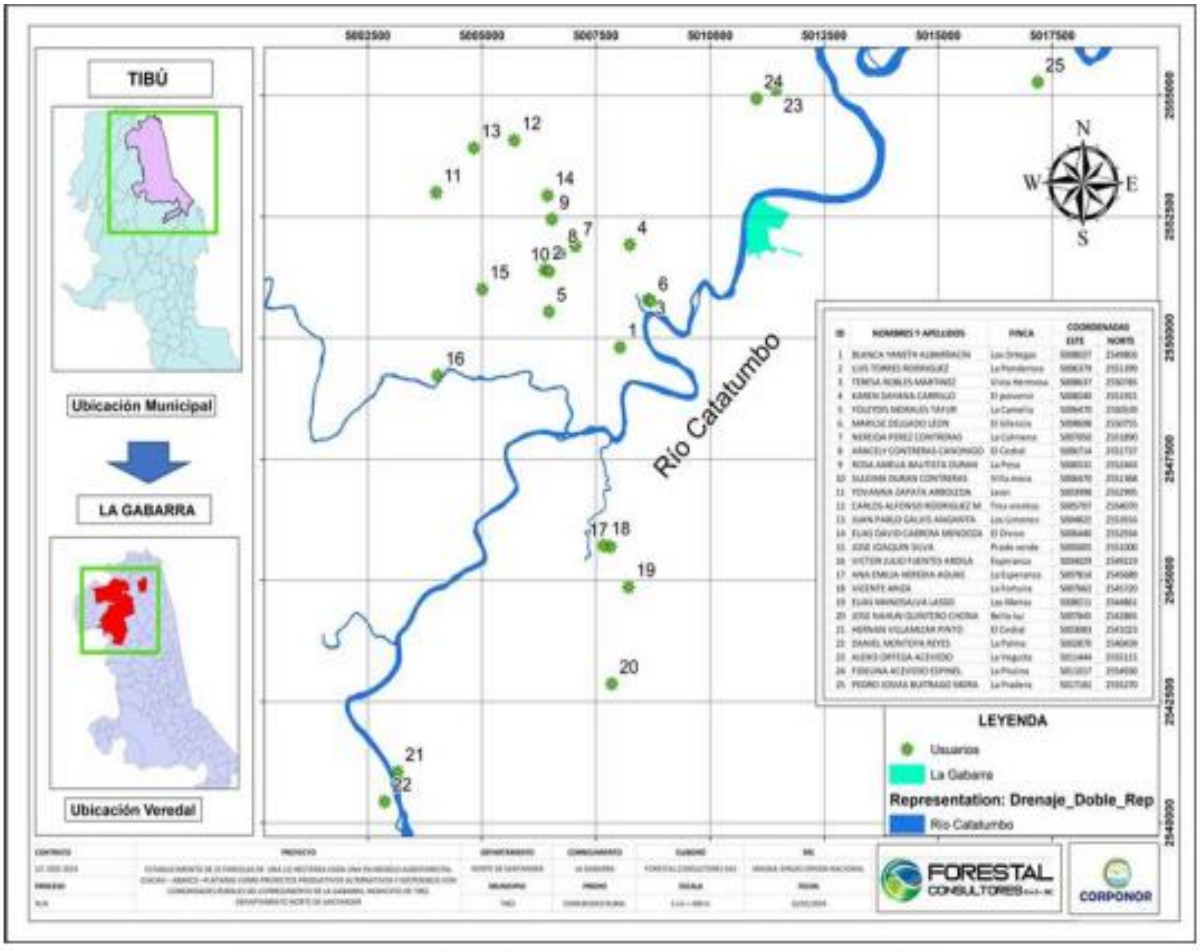


**Fuente: Forestal Consultores SAS BIC, 2024**

En el informe de obra dentro de sus anexos se hace la entrega de la geodatabase, de los puntos de predios intervenidos con el proyecto.

## 2. CONDICIONES CONTRACTUALES

### 2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA No. LIC 1032-2023

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | LICITACIÓN PUBLICA |
| **TIPO DE CONTRATO** | OBRA PUBLICA |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 07/12/2023 |
| No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA | 1749 DEL 07 DE DICIEMBRE 2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE | CORPONOR |
| CONTRATISTA | FORESTAL CONSULTORES S.A.S. R/L JOSE ALEXANDER SALAZAR GOYENECHE |
| OBJETO | ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO – ABARCO – PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER |
| VALOR DEL CONTRATO | SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS<br>$ 674.357,825,00 |
| VALOR ADICIONAL | $ 0,00 |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO** | $ 674.357,825,00 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 18 DIAS |
| PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL | 4 MESES |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL** | 4 MESES Y 18 DIAS |
| FECHA DE INICIO | 14/12/2023 |
| FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN | 30/04/2024 |

## 2.2. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 1052 -2023

| | |
|---|---|
| **MODALIDAD DE CONTRATACIÓN** | CONCURSO DE MÉRITO ABIERTO |
| **TIPO DE CONTRATO** | INTERVENTORÍA |
| FECHA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO | 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL Y FECHA | 1752 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| ENTIDAD CONTRATANTE | CORPONOR |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 |
| OBJETO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, AL CONTRATODEOBRARESULTANTEDE LA LICITACION PUBLICA N° LIC1032-2023, CUYOOBJETOES: ESTABLECIMIENTODE 25 PARCELASDEUNA (1) HECTÁREACADA UNA EN MODELOAGROFORESTAL (CACAO - ABARCO- PLÁTANO) COMOPROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLESCON COMUNIDADES RURALESDEL CORREGIMIENTODE LA GABARRA, MUNICIPIODE TIBÚ, DEPARTAMENTONORTEDE SANTANDER. |
| VALOR DEL CONTRATO | CUARENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS<br>$ 40.550.661 |
| VALOR ADICIONAL | N/A |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO** | 40.550.661 |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL | 18 DIAS |
| PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL | 4 MESES |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL** | 4 MESES Y 18 DIAS |
| FECHA DE INICIO | 14 DE DICIEMBRE DE 2023 |
| FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN | 30 DE ABRIL DE 2024 |

## 2.3 PLAZO CONTRACTUAL

Con relación al plazo contractual, es de dieciocho (18) días, más cuatro (4) meses adicionales para un total de 4 meses y 18 días.

## 2.4 RELACIÓN DE POLIZAS

### 2.4.1 RELACIÓN DE POLIZAS SUSCRITAS INICIALES

### 2.4.1.1 RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

| CONTRATO DE OBRA No. LIC 1032-2023 | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | **POLIZA No.:** | 49-44-101032606 ANEXO 0 |
| **FECHA DE EXPEDICION:** | 12/12/2023 | **FECHA DE APROBACION:** | 12/12/2023 |
| **NOMBRE DEL AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA** |
| CUMPLIMIENTO | 11/12/2023 | 30/04/2024 | $ 67.917.768.80 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 11/12/2023 | 31/12/2026 | $ 33.958.884.40 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 11/12/2023 | 30/06/2024 | $ 67.917.768.80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | **POLIZA No.:** | 49-40-101010339 ANEXO 0 |
| **FECHA DE EXPEDICION:** | 12/12/2023 | **FECHA DE APROBACION:** | 12/12/2023 |
| **NOMBRE DEL AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA** |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 11/12/2023 | 31/12/2023 | $ 580.000.000.00 |

### 2.4.1.2 RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 1052 -2023 | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** | SOLIDARIA DE COLOMBIA | **POLIZA No.:** | 460-47- 994000070271 ANEXO. 0 |
| **FECHA DE EXPEDICION:** | 12/12/2023 | **FECHA DE APROBACION:** | 12/12/2023 |
| **NOMBRE DEL AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA** |
| CUMPLIMIENTO | 12/12/2023 | 30/04/2024 | 4,055,066.10 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 12/12/2023 | 31/12/2026 | 2,027,533.05 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 31/12/2023 | 31/12/2028 | 4,055,066.10 |

**Anexo** *de pólizas iniciales contrato de interventoría.*

### 2.4.2 RELACIÓN DE POLIZAS SUSCRITAS POR MODIFICACIONES Y SUSPENSIONES

### 2.4.2.1 RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE OBRA

| CONTRATO DE OBRA No. LIC 1032-2023 | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | **POLIZA No.:** | 49-44-101032606 ANEXO. 1 |
| **FECHA DE EXPEDICION:** | 29/12/2023 | **FECHA DE APROBACION:** | 29/12/2023 |
| **NOMBRE DEL AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA** |
| CUMPLIMIENTO | 11/12/2023 | 30/08/2024 | 67.917.768.80 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 11/12/2023 | 30/04/2027 | 33.958.884.40 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 11/12/2023 | 30/10/2024 | 67.917.768.80 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. | **POLIZA No.:** | 49-40-101010339 ANEXO.1 |
| **FECHA DE EXPEDICION:** | 29/12/2023 | **FECHA DE APROBACION:** | 29/12/2023 |
| **NOMBRE DEL AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA** |
| PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 11/12/2023 | 30/04/2024 | $580.000.000.00 |

### 2.4.2.2 RELACION DE POLIZAS CONTRATO DE INTERVENTORIA

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 1052 -2023 | | | |
|---|---|---|---|
| **ASEGURADORA:** | SOLIDARIA DE COLOMBIA | **POLIZA No.:** | 460-47- 994000070271 ANEXO. 1 |
| **FECHA DE EXPEDICION:** | 27/12/2023 | **FECHA DE APROBACION:** | 27/12/2023 |
| **NOMBRE DEL AMPARO** | **VIGENCIA DESDE** | **VIGENCIA HASTA** | **SUMA ASEGURADA** |
| CUMPLIMIENTO | 14/12/2023 | 30/08/2024 | 4,055,066.10 |
| PRESTACIONES SOCIALES | 14/12/2023 | 30/04/2027 | 2,027,533.05 |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA | 30/04/2024 | 30/04/2029 | 4,055,066.10 |

**Anexo** *de pólizas actualizadas del contrato de interventoría*

## 2.5 SEGUIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES DEL PROYECTO

Las actividades cantidades de obra a desarrollas según contratos:

| CONTRATO INICIAL | | | | | | TOTAL CONTRATADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **VALOR UNITARIO ($)** | **VALOR ($)** | **CANT** | **VALOR ($)** |
| **1** | **Diagnóstico y Acuerdo de Conservación** | | | | | | |
| | Costos de diagnóstico y firma de acuerdo de conservación (incluye realizar una caracterización socioeconómica; descripción físico-biótica del área) | Unidad | 25 | $ 632.586,00 | $ 15.814.650,00 | 25 | $ 15.814.650,00 |
| **2** | **Mano de obra** | | | | | | |
| **2.1** | **Adecuación del lote** | | | | | | |
| | Preparación terreno | Jornal | 450 | $ 86.394,00 | $ 38.877.300,00 | 450 | $ 38.877.300,00 |
| | Construcción de canales | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | 75 | $ 6.479.550,00 |
| **2.2** | **Establecimiento de sombrío (Plátano y maderables)** | | | | | | |
| | Trazado de líneas de sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | 75 | $ 6.479.550,00 |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | 200 | $ 17.278.800,00 |
| | Acarreo siembra sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | 75 | $ 6.479.550,00 |
| | Desinfección de colinos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | 75 | $ 6.479.550,00 |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 150 | $ 86.394,00 | $ 12.959.100,00 | 150 | $ 12.959.100,00 |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | 100 | $ 8.639.400,00 |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | 50 | $ 4.319.700,00 |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | 50 | $ 4.319.700,00 |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | 75 | $ 6.479.550,00 |
| **2.3** | **Establecimiento de cacao** | | | | | | |

| CONTRATO INICIAL | | | | | | TOTAL CONTRATADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO ($) | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) |
| | Trazado | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | 75 | $ 6.479.550,00 |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | 200 | $ 17.278.800,00 |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | 75 | $ 6.479.550,00 |
| | Acarreo siembra cacao | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | 100 | $ 8.639.400,00 |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | 200 | $ 17.278.800,00 |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | 100 | $ 8.639.400,00 |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | 50 | $ 4.319.700,00 |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 25 | $ 86.394,00 | $ 2.159.850,00 | 25 | $ 2.159.850,00 |
| | Otras labores | | | | | | |
| | Manejo del sombrío | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | 50 | $ 4.319.700,00 |
| | Mantenimiento drenajes | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | 50 | $ 4.319.700,00 |
| **2.4** | **Insumos** | | | | | | |
| | Semilla plátano (Colino de 1 kg) | Unidad | 30.000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | 30.000 | $ 90.000.000,00 |
| | Plántulas maderables (35 cm de altura y bolsa forestal de 4x8 pulgadas) | Unidad | 4000 | $ 2.800,00 | $ 11.200.000,00 | 4000 | $ 11.200.000,00 |
| | Plántulas de Cacao (30 cm de altura min, Bolsa 5x12 pulgadas calibre 2) | Unidad | 30.000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | 30.000 | $ 90.000.000,00 |
| | Materia Orgánica Enriquecida | Kilo | 30.000 | $ 800,00 | $ 24.000.000,00 | 30.000 | $ 24.000.000,00 |
| | Urea | Kilo | 2500 | $ 4.600,00 | $ 11.500.000,00 | 2500 | $ 11.500.000,00 |
| | Fertilizante compuesto | Kilo | 3750 | $ 4.500,00 | $ 16.875.000,00 | 3750 | $ 16.875.000,00 |
| | Correctivo | Kilo | 5000 | $ 600,00 | $ 3.000.000,00 | 5000 | $ 3.000.000,00 |

| CONTRATO INICIAL | | | | | | TOTAL CONTRATADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO ($) | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) |
| | Fungicida | Kilo | 75 | $ 45.000,00 | $ 3.375.000,00 | 75 | $ 3.375.000,00 |
| | Insecticidas | Kilo | 50 | $ 56.000,00 | $ 2.800.000,00 | 50 | $ 2.800.000,00 |
| | Herbicidas | Litro | 50 | $ 65.000,00 | $ 3.250.000,00 | 50 | $ 3.250.000,00 |
| | Hidroretenedor | Kilo | 125 | $ 52.000,00 | $ 6.500.000,00 | 125 | $ 6.500.000,00 |
| | Análisis suelos | Unidad | 25 | $ 155.000,00 | $ 3.875.000,00 | 25 | $ 3.875.000,00 |
| | Kit de Fertilización Organica (Caneca de 200 Lt con tapa, Cal hidratada, Melaza, Sulfatos de cobre, Magnesio y Zinc, Borax, Harina de Pescado y de Hueso) | Unidad | 25 | $ 620.000,00 | $ 15.500.000,00 | 25 | $ 15.500.000,00 |
| **2.5** | **Herramientas** | | | | | | |
| | Machete | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | 25 | $ 1.125.000,00 |
| | Limas | Unidad | 25 | $ 7.000,00 | $ 175.000,00 | 25 | $ 175.000,00 |
| | Azadón | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | 25 | $ 800.000,00 |
| | Barra Agricola | Unidad | 25 | $ 80.000,00 | $ 2.000.000,00 | 25 | $ 2.000.000,00 |
| | Pala | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | 25 | $ 1.125.000,00 |
| | Tijera de podar de 9" | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | 25 | $ 800.000,00 |
| | Palín | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | 25 | $ 1.125.000,00 |
| | Bomba de espalda de 20 Lt | Unidad | 25 | $ 400.000,00 | $ 10.000.000,00 | 25 | $ 10.000.000,00 |
| **2.6** | **Transporte** | | | | | | |
| | Fletes y transporte Terrestre (incluye transporte menor fluvial y mular si aplica) 5% | Global | 25 | $ 563.750,00 | $ 14.093.750,00 | 25 | $ 14.093.750,00 |

| CONTRATO INICIAL | | | | | | TOTAL CONTRATADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ITEM** | **DESCRIPCION** | **UND** | **CANT** | **VALOR UNITARIO ($)** | **VALOR ($)** | **CANT** | **VALOR ($)** |
| | del costo de los insumos | | | | | | |
| **2.7** | **Asistencia técnica** | | | | | | |
| | Asistencia técnica | Global | 25 | $ 482.502,00 | $ 12.062.550,00 | 25 | $ 12.062.550,00 |
| **TOTAL, COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 539.702.150,00** | | **$ 539.702.150,00** |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 18% | $ 97.146.375,00 | | $ 97.146.375,00 |
| IMPREVISTOS | | | | 1% | $ 5.397.025,00 | | $ 5.397.025,00 |
| UTILIDADES | | | | 5% | $ 26.985.100,00 | | $ 26.985.100,00 |
| IVA sobre utilidad | | | | 19% | $ 5.127.175,00 | | $ 5.127.175,00 |
| **TOTAL COSTOS INDIRECTOS** | | | | | **$ 134.655.675,00** | | **$ 134.655.675,00** |
| **VALOR TOTAL OBRA** | | | | | **$ 674.357.825,00** | | **$ 674.357.825,00** |
| **INTERVENTORIA** | | | | | **$ 40.550.661,00** | | **$ 40.550.661,00** |
| **TOTAL PROYECTO** | | | | | **$ 714.908.486,00** | | **$ 714.908.486,00** |

### 2.5.1 ACTAS SUSCRITAS

| ***DESCRIPCION*** | ***FECHA*** |
|---|---|
| ***CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 1052 -2023*** | |
| *ACTA DE INICIO* | 14/12/2023 |
| *ACTA DE COMITÉ No. 1* | 21/12/2023 |
| *ACTA DE COMITÉ No. 2* | 27/12/2023 |
| *INFORME DE AVENCE No. 01* | 17/01/2024 |
| *INFORME DE AVENCE No. 02* | 22/03/2024 |
| *ACTA PARCIAL No. 1* | 23/04/2024 |

**Anexo.** *Actas suscritas en el periodo del informe (Comités, suspensión y reinicio)*

## 3 CUMPLIMIENTO DE TIEMPOS DE EJECUCION

Con relación al plazo contractual, han transcurrido ciento treinta y nueve (139) días calendario desde la suscripción del acta de inicio.
Cumplimiento de los tiempos de ejecución: 100%

# 4 CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA

**ANEXO 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y FLUJO DE FONDOS**

MPA-01-F-33, 16/08/2022

FORESTAL CONSULTORES SAS

| CONTRATO DE OBRA No. 1032 DEL 2023 Del 7 DICIEMBRE DE 2023 | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1052 DEL 2023 DEL 12 DE DICIMEBRE DE 2023 | PERIODO REPORTADO | |
|---|---|---|---|
| PROYECTO: | ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO – ABARCO – PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA,MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | DESDE: | 21/03/2024 |
| CONTRATISTA: FORESTAL CONSULTORES S.A.S. | SUPERVISOR DE OBRA: VICTOR MANUEL LOPEZ QUINTERO / SUPERVISOR: SANDRA MILENA GOMEZ PEÑARANDA / INTERVENTOR: UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 / INFORME No. 3 | HASTA: | 30/04/2024 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | V. UNITARIO | VALOR TOTAL | Corte # 1 14/12/23 - 13/1/24 | | | Corte # 2 14/1/24 - 20/3/24 | | | Corte # 3 21/3/24 - 30/4/24 | | | ACUMULADO | | | PORCENTAJE EJECUTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DIAS | CANT | V. TOTAL | DIAS | CANT | V. TOTAL | DIAS | CANT | V. TOTAL | DIAS | CANT | V. TOTAL | |
| 1 | **Diagnóstico y Acuerdo de Conservación** | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| 1.1 | Costos de diagnóstico y firma de acuerdo de conservación (incluye realizar una caracterización socioeconómica; descripción físico-biótica del área) | und | 25 | $ 632.586,00 | $ 15.814.650,00 | 18 | 25 | $ 15.814.650,00 | | | $ - | | | $ - | 18 | 25 | $ 15.814.650,00 | 100% |
| | | | | | | 18 | 25 | $ 15.814.650,00 | | | $ - | | | $ - | 18 | 25 | $ 15.814.650,00 | |
| 2 | **Mano de obra** | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| 2.1 | **Adecuación del lote** | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| | Preparación terreno | Jornal | 450 | $ 86.394,00 | $ 38.877.300,00 | 12 | 300 | $ 25.918.200,00 | 6 | 150 | $ 12.959.100,00 | | | $ - | 18 | 450 | $ 38.877.300,00 | 100% |
| | | | | | | 6 | 126 | $ 10.885.644,00 | 13 | 324 | $ 27.991.656,00 | | | $ - | 19 | 450 | $ 38.877.300,00 | |
| | Construcción de canales | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | 12 | 36 | $ 3.110.184,00 | 13 | 39 | $ 3.369.366,00 | | | $ - | 25 | 75 | $ 6.479.550,00 | 100% |
| | | | | | | 7 | 21 | $ 1.814.274,00 | 27 | 54 | $ 4.665.276,00 | | | $ - | 34 | 75 | $ 6.479.550,00 | |
| 2.2 | **Establecimiento de sombrío (Plátano y maderables)** | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| | Trazado de líneas de sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | $ - | 7 | 75 | $ 6.479.550,00 | | | $ - | 7 | 75 | $ 6.479.550,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 7 | 75 | $ 6.479.550,00 | | | $ - | 7 | 75 | $ 6.479.550,00 | |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | $ - | 7 | 200 | $ 17.278.800,00 | | | $ - | 7 | 200 | $ 17.278.800,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 7 | 200 | $ 17.278.800,00 | | | $ - | 7 | 200 | $ 17.278.800,00 | |
| | Acarreo siembra sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | $ - | 7 | 75 | $ 6.479.550,00 | | | $ - | 7 | 75 | $ 6.479.550,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 7 | 63 | $ 5.442.822,00 | 2 | 12 | $ 1.036.728,00 | 9 | 75 | $ 6.479.550,00 | |
| | Desinfección de colinos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | $ - | 7 | 75 | $ 6.479.550,00 | | | $ - | 7 | 75 | $ 6.479.550,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 7 | 75 | $ 6.479.550,00 | | | $ - | 7 | 75 | $ 6.479.550,00 | |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 150 | $ 86.394,00 | $ 12.959.100,00 | | | $ - | 15 | 150 | $ 12.959.100,00 | | | $ - | 15 | 150 | $ 12.959.100,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 15 | 100 | $ 8.639.400,00 | 7 | 50 | $ 4.319.700,00 | 22 | 150 | $ 12.959.100,00 | |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | $ - | 20 | 100 | $ 8.639.400,00 | | | $ - | 20 | 100 | $ 8.639.400,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 20 | 100 | $ 8.639.400,00 | 20 | 100 | $ 8.639.400,00 | |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | $ - | 19 | 30 | $ 2.591.820,00 | 8 | 20 | $ 1.727.880,00 | 27 | 50 | $ 4.319.700,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 20 | 50 | $ 4.319.700,00 | 20 | 50 | $ 4.319.700,00 | |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | $ - | | | $ - | 20 | 50 | $ 4.319.700,00 | 20 | 50 | $ 4.319.700,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 22 | 50 | $ 4.319.700,00 | 22 | 50 | $ 4.319.700,00 | |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | $ - | | | $ - | 40 | 75 | $ 6.479.550,00 | 40 | 75 | $ 6.479.550,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 40 | 75 | $ 6.479.550,00 | 40 | 75 | $ 6.479.550,00 | |
| 2.3 | **Establecimiento de cacao** | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| | Trazado | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | $ - | 19 | 45 | $ 3.887.730,00 | 8 | 30 | $ 2.591.820,00 | 27 | 75 | $ 6.479.550,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 27 | 75 | $ 6.479.550,00 | 27 | 75 | $ 6.479.550,00 | |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | $ - | 19 | 120 | $ 10.367.280,00 | 8 | 80 | $ 6.911.520,00 | 27 | 200 | $ 17.278.800,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 25 | 200 | $ 17.278.800,00 | 25 | 200 | $ 17.278.800,00 | |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | $ - | 19 | 45 | $ 3.887.730,00 | 8 | 30 | $ 2.591.820,00 | 27 | 75 | $ 6.479.550,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 25 | 75 | $ 6.479.550,00 | 25 | 75 | $ 6.479.550,00 | |
| | Acarreo siembra cacao | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | $ - | 19 | 60 | $ 5.183.640,00 | 8 | 40 | $ 3.455.760,00 | 27 | 100 | $ 8.639.400,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 25 | 100 | $ 8.639.400,00 | 25 | 100 | $ 8.639.400,00 | |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | $ - | 19 | 120 | $ 10.367.280,00 | 8 | 80 | $ 6.911.520,00 | 27 | 200 | $ 17.278.800,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 25 | 200 | $ 17.278.800,00 | 25 | 200 | $ 17.278.800,00 | |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | $ - | | | $ - | 15 | 100 | $ 8.639.400,00 | 15 | 100 | $ 8.639.400,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 15 | 100 | $ 8.639.400,00 | 15 | 100 | $ 8.639.400,00 | |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | $ - | | | $ - | 25 | 50 | $ 4.319.700,00 | 25 | 50 | $ 4.319.700,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 25 | 50 | $ 4.319.700,00 | 25 | 50 | $ 4.319.700,00 | |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 25 | $ 86.394,00 | $ 2.159.850,00 | | | $ - | | | $ - | 25 | 25 | $ 2.159.850,00 | 25 | 25 | $ 2.159.850,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 25 | 25 | $ 2.159.850,00 | 25 | 25 | $ 2.159.850,00 | |
| | **Otras labores** | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | |
| | Manejo del sombrío | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | $ - | | | $ - | 25 | 50 | $ 4.319.700,00 | 25 | 50 | $ 4.319.700,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 25 | 50 | $ 4.319.700,00 | 25 | 50 | $ 4.319.700,00 | |
| | Mantenimiento drenajes | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | $ - | | | $ - | 25 | 50 | $ 4.319.700,00 | 25 | 50 | $ 4.319.700,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 25 | 50 | $ 4.319.700,00 | 25 | 50 | $ 4.319.700,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4** | **Insumos** | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | |
| | | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | |
| | Semilla plátano (Colino de 1 kg) | Unidad | 30000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | 30 | 30000 | $ 90.000.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 90.000.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 25000 | $ 75.000.000,00 | 5 | 5000 | $ 15.000.000,00 | 35 | 30000 | $ 90.000.000,00 | | |
| | Plántulas maderables (35 cm de altura y bolsa forestal de 4x8 pulgadas) | Unidad | 4000 | $ 2.800,00 | $ 11.200.000,00 | 30 | 4000 | $ 11.200.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 11.200.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 4000 | $ 11.200.000,00 | | | $ - | 30 | 4000 | $ 11.200.000,00 | | |
| | Plántulas de Cacao (30 cm de altura min, Bolsa 5x12 pulgadas calibre 2) | Unidad | 30000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | 30 | 30000 | $ 90.000.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 90.000.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 30 | 30000 | $ 90.000.000,00 | 30 | 30000 | $ 90.000.000,00 | | |
| | Materia Orgánica Enriquecida | Kilo | 30000 | $ 800,00 | $ 24.000.000,00 | 30 | 30000 | $ 24.000.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 24.000.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 25000 | $ 20.000.000,00 | 5 | 5000 | $ 4.000.000,00 | 35 | 30000 | $ 24.000.000,00 | | |
| | Urea | Kilo | 2500 | $ 4.600,00 | $ 11.500.000,00 | 30 | 2500 | $ 11.500.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 11.500.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 30 | 2500 | $ 11.500.000,00 | 30 | 2500 | $ 11.500.000,00 | | |
| | Fertilizante compuesto | Kilo | 3750 | $ 4.500,00 | $ 16.875.000,00 | 30 | 3750 | $ 16.875.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 16.875.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 2500 | $ 11.250.000,00 | 10 | 1250 | $ 5.625.000,00 | 40 | 3750 | $ 16.875.000,00 | | |
| | Correctivo | Kilo | 5000 | $ 600,00 | $ 3.000.000,00 | 30 | 5000 | $ 3.000.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 3.000.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 5000 | $ 3.000.000,00 | | | $ - | 30 | 5000 | $ 3.000.000,00 | | |
| | Fungicida | Kilo | 75 | $ 45.000,00 | $ 3.375.000,00 | 30 | 75 | $ 3.375.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 3.375.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 18,75 | $ 843.750,00 | 30 | 56 | $ 2.531.250,00 | 60 | 75 | $ 3.375.000,00 | | |
| | Insecticidas | Kilo | 50 | $ 56.000,00 | $ 2.800.000,00 | 30 | 50 | $ 2.800.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 2.800.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 50 | $ 2.800.000,00 | | | $ - | 30 | 50 | $ 2.800.000,00 | | |
| | Herbicidas | Litro | 50 | $ 65.000,00 | $ 3.250.000,00 | 30 | 50 | $ 3.250.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 3.250.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 50 | $ 3.250.000,00 | | | $ - | 30 | 50 | $ 3.250.000,00 | | |
| | Hidroretenedor | Kilo | 125 | $ 52.000,00 | $ 6.500.000,00 | 30 | 125 | $ 6.500.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 6.500.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 50 | $ 2.600.000,00 | 30 | 75 | $ 3.900.000,00 | 60 | 125 | $ 6.500.000,00 | | |
| | Análisis suelos | Unidad | 25 | $ 155.000,00 | $ 3.875.000,00 | 30 | 25 | $ 3.875.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 3.875.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | 30 | 25 | $ 3.875.000,00 | 30 | 25 | $ 3.875.000,00 | | |
| | Kit de Fertilización Organica (Caneca de 200 Lt con tapa, Cal hidratada, Melaza, Sulfatos de cobre, Magnesio y Zinc, Borax, Harina de Pescado y de Hueso) | Unidad | 25 | $ 620.000,00 | $ 15.500.000,00 | 30 | 25 | $ 15.500.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 15.500.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 25 | $ 15.500.000,00 | | | $ - | 30 | 25 | $ 15.500.000,00 | | |
| **2.5** | **Herramientas** | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | |
| | Machete | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | 30 | 25 | $ 1.125.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 1.125.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 25 | $ 1.125.000,00 | | | $ - | 30 | 25 | $ 1.125.000,00 | | |
| | Limas | Unidad | 25 | $ 7.000,00 | $ 175.000,00 | 30 | 25 | $ 175.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 175.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 25 | $ 175.000,00 | | | $ - | 30 | 25 | $ 175.000,00 | | |
| | Azadón | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | 30 | 25 | $ 800.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 800.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 25 | $ 800.000,00 | | | $ - | 30 | 25 | $ 800.000,00 | | |
| | Barra Agricola | Unidad | 25 | $ 80.000,00 | $ 2.000.000,00 | 30 | 25 | $ 2.000.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 2.000.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 25 | $ 2.000.000,00 | | | $ - | 30 | 25 | $ 2.000.000,00 | | |
| | Pala | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | 30 | 25 | $ 1.125.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 1.125.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 25 | $ 1.125.000,00 | | | $ - | 30 | 25 | $ 1.125.000,00 | | |
| | Tijera de podar de 9" | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | 30 | 25 | $ 800.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 800.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 25 | $ 800.000,00 | | | $ - | 30 | 25 | $ 800.000,00 | | |
| | Palín | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | 30 | 25 | $ 1.125.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 1.125.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 25 | $ 1.125.000,00 | | | $ - | 30 | 25 | $ 1.125.000,00 | | |
| | Bomba de espalda de 20 Lt | Unidad | 25 | $ 400.000,00 | $ 10.000.000,00 | 30 | 25 | $ 10.000.000,00 | | | | $ - | | | $ - | | | $ 10.000.000,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 30 | 25 | $ 10.000.000,00 | | | $ - | 30 | 25 | $ 10.000.000,00 | | |
| 2.6 | Transporte | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | |
| | Fletes y transporte Terrestre (incluye transporte menor fluvial y mular si aplica) 5% del costo de los insumos | Global | 25 | $ 563.750,00 | $ 14.093.750,00 | 30 | 8 | $ 4.510.000,00 | 60 | 17 | $ 9.583.750,00 | | | $ - | 90 | 25 | $ 14.093.750,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 66 | 17 | $ 9.583.750,00 | 30 | 8 | $ 4.510.000,00 | 96 | 25 | $ 14.093.750,00 | | |
| 2.7 | Asistencia técnica | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | |
| | | | | | | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | | $ - | | |
| | Asistencia técnica | Global | 25 | $ 482.502,00 | $ 12.062.550,00 | 12 | 2,5 | $ 1.206.255,00 | 67 | 12,5 | $ 6.031.275,00 | 48 | 10 | $ 4.825.020,00 | 127 | 25 | $ 12.062.550,00 | 100% |
| | | | | | | | | $ - | 66 | 12,5 | $ 6.031.275,00 | 48 | 12,5 | $ 6.031.275,00 | 114 | 25 | $ 12.062.550,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTO DIRECTO CONTRATADO Y/O PROGAMADO** | | **$ 539.702.150,00** | **$ 349.584.289,00** | **$ 126.544.921,00** | **$ 63.572.940,00** | **$ 539.702.150,00** |
| ADMINISTRACIÓN | 18% | $ 97.146.375,00 | $ 62.925.164,00 | $ 22.778.083,00 | $ 11.443.128,00 | $ 97.146.375,00 |
| IMPREVISTOS | 1% | $ 5.397.025,00 | $ 3.495.845,00 | $ 1.265.450,00 | $ 635.730,00 | $ 5.397.025,00 |
| UTILIDADES | 5% | $ 26.985.100,00 | $ 17.479.209,00 | $ 6.327.244,00 | $ 3.178.646,00 | $ 26.985.100,00 |
| IVA sobre utilidad | 19% | $ 5.127.175,00 | $ 3.321.054,00 | $ 1.202.178,00 | $ 603.943,00 | $ 5.127.175,00 |
| **COSTO INDIRECTO CONTRATADO Y/O PROGAMADO** | | **$ 134.655.675,00** | **$ 87.221.272,00** | **$ 31.572.955,00** | **$ 15.861.447,00** | **$ 134.655.675,00** |
| **VALOR TOTAL CONTRATADO Y/O PROGAMADO** | | **$ 674.357.825,00** | **$ 436.805.561,00** | **$ 158.117.876,00** | **$ 79.434.387,00** | **$ 674.357.825,00** |
| **% AVANCE MENSUAL** | | | **64,8%** | **23,5%** | **11,8%** | **100,0%** |
| **% AVANCE ACUMULADO** | | | **64,8%** | **88,2%** | **100,0%** | |

PROGRAMADO MES 1 | PROGRAMADO MES 2 | PROGRAMADO MES 3 | PROGRAMADO ACUMULADO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **COSTO DIRECTO EJECUTADO** | | | **$ 28.514.568,00** | **$ 255.185.829,00** | **$ 256.001.753,00** | **$ 539.702.150,00** |
| ADMINISTRACIÓN | 18% | | $ 5.132.622,24 | $ 45.933.449,22 | $ 46.080.315,54 | $ 97.146.375,00 |
| IMPREVISTOS | 1% | | $ 285.145,68 | $ 2.551.858,29 | $ 2.560.017,53 | $ 5.397.025,00 |
| UTILIDADES | 5% | | $ 1.425.728,40 | $ 12.759.291,45 | $ 12.800.087,65 | $ 26.985.100,00 |
| IVA sobre utilidad | 19% | | $ 270.888,40 | $ 2.424.265,37 | $ 2.432.016,65 | $ 5.127.175,00 |
| **COSTO INDIRECTO EJECUTADO** | | | **$ 7.114.384,72** | **$ 63.668.864,33** | **$ 63.872.425,95** | **$ 134.655.675,00** |
| **VALOR TOTAL EJECUTADO** | | | **$ 35.628.952,72** | **$ 318.854.693,33** | **$ 319.874.178,95** | **$ 674.357.825,00** |
| **% AVANCE MENSUAL** | | | **5,28%** | **47,28%** | **47,43%** | **100,00%** |
| **% AVANCE ACUMULADO** | | | **5,28%** | **52,57%** | **100,00%** | |

EJECUTADO MES 1 | EJECUTADO MES 2 | EJECUTADO MES 3 | EJECUTADO ACUMULADO

Ver Anexos del informe de obra - *Anexo No. 1 (Cronograma de actividades y flujo de fondos)*

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

## ANEXO 2. CONTROL DE TIEMPOS

MPA-01-F-33, 16/08/2022

FORESTAL CONSULTORES S.A.S


| CONTRATO DE OBRA No. 1032 DEL 2023 Del 7 DICIEMBRE DE 2023 | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA No.1052 DEL 2023 DEL 12 DE DICIMEBRE DE 2023 | | | | PERIODO REPORTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO – ABARCO – PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA,MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | | | | | | | DESDE: | 21/03/2024 |
| CONTRATISTA: | FORESTAL CONSULTORES S.A.S. | SUPERVISOR OBRA | VICTOR MANUEL LOPEZ QUINTERO | SUPERVISOR INTERVENTORIA | SANDRA MILENA GOMEZ PEÑARANDA | INTERVENTOR: | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | HASTA: | 30/04/2024 |
| | | | | | | | | INFORME No. | 3 |

| Fecha de inicio: | 14/12/2023 |
|---|---|
| | |
| Plazo inicial (meses) | 0,60 |
| Plazo adicional (meses) | 4,00 |
| Duración total (meses) | 4,60 |

| Fecha de terminación: | 30/04/2024 |
|---|---|
| | |
| Días ejecución inicial: | 18 |
| Días ejecución adicional: | 121 |
| Total Días ejecución : | 139 |

| Fecha de reporte | 30/04/2024 |
|---|---|
| Días planeados | 139 |
| Días transcurridos | 139 |
| Días faltantes | 0 |

| N° | Descripción de la etapa | Duración en (días) | Inicio | Fin | Estatus | Fecha de terminación Estimado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejecución inicial | 18 | 14/12/23 | 31/12/23 | Ejecución | 31/12/2023 |
| 2 | Adición o Prorroga | 121 | 01/01/24 | 30/04/24 | Ejecución | 30/04/2024 |
| 3 | Informe No. 1 | 31 | 14/12/23 | 13/01/24 | Terminado | 13/01/2024 |
| 4 | Informe No. 2 | 67 | 14/01/24 | 20/03/24 | Terminado | 20/03/2024 |
| 5 | Informe No. 3 | 41 | 21/03/24 | 30/04/24 | Terminado | 30/04/2024 |

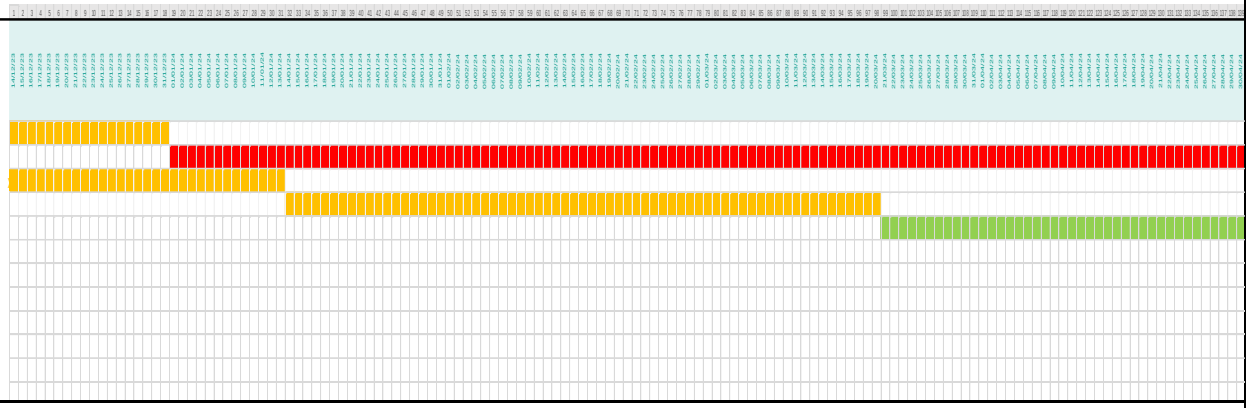

**OBSERVACIONES:**

*Anexo No. 2 (Tablero de control de tiempos).*

## 5 AVANCE FISICO - FINANCIERO

El avance físico – financiero del contrato de obra e interventoría es 47.43% en el presente periodo del valor total contratado.
El avance de ejecución acumulado del proyecto es de 100%.

**ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA**
MPA-01-F-07, 16/08/2022

| CONTRATO DE OBRA No. LIC 1032-2023 | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 1052 -2023 | | | | PERIODO REPORTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIARA, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LIC 1032-2023, CUYO OBJETO ES: "ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO- ABARCO-PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". | | | | | | | DESDE: | 21/03/2024 |
| CONTRATISTA: | FORESTAL CONSULTORES S.A.S. | SUPERVISOR: | SANDRA MILENA GOMEZ PEÑARANDA | INTERVENTOR: | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | INFORME No. | 3 | HASTA: | 30/04/2024 |

| ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO | | | | | | MODIFICACION O ADICIÓN | | | TOTAL CONTRATADO | | INFORME No. 1 14/12/2023- 13/01/2024 | | INFORME No. 2 14/04/2024-20/03/2024 | | INFORME No. 3 21/03/2024 - 30/04/2024 | | ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE | | % EJECUTADO | POR EJECUTAR | | % POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO ($) | VALOR ($) | +/- | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | | CANT | VALOR ($) | |
| 1 | **Diagnóstico y Acuerdo de Conservación** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | Costos de diagnóstico y firma de acuerdo de conservación (incluye realizar una caracterización socioeconómica; descripción físico-biótica del área) | Unidad | 25 | $ 632.586,00 | $ 15.814.650,00 | | | | 25 | $ 15.814.650,00 | 25,00 | $ 15.814.650,00 | | | | | 25,00 | $ 15.814.650,00 | 100% | - | | |
| 2 | **Mano de obra** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| 2.1 | **Adecuación del lote** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Preparación terreno | Jornal | 450 | $ 86.394,00 | $ 38.877.300,00 | | | | 450 | $ 38.877.300,00 | 126,00 | $ 10.885.644,00 | 324,00 | $ 27.991.656,00 | | | 450,00 | $ 38.877.300,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de canales | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | 21,00 | $ 1.814.274,00 | 54,00 | $ 4.665.276,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| 2.2 | **Establecimiento de sombrío (Plátano y maderables)** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Trazado de líneas de sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | | 200 | $ 17.278.800,00 | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 100% | - | | |
| | Acarreo siembra sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | 63,00 | $ 5.442.822,00 | 12,00 | $ 1.036.728,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Desinfección de colinos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 150 | $ 86.394,00 | $ 12.959.100,00 | | | | 150 | $ 12.959.100,00 | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 150,00 | $ 12.959.100,00 | 100% | - | | |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | | 100 | $ 8.639.400,00 | | | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100% | - | | |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| 2.3 | **Establecimiento de cacao** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Trazado | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | | | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | | 200 | $ 17.278.800,00 | | | | | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 100% | - | | |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | | | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Acarreo siembra cacao | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | | 100 | $ 8.639.400,00 | | | | | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100% | - | | |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | | 200 | $ 17.278.800,00 | | | | | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 100% | - | | |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | | 100 | $ 8.639.400,00 | | | | | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100% | - | | |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | | | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 25 | $ 86.394,00 | $ 2.159.850,00 | | | | 25 | $ 2.159.850,00 | | | | | | | 25,00 | $ 2.159.850,00 | 100% | - | | |
| | Otras labores | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Manejo del sombrío | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | | | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |
| | Mantenimiento drenajes | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | | | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | **Insumos** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Semilla plátano (Colino de 1 kg) | Unidad | 30.000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | | | | 30.000 | $ 90.000.000,00 | | | 25.000,00 | $ 75.000.000,00 | 5.000,00 | $ 15.000.000,00 | 30.000,00 | $ 90.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Plántulas maderables (35 cm de altura y bolsa forestal de 4x8 pulgadas) | Unidad | 4000 | $ 2.800,00 | $ 11.200.000,00 | | | | 4000 | $ 11.200.000,00 | | | 4.000,00 | $ 11.200.000,00 | | | 4.000,00 | $ 11.200.000,00 | 100% | - | | |
| | Plántulas de Cacao (30 cm de altura min, Bolsa 5x12 pulgadas calibre 2) | Unidad | 30.000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | | | | 30.000 | $ 90.000.000,00 | | | | | 30.000,00 | $ 90.000.000,00 | 30.000,00 | $ 90.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Materia Orgánica Enriquecida | Kilo | 30.000 | $ 800,00 | $ 24.000.000,00 | | | | 30.000 | $ 24.000.000,00 | | | 25.000,00 | $ 20.000.000,00 | 5.000,00 | $ 4.000.000,00 | 30.000,00 | $ 24.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Urea | Kilo | 2500 | $ 4.600,00 | $ 11.500.000,00 | | | | 2500 | $ 11.500.000,00 | | | | | 2.500,00 | $ 11.500.000,00 | 2.500,00 | $ 11.500.000,00 | 100% | - | | |
| | Fertilizante compuesto | Kilo | 3750 | $ 4.500,00 | $ 16.875.000,00 | | | | 3750 | $ 16.875.000,00 | | | 2.500,00 | $ 11.250.000,00 | 1.250,00 | $ 5.625.000,00 | 3.750,00 | $ 16.875.000,00 | 100% | - | | |
| | Correctivo | Kilo | 5000 | $ 600,00 | $ 3.000.000,00 | | | | 5000 | $ 3.000.000,00 | | | 5.000,00 | $ 3.000.000,00 | | | 5.000,00 | $ 3.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Fungicida | Kilo | 75 | $ 45.000,00 | $ 3.375.000,00 | | | | 75 | $ 3.375.000,00 | | | 18,75 | $ 843.750,00 | 56,25 | $ 2.531.250,00 | 75,00 | $ 3.375.000,00 | 100% | - | | |
| | Insecticidas | Kilo | 50 | $ 56.000,00 | $ 2.800.000,00 | | | | 50 | $ 2.800.000,00 | | | 50,00 | $ 2.800.000,00 | | | 50,00 | $ 2.800.000,00 | 100% | - | | |
| | Herbicidas | Litro | 50 | $ 65.000,00 | $ 3.250.000,00 | | | | 50 | $ 3.250.000,00 | | | 50,00 | $ 3.250.000,00 | | | 50,00 | $ 3.250.000,00 | 100% | - | | |
| | Hidroretenedor | Kilo | 125 | $ 52.000,00 | $ 6.500.000,00 | | | | 125 | $ 6.500.000,00 | | | 50,00 | $ 2.600.000,00 | 75,00 | $ 3.900.000,00 | 125,00 | $ 6.500.000,00 | 100% | - | | |
| | Análisis suelos | Unidad | 25 | $ 155.000,00 | $ 3.875.000,00 | | | | 25 | $ 3.875.000,00 | | | | | 25,00 | $ 3.875.000,00 | 25,00 | $ 3.875.000,00 | 100% | - | | |
| | Kit de Fertilización Organica (Caneca de 200 Lt con tapa, Cal hidratada, Melaza, Sulfatos de cobre, Magnesio y Zinc, Borax, Harina de Pescado y de Hueso) | Unidad | 25 | $ 620.000,00 | $ 15.500.000,00 | | | | 25 | $ 15.500.000,00 | | | 25,00 | $ 15.500.000,00 | | | 25,00 | $ 15.500.000,00 | 100% | - | | |
| 2.5 | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Machete | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | | | 25 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | 100% | - | | |
| | Limas | Unidad | 25 | $ 7.000,00 | $ 175.000,00 | | | | 25 | $ 175.000,00 | | | 25,00 | $ 175.000,00 | | | 25,00 | $ 175.000,00 | 100% | - | | |
| | Azadón | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | | | | 25 | $ 800.000,00 | | | 25,00 | $ 800.000,00 | | | 25,00 | $ 800.000,00 | 100% | - | | |
| | Barra Agricola | Unidad | 25 | $ 80.000,00 | $ 2.000.000,00 | | | | 25 | $ 2.000.000,00 | | | 25,00 | $ 2.000.000,00 | | | 25,00 | $ 2.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Pala | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | | | 25 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | 100% | - | | |
| | Tijera de podar de 9" | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | | | | 25 | $ 800.000,00 | | | 25,00 | $ 800.000,00 | | | 25,00 | $ 800.000,00 | 100% | - | | |
| | Palín | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | | | 25 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | 100% | - | | |
| | Bomba de espalda de 20 Lt | Unidad | 25 | $ 400.000,00 | $ 10.000.000,00 | | | | 25 | $ 10.000.000,00 | | | 25,00 | $ 10.000.000,00 | | | 25,00 | $ 10.000.000,00 | 100% | - | | |
| 2.6 | **Transporte** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Fletes y transporte Terrestre (incluye transporte menor fluvial y mular si aplica) 5% del costo de los insumos | Global | 25 | $ 563.750,00 | $ 14.093.750,00 | | | | 25 | $ 14.093.750,00 | | | 17,00 | $ 9.583.750,00 | 8,00 | $ 4.510.000,00 | 25,00 | $ 14.093.750,00 | 100% | - | | |
| 2.7 | **Asistencia técnica** | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Asistencia técnica | Global | 25 | $ 482.502,00 | $ 12.062.550,00 | | | | 25 | $ 12.062.550,00 | | | 12,50 | $ 6.031.275,00 | 12,50 | $ 6.031.275,00 | 25,00 | $ 12.062.550,00 | 100% | - | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | **$ 539.702.150,00** | | | | | **$ 539.702.150,00** | | | **$ 28.514.568,00** | | **$ 255.185.829,00** | | **$ 256.001.753,00** | | **$ 539.702.150,00** | | | **$ -** | | |
| | ADMINISTRACIÓN | | 18% | | $ 97.146.375,00 | | | | | $ 97.146.375,00 | | | 5132622,24 | | 45933449,22 | | 46080315,54 | | 97146387 | | | 0 | | |
| | IMPREVISTOS | | 1% | | $ 5.397.025,00 | | | | | $ 5.397.025,00 | | | 285145,68 | | 2551858,29 | | 2560017,53 | | 5397022 | | | 0 | | |
| | UTILIDADES | | 5% | | $ 26.985.100,00 | | | | | $ 26.985.100,00 | | | 1425728,4 | | 12759291,45 | | 12800087,65 | | 26985108 | | | 0 | | |
| | IVA sobre utilidad | | 19% | | $ 5.127.175,00 | | | | | $ 5.127.175,00 | | | 270888,40 | | 2424265,38 | | 2432016,654 | | 5127170 | | | 0 | | |
| | **COSTO INDIRECTO** | | | | **$ 134.655.675,00** | | | | | **$ 134.655.675,00** | | | **$ 7.114.384,72** | | **$ 63.668.864,34** | | **$ 63.872.425,95** | | **$ 134.655.675,00** | | | | | |
| | **VALOR TOTAL OBRA** | | | | **$ 674.357.825,00** | | | | | **$ 674.357.825,00** | | | **$ 35.628.952,72** | | **$ 318.854.693,34** | | **$ 319.874.178,95** | | **$ 674.357.825,00** | | | **$ -** | | |
| | **PORCENTAJE DE AVANCE OBRA** | | | | | | | | | | | | **5,28%** | | **47,28%** | | **47,43%** | | **100,00%** | | | **0,00%** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INTERVENTORIA** | | | | **$ 34.076.186,00** | | | | | **$ 34.076.186,00** | | | **$ 1.800.377,74** | | **$ 16.112.146,16** | | **$ 16.163.661,81** | | **$ 34.076.185,71** | | | **$ -** | | |
| | IVA Interventoria | | 19% | | $ 6.474.475,00 | | $ - | | | $ 6.474.475,34 | | | $ 342.071,77 | | $ 3.061.307,77 | | $ 3.071.095,74 | | $ 6.474.475,28 | | | $ - | | |
| | **SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO** | | | | **$ 40.550.661,00** | | **$ -** | | | **$ 40.550.661,00** | | | **$ 2.142.449,52** | | **$ 19.173.453,92** | | **$ 19.234.757,55** | | **$ 40.550.660,99** | | | **$ 0,01** | | |
| | **PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA** | | | | | | | | | | | | **5,28%** | | **47,28%** | | **47,43%** | | **100,00%** | | | **0,00%** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PROYECTO :** | | | | $ 714.908.486,00 | | | | | $ 714.908.486,00 | | | $ 37.771.402,24 | | $ 338.028.147,26 | | $ 339.108.937,00 | | $ 714.908.485,99 | | | $ 0,01 | | |
| **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (%) :** | | | | | | | | | | | | 5,28% | | 47,28% | | 47,43% | | 100,00% | | | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 714.908.486,50 | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

***Ver Anexo No. 1***. *(Balance físico – financiero de obra e interventoría*

## 6 CONDICIONES CLIMATICAS Y/O ORDEN PUBLICO


Durante el periodo del presente informe se presentaron temperatura media 25 °C, temperatura Max media 32°C, se presentaron 25 días de lluvia dispersos, vientos medios 4 km/h, temperatura minina media 20°C.

Se han presentado situaciones complejas por temporada seca como afectación directa, que se ha dado por el tema de dificultad de movilidad fluvial, dado la reducción de los cauces de los ríos y caños, que limita el trasporte de insumos y materiales.

Respecto a los grupos al margen de la ley presentes en el territorio, no se ha presentado una situación de afectación directa al desarrollo del proyecto, solo algunas restricciones que en la zona se aplica para toda la población; tales como uso de GPS, restricciones en toma de registro fotográfico, en la recolección de firma de listados de asistencia u otros formatos.

Dependiendo las veredas, no se puede ingresar a ellas, pero con previo aviso se advierte al personal de campo y poder gestionar los permisos para el ingreso.

**GRAFICO DE TEMPERATURA DEL MES DE ABRIL**

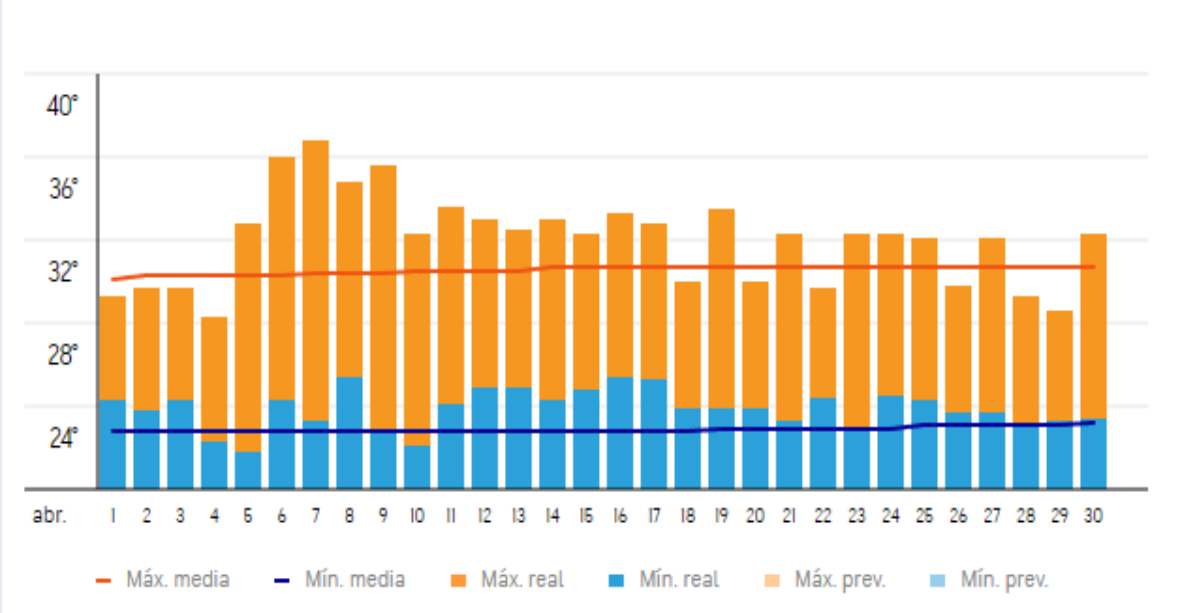

## 7 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS OBRA E INTERVENTORIA

A continuación, se realiza una breve descripción de las actividades realizadas por la interventoría tanto en obra como en oficina, en el transcurso del periodo trabajado desde el 21 de marzo hasta el 30 de abril de 2024, describiendo de manera generalizada las acciones representativas en las diversas actividades que se van a desarrollar en el presente proyecto.

**ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS:** se realiza la verificación de los documentos del establecimiento del sistema agroforestal.

- Revisión documental, como registro ICA del vivero que suministra el material vegetal del cacao.
- SOPORTES DE VISITAS TECNICAS DE ASISTENCIA TECNICA CON LAS CORRESPONDIENTES RECOMENDACIONES.
- IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA AGROFORESTAL.
- LABORES CULTURALES Y ESTADO VEGETATIVO Y FITOSANITARIO DEL MODELO AGROFORESTAL (CACAO, PLÁTANO Y MADERABLES)
- PLAN DE MANEJO Y SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA AGROFORESTAL - SAF (CACAO + PLATANO + MADERABLES)
- PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
- PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA AGROFORESTAL (CACAO, PLÁTANO Y MADERABLES).

**REUNIONES TÉCNICAS**: El contratista, la interventoría y la supervisión ha venido a lo largo de la ejecución asistiendo a reuniones presenciales, en campo y en las instalaciones de CORPONOR y virtualmente con el ministerio y la contraloría, con el objeto de mostrar el avance de ejecución del proyecto.

**SEGUIMIENTO TÉCNICO:** Se evidencia en terreno el cumplimiento del sistema agroforestal del cacao – plátano – abarco.

**CONTROL DE OBRA:** Se realiza el control y seguimiento de las actividades realizadas en el periodo del presente informe, ciñéndose en el cumplimiento al cronograma de actividades aportado por el contratista.

**ACTIVIADES TECNICAS:** La presente interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales realiza el seguimiento y control de las actividades de obra con el fin de dar cumplimiento al alcance del proyecto.

A continuación, se realiza la descripción de las actividades realizadas por el contratista de obra:

## ESTABLECIMIENTO DEL SOMBRÍO (PLÁTANO Y MADERABLE)

• Fertilización
• Aplicación correctivos
• Control manual de arvenses
• Control de plagas y enfermedades
• Resiembra de los individuos que no lograron la etapa de adaptación.

### Fertilización y Aplicación de correctivos

Para el desarrollo de esta actividad se contó con la formulación de un plan inicial de fertilización realizada por los profesionales y técnicos contratados para el proyecto partiendo de los insumos entregados como aporte a cada beneficiario del proyecto, en función de la etapa de desarrollo fenológico inicial del cultivo.

De la misma manera se deja el insumo de los análisis de suelo practicados a cada predio y sus recomendaciones para que a partir del mismo se formule los respectivos planes de fertilización con los que se proyecta lograr un desarrollo satisfactorio del cultivo; mayor crecimiento, vigorosa conformación estructural, alta productividad, alta resistencia a plagas, enfermedades y a condiciones climáticas extremas.

crecimiento, vigorosa conformación estructural, alta productividad, alta resistencia a plagas, enfermedades y a condiciones climáticas extremas.

### Control de plagas y enfermedades

Para el desarrollo de esta actividad se realiza diagnóstico de afectación de plagas y enfermedades sobre el cual se realiza la aplicación de controles respectivos

### Resiembra

Se realizó entrega de 200 Plantas e insumos para desarrollo de la actividad de resiembra de los individuos que no lograron adaptarse en la primera etapa de establecimiento (Ver Anexo No. 9. Entrega de Material vegetal e Insumos para Resiembra) informe de obra. Se realizó así el acompañamiento para implementación de la actividad de resiembra de sombrío aplicando la misma metodología de siembra para garantizar la correcta instalación de la planta.

## ESTABLECIMIENTO DE CACAO

Unas de las principales actividades realizadas durante este periodo fue la siembra de las plántulas de cacao.

Se evaluó y determino la variedad genética del cacao más apropiada para implementar en el presente proyecto, entre los argumentos evaluados y que se tuvieron en cuenta con la argumentación y soporte técnico y el conocimiento local de la comunidad y experiencias técnicas locales, permitieron la elección de las variedades; CCN 51 (Introducido – Ecuador) y FEAR 5 (Regional - Colombia), como las variedades más apropiadas para establecer bajo el modelo SAF.

Se realiza la entrega de 1000 Plántulas de Cacao a cada beneficiario inicialmente, de igual manera teniendo en cuenta que durante el acareo, transporte y la adaptabilidad, los cambios de temperatura algunas se dañaron por ende se realiza una resiembra donde a cada beneficiario se le hace entrega de 200 plántulas más.

El material vegetal de Cacao fue adquirido en el Vivero la Ceiba en el Municipio del El Zulia en Norte de Santander, posteriormente entregado a cada beneficiario en bolsas con unas dimensiones de 5*12 y con altura superior a 30cm.

**Trazado**

Cuando se inicia con los trazados para el establecimiento del sombrío, se realiza el del cacao a si mismo trazados y estaquillados están de acuerdo al sistema y diseño (Triangulo – Cuadrado), que aplica a cada lote seleccionado.

**Ahoyado**

Dadas las características de los terrenos identificados se establece un estándar de medida para el ahoyado de todo el sistema SAF; se realizó un ahoyado de 40 cm x 40 cm, para el cacao.

**Acarreo**

Se llevaron las plántulas de cacao clonado al predio y se colocan a aclimatar unos 8 a 15 días antes de la siembra, se exponen a una mayor radiación que la que estaba expuesta, con el fin de aclimatar o adaptar las nuevas plantas a las condiciones locales, se acomodaron bajo sombra no mayor al 30%, y se aplicaba riego cada dos días, hasta el momento de su siembra 8 – 15 días después.

**Siembra y resiembra**

Al momento de la siembra se incorporó en el fondo del hueco 1 kg de materia orgánica mezclada con la tierra que se ha sacado del hueco y se procedió a colocar la plántula en el centro del hueco, de tal manera que el cuello de la raíz quedara a ras del suelo; se terminó de llenar el hoyo hasta la superficie procurando que al llenar no quedara el tallo enterrado, ni la raíz expuesta; por último, se repiso la tierra a fin de evitar espacios de aire en el hueco

y posibles afectaciones fitosanitarios futuras.

Se realiza una resiembra dado que algunas plántulas se dañaron por el acarreo y transporte.

**Fertilización y Aplicación de correctivos**

Se estableció incorporar 300 gramos de correctivo (cal agrícola), en la etapa inicial, que se debe hacer 10 días antes de la siembra del material vegetal; tiempo en el cual se aprovecha para colocar a pregerminar y/o adaptar climáticamente el material vegetal entregado. Se realiza igual la aplicación del correctivo al hueco internamente y los bordes externos del mismo en el momento de siembra.

Conforme al plan de fertilización se tiene en cuenta el plan de fertilización complementario de fertilización ecológica con el caldo microbial SUPER 4, el cual se aplica según la guía entregada al beneficiario para la elaboración y el uso del mismo.

**Control manual de arvenses**

Es de máxima importancia el concepto de Arvenses. Son plantas que no causan competencia a las cultivadas, siempre que sean manejadas adecuadamente. Éstas deben dejarse crecer alrededor del SAF - cacao, en especial si son de crecimiento a manera de cobertura, con la cual se mantiene la frescura del suelo, lo protegen de la erosión y le agregan los efectos señalados sobre microflora y microfauna.

Se realizó controles mecánicos (o manuales) para el manejo de arvenses a cada planta (un metro de radio), teniendo precaución de no dejar descapotado el plato de la planta, cubriendo con hojarasca u otro medio natural para evitar la exposición directa al sol o impacto de la lluvia.

**Control de plagas y enfermedades**

Para el desarrollo de esta actividad se realiza diagnóstico de afectación de plagas y enfermedades sobre el cual se realiza la aplicación de controles respectivos.

**OTRAS LABORES**

**Manejo del sombrío**

Para la correcta instalación de plántulas de cacao se procede a realizar actividades concernientes a manejo del sombrío instalado y existente a fin de crear las condiciones ideales para el establecimiento del SAF.

**Mantenimiento drenajes**

Se realizó mantenimiento a canales de drenaje para mantenerlos libres de obstrucciones en ocurrencia de lluvias

## ENTREGA DE INSUMOS

Se realiza la entrega de los siguientes insumos:

- Plántulas de Cacao (30 cm de altura min, Bolsa 5x12 pulgadas calibre 2)
- Entrega de Insumos fertilización y siembra del Cacao
- Resultados Análisis de suelos
- Semillas de plátano
- Materia orgánica enriquecida
- Urea
- Fertilizante compuesto
- Fungicida
- Hidroretenedor

### Análisis suelos

De las muestras enviadas a laboratorio fueron remitidos los resultados del análisis Básico de suelos por parte de la Universidad Industrial de Santander con las respectivas recomendaciones para cada predio de los 25 beneficiarios.

Una vez recibidos los resultados se realizó una visita de asistencia técnica a cada beneficiario, con el objeto de realzar la socialización de las recomendaciones acorde a lo establecido en el informe de análisis.

## TRANSPORTE

Para esta actividad fue utilizado transporte terrestre y fluvial para material vegetal e insumos entregados a los beneficiarios del proyecto. En la realización de esta actividad fue necesario utilizar tanto el transporte terrestre como fluvial para plántulas de cacao. El transporte terrestre comprendido desde el vivero en el municipio del EL Zulia hasta el corregimiento de la Gabarra y el transporte fluvial desde la Gabarra hasta los predios beneficiarios, incluida la arriería para algunos de los predios

## ASISTENCIA TECNICA

Durante la ejecución de la actividad de asistencia técnica se desarrollaron visitas de asistencia técnica a cada uno de los veinticinco (25) beneficiarios, realizadas por el equipo profesional en el presente corte, a fin de identificar y obtener observaciones sobre el estado de las actividades ejecutadas (adecuación de terrenos, construcción de drenajes, siembra, entrega de insumos).

Como valor agregado del proceso, se ha desarrollado un evento de capacitación grupal (ECA – Escuela de Campo para Agricultores). Metodología basada en el aprender haciendo; con el fin de capacitar sobe el proceso de ahoyado, encalado y siembra, así mismo sobre la elaboración y uso de fertilización ecológica (caldo microbial). A partir del análisis anterior fueron realizadas las recomendaciones pertinentes a cada beneficiario

| CONTRATO INICIAL | | | | | | ACTIVIDADES EJECUTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO ($) | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) |
| 1 | **Diagnóstico y Acuerdo de Conservación** | | | | | | |
| | Costos de diagnóstico y firma de acuerdo de conservación (incluye realizar una caracterización socioeconómica ; descripción físico-biótica del área) | Unidad | 25 | $ 632.586,00 | $ 15.814.650,00 | | |
| 2 | **Mano de obra** | | | | | | |
| 2.1 | **Adecuación del lote** | | | | | | |
| | Preparación terreno | Jornal | 450 | $ 86.394,00 | $ 38.877.300,00 | | |
| | Construcción de canales | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | |
| 2.2 | **Establecimiento de sombrío (Plátano y maderables)** | | | | | | |
| | Trazado de líneas de sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | |
| | Acarreo siembra sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | 12,00 | $ 1.036.728,00 |
| | Desinfección de colinos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 150 | $ 86.394,00 | $ 12.959.100,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 |

| CONTRATO INICIAL | | | | | | ACTIVIDADES EJECUTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO ($) | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 |
| **2.3** | **Establecimiento de cacao** | | | | | | |
| | Trazado | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | 200,00 | $ 17.278.800,00 |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 |
| | Acarreo siembra cacao | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | 200,00 | $ 17.278.800,00 |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 25 | $ 86.394,00 | $ 2.159.850,00 | 25,00 | $ 2.159.850,00 |
| | Otras labores | | | | | | |
| | Manejo del sombrío | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 |
| | Mantenimiento drenajes | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 |
| **2.4** | **Insumos** | | | | | | |
| | Semilla plátano (Colino de 1 kg) | Unidad | 30.000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | 5.000,00 | $ 15.000.000,00 |
| | Plántulas maderables (35 cm de altura y bolsa forestal de 4x8 pulgadas) | Unidad | 4000 | $ 2.800,00 | $ 11.200.000,00 | | |
| | Plántulas de Cacao (30 cm de altura min, | Unidad | 30.000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | 30.000,00 | $ 90.000.000,00 |

| CONTRATO INICIAL | | | | | | ACTIVIDADES EJECUTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO ($) | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) |
| | Bolsa 5x12 pulgadas calibre 2) | | | | | | |
| | Materia Orgánica Enriquecida | Kilo | 30.000 | $ 800,00 | $ 24.000.000,00 | 5.000,00 | $ 4.000.000,00 |
| | Urea | Kilo | 2500 | $ 4.600,00 | $ 11.500.000,00 | 2.500,00 | $ 11.500.000,00 |
| | Fertilizante compuesto | Kilo | 3750 | $ 4.500,00 | $ 16.875.000,00 | 1.250,00 | $ 5.625.000,00 |
| | Correctivo | Kilo | 5000 | $ 600,00 | $ 3.000.000,00 | | |
| | Fungicida | Kilo | 75 | $ 45.000,00 | $ 3.375.000,00 | 56,25 | $ 2.531.250,00 |
| | Insecticidas | Kilo | 50 | $ 56.000,00 | $ 2.800.000,00 | | |
| | Herbicidas | Litro | 50 | $ 65.000,00 | $ 3.250.000,00 | | |
| | Hidroretenedor | Kilo | 125 | $ 52.000,00 | $ 6.500.000,00 | 75,00 | $ 3.900.000,00 |
| | Análisis suelos | Unidad | 25 | $ 155.000,00 | $ 3.875.000,00 | 25,00 | $ 3.875.000,00 |
| | Kit de Fertilización Organica (Caneca de 200 Lt con tapa, Cal hidratada, Melaza, Sulfatos de cobre, Magnesio y Zinc, Borax, Harina de Pescado y de Hueso) | Unidad | 25 | $ 620.000,00 | $ 15.500.000,00 | | |
| **2.5** | **Herramientas** | | | | | | |
| | Machete | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | |

| CONTRATO INICIAL | | | | | | ACTIVIDADES EJECUTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO ($) | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) |
| | Limas | Unidad | 25 | $ 7.000,00 | $ 175.000,00 | | |
| | Azadón | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | | |
| | Barra Agricola | Unidad | 25 | $ 80.000,00 | $ 2.000.000,00 | | |
| | Pala | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | |
| | Tijera de podar de 9" | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | | |
| | Palín | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | |
| | Bomba de espalda de 20 Lt | Unidad | 25 | $ 400.000,00 | $ 10.000.000,00 | | |
| **2.6** | **Transporte** | | | | | | |
| | Fletes y transporte Terrestre (incluye transporte menor fluvial y mular si aplica) 5% del costo de los insumos | Global | 25 | $ 563.750,00 | $ 14.093.750,00 | 8,00 | $ 4.510.000,00 |
| **2.7** | **Asistencia técnica** | | | | | | |
| | Asistencia técnica | Global | 25 | $ 482.502,00 | $ 12.062.550,00 | 12,50 | $ 6.031.275,00 |
| **TOTAL, COSTOS DIRECTOS** | | | | | **$ 539.702.150,00** | | **$ 256.001.753,00** |
| ADMINISTRACIÓN | | | | 18% | $ 97.146.375,00 | | $ 46.080.315,54 |
| IMPREVISTOS | | | | 1% | $ 5.397.025,00 | | $ 2.560.017,53 |
| UTILIDADES | | | | 5% | $ 26.985.100,00 | | $ 12.800.087,65 |
| IVA sobre utilidad | | | | 19% | $ 5.127.175,00 | | $ 2.432.016,65 |

| CONTRATO INICIAL | | | | | | ACTIVIDADES EJECUTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO ($) | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) |
| TOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | | $ 134.655.675,00 | | $ 63.872.425,95 |
| VALOR TOTAL OBRA | | | | | $ 674.357.825,00 | | $ 319.874.178,95 |
| INTERVENTORIA | | | | | $ 40.550.661,00 | | $ 19.234.757,56 |
| TOTAL PROYECTO | | | | | $ 714.908.486,00 | | $ 339.108.936,51 |

***Ver Anexo No. 02.*** *Registro fotográfico*

Con base a lo anterior se puede constatar que el contratista FORESTAL CONSTRUCTORES S.A.S -BIC, cumplió a satisfacción el 100% de las actividades establecidas en el contrato LIC 1032-2023.

La interventoría realiza el acompañamiento y supervisión de la obra, recibe junto a la corporación al 100% la ejecución de la obra del sistema agroforestal.

### 7.1 ENSAYOS DE LABORATORIO RELIZADOS

El contratista de la obra Forestal Consultores S.A.S, realizo el estudio de suelo físico, químicos en el laboratorio químico de suelos de la universidad industrial de Santander.

En el informe de obra en el Anexo No. 7. Se entrega resultado análisis de suelo, análisis de resultados y recomendaciones.

### 7.2 DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

El contratista de obra mantuvo todo su personal de propuesta y realizo la contratación de obreros para la ejecución de las actividades.

Por parte del personal de interventoría se mantuvo el personal propuesto para la ejecución del proyecto.

### 7.4 ESTADO FINANCIERO Y RELACION DE PAGOS

### 7.4.1 ESTADO FINANCIERO Y RELACION DE PAGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El avance físico – financiero del contrato de obra es 100% del valor total contratado.

A la fecha se suscribió acta parcial No. 1 del contrato de obra.

Se suscribió acta parcial de obra No. 1 por valor de $ 354.483.646.05, para un valor total a cobrar de $ 354.483.646.05 del valor total contratado de $ 674.357.825.00.

A la fecha se suscribió acta parcial No. 2 del contrato de obra.

Se suscribió acta parcial de obra No. 2 por valor de $ 319.874.178.95, para un valor total a cobrar de $ 674.357.825.00, del valor total contratado.

No quedaría saldo por pagar, una vez se hagan efectivos los pagos parciales de las actas suscritas.

### 7.4.2 ESTADO FINANCIERO Y RELACION DE PAGOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

El avance físico – financiero del contrato de interventoría es 100% del valor total contratado.

A la fecha se suscribió acta parcial No. 1 del contrato de interventoría.

Se suscribió acta parcial de obra No. 1 por valor de $ 21.315.903.44, para un valor total a cobrar de $ 21.315.903.44 del valor total contratado de $ 40.550.661.00.

A la fecha se suscribió acta parcial No. 2 del contrato de interventoría.

Se suscribió acta parcial de obra No. 2 por valor de $ 19.234.757.55, para un valor total a cobrar de $ 40.550.660.99. del valor total contratado.

Saldo a favor de CORPONOR $ 0.01

No hay saldo por pagar, una vez se hagan efectivos los pagos parciales de las actas suscritas.

## ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, 16/08/2022

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023

| CONTRATO DE OBRA No. LIC 1032-2023 | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 1052 -2023 | | | PERIODO REPORTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIARA, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LIC 1032-2023, CUYO OBJETO ES: "ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO-ABARCO- PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". | | | | | | | DESDE: | 21/03/2024 |
| CONTRATISTA: | FORESTAL CONSULTORES S.A.S. | SUPERVISOR: | SANDRA MILENA GOMEZ PEÑARANDA | INTERVENTOR: | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | INFORME No. | 3 | HASTA: | 30/04/2024 |

| ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO | | | | | | MODIFICACION O ADICIÓN | | | TOTAL CONTRATADO | | ACTA PARCIAL No. 1 14/12/2023-20/03/2024 | | ACTA PARCIAL No. 2 14/01/2024- 20/03/2024 | | ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS | | % PAGADO | POR COBRAR | | % POR COBRAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO ($) | VALOR ($) | +/- | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | | CANT | VALOR ($) | |
| 1 | **Diagnóstico y Acuerdo de Conservación** | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | Costos de diagnóstico y firma de acuerdo de conservación (incluye realizar una caracterización socioeconómica; descripción físico-biótica del área) | Unidad | 25 | $ 632.586,00 | $ 15.814.650,00 | | | | 25 | $ 15.814.650,00 | 25,00 | $ 15.814.650,00 | | | 25,00 | $ 15.814.650,00 | 100% | - | | |
| 2 | **Mano de obra** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| 2.1 | **Adecuación del lote** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Preparación terreno | Jornal | 450 | $ 86.394,00 | $ 38.877.300,00 | | | | 450 | $ 38.877.300,00 | 450,00 | $ 38.877.300,00 | | | 450,00 | $ 38.877.300,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de canales | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| 2.2 | **Establecimiento de sombrío (Plátano y maderables)** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Trazado de líneas de sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | | 200 | $ 17.278.800,00 | 200,00 | $ 17.278.800,00 | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 100% | - | | |
| | Acarreo siembra sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | 63,00 | $ 5.442.822,00 | 12,00 | $ 1.036.728,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Desinfección de colinos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 150 | $ 86.394,00 | $ 12.959.100,00 | | | | 150 | $ 12.959.100,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 150,00 | $ 12.959.100,00 | 100% | - | | |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | | 100 | $ 8.639.400,00 | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100% | - | | |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| 2.3 | **Establecimiento de cacao** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Trazado | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | | 200 | $ 17.278.800,00 | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 100% | - | | |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Acarreo siembra cacao | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | | 100 | $ 8.639.400,00 | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100% | - | | |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | | 200 | $ 17.278.800,00 | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 100% | - | | |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | | 100 | $ 8.639.400,00 | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100% | - | | |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 25 | $ 86.394,00 | $ 2.159.850,00 | | | | 25 | $ 2.159.850,00 | | | 25,00 | $ 2.159.850,00 | 25,00 | $ 2.159.850,00 | 100% | - | | |
| | Otras labores | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Manejo del sombrío | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |
| | Mantenimiento drenajes | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4** | **Insumos** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | |
| | Semilla plátano (Colino de 1 kg) | Unidad | 30.000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | | | | 30.000 | $ 90.000.000,00 | 25.000,00 | $ 75.000.000,00 | 5.000,00 | $ 15.000.000,00 | 30.000,00 | $ 90.000.000,00 | 100% | - | |
| | Plántulas maderables (35 cm de altura y bolsa forestal de 4x8 | Unidad | 4000 | $ 2.800,00 | $ 11.200.000,00 | | | | 4000 | $ 11.200.000,00 | 4.000,00 | $ 11.200.000,00 | | | 4.000,00 | $ 11.200.000,00 | 100% | - | |
| | Plántulas de Cacao (30 cm de altura min, | Unidad | 30.000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | | | | 30.000 | $ 90.000.000,00 | | | ######## | $ 90.000.000,00 | 30.000,00 | $ 90.000.000,00 | 100% | - | |
| | Materia Orgánica Enriquecida | Kilo | 30.000 | $ 800,00 | $ 24.000.000,00 | | | | 30.000 | $ 24.000.000,00 | 25.000,00 | $ 20.000.000,00 | 5.000,00 | $ 4.000.000,00 | 30.000,00 | $ 24.000.000,00 | 100% | - | |
| | Urea | Kilo | 2500 | $ 4.600,00 | $ 11.500.000,00 | | | | 2500 | $ 11.500.000,00 | | | 2.500,00 | $ 11.500.000,00 | 2.500,00 | $ 11.500.000,00 | 100% | - | |
| | Fertilizante compuesto | Kilo | 3750 | $ 4.500,00 | $ 16.875.000,00 | | | | 3750 | $ 16.875.000,00 | 2.500,00 | $ 11.250.000,00 | 1.250,00 | $ 5.625.000,00 | 3.750,00 | $ 16.875.000,00 | 100% | - | |
| | Correctivo | Kilo | 5000 | $ 600,00 | $ 3.000.000,00 | | | | 5000 | $ 3.000.000,00 | 5.000,00 | $ 3.000.000,00 | | | 5.000,00 | $ 3.000.000,00 | 100% | - | |
| | Fungicida | Kilo | 75 | $ 45.000,00 | $ 3.375.000,00 | | | | 75 | $ 3.375.000,00 | 18,75 | $ 843.750,00 | 56,25 | $ 2.531.250,00 | 75,00 | $ 3.375.000,00 | 100% | - | |
| | Insecticidas | Kilo | 50 | $ 56.000,00 | $ 2.800.000,00 | | | | 50 | $ 2.800.000,00 | 50,00 | $ 2.800.000,00 | | | 50,00 | $ 2.800.000,00 | 100% | - | |
| | Herbicidas | Litro | 50 | $ 65.000,00 | $ 3.250.000,00 | | | | 50 | $ 3.250.000,00 | 50,00 | $ 3.250.000,00 | | | 50,00 | $ 3.250.000,00 | 100% | - | |
| | Hidroretenedor | Kilo | 125 | $ 52.000,00 | $ 6.500.000,00 | | | | 125 | $ 6.500.000,00 | 50,00 | $ 2.600.000,00 | 75,00 | $ 3.900.000,00 | 125,00 | $ 6.500.000,00 | 100% | - | |
| | Análisis suelos | Unidad | 25 | $ 155.000,00 | $ 3.875.000,00 | | | | 25 | $ 3.875.000,00 | | | 25,00 | $ 3.875.000,00 | 25,00 | $ 3.875.000,00 | 100% | - | |
| | Kit de Fertilización Organica (Caneca de 200 | Unidad | 25 | $ 620.000,00 | $ 15.500.000,00 | | | | 25 | $ 15.500.000,00 | 25,00 | $ 15.500.000,00 | | | 25,00 | $ 15.500.000,00 | 100% | - | |
| **2.5** | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | |
| | Machete | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | | | 25 | $ 1.125.000,00 | 25,00 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | 100% | - | |
| | Limas | Unidad | 25 | $ 7.000,00 | $ 175.000,00 | | | | 25 | $ 175.000,00 | 25,00 | $ 175.000,00 | | | 25,00 | $ 175.000,00 | 100% | - | |
| | Azadón | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | | | | 25 | $ 800.000,00 | 25,00 | $ 800.000,00 | | | 25,00 | $ 800.000,00 | 100% | - | |
| | Barra Agricola | Unidad | 25 | $ 80.000,00 | $ 2.000.000,00 | | | | 25 | $ 2.000.000,00 | 25,00 | $ 2.000.000,00 | | | 25,00 | $ 2.000.000,00 | 100% | - | |
| | Pala | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | | | 25 | $ 1.125.000,00 | 25,00 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | 100% | - | |
| | Tijera de podar de 9" | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | | | | 25 | $ 800.000,00 | 25,00 | $ 800.000,00 | | | 25,00 | $ 800.000,00 | 100% | - | |
| | Palín | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | | | 25 | $ 1.125.000,00 | 25,00 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | 100% | - | |
| | Bomba de espalda de 20 Lt | Unidad | 25 | $ 400.000,00 | $ 10.000.000,00 | | | | 25 | $ 10.000.000,00 | 25,00 | $ 10.000.000,00 | | | 25,00 | $ 10.000.000,00 | 100% | - | |
| **2.6** | **Transporte** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | |
| | Fletes y transporte Terrestre (incluye | Global | 25 | $ 563.750,00 | $ 14.093.750,00 | | | | 25 | $ 14.093.750,00 | 17,00 | $ 9.583.750,00 | 8,00 | $ 4.510.000,00 | 25,00 | $ 14.093.750,00 | 100% | - | |
| **2.7** | **Asistencia técnica** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | |
| | Asistencia técnica | Global | 25 | $ 482.502,00 | $ 12.062.550,00 | | | | 25 | $ 12.062.550,00 | 12,50 | $ 6.031.275,00 | 12,50 | $ 6.031.275,00 | 25,00 | $ 12.062.550,00 | 100% | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | **$ 539.702.150,00** | | | | | **$ 539.702.150,00** | | **$ 283.700.397,00** | | **$ 256.001.753,00** | | **$ 539.702.150,00** | | | **$ -** |
| | ADMINISTRACIÓN | 18% | | | $ 97.146.375,00 | | | | | $ 97.146.375,00 | | 51066071,46 | | 46080315,54 | | 97146387 | | | 0 |
| | IMPREVISTOS | 1% | | | $ 5.397.025,00 | | | | | $ 5.397.025,00 | | 2837003,97 | | 2560017,53 | | 5397021,5 | | | 0 |
| | UTILIDADES | 5% | | | $ 26.985.100,00 | | | | | $ 26.985.100,00 | | 14185019,85 | | 12800087,65 | | 26985107,5 | | | 0 |
| | IVA sobre utilidad | 19% | | | $ 5.127.175,00 | | | | | $ 5.127.175,00 | | 2695153,77 | | 2432016,654 | | 5127170,43 | | | 0 |
| | **COSTO INDIRECTO** | | | | **$ 134.655.675,00** | | | | | **$ 134.655.675,00** | | **$ 70.783.249,05** | | **$ 63.872.425,95** | | **$ 134.655.675,00** | | | |
| | **VALOR TOTAL OBRA** | | | | **$ 674.357.825,00** | | | | | **$ 674.357.825,00** | | **$ 354.483.646,05** | | **$ 319.874.178,95** | | **$ 674.357.825,00** | | | **$ -** |
| | **PORCENTAJE DE AVANCE OBRA** | | | | | | | | | | **52,57%** | | **47,43%** | | **100,00%** | | | **0,00%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INTERVENTORIA** | | | | **$ 34.076.186,00** | | | | | **$ 34.076.186,00** | | **$ 17.912.523,90** | | **$ 16.163.661,81** | | **$ 34.076.185,71** | | | |
| | IVA Interventoria | 19% | | | $ 6.474.475,00 | | $ - | | | $ 6.474.475,00 | | $ 3.403.379,54 | | $ 3.071.095,74 | | $ 6.474.475,28 | | | |
| | **SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO** | | | | **$ 40.550.661,00** | | **$ -** | | | **$ 40.550.661,00** | | **$ 21.315.903,44** | | **$ 19.234.757,55** | | **$ 40.550.660,99** | | | **$ 0,01** |
| | **PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA** | | | | | | | | | | **52,57%** | | **47,43%** | | **100,00%** | | | **0,00%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PROYECTO :** | $ 714.908.486,00 | | | | | | | | | $ 714.908.486,00 | $ 375.799.549,49 | $ 339.108.936,50 | $ 714.908.485,99 | $ 0,01 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 52,57% | 47,43% | 100% | 0,0% | | | | | | | |

**OBSERVACIONES:**

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor inicial del contrato** | **$** | **674.357.825,00** |
| **Valor Adicional del contrato** | | |
| **Valor Total del contrato** | | |

| No. Acta | Valor cobrado | Valor Acumulado | Saldo del contrato | % parcial ejecutado | % ejecutado acumulado | Periodo cobrado | | Fecha presentación del acta | Comprobante de egreso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Desde | Hasta | | | |
| 1 | $ 354.483.646,05 | $ 354.483.646,05 | $ 319.874.178,95 | 52,57% | 52,57% | 14/12/2023 | 20/03/2024 | 23/04/2024 | 1035 | |
| 2 | $ 319.874.178,95 | $ 674.357.825,00 | $ - | 47,43% | 100,00% | 21/03/2024 | 30/04/2024 | | | |
| | $ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE ITERVENTORIA**

| | | |
|---|---|---|
| **Valor inicial del contrato** | **$** | **40.550.661,00** |
| **Valor Adicional del contrato** | **$** | **-** |
| **Valor Total del contrato** | **40550661** | |

| No. Acta | Valor cobrado | Valor Acumulado | Saldo del contrato | % parcial ejecutado | % ejecutado acumulado | Periodo cobrado | | Fecha presentación del acta | Comprobante de egreso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Desde | Hasta | | | |
| 1 | $ 21.315.903,44 | $ 21.315.903,44 | $ 19.234.757,56 | 52,57% | 52,57% | 14/12/2023 | 20/03/2024 | 23/04/2024 | 1010 | |
| 2 | $ 19.234.757,55 | $ 40.550.660,99 | $ (0,01) | 47,43% | 100,00% | 21/03/2024 | 30/04/2024 | | | |
| | $ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

***Ver Anexo No. 3*** *Relación de pagos obra e interventoría*

## 8 VERIFICACIÓN DEL CONTROL SOCIAL

Se realiza una visita a campo con el personal de la corporación CORPONOR con el objeto de realizar supervisión.

Se realiza también por parte del ministerio una segunda visita para dar cumplimiento de campo del establecimiento del sistema agroforestal.

## 9 VERIFICACION CRITERIOS DE CUMPLIMIENTO DE HSEQ DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se realiza seguimiento y control a los criterios de cumplimiento de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental de obras públicas realizado por el contratista de obra y mencionar que los soportes se anexan en el informe de ejecución del contratista de obra. Revisión de seguimiento y aplicación de planes (Riesgo, Ambiental, Señalización, emergencia y calidad)

**Anexo MPA-01-F-25 - Versión 3** *(Lista de verificación del cumplimiento de criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas).*

### 9.1 LISTADO DE PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Para la ejecución del proyecto se contrató el siguiente personal:

#### 9.1.1 LISTADO DE PERSONAL INGRESADO

| ITEM | NOMBRE Y APELLIDO | CEDULA | PROFESIÓN | CARGO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIEL GUSTAVO CAÑAS VELANDIA | 13929587 | INGENIERO FORESTAL | DIRECTOR |
| 2 | EDISON BENAVIDES ZARATE | 91045632 | TECNICO FORESTAL | TECNICO DE CAMPO |
| 3 | FERNANDO ALBERTO JAIMES NIÑO | 13929675 | INGENIERO FORESTAL | RESIDENTE |
| 4 | HECTOR URIEL RIVERA ALARCON | 88164992 | INGENIERO AMBIENTAL | HSEQ |

##### 9.1.1.1 EXAMENES DE INGRESO

Se presentan las copias de los exámenes de ingreso del personal de técnico y administrativo vinculado en el periodo del informe.

I.P.S. MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.

*IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.*
*Nit. 900257281 - 1*
*Dirección: AV 2E # 5-35 LA CEIBA*
*Tel: 5777177 - 5777188 - 5777199*

**INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD**

| **Tipo certificación:** | Ingreso (X) | Periódico ( ) | Retiro ( ) | Post incapacidad ( ) | Caso ocupacional ( ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Control ( ) | Reubicación ( ) | Ingreso al SVE ( ) | Trabajo en alturas ( ) | |

**DATOS DEL PACIENTE**

Fecha **22/12/2023 08:11:00** Empresa **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023**

Nombre **DANIEL GUSTAVO CAÑAS VELANDIA**

Cargo **DIRECTOR DE INTERVENTORIA** Doc. Identidad **CC 13929587**

**SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS**

| | | |
|---|---|---|
| 1 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

| EXAMEN DE INGRESO | SI | NO |
|---|---|---|
| Sin restricciones para desempeñar el cargo | (X) | ( ) |
| Aplazado | ( ) | ( ) |
| Con restricciones para desempeñar el cargo | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en alturas | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en espacios confinados | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar con equipos de suministro de aire o auto contenido | ( ) | ( ) |
| Apto para participar en la brigada | ( ) | ( ) |
| Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista | ( ) | ( ) |

| EXAMEN PERIÓDICO | SI | NO |
|---|---|---|
| Sin restricciones para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones | ( ) | ( ) |
| Con restricciones para continuar desempeñando el cargo | ( ) | ( ) |
| Requiere reubicación laboral temporal | ( ) | ( ) |
| Requiere reubicación laboral permanente | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en alturas | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en espacios confinados | ( ) | ( ) |

| EXAMEN DE RETIRO | SI | NO |
|---|---|---|
| Sospecha de enfermedad profesional | ( ) | ( ) |
| Secuelas de accidentes de trabajo | ( ) | ( ) |
| Enfermedad común | ( ) | ( ) |

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA**

Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

| **REMISIÓN** | SI ( ) | NO (X) | **ARL** | SI ( ) | NO ( ) | **EPS** | SI ( ) | NO ( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. HIGIENE POSTURAL. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS. USO DE EPP. CONTROL PYP POR SU EPS.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DIEGO FERNANDO SALAZAR APONTE
Especialidad: MEDICO EN MEDICINA LABORAL
CC: 1090369444 RM: 004536

Trabajador: DANIEL GUSTAVO CAÑAS VELANDIA
CC 13929587
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biométrica

Dirección: AV 2E # 5-35 LA CEIBA Teléfono: 5777177 - 5777188 - 5777199
Email: GERENCIA@IPSMEDCARE.COM

*Página 1 de 1*

I.P.S. MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.

*IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.*
*Nit. 900257281 - 1*
*Dirección: AV 2E # 5-23 LA CEIBA*
*Tel: 5777177 - 5777188 - 5777199*

**INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD**

| **Tipo certificación:** | Ingreso (X) | Periódico ( ) | Retiro ( ) | Post incapacidad ( ) | Caso ocupacional ( ) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Control ( ) | Reubicación ( ) | Ingreso al SVE ( ) | Trabajo en alturas ( ) | |

**DATOS DEL PACIENTE**

Fecha **22/12/2023 08:34:00** Empresa **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023**

Nombre **FERNANDO ALBERTO JAIMES NIÑO**

Cargo **RESIDENTE DE OBRA** Doc. Identidad **CC 13929675**

**SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS**

| | | |
|---|---|---|
| 1 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

| EXAMEN DE INGRESO | SI | NO |
|---|---|---|
| Sin restricciones para desempeñar el cargo | (X) | ( ) |
| Aplazado | ( ) | ( ) |
| Con restricciones para desempeñar el cargo | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en alturas | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en espacios confinados | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar con equipos de suministro de aire o auto contenido | ( ) | ( ) |
| Apto para participar en la brigada | ( ) | ( ) |
| Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista | ( ) | ( ) |

| EXAMEN PERIÓDICO | SI | NO |
|---|---|---|
| Sin restricciones para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones | ( ) | ( ) |
| Con restricciones para continuar desempeñando el cargo | ( ) | ( ) |
| Requiere reubicación laboral temporal | ( ) | ( ) |
| Requiere reubicación laboral permanente | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en alturas | ( ) | ( ) |
| Apto para trabajar en espacios confinados | ( ) | ( ) |

| EXAMEN DE RETIRO | SI | NO |
|---|---|---|
| Sospecha de enfermedad profesional | ( ) | ( ) |
| Secuelas de accidentes de trabajo | ( ) | ( ) |
| Enfermedad común | ( ) | ( ) |

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Visual ( ) Auditivo ( ) Respiratorio ( ) Cardiovascular ( ) Psicosocial ( ) Ergonómico ( ) Otros ( )

| **REMISIÓN** | SI ( ) | NO (X) | **ARL** | SI ( ) | NO ( ) | **EPS** | SI ( ) | NO ( ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. HIGIENE POSTURAL. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS. USO DE EPP. CONTROL PYP POR SU EPS.

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DIEGO FERNANDO SALAZAR APONTE
Especialidad: MEDICO EN MEDICINA LABORAL
CC: 1090369444 RM: 004536

Trabajador: FERNANDO ALBERTO JAIMES NIÑO
CC 13929675
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biométrica

Dirección: AV 2E # 5-23 LA CEIBA Teléfono: 5777177 - 5777188 - 5777199
Email: GERENCIA@IPSMEDCARE.COM

*Página 1 de 1*

I.P.S. MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.

***IPS MEDCARE DE COLOMBIA S.A.S.***
*Nit. 900257281 - 1*
*Dirección: AV 2E # 5-23 LA CEIBA*
*Tel: 5777177 - 5777188 - 5777199*

**INFORME MÉDICO OCUPACIONAL DE APTITUD**

| **Tipo certificación:** | Ingreso ⊗ | Periódico ○ | Retiro ○ | Post incapacidad ○ | Caso ocupacional ○ |
|---|---|---|---|---|---|
| | Control ○ | Reubicación ○ | Ingreso al SVE ○ | Trabajo en alturas ○ | |

**DATOS DEL PACIENTE**

Fecha **22/12/2023 09:08:00** Empresa **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023**

Nombre **HECTOR URIEL RIVERA ALARCON**

Cargo **PROFESIONAL HSEQ** Doc. Identidad **CC 88164992**

**SE PRACTICARON LOS SIGUIENTES PARACLÍNICOS**

| | | |
|---|---|---|
| 1 EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL INGRESO | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

| EXAMEN DE INGRESO | SI | NO |
|---|---|---|
| Sin restricciones para desempeñar el cargo | ⊗ | ○ |
| Aplazado | ○ | ○ |
| Con restricciones para desempeñar el cargo | ○ | ○ |
| Apto para trabajar en alturas | ○ | ○ |
| Apto para trabajar en espacios confinados | ○ | ○ |
| Apto para trabajar con equipos de suministro de aire o auto contenido | ○ | ○ |
| Apto para participar en la brigada | ○ | ○ |
| Apto para el requerimiento del cargo de la empresa o contratista | ○ | ○ |

| EXAMEN PERIÓDICO | SI | NO |
|---|---|---|
| Sin restricciones para continuar desempeñando el cargo sin limitaciones | ○ | ○ |
| Con restricciones para continuar desempeñando el cargo | ○ | ○ |
| Requiere reubicación laboral temporal | ○ | ○ |
| Requiere reubicación laboral permanente | ○ | ○ |
| Apto para trabajar en alturas | ○ | ○ |
| Apto para trabajar en espacios confinados | ○ | ○ |

| EXAMEN DE RETIRO | SI | NO |
|---|---|---|
| Sospecha de enfermedad profesional | ○ | ○ |
| Secuelas de accidentes de trabajo | ○ | ○ |
| Enfermedad común | ○ | ○ |

**PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA**

Visual ○ Auditivo ○ Respiratorio ○ Cardiovascular ○ Psicosocial ⊗ Ergonómico ⊗ Otros ○

| **REMISIÓN** | SI ○ | NO ⊗ | **ARL** | SI ○ | NO ○ | **EPS** | SI ○ | NO ○ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

HÁBITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. HIGIENE POSTURAL. REALIZAR PAUSAS ACTIVAS. USO DE EPP. CONTROL PYP POR SU EPS

Los resultados fueron consignados en una historia clínica ocupacional que reposará en nuestra IPS.

DIEGO FERNANDO SALAZAR APONTE
Especialidad: MEDICO EN MEDICINA LABORAL
CC: 1090369444 RM: 004536

Trabajador: HECTOR URIEL RIVERA ALARCON
CC 88164992
Declaro que todos los datos registrados corresponden a la verdad

Captura Biométrica


Dirección: AV 2E # 5-23 LA CEIBA Teléfono: 5777177 - 5777188 - 5777199
Email: GERENCIA@IPSMEDCARE.COM

*Página 1 de 1*

## 9.2 AFILIACION DEL PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presentan copias de las certificaciones de afiliación al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal de técnico y administrativo vinculado en el periodo del informe del contrato de interventoría.

### 9.2.1 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

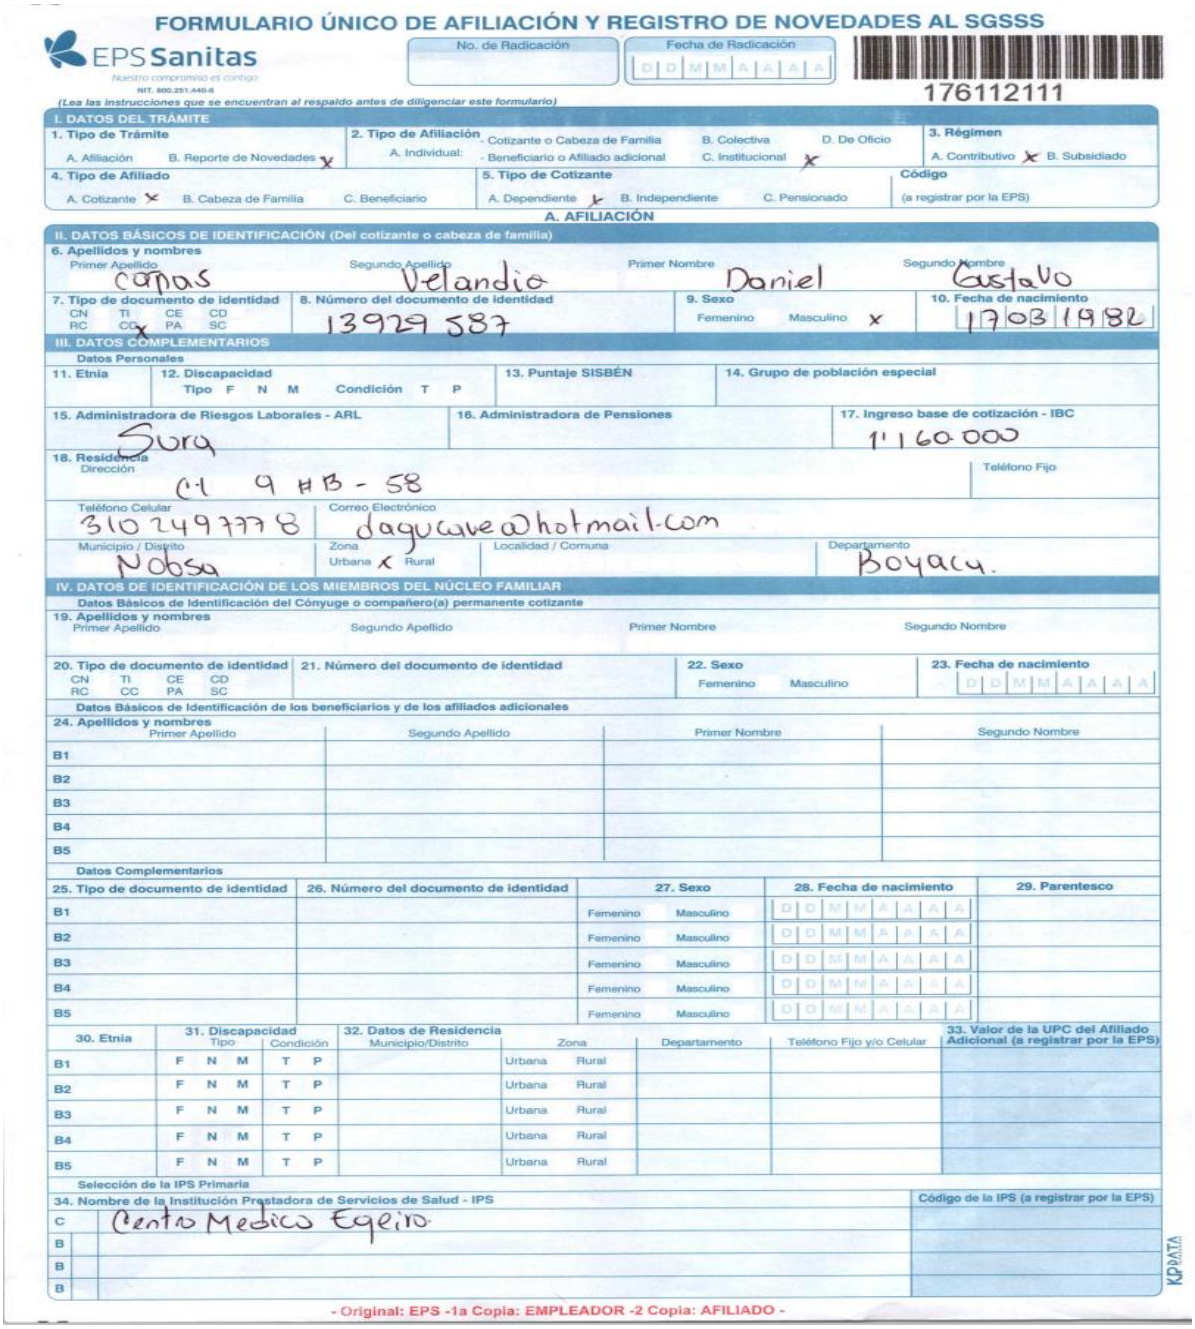

FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas — Nuestro compromiso es contigo — NIT. 800.251.440-6

No. de Radicación: 176112111 — Fecha de Radicación: D D M M A A A A

(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)

I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación — B. Reporte de Novedades: X
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia — B. Colectiva — D. De Oficio; - Beneficiario o Afiliado adicional — C. Institucional: X
3. Régimen: A. Contributivo: X — B. Subsidiado
4. Tipo de Afiliado: A. Cotizante: X — B. Cabeza de Familia — C. Beneficiario
5. Tipo de Cotizante: A. Dependiente: X — B. Independiente — C. Pensionado
Código (a registrar por la EPS)

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres
Primer Apellido: Capas — Segundo Apellido: Velandia — Primer Nombre: Daniel — Segundo Nombre: Gustavo
7. Tipo de documento de identidad: CN TI CE CD / RC CC: X PA SC
8. Número del documento de identidad: 13929 587
9. Sexo: Femenino — Masculino: X
10. Fecha de nacimiento: 17 03 1982

III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales
11. Etnia
12. Discapacidad: Tipo F N M — Condición T P
13. Puntaje SISBÉN
14. Grupo de población especial
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: Sura
16. Administradora de Pensiones
17. Ingreso base de cotización - IBC: 1'160.000
18. Residencia — Dirección: Cl 9 #B - 58 — Teléfono Fijo
Teléfono Celular: 3102497778 — Correo Electrónico: daguave@hotmail.com
Municipio / Distrito: Nobsa — Zona: Urbana: X Rural — Localidad / Comuna — Departamento: Boyacá.

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante
19. Apellidos y nombres: Primer Apellido — Segundo Apellido — Primer Nombre — Segundo Nombre
20. Tipo de documento de identidad: CN TI CE CD / RC CC PA SC
21. Número del documento de identidad
22. Sexo: Femenino — Masculino
23. Fecha de nacimiento: D D M M A A A A

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales
24. Apellidos y nombres: Primer Apellido — Segundo Apellido — Primer Nombre — Segundo Nombre
B1
B2
B3
B4
B5

Datos Complementarios

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo | 28. Fecha de nacimiento | 29. Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | Femenino Masculino | D D M M A A A A | |
| B2 | | | Femenino Masculino | D D M M A A A A | |
| B3 | | | Femenino Masculino | D D M M A A A A | |
| B4 | | | Femenino Masculino | D D M M A A A A | |
| B5 | | | Femenino Masculino | D D M M A A A A | |

| | 30. Etnia | 31. Discapacidad Tipo F N M | Condición T P | 32. Datos de Residencia Municipio/Distrito | Zona Urbana Rural | Departamento | Teléfono Fijo y/o Celular | 33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B2 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B3 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B4 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B5 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |

Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | Centro Medico Egeiro | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

- Original: EPS -1a Copia: EMPLEADOR -2 Copia: AFILIADO -

KPRATA

**V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO**

35. Nombre o razón social: Unión Temporal Interventoría Siembra 2023 | 36. Tipo documento de Identificación: NIT X, CC, TI, PA, CE, CD | 37. Número del documento de Identificación: 901.780.340 | 38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)

39. Ubicación — Dirección: Cl 9 # 13-58 San Miguel | Teléfono Fijo: 3124075238

Correo Electrónico | Municipio / Distrito: Cucuta. | Departamento: N.S.

**B. REPORTE DE NOVEDADES**

**40. Tipo de Novedad**

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: A. Régimen Contributivo / B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: A. Mismo Régimen / B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

**VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD**

**41. Datos básicos de identificación**
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad: CN RC TI CC CE PA CD SC | Número del documento de identidad | Sexo: Femenino Masculino | Fecha de nacimiento (D D M M A A A A) | **42. Fecha**: 14/12/2023

**43. EPS anterior**: Sanitas | **44. Motivo de traslado** Código | **45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones**

**VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES**

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

**VIII. FIRMAS**

**54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario**: DANIEL GUSTAVO CAÑAS VELANDIA

**55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio**: RONALD VIVAS M

**IX. ANEXOS**

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: CN RC TI CC PA CE CD SC — Cantidad — TOTAL
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

**X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL**

**66. Identificación de la Entidad Territorial** — Código del Municipio | Código del Departamento | **67. Datos del SISBÉN** — Número de ficha | Puntaje | Nivel | **68. Fecha de Radicación** (D D M M A A A A) | **69. Fecha de Validación** (D D M M A A A A)

**70. Datos del funcionario que realiza la validación**
Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento | Número de documento de identidad | **71. Firma del Funcionario**

**Observaciones:** Director Interventoría COTOEA 0001

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial: Julio Toledo | Sello de Radicación: Julio Toledo 03-01-2024 | Sticker: CF-480416 JULIO CESAR TOLEDO

nueva eps

CERTIFICA QUE:

El(La) Señor(a) EDISON BENAVIDES ZARATE identificado(a) con CC 91045632 se encuentra afiliado a la EPS en condición de 1° COTIZANTE.

| | |
|---|---|
| **Fecha de Activación de** | **01/03/2022** |
| **Estado de la Afiliación:** | **ACTIVO** |
| **IPS:** | **U.T. VIHONCO CEIMLAB - SEDE 1 CALLE 13 CONTRIBUTIVO** |
| **Categoría:** | **A** |

La presente certificación se expide a solicitud del(de la) interesado(a) en Bogotá para QUIEN INTERESE, a los 12 días del mes de enero del año 2024.

La certificación tiene validez de un mes con respecto a la fecha de generación.

**Observaciones:**

ESTA CERTIFICACIÓN NO APLICA PARA SERVICIOS MÉDICOS.
NO VÁLIDO PARA TRASLADO A OTRA EPS.

Cordialmente,

**Gerencia de Afiliaciones**
Nueva EPS S.A

## FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

EPS Sanitas
Nuestro compromiso es contigo
NIT. 800.251.440-6

No. de Radicación | Fecha de Radicación (D D M M A A A A)

176112129

*(Lea las instrucciones que se encuentran al respaldo antes de diligenciar este formulario)*

### I. DATOS DEL TRÁMITE

1. Tipo de Trámite: A. Afiliación — B. Reporte de Novedades **X**
2. Tipo de Afiliación: A. Individual: - Cotizante o Cabeza de Familia — B. Colectiva — D. De Oficio; - Beneficiario o Afiliado adicional — C. Institucional **X**
3. Régimen: A. Contributivo **X** — B. Subsidiado
4. Tipo de Afiliado: A. Cotizante **X** — B. Cabeza de Familia — C. Beneficiario
5. Tipo de Cotizante: A. Dependiente **X** — B. Independiente — C. Pensionado
Código (a registrar por la EPS)

**A. AFILIACIÓN**

### II. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (Del cotizante o cabeza de familia)

6. Apellidos y nombres

| Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|
| Jaimes | Niño | Fernando | Alberto. |

7. Tipo de documento de identidad: CN — TI — CE — CD — RC — CC **X** — PA — SC
8. Número del documento de identidad: 13.929.675.
9. Sexo: Femenino — Masculino **X**
10. Fecha de nacimiento: 29 05 1982

### III. DATOS COMPLEMENTARIOS

Datos Personales

11. Etnia
12. Discapacidad — Tipo F N M — Condición T P
13. Puntaje SISBÉN
14. Grupo de población especial
15. Administradora de Riesgos Laborales - ARL: Sura
16. Administradora de Pensiones
17. Ingreso base de cotización - IBC: 1'714.547
18. Residencia — Dirección: AV SA # 17A - 04 Tiemulinda — Teléfono Fijo
Teléfono Celular: 3144324 68 — Correo Electrónico: fechojaimes80@gmail.com
Municipio / Distrito: Cucuta — Zona: Urbana **X** Rural — Localidad / Comuna — Departamento: NDS

### IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

Datos Básicos de Identificación del Cónyuge o compañero(a) permanente cotizante

19. Apellidos y nombres: Primer Apellido — Segundo Apellido — Primer Nombre — Segundo Nombre
20. Tipo de documento de identidad: CN — TI — CE — CD — RC — CC — PA — SC
21. Número del documento de identidad
22. Sexo: Femenino — Masculino
23. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A)

Datos Básicos de Identificación de los beneficiarios y de los afiliados adicionales

| 24. Apellidos y nombres | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre |
|---|---|---|---|---|
| B1 | | | | |
| B2 | | | | |
| B3 | | | | |
| B4 | | | | |
| B5 | | | | |

Datos Complementarios

| | 25. Tipo de documento de identidad | 26. Número del documento de identidad | 27. Sexo | 28. Fecha de nacimiento (D D M M A A A A) | 29. Parentesco |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | | Femenino Masculino | | |
| B2 | | | Femenino Masculino | | |
| B3 | | | Femenino Masculino | | |
| B4 | | | Femenino Masculino | | |
| B5 | | | Femenino Masculino | | |

| | 30. Etnia | 31. Discapacidad Tipo (F N M) | Condición (T P) | 32. Datos de Residencia Municipio/Distrito | Zona (Urbana Rural) | Departamento | Teléfono Fijo y/o Celular | 33. Valor de la UPC del Afiliado Adicional (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B2 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B3 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B4 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |
| B5 | | F N M | T P | | Urbana Rural | | | |

Selección de la IPS Primaria

| | 34. Nombre de la Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS | Código de la IPS (a registrar por la EPS) |
|---|---|---|
| C | Centro Medico Cucuta | |
| B | | |
| B | | |
| B | | |

KPDATA

- Original: EPS -1a Copia: EMPLEADOR -2 Copia: AFILIADO -

**V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO**

35. Nombre o razón social: Unión Temporal Interventoria Siembra 2023 | 36. Tipo documento de Identificación: NIT X, CC, TI, PA, CE, CD | 37. Número del documento de identificación: 901.780.340 | 38. Tipo de aportante o pagador de Pensiones (a registrar por la EPS)

39. Ubicación — Dirección: Cl 9 # 13 - 58 San Miguel | Teléfono Fijo: 3124075238

Correo Electrónico | Municipio / Distrito: Cucuta | Departamento: NDS

**B. REPORTE DE NOVEDADES**

40. Tipo de Novedad

- [ ] 1. Modificación de datos básicos de identificación.
- [ ] 2. Corrección de datos básicos de identificación.
- [ ] 3. Actualización del documento de identidad.
- [ ] 4. Actualización y corrección de datos complementarios.
- [ ] 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código
- [ ] 6. Reinscripción en la EPS.
- [ ] 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.
- [ ] 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales
- [X] 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.
- [ ] 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando
- [ ] 11. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 12. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas
- [ ] 13. Movilidad: [ ] A. Régimen Contributivo [ ] B. Régimen Subsidiado
- [ ] 14. Traslado: [ ] A. Mismo Régimen [ ] B. Diferente Régimen
- [ ] 15. Reporte de fallecimiento.
- [ ] 16. Reporte del trámite de protección al cesante
- [ ] 17. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
- [ ] 18. Reporte de la calidad de Pensionado

**VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD**

41. Datos básicos de identificación — Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento de identidad: CN TI CE CD / RC CC PA SC | Número del documento de identidad | Sexo: Femenino Masculino | Fecha de nacimiento (D D M M A A A A) | 42. Fecha: 14/12/2023

43. EPS anterior: Sanitas | 44. Motivo de traslado — Código | 45. Caja de compensación Familiar o pagador de pensiones

**VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES**

- [ ] 46. Declaración de dependencia económica de los beneficiarios y afiliados adicionales.
- [ ] 47. Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción.
- [ ] 48. Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios.
- [ ] 49. Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud.
- [X] 50. Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales.
- [X] 51. Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte de novedades a la base de datos de afiliados vigente y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran.
- [X] 52. Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013.
- [X] 53. Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o al celular como mensajes de texto.

**VIII. FIRMAS**

54. El cotizante, cabeza de familia o beneficiario: Fernando A Jaimes

55. El empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institución o de oficio: RONALD VIVAS M

**IX. ANEXOS**

- [ ] 56. Anexo copia del documento de identidad: Cantidad | CN RC TI CC PA CE CD SC | TOTAL
- [ ] 57. Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente.
- [ ] 58. Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital.
- [ ] 59. Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de la unión marital.
- [ ] 60. Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor.
- [ ] 61. Copia de la orden judicial o del acto administrativo de custodia.
- [ ] 62. Documento en que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres.
- [ ] 63. Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud.
- [ ] 64. Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
- [ ] 65. Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio.

**X. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL**

66. Identificación de la Entidad Territorial — Código del Municipio | Código del Departamento | 67. Datos del SISBÉN — Número de ficha | Puntaje | Nivel | 68. Fecha de Radicación (D D M M A A A A) | 69. Fecha de Validación (D D M M A A A A)

70. Datos del funcionario que realiza la validación — Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre

Tipo de documento | Número de documento de identidad | 71. Firma del Funcionario

Observaciones: Residente de Interventoria / Anexo doc Creacion de Empresa Persona Juridica. COT PEP

Recuerde que con la firma del formulario, el afiliado manifiesta la veracidad de la información registrada y de las declaraciones contenidas en el capítulo VII del formulario.

Doc. identificación y nombre del Ejecutivo Comercial | Sello de Radicación: 29-12-2023 | Sello de Recibimiento

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

## SOPORTE DE NOVEDADES DE REINGRESOS

nueva eps Radicado en Proceso
ASESOR COMERCIAL - 3102965675

nueva eps
gente cuidando gente
NIT 900.156.264-2

CÓDIGO ASESOR Y/O PROMOTOR: C2180

**AFILIACIÓN**

**I. DATOS BÁSICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)**

1. APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

| PRIMER APELLIDO | SEGUNDO APELLIDO | PRIMER NOMBRE | SEGUNDO NOMBRE |
|---|---|---|---|
| Rivera | Alarcon | Hector | Uriel |

| 2. TIPO DOCUMENTO | | | | | | | | | 3. DOCUMENTO DE IDENTIDAD | 4. SEXO | | 5. FECHA NACIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.C. | T.I. | X | C.E. | P.A. | C.D. | S.C. | P.E. | | 88164992 | F. | X | 23 | 07 | 1975 |

**II. DATOS COMPLEMENTARIOS**

| CIUDAD / MUNICIPIO | DEPARTAMENTO | TELÉFONO |
|---|---|---|
| Cucuta | Norte de Santander | |

| TELÉFONO MÓVIL | CORREO ELECTRÓNICO | CÓDIGO IPS |
|---|---|---|
| 3102830214 | Calle 2 N # 8-07 | 12563 |

**III. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES Y/O INDEPENDIENTE POR PRESTACIÓN DE SERVICIO O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA.**

| 35. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | 36. Tipo documento de identidad | | | | | | | 37. Número documento de identidad | DV | 38. Tipo de aportante o pagador de pensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.T. Interventoria Siembra 2023 | C.C. | C.E. | P.A. | C.D. | X | P.E. | | 901.780.340 | | |

| 40. UBICACIÓN O DIRECCIÓN | CIUDAD / MUNICIPIO | DEPARTAMENTO |
|---|---|---|
| Calle 9ff 13-58 San Miguel | Cucuta | Norte De Santander |

| TELÉFONO FIJO | TELÉFONO MÓVIL | CORREO ELECTRÓNICO |
|---|---|---|
| | 3124095238 | |

| FECHA INICIO DE RELACIÓN LABORAL | CARGO | SALARIO |
|---|---|---|
| 14 / 12 / 2023 | Inspector Social SST | $1.160.000 |

**IV. FIRMAS**

| 54. Firma de cotizante, cabeza de familia o beneficiario | 55. Firma y sello del empleador, aportante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio y/o independiente por prestación de servicio |
|---|---|
| Hector Rivera. | |

### 9.2.2 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**
En su condición de administradora del
**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**
NIT 800.224.808-8

**CERTIFICA QUE:**

**DANIEL GUSTAVO CAÑAS VELANDIA,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **13.929.587**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir**.

La presente certificación se expide el 19 de Febrero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Nit. 800.144.331-3 Filial de Grupo AVAL

porvenir
sólo hay uno

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.**
En su condición de administradora del
**FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR**
NIT 800.224.808-8

## CERTIFICA QUE:

**EDISON BENAVIDES ZARATE,** identificado(a) con cédula de ciudadanía **91.045.632**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.**

La presente certificación se expide el 12 de Enero del 2024.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes

**Tenga en cuenta:**

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

**LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **FERNANDO ALBERTO JAIMES NIÑO** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **13929675,** se encuentra afiliado/a desde **01/11/2018** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 19 de febrero de 2024.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Rosa Mercedes Nino Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Colpensiones

**LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**

**CERTIFICA QUE**

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **HECTOR URIEL RIVERA ALARCON** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **88164992,** se encuentra afiliado/a desde **01/10/2014** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 19 de febrero de 2024.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Rosa Mercedes Nino Amaya**
**Dirección de Afiliaciones**

**Nota:** Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

### 9.2.3 CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL – ARL

ARL | sura

Medellín, 26 de December de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER | | Clase: 5 | | Porcentaje Cotización: | 6.96 % |
| C13929587 | CAÑAS VELANDIA DANIEL GUSTAVO | 27/12/2023 | | n7I20362 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/12/2023 17:35:58 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.124.81, 192.230.104.5, 172.16.42.57

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

**CERTIFICADO DE AFILIACIÓN**

**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

**HACE CONSTAR QUE:**

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que, **EDISON BENAVIDES ZARATE** identificado con **CC** No. **91045632**, registra la siguiente información.

| Datos del Contratante | Datos de la Relación Laboral |
|---|---|
| INDEPENDIENTE CONTRATANTE NO AFILIADO (DECRETO 723/2013) - NI. 899999995 | **Fecha de afiliación:** 02/06/2021<br>**Fecha de inicio de cobertura:** 29/12/2023<br>**Estado Afiliación:** ACTIVO<br>**Fecha de inicio de Contrato:** 01/11/2023<br>**Fecha fin de Contrato:** 31/05/2024<br>**Tipo Vinculación:** TRABAJADOR INDEPENDIENTE 723<br>**Clase de Riesgo:** 5<br>**Cargo :** TRABAJADOR INDEPENDIENTE |

Recuerde que una vez cumplida la fecha fin de contrato, el sistema aplica de forma automática la novedad de retiro, por lo anterior, en caso de tener un nuevo contrato o prorroga deberá realizar la correspondiente novedad a través de nuestro portal www.positivaenlinea.gov.co, para continuar con la cobertura.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202401012653189.

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá D.C. a los 22 días del mes de febrero de 2024.

Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES**
**POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.**

ARL | sura

Medellín, 26 de December de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C13929675 | JAIMES NIÑO FERNANDO ALBERTO | 27/12/2023 | | 25235nl2 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/12/2023 17:37:07 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.124.81, 192.230.104.5, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 26 de December de 2023

**LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS**

**HACE CONSTAR:**

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023.

**A continuación se relacionan las fechas de afiliación**

| Número identificación | Nombre | Fecha inicio cobertura | Fecha fin cobertura | Código de transacción | Tipo Cotizante | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Centro de trabajo: | 0000000001 PRINCIPAL NORTE DE SANTANDER | | Clase: 5 | Porcentaje Cotización: | 6.96 % | |
| C88164992 | RIVERA ALARCON HECTOR URIEL | 27/12/2023 | | 18141721 | DEPENDIENTE | POR INICIAR |

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/12/2023 17:38:41 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 179.32.124.81, 192.230.104.5, 172.16.42.57

### 9.3 LISTADO DE PERSONAL RETIRADO

A la fecha del presente informe se realiza los retiros del personal que labora para la UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023.

### 9.3.1 EXÁMENES DE RETIRO

Se presenta la orden de examen de retiro del personal de la UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023.

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023

| | |
|---|---|
| Fecha | 30/04/2024 |
| De | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| Para | DANIEL GUSTAVO CAÑAS VELANDIA |

Con motivo de su desvinculación, le hacemos entrega de una **Orden de Examen Médico de Retiro,** debe dirigirse a la IPS SALUD EMPRESARIAL S.A.S, Ubicada calle 3 # 1e-09 Ceiba y se realice los exámenes de retiro correspondientes.

Esta evaluación médica tiene como finalidad conocer su condición de salud y debe solicitarse sin importar su razón de salida de nuestra empresa, por lo que la realización del mismo queda expresamente bajo su absoluta responsabilidad como trabajador.

Lo anterior da cumplimiento al Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 1072 del 2015, Ley 100 de 1993, Art. 3. Resolución 2346 de 2007

**Vigencia:** 5 días a partir de su terminación de su contrato laboral, presentar carta en la IPS asignada para la realización de los exámenes correspondientes.

| Daniel Cañas | 13.929.587 | |
|---|---|---|
| NOMBRE | CEDULA | FIRMA |

Atentamente,

RONALD GABRIEL VIVAS MALDONADO
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023
NIT: 901780340-3
EMPLEADOR

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023

| | |
|---|---|
| Fecha | 30/04/2024 |
| De | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| Para | FERNANDO ALBERTO JAIMES NIÑO |

Con motivo de su desvinculación, le hacemos entrega de una **Orden de Examen Médico de Retiro,** debe dirigirse a la IPS SALUD EMPRESARIAL S.A.S, Ubicada calle 3 # 1e-09 Ceiba y se realice los exámenes de retiro correspondientes.

Esta evaluación médica tiene como finalidad conocer su condición de salud y debe solicitarse sin importar su razón de salida de nuestra empresa, por lo que la realización del mismo queda expresamente bajo su absoluta responsabilidad como trabajador.

Lo anterior da cumplimiento al Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 1072 del 2015, Ley 100 de 1993, Art. 3. Resolución 2346 de 2007

**Vigencia:** 5 días a partir de su terminación de su contrato laboral, presentar carta en la IPS asignada para la realización de los exámenes correspondientes.

| Fernando Alberto Jaimes | 13.929.675 | Fernando Jaimes N |
|---|---|---|
| NOMBRE | CEDULA | FIRMA |

Atentamente,

Ronald Vivas M.

RONALD GABRIEL VIVAS MALDONADO
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023
NIT: 901780340-3
EMPLEADOR

UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023

| | |
|---|---|
| Fecha | 30/04/2024 |
| De | Área de Seguridad y Salud en el Trabajo |
| Para | HECTOR URIEL RIVERA ALARCON |

Con motivo de su desvinculación, le hacemos entrega de una **Orden de Examen Médico de Retiro,** debe dirigirse a la IPS SALUD EMPRESARIAL S.A.S, Ubicada calle 3 # 1e-09 Ceiba y se realice los exámenes de retiro correspondientes.

Esta evaluación médica tiene como finalidad conocer su condición de salud y debe solicitarse sin importar su razón de salida de nuestra empresa, por lo que la realización del mismo queda expresamente bajo su absoluta responsabilidad como trabajador.

Lo anterior da cumplimiento al Código Sustantivo del Trabajo, Decreto 1072 del 2015, Ley 100 de 1993, Art. 3. Resolución 2346 de 2007

**Vigencia:** 5 días a partir de su terminación de su contrato laboral, presentar carta en la IPS asignada para la realización de los exámenes correspondientes.

| Hector Uriel Rivera | 88.164.992 | |
|---|---|---|
| **NOMBRE** | **CEDULA** | **FIRMA** |

Atentamente,

RONALD VIVAS M.
RONALD GABRIEL VIVAS MALDONADO
UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023
NIT: 901780340-3
EMPLEADOR

## 9.4 PLANILLAS DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA Y REVIÓN DE PAGOS DEL CONTRATISTA DE OBRA

Se presentan copias de las planillas de pago al sistema de seguridad social salud, pensión y ARL del personal de obra y administrativo vinculado en el periodo del informe del contrato de interventoría. Y revisión de los pagos realizados por el contratista de obra

aportes en línea

### Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901780340 | 3 | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UT INTERV SIEMBRA | CALLE 9 # 13-58 SAN MIGUEL | CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | 5555555 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-03 | 2024-04 | 10000001958 | 9465319518 | E | 2024/04/09 | 2024/04/08 | BANCO DE BOGOTA | 0 | $1,336,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 13929587 | CAÑAS VELANDIA DANIEL GUSTAVO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF37 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 13929675 | JAIMES NIÑO FERNANDO ALBERTO | 25-14 | 30 | $1,714,547 | $274,400 | EPS005 | 30 | $1,714,547 | $68,600 | CCF37 | 30 | $1,714,547 | $68,600 | 14-11 | 30 | $1,714,547 | $119,400 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 8816499 | RIVERA ALARCON HECTOR URIEL | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF37 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | $4,314,547 | $690,400 | | | $4,314,547 | $172,600 | | | $4,314,547 | $172,600 | | | $4,314,547 | $300,400 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $690,400 | $0 | $0 | $690,400 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $482,400 | $0 | $0 | $482,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $0 | $0 | $208,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $300,400 | $0 | $0 | $300,400 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $300,400 | $0 | $0 | $300,400 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $172,600 | $0 | $0 | $172,600 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 3 | $172,600 | $0 | $0 | $172,600 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $172,600 | $0 | $0 | $172,600 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $52,000 | $0 | $0 | $52,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $120,600 | $0 | $0 | $120,600 |
| TOTAL | | | | 3 | $1,336,000 | $0 | $0 | $1,336,000 |

aportes en línea

## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 901780340 | 3 | UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | UT INTERV SIEMBRA | CALLE 9 # 13-58 SAN MIGUEL | CUCUTA-NORTE DE SANTANDER | 5555555 | SI |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-05 | 1000001185 | 9466759215 | E | 2024/05/10 | 2024/05/15 | BANCO DE BOGOTA | 5 | $1,341,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | | Nombres | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Codigo | Días | IBC | Aporte | Días | IBC | Aporte |
| 1 | CC | 13929587 | CAÑAS VELANDIA DANIEL GUSTAVO | 230301 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS005 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF37 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| 2 | CC | 13929675 | JAIMES NIÑO FERNANDO ALBERTO | 25-14 | 30 | $1,714,547 | $274,400 | EPS005 | 30 | $1,714,547 | $68,600 | CCF37 | 30 | $1,714,547 | $68,600 | 14-11 | 30 | $1,714,547 | $119,400 | 30 | $0 | $0 |
| 3 | CC | 88164992 | RIVERA ALARCON HECTOR URIEL | 25-14 | 30 | $1,300,000 | $208,000 | EPS037 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | CCF37 | 30 | $1,300,000 | $52,000 | 14-11 | 30 | $1,300,000 | $90,500 | 30 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 3)** | | | | | $4,314,547 | $690,400 | | | $4,314,547 | $172,600 | | | $4,314,547 | $172,600 | | | $4,314,547 | $300,400 | | $0 | $0 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $690,400 | $2,900 | $0 | $693,300 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | $482,400 | $2,000 | $0 | $484,400 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 1 | $208,000 | $900 | $0 | $208,900 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $300,400 | $1,300 | $0 | $301,700 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 3 | $300,400 | $1,300 | $0 | $301,700 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $172,600 | $700 | $0 | $173,300 |
| COMFANORTE | CCF37 | 890,500,516 | 3 | 3 | $172,600 | $700 | $0 | $173,300 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 3 | $172,600 | $800 | $0 | $173,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 1 | $52,000 | $300 | $0 | $52,300 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 2 | $120,600 | $500 | $0 | $121,100 |
| TOTAL | | | | 3 | $1,336,000 | $5,700 | $0 | $1,341,700 |

aportes en línea

## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 91045632 | | BENAVIDES ZARATE EDISON | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 12 # 13 32 | TIBU-NORTE DE SANTANDER | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-03 | 2024-03 | 552512928 | 94647190 17 | I | 2024/04/08 | 2024/04/03 | BANCOLOMBIA | 0 | $515,700 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| **Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)** | | | | | $1,453,850 | $232,700 | | | $1,453,850 | $181,800 | | | $0 | $0 | | | $1,453,850 | $101,200 | | $0 | $0 |
| **Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)** | | | | | $1,453,850 | $232,700 | | | $1,453,850 | $181,800 | | | $0 | $0 | | | $1,453,850 | $101,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: TIBU Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | $1,453,850 | $232,700 | | | $1,453,850 | $181,800 | | | $0 | $0 | | | $1,453,850 | $101,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 91045632 | BENAVIDES EDISON | 230301 | 30 | $1,453,850 | $232,700 | EPS037 | 30 | $1,453,850 | $181,800 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,453,850 | $101,200 | 0 | $0 | $0 |
| **Total** | **Afiliados( 1)** | | | | $1,453,850 | $232,700 | | | $1,453,850 | $181,800 | | | $0 | $0 | | | $1,453,850 | $101,200 | | $0 | $0 |

aportes en línea

## Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC 91045632 | | BENAVIDES ZARATE EDISON | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CARRERA 12 # 13 32 | TIBU-NORTE DE SANTANDER | 5555555 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2024-04 | 2024-04 | 636056743 | 9466051255 | I | 2024/05/09 | 2024/05/14 | BANCOLOMBIA | 5 | $518,000 |

**LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES**

| EMPLEADO | | | | | PENSION | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombres | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte |
| Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) | | | | | $1,453,850 | $232,700 | | | $1,453,850 | $181,800 | | | $0 | $0 | | | $1,453,850 | $101,200 | | $0 | $0 |
| Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados) | | | | | $1,453,850 | $232,700 | | | $1,453,850 | $181,800 | | | $0 | $0 | | | $1,453,850 | $101,200 | | $0 | $0 |
| Ciudad: TIBU Depto: NORTE DE SANTANDER ( 1 Afiliados) | | | | | $1,453,850 | $232,700 | | | $1,453,850 | $181,800 | | | $0 | $0 | | | $1,453,850 | $101,200 | | $0 | $0 |
| 1 | CC 91045632 | BENAVIDES EDISON | 230301 | 30 | $1,453,850 | $232,700 | EPS037 | 30 | $1,453,850 | $181,800 | | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 30 | $1,453,850 | $101,200 | 0 | $0 | $0 |
| Total Afiliados( 1) | | | | | $1,453,850 | $232,700 | | | $1,453,850 | $181,800 | | | $0 | $0 | | | $1,453,850 | $101,200 | | $0 | $0 |

**9.6 SEGUIMIENTO DE PLANES (SOCIOAMBIENTAL, CALIDAD, EMERGENCIA Y SEÑALIZACIÓN)**

Se realiza la revisión, seguimiento y aplicación de planes (Riesgo, Ambiental, Señalización, emergencia y calidad).

**RONALD GABRIEL VIVAS MALDONADO**
REPRESENTANTE LEGAL
**UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023**

## ANEXOS

**Anexo.** Pólizas iniciales contrato de interventoría.

**Anexo.** Pólizas actualizadas del contrato de interventoría

**Ver Anexo No. 1.** *BALANCE FISICO FINANCIERO OBRA - INTERVENTORIA*

**Ver *Anexo No. 2.*** *REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA*

**Ver *Anexo No. 3.*** *ESTADO FINANCIERO OBRA E INTERVENTORIA*

***Anexo*** *MPA-01-F-25 - Versión 3 (Lista de verificación del cumplimiento de criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas).*

# ANEXOS

# Anexo.

Pólizas iniciales contrato de interventoría.

## RECIBO DE CAJA No. 460132973

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

| AGENCIA | TRANSACCIÓN Nro. | FECHA DE RECAUDO | TIPO PAGADOR |
|---|---|---|---|
| CUCUTA QUINTA VELEZ | 460224738 | 12/12/2023 | ASEGURADO |
| NOMBRE PAGADOR<br>UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | | | C.C o NIT<br>901780340 |
| TOMADOR PÓLIZA<br>UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | | | |
| DETALLE DE PAGO<br>PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000070271 - NRO. ELECTRÓNICO 4602874739 | | | |
| VALOR EN LETRAS (en Pesos)<br>NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS | | | VALOR RECIBO<br>$ 96,529.00 |
| PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000070271 - ANEXO 0 AGENCIA CUCUTA QUINTA VELEZ, TOMADOR PÓLIZA: NIT-901780340 UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 . VALOR PAGADO $ 96,528.68 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 460224738 | | | |



FIRMA RECIBIDO PAGO

**RECIBO GENERADO POR: VILLAMIZAR CARO ZORAIDA**

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar. COLOMBIA 2022
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar. AMÉRICA LATINA 2021

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**4602874739**

## PÓLIZA No: 460 - 47 - 994000070271 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| FECHA DE EXPEDICIÓN | 12 | 12 | 2023 |
| FECHA DE IMPRESIÓN | 12 | 12 | 2023 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.780.340-3**

DIRECCIÓN: CL 9 13 58 BRR SAN MIGUEL CIUDAD: CUCUTA, NTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3124075238

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

| DESCRIPCION CONTRATO | AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|
| | CUMPLIMIENTO | 12/12/2023 | 30/04/2024 | 4,055,066.10 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 12/12/2023 | 31/12/2026 | 2,027,533.05 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 31/12/2023 | 31/12/2028 | 4,055,066.10 |

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900967858 - VIVAS&RIVERA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - PART: 60.00%
NIT 901294312 - M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S. - PART: 40.00%

BENEFICIARIOS
NIT 890505253 - CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. CMA1052-2023, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA N° LIC1032-2023, CUYO OBJETO ES: "ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO - ABARCO - PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ****10,137,665.25 | $ **********70,117 | $****11,000.00 | $ *******15,412 | $ **********96,529 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| ZORAIDA VILLAMIZAR CARO | 4884 | 100.00 |

| NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000460287473

**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADE207A0708F8795C

**Defensor del Consumidor Financiero:** Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 7919180
**Fax: (**601) 7919180 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
**Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento

GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CUCUTA QUINTA VELEZ COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000070271** ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.780.340-3**

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

**TEXTO ITEM 1**

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

CLIENTE

# Anexo.

Pólizas actualizadas del contrato de interventoría

## RECIBO DE CAJA No. 460133786

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre junto a ti!

| AGENCIA | TRANSACCIÓN Nro. | FECHA DE RECAUDO | TIPO PAGADOR |
|---|---|---|---|
| CUCUTA QUINTA VELEZ | 460225712 | 27/12/2023 | ASEGURADO |
| NOMBRE PAGADOR<br>UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | | | C.C o NIT<br>901780340 |
| TOMADOR PÓLIZA<br>UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | | | |
| DETALLE DE PAGO<br>PAGO POLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000070271 - NRO. ELECTRÓNICO 4602874739 | | | |
| VALOR EN LETRAS (en Pesos)<br>ONCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS | | | VALOR RECIBO<br>$ 11,899.00 |
| PAGO PÓLIZA DE CUMP. ENT. ESTATALES 994000070271 - ANEXO 1 AGENCIA CUCUTA QUINTA VELEZ, TOMADOR PÓLIZA: NIT-901780340 UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 . VALOR PAGADO $ 11,898.57 RELACIONADO CON EL NRO. DE RECIBO 460225712 | | | |



FIRMA RECIBIDO PAGO

**RECIBO GENERADO POR: VILLAMIZAR CARO ZORAIDA**

Aseguradora Solidaria de Colombia
NIT: 860.524.654-6

Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en Colombia — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar. COLOMBIA 2022
Somos la Novena Mejor Empresa para Trabajar en América Latina — Great Place To Work. Los Mejores Lugares para Trabajar. AMÉRICA LATINA 2021

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 - PATRICLSUSP09V4

**NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS**
**4602874739**

## PÓLIZA No: 460 - 47 - 994000070271 ANEXO: 1

AGENCIA EXPEDIDORA: **CUCUTA QUINTA VELEZ** COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: PRORROGA TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

| FECHA DE EXPEDICIÓN | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 27 | 12 | 2023 |

| FECHA DE IMPRESIÓN | DIA | MES | AÑO |
|---|---|---|---|
| | 27 | 12 | 2023 |

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE:: **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.780.340-3**

DIRECCIÓN: CL 9 13 58 BRR SAN MIGUEL CIUDAD: CUCUTA, NTE DE SANTANDER TELÉFONO: 3124075238

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: CONTRATO DE INTERVENTORIA

| DESCRIPCION CONTRATO | AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA |
|---|---|---|---|---|
| | CUMPLIMIENTO | 14/12/2023 | 30/08/2024 | 4,055,066.10 |
| | PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND | 14/12/2023 | 30/04/2027 | 2,027,533.05 |
| | CALIDAD DEL SERVICIO | 30/04/2024 | 30/04/2029 | 4,055,066.10 |

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900967858 - VIVAS&RIVERA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS - PART: 60.00%
NIT 901294312 - M.A.P.G. INGENIERIA CIVIL S.A.S. - PART: 40.00%

BENEFICIARIOS
NIT 890505253 - CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE INTERVENTORIA:

***OBJETO DE LA GARANTIA***

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE CONTRATO NO. CMA1052-2023, CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA N° LIC1032-2023, CUYO OBJETO ES: "ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO - ABARCO - PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.

| VALOR ASEGURADO TOTAL: | VALOR PRIMA: | GASTOS EXPEDICION: | IVA: | TOTAL A PAGAR: |
|---|---|---|---|---|
| $ ****10,137,665.25 | $ ***********9,999 | $*********0.00 | $ ********1,900 | $ ***********11,899 |

| NOMBRE INTERMEDIARIO | CLAVE | %PART |
|---|---|---|
| ZORAIDA VILLAMIZAR CARO | 4884 | 100.00 |

| NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO | %PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|

**MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN_HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX**

Las condiciones generales de su póliza se pueden descargar de nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES.
Aseguradora Solidaria pensando en su tranquilidad, lo invita a verificar la validez de esta póliza ingresando a nuestra Página Web www.solidaria.com.co en la opción SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

**FIRMA ASEGURADOR**

(415)7701861000019(8020)000000000007000460287473

Ronald Vivas M.
**FIRMA TOMADOR**

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CLIENTE

CADE207A0707F87E5B

**Defensor del Consumidor Financiero:** Manuel Guillermo Rueda Serrano *** Dirección:** Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá *** Teléfono:** (601) 7919180
**Fax: (**601) 7919180 *** Celular:** 312 342 6229 *** Correo electrónico:** defensoriasolidaria@gmail.com
**Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:**
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la información de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que será contactado para realizar el procedimiento
GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

# PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: CUCUTA QUINTA VELEZ COD. AGENCIA: 460 RAMO: 47 No PÓLIZA: **994000070271** ANEXO: 1

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: **UNION TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023** IDENTIFICACIÓN: NIT **901.780.340-3**

ASEGURADO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

BENEFICIARIO: **CORP AUTONOMA REGIONAL DE LA F CORPONOR** IDENTIFICACIÓN: NIT **890.505.253-4**

**TEXTO ITEM 1**

*** NOTA ACLARATORIA ***

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA, TIENE VIGENCIA DE 5 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO Y ENTREGA FINAL DE LA OBRA A ENTERA SATISFACCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO CUAL DEBERA SER REPORTADO OPORTUNAMENTE Y POR ESCRITO A ASEGURADORA SOLIDARIA.

SE REALIZA EL PRESENTE ANECO AMPLAINDO LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS SEGUN PRORROGA AL CONTRATO.

# Ver Anexo No. 1.

*BALANCE FISICO FINANCIERO OBRA – INTERVENTORIA*

**ANEXO 1. BALANCE FISICO - FINANCIERO DE OBRA E INTERVENTORIA**

MPA-01-F-07, 16/08/2022

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023

| CONTRATO DE OBRA No. LIC 1032-2023 | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 1052 -2023 | | | | PERIODO REPORTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIARA, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LIC 1032-2023, CUYO OBJETO ES: "ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO- ABARCO- PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".** | | | | | | | **DESDE:** | **21/03/2024** |
| **CONTRATISTA:** | FORESTAL CONSULTORES S.A.S. | **SUPERVISOR:** | SANDRA MILENA GOMEZ PEÑARANDA | **INTERVENTOR:** | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | **INFORME No.** | 3 | **HASTA:** | 30/04/2024 |

| ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO | | | | | | MODIFICACION O ADICIÓN | | | TOTAL CONTRATADO | | INFORME No. 1 14/12/2023- 13/01/2024 | | INFORME No. 2 14/04/2024-20/03/2024 | | INFORME No. 3 21/03/2024 - 30/04/2024 | | ACUMULADO EJECUTADO MENSUALMENTE | | % EJECUTADO | POR EJECUTAR | | % POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO ($) | VALOR ($) | +/- | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | | CANT | VALOR ($) | |
| **1** | **Diagnóstico y Acuerdo de Conservación** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| | Costos de diagnóstico y firma de acuerdo de conservación (incluye realizar una caracterización socioeconómica; descripción físico-biótica del área) | Unidad | 25 | $ 632.586,00 | $ 15.814.650,00 | | | | 25 | $ 15.814.650,00 | 25,00 | $ 15.814.650,00 | | | | | 25,00 | $ 15.814.650,00 | 100% | - | | |
| **2** | **Mano de obra** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| **2.1** | **Adecuación del lote** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Preparación terreno | Jornal | 450 | $ 86.394,00 | $ 38.877.300,00 | | | | 450 | $ 38.877.300,00 | 126,00 | $ 10.885.644,00 | 324,00 | $ 27.991.656,00 | | | 450,00 | $ 38.877.300,00 | 100% | - | | |
| | Construcción de canales | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | 21,00 | $ 1.814.274,00 | 54,00 | $ 4.665.276,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| **2.2** | **Establecimiento de sombrío (Plátano y maderables)** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Trazado de líneas de sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | | 200 | $ 17.278.800,00 | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 100% | - | | |
| | Acarreo siembra sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | 63,00 | $ 5.442.822,00 | 12,00 | $ 1.036.728,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Desinfección de colinos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 150 | $ 86.394,00 | $ 12.959.100,00 | | | | 150 | $ 12.959.100,00 | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 150,00 | $ 12.959.100,00 | 100% | - | | |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | | 100 | $ 8.639.400,00 | | | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100% | - | | |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| **2.3** | **Establecimiento de cacao** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Trazado | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | | 200 | $ 17.278.800,00 | | | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 100% | - | | |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | | |
| | Acarreo siembra cacao | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | | 100 | $ 8.639.400,00 | | | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100% | - | | |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | | 200 | $ 17.278.800,00 | | | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 100% | - | | |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | | 100 | $ 8.639.400,00 | | | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100% | - | | |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 25 | $ 86.394,00 | $ 2.159.850,00 | | | | 25 | $ 2.159.850,00 | | | | | 25,00 | $ 2.159.850,00 | 25,00 | $ 2.159.850,00 | 100% | - | | |
| | Otras labores | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Manejo del sombrío | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |
| | Mantenimiento drenajes | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.4** | **Insumos** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Semilla plátano (Colino de 1 kg) | Unidad | 30.000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | | | | 30.000 | $ 90.000.000,00 | | | 25.000,00 | $ 75.000.000,00 | 5.000,00 | $ 15.000.000,00 | 30.000,00 | $ 90.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Plántulas maderables (35 cm de altura y bolsa forestal de 4x8 pulgadas) | Unidad | 4000 | $ 2.800,00 | $ 11.200.000,00 | | | | 4000 | $ 11.200.000,00 | | | 4.000,00 | $ 11.200.000,00 | | | 4.000,00 | $ 11.200.000,00 | 100% | - | | |
| | Plántulas de Cacao (30 cm de altura min, Bolsa 5x12 pulgadas calibre 2) | Unidad | 30.000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | | | | 30.000 | $ 90.000.000,00 | | | | | 30.000,00 | $ 90.000.000,00 | 30.000,00 | $ 90.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Materia Orgánica Enriquecida | Kilo | 30.000 | $ 800,00 | $ 24.000.000,00 | | | | 30.000 | $ 24.000.000,00 | | | 25.000,00 | $ 20.000.000,00 | 5.000,00 | $ 4.000.000,00 | 30.000,00 | $ 24.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Urea | Kilo | 2500 | $ 4.600,00 | $ 11.500.000,00 | | | | 2500 | $ 11.500.000,00 | | | | | 2.500,00 | $ 11.500.000,00 | 2.500,00 | $ 11.500.000,00 | 100% | - | | |
| | Fertilizante compuesto | Kilo | 3750 | $ 4.500,00 | $ 16.875.000,00 | | | | 3750 | $ 16.875.000,00 | | | 2.500,00 | $ 11.250.000,00 | 1.250,00 | $ 5.625.000,00 | 3.750,00 | $ 16.875.000,00 | 100% | - | | |
| | Correctivo | Kilo | 5000 | $ 600,00 | $ 3.000.000,00 | | | | 5000 | $ 3.000.000,00 | | | 5.000,00 | $ 3.000.000,00 | | | 5.000,00 | $ 3.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Fungicida | Kilo | 75 | $ 45.000,00 | $ 3.375.000,00 | | | | 75 | $ 3.375.000,00 | | | 18,75 | $ 843.750,00 | 56,25 | $ 2.531.250,00 | 75,00 | $ 3.375.000,00 | 100% | - | | |
| | Insecticidas | Kilo | 50 | $ 56.000,00 | $ 2.800.000,00 | | | | 50 | $ 2.800.000,00 | | | 50,00 | $ 2.800.000,00 | | | 50,00 | $ 2.800.000,00 | 100% | - | | |
| | Herbicidas | Litro | 50 | $ 65.000,00 | $ 3.250.000,00 | | | | 50 | $ 3.250.000,00 | | | 50,00 | $ 3.250.000,00 | | | 50,00 | $ 3.250.000,00 | 100% | - | | |
| | Hidroretenedor | Kilo | 125 | $ 52.000,00 | $ 6.500.000,00 | | | | 125 | $ 6.500.000,00 | | | 50,00 | $ 2.600.000,00 | 75,00 | $ 3.900.000,00 | 125,00 | $ 6.500.000,00 | 100% | - | | |
| | Análisis suelos | Unidad | 25 | $ 155.000,00 | $ 3.875.000,00 | | | | 25 | $ 3.875.000,00 | | | | | 25,00 | $ 3.875.000,00 | 25,00 | $ 3.875.000,00 | 100% | - | | |
| | Kit de Fertilización Organica (Caneca de 200 Lt con tapa, Cal hidratada, Melaza, Sulfatos de cobre, Magnesio y Zinc, Borax, Harina de Pescado y de Hueso) | Unidad | 25 | $ 620.000,00 | $ 15.500.000,00 | | | | 25 | $ 15.500.000,00 | | | 25,00 | $ 15.500.000,00 | | | 25,00 | $ 15.500.000,00 | 100% | - | | |
| **2.5** | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Machete | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | | | 25 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | 100% | - | | |
| | Limas | Unidad | 25 | $ 7.000,00 | $ 175.000,00 | | | | 25 | $ 175.000,00 | | | 25,00 | $ 175.000,00 | | | 25,00 | $ 175.000,00 | 100% | - | | |
| | Azadón | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | | | | 25 | $ 800.000,00 | | | 25,00 | $ 800.000,00 | | | 25,00 | $ 800.000,00 | 100% | - | | |
| | Barra Agricola | Unidad | 25 | $ 80.000,00 | $ 2.000.000,00 | | | | 25 | $ 2.000.000,00 | | | 25,00 | $ 2.000.000,00 | | | 25,00 | $ 2.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Pala | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | | | 25 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | 100% | - | | |
| | Tijera de podar de 9" | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | | | | 25 | $ 800.000,00 | | | 25,00 | $ 800.000,00 | | | 25,00 | $ 800.000,00 | 100% | - | | |
| | Palín | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | | | 25 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | 100% | - | | |
| | Bomba de espalda de 20 Lt | Unidad | 25 | $ 400.000,00 | $ 10.000.000,00 | | | | 25 | $ 10.000.000,00 | | | 25,00 | $ 10.000.000,00 | | | 25,00 | $ 10.000.000,00 | 100% | - | | |
| **2.6** | **Transporte** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Fletes y transporte Terrestre (incluye transporte menor fluvial y mular si aplica) 5% del costo de los insumos | Global | 25 | $ 563.750,00 | $ 14.093.750,00 | | | | 25 | $ 14.093.750,00 | | | 17,00 | $ 9.583.750,00 | 8,00 | $ 4.510.000,00 | 25,00 | $ 14.093.750,00 | 100% | - | | |
| **2.7** | **Asistencia técnica** | | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Asistencia técnica | Global | 25 | $ 482.502,00 | $ 12.062.550,00 | | | | 25 | $ 12.062.550,00 | | | 12,50 | $ 6.031.275,00 | 12,50 | $ 6.031.275,00 | 25,00 | $ 12.062.550,00 | 100% | - | | |
| **COSTO DIRECTO** | | | | | **$ 539.702.150,00** | | | | | **$ 539.702.150,00** | | **$ 28.514.568,00** | | **$ 255.185.829,00** | | **$ 256.001.753,00** | | **$ 539.702.150,00** | | | **$ -** | |
| ADMINISTRACIÓN | | 18% | | | $ 97.146.375,00 | | | | | $ 97.146.375,00 | | 5132622,24 | | 45933449,22 | | 46080315,54 | | 97146387 | | | 0 | |
| IMPREVISTOS | | 1% | | | $ 5.397.025,00 | | | | | $ 5.397.025,00 | | 285145,68 | | 2551858,29 | | 2560017,53 | | 5397022 | | | 0 | |
| UTILIDADES | | 5% | | | $ 26.985.100,00 | | | | | $ 26.985.100,00 | | 1425728,4 | | 12759291,45 | | 12800087,65 | | 26985108 | | | 0 | |
| IVA sobre utilidad | | 19% | | | $ 5.127.175,00 | | | | | $ 5.127.175,00 | | 270888,40 | | 2424265,38 | | 2432016,654 | | 5127170 | | | 0 | |
| **COSTO INDIRECTO** | | | | | **$ 134.655.675,00** | | | | | **$ 134.655.675,00** | | **$ 7.114.384,72** | | **$ 63.668.864,34** | | **$ 63.872.425,95** | | **$ 134.655.675,00** | | | | |
| **VALOR TOTAL OBRA** | | | | | **$ 674.357.825,00** | | | | | **$ 674.357.825,00** | | **$ 35.628.952,72** | | **$ 318.854.693,34** | | **$ 319.874.178,95** | | **$ 674.357.825,00** | | | **$ -** | |
| **PORCENTAJE DE AVANCE OBRA** | | | | | | | | | | | | **5,28%** | | **47,28%** | | **47,43%** | | **100,00%** | | | **0,00%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **INTERVENTORIA** | | | | | **$ 34.076.186,00** | | | | | **$ 34.076.186,00** | | **$ 1.800.377,74** | | **$ 16.112.146,16** | | **$ 16.163.661,81** | | **$ 34.076.185,71** | | | **$ -** | |
| IVA Interventoria | | 19% | | | $ 6.474.475,00 | | $ - | | | $ 6.474.475,34 | | $ 342.071,77 | | $ 3.061.307,77 | | $ 3.071.095,74 | | $ 6.474.475,28 | | | $ - | |
| **SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO** | | | | | **$ 40.550.661,00** | | **$ -** | | | **$ 40.550.661,00** | | **$ 2.142.449,52** | | **$ 19.173.453,92** | | **$ 19.234.757,55** | | **$ 40.550.660,99** | | | **$ 0,01** | |
| **PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA** | | | | | | | | | | | | **5,28%** | | **47,28%** | | **47,43%** | | **100,00%** | | | **0,00%** | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PROYECTO :** | | | | | $ 714.908.486,00 | | | | | $ 714.908.486,00 | | $ 37.771.402,24 | | $ 338.028.147,26 | | $ 339.108.937,00 | | $ 714.908.485,99 | | | $ 0,01 | |
| **AVANCE TOTAL DEL PROYECTO (%) :** | | | | | | | | | | | | 5,28% | | 47,28% | | 47,43% | | 100,00% | | | 0,00% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ 714.908.486,50 | | | | |

**OBSERVACIONES:**

| | | |
|---|---|---|
| **FERNANDO ALBERTO JAIMES NIÑO** | **JOSE ALEXANDER SALAZAR GOYENECHE** | **DANIEL GUSTAVO CAÑAS VELANDIA** |
| RESIDENTE DE INTERVENTORIA | DIRECTOR DE OBRA | DIRECTOR DE INTERVENTORIA |

# Ver *Anexo No. 2.*
# *REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORIA*

| | | |
|---|---|---|
| Corponor<br>Cuidamos nuestro mundo | **ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA**<br>MPA-01-F-07, 16/08/2022 | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **21/03/2024 HASTA 30/04/2024** | | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA 1052 -2023** | | | |
| **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023** | | | |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, AL CONTRATO DE OBRARESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICAN° LIC1032-2023, CUYO OBJETOES: ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELASDEUNA (1) HECTÁREACADA UNA EN MODELOAGROFORESTAL (CACAO - ABARCO-PLÁTANO) COMOPROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.** | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL ITEM** | **ASISTENCIA TECNICA** | **DESDE:** | **21/03/2024** |
| | | **HASTA:** | **30/04/2024** |

| | | |
|---|---|---|
|  | |  |
| Supervisión en terreno | | Supervisión en terreno |
|  | |  |
| Supervisión en terreno | | Supervisión en terreno |

| | | |
|---|---|---|
| Corponor<br>Cuidamos nuestro mundo | **ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA**<br>MPA-01-F-07, 16/08/2022 | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 |

| | |
|---|---|
| **21/03/2024 HASTA 30/04/2024** | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA 1052 -2023** | |
| **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023** | |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, AL CONTRATO DE OBRARESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICAN° LIC1032-2023, CUYO OBJETOES: ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELASDEUNA (1) HECTÁREACADA UNA EN MODELOAGROFORESTAL (CACAO - ABARCO-PLÁTANO) COMOPROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DESCRIPCIÓN DEL ITEM** | **INSUMOS** | **DESDE:** | **21/03/2024** |
| | | **HASTA:** | **30/04/2024** |

| | | |
|---|---|---|
|  | |  |
| Entrega de plantula de Cacao | | Entrega de plantula de Cacao |
|  | |  |
| Entrega de plantula de Cacao | | Taller establecimiento de Cacao y socializacion de avance |

| | | |
|---|---|---|
| Corponor<br>Cuidamos nuestro mundo | **ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA**<br>MPA-01-F-07, 16/08/2022 | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 |

21/03/2024 HASTA 30/04/2024

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA 1052 -2023**

**UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO:** | **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, AL CONTRATO DE OBRARESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICAN° LIC1032-2023, CUYO OBJETOES: ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELASDEUNA (1) HECTÁREACADA UNA EN MODELOAGROFORESTAL (CACAO - ABARCO-PLÁTANO) COMOPROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.** | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL ITEM** | **ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL** | **DESDE:** | **21/03/2024** |
| | | **HASTA:** | **30/04/2024** |



PLATANO



PLANTULA DE ABARCO



PLANTULA DE CACAO



HECTAREA DE VICENTE ARIZA

| | | |
|---|---|---|
| Corponor<br>Cuidamos nuestro mundo | **ANEXO 2. REGISTRO FOTOGRAFICO INFORME DE INTERVENTORÍA**<br>MPA-01-F-07, 16/08/2022 | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **21/03/2024 HASTA 30/04/2024** | | | |
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMA 1052 -2023** | | | |
| **UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023** | | | |
| **OBJETO:** | **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, AL CONTRATO DE OBRARESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICAN° LIC1032-2023, CUYO OBJETOES: ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELASDEUNA (1) HECTÁREACADA UNA EN MODELOAGROFORESTAL (CACAO - ABARCO-PLÁTANO) COMOPROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER.** | | |
| **DESCRIPCIÓN DEL ITEM** | **ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL VEGETAL** | **DESDE:** | **21/03/2024** |
| | | **HASTA:** | **30/04/2024** |

| | | |
|---|---|---|
|  | |  |
| HECTAREA DE JOSE SILVA | | HECTAREA DE ALEXIS ORTEGA |
|  | |  |
| BENEFICIARIO ELIAS MANOSALVA | | HECTAREA DE ANA EMILIA HEREDIA |

# **Ver *Anexo No. 3.*** *ESTADO FINANCIERO OBRA E INTERVENTORIA*

Corponor
Cuidamos nuestro mundo

## ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, 16/08/2022

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023

| CONTRATO DE OBRA No. LIC 1032-2023 | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 1052 -2023 | | | | PERIODO REPORTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PROYECTO:** | **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIARA, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LIC 1032-2023, CUYO OBJETO ES: "ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO-ABARCO- PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".** | | | | | | | **DESDE:** | **21/03/2024** |
| **CONTRATISTA:** | FORESTAL CONSULTORES S.A.S. | **SUPERVISOR:** | SANDRA MILENA GOMEZ PEÑARANDA | **INTERVENTOR:** | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | **INFORME No.** | 3 | **HASTA:** | 30/04/2024 |

| ITEMS Y VALORES DEL CONTRATO | | | | | | MODIFICACION O ADICIÓN | | | TOTAL CONTRATADO | | ACTA PARCIAL No. 1 14/12/2023-20/03/2024 | | ACTA PARCIAL No. 2 14/01/2024- 20/03/2024 | | ACUMULADO EJECUTADO Y PAGADO EN ACTAS | | % PAGADO | POR COBRAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANT | VALOR UNITARIO ($) | VALOR ($) | +/- | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | CANT | VALOR ($) | | CANT | VALOR ($) |
| 1 | **Diagnóstico y Acuerdo de Conservación** | | | | | | | | | | | | | | - | | | | |
| | Costos de diagnóstico y firma de acuerdo de conservación (incluye realizar una caracterización socioeconómica; descripción físico-biótica del área) | Unidad | 25 | $ 632.586,00 | $ 15.814.650,00 | | | | 25 | $ 15.814.650,00 | 25,00 | $ 15.814.650,00 | | | 25,00 | $ 15.814.650,00 | 100% | - | |
| 2 | **Mano de obra** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | |
| 2.1 | **Adecuación del lote** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | |
| | Preparación terreno | Jornal | 450 | $ 86.394,00 | $ 38.877.300,00 | | | | 450 | $ 38.877.300,00 | 450,00 | $ 38.877.300,00 | | | 450,00 | $ 38.877.300,00 | 100% | - | |
| | Construcción de canales | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | |
| 2.2 | **Establecimiento de sombrío (Plátano y maderables)** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | |
| | Trazado de líneas de sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | | 200 | $ 17.278.800,00 | 200,00 | $ 17.278.800,00 | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 100% | - | |
| | Acarreo siembra sombrío | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | 63,00 | $ 5.442.822,00 | 12,00 | $ 1.036.728,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | |
| | Desinfección de colinos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 150 | $ 86.394,00 | $ 12.959.100,00 | | | | 150 | $ 12.959.100,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 150,00 | $ 12.959.100,00 | 100% | - | |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | | 100 | $ 8.639.400,00 | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100% | - | |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | |
| 2.3 | **Establecimiento de cacao** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | |
| | Trazado | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | |
| | Ahoyado | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | | 200 | $ 17.278.800,00 | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 100% | - | |
| | Aplicación correctivos | Jornal | 75 | $ 86.394,00 | $ 6.479.550,00 | | | | 75 | $ 6.479.550,00 | | | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 75,00 | $ 6.479.550,00 | 100% | - | |
| | Acarreo siembra cacao | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | | 100 | $ 8.639.400,00 | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100% | - | |
| | Siembra y resiembra | Jornal | 200 | $ 86.394,00 | $ 17.278.800,00 | | | | 200 | $ 17.278.800,00 | | | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 200,00 | $ 17.278.800,00 | 100% | - | |
| | Fertilización | Jornal | 100 | $ 86.394,00 | $ 8.639.400,00 | | | | 100 | $ 8.639.400,00 | | | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100,00 | $ 8.639.400,00 | 100% | - | |
| | Control manual de arvenses | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | |
| | Control plagas y enfermedades | Jornal | 25 | $ 86.394,00 | $ 2.159.850,00 | | | | 25 | $ 2.159.850,00 | | | 25,00 | $ 2.159.850,00 | 25,00 | $ 2.159.850,00 | 100% | - | |
| | Otras labores | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | |
| | Manejo del sombrío | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | |
| | Mantenimiento drenajes | Jornal | 50 | $ 86.394,00 | $ 4.319.700,00 | | | | 50 | $ 4.319.700,00 | | | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 50,00 | $ 4.319.700,00 | 100% | - | |

Corponor

## ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA

MPA-01-F-07, 16/08/2022

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023

| CONTRATO DE OBRA No. LIC 1032-2023 | | | | | | | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 1052 -2023 | | | | | | | | | | PERIODO REPORTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIARA, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LIC 1032-2023, CUYO OBJETO ES: "ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO-ABARCO- PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESDE: | 21/03/2024 |
| CONTRATISTA: | FORESTAL CONSULTORES S.A.S. | SUPERVISOR: | | | SANDRA MILENA GOMEZ PEÑARANDA | | | INTERVENTOR: | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | | | | | | | | INFORME No. | 3 | HASTA: | 30/04/2024 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | **Insumos** | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Semilla plátano (Colino de 1 kg) | Unidad | 30.000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | | | | 30.000 | $ 90.000.000,00 | 25.000,00 | $ 75.000.000,00 | 5.000,00 | $ 15.000.000,00 | 30.000,00 | $ 90.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Plántulas maderables (35 cm de altura y bolsa forestal de 4x8 | Unidad | 4000 | $ 2.800,00 | $ 11.200.000,00 | | | | 4000 | $ 11.200.000,00 | 4.000,00 | $ 11.200.000,00 | | | 4.000,00 | $ 11.200.000,00 | 100% | - | | |
| | Plántulas de Cacao (30 cm de altura min, | Unidad | 30.000 | $ 3.000,00 | $ 90.000.000,00 | | | | 30.000 | $ 90.000.000,00 | | | ####### | $ 90.000.000,00 | 30.000,00 | $ 90.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Materia Orgánica Enriquecida | Kilo | 30.000 | $ 800,00 | $ 24.000.000,00 | | | | 30.000 | $ 24.000.000,00 | 25.000,00 | $ 20.000.000,00 | 5.000,00 | $ 4.000.000,00 | 30.000,00 | $ 24.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Urea | Kilo | 2500 | $ 4.600,00 | $ 11.500.000,00 | | | | 2500 | $ 11.500.000,00 | | | 2.500,00 | $ 11.500.000,00 | 2.500,00 | $ 11.500.000,00 | 100% | - | | |
| | Fertilizante compuesto | Kilo | 3750 | $ 4.500,00 | $ 16.875.000,00 | | | | 3750 | $ 16.875.000,00 | 2.500,00 | $ 11.250.000,00 | 1.250,00 | $ 5.625.000,00 | 3.750,00 | $ 16.875.000,00 | 100% | - | | |
| | Correctivo | Kilo | 5000 | $ 600,00 | $ 3.000.000,00 | | | | 5000 | $ 3.000.000,00 | 5.000,00 | $ 3.000.000,00 | | | 5.000,00 | $ 3.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Fungicida | Kilo | 75 | $ 45.000,00 | $ 3.375.000,00 | | | | 75 | $ 3.375.000,00 | 18,75 | $ 843.750,00 | 56,25 | $ 2.531.250,00 | 75,00 | $ 3.375.000,00 | 100% | - | | |
| | Insecticidas | Kilo | 50 | $ 56.000,00 | $ 2.800.000,00 | | | | 50 | $ 2.800.000,00 | 50,00 | $ 2.800.000,00 | | | 50,00 | $ 2.800.000,00 | 100% | - | | |
| | Herbicidas | Litro | 50 | $ 65.000,00 | $ 3.250.000,00 | | | | 50 | $ 3.250.000,00 | 50,00 | $ 3.250.000,00 | | | 50,00 | $ 3.250.000,00 | 100% | - | | |
| | Hidroretenedor | Kilo | 125 | $ 52.000,00 | $ 6.500.000,00 | | | | 125 | $ 6.500.000,00 | 50,00 | $ 2.600.000,00 | 75,00 | $ 3.900.000,00 | 125,00 | $ 6.500.000,00 | 100% | - | | |
| | Análisis suelos | Unidad | 25 | $ 155.000,00 | $ 3.875.000,00 | | | | 25 | $ 3.875.000,00 | | | 25,00 | $ 3.875.000,00 | 25,00 | $ 3.875.000,00 | 100% | - | | |
| | Kit de Fertilización Organica (Caneca de 200 | Unidad | 25 | $ 620.000,00 | $ 15.500.000,00 | | | | 25 | $ 15.500.000,00 | 25,00 | $ 15.500.000,00 | | | 25,00 | $ 15.500.000,00 | 100% | - | | |
| 2.5 | **Herramientas** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Machete | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | | | 25 | $ 1.125.000,00 | 25,00 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | 100% | - | | |
| | Limas | Unidad | 25 | $ 7.000,00 | $ 175.000,00 | | | | 25 | $ 175.000,00 | 25,00 | $ 175.000,00 | | | 25,00 | $ 175.000,00 | 100% | - | | |
| | Azadón | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | | | | 25 | $ 800.000,00 | 25,00 | $ 800.000,00 | | | 25,00 | $ 800.000,00 | 100% | - | | |
| | Barra Agricola | Unidad | 25 | $ 80.000,00 | $ 2.000.000,00 | | | | 25 | $ 2.000.000,00 | 25,00 | $ 2.000.000,00 | | | 25,00 | $ 2.000.000,00 | 100% | - | | |
| | Pala | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | | | 25 | $ 1.125.000,00 | 25,00 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | 100% | - | | |
| | Tijera de podar de 9" | Unidad | 25 | $ 32.000,00 | $ 800.000,00 | | | | 25 | $ 800.000,00 | 25,00 | $ 800.000,00 | | | 25,00 | $ 800.000,00 | 100% | - | | |
| | Palín | Unidad | 25 | $ 45.000,00 | $ 1.125.000,00 | | | | 25 | $ 1.125.000,00 | 25,00 | $ 1.125.000,00 | | | 25,00 | $ 1.125.000,00 | 100% | - | | |
| | Bomba de espalda de 20 Lt | Unidad | 25 | $ 400.000,00 | $ 10.000.000,00 | | | | 25 | $ 10.000.000,00 | 25,00 | $ 10.000.000,00 | | | 25,00 | $ 10.000.000,00 | 100% | - | | |
| 2.6 | **Transporte** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Fletes y transporte Terrestre (incluye | Global | 25 | $ 563.750,00 | $ 14.093.750,00 | | | | 25 | $ 14.093.750,00 | 17,00 | $ 9.583.750,00 | 8,00 | $ 4.510.000,00 | 25,00 | $ 14.093.750,00 | 100% | - | | |
| 2.7 | **Asistencia técnica** | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | Asistencia técnica | Global | 25 | $ 482.502,00 | $ 12.062.550,00 | | | | 25 | $ 12.062.550,00 | 12,50 | $ 6.031.275,00 | 12,50 | $ 6.031.275,00 | 25,00 | $ 12.062.550,00 | 100% | - | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | - | | | - | | |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | **$ 539.702.150,00** | | | | | **$ 539.702.150,00** | | **$ 283.700.397,00** | | **$ 256.001.753,00** | | **$ 539.702.150,00** | | | | **$ -** |
| | ADMINISTRACIÓN | | | 18% | $ 97.146.375,00 | | | | | $ 97.146.375,00 | | 51066071,46 | | 46080315,54 | | 97146387 | | | | 0 |
| | IMPREVISTOS | | | 1% | $ 5.397.025,00 | | | | | $ 5.397.025,00 | | 2837003,97 | | 2560017,53 | | 5397021,5 | | | | 0 |
| | UTILIDADES | | | 5% | $ 26.985.100,00 | | | | | $ 26.985.100,00 | | 14185019,85 | | 12800087,65 | | 26985107,5 | | | | 0 |
| | IVA sobre utilidad | | | 19% | $ 5.127.175,00 | | | | | $ 5.127.175,00 | | 2695153,77 | | 2432016,654 | | 5127170,43 | | | | 0 |
| | **COSTO INDIRECTO** | | | | **$ 134.655.675,00** | | | | | **$ 134.655.675,00** | | **$ 70.783.249,05** | | **$ 63.872.425,95** | | **$ 134.655.675,00** | | | | |
| | **VALOR TOTAL OBRA** | | | | **$ 674.357.825,00** | | | | | **$ 674.357.825,00** | | **$ 354.483.646,05** | | **$ 319.874.178,95** | | **$ 674.357.825,00** | | | | **$ -** |
| | **PORCENTAJE DE AVANCE OBRA** | | | | | | | | | | | **52,57%** | | **47,43%** | | **100,00%** | | | | **0,00%** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **INTERVENTORIA** | | | | **$ 34.076.186,00** | | | | | **$ 34.076.186,00** | | **$ 17.912.523,90** | | **$ 16.163.661,81** | | **$ 34.076.185,71** | | | | |
| | IVA Interventoria | | | 19% | $ 6.474.475,00 | | | $ - | | $ 6.474.475,00 | | $ 3.403.379,54 | | $ 3.071.095,74 | | $ 6.474.475,28 | | | | |
| | **SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO** | | | | **$ 40.550.661,00** | | | **$ -** | | **$ 40.550.661,00** | | **$ 21.315.903,44** | | **$ 19.234.757,55** | | **$ 40.550.660,99** | | | | **$ 0,01** |
| | **PORCENTAJE DE AVANCE INTERVENTORIA** | | | | | | | | | | | **52,57%** | | **47,43%** | | **100,00%** | | | | **0,00%** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL PROYECTO :** | | | | | $ 714.908.486,00 | | | | | $ 714.908.486,00 | | $ 375.799.549,49 | | $ 339.108.936,50 | | $ 714.908.485,99 | | | | $ 0,01 |
| | | | | | | | | | | | | 52,57% | | 47,43% | | 100% | | | | 0,0% |

**OBSERVACIONES:**

**FERNANDO ALBERTO JAIMES NIÑO**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

**JOSE ALEXANDER SALAZAR GOYENECHE**
DIRECTOR DE OBRA

**DANIEL GUSTAVO CAÑAS VELANDIA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

**ANEXO 3. RELACIÓN DE PAGOS OBRA E INTERVENTORIA**
MPA-01-F-07, 16/08/2022

UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023

| CONTRATO DE OBRA No. LIC 1032-2023 | | | | CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA 1052 -2023 | | | | PERIODO REPORTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROYECTO: | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIARA, AL CONTRATO DE OBRA RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N° LIC 1032-2023, CUYO OBJETO ES: "ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO-ABARCO- PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER". | | | | | | | DESDE: | 21/03/2024 |
| CONTRATISTA: | FORESTAL CONSULTORES S.A.S. | SUPERVISOR: | SANDRA MILENA GOMEZ PEÑARANDA | INTERVENTOR: | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORIA SIEMBRA 2023 | INFORME No. | 3 | HASTA: | 30/04/2024 |

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE OBRA**

**Valor inicial del contrato** **$** **674.357.825,00**
**Valor Adicional del contrato**
**Valor Total del contrato**

| No. Acta | Valor cobrado | Valor Acumulado | Saldo del contrato | % parcial ejecutado | % ejecutado acumulado | Periodo cobrado | | Fecha presentación del acta | Comprobante de egreso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Desde | Hasta | | | |
| 1 | $ 354.483.646,05 | $ 354.483.646,05 | $ 319.874.178,95 | 52,57% | 52,57% | 14/12/2023 | 20/03/2024 | 23/04/2024 | 1035 | |
| 2 | $ 319.874.178,95 | $ 674.357.825,00 | $ - | 47,43% | 100,00% | 21/03/2024 | 30/04/2024 | | | |
| | $ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATISTA DE ITERVENTORIA**

**Valor inicial del contrato** **$** **40.550.661,00**
**Valor Adicional del contrato** **$** **-**
**Valor Total del contrato** **40550661**

| No. Acta | Valor cobrado | Valor Acumulado | Saldo del contrato | % parcial ejecutado | % ejecutado acumulado | Periodo cobrado | | Fecha presentación del acta | Comprobante de egreso | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Desde | Hasta | | | |
| 1 | $ 21.315.903,44 | $ 21.315.903,44 | $ 19.234.757,56 | 52,57% | 52,57% | 14/12/2023 | 20/03/2024 | 23/04/2024 | 1010 | |
| 2 | $ 19.234.757,55 | $ 40.550.660,99 | $ (0,01) | 47,43% | 100,00% | 21/03/2024 | 30/04/2024 | | | |
| | $ - | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**FERNANDO ALBERTO JAIMES NIÑO**
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

**JOSE ALEXANDER SALAZAR GOYENECHE**
DIRECTOR DE OBRA

**DANIEL GUSTAVO CAÑAS VELANDIA**
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

# *Anexo*

*MPA-01-F-25 - Versión 3 (Lista de verificación del cumplimiento de criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en obras públicas).*

## LISTA DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MANEJO AMBIENTAL EN OBRAS PUBLICAS

MPA-01-F-25 - Versión 3 - 21/09/2021

**Mensualmente se verificará el estado de cumplimiento de los criterios de seguridad, salud en el trabajo y manejo ambiental en las obras públicas ejecutadas por la Corporación.**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO N° Y FECHA** | No. LIC 1032-2023 |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | ESTABLECIMIENTO DE 25 PARCELAS DE UNA (1) HECTÁREA CADA UNA EN MODELO AGROFORESTAL (CACAO - ABARCO-PLÁTANO) COMO PROYECTOS PRODUCTIVOS ALTERNATIVOS Y SOSTENIBLES CON COMUNIDADES RURALES DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. |
| **CONTRATISTA** | FORESTAL CONSULTORES S.A.S BIC |
| **INTERVENTOR** | UNIÓN TEMPORAL INTERVENTORÍA SIEMBRA 2023 |
| **SUPERVISOR** | SANDRA MILENA GÓMEZ PEÑARANDA |

| | GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **Variable de control** | **Criterio de aceptabilidad** | **Frecuencia de control** | **Responsable del control** | **Registro** | **VERIFICACIÓN** | | | | OBSERVACIONES |
| | | | | | | **Fecha de inspección:** | **Registro de verificación** | | | |
| | | | | | | | C | N/C | N/A | |
| **1** | **SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** | | | | | | | | | |
| **1.1** | Afiliación al personal de la obra al Sistema de Seguridad Social (ARL, EPS, PENSIÓN y PARAFISCALES) y pagos correspondientes. | * Todo el personal de la obra debe estar afiliado al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales.<br>* El empleador realizará oportunamente los pagos al Sistema de Seguridad Social. (Nota: Los primeros 5 días de cada mes) | Antes y durante la ejecución de la obra. | Residente de Obra e interventoría | Planillas de afiliación al Sistema de Seguridad Social y Planilla de pagos mensuales de la seguridad social. | **30-Apr-24** | **X** | | | |
| **1.2** | Inducción a los trabajadores sobre la exposición a los peligros. | Conocimiento del PLAN DE CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | Al ingreso del personal | Residente de Obra e interventoría | Registro de asistencia | **30-Apr-24** | **X** | | | |
| **1.3** | Entrega de EPP y capacitación del uso de los mismos. | * Todo el personal de la obra debe estar dotado de EPP que correspondan a la actividad que realizan y capacitarlo en el uso adecuado de los mismos. | Al ingreso y durante la ejecución de la obra. | Residente de Obra e interventoría | Planilla de entrega de EPP / Capacitación del uso de los EPP. | **30-Apr-24** | **X** | | | |
| **1.4** | Exámenes de ingreso y retiro | Todo el personal de la obra antes de su ingreso se le realizará Examen de ingreso y al retirarse se le realizará Examen de retiro. | Al ingreso y al retiro de la obra. | Residente de Obra e interventoría | Exámenes de ingreso y Exámenes de retiro. | **30-Apr-24** | **X** | | | |
| **1.5** | Reporte e investigación de Accidente de trabajo | Reportar el accidente o incidente inmediatamente suceda al jefe inmediato.<br>Investigar la causa real y las condiciones en que se dio.<br>Nota: La ARL solo reconoce los accidentes que se reporten dentro de las 48 horas siguientes. | Al momento de ocurrir un Accidente de trabajo ó Incidente de trabajo. | Residente de Obra e interventoría | Reporte ante la ARL del Accidente de trabajo y Registro de la investigación del accidente sea a la ARL ó propio de la empresa. | | | | **X** | |
| **1.6** | Reporte e investigación de Incidente de trabajo | | | | | | | | **X** | |
| **1.7** | Demarcación y señalización de áreas de trabajo | Informar a las personas en general y en especial a los usuarios de las áreas existentes. Una adecuada señalización permitirá disminuir el riesgo de accidentes, | Al inicio y durante la ejecución de la obra. | Residente de Obra e interventoría | Capacitación al personal de la obra y Registro fotográfico. | **30-Apr-24** | **x** | | | |
| **2** | **PLAN DE EMERGENCIA** | | | | | | | | | |
| **2.1** | Capacitación plan de emergencia en caso de evacuación. | Todo el personal debe tener conocimiento de cómo actuar al momento de una emergencia en caso de evacuación. | En la inducción al personal | Ingeniero Residente de obra, y de interventoría | Registro de capacitación | **30-Apr-24** | **X** | | | |
| **2.2** | Ocurrencia de un evento | Diligenciar informe de reporte. | Cuando ocurra el evento. | Residente de Obra | Informe con VoBo de interventoría | | | | **X** | |
| **3** | **PELIGRO A CONTROLAR:** | **POLITRAUMATISMO, GOLPES, CONTUSIONES, CAÍDA DE OBJETOS, ACCIDENTES .** | | | | | | | | |
| **3.1** | Uso de los elementos de protección personal de acuerdo a la actividad. | * Todo el personal de la obra debe portar adecuadamente los EPP de acuerdo a la actividad que realicen. * Realizar capacitación al personal en el uso de los EPP. | Al ingreso del personal y antes del inicio de la actividad y durante la ejecución de la actividad. | Residente de Obra e interventoría | Planilla entrega de dotación de los EPP por trabajador y Registro de capacitación del uso de los EPP. | **30-Apr-24** | **X** | | | |

| No. | Variable de control | Criterio de aceptabilidad | Frecuencia de control | Responsable del control | Registro | VERIFICACIÓN | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fecha de inspección: | Registro de verificación | | | |
| | | | | | | | C | N/C | N/A | |
| 3.2 | Autocuidado | Capacitación en higiene postural y manejo de cargas | Al ingreso del personal y antes del inicio de la actividad y durante la ejecución de la actividad. | Residente de Obra e interventoría | Registro de capacitación y registro fotográfico. | 30-Apr-24 | X | | | |
| 4 | PELIGRO A CONTROLAR: | MATERIAL PARTICULADO EN SUSPENSIÓN DURANTE OPERACIONES (POLVO POR SOLDADURAS, CORTE DE LADRILLO , CORTE CERÁMICA , DEMOLICIÓN, PARTICULAS DE CEMENTO). | | | | | | | | |
| 4.1 | Uso obligatorio del tapabocas, y protección visual. | Todo el personal que realice actividades donde se genere dispersión de partículas, debe usar debidamente el tapabocas y la protección visual. | Permanente | Residente de Obra e interventoría | Registro de capacitación del uso de los EPP y Registro fotográfico. | 30-Apr-24 | X | | | |
| 4.2 | Riego de agua sobre superficies polvorientas. | Las superficies con exceso de polvo se le debe hacer riego de agua. | Durante la ejecución de la obra. | Residente de Obra e interventoría | Registro fotográfico. | | | | X | |
| 5 | PELIGRO A CONTROLAR: | RIESGO DE ACCIDENTE POR ALMACENAMIENTO INADECUADO Y POR FALTA DE ORDEN Y ASEO. | | | | | | | | |
| 5.1 | Almacenamiento inadecuado de materiales en la obra | Disponer adecuadamente los materiales en obra. | Durante la ejecución de la obra. | Residente de Obra e interventoría | Capacitación al almacenista sobre el almacenamiento de materiales / Registro fotográfico. | | | | X | |
| 5.2 | Orden y aseo en la obra | Mantener limpio y ordenada la obra. | Periódicamente | Residente de Obra e interventoría | Anotación en la bitácora / Registro fotográfico. | 30-Apr-24 | X | | | |
| 6 | PELIGRO A CONTROLAR: | RIESGO ERGONÓMICO POR POSTURAS INADECUADAS Y MANEJO DE CARGAS. | | | | | | | | |
| 6.1 | Manejo de buenas posturas y manejo de cargas | * Aplicar la información dada en la capacitaciones referentes al manejo adecuado de cargas y las buenas posturas.<br>* Nota: La carga máxima será de 25 kilogramos de carga compacta; para las mujeres, será de 12,5 kilogramos de carga compacta (Resolución 2400 del 22/05 1979 Articulo 392). | Durante la ejecución de la obra. | Residente de Obra e interventoría | Capacitación al personal de obra en el Manejo adecuado de cargas y posturas. | 30-Apr-24 | X | | | |
| 7 | PELIGRO A CONTROLAR: | RIESGO DE TRABAJO EN ALTURA. | | | | | | | | |
| 7.1 | Trabajo Seguro en Alturas | * Desarrollar un procedimiento seguro para las actividades en altura, teniendo en cuenta los peligros y el análisis de tareas críticas, con el fin de asegurar la integridad física del personal involucrado en este proceso y otras condiciones que puedan verse afectadas (ambientales, bienes y particulares).<br>* Aplicable para todas las actividades que involucren trabajos en alturas, entendiéndose como toda labor o desplazamiento ejecutado a 1,5 m o más sobre un nivel inferior. | Durante la ejecución de la Actividad. | Residente de Obra e interventoría | Capacitación al personal de obra en el Trabajo en alturas, registro fotográfico | | | | X | |
| 7.2 | Capacitación y entrenamiento requerido para trabajos en alturas | Todo Trabajador o Supervisor que está expuesto recibirá inducción y debe evidenciar la certificación respectiva de acuerdo a:<br>Operativo nivel avanzado: actividades de alto riesgo .<br>Operativo nivel medio: labores en alturas asegurado con sistemas de tránsito vertical que no implique desplazamientos horizontales en alturas<br>Operativo nivel básico: trabaje en plataformas de acceso a los sitios de baja alturas protegidas por barandas.<br>Adicionalmente se le darán capacitaciones sobre elementos de protección personal para trabajo en alturas | Antes, durante la actividad | Residente de Obra e interventoría | Certificados del personal de obra y Supervisores que se involucren en trabajos en alturas, Asistencia de charlas de trabajo seguro / Registro Fotográfico | | | | X | |

| No. | Variable de control | Criterio de aceptabilidad | Frecuencia de control | Responsable del control | Registro | VERIFICACIÓN | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fecha de inspección: | Registro de verificación | | | |
| | | | | | | | C | N/C | N/A | |
| **8** | **PELIGRO A CONTROLAR:** | **MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS CON GRADO DE PELIGROSIDAD** | | | | | | | | |
| **8.1** | Manejo adecuado de sustancias químicas | * Obligatoriedad en uso de los elementos de protección personal requerido<br>* Adecuado rotulado de elementos químicos y almacenamiento de acuerdo a su peligrosidad.<br>* Las fichas de seguridad de las sustancias deben estar publicadas en sitios visibles.<br>* La disposición final de las sustancias peligrosas debe efectuarse de acuerdo lo dispuesto por la Entidad competente.<br>Nota: cuando aplica | Antes, durante y al finalizar el uso de los productos. | Residente de Obra e interventoría o personal calificado | Fichas de seguridad, Registro fotográfico. | | | | **X** | |
| | **MANEJO AMBIENTAL** | | | | | | | | | |
| **9** | **ASPECTO A CONTROLAR:** | **PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS POR LA EXPOSICIÓN AL RUIDO** | | | | | | | | |
| **9.1** | Criterios de valoración del ruido | Según la legislación colombiana los valores limites permitidos para el ruido dependerán del tiempo de exposición para ruido continuo y del número de impulsos, para ruidos de impacto. Este valor ha sido especificado por el gobierno colombiano, a través de las resoluciones 8321 de 1983 expedida por el Ministerio de Salud y la 1792 de 1990 expedida por los Ministerios de Salud y de Trabajo y Seguridad Social. | Cuando Aplique | Residente de obra/ Interventoría | Reporte de Decibeles | | | | **X** | |
| **9.2** | Normatividad relacionada con los riesgos derivados dela exposición al ruido | *Proteger a los trabajadores contra los riesgos de ruidos.<br>*Reducir al nivel mas bajo, técnica y razonablemente posible.<br>*Evaluar la exposición de los trabajadores * Realizar control medico auditivo (Audiometría).<br>*Proporcionar equipos de protección (tapones auditivos, tapa oídos).<br>*Acondicionar acústicamente los centros de trabajo. *Analizar y desarrollar un programa de medidas técnicas y organizativas en los puestos de trabajo, en los que el nivel diario equivalente sea superior a 90 dB (A) o el nivel pico supere a los 140 dB y señalizar dichos lugares. | *Señalización<br>*Formato de entrega de Elementos de Protección Personal.<br>*Registro de Exámenes médicos | Residente de obra/ Interventoría | Registro fotográfico y Documentos | | | | | |
| **10** | **ASPECTO A CONTROLAR:** | **GENERACIÓN DE AGUAS SERVIDAS.** | | | | | | | | |
| **10.1** | Disposición adecuada de las aguas que se generen | Aguas Residuales en Zona Urbana: Disponerla adecuadamente en el alcantarillado Municipal.<br>Aguas Residuales en Zona Rural: Si no se cuenta con alcantarillado, enviarlo a un campo de infiltración alejado de cuerpos de agua. | Semanalmente durante la ejecución de la obra. | Residente de obra/ Interventoría | Registro fotográfico. | | | | **X** | |
| **10.2** | Disposición adecuada de las aguas que se generen por el lavado de la herramienta, maquinaria y equipo | Enviarlo a un campo de infiltración alejado de cuerpos de agua, y el sedimento será tratado como escombro. | Cuando aplique | Residente de obra/ Interventoría | Registro fotográfico. | | | | **X** | |
| **11** | **ASPECTO A CONTROLAR:** | **GENERACIÓN DE RESIDUOS COMUNES, RESIDUOS DE COMIDA, EMPAQUES.** | | | | | | | | |
| **11.1** | Separación de residuos | Realizar separación de residuos generados y disponerlos adecuadamente dentro de recipientes debidamente marcados, identificando el tipo de residuo almacenado en cada uno de ellos. | Permanente | Residente de obra/ Interventoría | Registro fotográfico | **30-Apr-24** | **X** | | | |

| No. | Variable de control | Criterio de aceptabilidad | Frecuencia de control | Responsable del control | Registro | VERIFICACIÓN | | | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Fecha de inspección: | Registro de verificación | | | |
| | | | | | | | C | N/C | N/A | |
| 11.2 | Almacenamiento de residuos | Almacenar temporalmente los residuos generados en un lugar adecuado para ello: señalizado, demarcado, bajo cubierta, sobre estibas y con condiciones adecuadas de ventilación | Cada que se generen | Residente de obra/ Interventoría | Registro fotográfico | 30-Apr-24 | X | | | |
| 11.3 | Disposición final | En zona rural, transportarlo a la zona urbana; para su posterior entrega a la empresa de recolección de basuras. | Cada que se generen | Residente de obra/ Interventoría | Registro fotográfico | 30-Apr-24 | X | | | |
| 12 | ASPECTO A CONTROLAR: | GENERACIÓN DE RESIDUOS ESPECIALES Y PELIGROSOS. | | | | | | | | |
| 12.1 | Separación de residuos especiales y/o peligrosos | Realizar separación de residuos especiales y/o peligrosos y disponerlos adecuadamente en un lugar de la obra identificado y delimitado. | Cada que se generen | Residente de obra/ Interventoría | Registro fotográfico / Hojas de seguridad. | 30-Apr-24 | X | | | |
| 12.2 | Almacenamiento de residuos especiales y/o peligrosos | Almacenar temporalmente los residuos generados dentro de un lugar adecuado para ello: señalizado, demarcado, bajo cubierta, sobre estibas. | Cada que se generen | Residente de obra/ Interventoría | Registro fotográfico | 30-Apr-24 | X | | | |
| 12.3 | Disposición final | Entrega a la empresa avalada para la recepción de estos residuos. | Cada que se generen | Residente de obra/ Interventoría | Certificado de entrega de residuos expedido por la entidad encargada. | 30-Apr-24 | X | | | |
| 13 | ASPECTO A CONTROLAR: | DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL DE MOVIMIENTO DE TIERRA Ó ESCOMBROS. | | | | | | | | |
| 13.1 | Disposición final de residuos y escombros | Cargue: Al momento del cargue del material se debe señalizar el sitio de cargue donde esta el material y la volqueta.<br>Transporte: Al momento de transportarse el material al sitio de la disposición final, la volqueta se cubrirá completamente con una carpa asegurada a la volqueta, para impedir la dispersión del material.<br>Disposición final: Al momento del descargue el material se dispondrá adecuadamente, y si se requiere se apisonará y compactará.<br><br>Si el material se deposita en un botadero, este debe estar autorizado por la entidad competente del Municipio. | Cada que se deposite material en la escombrera | Ingeniero Residente de obra, y de interventoría | Registro fotográfico y Comprobante de la escombrera, cuando aplique. | | | | X | |
| 14 | ASPECTO A CONTROLAR: | USO DE AGREGADOS PÉTREOS | | | | | | | | |
| 14.1 | Material utilizado | Utilizar material sólo de sitios autorizados. | Antes de iniciar la extracción del material. | Ingeniero Residente de obra, y de interventoría | Licencia ambiental y/o titulo minero de donde se extraen los materiales (Cuando aplique, dependiendo del impacto) | | | | X | |
| 15 | ASPECTO A CONTROLAR: | USO DE AGUA | | | | | | | | |
| 15.1 | Uso adecuado del agua | Hacer sensibilización del uso adecuado del agua. | En la inducción al personal y durante la ejecución de la obra | Ingeniero Residente de obra, y de interventoría | Registro de capacitación y Registro fotográfico. | | | | X | |
| 16 | ASPECTO A CONTROLAR: | EMERGENCIAS POR DERRAME DE SUSTANCIAS QUIMICAS | | | | | | | | |
| 16.1 | Capacitación plan de emergencia en caso de derrame sustancia química. | Todo el personal debe tener conocimiento de cómo actuar al momento de una emergencia en caso de derrame sustancia química. | Cuando aplica (En las inducciones de personal) | Ingeniero Residente de obra, y de interventoría | Registro de capacitación | | | | X | |
| 17 | ASPECTO A CONTROLAR: | GENERACIÓN DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS POR COMBUSTIÓN DE MOTORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | | | | | |
| 17.1 | Mantenimiento de maquinaria y equipo | Que los equipos trabajen de manera aceptable y cuente con los registros de mantenimiento periódicos según su uso | Cada que se requiera | Residente de obra/ Interventoría | Anotación en la bitácora | | | | X | |
