INFORME MENSUAL N° 01

CONVENIO DE ASOCIACIÓN
No. 4196 – 10 – NOVIEMBRE - 2025
CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y MOVILLGAS S.A.S E.S.P PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAMO, TOLIMA".

PRESENTADO POR:
MOVILLGAS S.A.S E.S.P

PERIODO DE EJECUCIÓN
22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DEL 2026

AGOSTO DE 2026

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5
2. RESUMEN EJECUTIVO 6
3. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO - ANTECEDENTES CONTRACTUALES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4196 – 2025. 7
3.1 CONVENIO DE ASOCIACION No° 4196 DEL 10 DE NOVIEMBRE 2025. 7
3.2 POLIZAS DE SEGURO CONVENIO N° 4196 - 2025 9
3.3. APROBACIÓN DEL PROYECTO 9
4. CRONOGRAMA DE EJECUCION 10
6.1 Cronograma de ejecución inicial presentado con ocasión del acta de inicio, suscrita el 22 de julio de 2026. 10
4.2 Cronograma de ejecución proyectado. 11
5. ALCANCE CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 4196 DEL 10 DE NOVIEMBRE 2025. 12
6. AVANCE DE OBRA ÍTEMS - % EJECUCIÓN. (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO) 15
6.1 MAQUINARIA Y EQUIPO. 16
6.2 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE OBRA CONVENIO. 16
6.3 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES SST. 16
6.4 GESTIÓN AMBIENTAL. 16
Durante el periodo comprendido entre el 22 de julio y el 21 de agosto de 2026, se adelantaron las actividades de gestión ambiental asociadas a la ejecución del proyecto de gasificación rural domiciliaria, orientadas a prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos ambientales derivados de las actividades constructivas y logísticas desarrolladas. 16
6.4.1 COMPONENTE AMBIENTAL 17
6.4.2 IMPACTO GENERADOS EJECUCIÓN DE OBRA. 18
6.4.3 CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 18
6.4.4 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 19
7. GESTIÓN FINANCIERA. 21
7.1 DESCRIPCIÓN FINANCIERA. 21
7.2 SEGURIDAD SOCIAL 22
8 GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO. 23
8.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 23
8.1.1 LICENCIAS Y PERMISOS. 23
8.1.2 ACTAS, INFORMES Y OTROS. 23

8.2 GESTIÓN TÉCNICA. 23
8.2.1 LABORES REALIZADAS. 23
9 PLAN DE MEJORAMIENTO Y LECCIONES 24
Acciones y recomendaciones para el siguiente periodo 24
10 CONTROL DE VERSIONES 25
11 REGISTRO FOTOGRÁFICO. 26
12 LISTADO DE USUARIOS CONSTRUIDOS. 28
13 CONCLUSIONES 29
14 ANEXOS 30

LISTA DE ILUSTRACIONES

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Póliza de seguro Convenio 4196 - 2025 pág. **9**
Ilustración 2. Cronograma de ejecución inicial pág. **10**
Ilustración 3. Cronograma de ejecución proyectado pág. **11**
Ilustración 4. Presupuesto general por veredas pág. **12**
Ilustración 5. Porcentaje (%) de ejecución física y financiera pág. **15**

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Ficha técnica del proyecto pág. **9**
Tabla 2. Certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) pág. **9**
Tabla 3. Condiciones contractuales y alcances por ítem pág. **13**
Tabla 4. Modelo de aportes contractuales Convenio 4196 - 2025 pág. **14**
Tabla 5. Componente ambiental y medidas implementadas pág. **18**
Tabla 6. Impactos ambientales e infraestructura generados
Tabla 7. Control de ejecución de actividades de obra pág. **19**
Tabla 8. Descripción y resumen financiero del convenio pág. **21**
Tabla 9. Relación de licencias y permisos tramitados pág. **23**
Tabla 10. Listado de usuarios e instalaciones construidas pág. **28**

1. INTRODUCCIÓN

Entre los suscritos a saber: GOBERNACION DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 representado por SANDRA LILIANA GARCIA COBAS, en calidad de secretario de INFRAESTRUCTURA Y HABITAT, de conformidad con el decreto N° 0169 DE 9 DE FEBRERO DE 2023, delegado por la gobernadora para ejercer la función de ordenador del gasto, en nombre del departamento del Tolima, de conformidad con el decreto N° 0460 de AGOSTO 23 DE 2024, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, MOVILLGAS S.A.S E.S.P con NIT. 901.747.670-1 quien denominara EL COOPERANTE y declara que tiene capacidad para celebrar este convenio. con objeto: **"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAMO, TOLIMA".**

El convenio se firmó por un valor de **$ 3.367.255.838,61** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (M/CTE). El departamento del Tolima aporta **$2.802.965.685,96** DOS MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. y la empresa MOVILLGAS S.A.S E.S.P cofinancia **$564.290.152,65** QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.

El orden de inicio del convenio de asociación No. 4196 del 10 de noviembre de 2025, con un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) Días Calendario. Fue impartida según acta de inicio 22 de julio de 2026, obteniendo de esta manera la fecha de terminación para el convenio 4196 la cual corresponde al 18 de diciembre de 2026.

En el orden de inicio del convenio de asociación N° 4196 del 10 de noviembre de 2025, se brindará el beneficio a 576 familias de las veredas caracolí iguaes, pueblo nuevo, loma Luisa, badeo y cañada alta del municipio de Guamo-Tolima.

2. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el primer mes de ejecución del proyecto, comprendido entre el 22 de julio y el 21 de agosto de 2026, contado a partir de la suscripción del Acta de Inicio, se adelantaron las actividades iniciales necesarias para la puesta en marcha de las obras de instalación de las redes de distribución de gas natural domiciliario en las veredas Caracoli Iguaes, Pueblo Nuevo, Cañada Alta, Loma Luisa y Badeo**,** del municipio de Guamo, Tolima.

Durante este periodo se realizó la programación, adquisición y traslado de las tuberías y materiales requeridos para la ejecución de las obras objeto del convenio, así como la búsqueda y disposición de una bodega para el almacenamiento y custodia de los materiales destinados a la obra.

De igual manera, se efectuó el replanteo de las zonas de intervención, actividad necesaria para definir y verificar en campo los trazados proyectados y dar inicio a las actividades constructivas.


Finalmente, se dio inicio a la construcción de las redes internas y sus respectivos centros de medición en la vereda Pueblo Nuevo**,** constituyéndose en el primer frente de trabajo ejecutado durante el periodo objeto del presente informe.

Las actividades desarrolladas durante este primer mes permitieron establecer las condiciones logísticas, técnicas y operativas necesarias para la continuidad de la ejecución del proyecto y el desarrollo progresivo de los demás frentes de obra.

Al día de hoy las actividades de obra por parte de la empresa MOVILLGAS S.A.S E.S.P se encuentran en un porcentaje financiero del convenio del **1,13%** para lo cual ha realizado la construcción de redes internas y centros de medición en la vereda pueblo nuevo. Lo mencionado corresponde a las actividades pactadas y citadas dentro del convenio de asociación.

3. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO - ANTECEDENTES CONTRACTUALES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4196 – 2025.

3.1 CONVENIO DE ASOCIACION No° 4196 DEL 10 DE NOVIEMBRE 2025.

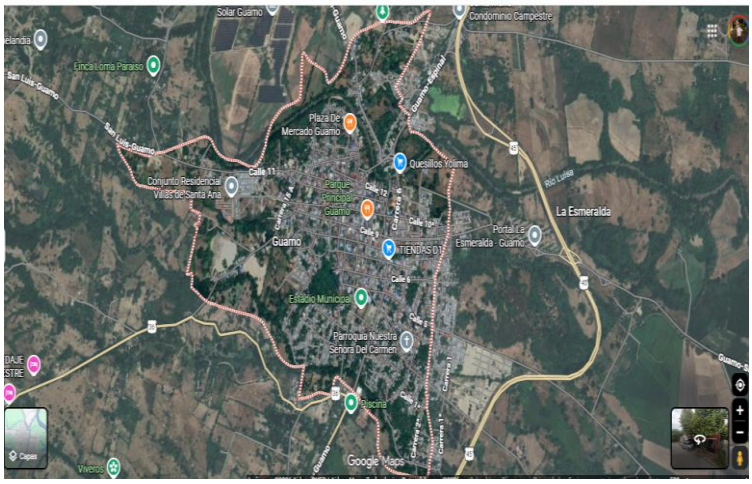CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 4196-2025:	"AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAMO, TOLIMA".
PERIODO INFORME	22 DE JULIO AL 21 DE AGOSTO DE 2026.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE GUAMO TOLIMA
MAPA DE UBICACIÓN	
CONTRATISTA	MOVILLGAS S.A.S E.S.P
INTERVENTORÍA	GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES S.A.S
SUPERVISIÓN	FERNANDO AUGUSTO BONILLA PORTILLO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	10 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR INICIAL CONVENIO	EL CONVENIO SE FIRMÓ POR UN VALOR DE **$ 3.367.255.838,61** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIO	EL CONVENIO SE REALIZARÁ DURANTE CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO. EL TERMINO QUE SE EMPEZARA A CONTAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO

	PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO.
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO	18 DE DICIEMBRE DE 2026
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	POLIZA N° 4401761 SURAMERICANA S. A
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	POLIZA N° I-13001045592 SURAMERICANA S.A
CDP GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	No. 5045 del SIAF DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RP GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	No. 16841 DEL 11 de diciembre de 2025.
APORTES	1. **GOBERNACION:** $2.802.965.685,96 DOS MIL OCHOCIENTOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE.
	2. **MOVILLGAS S.A.S E.S.P:** $564.290.152,65 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.
APORTES VALOR TOTAL DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN	**$ 3.367.255.838,61** TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (M/CTE)
CONEXIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	**576 USUARIOS**

Tabla 1. Ficha Técnica Del Proyecto

3.2 POLIZAS DE SEGURO CONVENIO N° 4196 - 2025

CONVENIO No.	MUNICIPIO	FECHA CONVENIO	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y MOVILLGAS S.A.S E.S.P. PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO" AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL GUAMO, TOLIMA."			VR. TOTAL DEL CONVENIO		POLIZAS LEGALIZACION CONVENIO	ACTUALIZACION AL ACTA DE INICIO DEL 22-JUL 2026	
4196	GUAMO TOL.	10/11/2025			$ 3.367.255.838,61			FECHA EXPEDICION POLIZAS 18 AGO.2026	
No. DE POLIZA	No. DOCTO	FECHA EXPEDICION	COBERTURAS	VIGENCIAS		PORCENTAJE %	VALOR ASEGURADO		VIGENCIAS	
				FECH INICIO	FECHA FINAL				FECHA INICIO	FECHA FINAL
4401761	16967647	21/11/2025	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICCIPO	2025-11-10	2026-10-07	100%	$ 1.401.482.843		2026-07-22	2027-06-19
4401761	16967647	21/11/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2025-11-10	2026-10-07	30%	$ 1.010.176.752		2026-07-22	2027-06-19
4401761	16967647	21/11/2025	ESTABILIDAD DE LA OBRA	2026-04-09	2031-04-09	30%	$ 1.010.176.752		2026-12-21	2031-12-21
4401761	16967647	21/11/2025	PAGOS DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2025-11-10	2029-04-09	5%	$ 168.362.792		2026-07-22	2026-12-21
I-13001045592	14190956	21/11/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO	2025-11-10	2026-04-09	200 SMLMV	$ 284.700.000		2026-07-22	2026-12-21
DURACION DE LA OBRA		150								
				APORTE GOBERNACION			$ 2.802.965.685,96			
				APORTE MOVILLGAS			$ 564.290.152,65			
						TOTAL	$ 3.367.255.838,61			

Ilustración 1. Póliza De Seguro Convenio 4196 – 2025

Una vez suscrito el Convenio, se adelantó el trámite correspondiente para la expedición de las pólizas requeridas para su legalización, las cuales fueron aprobadas el 21 de enero de 2026. Posteriormente, con ocasión de la suscripción del Acta de Inicio, se solicitó la actualización de las pólizas el 31 de julio de 2026. La documentación correspondiente a dicha actualización fue radicada ante la Gobernación del Tolima el 20 de agosto de 2026**,** para su respectiva revisión y aprobación.

3.3. APROBACIÓN DEL PROYECTO

Los recursos comprometidos en el convenio de asociación No. 4196 del 10 de noviembre del 2025 son cargo al presupuesto de la vigencia 2025, respectivo certificado de disponibilidad presupuestal de cada entidad:

ENTIDAD	CDP	FECHA	VALOR
GOBERNACION DEL TOLIMA	No. 5045	11-09-2025	$2.802.965.685,96
MOVILLGAS S.A.S E.S. P	Aportes Proyecto		$564.290.152,65
TOTAL, DISPONIBILIDAD			**$ 3.367.255.838,61**

Tabla 2. Disponibilidad Presupuestal

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION

6.1 Cronograma de ejecución inicial presentado con ocasión del acta de inicio, suscrita el 22 de julio de 2026.

El cronograma relacionado corresponde exclusivamente a la programación inicial del proyecto y se incorpora al presente informe como antecedente de la planificación establecida al inicio de la ejecución. La programación será actualizada periódicamente de acuerdo con el avance real de las actividades y los ajustes que se deriven del seguimiento a la ejecución contractual.

INICIAL FINAL

MOVILLGAS S.A.S ESP	AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GUAMO, TOLIMA. (Meses / Semanas)						PROGRAMACION INICIAL ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO. CONVENIO 4196																			
ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL ITEM	DURACION (dias)	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	JUL (22/07/2026 al 31/07/2026) MES 1				AGO (01/08/2026 al 31/08/2026) MES 2				SEP (01/09/2026 al 30/09/2026) MES 3				OCT (01/10/2026 al 31/10/2026) MES 4				NOV (01/11/2026 al 30/11/2026) MES 5				DIC (01/12/2026 al 18/12/2026) MES 6				EJECUCION ACUMULADA	OBSERVACIONES
							S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
ACTIVACION Y SOCIALIZACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				150	22/07/2026	18/12/2026																										
Replanteo de obra y verificacion de usuarios				20	23/07/2026	12/08/2026																										
Socializacion con las comunidades				4	28/07/2026	1/08/2026																										
Compra de materiales, transporte y acopio del mismo				15	23/07/2026	7/08/2026																										
REDES DE DISTRIBUCION																																
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	METRO LINEAL	64.543,35	$ 2.039.039.800,51	110	10/08/2026	6/12/2026					$ 88.457.005,12				$ 789.794.688,57				$ 769.794.688,57				$ 367.191.346,61				$ 3.802.071,63				$ 2.039.039.800,51	
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	METRO LINEAL	432,00	$ 37.321.465,36	60	20/09/2026	19/11/2026									$ 8.639.238,09				$ 21.598.070,23				$ 7.084.167,04								$ 37.321.465,36	
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	METRO LINEAL	7.213,00	$ -	60	20/08/2026	19/10/2026					$ -				$ -				$ -				$ -				$ -				$ -	
PASOS ESPECIALES																																
Pasos especiales	UND	4	$ 38.130.486,73	15	15/10/2026	30/10/2026													$ 38.130.486,73												$ 38.130.486,73	
Cruce dirigido y subfluvial	METRO LINEAL	51	$ 81.859.947,00	6	19/10/2026	25/10/2026													$ 81.859.947,00												$ 81.859.947,0	
Polivalvulas	UND	11	$ 8.468.861,1	22	16/11/2026	8/12/2026																	$ 4.619.378,78				$ 3.849.482,32				$ 8.468.861,10	
Señalizacion vertical	UND	19	$ 10.531.325,9	19	25/10/2026	13/11/2026													$ 5.542.803,12				$ 4.988.522,80								$ 10.531.325,92	
REDES INTERNAS																																
Redes Internas	UND	576	$ 616.134.672,0	120	10/08/2026	8/12/2026					$ 85.574.260,00				$ 128.361.390,00				$ 192.542.085,00				$ 160.451.737,50				$ 49.205.199,50				$ 616.134.672,0	
DERECHOS DE CONEXIÓN																																
Derecho de conexión	UND	576	$ 535.769.280,0	120	10/08/2026	8/12/2026					$ 74.412.400,00				$ 111.618.600,00				$ 167.427.900,00				$ 139.523.250,00				$ 42.787.130,00				$ 535.769.280,0	
Conexión al servicio	UND	576	0	50	28/10/2026	17/12/2026																										
TOTALES											$ 248.443.665				$ 1.038.413.907				$ 1.296.895.981				$ 683.858.403				$ 99.643.883				$ 3.367.255.838,61	
PORCENTAJE											7,38%				30,84%				38,51%				20,31%				2,96%				100,00%	
TOTAL																															3.367.255.838,61	
INTERVENTORIA																																
Interventoria	UND	1	143.866.240,00	150	22/07/2026	18/12/2026	$ -				$ 10.614.772,88				$ 44.366.306,42				$ 55.409.971,01				$ 29.217.897,84				$ 4.257.291,85				$ 143.866.240	

Firma:

Nombre: EFRAIN HERNANDEZ RIAÑO
Coordinador Proyectos Area Tolima
MOVILLGAS S.A.S. ESP

Ilustración 2. Cronograma de ejecución inicial. Convenio 4196 – 2025

4.2 Cronograma de ejecución proyectado.

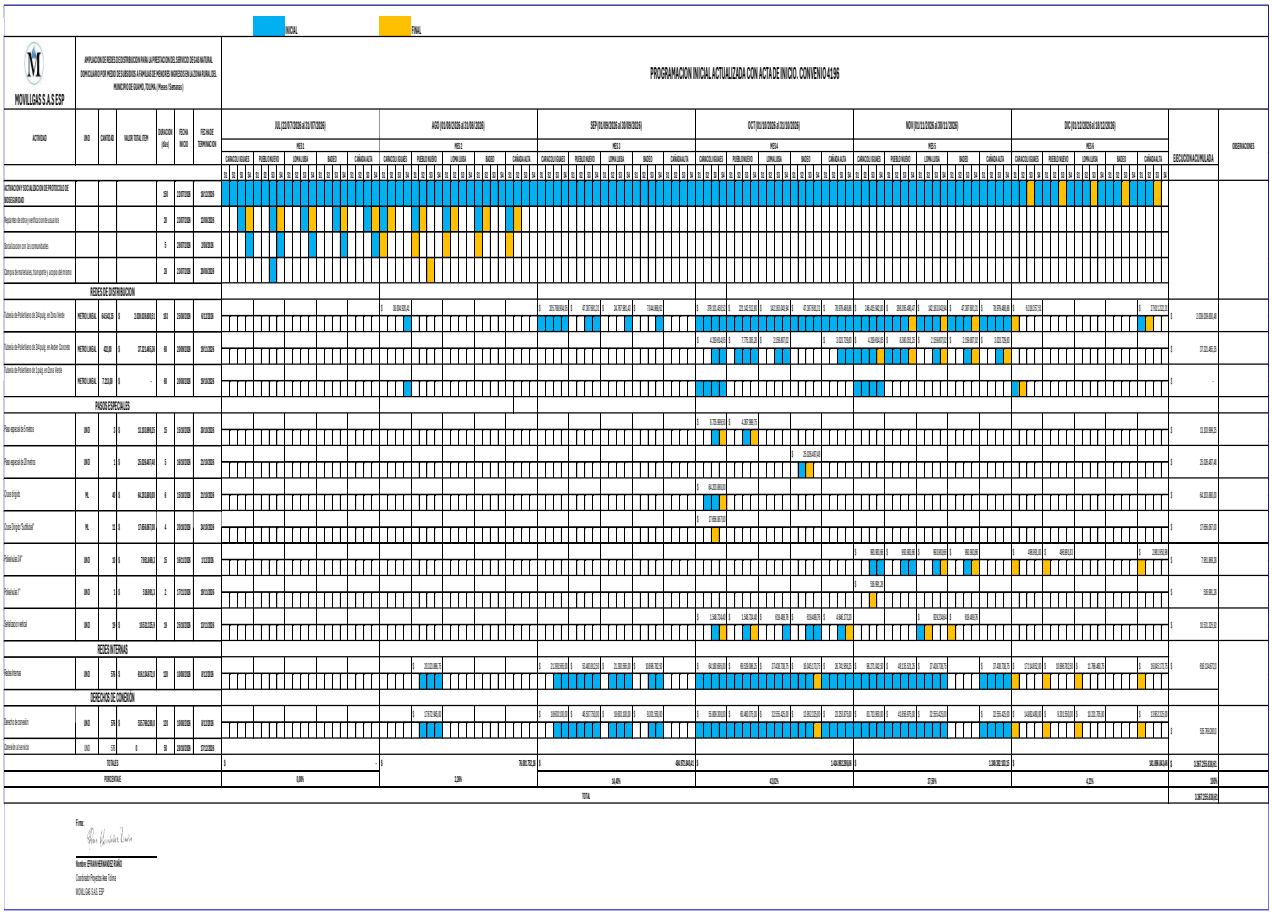


Ilustración 3. Cronograma de ejecución proyectado. Convenio 4196 – 2025

Para el segundo corte de ejecución, comprendido entre el **22 de agosto y el 21 de septiembre de 2026**, se proyecta un avance programado del 10,08 %**,** correspondiente al porcentaje estimado de ejecución con respecto al valor total del presupuesto del proyecto, de acuerdo con el cronograma de ejecución proyectado para el periodo.

5. ALCANCE CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 4196 DEL 10 DE NOVIEMBRE 2025.

Para el alcance del convenio de asociación **No. 4196 del 10 de NOVIEMBRE del 2025** está bajo los parámetros de los aportes de la Gobernación del Tolima y la empresa de servicios públicos MOVILLGAS S.A.S E.S.P, donde se realizará la construcción y/o canalización de redes de distribución de gas natural, pasos especiales, cruces de vías, derechos de conexión y redes internas, para prestar el servicio de Gas natural a 576 familias de 5 veredas del municipio de Guamo - Tolima. A continuación, se relaciona las condiciones Contractuales:

AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL GUAMO, TOLIMA.

DESCRIPCION	CODIGOD PRECIOS CREG	UND	PRECIOS CREG 2024	CARACOLI IGUAES		PUEBLO NUEVO		LOMA LUISA		BADEO		CAÑADA ALTA		TOTAL (576)	
				CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES
REDES DE DISTRIBUCION															
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	TPE3/4ZV	m	$ 31.591,79	27.717,00	$ 875.629.643,43	17.945,35	$566.925.570,72	9.784,00	$309.094.073,36	3.223,00	$101.820.339,00	5.874,00	$ 185.570.174,00	64.543,35	$ 2.039.039.800,51
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	TPE3/4ACO	m	$ 86.392,28	100,00	$ 8.639.228,00	187,00	$ 16.155.356,36	50,00	$ 4.319.614,00	25,00	$ 2.159.807,00	70,00	$ 6.047.460,00	432,00	$ 37.321.465,36
Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	TPE1ZV	m	$ 35.986,68	7.213,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	7.213,00	$ -
TOTAL REDES DE DISTRIBUCION				35.030,00	$ 884.268.871,43	18.132,35	$583.080.927,08	9.834	$313.413.687,36	3.248,00	$103.980.146,00	5.944,00	$ 191.617.634,00	72.188,35	$ 2.076.361.265,87
PASOS ESPECIALES Y DIRIGIDOS															
Paso especial 5 mts		UND	$ 4.367.999,75	2,00	$ 8.735.999,50	1,00	$ 4.367.999,75	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 13.103.999,25
Paso especial 20 mts		UND	$ 25.026.487,48	0,00		0,00		0,00		1,00	$ 25.026.487,48	0,00		1,00	$ 25.026.487,48
Cruce Dirigido		ML	$ 1.605.097,00	40,00	$ 64.203.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	40,00	$ 64.203.880,00
Cruce Dirigido "Subfubial"		ML	$ 1.605.097,00	11,00	$ 17.656.067,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 17.656.067,00
Polivalvulas 3/4"		UND	$ 496.991,83	3,00	$ 1.490.975,49	3,00	$ 1.490.975,49	2,00	$ 993.983,66	2,00	$ 993.983,66	2,00	$ 2.981.950,98	10,00	$ 7.951.869,28
Polivalvulas 1"		UND	$ 516.991,82	1,00	$ 516.991,82	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 516.991,82
Señalizacion Vertical		UND	$ 309.744,88	5	$ 1.548.724,40	5	$ 1.548.724,40	5	$ 1.548.724,40	4	$ 1.238.979,52	3	$ 4.646.173,20	19,00	$ 10.531.325,92
TOTAL PASOS ESPECIALES Y PASOS DIRIGIDOS				2	$ 94.152.638,21	1	$ 7.407.699,64	-	$ 2.542.708,06	1	$ 27.259.450,66	-	$ 7.628.124,18	4,00	$ 138.990.620,75
ACOMETIDAS															
DERECHOS DE CONEXION (581 USUARIOS)		UND	$ 930.155,000	186	$ 173.008.830,00	189	$175.799.295,00	101	$ 93.945.655,00	25	$ 23.253.875,00	75	$ 69.761.625,00	576,00	$ 535.769.280,00
REDES INTERNA (581 USUARIOS)		UND	$ 1.069.678,25	186	$ 198.960.154,50	189	$202.169.189,25	101	$108.037.503,25	25	$ 26.741.956,25	75	$ 80.225.868,75	576,00	$ 616.134.672,00
TOTAL ACOMETIDAS				372	$ 371.968.984,50	378	$377.968.484,25	202	$201.983.158,25	50	$ 49.995.831,25	150	$ 149.987.493,75	1.002,00	$ 1.001.916.458,25
				$ 1.350.390.494,14		$ 968.457.110,97		$ 517.939.553,67		$ 181.235.427,91		$ 349.233.251,93		$ 3.367.255.838,61	

Ilustración 4. Relación – Presupuesto General por Veredas

1	**REDES DE DISTRIBUCION**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
		ML	72.188,35	$ 2.076.361.265,87
2	**PASOS ESPECIALES, DIRIGIDOS, POLIVALVULAS Y SEÑALIZACION VERTICAL.**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
		UND	85	$ 138.990.620,75
3	**DERECHOS DE CONEXIÓN**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
		UND	576	$ 535.769.280,00
4	**RED INTERNA**	**UND**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
		UND	576	$ 360.180.000
CONVENIO CONTRACTUAL (N° 4196 - 2025)		**$ 3.367.255.838,61**		

Tabla 3 Condiciones Contractuales

Modelo de aporte Contractual Convenio de Asociación N° 4196 - 2026:

1		**UND**	**CANTIDAD**	**APORTE GOBERNACION 78,7%**	**APORTE MOVILLGAS 21,3%**	**VALOR TOTAL**
	REDES DE DISTRIBUCION	ML	72.188,35	$ 1.634.096.316,23	$ 442.264.949,63	$ 2.076.361.265,87
2		**UND**	**CANTIDAD**	**APORTE GOBERNACION 85%**	**APORTE MOVILLGAS 21,3%**	**VALOR TOTAL**
	PASOS ESPECIALES, DIRIGIDOS	UND	85	$ 109.385.618,53	$ 29.605.002,22	$ 138.990.620,75
3		**UND**	**CANTIDAD**	**APORTE GOBERNACION 100%**	**APORTE MOVILLGAS 0%**	**VALOR TOTAL**
	DERECHOS DE CONEXIÓN	UND	576	$ 535.769.280,00	$ 00 ,00	$ 535.769.280,00
4		**UND**	**CANTIDAD**	**APORTE GOBERNACION 85%**	**APORTE MOVILLGAS 15%**	**VALOR TOTAL**
	RED INTERNA	UND	576	$ 523.714.471,20	$ 92.420.200,80	$ 616.134,672,00
CONVENIO CONTRACTUAL (N° 4196-2026)				**$ 2.802.965.685,96**	**$ 564.290.152,65**	**$ 3.367.255.838,61**

Tabla 4 Modelo de aportes contractual convenio Asociación N° 4196 - 2025

6. AVANCE DE OBRA ÍTEMS - % EJECUCIÓN. (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO)

Los avances de obra del convenio de asociación N° 4196 de 10 de noviembre de 2025 se estipulan en memorias de cálculos adjuntos al presente informe. En el presente cuadro se enseña un resumen general de las unidades constructivas en el periodo de ejecución del convenio.

AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DEL GUAMO, TOLIMA.

DESCRIPCION	CODIGOD PRECIOS CREG	UND	PRECIOS CREG 2024	CARACOLI IGUAES		PUEBLO NUEVO		LOMA LUISA		BADEO		CAÑADA ALTA		TOTAL (576)	
				CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES
REDES DE DISTRIBUCION															
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	TPE3/4ZV	m	$ 31.591,79	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	TPE3/4ACO	m	$ 86.392,28	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	TPE1ZV	m	$ 35.986,68	0,00		0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
TOTAL REDES DE DISTRIBUCION				-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
PASOS ESPECIALES Y DIRIGIDOS															
Paso especial 5 mts		UND	$ 4.367.999,75	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
Paso especial 20 mts		UND	$ 25.026.487,48	0,00		0,00		0,00		0,00	$ -	0,00		-	$ -
Cruce Dirigido		ML	$ 1.605.097,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
Cruce Dirigido "Subfluvial"		ML	$ 1.605.097,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
Polivalvulas 3/4"		UND	$ 496.991,83	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
Polivalvulas 1"		UND	$ 516.991,82	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -
Señalizacion Vertical		UND	$ 309.744,88	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	0	$ -	-	$ -
TOTAL PASOS ESPECIALES Y PASOS DIRIGIDOS				-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
ACOMETIDAS															
DERECHOS DE CONEXION (581 USUARIOS)		UND	$ 930.155,000	-	$ -	19	$ 17.672.945,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,00	$ 17.672.945,00
REDES INTERNA (581 USUARIOS)		UND	$ 1.069.678,25	-	$ -	19	$ 20.323.886,75	-	$ -	-	$ -	-	$ -	19,00	$ 20.323.886,75
TOTAL ACOMETIDAS				-	$ -	38	$ 37.996.831,75	-	$ -	-	$ -	-	$ -	38,00	$ 37.996.831,75
				$ -		$ 37.996.831,75		$ -		$ -		$ -		$ 37.996.831,75	AVANCE FINANCIERO
														$ 3.367.255.838,61	PRESUPUESTO INICIAL
														1,13%	PORCENTAJE DE AVANCE

Ilustración 5. porcentaje (%) ejecución ítems

Al día de hoy las actividades de obra por parte de la empresa MOVILLGAS S.A.S E.S.P se encuentran en un 1,13% de ejecución del avance financiero del valor total del proyecto, donde se realizó la construcción de 19 redes internas con sus respectivos centros de medición en la vereda pueblo nuevo.

6.1 MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Herramienta menor.
- Plantas eléctricas.
- Roto martillo.
- Pulidoras.
- Equipos de Termo fusión A Socket.
- Camioneta y camión.

6.2 PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE OBRA CONVENIO.

Ingeniero Residente, personal técnico actividades de termo fusión, personal área administrativa y otros.

6.3 GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES SST.

- Afiliaciones a seguridad social del personal en obra de igual manera administrativo y operativo.
- Buen servicio preoperacionales de los equipos utilizados en obra.
- Instalación de la señalización y demarcación de áreas o zonas de trabajo, las cuales presenten riesgo a la integridad física de todos los trabajadores y personal externo involucrados en el proyecto.
- Entrega y uso correcto de EPP en campo por parte de los trabajadores.

6.4 GESTIÓN AMBIENTAL.

Durante el periodo comprendido entre el 22 de julio y el 21 de agosto de 2026, se adelantaron las actividades de gestión ambiental asociadas a la ejecución del proyecto de gasificación rural domiciliaria, orientadas a prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos ambientales derivados de las actividades constructivas y logísticas desarrolladas.

Las actividades ejecutadas durante este periodo correspondieron principalmente al replanteo de los frentes de obra, transporte y traslado de tuberías y materiales, almacenamiento de materiales e inicio de la construcción de redes internas y acometidas domiciliarias en la vereda Pueblo Nuevo.

En el desarrollo de estas actividades se procuró mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en las áreas intervenidas, realizar un manejo apropiado de los materiales y residuos generados, evitar afectaciones innecesarias al suelo y a la vegetación existente y garantizar que las actividades de excavación e instalación de las redes se desarrollaran dentro de las áreas requeridas para el proyecto.

Asimismo, se realizó seguimiento a las condiciones ambientales de los frentes de trabajo, procurando minimizar la generación de residuos, material particulado, afectaciones al suelo y demás impactos asociados a las actividades propias de la obra.

6.4.1 COMPONENTE AMBIENTAL

El componente ambiental del proyecto contempla las medidas de prevención, manejo, mitigación y control de los impactos ambientales que puedan generarse durante las etapas de construcción e instalación de las redes de distribución de gas natural domiciliario.

Para el periodo objeto del presente informe, las principales medidas consideradas fueron:

Aspecto ambiental	Actividad / medida implementada
Manejo de residuos sólidos	Recolección y disposición adecuada de los residuos generados durante las actividades de obra, evitando su disposición sobre el suelo o en zonas no autorizadas.
Manejo del suelo	Durante las excavaciones se procura realizar la intervención únicamente en las áreas requeridas para la instalación de las redes y efectuar el adecuado manejo del material producto de excavación.
Material particulado	Control de la generación de polvo durante las actividades de excavación, manipulación y transporte de materiales, especialmente en zonas cercanas a viviendas y vías de acceso.
Almacenamiento de materiales	Organización y almacenamiento de tuberías y demás materiales en un sitio destinado para tal fin, procurando condiciones adecuadas de seguridad, orden y protección.
Protección de la vegetación	Evitar intervenciones innecesarias sobre la cobertura vegetal existente y limitar las actividades a las áreas establecidas para la ejecución de las obras.
Orden y aseo	Mantener despejadas y limpias las áreas de trabajo y retirar los residuos y materiales sobrantes generados durante las actividades constructivas.

Aspecto ambiental	Actividad / medida implementada
Manejo de excavaciones	Realizar las excavaciones de manera controlada y disponer adecuadamente el material sobrante, evitando obstrucciones de accesos, drenajes o afectaciones a predios.
Prevención de derrames	Mantener medidas preventivas durante el uso y transporte de combustibles, lubricantes u otras sustancias requeridas para la operación de equipos y vehículos.

Tabla 5. Componente Ambiental.

6.4.2 IMPACTO GENERADOS EJECUCIÓN DE OBRA.

● Generación de escombros y otros residuos sólidos.
● Modificaciones en el paisaje y alteración de la cobertura vegetal.
● Alteración del flujo vehicular o peatonal.
● Alteración del espacio público.
● Afectación a la infraestructura de servicios públicos e interrupción en la prestación de los mismos.

Tabla 6. Impactos Generados.

6.4.3 CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

Durante el periodo comprendido entre el 22 de julio y el 21 de agosto de 2026, correspondiente al primer mes de ejecución del proyecto, se realizó seguimiento y control a las actividades programadas, de acuerdo con el alcance, las condiciones técnicas y el cronograma establecido para la ejecución de las obras de gasificación rural domiciliaria en el municipio de Guamo, Tolima.

En este periodo se adelantaron principalmente actividades de carácter logístico, técnico y constructivo, orientadas a garantizar las condiciones necesarias para el desarrollo de los diferentes frentes de obra. Entre las actividades ejecutadas se encuentran la adquisición y traslado de tuberías y materiales, la disposición de un sitio para su almacenamiento, el replanteo de los trazados y el inicio de la construcción de redes internas y acometidas domiciliarias en la vereda Pueblo Nuevo.

A continuación, se presenta el control de las principales actividades desarrolladas durante el periodo:

Actividad	Descripción / Alcance	Estado
Adquisición de materiales	Compra de tuberías y materiales requeridos para la ejecución de las redes de distribución en las veredas Caracoli Iguáes, Pueblo Nuevo, Cañada Alta, Loma Luisa y Badeo.	Ejecutada
Transporte y traslado de materiales	Traslado de las tuberías y demás materiales requeridos hacia el municipio y los frentes de trabajo establecidos.	Ejecutada
Almacenamiento de materiales	Gestión y disposición de una bodega para el almacenamiento y custodia de los materiales destinados a la ejecución del proyecto.	Ejecutada
Replanteo de obra	Verificación y materialización en campo de los trazados proyectados, previo al inicio de las actividades constructivas.	Ejecutada
Construcción de redes internas	Inicio de la instalación de las redes internas de distribución de gas natural domiciliario en la vereda Pueblo Nuevo.	En ejecución
Instalación de acometidas domiciliarias	Inicio de la construcción e instalación de las acometidas correspondientes a las viviendas beneficiarias de la vereda Pueblo Nuevo.	En ejecución

Tabla 7. Control de Actividades de Obra.

Las actividades desarrolladas durante el periodo permitieron dar inicio a la fase constructiva del proyecto, estableciendo las condiciones logísticas y técnicas necesarias para la continuidad de los trabajos en los diferentes frentes previstos.

6.4.4 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Durante el periodo comprendido entre el 22 de julio y el 21 de agosto de 2026, se realizó el manejo y control de los residuos sólidos generados como consecuencia de las actividades de transporte, almacenamiento de materiales, replanteo e inicio de las obras de construcción de redes internas y acometidas domiciliarias.

Los residuos generados durante las actividades constructivas fueron recolectados y retirados de las áreas de trabajo**,** evitando su disposición directa sobre el terreno y procurando mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en los frentes de obra. Asimismo, se realizó la separación y almacenamiento temporal de los residuos aprovechables y no aprovechables, de acuerdo con su naturaleza y las condiciones disponibles en cada frente de trabajo.

En las actividades de instalación de las redes se procuró minimizar la generación de residuos y realizar un uso adecuado de los materiales, evitando desperdicios innecesarios de tubería, accesorios y demás elementos utilizados en la ejecución de las obras.

Durante el periodo reportado no se presentaron situaciones asociadas al manejo inadecuado de residuos sólidos que generaran afectaciones ambientales significativas**.**

7. GESTIÓN FINANCIERA.

7.1 DESCRIPCIÓN FINANCIERA.

A la presente fecha de la ejecución del proyecto la empresa MOVILLGAS S.A.S E.S.P ha solicitado el pago anticipado del 50% radicado el día 20 de agosto de 2026.

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO No. 4196 - 2025 INFORME N° 1		%
VALOR DEL CONVENIO	**$ 3.367.255.838,61**	**100 %**
APORTE GOBERNACIÓN	**$ 2.802.965.685,96**	**85%**
APORTE MOVILLGAS S.A.S ESP	**$ 564.290.152,65**	**15%**
VALOR SOLICITADO PRIMER PAGO 50% APORTE GOBERNACION	**$ 1.401.482.842,98**	**50%**

Tabla 8. Descripción Financiera Convenio Asociación.

7.2 SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta la **planilla de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral** correspondiente al personal técnico, operativo y administrativo que ha participado en las actividades desarrolladas durante la etapa inicial de ejecución del proyecto, como soporte del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con seguridad social.

8 GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

A la fecha la empresa MOVILLGAS S.A.S E.S.P ha realizado labores en la vereda Pueblo nuevo de Guamo - Tolima, con instalación de redes internas con la finalidad de llevar a cabo la ejecución del convenio de asociación No. 4196 del 10 de noviembre de 2025 celebrado con la Gobernación del Tolima.

8.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

8.1.1 LICENCIAS Y PERMISOS.

Las licencias y permisos tramitados por la empresa MOVILLGAS S.A.S E.S.P para la ejecución a cabalidad del proyecto se han gestionado ante la secretaria de planeación del municipio de Guamo - Tolima.

ENTIDAD	PERMISO	DOCUMENTO
Secretaria de Planeación Municipio de Guamo – Tolima.	Licencia de Intervención y ocupación espacio público	Oficio 20264000050531 del municipio de Guamo Tolima.

Tabla 9. Licencias Y Permisos.

8.1.2 ACTAS, INFORMES Y OTROS.

- Elaboración de programación de obra realizada por **MOVILLGAS S.A.S E.S.P.**
- Solicitud de permisos “intervención y ocupación espacio público”
- Elaboración de informe de avance de obra.

8.2 GESTIÓN TÉCNICA.

Las actividades de obra ejecutadas en el periodo comprendido del 22 de julio al 21 de agosto de 2026, cumplen con los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 2505 2.44 Red Interna y NTC 3728 2.42 Redes de Distribución y 3.2 Trazado de Redes.

8.2.1 LABORES REALIZADAS.

- Replanteo de obra
- Socialización con las comunidades
- Construcción de redes internas y centros de medición
- Transporte de materiales

9 PLAN DE MEJORAMIENTO Y LECCIONES

Durante el periodo comprendido entre el 22 de julio y el 21 de agosto de 2026**,** correspondiente al primer mes de ejecución del proyecto, se realizó seguimiento a las actividades programadas y a las condiciones encontradas durante el inicio de la ejecución de las obras.

Al corresponder al primer periodo de seguimiento, no se registran acciones correctivas pendientes provenientes de informes anteriores. No obstante, se identificaron aspectos susceptibles de fortalecimiento para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades durante los siguientes periodos de ejecución.

Acciones y recomendaciones para el siguiente periodo

- Fortalecer la planeación y programación de los frentes de trabajo, priorizando la continuidad de las actividades constructivas iniciadas en la vereda Pueblo Nuevo.
- Abrir nuevo frente de trabajo en la vereda Caracoli Iguaes.
- Mantener un adecuado control de materiales, especialmente en lo relacionado con recepción, almacenamiento, transporte y utilización de tuberías y accesorios.
- Realizar seguimiento permanente a las cantidades de obra ejecutadas, de manera que permitan establecer oportunamente el avance físico del proyecto frente a lo programado.
- Fortalecer las actividades de orden, aseo y manejo de residuos sólidos en los diferentes frentes de trabajo.
- Mantener la coordinación permanente con la supervisión del convenio y la interventoría**,** atendiendo oportunamente las recomendaciones y observaciones que se formulen durante el desarrollo de las actividades.
- Continuar con el seguimiento a las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad de los frentes de trabajo, con el fin de prevenir situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto.

10 CONTROL DE VERSIONES

VERSION	DOCUMENTO	FECHA	DESCRIPCION/MODIFICACION	ELABORO	MATRICULA PROFESIONAL	APROBO
01	Informe mensual N° 1	01-09-2026	Elaboración y presentación inicial del informe	GUSTAVO REYES CARDENAS	25202-242057 CND	MOVILLGAS S.A.S E.S.P
02	Informe mensual N° 2	07-10-2026	Ajuste del informe de acuerdo con las observaciones realizadas por la interventoría.	GUSTAVO REYES CARDENAS	25202-242057 CND	MOVILLGAS S.A.S E.S.P

11 REGISTRO FOTOGRÁFICO.














Timemark
Foto 100% Real
Movillgas
06:47 a. m. 15 de ago 2026
Sáb
© DLWMBTRW4LJKAGD Timemark Verified











12 LISTADO DE USUARIOS CONSTRUIDOS.

LISTADO DE USUARIOS CONSTRUIDOS INFORME N° 1								
#	NOMBRE USUARIO ADICION	CEDULA	N° MEDIDOR	LATITUD	LONGITUD	VEREDA	MUNICIPIO	ROL/USUARIO
1	MARIA XIMENA SALAZAR TORRES	1.011.080.195	202502031587	N4.09080	W74.95878	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
2	MARIA CONCEPCION DURAN PERDOMO	65.551.750	202502031577	N4.11794	W74.976818	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
3	CARLOS ROJAS SANCHEZ	79.902.465	202502031479	N4.10524	W74.97860	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
4	JENNY CAROLINA LARA LOMBANA	1.108.930.715	202502031483	N4.11998	W74.97710	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
5	JOSE VIDAL RUBIO	10.164.211	202502031588	N4.12079	W74.97645	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
6	GERMAN LARA GUZMAN	93.082.123	202502031484	N4.12042	W74.97502	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
7	MARIA YANED FANDIÑO GUZMAN	28.866.261	202502031480	N4.12181	W74.97711	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
8	LUZ MILA BOCANEGRA	65.557.149	202502031584	N4.11237	W74.97412	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
9	DOLORES OLAYA DE MOLINA	28.755.576	202502031583	N4.09975	W74.98290	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
10	JOSE JOAQUIN GOMEZ LEAL	93.085.958	202502031576	N4.09560	W74.97366	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
11	ERNESTO MOLINA PORTILLO	93.084.957	202502031589	N4.09090	W74.97785	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
12	JESUS ANTONIO GARCIA	93.081.033	202502031481	N4.09027	W74.98036	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
13	MIRIAM DEL CARMEN ROMERO GARCIA	51.848.339	202502031586	N4.09019	W74.98117	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
14	MARIA LIBIA ROMERO GARCIA	28.758.307	202502031482	N4.09006	W74.98175	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
15	AURORA GOMEZ	28.755.906	202502031590	N4.09008	W74.98261	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
16	ELOISA BONILLA MENDEZ	1.108.928.338	202502031580	N4.09071	W74.96620	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
17	MARIA LETICIA BONILLA MENDEZ	65.551.438	202502031585	N4.09078	W74.96623	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
18	DEYANIRA BONILLA MENDEZ	52.380.035	202502031485	N4.09084	W74.96619	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL
19	GUSTAVO PORTILLO	5.898.709	202502031582	N4.09150	W74.95979	PUEBLO NUEVO	GUAMO	USUARIO FINAL

Tabla 10. Listado usuarios construidos

13 CONCLUSIONES

- Durante el periodo comprendido entre el 22 de julio y el 21 de agosto de 2026, correspondiente al primer mes de ejecución del convenio, se avanzó en el desarrollo de las actividades constructivas previstas, logrando la construcción de diecinueve (19) redes internas con sus respectivos centros de medición en la vereda Pueblo Nuevo, dando inicio efectivo a la fase de ejecución de las obras.
- Se realizó la socialización del proyecto con las comunidades de las veredas Caracoli Iguaes y Loma Luisa, próximas a ser intervenidas, en la cual se brindó información sobre el proceso constructivo, las actividades previstas y la documentación requerida a los beneficiarios para la construcción de las redes internas.
- Se efectuó el acopio y almacenamiento de materiales en el municipio de Guamo, estableciendo este punto como centro de distribución para atender los frentes de obra actualmente en ejecución y las veredas programadas para el inicio de actividades, con el propósito de facilitar la logística y garantizar la disponibilidad oportuna de los materiales requeridos.
- En relación con la intervención prevista en la vereda Caracoli Iguaes, se adelantaron gestiones con la comunidad para evaluar la viabilidad de realizar el trazado de la red troncal por el interior de los predios, como alternativa al trazado inicialmente contemplado dentro de la zona de influencia de la vía Ortega–Guamo. Lo anterior, teniendo en cuenta que el permiso de intervención ante el INVIAS se encuentra actualmente en trámite y que los tiempos asociados a su aprobación podrían afectar el cumplimiento del plazo establecido para la ejecución del convenio.
- En virtud de lo anterior, se deja constancia de que la alternativa de trazado por los predios se encuentra en etapa de evaluación y gestión, por lo cual se solicita a la Supervisión del Convenio y a la Interventoría revisar técnica y administrativamente la viabilidad de esta alternativa y, de considerarlo procedente, impartir la correspondiente aprobación o autorización, con el fin de garantizar la continuidad de las actividades y evitar afectaciones al cronograma de ejecución.
- En términos generales, las actividades desarrolladas durante el primer mes permitieron establecer las condiciones técnicas, logísticas y comunitarias necesarias para la continuidad del proyecto, manteniendo coordinación con la comunidad, la Supervisión del Convenio y la Interventoría para la atención oportuna de las situaciones que puedan incidir en el desarrollo de las obras.

Cordialmente,



_____

GUSTAVO REYES CARDENAS
Ingeniero Residente
25202-242057 CND
MOVILLGAS S.A.S E.S.P

14 ANEXOS

1. Planilla de seguridad social.
2. Licencia de intervención y ocupación del espacio público.
3. Certificado de calidad de los materiales.
4. Resolución Tarifaria del municipio del Guamo.
5. Acta de socialización.
