Movillgas
S.A.S E.S.P 901.747.670-1

INFORME N° 02

CONVENIO DE ASOCIACIÓN
No. 4156 – 07 – NOVIEMBRE - 2025
CUYO OBJETO ES: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y OPERATIVOS ENTRE LA GOBERNACION DEL TOLIMA Y MOVILLGAS S.A.S E.S.P PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION E INSTALACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, TOLIMA".

PRESENTADO POR:
MOVILLGAS S.A.S E.S.P

PERIODO DE EJECUCIÓN ENTRE EL 03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2026

Movillgas
S.A.S E.S.P 901.747.670-1

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. RESUMEN EJECUTIVO 5
3. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO - ANTECEDENTES CONTRACTUALES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4156 – 2025. 6
3.1. CONVENIO DE N° 4156 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2025. 6
3.2. POLIZAS DE SEGURO CONVENIO N° 4156 - 2025 7
3.3. APROBACIÓN DEL PROYECTO 8
4. CRONOGRAMA DE EJECUCION 9
4.1 CRONOGRAMA DE EJECUCION INICIAL 9
4.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION PROYECTADO 10
5. ALCANCE CONVENIO ASOCIACIÓN N° 4156 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2025. 11
6. AVANCE DE OBRA ÍTEMS - % EJECUCIÓN. (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO) 13
6.1. MAQUINARIA Y EQUIPO. 14
6.2. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE OBRA CONVENIO. 14
6.3. GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES SST. 15
6.4. GESTIÓN AMBIENTAL. 15
6.4.1 COMPONENTE AMBIENTAL 15
6.4.1. IMPACTO GENERADOS EJECUCIÓN DE OBRA. 16
6.4.2. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES. 17
6.4.3. MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 17
7. GESTIÓN FINANCIERA. 18
7.1 DESCRIPCIÓN FINANCIERA. 18
7.2 SEGURIDAD SOCIAL 19
8. GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO. 20
8.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 20
8.1.1. LICENCIAS Y PERMISOS. 20
8.1.2. ACTAS, INFORMES Y OTROS. 20
8.2. GESTIÓN TÉCNICA. 20
8.2.1. LABORES REALIZADAS 20
9. PLAN DE MEJORAMIENTO Y LECCIONES 21
Acciones y recomendaciones para el siguiente periodo 21
10. REGISTRO FOTOGRÁFICO. 22
11. LISTADO DE USUARIOS CONSTRUIDOS. 24
12. CONCLUSIONES 25
13. ANEXOS 26

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Póliza De Seguro Convenio 4156 - 2025 7
Ilustración 2. Cronograma de ejecucion inicial 9
Ilustración 3. Cronograma de ejecucion proyectado 130
Ilustración 4. Relación - Presupuesto general por veredas..... 11
Ilustración 5. Porcentaje de ejecución..... 13
Ilustración 6. Porcentaje acumulado..... 14

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Ficha tecnica del proyecto 7
Tabla 2. Disponibilidad presupuestal 8
Tabla 3. Condiciones Contractuales 132
Tabla 4. Modelo de aportes contractual convenio 4156 de 2025..... 12
Tabla 5. Componente ambiental..... 15
Tabla 6. Impactos generados..... 15
Tabla 7. Control de actividades de obra..... 17
Tabla 8. Descripción financiera convenio 4156 de 2025..... 18
Tabla 9. Licencias y permisos..... 20
Tabla 10. Listado de usuarios construidos..... 24

1. INTRODUCCIÓN

Entre los suscritos a saber: GOBERNACION DEL TOLIMA, con NIT. 800113672-7 representado por SANDRA LILIANA GARCIA COBAS, en calidad de secretario de INFRAESTRUCTURA Y HABITAT, de conformidad con el decreto N° 0169 DE 9 DE FEBRERO DE 2023, delegado por la gobernadora para ejercer la función de ordenador del gasto, en nombre del departamento del Tolima, de conformidad con el decreto N° 0460 de AGOSTO 23 DE 2024, quien se denominará, EL DEPARTAMENTO, por una parte y por la otra, MOVILLGAS S.A.S E.S.P con NIT. 901.747.670-1 quien denominara EL COOPERANTE y declara que tiene capacidad para celebrar este convenio. con objeto: **"IMPLEMENTACION E INSTALACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, TOLIMA".**

El convenio se firmó por un valor de **$ 2.231.022.331,7** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS (M/CTE). El departamento del Tolima aporta **$ 1.814.329.386,4** MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE. y la empresa MOVILLGAS S.A.S E.S.P cofinancia **$416.692.945,3** CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE.

El orden de inicio del convenio de asociación No. 4156 del 07 de noviembre de 2025, con un plazo de ejecución de ciento ochenta (180) Días Calendario. Fue impartida según acta de inicio 03 de julio de 2026, obteniendo de esta manera la fecha de terminación para el convenio 4156 la cual corresponde al 29 de diciembre de 2026.

En el orden de inicio del convenio de asociación N° 4156 del 07 de noviembre de 2025, se brindará el beneficio a 322 familias de las veredas Palomar y Lisboa del municipio de Anzoátegui-Tolima.

A la fecha, las actividades de obra ejecutadas por la empresa MOVILLGAS S.A.S. E.S.P. presentan un avance financiero acumulado equivalente al **6,05 %** del valor del convenio**.** En desarrollo de las actividades previstas, se ha realizado la canalización de 980 ml de tubería de ¾" en zona verde, así como la construcción de 52 redes internas y sus respectivos centros de medición en la vereda Lisboa**.**

Las actividades ejecutadas corresponden a los componentes y obligaciones establecidos dentro del Convenio de Asociación, de acuerdo con el alcance y las condiciones técnicas previstas para la ejecución del proyecto.

2. RESUMEN EJECUTIVO

Durante el segundo mes de ejecución del proyecto, comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre de 2026, se dio continuidad a las actividades previstas para la instalación de las redes de distribución de gas GLP domiciliario en las veredas Palomar y Lisboa del municipio de Anzoátegui, Tolima, de acuerdo con el alcance establecido en el Convenio de Asociación.

Durante este periodo se avanzó en la ejecución de las actividades constructivas correspondientes al frente de trabajo ubicado en la vereda Lisboa, donde se realizó la canalización de 980 ml de tubería de ¾" en zona verde**,** de acuerdo con los trazados definidos y aprobados para el proyecto.

De igual manera, se adelantó la construcción de 37 redes internas y sus respectivos centros de medición**,** correspondientes a las viviendas beneficiarias del proyecto en la vereda Lisboa, dando cumplimiento a las condiciones previstas para la prestación del servicio de GLP domiciliario.

Las actividades ejecutadas durante el periodo permitieron consolidar el avance físico y financiero del proyecto, alcanzando un avance financiero de 4,70 % del valor del convenio**.**

En términos generales, las actividades desarrolladas durante este segundo mes corresponden a las obligaciones y cantidades previstas dentro del Convenio de Asociación, permitiendo continuar con la ejecución progresiva de los frentes de obra y avanzar en el cumplimiento de las metas establecidas para el proyecto.

3. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO - ANTECEDENTES CONTRACTUALES CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 4156 – 2025.

3.1. CONVENIO DE ASOCIACION No° 4156 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2025.

CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 4156-2025:	"IMPLEMENTACION E INSTALACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACIÓN DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, TOLIMA".
PERIODO INFORME	03 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2026.
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, TOLIMA.
MAPA DE UBICACIÓN	
CONTRATISTA	MOVILLGAS S.A.S E.S.P
INTERVENTORÍA	GRUPO EMPRESARIAL ARENAS CONSTRUCCIONES S.A.S
SUPERVISIÓN	FERNANDO AUGUSTO BONILLA PORTILLO
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO	07 DE NOVIEMBRE DEL 2025
VALOR INICIAL CONVENIO	EL CONVENIO SE FIRMÓ POR UN VALOR DE **$ 2.231.022.331,7** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS (M/CTE).
PLAZO DE EJECUCIÓN CONVENIO	EL CONVENIO SE REALIZARÁ DURANTE CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO. EL TERMINO QUE SE EMPEZARA A CONTAR A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO.
FECHA DE TERMINACIÓN CONVENIO	29 DE DICIEMBRE DE 2026
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO	POLIZA N° I-100050425 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A
GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	POLIZA N° I-100013005 COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CDP GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	No. 5046 del SIAF DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025
RP GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	No. 16169 DEL 28 de noviembre de 2025.
APORTES	1. **GOBERNACION: $ 1.814.329.386,4** MIL OCHOCIENTOS CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE.
	2. **MOVILLGAS S.A.S E.S.P: $ 416.692.945,3** CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE.
APORTES VALOR TOTAL DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN	**$ 2.231.022.331,7** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SIETE CENTAVOS (M/CTE).
CONEXIONES DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO	**322 USUARIOS**

Tabla 1. Ficha Técnica Del Proyecto

3.2. POLIZAS DE SEGURO CONVENIO N° 4156 - 2025

CONVENIO N°	MUNICIPIO	FECHA CONVENI	"IMPLEMENTACION E INSTALACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACION DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, TOLIMA".			VR. TOTAL DEL CONVENIO				ACTUALIZACION AL ACTA DE INICIO DEL 03-JUL 2026		
4156	ANZOATEGUITOL.	7/11/2025				$ 2.231.022.331,70				POLIZAS 6 Y 21 AGO.2026		
No. DE POLIZA	No. DOCTO O ANEXO	FECHA EXPEDICION	COBERTURAS	VIGENCIAS		PORCENTAJE % O VR.	VALOR ASEGURADO	POLIZAS LEGALIZACION CONVENIO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIAS	
				FECH INICIO	FECHA FINAL					FECH INICIO	FECHA FINAL
I-100050425	0	21/11/2025	BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICCIPO	2025-11-07	2026-11-06	100%	$ 907.164.693		$ 907.164.693	2026-07-03	2027-06-29
I-100050425	0	21/11/2025	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	2025-11-07	2026-11-06	30%	$ 669.306.700		$ 669.306.700	2026-07-03	2027-06-29
I-100050425	0	21/11/2025	ESTABILIDAD DE LA OBRA	2026-05-06	2031-05-07	30%	$ 669.306.700		$ 669.306.700	2026-12-29	2031-12-29
I-100050425	0	21/11/2025	PAGOS DE SALARIOS PRRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	2025-11-07	2029-05-06	5%	$ 111.551.117		$ 111.551.117	2026-07-03	2029-12-29
I-100013005	0	21/11/2025	RESPONSABILIDAD CIVIL ESTRACONTRACTUAL DERIVADAS DEL CUMPLIMIENTO	2025-11-07	2026-05-06	300 SMLMV	$ 427.050.000		$ 525.271.500	2026-07-03	2027-01-01
DURACION DE LA OBRA		180 DIAS CALEND.									
				APORTE GOBERNACION			$ 1.814.329.386,40				
				APORTE MOVILLGAS			$ 416.692.945,30				
						TOTAL	$ 2.231.022.331,70				

Ilustración 1. Póliza De Seguro Convenio 4156 – 2025

Una vez suscrito el Convenio, se adelantó el trámite correspondiente para la expedición de las pólizas requeridas para su legalización, las cuales fueron aprobadas el 30 de diciembre de 2026. Posteriormente, con ocasión de la suscripción del Acta de Inicio, se solicitó la actualización de las pólizas el 31 de julio de 2026. La documentación correspondiente a dicha actualización fue radicada ante la Gobernación del Tolima el 24 de agosto de 2026**,** para su respectiva revisión y aprobación.

3.3. APROBACIÓN DEL PROYECTO

Los recursos comprometidos en el convenio de asociación No. 4156 del 07 de noviembre del 2025 son cargo al presupuesto de la vigencia 2025, respectivo certificado de disponibilidad presupuestal de cada entidad:


ENTIDAD	CDP	FECHA	VALOR
GOBERNACION DEL TOLIMA	No. 5046	11-09-2025	$ 1.814.329.386,4
MOVILLGAS S.A.S E.S. P	Aportes Proyecto		$ 416.692.945,3
TOTAL, DISPONIBILIDAD			**$ 2.231.022.331,7**

Tabla 2. Disponibilidad Presupuestal

4. CRONOGRAMA DE EJECUCION

4.1 Cronograma de ejecución inicial presentado con ocasión del acta de inicio, suscrita el 03 de julio de 2026.

El cronograma relacionado corresponde exclusivamente a la programación inicial del proyecto y se incorpora al presente informe como antecedente de la planificación establecida al inicio de la ejecución. La programación será actualizada periódicamente de acuerdo con el avance real de las actividades y los ajustes que se deriven del seguimiento a la ejecución contractual.

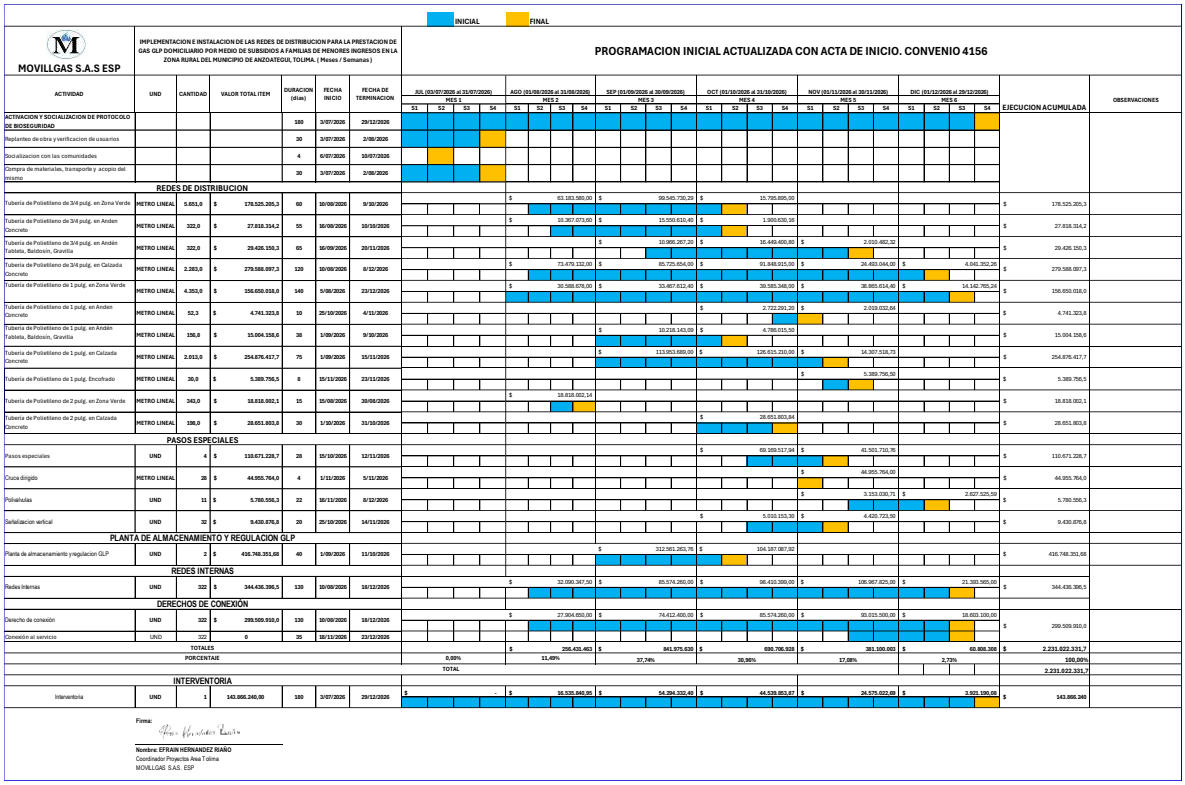

INICIAL FINAL


MOVILLGAS S.A.S ESP	IMPLEMENTACION E INSTALACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PARA LA PRESTACION DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, TOLIMA. (Meses / Semanas)						PROGRAMACION INICIAL ACTUALIZADA CON ACTA DE INICIO. CONVENIO 4156																			
ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL ITEM	DURACION (días)	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	JUL (03/07/2026 al 31/07/2026) MES 1				AGO (01/08/2026 al 31/08/2026) MES 2				SEP (01/09/2026 al 30/09/2026) MES 3				OCT (01/10/2026 al 31/10/2026) MES 4				NOV (01/11/2026 al 30/11/2026) MES 5				DIC (01/12/2026 al 29/12/2026) MES 6				EJECUCION ACUMULADA	OBSERVACIONES
							S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
ACTIVACION Y SOCIALIZACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				180	3/07/2026	29/12/2026																										
Replanteo de obra y verificacion de usuarios				30	3/07/2026	2/08/2026																										
Socializacion con las comunidades				4	6/07/2026	10/07/2026																										
Compra de materiales, transporte y acopio del insumo				30	3/07/2026	2/08/2026																										
REDES DE DISTRIBUCION																																
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	METRO LINEAL	5.651,0	$ 178.525.205,3	60	30/08/2026	9/10/2026					$ 63.183.580,00				$ 99.545.730,29				$ 15.795.895,00												$ 178.525.205,3	
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	METRO LINEAL	322,0	$ 27.818.314,2	55	30/08/2026	10/10/2026					$ 10.367.073,60				$ 15.550.610,40				$ 1.900.630,16												$ 27.818.314,2	
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Tableta, Baldosin, Gravilla	METRO LINEAL	322,0	$ 29.426.150,3	65	30/08/2026	20/11/2026									$ 10.966.267,20				$ 16.449.400,80				$ 2.010.482,32								$ 29.426.150,3	
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	METRO LINEAL	2.383,0	$ 279.588.097,3	120	30/08/2026	8/12/2026					$ 75.479.132,00				$ 85.725.654,80				$ 91.848.915,00				$ 24.493.544,00				$ 4.041.352,24				$ 279.588.097,3	
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	METRO LINEAL	4.353,0	$ 156.650.018,0	140	5/08/2026	23/12/2026					$ 30.588.678,00				$ 33.467.612,40				$ 39.585.348,00				$ 38.865.614,40				$ 14.142.765,24				$ 156.650.018,0	
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	METRO LINEAL	52,3	$ 4.741.323,8	10	25/10/2026	4/11/2026													$ 2.722.291,20				$ 2.019.032,64								$ 4.741.323,8	
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. en Anden Tableta, Baldosin, Gravilla	METRO LINEAL	156,0	$ 15.004.158,6	30	1/09/2026	9/10/2026									$ 10.216.143,00				$ 4.788.015,60												$ 15.004.158,6	
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto	METRO LINEAL	2.013,0	$ 254.876.417,7	75	1/09/2026	15/11/2026									$ 113.953.689,60				$ 126.615.210,00				$ 14.307.518,73								$ 254.876.417,7	
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. Encofrado	METRO LINEAL	30,0	$ 5.389.756,5	8	15/11/2026	23/11/2026																	$ 5.389.756,50								$ 5.389.756,5	
Tuberia de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	METRO LINEAL	343,0	$ 18.818.002,1	15	15/08/2026	30/08/2026					$ 18.818.002,14																				$ 18.818.002,1	
Tuberia de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto	METRO LINEAL	198,0	$ 28.651.803,8	30	1/10/2026	31/10/2026													$ 28.651.803,84												$ 28.651.803,8	
PASOS ESPECIALES																																
Pasos especiales	UND	4	$ 110.671.228,7	28	15/10/2026	12/11/2026													$ 69.169.517,94				$ 41.501.710,76								$ 110.671.228,7	
Cruce dirigido	METRO LINEAL	28	$ 44.955.764,0	4	1/11/2026	5/11/2026																	$ 44.955.764,00								$ 44.955.764,0	
Polisalulas	UND	11	$ 5.780.556,3	22	30/11/2026	8/12/2026																	$ 3.153.030,71				$ 2.627.525,59				$ 5.780.556,3	
Señalizacion vertical	UND	32	$ 9.430.876,8	20	25/10/2026	14/11/2026													$ 5.010.153,36				$ 4.420.723,50								$ 9.430.876,8	
PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION GLP																																
Planta de almacenamiento y regulacion GLP	UND	2	$ 416.748.351,68	40	1/09/2026	11/10/2026									$ 312.561.263,76				$ 104.187.087,92												$ 416.748.351,68	
REDES INTERNAS																																
Redes Internas	UND	322	$ 344.436.396,5	130	30/08/2026	10/12/2026					$ 32.090.347,50				$ 85.574.260,00				$ 98.410.399,00				$ 106.967.825,00				$ 21.393.565,00				$ 344.436.396,5	
DERECHOS DE CONEXIÓN																																
Derecho de conexión	UND	322	$ 299.509.910,0	130	30/08/2026	10/12/2026					$ 27.904.650,00				$ 74.412.400,00				$ 85.574.260,00				$ 93.015.500,00				$ 18.603.100,00				$ 299.509.910,0	
Conexión al servicio	UND	322	0	35	30/11/2026	23/12/2026																										
TOTALES											$ 256.431.463				$ 841.975.638				$ 690.706.928				$ 381.100.603				$ 60.806.308				$ 2.231.022.331,7	
PORCENTAJE							0,00%				11,49%				37,74%				30,96%				17,08%				2,73%				100,00%	
TOTAL																															2.231.022.331,7	
INTERVENTORIA																																
Interventoria	UND	1	143.866.240,00	180	3/07/2026	29/12/2026	$ -				$ 16.535.840,00				$ 54.394.332,40				$ 44.539.853,87				$ 24.575.022,69				$ 3.921.190,04				$ 143.866.240	

Firma:

Nombre: EFRAIN HERNANDEZ RIAÑO
Coordinador Proyectos Area Tolima
MOVILLGAS S.A.S. ESP

Ilustración 2. Cronograma de ejecución inicial. Convenio 4156 – 2025

4.2 Cronograma de ejecución proyectado.

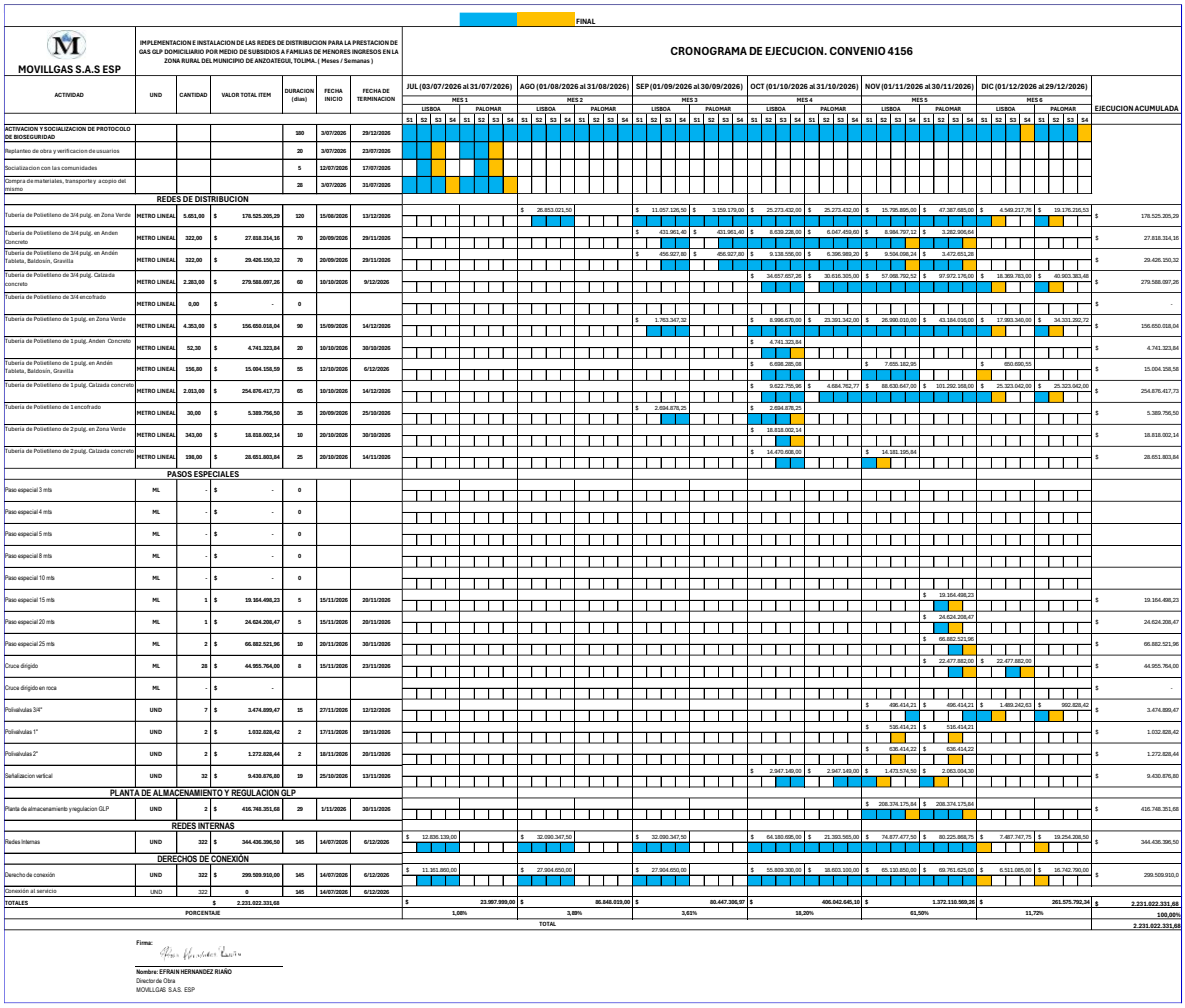

FINAL

MOVILLGAS S.A.S ESP

IMPLEMENTACION E INSTALACION DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PARA LA PRESTACION DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, TOLIMA. (Meses / Semanas)

CRONOGRAMA DE EJECUCION. CONVENIO 4156

ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL ITEM	DURACION (días)	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACION	JUL (03/07/2026 al 31/07/2026) MES 1	AGO (01/08/2026 al 31/08/2026) MES 2	SEP (01/09/2026 al 30/09/2026) MES 3	OCT (01/10/2026 al 31/10/2026) MES 4	NOV (01/11/2026 al 30/11/2026) MES 5	DIC (01/12/2026 al 29/12/2026) MES 6	EJECUCION ACUMULADA
ACTIVACION Y SOCIALIZACION DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD				180	3/07/2026	29/12/2026							
Replanteo de obra y verificacion de usuarios				20	3/07/2026	23/07/2026							
Socializacion con las comunidades				5	22/07/2026	17/07/2026							
Compra de materiales, transporte y acopio del mismo				28	3/07/2026	31/07/2026							
REDES DE DISTRIBUCION													
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	METRO LINEAL	5.651,00	$ 178.525.205,29	120	15/08/2026	13/12/2026		$ 26.853.021,50	$ 11.057.126,50 $ 3.159.179,00	$ 25.273.432,00 $ 25.273.432,00	$ 15.795.895,00 $ 47.387.685,00	$ 4.549.217,75 $ 19.176.216,53	$ 178.525.205,29
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	METRO LINEAL	322,00	$ 27.818.314,16	70	20/09/2026	29/11/2026			$ 431.961,40 $ 431.961,40	$ 8.639.228,00 $ 8.047.459,00	$ 8.984.797,12 $ 1.282.906,64		$ 27.818.314,16
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla	METRO LINEAL	322,00	$ 29.426.150,32	70	20/09/2026	29/11/2026			$ 456.927,80 $ 456.927,80	$ 9.138.556,00 $ 8.396.969,20	$ 9.594.596,34 $ 3.472.921,39		$ 29.426.150,32
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. Calzada concreto	METRO LINEAL	2.383,00	$ 279.588.097,26	60	10/10/2026	9/12/2026				$ 34.657.657,26 $ 30.616.305,00	$ 57.068.792,52 $ 97.972.176,99	$ 18.369.783,99 $ 40.903.383,48	$ 279.588.097,26
Tuberia de Polietileno de 3/4 encofrado	METRO LINEAL	0,00	$ -	0									$ -
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	METRO LINEAL	4.353,00	$ 156.650.018,04	90	15/09/2026	14/12/2026			$ 1.763.367,32	$ 8.998.670,00 $ 23.391.342,00	$ 26.990.010,00 $ 43.184.035,00	$ 17.993.340,00 $ 34.331.352,72	$ 156.650.018,04
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. Anden Concreto	METRO LINEAL	52,30	$ 4.741.323,84	20	10/10/2026	30/10/2026				$ 4.741.323,84			$ 4.741.323,84
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla	METRO LINEAL	156,60	$ 15.004.158,58	55	12/10/2026	6/12/2026				$ 8.698.280,58	$ 7.655.182,95	$ 650.695,53	$ 15.004.158,58
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. Calzada concreto	METRO LINEAL	2.013,00	$ 254.876.417,73	65	10/10/2026	14/12/2026				$ 9.622.755,96 $ 4.684.762,77	$ 88.630.647,00 $ 101.292.168,00	$ 25.323.042,00 $ 25.323.042,00	$ 254.876.417,73
Tuberia de Polietileno de 1 encofrado	METRO LINEAL	30,00	$ 5.389.756,50	35	20/09/2026	25/10/2026			$ 2.694.878,25	$ 2.694.878,25			$ 5.389.756,50
Tuberia de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	METRO LINEAL	343,00	$ 18.818.002,14	10	20/10/2026	30/10/2026				$ 18.818.002,14			$ 18.818.002,14
Tuberia de Polietileno de 2 pulg. Calzada concreto	METRO LINEAL	196,00	$ 28.651.803,84	25	20/10/2026	14/11/2026				$ 14.470.608,00	$ 14.181.195,84		$ 28.651.803,84
PASOS ESPECIALES													
Paso especial 3 mts	ML	-	$ -	0									
Paso especial 4 mts	ML	-	$ -	0									
Paso especial 5 mts	ML	-	$ -	0									
Paso especial 8 mts	ML	-	$ -	0									
Paso especial 10 mts	ML	-	$ -	0									
Paso especial 15 mts	ML	1	$ 19.164.498,23	5	15/11/2026	20/11/2026					$ 19.164.498,23		$ 19.164.498,23
Paso especial 20 mts	ML	1	$ 24.624.208,47	5	15/11/2026	20/11/2026					$ 24.624.208,47		$ 24.624.208,47
Paso especial 25 mts	ML	3	$ 66.882.521,96	10	20/11/2026	30/11/2026					$ 66.882.521,96		$ 66.882.521,96
Cruce dirigido	ML	28	$ 44.955.764,00	8	15/11/2026	23/11/2026					$ 22.477.882,00 $ 22.477.882,00		$ 44.955.764,00
Cruce dirigido en roca	ML	-	$ -										$ -
Polivalvulas 3/4"	UND	7	$ 3.474.899,47	15	27/11/2026	12/12/2026					$ 496.414,21 $ 496.414,21 $ 1.489.242,63 $ 992.828,42		$ 3.474.899,47
Polivalvulas 1"	UND	2	$ 1.032.828,42	2	17/11/2026	18/11/2026					$ 516.414,21 $ 516.414,21		$ 1.032.828,42
Polivalvulas 2"	UND	2	$ 1.272.828,44	2	18/11/2026	20/11/2026					$ 636.414,22 $ 636.414,22		$ 1.272.828,44
Señalizacion vertical	UND	32	$ 9.430.876,80	19	25/10/2026	13/11/2026				$ 2.947.186,00 $ 2.947.186,00	$ 1.473.576,50 $ 2.063.004,30		$ 9.430.876,80
PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION GLP													
Planta de almacenamiento y regulacion GLP	UND	2	$ 416.748.351,68	29	3/11/2026	30/11/2026					$ 208.374.175,84 $ 208.374.175,84		$ 416.748.351,68
REDES INTERNAS													
Redes Internas	UND	322	$ 344.436.396,50	145	14/07/2026	6/12/2026	$ 12.836.130,00	$ 32.080.347,50	$ 32.080.347,50	$ 64.160.695,00 $ 21.393.565,00	$ 74.877.477,50 $ 80.225.868,75	$ 7.487.747,75 $ 19.254.308,50	$ 344.436.396,50
DERECHOS DE CONEXIÓN													
Derecho de conexión	UND	322	$ 299.509.910,00	145	14/07/2026	6/12/2026	$ 11.361.860,00	$ 27.904.650,00	$ 27.904.650,00	$ 55.809.300,00 $ 18.603.100,00	$ 65.110.850,00 $ 69.761.625,00	$ 6.511.085,00 $ 16.742.790,00	$ 299.509.910,0
Conexión al servicio	UND	322	0	145	14/07/2026	6/12/2026							
TOTALES			$ 2.231.022.331,68				$ 23.997.990,00	$ 86.648.019,00	$ 80.447.306,97	$ 406.042.645,10	$ 1.372.110.569,26	$ 261.575.792,34	$ 2.231.022.331,68
PORCENTAJE							1,08%	3,88%	3,61%	18,20%	61,50%	11,72%	100,00%
TOTAL													2.231.022.331,68

Firma:

Nombre: EFRAIN HERNANDEZ RIAÑO
Director de Obra
MOVILLGAS S.A.S. ESP

Ilustración 3. Cronograma de ejecución proyectado. Convenio 4156 – 2025

Para el tercer corte de ejecución, comprendido entre el **03 de septiembre y el 02 de octubre de 2026**, se proyecta un avance programado del **3,61 %**, correspondiente al porcentaje estimado de ejecución con respecto al valor total del presupuesto del proyecto, de acuerdo con el cronograma de ejecución proyectado para el periodo.

5. ALCANCE CONVENIO DE ASOCIACIÓN N° 4156 DEL 07 DE NOVIEMBRE 2025.

Para el alcance del convenio de asociación **No. 4156 del 07 de NOVIEMBRE del 2025** está bajo los parámetros de los aportes de la Gobernación del Tolima y la empresa de servicios públicos MOVILLGAS S.A.S E.S.P, donde se realizará la construcción y/o canalización de redes de distribución de gas GLP, pasos especiales, cruces de vías, derechos de conexión y redes internas, para prestar el servicio de Gas GLP a 322 familias de 2 veredas del municipio de Anzoátegui - Tolima. A continuación, se relaciona las condiciones Contractuales:

IMPLEMENTACION E INSTALACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACION DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, TOLIMA									
MUNICIPIO DE ANZOATEGUI									
DESCRIPCION	CODIGOS CREG	UND	PRECIOS CREG 2024	1. PALOMAR (113)		2. LISBOA (209)		TOTAL (322)	
				CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES
REDES DE DISTRIBUCION									
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	TPE3/4ZV	m	31.591,8	3.007,0	94.996.512,5	2.644,0	83.528.692,8	5.651,0	178.525.205,3
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	TPE3/4ACO	m	86.392,3	113,0	9.762.327,6	209,0	18.055.986,5	322,0	27.818.314,2
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla	TPE3/4TA	m	91.385,6	113,0	10.326.568,3	209,0	19.099.582,0	322,0	29.426.150,3
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	TPE3/4CO	m	122.465,2	1.384,0	169.491.864,5	899,0	110.096.232,8	2.283,0	279.588.097,3
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. Encofrado		m	238.282,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	TPE1ZV	m	35.986,7	2.804,0	100.906.650,7	1.549,0	55.743.367,3	4.353,0	156.650.018,0
Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	TPE1ACO	m	90.743,0	0,0	0,0	52,3	4.741.323,8	52,3	4.741.323,8
Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla	TPE1TA	m	95.720,3	0,0	0,0	156,8	15.004.158,6	156,8	15.004.158,6
Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto	TPE1CO	m	126.615,2	1.037,0	131.299.972,8	976,0	123.576.445,0	2.013,0	254.876.417,7
Tubería de Polietileno de 1 pulg. Encofrado		m	179.658,6	0,0	0,0	30,0	5.389.756,5	30,0	5.389.756,5
Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	TPE2ZV	m	54.863,0	0,0	0,0	343,0	18.818.002,1	343,0	18.818.002,1
Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto	TPE2CO	m	144.706,1	0,0	0,0	198,0	28.651.803,8	198,0	28.651.803,8
TOTAL REDES DE DISTRIBUCION				**8.458,0**	**516.783.896,4**	**7.266,0**	**482.705.351,3**	**15.724,0**	**999.489.247,7**
PASOS ESPECIALES Y DIRIGIDOS									
Paso especial 3 mts		UND	3.943.329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 4 mts		UND	4.234.680,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 5 mts		UND	4.352.296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 8 mts		UND	4.934.575,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 10 mts		UND	13.754.857,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 15 mts		UND	19.164.498,2	1,0	19.164.498,2	0,0	0,0	1,0	19.164.498,2
Paso especial 20 mts		UND	24.624.208,5	1,0	24.624.208,5	0,0	0,0	1,0	24.624.208,5
Paso especial 25 mts		UND	33.441.261,0	2,0	66.882.522,0	0,0	0,0	2,0	66.882.522,0
Cruce Dirigido		ML	1.605.563,0	14,0	22.477.882,0	14,0	22.477.882,0	28,0	44.955.764,0
Cruce Dirigido en Roca		ML	2.215.696,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polivalvulas 3/4"		UND	496.414,2	3,0	1.489.242,6	4,0	1.985.656,8	7,0	3.474.899,5
Polivalvulas 1"		UND	516.414,2	1,0	516.414,2	1,0	516.414,2	2,0	1.032.828,4
Polivalvulas 2"		UND	636.414,2	1,0	636.414,2	1,0	636.414,2	2,0	1.272.828,4
Señalizacion Vertical		UND	294.714,9	17,0	5.010.153,3	15,0	4.420.723,5	32,0	9.430.876,8
TOTAL PASOS ESPECIALES Y PASOS DIRIGIDOS				**4,0**	**140.801.335,0**	**0,0**	**30.037.090,8**	**4,0**	**170.838.425,8**
PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION GLP									
PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION		UND	208.374.175,8	1,0	208.374.175,8	1,0	208.374.175,8	2,0	416.748.351,7
TOTAL PLANTA - CITY GATE				**1,0**	**208.374.175,8**	**1,0**	**208.374.175,8**	**2,0**	**416.748.351,7**
ACOMETIDAS									
DERECHOS DE CONEXION (322 USUARIOS)		UND	930.155,0	113,0	105.107.515,0	209,0	194.402.395,0	322,0	299.509.910,0
REDES INTERNA (322 USUARIOS)		UND	1.069.678,3	113,0	120.873.642,3	209,0	223.562.754,3	322,0	344.436.396,5
TOTAL ACOMETIDAS				**226,0**	**225.981.157,3**	**418,0**	**417.965.149,3**	644,0	643.946.306,5
				1.091.940.564,5		**1.139.081.767,2**		**2.231.022.331,7**	

Ilustración 4. Relación – Presupuesto General por Veredas

1	REDES DE DISTRIBUCION	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		ML	15.724	$ 999.489.247,70
2	PASOS ESPECIALES Y DIRIGIDOS	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		UND	75	$ 170.838.425,80
3	PLANTA DE REGULACION	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		UND	2	$ 416.748.351,70
4	DERECHOS DE CONEXIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		UND	322	$ 299.509.910,00
5	RED INTERNA	UND	CANTIDAD	VALOR TOTAL
		UND	322	$ 344.436.396,50
CONVENIO CONTRACTUAL (N° 4156 -2025)				**$ 2.231.022.331,70**

Tabla 3 Condiciones Contractuales

Modelo de aporte Contractual Convenio de Asociación N° 4156 - 2026:

1	REDES DE DISTRIBUCION	UND	CANTIDAD	APORTE GOBERNACION 77%	APORTE MOVILLGAS 23%	VALOR TOTAL
		ML	15.724	$ 769.606.720,729	$ 229.882.526,971	$ 999.489.247,70
2	PASOS ESPECIALES Y DIRIGIDOS	UND	CANTIDAD	APORTE GOBERNACION 77%	APORTE MOVILLGAS 23%	VALOR TOTAL
		UND	75	$ 131.545.587,866	$ 39.292.837,934	$ 170.838.425,80
3	PLANTA DE REGULACION	UND	CANTIDAD	APORTE GOBERNACION 77%	APORTE MOVILLGAS 23%	VALOR TOTAL
		UND	2	$ 320.896.230,809	$ 95.852.120,891	$ 416.748.351,70
4	DERECHOS DE CONEXIÓN	UND	CANTIDAD	APORTE GOBERNACION 100%	APORTE MOVILLGAS 0%	VALOR TOTAL
		UND	322	$ 299.509.910,00	$ 00 ,00	$ 299.509.910,00
5	RED INTERNA	UND	CANTIDAD	APORTE GOBERNACION 85%	APORTE MOVILLGAS 15%	VALOR TOTAL
		UND	322	$ 292.770.937,025	$ 51.665.459,475	$ 344.436.396,50
CONVENIO CONTRACTUAL (N° 4156-2025)				**$ 1.814.329.386,42**	**$ 416.692.945,271**	**$ 2.231.022.331,70**

Tabla 4 Modelo de aportes contractual convenio Asociación N° 4156 - 2025

6. AVANCE DE OBRA ÍTEMS - % EJECUCIÓN. (AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO)

Los avances de obra del convenio de asociación N° 4156 de 07 de noviembre de 2025 se estipulan en memorias de cálculos adjuntos al presente informe. En el presente cuadro se enseña un resumen general de las unidades constructivas en el periodo de ejecución del convenio.

				IMPLEMENTACION E INSTALACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACION DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, TOLIMA					
				MUNICIPIO DE ANZOATEGUI					
DESCRIPCION	CODIGOS CREG	UND	PRECIOS CREG 2024	1. PALOMAR (113)		2. LISBOA (209)		TOTAL (322)	
				CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES
REDES DE DISTRIBUCION									
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	TPE3/4ZV	m	31.591,8	0,0	0,0	980,0	30.959.954,2	980,0	30.959.954,2
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	TPE3/4ACO	m	86.392,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla	TPE3/4TA	m	91.385,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tubería de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	TPE3/4CO	m	122.465,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	TPE1ZV	m	35.986,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	TPE1ACO	m	90.743,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosín, Gravilla	TPE1TA	m	95.720,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tubería de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto	TPE1CO	m	126.615,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tubería de Polietileno de 1 pulg. Encofrado		m	179.658,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	TPE2ZV	m	54.863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tubería de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto	TPE2CO	m	144.706,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL REDES DE DISTRIBUCION				**0,0**	**0,0**	**980,0**	**30.959.954,2**	**980,0**	**30.959.954,2**
PASOS ESPECIALES Y DIRIGIDOS									
Paso especial 3 mts		UND	3.943.329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 4 mts		UND	4.234.680,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 5 mts		UND	4.352.296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 8 mts		UND	4.934.575,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 10 mts		UND	13.754.857,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 15 mts		UND	19.164.498,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 20 mts		UND	24.624.208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 25 mts		UND	33.441.261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cruce Dirigido		ML	1.605.563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cruce Dirigido en Roca		ML	2.215.696,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polivalvulas 3/4"		UND	496.414,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polivalvulas 1"		UND	516.414,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polivalvulas 2"		UND	636.414,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Señalizacion Vertical		UND	294.714,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL PASOS ESPECIALES Y PASOS DIRIGIDOS				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION GLP									
PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION		UND	208.374.175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL PLANTA - CITY GATE				**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
ACOMETIDAS									
DERECHOS DE CONEXION (322 USUARIOS)		UND	930.155,0	0,0	0,0	37,0	34.415.735,0	37,0	34.415.735,0
REDES INTERNA (322 USUARIOS)		UND	1.069.678,3	0,0	0,0	37,0	39.578.095,3	37,0	39.578.095,3
TOTAL ACOMETIDAS				**0,0**	**0,0**	**74,0**	**73.993.830,3**	74,0	73.993.830,3
				0,0		**104.953.784,5**		104.953.784,45	AVANCE FINANCIERO
								$ 2.231.022.331,68	PRESUPUESTO INICIAL
								4,70%	PORCENTAJE DE AVANCE

Ilustración 5. porcentaje (%) ejecución ítems

Al día de hoy las actividades de obra por parte de la empresa MOVILLGAS S.A.S E.S.P se encuentran en un **6,05 %** de ejecución del avance financiero del valor total del proyecto, donde se realizó la construcción de 52 redes internas con sus respectivos centros de medición y la canalización e instalación de tubería polietileno de ¾" en zona verde en la vereda Lisboa.

				IMPLEMENTACION E INSTALACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA LA PRESTACION DE GAS GLP DOMICILIARIO POR MEDIO DE SUBSIDIOS A FAMILIAS DE MENORES INGRESOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI, TOLIMA					
				MUNICIPIO DE ANZOATEGUI					
DESCRIPCION	CODIGOS CREG	UND	PRECIOS CREG 2024	1. PALOMAR (113)		2. LISBOA (209)		TOTAL (322)	
				CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES	CANTIDAD	SUBTOTALES
REDES DE DISTRIBUCION									
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Zona Verde	TPE3/4ZV	m	31.591,8	0,0	0,0	980,0	30.959.954,2	980,0	30.959.954,2
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Anden Concreto	TPE3/4ACO	m	86.392,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Andén Tableta, Baldosin, Gravilla	TPE3/4TA	m	91.385,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberia de Polietileno de 3/4 pulg. en Calzada Concreto	TPE3/4CO	m	122.465,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. en Zona Verde	TPE1ZV	m	35.986,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. en Anden Concreto	TPE1ACO	m	90.743,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. en Andén Tableta, Baldosin, Gravilla	TPE1TA	m	95.720,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. en Calzada Concreto	TPE1CO	m	126.615,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberia de Polietileno de 1 pulg. Encofrado		m	179.658,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberia de Polietileno de 2 pulg. en Zona Verde	TPE2ZV	m	54.863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tuberia de Polietileno de 2 pulg. en Calzada Concreto	TPE2CO	m	144.706,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL REDES DE DISTRIBUCION				0,0	0,0	980,0	30.959.954,2	980,0	30.959.954,2
PASOS ESPECIALES Y DIRIGIDOS									
Paso especial 3 mts		UND	3.943.329,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 4 mts		UND	4.234.680,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 5 mts		UND	4.352.296,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 8 mts		UND	4.934.575,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 10 mts		UND	13.754.857,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 15 mts		UND	19.164.498,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 20 mts		UND	24.624.208,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paso especial 25 mts		UND	33.441.261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cruce Dirigido		ML	1.605.563,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Cruce Dirigido en Roca		ML	2.215.696,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polivalvulas 3/4"		UND	496.414,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polivalvulas 1"		UND	516.414,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polivalvulas 2"		UND	636.414,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Señalizacion Vertical		UND	294.714,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL PASOS ESPECIALES Y PASOS DIRIGIDOS				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION GLP									
PLANTA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACION		UND	208.374.175,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL PLANTA - CITY GATE				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ACOMETIDAS									
DERECHOS DE CONEXION (322 USUARIOS)		UND	930.155,0	0,0	0,0	52,0	48.368.060,0	52,0	48.368.060,0
REDES INTERNA (322 USUARIOS)		UND	1.069.678,3	0,0	0,0	52,0	55.623.269,0	52,0	55.623.269,0
TOTAL ACOMETIDAS				0,0	0,0	104,0	103.991.329,0	104,0	103.991.329,0
				0,0		134.951.283,2		134.951.283,20	AVANCE FINANCIERO
								$ 2.231.022.331,68	PRESUPUESTO INICIAL
								6,05%	PORCENTAJE DE AVANCE

Ilustración 6. Porcentaje acumulado (%) ejecución ítems

6.1. MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Herramienta menor.
- Plantas eléctricas.
- Roto martillo.
- Pulidoras.
- Equipos de Termo fusión A Socket.
- Camioneta y camión.

6.2. PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO DE OBRA CONVENIO.

Ingeniero Residente, personal técnico actividades de termo fusión, personal área administrativa y otros.

6.3. GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES SST.

- Afiliaciones a seguridad social del personal en obra de igual manera administrativo y operativo.
- Buen servicio preoperacionales de los equipos utilizados en obra.
- Instalación de la señalización y demarcación de áreas o zonas de trabajo, las cuales presenten riesgo a la integridad física de todos los trabajadores y personal externo involucrados en el proyecto.
- Entrega y uso correcto de EPP en campo por parte de los trabajadores.

6.4. GESTIÓN AMBIENTAL.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre de 2026, se adelantaron las actividades de gestión ambiental asociadas a la ejecución del proyecto de gasificación rural domiciliaria, orientadas a prevenir, mitigar y controlar los posibles impactos ambientales derivados de las actividades constructivas y logísticas desarrolladas.

Las actividades ejecutadas durante este periodo correspondieron principalmente a la canalización manual, transporte y traslado de tuberías y materiales, almacenamiento de materiales y continuidad en la construcción de redes internas y acometidas domiciliarias en la vereda Lisboa.

En el desarrollo de estas actividades se procuró mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en las áreas intervenidas, realizar un manejo apropiado de los materiales y residuos generados, evitar afectaciones innecesarias al suelo y a la vegetación existente y garantizar que las actividades de excavación e instalación de las redes se desarrollaran dentro de las áreas requeridas para el proyecto.

Asimismo, se realizó seguimiento a las condiciones ambientales de los frentes de trabajo, procurando minimizar la generación de residuos, material particulado, afectaciones al suelo y demás impactos asociados a las actividades propias de la obra.

6.4.1 COMPONENTE AMBIENTAL

El componente ambiental del proyecto contempla las medidas de prevención, manejo, mitigación y control de los impactos ambientales que puedan generarse durante las etapas de construcción e instalación de las redes de distribución de gas GLP domiciliario.

Para el periodo objeto del presente informe, las principales medidas consideradas fueron:

Aspecto ambiental	Actividad / medida implementada

Aspecto ambiental	Actividad / medida implementada
Manejo de residuos sólidos	Recolección y disposición adecuada de los residuos generados durante las actividades de obra, evitando su disposición sobre el suelo o en zonas no autorizadas.
Manejo del suelo	Durante las excavaciones se procura realizar la intervención únicamente en las áreas requeridas para la instalación de las redes y efectuar el adecuado manejo del material producto de excavación.
Material particulado	Control de la generación de polvo durante las actividades de excavación, manipulación y transporte de materiales, especialmente en zonas cercanas a viviendas y vías de acceso.
Almacenamiento de materiales	Organización y almacenamiento de tuberías y demás materiales en un sitio destinado para tal fin, procurando condiciones adecuadas de seguridad, orden y protección.
Protección de la vegetación	Evitar intervenciones innecesarias sobre la cobertura vegetal existente y limitar las actividades a las áreas establecidas para la ejecución de las obras.
Orden y aseo	Mantener despejadas y limpias las áreas de trabajo y retirar los residuos y materiales sobrantes generados durante las actividades constructivas.
Manejo de excavaciones	Realizar las excavaciones de manera controlada y disponer adecuadamente el material sobrante, evitando obstrucciones de accesos, drenajes o afectaciones a predios.
Prevención de derrames	Mantener medidas preventivas durante el uso y transporte de combustibles, lubricantes u otras sustancias requeridas para la operación de equipos y vehículos.

Tabla 5. Componente Ambiental.

6.4.2 IMPACTO GENERADOS EJECUCIÓN DE OBRA.

• Generación de escombros y otros residuos sólidos.
• Modificaciones en el paisaje y alteración de la cobertura vegetal.
• Alteración del flujo vehicular o peatonal.
• Alteración del espacio público.
• Afectación a la infraestructura de servicios públicos e interrupción en la prestación de los mismos.

Tabla 6. Impactos Generados.

6.4.3 CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES.

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 03 de septiembre de 2026, correspondiente al segundo mes de ejecución del proyecto, se realizó seguimiento y control a las actividades programadas, de acuerdo con el alcance, las condiciones técnicas y el cronograma establecido para la ejecución de las obras de gasificación rural domiciliaria en el municipio de Anzoátegui, Tolima.

En este periodo se adelantaron actividades de canalización y construcción de redes internas y centros de medición en la vereda Lisboa.

A continuación, se presenta el control de las principales actividades desarrolladas durante el periodo:

Actividad	Descripción / Alcance	Estado
Transporte y traslado de materiales	Traslado de las tuberías y demás materiales requeridos hacia el municipio y los frentes de trabajo establecidos.	Ejecutada
Almacenamiento de materiales	Gestión y disposición de una bodega para el almacenamiento y custodia de los materiales destinados a la ejecución del proyecto.	Ejecutada
Construcción de redes internas	Inicio de la instalación de las redes internas de distribución de gas GLP domiciliario en la vereda Lisboa.	En ejecución
Instalación de acometidas domiciliarias	Inicio de la construcción e instalación de las acometidas correspondientes a las viviendas beneficiarias de la vereda Lisboa.	En ejecución

Tabla 7. Control de Actividades de Obra.

6.4.4 MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre de 2026, se realizó el manejo y control de los residuos sólidos generados como consecuencia de las actividades de transporte, almacenamiento de materiales, replanteo e inicio de las obras de construcción de redes internas y acometidas domiciliarias.

Los residuos generados durante las actividades constructivas fueron recolectados y retirados de las áreas de trabajo**,** evitando su disposición directa sobre el terreno y procurando mantener condiciones adecuadas de orden y aseo en los frentes de obra. Asimismo, se realizó la separación y almacenamiento temporal de los residuos aprovechables y no aprovechables, de acuerdo con su naturaleza y las condiciones disponibles en cada frente de trabajo.

En las actividades de instalación de las redes se procuró minimizar la generación de residuos y realizar un uso adecuado de los materiales, evitando desperdicios innecesarios de tubería, accesorios y demás elementos utilizados en la ejecución de las obras.

Durante el periodo reportado no se presentaron situaciones asociadas al manejo inadecuado de residuos sólidos que generaran afectaciones ambientales significativas**.**

7. GESTIÓN FINANCIERA.

7.1. DESCRIPCIÓN FINANCIERA.

A la fecha de corte del presente informe, MOVILLGAS S.A.S. E.S.P. no ha solicitado el desembolso del anticipo correspondiente al cincuenta por ciento (50%)**,** toda vez que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Cuarta, numeral 27 del Convenio**,** dicho desembolso se encuentra condicionado a la presentación del Certificado de Tradición y Libertad (CTL) del predio destinado para la ubicación de la planta**.** Actualmente, la documentación y el proceso de legalización correspondiente al predio se encuentran en trámite, razón por la cual no se ha procedido con la solicitud del pago anticipado.

RESUMEN FINANCIERO CONVENIO No. 4156 - 2025 INFORME N° 1		%
VALOR DEL CONVENIO	**$ 2.231.022.331,7**	**100%**
APORTE GOBERNACIÓN	**$ 1.814.329.386,4**	**81%**
APORTE MOVILLGAS S.A.S ESP	**$ 416.692.945,3**	**19%**
VALOR SOLICITADO PRIMER PAGO 50% APORTE GOBERNACION	**$ 907.164.693,20**	**50%**

Tabla 8. Descripción Financiera Convenio Asociación.

7.2. SEGURIDAD SOCIAL

Se adjunta la **planilla de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral** correspondiente al personal técnico, operativo y administrativo que ha participado en las actividades desarrolladas durante la etapa inicial de ejecución del proyecto, como soporte del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con seguridad social.

8. GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO.

A la fecha la empresa MOVILLGAS S.A.S E.S.P ha realizado labores en la vereda Lisboa de Anzoátegui - Tolima, con instalación de redes internas con la finalidad de llevar a cabo la ejecución del convenio de asociación No. 4156 del 07 de noviembre de 2025 celebrado con la Gobernación del Tolima.

8.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

8.1.1. LICENCIAS Y PERMISOS.

Las licencias y permisos tramitados por la empresa MOVILLGAS S.A.S E.S.P para la ejecución a cabalidad del proyecto se han gestionado ante la secretaria de planeación del municipio de Anzoátegui - Tolima.

ENTIDAD	PERMISO	DOCUMENTO
Secretaria de Planeación Municipio de Anzoátegui – Tolima.	Licencia de Intervención y ocupación espacio público	Resolución No. 1 del 25 de julio de 2026. Anzoátegui, Tolima.

Tabla 9. Licencias Y Permisos.

8.1.2. ACTAS, INFORMES Y OTROS.

- Elaboración de programación de obra realizada por **MOVILLGAS S.A.S E.S.P.**
- Solicitud de permisos “intervención y ocupación espacio público”
- Elaboración de informe de avance de obra.

8.2. GESTIÓN TÉCNICA.

Las actividades de obra ejecutadas en el periodo comprendido del 03 de agosto al 02 de septiembre de 2026, cumplen con los parámetros establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 2505 2.44 Red Interna y NTC 3728 2.42 Redes de Distribución y 3.2 Trazado de Redes.

8.2.1 LABORES REALIZADAS.

- Replanteo de obra
- Socialización con las comunidades
- Construcción de redes internas y centros de medición
- Transporte de materiales

9. PLAN DE MEJORAMIENTO Y LECCIONES

Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre de 2026**,** correspondiente al primer mes de ejecución del proyecto, se realizó seguimiento a las actividades programadas y a las condiciones encontradas durante el inicio de la ejecución de las obras.

se evidenció la importancia de mantener una adecuada coordinación entre la planeación técnica, la programación de obra y las condiciones encontradas en campo**,** particularmente en el desarrollo de las actividades de canalización y construcción de redes internas.

Asimismo, se identificó que el seguimiento permanente de los trazados, las cantidades ejecutadas y las condiciones de cada frente de trabajo permite anticipar posibles situaciones que puedan generar ajustes o retrasos en la ejecución.

Acciones y recomendaciones para el siguiente periodo

- Fortalecer la planeación y programación de los frentes de trabajo, priorizando la continuidad de las actividades constructivas iniciadas en la vereda Lisboa.
- Mantener un adecuado control de materiales, especialmente en lo relacionado con recepción, almacenamiento, transporte y utilización de tuberías y accesorios.
- Realizar seguimiento permanente a las cantidades de obra ejecutadas, de manera que permitan establecer oportunamente el avance físico del proyecto frente a lo programado.
- Fortalecer las actividades de orden, aseo y manejo de residuos sólidos en los diferentes frentes de trabajo.
- Mantener la coordinación permanente con la supervisión del convenio y la interventoría**,** atendiendo oportunamente las recomendaciones y observaciones que se formulen durante el desarrollo de las actividades.
- Continuar con el seguimiento a las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad de los frentes de trabajo, con el fin de prevenir situaciones que puedan afectar el normal desarrollo del proyecto.
- Programar inicio de actividades de ejecución en la vereda Palomar.

10. REGISTRO FOTOGRÁFICO.













Movillgas
S.A.S E.S.P 901.747.670-1













Calle 153 No. 16C-38 Bogotá D.C
Calle 10 No. 3-76 edif. Camara de comercio ibague – oficina 403
PBX.: (601) 9181112 - Celular 3102122715

11. LISTADO DE USUARIOS CONSTRUIDOS.


ITEM	N° DE CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	N° MEDIDOR	LATITUD	LONGUITUD	VEREDA	MUNCIPIO	ROL/USUARIO
1	28.589.226	DIANA PATRICIA BORRAY BUITRAGO	202502036779	490693	506380	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
2	1.110.086.154	JAIRO ENRIQUE CARDENAS SOTELO	202502036856	490624	506400	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
3	5.842.642	HERALDO CARDENAS GORDILLO	202502036861	490625	506401	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
4	5.842.132	CARLOS JULIO BERNAL VARGAS	202502039411	490382	506448	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
5	5.826.593	CARLOS JULIO HERRAN BONILLA	202502039408	490367	506539	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
6	93.473.091	WILLIAN VARGAS LATORRE	202502039346	490398	506405	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
7	38.231.598	MARIA EUNICE LATORRE ROJAS	202502039347	490382	506397	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
8	1.110.087.583	FLOR ANDREA PATIÑO MILLAN	202502036855	490321	506386	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
9	28.863.616	NURY ALICIA SALAZAR	202502036697	489979	506304	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
10	1.110.088.661	ISAIAS BERNAL HERRAN	202502036860	489947	506317	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
11	79.812.169	YOBANY CAPERA SALAZAR	202502039412	489883	506320	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
12	28.587.946	OBEIDA GONZALEZ	202502039343	489898	506334	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
13	93.060.882	JOSE HONORIO GUARIN LOMBANA	202502039345	489875	506335	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
14	1.110.086.183	LEIDY DIANA CAPERA SALAZAR	202502036857	489808	506303	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
15	28.588.851	MARIA CONSUELO HERNANDEZ	202502039414	489802	506300	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
16	1.110.086.667	NATALIA PEREZ GONZALEZ	202502036858	489781	506291	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
17	28.587.754	MAIRUTH TARQUINO GUAPACHO	202502039413	489786	506287	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
18	16.545.437	JOSE MARIA HERRERA	202502036698	489629	506369	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
19	89.002.353	RICARDO PALACIO GRANADA	202502036702	489520	506399	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
20	28.588.536	GLADYS MILLAN MURIEL	202502036701	489475	506173	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
21	1.006.087.902	LINA FERNANDA BORJA VANEGAS	202502036700	489475	506173	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
22	1.006.087.277	HAROL PATIÑO MILLAN	202502036696	489475	506173	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
23	65.728.019	MARY LUZ LEIVA VELANDIA	202502038160	489130	505914	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
24	5.842.643	FABIAN SILVA MONSALVE	202502039292	489150	505898	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
25	30.516.768	LIDA LEGRO LOPEZ	202502039293	489167	505922	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
26	1.022.929.412	GILBERTO RODRIGUEZ CRUZ	202502039287	489166	505923	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
27	28.681.925	MARIA DEL ROSARIO VERJAN CERQUERA	202502036699	489166	505923	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
28	6.008.671	LUIS EDUARDO GARZON	202502036695	489226	505963	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
29	5.842.110	JORGE LEIVA VELANDIA	202502039289	489228	505967	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
30	1.110.462.638	LUIS ALFREDO PULIDO GONZALEZ	202502039290	489228	505982	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
31	7.601.195	RICHARD ANTONIO RENDON MORA	202502039294	489236	505980	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
32	4.518.239	FRANCISCO JAVIER MARTINEZ	202502039291	489232	505997	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
33	28.589.049	GLORIA STELLA AMPUDIA SAAVEDRA	202502036768	489289	506033	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
34	28.592.820	MODESTINA OTALORA ROJAS	202502039288	489296	506037	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
35	1.006.086.747	ISMAEL SANCHEZ OTALORA	202502036767	489365	506009	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
36	28.587.986	MARIA MELANIA OTALORA ROJAS	202502036773	489374	506014	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL
37	28.587.321	CONSUELO LONDOÑO VALENCIA	202502036772	489361	506049	LISBOA	ANZOATEGUI	USUARIO FINAL

Tabla 10. Listado usuarios construidos

12. CONCLUSIONES

- Durante el periodo comprendido entre el 03 de agosto y el 02 de septiembre de 2026, correspondiente al segundo mes de ejecución del convenio, se avanzó en el desarrollo de las actividades constructivas previstas, logrando la construcción de treinta y siete (37) redes internas con sus respectivos centros de medición y la canalización e instalación de 980 ml en de tubería de ¾" en zona verde en la vereda Lisboa, dando cumplimiento al cronograma proyectado.
- Las actividades desarrolladas durante el periodo permitieron consolidar el avance físico de las obras y fortalecer el desarrollo del frente de trabajo en la vereda Lisboa, manteniendo la continuidad de las actividades previstas y atendiendo las especificaciones técnicas establecidas para la ejecución del proyecto.
- A la fecha de corte del presente informe, las actividades ejecutadas por MOVILLGAS S.A.S. E.S.P. representan un avance financiero acumulado del 6,05 % del valor del convenio**,** correspondiente a las actividades efectivamente desarrolladas durante el periodo objeto de seguimiento.
- A la fecha, la empresa MOVILLGAS S.A.S. E.S.P. informa que la solicitud de aprobación de cargos tarifarios presentada ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), correspondiente al Convenio No. 4156 del 7 de noviembre de 2025, fue radicada el 21 de abril de 2026 bajo el número de radicado E2026005755 y, actualmente, se encuentra en trámite ante dicha entidad.
- Finalmente, se continuará con la ejecución progresiva de las actividades contempladas en el convenio, fortaleciendo la programación, seguimiento y control de los diferentes frentes de trabajo, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las metas físicas, financieras y contractuales establecidas para el proyecto.

Cordialmente,



_____

EFRAIN HERNANDEZ RIAÑO
Director de obra
MOVILLGAS S.A.S E.S.P

13. ANEXOS

1. *Planilla de seguridad social.*
2. *Licencia de intervención y ocupación del espacio público.*
3. *Certificado de calidad de los materiales.*
4. *Radicado solitud tarifaria CREG.*
5. *memoria de cantidades ejecutadas.*
6. *plano de redes y usuarios construidos.*
