ICCU-I-2026-0001352

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

3 de febrero de 2026

Al contestar Cite este N°. **ICCU-I-2026-0001352**

Folios: 1 Anexos: Si

TIPO DE DOCUMENTO: Comunicación Contractual.

ASUNTO: Aprobación del informe mensual correspondiente a Septiembre de 2025

Bogotá D, C. 3 de febrero de 2026

Señor
CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
Director de interventoría.
CONSORCIO INTERVENTORIA AC
TRANSVERSAL 55A 115A-06
correspondencia@g-proyectos.com.co
Bogotá

Asunto: Aprobación del informe mensual correspondiente a Septiembre de 2025.
Ref.: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Legal para la intervenciónde las vías que conforman el programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el Departamento de Cundinamarca.

Reciba un cordial saludo,

En atención al comunicado radicado a esta entidad bajo el numero 766-457-ICCU,mediante el cual se hace entrega del Informe Mensual de Interventoría No. 6 – Versión 1, correspondiente al mes de septiembre que contiene los componentes Técnicos, SST, Ambiental y Social, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 30 de septiembre de 2025; el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU se permite emitir concepto **favorable** al contenido del informe mencionado.

No obstante, para dar continuidad al tramite de pago, se solicita radicar, en un único archivo electrónico, a la Subdirección de Caminos Vecinales del ICCU, la siguiente documentación:

• Aprobación del informe mensual de interventoría.
• Acta de costos de interventoría debidamente firmada MS-GP-FR-42.
• Factura proforma a espera de la aprobación para factura de venta.
• RUT.
• Certificación bancaria.
• Certificación de parafiscales.
• Soporte de contratos y comprobantes de pago de nómina.
• Soporte de todos los conceptos a cobrar según la propuesta económica del contrato.

Cordialmente,

QR Validación Documento:

Contraseña:HdFcNPIjBa

INSTITUTO DE CAMINOS Y
CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Adriana Diaz

ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ
Profesional Especializado
Subdirección de Caminos Vecinales.

Aprobó: PERLA ROCÍO LOMBO CORTES / DCT
Revisó: . ANGELLO GUZMAN MARIN / SDIV
Proyectó: ADRIANA DE LOS SANTOS MARTIN DIAZ / SDCV

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 219 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 138 DE 2025

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL No. 06

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C.

BOGOTÁ D.C., 01 DE OCTUBRE DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. Introducción 8
2. Descripción del proyecto 10
2.1 Localización 10
2.2 Estado inicial de la vía 10
3 Información Contrato de Obra 11
3.1 Información general contrato de obra 11
3.2 Actividades ejecutadas en el mes 13
3.2.1 Actividades ejecutadas en el mes componente técnico 13
3.2.2 Actividades Fase II Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones, ver tabla 1. 16
3.2.3 Actividades Fase III Construcción 18
3.2.4 Actividades ejecutadas en el mes componente ambiental 25
3.2.5 Actividades ejecutadas en el mes componente social 27
4 Reportes ejecución mensual contrato de obra 36
4.1 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 36
4.2 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra 36
4.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 40
4.4 Estado General del Tiempo 42
4.5 Resumen Ensayos de Laboratorio 43
4.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 45
4.6.1 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia) 45
4.7 Otros documentos seguimiento mensual 46
4.7.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 46
4.7.2 Seguimiento Programa de Inversión 47
4.7.3 Seguimiento Programa de Obra 48
5 Información contrato de interventoría 50
5.1 Información general del contrato de interventoría 50

Fuente: elaboración propia 51
5.2 Informe semanal 51
5.3 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor 52
5.4 Informes especialistas y profesionales 53
5.5 Informe del Programa Anual de Caja – PAC 53
6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría 54
6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría 54
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría 55
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría 56
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 57
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría 57
6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría 57
6.6 Otros Documentos seguimiento mensual 58
6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo 58
6.7 Actas de Comité de Obra 58
7 Conclusiones y recomendaciones 59
7.1 Conclusiones y recomendaciones área técnica 59
7.2 Conclusiones y recomendaciones área ambiental 61
7.3 Conclusiones y recomendaciones área social 62
7.4 Conclusiones y recomendaciones área SST 63
8 Anexos 64
8.1 Carpeta componente técnico 64
8.2 Carpeta componente social 64
8.3 Carpeta componente SST 64
8.4 Carpeta componente ambiental 64
8.5 Registro fotográfico del avance de las obras. 64
8.6 Correspondencia 69
8.7 Bitácora de obra 87

8.8 Certificación componente ambiental y social..... 88

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Cuadro resumen de actividades a la fase I y II Acumulado mensual..... 18
Tabla 2. Registro fotográfico Alcantarilla N° 2..... 19
Tabla 3. Registro fotográfico Alcantarilla N° 3..... 20
Tabla 4. Registro fotográfico Alcantarilla N° 4..... 22
Tabla 5. registro fotográfico alcantarilla #5 23
Tabla 6. registro fotográfico alcantarilla N°6..... 24
Tabla 7. Reuniones preliminares realizadas en el mes de septiembre: 29
Tabla 8. Reuniones realizadas durante el mes 29
Tabla 9. Estado de los volantes 30
Tabla 10. Estado de las cartas personalizadas 30
Tabla 11. Estado de la solicitud del diseño de las vallas a la Entidad 31
Tabla 12. Estado del levantamiento de actas de vecindad 32
Tabla 13. Mano de obra no calificada – Provincia del Guavio 32
Tabla 14. Paridad laboral..... 33
Tabla 15. Informes semanales de contratista..... 33
Tabla 16. Informes semanales de interventoría..... 34
Tabla 17. Mesas de trabajo 34
Tabla 18. Comités de seguimiento semanal 34
Tabla 19. Trazabilidad de informes mensuales:..... 35
Tabla 20. Personal contratista 37
Tabla 21. Personal del Subcontratista – Jefferson Enrique Amézquita Picón..... 38
Tabla 22. Personal del Subcontratista – Tecnisuelos Pavimentos y Concretos SAS..... 38
Tabla 23. Personal del Subcontratista – Urbanuz Construcciones 38
Tabla 24. Personal Retirado..... 39
Tabla 25. tabla de control presupuesto ejecutado semanal del contratista..... 40
Tabla 26. Resumen precipitaciones mensual..... 42
Tabla 27. Avance financiero de acuerdo con los capítulos de ejecución 49
Tabla 28. Avance de actividades de obra por capítulos en ejecución 49
Tabla 29. Diagrama anual de caja de la interventoría..... 53
Tabla 30. Personal de la interventoría, periodo mes de agosto 55
Tabla 31. Personal de interventoría-personales especialistas..... 55
Tabla 32. Valor acumulado de actividades ejecutadas por parte de la interventoría... 56

RESUMEN MENSUAL DEL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

El Informe Mensual de Interventoría No. 6, correspondiente al mes de septiembre de 2025, presenta un balance de las actividades desarrolladas en la supervisión técnica, administrativa y documental del contrato de obra, las actividades técnicas incluyen el desarrollo de las fases I, II y III que implican activades como levantamientos topográficos, realización de apiques, toma de muestras, ensayos de laboratorio e instalación de placas con presencia activa en Municipios de las Provincias de Oriente, Medina y Soacha, la GNSS y la construcción de obras drenaje en la Provincia del Guavio. Se describen los aspectos generales, destacando el alcance de la interventoría y el seguimiento a los compromisos establecidos.

Durante el periodo se evidenciaron avances en la ejecución de actividades correspondientes a las fases I y II, destacándose la proximidad al 100% de la fase I y progresos significativos en la entrega de informes de laboratorio asociados a la fase II, lo cual representa un avance físico del 6.55% versus un avance programado del 35.44%, resultando así un retraso del 28.88%. En el componente financiero, la ejecución acumulada alcanzó la suma de $ 2.316.230.386, sin que se registraran actas parciales de pagos durante el periodo, se aprobó y se realizó certificación para tramite de pago del primer 25% de la Fase de Caracterización, además, se emitieron las aprobaciones de giros No 2 y 3 del anticipo. La interventoría mantuvo un seguimiento integral a los aspectos técnicos, financieros, de calidad, sociales, ambientales y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos contractuales y la mitigación de riesgos en la ejecución.

Durante el mes de septiembre, la Interventoría emitió el apremio N° 2 y llamado de atención por el incumplimiento en la entrega de informes de caracterización por partes del contratista de obra mediante oficio 766-178 del 3 de septiembre del 2025 , teniendo en cuenta que la fase de caracterización geotécnica culminó el pasado 9 de julio de 2025

de manera contractual con lo establecido en minuta del contrato. Se implementaron mesas técnicas de trabajo en conjunto con la interventoría para resolver las situaciones críticas de la caracterización geotécnica, pactándose nuevos compromisos; los cuales fueron incumplidos por el contratista, conllevando a un nuevo llamado de atención por el incumplimiento de compromiso adquiridos en comité de seguimiento para la entrega de las fórmulas de trabajo para la fase III. Asimismo, la interventoría emitió apremio por incumplimiento de las actividades planteadas en el plan de gestión social del contrato ICCU 138 2025; y llamado de atención por incumplimiento a los requerimientos para la radicación de actas de vecindad.

Por otro lado, se realizaron observaciones nuevamente a la solicitud de la reprogramación de actividades de obra, dejándose claro que la interventoría no admitirá el tiempo total justificado como retrasos de obra productos de eventos climáticos, cierres parciales de vías y desembolso de anticipo, toda vez que estos no configuran fuerza mayor para la ejecución de las actividades contractuales, por tal motivo se solicitó soporte técnico y un análisis jurídico y financiero para validar la redistribución de actividades a corte del 31 de diciembre del 2025.

Dado el porcentaje de retraso del contratista de obra, esta Interventoría radicó ante la entidad, el informe y recomendación del inicio del proceso administrativo por presunto incumplimiento del contrato de obra ICCU-138-2025, teniendo en cuenta que a corte del informe de incumplimiento se presentaba un retraso de 81 y 38 días para los entregables de la Fase 1, de geoposicionamiento y topografía; y fase 2, caracterización geotécnica. De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. 047 de 2022 del ICCU, artículo sexto, literal C, este incumplimiento genera la imposición de una multa diaria equivalente al 0,20% del valor del contrato por cada día de atraso, la cual a la fecha del presente informe asciende a CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS

CON ONCE CENTAVOS M/CTE ($ 5.443.936.225,11 COP), sin perjuicio de que dicha suma continúe acumulándose mientras el contratista no subsane el atraso.

Ahora bien, aunque se realizó la aprobación condicionada de los informes de caracterización geotécnica para los municipios de Choachí y Junín, se espera la entrega de los productos de los municipios restantes, así como la entrega de los informes de topografía para los 11 municipios del Lote 1, toda vez que para el mes pasado se vencieron los plazos contractuales establecidos para estas, lo que exige la formulación inmediata de un plan de contingencia y la redistribución de actividades a corte del 31 de diciembre, a fin de evitar la imposición de sanciones contractuales, jurídicas y administrativas derivadas de incumplimientos reiterados del contrato de obra ICCU-138-2025.

1. Introducción

Con el propósito de fomentar el progreso económico, social y ambiental del Departamento de Cundinamarca, mejorar la interconectividad entre los municipios y facilitar su crecimiento en diversos ámbitos, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca ha considerado pertinente llevar a cabo diversas obras viales para satisfacer las necesidades de la comunidad. Estas acciones buscan garantizar la transitabilidad y el bienestar de los usuarios en el Departamento, al mismo tiempo que se promueve el respeto por el entorno natural y la seguridad de los trabajadores.

Dentro de este marco, el Departamento de Cundinamarca, a través del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), en el LOTE 1, firmó el Contrato No. ICCU-138-2025 con el CONSORCIO SOFAN C-031 para desarrollar el proyecto cuyo objetivo es la **"Intervención de las vías que conforman el Programa de Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse, en las Provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el Departamento de Cundinamarca"**. Este proyecto no solo busca mejorar la infraestructura vial, sino también crear un impacto positivo en las comunidades a través de la creación de empleos, la optimización del acceso a servicios básicos, y el impulso al desarrollo local.

Así mismo, dando aplicación al artículo 32 de la ley 80 de 1993 realizó el Contrato No. ICCU-219-2025 con el CONSORCIO INTERVENCIÓN A.C. cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

La supervisora de los contratos de obra e interventoría para el LOTE 1 es **Laura Daniela Nieto Gutiérrez**, quien conto con el apoyo inicialmente de **Dairon Andrés Solano Duran** desde el 9 de abril hasta **30 de mayo**, luego de **Adriana Martín** en

apoyo del 30 de mayo hasta el **19 de junio** posterior a la fecha quedo a cargo la Arquitecta **Luz Angela Sanabria** quien estuvo en la supervisión de las actividades de este mes hasta el **22 de julio del 2025**, actualmente como supervisor asignado se encuentra el ingeniero **Juan Sebastián Sánchez Estrada** a la fecha de este informe.

El informe mensual correspondiente a septiembre de 2025 dio continuidad a las actividades de la Fase I – Diagnóstico y Caracterización Vial y la Fase II – Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones, y se continuó el desarrollo de actividades de fase III en la provincia del Guavio, específicamente en el municipio de Ubalá con la intervención y construcción de alcantarillas. Se mantuvo la ejecución de los componentes social, ambiental y de SST, en cumplimiento de las normativas aplicables. La interventoría actuó en los ámbitos técnicos, administrativos y contractuales frente al contratista, con el propósito de garantizar la correcta ejecución del proyecto, dado que a esa fecha el contrato se sigue presentando un retraso del -28,88% frente a los tiempos contractuales establecidos.

2. Descripción del proyecto

2.1 Localización

El Proyecto para la intervención de vías se localiza en las Provincias del oriente de Cundinamarca: **Medina, Guavio, Oriente y Soacha**, toda la información en referente a la localización de cada provincia se encuentra dentro del anexo del componente técnico, actas de localización.

2.2 Estado inicial de la vía

Todo el registro fotográfico referente al estado inicial de la vía ya se encuentra referenciado dentro del contenido de los informes mensuales N°1, 2, 3, y 4 correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, y julio concerniente a todos los tramos existentes del proyecto, este registro fotográfico se hace con el fin de contar con evidencia del antes y el después de la intervención del contrato de obra.

3 Información Contrato de Obra

3.1 Información general contrato de obra

Apertura del proceso de contratación	**No.:** ICCU-LP-031 de 2024.
Resolución de adjudicación del contrato	**No.:** 1053 de 2024
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y Fecha	DIS-2025000077 de miércoles, 22 de enero de 2025 y DIS-2025000080 de miércoles, 22 de enero de 2025.
RP (Registro Presupuestal) y Fecha:	RES-2025000367 de lunes, 17 de febrero de 2025 y RES-2025000368 de lunes, 17 de febrero de 2025.
Contrato ICCU No.:	138 DE 2025.
Fecha de suscripción del contrato:	27 de enero de 2025.
Objeto del contrato:	Intervención de las vías que conforman el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse, en las provincias de Medina, Guavio, Oriente y Soacha, en el departamento de Cundinamarca.
Contratista:	CONSORCIO SOFAN C-031, NIT. 901.906.842 – 2 SOFAN INGENIERIA S.A.S identificada con NIT 800.012.888 – 7 constituida mediante Escritura Pública No. 1769 del 31 de julio de 1987 de la Notaria 1a. De Montería. inscrito en la Cámara de Comercio el 11 de agosto de 1987, con el No. 3560 del Libro IX, representada legalmente por ANDRES

	GABRIEL SOFAN SANCHEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.553.192 de Bogotá D.C, todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal de la Cámara de Comercio de Montería, con una participación del noventa por ciento (90%). ANDRES GABRIEL SOFAN SANCHEZ mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 79.553.192 de Bogotá D.C, quien obra en nombre propio con una participación del diez por ciento (10%).
Valor inicial:	$ 35.350.235.228,00
Adiciones:	NINGUNA.
Valor acumulado del contrato:	$35.350.235.228,00
Modificaciones:	Modificatorio 1: la modificación de la cláusula 7 de contrato de Obra N° ICCU-138 de 2025 (Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2025000418 del 10 de julio de 2025)
Aclaraciones:	NINGUNA
Suspensiones:	NINGUNA
Cesiones de participación contractual:	NINGUNA
Plazo:	Once (11) meses y quince (15) días o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra.
Fecha de inicio:	9 de abril de 2025.

Fecha de terminación actual del contrato:	31 de diciembre de 2025.

Fuente: elaboración propia

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

3.2.1 Actividades ejecutadas en el mes componente técnico

✓ **Actividades Fase I Geoposicionamiento, Topografía y Caracterización de materiales, ver tabla 1.**

Durante el período comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre del presente año se continúan desarrollando las actividades por Provincia que se describen a continuación:

A. Provincia del Guavio:

- Junín en el tramo: Sueva – San Francisco – Valle Junín
    - En el mes de julio se dio por finalizado el levantamiento topográfico en el municipio de Junín. En este mes se enviaron dos veces los productos topográficos por parte del Contratista mediante oficios **SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-302 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-326** y dos veces se respondieron **(766-187** y **766-239**) indicando que aún no se habían hecho las subsanaciones correspondientes. Al finalizar el mes aún no se entregan estos productos debidamente subsanados.
    - Se avaló el geoposicionamiento de vértices intermedios enviado por Sofán en el comunicado **ICUU031-199** con el comunicado **766-203** el 12 de septiembre de 2025

- Gama en el tramo: Clemente – Palenque – Rio Sucio
    - El día 12 de septiembre se contesta con comunicado **766-204**, como segunda revisión, a los productos topográficos entregados por Sofán en

comunicado **ICCU031-207** donde se hacen varias observaciones. El 26 de septiembre, mediante el comunicado **766-265** en respuesta al comunicado de Sofán **ICCU031-239** se responde con varias observaciones como la tercera revisión a los productos topográficos y geográficos del tramo. Al finalizar el mes aún no se entregan estos productos debidamente subsanados.

B. Provincia de Oriente:

- Choachí en el tramo: El Rosario – La Caja – Chatasuga – La Llanada – Ferralarada – Barro Negro – Granadillo – Chivate – Resguardo Bajo
    - El 10 de septiembre, Sofán remite el comunicado **ICCU031-209**, mediante el cual da respuesta a las observaciones realizadas por la Interventoría el mes anterior **(comunicado 766-169),** adjuntando los productos topográficos correspondientes. No obstante, las observaciones no fueron atendidas de manera satisfactoria, por lo que el doce (12) de septiembre se emiten nuevas y reiteradas observaciones a través del comunicado **766-205**. Al cierre del mes, el Contratista no ha remitido los productos con las correcciones requeridas.
    - Mediante comunicado **766-193** enviado el nueve (9) de septiembre la Interventoría da por recibida y aprobada la información del geoposicionamiento del tramo.

- Fomeque en el tramo: Fomeque – Cáqueza
    - A la fecha del 30 de septiembre, el levantamiento topográfico del tramo llega a catorce (**14) kilómetros**, aun quedando un faltante de **cinco (5)** kilómetros.
    - El 19 de septiembre se da aprobación parcial el geoposicionamiento de este tramo (vértices iniciales y finales) mediante comunicado **766-232**

aclarando que aún falta **la entrega del geoposicionamiento de los vértices intermedios.**

- Quetame en el tramo: Quetame - Yerbabuena hacia Fomeque
  - El Contratista termina el levantamiento topográfico, pero aún no envía los informes y productos derivados del mismo para dar por concluida la Fase I.
  - Mediante comunicado **766-203** del 12 de septiembre, se da por aprobado el geoposicionamiento de los dos vértices iniciales de este tramo. Aún se espera el informe geoposicionamiento de los vértices finales.
- Chipaque en el tramo: Siecha – Caldera – Potrero Grande
  - Se han hecho tres revisiones de los productos topográficos y geográficos del tramo donde en el comunicado **766-249** se expresa que ya son reiterativos los errores y deficiencias en la entrega de esta información.
  - El 19 de septiembre se envía comunicado **766-232** donde se da por aprobado el geoposicionamiento de este tramo. Al finalizar el mes aún no se entregan estos productos debidamente subsanados.
- Fosca en el tramo: Fosca - Quinchita – Saname
  - El 19 de septiembre se da por recibido y aprobado el geoposicionamiento del tramo de Fosca mediante el comunicado **766-232.**
  - Al terminar el mes aún no se realizó entrega de la topografía del tramo por parte del Contratista.

C. Provincia de Medina

- Paratebueno en el Tramo Buenavista Alto – Redondo – Engaño
  - A la finalización de este mes no se recibe el informe de la topografía de Fase I

- Al finalizar el mes el contratista de obra Sofán no envió el informe de geoposicionamiento.

- Medina en el tramo: Humea- San Cristóbal -Gazatavena -San Luis del Retiro
  - A la finalización de este mes no se recibe el informe de la topografía de Fase I
  - Se termina la labor GNSS en campo, pero al terminar el mes no envío el contratista de obra Sofán el informe de geoposicionamiento.

D. Provincia de Soacha:

- Sibaté en el tramo: Vereda San Rafael – Vereda Alto Charco – Sector Alto de la Virgen – Vereda la Unión
  - Se ha hecho entrega por parte del Contratista de informes de topografía los cuales han sido revisados y observados (766-211 del 15 de septiembre) las cuales al terminar el mes no ha subsanado. Esto incluye también el geoposicionamiento (indicado también en el mismo comunicado).

3.2.2 Actividades Fase II Caracterización de Materiales y Propuesta de Intervenciones, ver tabla 1.

A. Provincia del Guavio

Se realizó la aprobación condicionada del informe de laboratorio del **municipio de Junín mediante oficio 766-241 del 23 de septiembre**. Los informes de los municipios de Gama y Ubalá se encuentran en proceso de observación y revisión por parte de interventoría los cuales fueron radicados mediante oficios **SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-242 y SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-227.**

B. Provincia de Medina

Durante el mes de septiembre, el contratista realizo ensayos de laboratorio a las muestras tomadas en los apiques realizados en el tramo comprendido entre Humea – San Cristóbal – Gazatavena – San Luis del Retiro del municipio de Medina; y culminó

la ejecución de los 32 apiques programados con sus respectivos ensayos en la subrasante en el tramo comprendido entre Buena Vista Altorredondo – Engaño del municipio de Paratebueno e inició los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas en dichos apiques. Ver en pág. 61 registro fotográfico de obras.

C. Provincia de Oriente

Durante el mes de septiembre, el contratista culminó la ejecución de los 65 apiques programados con sus respectivos ensayos en la subrasante en el tramo comprendido entre Fómeque - Cáqueza del municipio de Fómeque e inició los ensayos de laboratorio de las muestras tomadas en dichos apiques. Se realizó la aprobación condicionada del informe del municipio de Choachí mediante **oficio 766-241 del 23 de septiembre.**

D. Provincia de Soacha

Para el tramo comprendido entre la Vereda San Rafael – Vereda Alto Charco – Sector Alto de La Virgen – Vereda La Unión del municipio de Sibaté el contratista continúa realizado el debido proceso de las muestras en laboratorio a fin de definir la fórmula de trabajo para este corredor vial. Se anexan los oficios correspondientes a los laboratorios entregados por el contratista a la fecha. Ver anexo 1.9 Resultados de laboratorios.

A continuación, se presenta la **tabla resumen acumulada de los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre**, la cual será actualizada progresivamente conforme el contratista avance en la ejecución de las actividades. Para su consolidación, se tendrá en cuenta el registro de control que se gestiona semanalmente con el **ICCU**, mediante una tabla en formato Excel alojada en una carpeta del **ONE DRIVE**, garantizando así la trazabilidad y disponibilidad de la información.

Tabla 1. Cuadro resumen de actividades a la fase I y II Acumulado mensual

Provincia	Municipio	Fase I					Fase Ii	
		GPS	%	Topografía	%	Km	Apiques	%
Guavio	Gama (4)	4	100%	5,12	80%	5,12	20	100%
Guavio	Junín (6)	6	100%	15,7	100%	15,7	68	100%
Guavio	Ubalá (6)	6	100%	19,4	100%	19,4	68	100%
Medina	Medina	0	0%	20,3	100%	20,3	72	100%
Medina	Paratebueno	4	100%	9,1	100%	9,1	32	100%
Oriente	Choachí (6)	6	100%	21,5	100%	21,5	72	100%
Oriente	Fosca (4)	4	100%	8,25	100%	8,25	29	100%
Oriente	Chipaque (4)	4	100%	5,34	100%	5,34	19	100%
Oriente	Fomeque (6)	4	60%	14	73,7%	19	65	100%
Oriente	Quetame (4)	2	60%	5	100%	5	11	60%
Soacha	Sibaté (4)	4	100%	7,41	100%	7,41	26	100%

Fuente: Elaboración propia

3.2.3 Actividades Fase III Construcción

A. Provincia del Guavio

Para el tramo **Casa Rosada – Laguna Azul**, ubicado en el **municipio de Ubalá**, se ejecutaron actividades correspondientes a la distribución de tubería de 36", suministrada por el contratista. Dicho material fue dispuesto estratégicamente en varios puntos de intervención definidos durante una visita técnica conjunta entre el Contratista, la Interventoría y la Supervisión, en la cual se determinó la construcción de obras de drenaje tipo alcantarilla, con el objetivo de garantizar el adecuado manejo y control de las aguas lluvias sobre la vía.

Para el desarrollo de estas labores se contó con el apoyo de maquinaria pesada tipo retroexcavadora, utilizada para las actividades de excavación e instalación de la tubería, así como volquetas para el transporte y suministro de materiales. El

contratista empleó mano de obra calificada y herramientas menores para la correcta ejecución de las actividades.

- ✓ **Construcción de alcantarilla #1 PR 5+900**

En el mes de septiembre contratista finalizo con la construcción de la alcantarilla ubicada en el PR 5+900 dentro del tramo de la provincia de Ubalá, el contratista realizo el relleno con material seleccionado.

- ✓ **Construcción de alcantarilla #2 PR 0+407**

El Contratista culminó la construcción de una segunda alcantarilla en el municipio de Ubalá, específicamente en el tramo comprendido entre Casa Rosada y Laguna Azul, a la altura del PR 0+407. Por parte de la Interventoría, se realizó la verificación del cumplimiento de las normas técnicas aplicables y la revisión de la estructura finalizada.

Durante la revisión se identificaron inconsistencias en la sección de descole de la estructura, razón por la cual la Interventoría solicitó, mediante el oficio No. 766-180 (segundo llamado de atención por calidad de las obras hidráulicas), la corrección de las deficiencias detectadas. En respuesta, el Contratista informó, mediante oficio de contestación, que procederá a la demolición y reconstrucción de la sección de descole, debido a diversas circunstancias de carácter técnico y operativo que incidieron en la ejecución inicial de la obra.

Tabla 2. Registro fotográfico Alcantarilla N° 2

	
Demolicion de muro	

Fuente: Elaboración propia

- ✓ **Construcción de alcantarilla #3 PR 6+616**

Igualmente, se avanzó en la ejecución de la alcantarilla ubicada en el PR 6+616, del tramo correspondiente al municipio de Ubalá. Se continuo con la construcción de esta alcantarilla, contratista realizo actividades de amarre de acero y fundida de concreto de 3000 PSI para construcción de poceta y muro pantalla. La interventoría realizo la verificación de los rellenos, manejo de aguas y encole de las mismas a fin de que la alcantarilla quedara funcional.

Tabla 3. Registro fotográfico Alcantarilla N° 3

	
Solado	Fundida de poceta

	
Muro pantalla de descole	Canal de desgue excavacion manual

Fuente: Elaboración propia

- ✓ **Construcción de alcantarilla #4 PR 7+780**

Durante el mes de septiembre, el Contratista continuó con las actividades de construcción de la alcantarilla, habiendo ejecutado la excavación para la instalación de la tubería. En el presente mes se llevaron a cabo las labores de amarre de acero, así como la construcción de la poceta y del muro pantalla de descole.

De manera paralela, la Interventoría realizó la revisión de las obras, identificando la ausencia de la ejecución de un canal de descole con una longitud aproximada de 13 m. En consecuencia, mediante el oficio No. 766-233, "Observaciones actividades alcantarilla No 4, PR 7+780, Municipio de Ubalá, tramo Casa Rosada – Laguna Azul", la Interventoría solicitó se aclarara a quién corresponde la finalización de dicha intervención.

Al respecto, se recibió comunicación por parte del Contratista mediante el oficio No. FOR-CO-03-265, en la cual se indica que las actividades de excavación del canal de descole son responsabilidad de la Alcaldía Municipal de Ubalá.

Tabla 4. Registro fotográfico Alcantarilla N° 4

	
Excavación poceta	Fundida de zarpa de muro pantalla
	
Amarre acero poceta	Encofrado
	
Muro pantalla terminado	

Fuente: Elaboración propia

Para el mes de septiembre no solo se dio terminación a algunas de las alcantarillas que se venían trabajando, sino que también se abrieron dos frentes de obra adicionales de obras de drenaje necesarias que se tienen dentro del inventario de obras a ejecutar.

- ✓ **Construcción de alcantarilla #5 PR 13+520**

Se ejecutaron las actividades correspondientes a la construcción de la alcantarilla, las cuales incluyeron la excavación y nivelación del terreno, el solado de la base y la instalación de la tubería de 36” de diámetro. Asimismo, se realizó el amarre del acero de refuerzo tanto longitudinal como transversal del muro pantalla ubicado en el encole, así como de la poceta correspondiente al descole. Adicionalmente, el contratista llevó a cabo la excavación de la zanja para el descole de las aguas, con el fin de garantizar una adecuada conducción del flujo.

Tabla 5. registro fotográfico alcantarilla #5

	
Nivelación y cotas alcantarilla	Excavaciones

	
Instalación de tubería de 36”	Amarre de acero
	
Poceta construida	Muro pantalla

✓ **Construcción de alcantarilla #6 PR 14+000**

Se ejecutó la construcción de la alcantarilla N°6 por parte del contratista, en el tramo comprendido entre Casa Rosada y Laguna Azul. Para esta estructura de drenaje se desarrollaron actividades de instalación de tubería, conformación de solados y construcción de atraques, conforme a las especificaciones del diseño. Actualmente, el contratista se encuentra en proceso de figuración y armado del acero de refuerzo correspondiente a las aletas y al muro pantalla, previéndose la finalización de la obra a inicios del mes de octubre.

Tabla 6. registro fotográfico alcantarilla N°6

	
	
Toma de muestras	Fundida de zarpa encole

3.2.4 Actividades ejecutadas en el mes componente ambiental

A. Gestión documental PAGA

Se realiza la actualización del PAGA de acuerdo con la solicitud de la supervisión del contrato, con la presentación del PAGA para la provincia de Guavio se subsana la necesidad de presentar un documento con las características particulares presentadas en cada zona de intervención, además se realiza el reajuste del nivel de complejidad y línea base del proyecto por las condiciones ambientales presentadas en los territorios.

B. Capacitaciones e Inducciones

Se desarrollaron las inducciones, capacitación, entrenamiento de los colaboradores en los temas referentes a los componentes ambiental, flora y fauna y de las medidas de manejo establecidas para prevenir, minimizar y/o corregir los impactos ambientales del proyecto durante su etapa constructiva.

Se realizaron 4 capacitaciones en temas ambiental donde se capacitó al 100% del personal en obra para el tramo de Ubalá.

C. Recorridos de obra

Se realizaron recorridos de obra a fin de inspeccionar las actividades diarias, señalización en los puntos de intervención de obras de drenaje, estado de campamentos y unidades sanitarias. Se verificó el cumplimiento de la señalización del PMT la cual comprende la tipología de diseño adoptando un esquema de control típico en vías rurales, donde se establecen zonas de espera seguras, reducción de velocidad, pasos alternos y advertencias claras para los conductores, estas acciones permitieron la ejecución continua de las actividades de obra sin afectar de manera significativa la movilidad local, y minimizaron los riesgos asociados a la presencia de maquinaria en la vía.

La inspección del campamento se ejecutó una vez en el periodo con la revisión de estado la estructura, organización y limpieza de las áreas de trabajo y baterías sanitarias, segregación de materiales, manejo de residuos y suministro de agua para hidratación del personal.

D. Recorridos de inspección previa de alcantarillas

Se ejecutan las actividades de reconocimiento de puntos de intervención de obras de drenaje o alcantarillas de acuerdo con las indicaciones aportadas por el área técnica, en estos recorridos se evalúan las condiciones iniciales de tuberías, taludes

y pasos existentes de descarga de escorrentías a los costados de la vía y se confirma la justificación técnica de permisos de ocupación de cauce.

3.2.5 Actividades ejecutadas en el mes componente social

Desde el Consorcio Intervención AC, se realizó el seguimiento y control de las actividades realizadas por el Contratista en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de septiembre, en el marco del Plan de Gestión Social, teniendo en cuenta que, estas dependen del avance del área técnica en las provincias del Guavio, Oriente, Medina y Soacha.

A. Programa de Atención a la Comunidad:

A continuación, se relacionan las actividades de control y seguimiento realizadas durante el periodo reportado en el presente informe (de 1 al 30 de septiembre) relacionadas con el programa de atención a la comunidad:

a. Atención de PQRSD:

En el periodo reportado en el presente informe (1 al 30 de septiembre), no se radicaron PQRSD a través de los canales de atención del Punto SAU.

No obstante, se realizaron las siguientes atenciones sin apertura de PQRSD. Ver Informe Social N° 6.

b. Punto SAU

Durante el periodo reportado en el presente informe (1 al 30 de septiembre), se realizaron las siguientes gestiones de seguimiento, control y revisión relacionadas con el Punto del Sistema de Atención al Usuario (SAU) de las provincias del Guavio y Oriente:

Ver Informe Social N° 6.

c. Buzones Satelitales:

Los buzones satelitales constituyen una estrategia para ampliar la cobertura de la atención a la comunidad, ya que se instalan en puntos estratégicos de los tramos de intervención, estos se componen de una cartelera con los datos del contrato y las piezas de divulgación vigentes, además de una caja donde las personas pueden radicar sus PQRSD.

El 5 de septiembre, la mesa de trabajo No. 22, la Interventoría reiteró la importancia de reportar las revisión y novedades de los buzones satelitales en los informes semanales.

Ver detalle de provincia en el Informe social N° 6.

d. Recorridos de Obra

Durante el periodo reportado en el presente informe (1 al 30 de septiembre), se realizaron recorridos desde el área social, en la provincia del Guavio:

El 5 de septiembre, durante la mesa de trabajo No. 22, la Interventoría indicó que, se deben reportar en el informe semanal los recorridos que se hacen por parte del componente social y los recorridos con la comunidad.

Ver detalles de los municipios en el Informe social N° 6.

B. Programa de información y divulgación

A continuación, se describen las actividades realizadas durante el periodo reportado en el presente informe (1 al 30 de septiembre) relacionadas con el Programa de Información y Divulgación por provincias:

a. Acciones de información:

En este apartado se describen las gestiones y acciones relacionadas con las reuniones participativas en las provincias del Guavio, Oriente, Medina y Soacha:

b. Reuniones preliminares:

Estas reuniones fueron requeridas por la Entidad con el fin de socializar a la comunidad, el objetivo de las fases I y II en cada uno de los municipios y presentar al equipo de trabajo, encargado por parte del ICCU, Interventoría y Contratista del proyecto "Caminos vecinales, caminos para quedarse" – Lote 1.

Tabla 7. Reuniones preliminares realizadas en el mes de septiembre:

No. Reunión	Provincia	Municipio (s)	Fecha de realización	Estado de los soportes
1	Oriente	Choachí	04-09-25	Ver Informe Social N° 6

Fuente: Consorcio Intervención AC

c. Reuniones de inicio:

Las reuniones de inicio se realizan con el fin de informar a la comunidad, lideres comunitarios, entes y entidades territoriales acerca de la fase III del proyecto, es decir, del proceso de mejoramiento de la rasante de las vías terciaras, por lo tanto, se describen las trazabilidades, a continuación:

Tabla 8. Reuniones realizadas durante el mes

No. Reunión	Provincia	Municipio (s)	Fecha de realización	Estado de los soportes
1	Oriente	Choachí	29-09-25	Ver informe social N° 6

Fuente: Consorcio Intervención AC

d. Acciones de divulgación:

- **Elaboración y distribución de piezas de divulgación**

En este ítem se relacionan los volantes y folletos diseñados y difundidos para informar a la comunidad:

Tabla 9. Estado de los volantes

Estado de los volantes– agosto 2025				
No.	**Provincia**	**Municipio (s)**	**Objetivo**	**Medios de difusión**
Folleto 2	Guavio	Ubalá	Cierre vial por actividades hidráulicas	Sin difundir
Folleto 4	Guavio	Junín	Notificación de inicio de actividades técnicas para el municipio de Junín.	Física
Volante 11	Guavio	Junín	Contratación de Mano de Obra No Calificada – municipio de Junín	Sin aval de la entidad
Volante 12	Guavio	Junín	Levantamiento de actas de vecindad – municipio de Junín	Sin aval de la entidad
Folleto 3	Oriente	Choachí	Notificación de inicio de actividades hidráulicas - municipio de Choachí	Sin difundir
Volante 4	Oriente	Choachí	Invitación a la reunión preliminar No. 5 – Municipio de Choachí	Sin difundir
Volante 9	Oriente	Choachí	Levantamiento de actas de vecindad – municipio de Choachí	Físico
Volante 10	Oriente	Choachí	Contratación de Mano de Obra No Calificada– municipio de Choachí:	físico

Fuente: Consorcio Intervención AC

- **Elaboración de cartas personalizadas**

Durante el periodo reportado en el presente informe se realizó la elaboración y distribución de cartas personalizadas, por lo tanto, se realizaron las gestiones en la provincia de Oriente, las cuales se describen a continuación:

Tabla 10. Estado de las cartas personalizadas

Asunto	**Provincia**	**Municipio (s)**	**Destinatario**	**Medio de radicación**	**Fecha**
Inicio de actividades hidráulicas en el municipio de Junín	Guavio	Junín	Alcaldía de Junín	Correo electrónico	En revisión
Solicitud de apoyo para predios problemáticos	Guavio	Ubalá	Alcaldía de Ubalá	Correo electrónico	Sin radicar
Invitación a la alcaldía municipal a la reunión preliminar No. 5	Oriente	Choachí	Alcaldía de Choachí	Correo electrónico	04-09-25

Asunto	Provincia	Municipio (s)	Destinatario	Medio de radicación	Fecha
Inicio de actividades hidráulicas en el municipio de Choachí	Oriente	Choachí	Alcaldía de Choachí	Correo electrónico	Sin radicar
Invitación a alcaldía municipal a la reunión de inicio No. 1 en el municipio de Choachí	Oriente	Choachí	Alcaldía de Choachí	Física	29-09-25
Invitación a ASOJUNTAS a la reunión de inicio No. 1 en el municipio de Choachí	Oriente	Choachí	ASOJUNTAS	Física	Sin radicar
Invitación a la Secretaría de Planeación a la reunión de inicio No. 1 en el municipio de Choachí	Oriente	Choachí	Secretaria de Planeación	Correo electrónico	29-09-25
Notificación a la alcaldía municipal del inicio de actividades de obra	Oriente	Choachí	Alcaldía de Choachí	Correo electrónico	Sin radicar

Fuente: Consorcio Intervención AC

e. Vallas informativas:

A continuación, se describen las gestiones adelantadas durante el mes de septiembre, para la solicitud de los diseños de las vallas ante la Entidad:

Tabla 11. Estado de la solicitud del diseño de las vallas a la Entidad

Fecha	Gestión	Medio	Remitente	Destinatario
08-09	traslado del instructivo ICCU para la solicitud del diseño de las vallas	Correo electrónico	Interventoría	Contratista
11/09	solicitud del diseño de las vallas al ICCU de los municipios Ubalá, Junín, Gama y Choachí	Correo electrónico	Contratista	ICCU
15/09	subsanación de las observaciones realizadas a la solicitud de las vallas radicada a la Entidad	Correo electrónico	Contratista	ICCU
22-09	Visto Bueno de la Información Contractual del PDF adjunto para la solicitud del diseño de vallas al ICCU	Correo electrónico	Interventoría	Contratista

Fuente: Consorcio Intervención AC

C. Programa de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos

En este ítem se describen las actividades realizadas desde el componente social relacionadas con la ejecución técnica del proyecto.

a. Actas de vecindad de inicio:

Tabla 12. Estado del levantamiento de actas de vecindad

Condición	Previstas	Realizadas	Faltantes
Levantamientos de actas de vecindad-Junín		23	
Levantamientos de actas de vecindad-Choachí		20	
Total		**53**	

Fuente: Consorcio Intervención AC

De acuerdo con lo anterior, el Contratista lleva levantado el 60 % de las actas de vecindad de inicio contempladas para el municipio de Ubalá, no obstante, estas no fueron enviadas a revisión de la interventoría durante el mes de agosto, por ende, no se dio cumplimiento a los requerimientos sociales previos al inicio de actividades técnicas.

D. Programa de cultura vial y participación ciudadana.

Dentro del periodo reportado en el presente informe (1 al 30 de septiembre) no se adelantaron actividades del programa de cultura vial y participación ciudadana ya que se contemplan para la fase III del proyecto, no obstante, se presentaron las siguientes gestiones:

Ver Informe social N° 6

E. Programa de contratación de mano de obra.

a. Mano de obra no calificada local:

De acuerdo con lo reportado por el Contratista se relacionan los datos de mano de obra no calificada en la provincia del Guavio, en el municipio de Ubalá:

Tabla 13. Mano de obra no calificada – Provincia del Guavio

Mano de obra no calificada Provincia del Guavio	
Total, MONC	15
MONCL	8
Porcentaje de cumplimiento	**53%**

Fuente: Consorcio Intervención AC

Por lo anterior, se dio cumplimiento a lo requerido contractualmente, con un 53 %.

b. Paridad laboral:

De acuerdo con lo reportado por el Contratista se relacionan los datos de la vinculación de mujeres al proyecto

Tabla 14. Paridad laboral

Paridad laboral Provincia del Guavio	
Personal total	47
Mujeres	4
Porcentaje de cumplimiento	**9 %**

Fuente: Consorcio Intervención AC

Por lo anterior, se dio cumplimiento a lo requerido contractualmente, con un 9 %.

F. Reportes, seguimiento y coordinación del componente social

Durante el mes de septiembre se realizaron las siguientes gestiones de seguimiento:

a. Informes semanales del Contratista

A continuación, se relacionan los informes semanales reportados por el contratista durante el mes:

Tabla 15. Informes semanales de contratista

No.	Fecha de envío	Periodo reportado
11	05-09-25	30-08 al 05-09 del 2025
12	13-09-25	6 al 12 de septiembre
13	19-09-25	del 13 al 19 septiembre
14	26-09-25	20 al 26 septiembre

Fuente: Consorcio intervención AC

b. Informes semanales de la Interventoría– agosto 2025:

A continuación, se relacionan los informes semanales alimentados y radicados por la interventoría durante el mes:

Tabla 16. Informes semanales de interventoría

No.	Periodo reportado	Oficio	Fecha
21	30 de agosto al 5 de septiembre	766-227-ICCU	18 de septiembre
22	6 al 12 de septiembre	766-277-ICCU	30 de septiembre
23	13 al 19 de septiembre	766-277-ICCU	30 de septiembre
24	10 a 26 de septiembre	Pendiente	Pendiente

Fuente: Consorcio intervención AC

c. Mesas de trabajo – Componente social:

Las mesas de trabajo se realizan de manera semanal para llevar realizar control y seguimiento del componente social:

Tabla 17. Mesas de trabajo

No.	Fecha	Participantes	Estado de las actas
22	5-09-25	Profesionales sociales – Interventoría y Contratista	Firmada
23	12-09-25	Profesionales sociales – Interventoría y Contratista	Firmada
24	19-09-25	Profesionales sociales – Interventoría y Contratista	
25	26-09-25	Profesionales sociales – Interventoría y Contratista	

Fuente: Consorcio intervención AC

d. Comités de seguimiento semanal:

El componente social asistió a los siguientes comités de seguimiento semanal durante el mes:

Tabla 18. Comités de seguimiento semanal

No.	Fecha
16	3 de septiembre
17	10 de septiembre
18	17 de septiembre
19	24 de septiembre

Fuente: Consorcio Intervención AC

e. Trazabilidad de informes mensuales:

A continuación, se describen las trazabilidades de los informes mensuales del Contratista:

Tabla 19. Trazabilidad de informes mensuales:

No.	Periodo reportado	Estado
4	1 al 31 de julio	Sin aprobar
5	1 al 30 de agosto	Sin aprobar

Fuente: Consorcio Intervención AC

3.2.6 Actividades ejecutadas en el mes componente SST

Durante el mes de septiembre se evidenció avance en las actividades programadas, sin embargo, persisten retrasos en la entrega de productos como actas de vecindad, piezas de comunicación y radicación de correspondencia oficial ante alcaldías.

Los informes semanales y mensuales del Contratista presentaron demoras en su radicación y observaciones recurrentes sobre registro fotográfico, fechas y soporte de campo, lo que ha retrasado su aprobación por parte de la Interventoría.

Se presentaron incumplimientos en los horarios del Punto SAU afectando la cobertura del servicio de atención y recepción de PQRSD.

Se identificaron dificultades en la coordinación entre el componente social y las áreas técnica y ambienta del Contratista l, lo que ha generado reprocesos en la elaboración de materiales de divulgación y gestión de residuos.

4 Reportes ejecución mensual contrato de obra

4.1 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

Se cuenta con el reporte que se entregó en el informe del mes de julio donde se soportaba la siguiente maquinaria:

a. 1 camioneta
b. 1 turbo
c. 1 retroexcavadora
d. 1 volqueta
e. 4 estaciones de topografía
f. 4 niveles
g. Otros elementos de laboratorio

4.2 Personal, Control Aporte Legales y Seguridad Social Contrato de Obra

A. Relación de personal del contratista

A continuación, se presenta la información correspondiente a las contrataciones directas y de subcontratistas realizadas por parte del CONSORCIO SOFAN C-031. La base de datos de personal se encuentra en el Anexo 1. Listado del personal vinculado del Componente SST.

Tabla 20. Personal contratista

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Wilson Gerardo Loaiza Galindo	Director de Obra	01/04/2025
Marcela Pinto Blanco	Residente SST	01/04/2025
Elizabeth Giovanna Daza Socarrás	Residente Ambiental	22/04/2025
Manuel Alexander Rojas Hernández	Residente Social	27/07/2025
Yesica Raigoso Díaz	Residente Técnico	01/04/2025
Carlos Daniel Tinoco Sopo	Residente Técnico	27/07/2025
Henry Augusto García Martínez	Director de Obra	15/09/2025
Kimberly Mendoza Morena	Residente social	15/09/2025
Edixon Eduardo Beltrán Calderón	Cadenero Primero	15/04/2025
Luis Jaime Cruz Molano	Conductor	01/04/2025
José Manuel Pérez	Almacenista	6/05/2025
Fanny Acosta Bejarano	Insp. SST – MA	12/05/2025
Juan José Orjuela Pava	Inspector Técnico	27/07/2025
Jorge Sánchez	Esp. de Pavimentos	01/04/2025
Armando Ruiz	Espe. de Geotecnia	01/04/2025
Yensy Nicolas Medina	Cadenero 1	27/07/2025
Miller Giovanni Barriga Ramos	Conductor	02/07/2025
Oscar Mauricio Gómez	Conductor	02/07/2025
Yoseth Alfonso Salcedo Sierra	Operador Retroexcavadora	02/07/2025
Oscar Mauricio Gómez	Conductor	11/09/2025
Julián Alonso Vargas Cruz	Aux Social	25/08/2025
Leidy Yohana Ruiz	Inspectora SST-MA	29/09/2025
John Faber Romero	Inspector de Obra	29/09/2025

Oscar Andrés García Quevedo	Operador de Motoniveladora	29/09/2025

Fuente: informe gerencial del contratista de obra

Tabla 21. Personal del Subcontratista – Jefferson Enrique Amézquita Picón

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Carlos Mauricio Cifuentes Riaño	Topógrafo	09/04/2025
Fabian Camilo Rodríguez Escamilla	Cadenero Primero	15/05/2025
Cristhian Giovanni Díaz Cárdenas	Cadenero Segundo	22/05/2025
Cristian Iván García Medina	Dib. Cadenero 1ero	28/05/2025
Carlos Rafael Meza Alba	Cadenero Primero	27/07/2025
Nelson Echeverry Córdoba	Cadenero Primero	28/06/2025
Miguel Antonio Retavisca	Cadenero Segundo	28/06/2025
Jefferson Enrique Amézquita	topógrafo	30/07/2025

Fuente: informe gerencial del contratista de obra

Tabla 22. Personal del Subcontratista – Tecnisuelos Pavimentos y Concretos SAS

Nombre completo	Cargo	Fecha de ingreso
Camilo Andrés Pintor Torres	Laboratorista	01/04/2025
Wilson Efraín Pintor Bolívar	Laboratorista Inspector	01/04/2025
Luis Felipe Bermúdez Avendaño	Laboratorista	01/04/2025

Fuente: informe gerencial del contratista de obra

Tabla 23. Personal del Subcontratista – Urbanuz Construcciones

Nombre completo	**Cargo**	**Fecha de ingreso**
Ángelo Wilmer Hernández Herrera	Ayudante	13/05/2025
Héctor Pablo Morales Vega	Ayudante	19/05/2025
Wilson Manuel Castellanos Hernández	Ayudante	19/05/2025
Nacianseno Sánchez Zamora	Ayudante	6/02/2025
Rafael Moreno Yépez	Ayudante	17/08/2025
Yeison Ronald Garzón Muse	Ayudante	18/01/2025

Ambrosio Morera Beltrán	Ayudante	11/07/2025
Ramiro Morera Babativa	Ayudante	10/07/2025
José Israel Timón García	Ayudante	10/07/2025
Yeison Hernando González Herrera	Ayudante	10/07/2025
Cristian Yesid León Rodríguez	Ayudante	21/08/2025
Nelson Reinaldo Parra Muete	Ayudante	21/08/2025
Roberto Carlos Novoa Arrieta	Ayudante	26/08/2025
John Jairo Morera Diaz	Ayudante	03/09/2025

Fuente: informe gerencial del contratista de obra

Tabla 24. Personal Retirado

Nombre completo	Cargo	Fecha de Retiro	Empresa
Douglas José Nieves Ramírez	Apique y Auxiliar	3/09/2025	Auscultar
Fernando Rodríguez Murcia	Coordinador de laboratorio	3/09/2025	Auscultar
Jaider Iván Carrillo Gómez	Apique y Auxiliar	3/09/2025	Auscultar
Iván Enrique Mayorga	Conductor	5/09/2025	Consorcio Sofán
Fernando Palacios	Conductor	25/09/2025	Consorcio Sofán
Cristhian Giovanni Diaz	Cadenero segundo	1/09/2025	Jefferson Amézquita

Fuente: informe gerencial del contratista de obra

De acuerdo con las actividades de este periodo el contratista entrega la seguridad social que se encuentra en el anexo 2, Anexos Consorcio Sofán vinculado, Componente SST, del siguiente personal:

B. Consorcio Sofán
C. Sofán Ingeniería
D. Tecnisuelos y Pavimentos
E. Auscultar
F. Jefferson Amézquita
G. Especialistas

H. Urbanuz Construcciones

4.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

De acuerdo con la propuesta económica presentada por el Contratista de Obra, CONSORCIO SOFAN C-031, para el Lote 1, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU lo contrató por un valor total de **treinta y cinco mil trescientos cincuenta millones doscientos treinta y cinco mil doscientos veintiocho pesos ($35.350.235.228).**

Para el informe mensual el contratista reporta el valor ejecutado mensual de **Cuatrocientos diecisiete millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos con ochenta y seis centavos ($ 417.645.865,86)** lo cual corresponde a las actividades de las fases I, II, Y III del proyecto durante el período comprendido entre el 1 y el 26 de septiembre de 2025. Por lo tanto, se tiene un acumulado ejecutado de **Dos mil trescientos dieciséis millones doscientos treinta mil trescientos ochenta y seis pesos m/cte. ($ 2.316.230.386)** hasta la fecha.

Tabla 25. tabla de control presupuesto ejecutado semanal del contratista

				ACUMULADO			SEMANAL	
PERIODO SEMANAL			SEM	PROGRAMADO	**EJECUTADO**	SEM	PROGRAMADO	**EJECUTADO**
9/04/2025		16/04/2025	1	$ 16.874.004,30	43.661.486	1	$ 16.874.004,30	$ 43.661.486,11
17/04/2025		25/04/2025	2	$ 87.985.879,53	105.272.694	2	$ 71.111.875,23	$ 61.611.208,17
26/04/2025		2/05/2025	3	$ 143.730.357,99	168.347.005	3	$ 55.744.478,47	$ 63.074.310,63
3/05/2025		9/05/2025	4	$ 301.068.395,48	464.751.553	4	$ 157.338.037,49	$ 296.404.548,09
10/05/2025		16/05/2025	5	$ 500.563.322,73	723.598.565	5	$ 199.494.927,25	$ 258.847.011,65
17/05/2025		23/05/2025	6	$ 667.308.738,15	849.589.441	6	$ 166.745.415,42	$ 125.990.876,85
24/05/2025		30/05/2025	7	$ 848.025.635,07	982.333.842	7	$ 180.716.896,91	$ 132.744.400,84
31/05/2025		6/06/2025	8	$ 1.129.364.283,49	1.023.812.412	8	$ 281.338.648,42	$ 41.478.569,23

7/06/2025		13/06/2025	9	$ 1.389.852.057,64	1.122.374.492	9	$ 260.487.774,16	$ 98.562.080,84
14/06/2025		20/06/2025	10	$ 1.722.388.681,03	1.179.328.252	10	$ 332.536.623,38	$ 56.953.759,79
21/06/2025		27/06/2025	11	$ 2.095.932.799,00	1.247.165.568	11	$ 373.544.117,98	$ 67.837.316,00
28/06/2025		4/07/2025	12	$ 2.467.330.502,55	1.317.751.941	12	$ 371.397.703,56	$ 70.586.372,53
5/07/2025		11/07/2025	13	$ 2.811.929.246,76	1.365.294.655	13	$ 344.598.744,22	$ 47.542.714,44
12/07/2025		18/07/2025	14	$ 3.571.316.928,80	1.445.012.082	14	$ 759.387.682,03	$ 79.717.426,83
19/07/2025		25/07/2025	15	$ 4.394.189.227,03	1.493.647.729	15	$ 822.872.298,22	$ 48.635.647,25
26/07/2025		1/08/2025	16	$ 5.300.337.070,15	1.527.308.860	16	$ 906.147.843,12	$ 33.661.131,13
2/08/2025		8/08/2025	17	$ 6.273.290.678,49	1.591.555.240	17	$ 972.953.608,32	$ 64.246.379,65
9/08/2025		15/08/2025	18	$ 7.073.437.906,11	1.675.432.086	18	$ 800.147.227,63	$ 83.876.846,14
16/08/2025		22/08/2025	19	$ 8.147.076.099,96	1.712.183.527	19	$ 1.073.638.193,85	$ 36.751.440,51
23/08/2025		29/08/2025	20	$ 9.129.272.291,75	1.898.584.520	20	$ 982.196.191,80	$ 186.400.993,55
30/08/2025		5/09/2025	21	$ 9.902.542.855,52	2.115.735.901	21	$ 773.270.563,77	$ 217.151.381,08
6/09/2025		12/09/2025	22	$ 10.800.476.419,58	2.183.746.658	22	$ 897.933.564,08	$ 68.010.756,69
13/09/2025		19/09/2025	23	$ 11.588.877.550,92	2.297.261.579	23	$ 788.401.131,34	$ 113.514.921,41
20/09/2025		26/09/2025	24	$ 12.526.752.861,81	2.316.230.386	24	$ 937.875.310,87	$ 18.968.806,68
27/09/2025		3/10/2025	25	$ 13.844.651.849,24	2.316.230.386	25	$ 1.317.898.987,44	$ -
4/10/2025		10/10/2025	26	$ 15.248.387.966,66	2.316.230.386	26	$ 1.403.736.117,44	$ -
11/10/2025		17/10/2025	27	$ 16.169.035.699,34	2.316.230.386	27	$ 920.647.732,67	$ -
18/10/2025		24/10/2025	28	$ 17.266.847.280,66	2.316.230.386	28	$ 1.097.811.581,30	$ -
25/10/2025		31/10/2025	29	$ 18.418.177.458,52	2.316.230.386	29	$ 1.151.330.177,87	$ -
1/11/2025		7/11/2025	30	$ 19.555.104.458,09	2.316.230.386	30	$ 1.136.926.999,56	$ -
8/11/2025		14/11/2025	31	$ 20.617.737.041,01	2.316.230.386	31	$ 1.062.632.582,93	$ -
15/11/2025		21/11/2025	32	$ 22.006.618.046,10	2.316.230.386	32	$ 1.388.881.005,11	$ -
22/11/2025		28/11/2025	33	$ 23.303.766.148,42	2.316.230.386	33	$ 1.297.148.102,33	$ -
29/11/2025		5/12/2025	34	$ 24.620.692.394,30	2.316.230.386	34	$ 1.316.926.245,89	$ -

6/12/2025		12/12/2025	35	$ 26.319.197.677,59	2.316.230.386	35	$ 1.698.505.283,31	$ -
13/12/2025		19/12/2025	36	$ 28.185.478.138,38	2.316.230.386	36	$ 1.866.280.460,80	$ -
20/12/2025		26/12/2025	37	$ 31.841.129.227,80	2.316.230.386	37	$ 3.655.651.089,46	$ -
27/12/2025		29/12/2025	38	$ 35.350.235.226,42	2.316.230.386	38	$ 3.509.105.998,64	$ -

Fuente: informe semanal 24

La Interventoría informa que se ha tramitado el primer pago del 25% de la fase de caracterización.

4.4 Estado General del Tiempo

La interventoría reporta diariamente el estado general del tiempo mediante formato interno en los municipios activos en cada una de las provincias donde se ejecutan actividades, registrando el número de horas efectivas por día y el porcentaje correspondiente por provincia. Esta información permite llevar un control detallado de las condiciones climáticas donde el contratista viene desarrollando actividades, de igual manera el contratista también lleva registro de las lluvias mediante bitácora de obra, este registro es comparado con los reportes de información Hidrometeorológica de DHIME del IDEAM de los cuales la interventoría toma como referencia para verificar la información entregada por el contratista de obra.

A continuación, se detallan el valor de la precipitación mensual de cada provincia:

Tabla 26. Resumen precipitaciones mensual

Provincia	Precipitación (mm)
Guavio	188.5
Medina	339
Soacha	58.6
Oriente	104.7

Fuente: elaboración propia

4.5 Resumen Ensayos de Laboratorio


Se realizó la aprobación condicionada de los informes de caracterización geotécnica de los municipios de Choachí y Junín.

Actualmente se encuentran en observación los informes de caracterización geotécnicas de los municipios de Ubalá y Gama.

A. Provincia Oriente, Municipio de Choachí, Tramo El Rosario - La Caja - Chatasuga – La Llanada-Ferralarada -Barro Negro -Granadillo - Chivate -Resguardo Bajo

La metodología constructiva busca elevar las propiedades mecánicas de la capa granular remanente a través de la estabilización con cemento Portland (3%) y aditivos no tradicionales, principalmente PROES, recomendado como la opción más equilibrada en resistencia inicial, aunque con vulnerabilidad frente a la humedad.

Ilustración 1. Alternativas de estabilización-Choachí

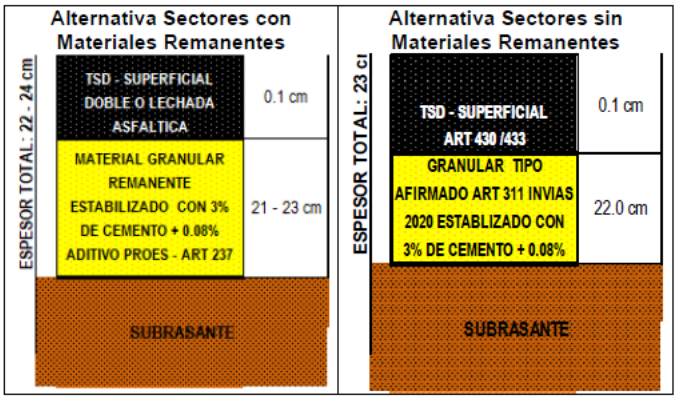

Fuente: informe técnico, consorcio Sofán


La información completa presentada por el contratista de obra fue radicada mediante el oficio **SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-226.** La interventoría emitió la aprobación condicionada a través del oficio **766-240** *Notificación Aprobación condicionada Informe de laboratorio municipio de Choachí y Junín- Respuesta oficio comunicación SOFAN- FOR-CO-03- ICCU031-226 y comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-229*

respectivamente.

B. Provincia Guavio, Municipio de Junín, Tramo Clemente – Palenque – Río Sucio.

Se optó por estabilización con cemento portland + aditivos químicos no tradicionales (PROES®), evaluado mediante resistencia a compresión y ensayos de durabilidad.

Ilustración 2. Alternativas de estabilización-Junín

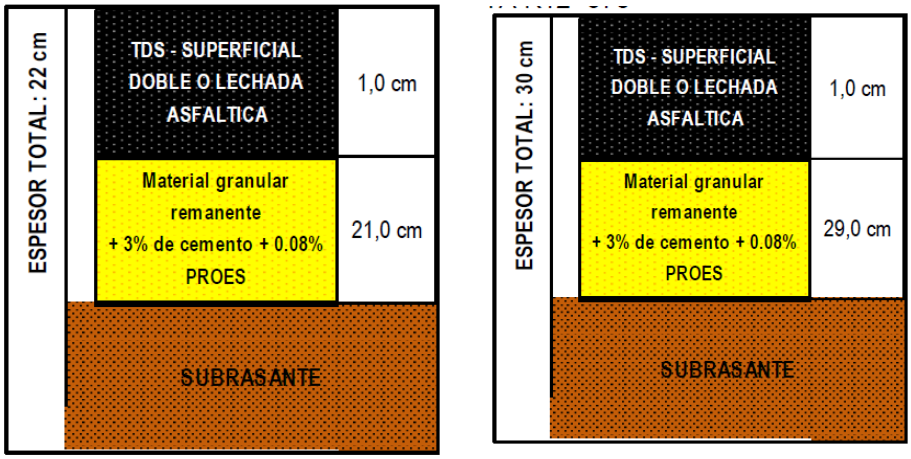

Fuente: informe técnico, consorcio Sofán

La información completa presentada por el contratista de obra fue radicada mediante el oficio **SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-226.** La interventoría emitió la aprobación condicionada a través del oficio **766-240** *Notificación Aprobación condicionada Informe de laboratorio municipio de Choachí y Junín- Respuesta oficio comunicación SOFAN- FOR-CO-03- ICCU031-226 y comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-229 respectivamente.*

4.6 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Entre el **01 y el 30 de septiembre de 2025**, la interventoría realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) presentado por el contratista, verificando que se esté implementando las acciones para el cumplimiento de los componentes implicados durante la ejecución de actividades del mes.

La interventoría constató que la construcción de las alcantarillas siguió un proceso constructivo adecuado que incluyó replanteo, cimentación, instalación de elementos prefabricados, control de compactación de rellenos, verificación de acabados e inspección de obras complementarias. También se supervisaron las medidas de seguridad industrial y el manejo ambiental, garantizando que las actividades se desarrollaran en concordancia con los lineamientos contractuales y normativos.

En campo, la interventoría verificó las actividades de excavación, controlando dimensiones y profundidad, así como la pendiente de instalación de la tubería de 36”. De igual manera, se constató el correcto armado de acero de refuerzo conforme a los diseños establecidos en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje, asegurando que el proceso constructivo se ejecutara dentro de los parámetros técnicos exigidos.

Durante la construcción de las **alcantarillas**, localizadas en los **PR 5+900**, **PR 0+407**, **PR 6+616**, **PR 7+780**, **PR 13+520** y **PR 14+000** respectivamente, se inspeccionó la aplicación de los procedimientos de vaciado de concreto en pocetas de encole y muros de descole, verificando el uso de vibradores mecánicos, la toma de muestras para ensayos de laboratorio, así como el encofrado y desencofrado de la formaleta metálica.

4.6.1 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)

La Interventoría realizó durante el periodo del presente informe el seguimiento al plan de gerencia del contratista, y teniendo en cuenta las líneas base del

cronograma, presupuesto y alcance; se realizaron las siguientes actuaciones administrativas: 766-178 APREMIO No 2 Y LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES DE CARACTERIZACIÓN; 766-199 Respuesta a Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-160-Documento de Justificación de Retraso y Solicitud de Reprogramación; 766-200 Respuesta a Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-195-Respuesta al Oficio No. 766-178 – Apremio No. 2 y Llamado de Atención; 766-210 Respuesta a comunicado SOFÁN- FOR-CO-03-ICCU031-216-Respuesta al oficio 766-159-ICCU - Apremio por incumplimiento de las actividades planteadas en el plan; 766-214 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-230- Respuesta Oficio 766-200 Apremio No 2 y llamado de atención.

Adicionalmente, se ha solicitado al contratista de obra durante los comités de seguimiento al contrato de obra ICCU-138-2025, un análisis integral Técnico, jurídico, financiero y administrativo que soporte la solicitud de la redistribución de actividades y remisión de plan de contingencia para restablecer las líneas bases de control y seguimiento señaladas en el plan de gerencia aprobado por la Interventoría.

4.7 Otros documentos seguimiento mensual

4.7.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

La Interventoría realizó seguimiento al Plan de Inversión del Anticipo presentado por el Contratista de Obra CONSORCIO SOFAN C-031, registrando las aprobaciones de los Giros N° 3 del anticipo por un valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE ($341.671.075,03), aprobado mediante oficio 766-247-Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-251 APROBACIÓN GIRO 3 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025.

En este sentido, la Interventoría continúa realizando un control detallado de la

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	32,78%	6,50%	-26,28%
Durante el periodo	2,65%	0,05%	-2,60%
Acumulado Actual	35,44%	6,55%	-28,88%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
267	171,00	96	-77,12

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

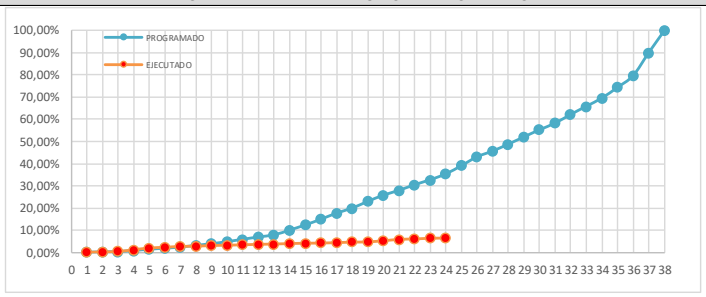

legalidad, trazabilidad y correcta aplicación de los recursos girados al Contratista, con el fin de garantizar que el anticipo se destine al cumplimiento de los objetivos contractuales establecidos.

4.7.2 Seguimiento Programa de Inversión

En el Informe Semanal No.24 correspondiente a este período se registró el control de programación así:

Ilustración 3. Control programación de avance físico del proyecto

Fuente: informe semanal No. 24

Ilustración 4. Control financiero del contrato de obra

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 11.588.877.551	$ 2.297.261.579	20%
Durante el periodo	$ 937.875.311	$ 18.968.807	2%
Acumulado Actual	$ 12.526.752.862	$ 2.316.230.386	18%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

-$	10.210.522.476

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ -	$ -	0,00%
Acumulado Actual	$ 10.605.070.568	$ -	0,00%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN %

-28,88%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO

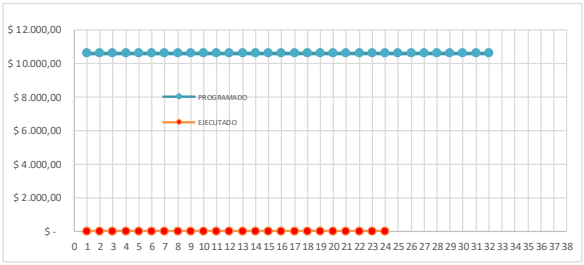

Fuente: informe semanal No. 24

4.7.3 Seguimiento Programa de Obra

La Interventoría para el avance físico y de inversión de las actividades de las Fases I, II y III del contrato de obra, presenta en este periodo reporte negativo respecto al seguimiento y control de la obra con base en la **PROGRAMACION GENERAL INTEGRAL DE OBRA V-1**, como resultado de las labores en ejecución que arrojan a la fecha un **Avance Ejecutado** de Obra del **6,55%** respecto al **35,44% Programado**; resultando en un retraso del 28.88%, cifra obtenida del avance físico que de acuerdo con el presupuesto y programa general integral de obra, y de la ejecución técnica que se realiza para cada una de las actividades en desarrollo correspondientes a los frentes de caracterización y laboratorios; el reporte del avance físico y el control que se lleva a cabo mediante el cálculo realizado y conciliado por el equipo técnico y profesional del contratista de obra e interventoría, en el que se relacionan los datos de acuerdo con en el control de la programación.

Como se ha indicado el control de la Programación general integral de Obra versión V-1, al culminar el periodo del presente informe y de acuerdo con los porcentajes de avance y seguimiento detallado para cada actividad, el resultado de este mes es de **-28,88%** indicador de **balance negativo** respecto a lo proyectado de acuerdo con el avance general de obra según el flujo de inversión que incluye en el Presupuesto de la Fase I, Fase II y Fase III. La interventoría ha conminado al contratista de obra ha garantizar el desarrollo de actividades en cinco municipios para dar cumplimiento a la programación inicial, y aumentar los rendimientos para terminar la Fase I y II del contrato, toda vez que estas vencieron en julio y agosto respectivamente, y a la fecha del presente informe no se han recibido los entregables finales correspondiente a cada una de ellas.

Tabla 27. Avance financiero de acuerdo con los capítulos de ejecución

No.	Indicadores	Valores (+AIU)	Porcentaje valor total del contrato	Diferencia (+) adelanto (-) atraso
1	valor acumulado programado	$12.526.752.862	**35,44%**	**-28,88%**
2	Valor acumulado ejecutado	$ 2.316.230.386	**6,55%**	

Fuente: Elaboración propia, interventoría

Tabla 28. Avance de actividades de obra por capítulos en ejecución

EDT	Descripción de la actividad	Avance de obra (% ejecutada inversión acumulada)		
		Por capitulo		Diferencia (+) adelanto (-) atraso
		Programado	Ejecutado	
0	**Programación general integral de obra v-1**	**35.44%**	**6,55%**	**-28,88%**
A	fase 1 - caracterización	100,00%	85,14%	-14,86%
B	fase 2 - laboratorios	100,00%	73,13%	-26,87%
C	fase 3 - obra	29,87%	0.46%	-29,41%
D	componentes	31,75%	25.83%	-5,92%

Fuente: elaboración propia, interventoría

5 Información contrato de interventoría

5.1 Información general del contrato de interventoría

Número del proceso de selección	ICCU-CM-050 de 2024.
Resolución de adjudicación del contrato No.:	099 de 2025.
No. CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y Fecha:	DIS- 2025000090 de lunes, 27 de enero de 2025.
No RP (Registro Presupuestal) y Fecha	RES- 000425 de lunes, 10 de marzo de 2025.
Número del contrato ICCU:	219 DE 2025.
Fecha de suscripción del contrato:	30 de marzo de 2025.
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE,

	EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Contratista:	CONSORCIO INTERVENCIÓN AC, NIT. 901.915.404 – 8, representado legalmente por **SUSANA MARGARITA GUERRA BECERRA** y conformado por: • ALIANZA INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. BIC., con NIT.:901.915.404-8, con una participación del noventa por ciento (50%). • CANJI DISEÑOS E INTERVENTORÍAS S.A.S., con NIT.:901.324.813-0, con una participación del noventa por ciento (50%).
Valor inicial:	$3.865.474.620,00 TRESMIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE.
Adiciones:	NINGUNA.
Modificaciones:	Modificatorio 1: la modificación de la cláusula 7 de contrato de Obra N° ICCU-138 de 2025 (Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. DIS-2025000418 del 10 de julio de 2025)
Aclaraciones:	NINGUNA.
Suspensiones:	NINGUNA.
Cesiones de participación contractual:	NINGUNA.
Plazo:	Once (11) meses y quince (15) días o hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que primero ocurra.
Fecha de inicio:	9 de abril de 2025.
Fecha de terminación actual del contrato:	31 de diciembre de 2025.

Fuente: elaboración propia

5.2 Informe semanal

Durante el periodo mensual de Agosto la Interventoría envió al ICCU los Informes Semanales **No.20, No.21, No.22, No.23 y No.24** correspondientes a las semanas dentro de este período, cabe resaltar que todos los informes presentados a continuación fueron también presentados en formato Excel y contienen cada uno de

los componentes de obra del contrato técnico, social, ambiental y salud y seguridad y un registro fotográfico detallado de cada una de las actividades realizadas cada semana, mediante el formato MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA. Estos son anexados en un paquete formato Excel y en PDF de la carpeta de componente técnico. Ver anexo 1.2 Informes semanales, dentro de la carpeta 1. Componente técnico de los anexos del informe mensual del mes de septiembre.

5.3 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Durante este período la Interventoría realizaron las siguientes actividades:

- Se presentaron los informes semanales **No.20, No.21, No.22, No.23 y No.24** en las condiciones establecidas para la correcta ejecución de la interventoría.
- Se revisaron los informes del contratista de obra y se solicitaron subsanaciones de estos, de igual manera se reiteró al contratista de las fechas de entrega a fin de que se puede gestionar el informe gerencia por parte de interventoría a la supervisión ICCU.
- Se asiste de manera presencial y/o virtual a las **reuniones programadas** dentro del desarrollo del contrato de interventoría, las cuales se realizan semanalmente los **miércoles**, con el fin de efectuar seguimiento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo al proyecto.
- Se realizan las comunicaciones relacionadas dentro del anexo 1. Componente técnico como 1.12 Correspondencia, donde se destacan las respuestas a los oficios del contratista, requerimientos, llamados de atención y apremio de incumplimiento.

- Se dio aprobación condicionada de los informes de caracterización geotécnica de los municipios de Choachí y Junín.
- Se realizó aprobación para los trámites del giro N° 3 del anticipo y cobro del primer 25% de la fase de caracterización del contratista de obra.

5.4 Informes especialistas y profesionales

Durante el presente período, el contratista entrego información relacionada con los avances relacionados con la **caracterización de materiales mediante los siguientes oficios SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-226 y 229**, y que la interventoría emitió aprobación condicionada mediante el oficio 766-240. Se recibió nueva versión del informe del municipio de Ubalá, que actualmente se encuentra observado a través del comunicado 766-253. Ver anexo 1.9 Resultados de laboratorio dentro de la carpeta 1. Componente técnico de los anexos del informe N° 6.

5.5 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

Se reporta una ejecución de **ciento cuarenta y cinco millones treinta y cinco mil quinientos doce pesos m/cte**. **($145.035.512)** en comparación con lo que se tenía establecido de acuerdo con el Programa Anual de Caja (PAC) presentado por la Interventoría, en el cual para el mes de **septiembre** se tenía establecido ejecutar **($ 364.955.745)**, sin tener en cuenta el veinte por ciento (20%) por amortización del anticipo.

Tabla 29. Diagrama anual de caja de la interventoría

	PROGRAMA ANUAL DE CAJA - PAC									
MESES	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	TOTAL
COSTOS DE PERSONAL	$ 33.810.000	$ 129.996.000	$ 180.895.000	$ 340.929.000	$ 272.941.000	$ 260.900.500	$ 260.900.500	$ 260.900.500	$ 1.006.445.500	**$ 2.747.718.000**
OTROS COSTOS	$ 9.030.000	$ 27.900.000	$ 45.475.000	$ 60.360.000	$ 45.785.000	$ 45.785.000	$ 45.785.000	$ 45.785.000	$ 174.675.000	**$ 500.580.000**
SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 42.840.000	$ 157.896.000	$ 226.370.000	$ 401.289.000	$ 318.726.000	$ 306.685.500	$ 306.685.500	$ 306.685.500	$ 1.181.120.500	**$ 3.248.298.000**
IVA 19%	$ 8.139.600	$ 30.000.240	$ 43.010.300	$ 76.244.910	$ 60.557.940	$ 58.270.245	$ 58.270.245	$ 58.270.245	$ 224.412.895	**$ 617.176.620**
TOTAL VALOR DE LA INTERVENTORÍA	**$ 50.979.600**	**$ 187.896.240**	**$ 269.380.300**	**$ 477.533.910**	**$ 379.283.940**	**$ 364.955.745**	**$ 364.955.745**	**$ 364.955.745**	**$ 1.405.533.395**	**$ 3.865.474.620**
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	**$ 10.195.920**	**$ 37.579.248**	**$ 53.876.060**	**$ 95.506.782**	**$ 75.856.788**	**$ 72.991.149**	**$ 72.991.149**	**$ 72.991.149**	**$ 281.106.679**	**$ 773.094.924**
TOTAL VALOR A PAGAR POR MES	**$ 40.783.680**	**$ 150.316.992**	**$ 215.504.240**	**$ 382.027.128**	**$ 303.427.152**	**$ 291.964.596**	**$ 291.964.596**	**$ 291.964.596**	**$ 1.124.426.716**	**$ 3.092.379.696**

VALOR COBRADO A LA FECHA	**$ 813.878.604**
VALOR POR FACTURAR	**$ 3.051.596.016**
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 3.865.474.620**

Fuente: elaboración propia, interventoría, formato Excel.

6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

A la fecha de este informe se mantiene la misma cantidad de vehículos y equipos utilizados para las actividades que debe ejecutar la interventoría para este periodo,

de igual manera con los programas y aplicativos necesarios, estas se encuentran reportadas en el primer informe de interventoría.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

A continuación, se presenta la información correspondiente a las contrataciones directas y de subcontratistas realizadas por parte del Consorcio Intervención AC.

Tabla 30. Personal de la interventoría, periodo mes de agosto

Nombre	Cargo	Dedicación
Cristian Moreno Arias	Director de interventoría	100%
Roberto López Julio	Director de interventoría Fase III	100%
Byron Aguirre Diaz	Residente técnico	100%
Laura peñuela	Residente social	100%
Lady Jiménez	Residente salud y seguridad	100%
Hernán Pantoja	Residente salud y seguridad	100%
Julieth Africano	Residente social	100%
Cristian Liñán	Apoyo a la supervisión	100%
Anderson Sierra	Residente técnico	100%
Helbert Casallas	topógrafo	100%

Fuente: personal de interventoría informe componente SST

Tabla 31. Personal de interventoría-personales especialistas

Nombre	Cargo	Dedicación
Angela Salazar Herrera	Geotecnia	40%

Luis Felipe Morales	Geotecnia	40%
Oscar Chaves Caballero	Geotecnia	40%
Daniel Vargas Rozo	Pavimentos	50%
Neimar Castaño Peláez	Pavimentos	50%
Néstor Bahos Canencio	Pavimentos	50%

Fuente: personal de interventoría informe componente SST

De acuerdo con las actividades de este periodo la Interventoría presenta la seguridad social que se encuentra en el anexo 2 SS Planilla dentro de la carpeta Anexos Informe N° 6 de la carpeta de la interventoría. Para este período no hubo retiro de personal por parte de la Interventoría de Obra. También se anexa Formato MS-GC-FR-013 herramienta de base revisión cálculo de seguridad social que se encuentra en la carpeta Anexo 3 cálculo del IBC vinculado.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

De acuerdo con la propuesta económica de la Interventoría de Obra el CONSORCIO INTERVENCIÓN AC para el LOTE 1 El ICCU la contrató por un valor de **tres mil ochocientos sesenta y cinco millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos ($3.865.474.620)**, para el presente Informe Mensual se reporta una ejecución de **ciento cuarenta y cinco millones treinta y cinco mil quinientos doce pesos m/cte**. **($145.035.512)** de las actividades correspondientes a las Fases I, II y III que se desarrollaron durante el período del **primero (01) al treinta (30) de septiembre de 2025.** A continuación, se refleja el registro acumulado del total ejecutado por la interventoría.

Tabla 32. Valor acumulado de actividades ejecutadas por parte de la interventoría

No.	MES	VALOR
1	Abril	$ 70.693.378

2	Mayo	$ 110.773.530
3	Junio	$ 120.908.760
4	Julio	$ 138.042.975
5	Agosto	$ 151.180.575
6	Septiembre	$145.035.512
	VALOR ACUMULADO	**$ 736.355.355**

Fuente: elaboración propia

Este valor acumulado correspondería a **diecisiete puntos cero tres por ciento (17.03%)** de los recursos destinados para el contrato de interventoría.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

A partir del acta de inicio firmada el **09 de abril de 2025**, se firmó acta de inicio del contrato de obra, a la fecha no se ha generado ninguna suspensión del contrato de obra. Dado el modificatorio N° 1 se actualizaron las pólizas del acta de inicio al anexo 3 de la póliza de responsabilidad civil extracontractual y póliza de cumplimiento de esta manera se anexa la actualización mencionada anteriormente. Ver anexo 1.3 Actas aprobación de pólizas

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría

Se verificó la certificación de equipos de topografía nuevos de un nivel y 2 estaciones y se hizo revisión de vigencia de la calibración.

Se realizo verificación de la documentación de los vehículos y conductores de la maquinaria que se reportó en el mes por parte de la interventoría, dentro de la documentación se verifico estado de tarjeta de propiedad del vehículo SOAT, tecno mecánica, licencias de conducción de los conductores del contratista de obra.

6.6 Otros Documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

La Interventoría presentó El Plan de Inversión del anticipo mensualizado y fue aprobado por el ICCU, se recibió el desembolso del Anticipo inicial de la Interventoría. Los movimientos detallados de la utilización del anticipo controlando su saldo mensual y el reintegro de los rendimientos causados, el formato los rendimientos generados en el mes anterior al mes del informe, el Informe mensual de los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros, notificación de aplicación del pago expedidos por la Subgerencia Administrativa y Financiera del ICCU, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos serán entregados en conjunto con este informe. Ver Anexo 1.13 Informe de buen manejo del anticipo de Interventoría

6.7 Actas de Comité de Obra

Durante el periodo comprendido entre el **1 al 30 septiembre** se realizaron tres actas en campo, y se cumplió con las cuatro reuniones de seguimiento entre contratista, interventoría y la supervisión del ICCU a fin de revisar el avance de obra que se vienen ejecutando, estas fueron diligenciadas en el formato ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION. Ver anexo

- Acta de comité de obra fecha: 03-09-25
- Acta de comité de obra fecha: 10-09-25
- Acta de comité de obra fecha: 17-09-25
- Acta de comité de obra fecha: 24-09-25

Tanto las actas de comité de obra como las actas de reunión se encuentran en trámite de ser firmadas por los asistentes.

7 Conclusiones y recomendaciones

7.1 Conclusiones y recomendaciones área técnica

- ✓ Durante el periodo evaluado, se evidenció un atraso del avance físico y financiero del proyecto, reflejado en un avance ejecutado del 6,55% frente al 35,44% programado,

lo que representa un retraso acumulado del -28,88% respecto al cronograma establecido en la Programación General de Obra, este comportamiento responde principalmente a los retrasos que se vienen acumulando con respecto a la fase 3 del contrato de obra, y el bajo rendimiento que ha llevado al incumplimiento de los entregables de la fase I y II.

- ✓ La interventoría ha ejercido seguimiento permanente a la ejecución de la obra, dejando constancia de hallazgos y observaciones mediante actas y oficios con registros fotográfico. A la fecha de este informe el contratista realizo la construcción de 5 alcantarillas en el tramo de casa rosada a laguna azul y 1 alcantarilla que aún se encuentra en construcción.
- ✓ La interventoría reitera que el cumplimiento estricto de especificaciones técnicas, normativas y contractuales es obligatorio y cualquier desviación compromete la estabilidad y funcionalidad de las obras.
- ✓ El contratista iniciará las actividades de mejoramiento de rasante correspondientes a la Fase 3 en el municipio de Choachí de la provincia de Oriente y en el municipio de Junín en la provincia del Guavio durante el próximo mes. Dicho inicio se encuentra respaldado por la aprobación parcial de los documentos técnicos y resultados de ensayos de laboratorio de la Fase 2, los cuales, pese a su carácter parcial, permiten el avance de las actividades al verificarse que las condiciones del suelo encontrado son favorables para su ejecución.
- ✓ El contrato continúa con retrasos, sin embargo, ya se cuenta con parte de la maquinaria para iniciar la fase 3 del contrato, por lo cual tiene establecido iniciar actividades en los tramos de las provincias del Guavio y Oriente debido a que en los municipios de Junín y Choachí el clima está favoreciendo el inicio de las actividades, por el momento contratista continua con la construcción de obras de drenaje aumentando con frentes de trabajo.

- ✓ Se han presentado deficiencias en algunos procedimientos constructivos, lo que obliga a realizar correcciones inmediatas sin generar costos adicionales por lo tanto se recomienda tomar muestras de concreto de cada una de las secciones de las estructuras de la alcantarilla.
- ✓ El contratista debe implementar medidas de mejora en los procesos de control interno de calidad y fortalecer el seguimiento a los procedimientos constructivos como en los procesos constructivos de obras hidráulicas que se continúen ejecutando.
- ✓ Se evidencia cumplimiento en los lineamientos generales de la interventoría, incluyendo control técnico, administrativo y documental del proyecto.
- ✓ Finalmente, la interventoría reitera la preocupación por los continuos incumplimientos en las entregas de los productos topográficos y documentos técnicos requeridos, los cuales han sido objeto de múltiples reprogramaciones sin evidencia de avances significativos. Se hace un llamado al contratista para fortalecer la planeación y el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos, especialmente en lo relacionado con las subsanaciones pendientes, la entrega de los informes geotécnicos y presupuestos preliminares, así como la presentación del análisis integral técnico, jurídico y financiero. El cumplimiento de estos requerimientos es fundamental para garantizar la adecuada ejecución de las actividades programadas y evitar afectaciones en el cronograma general del proyecto.

7.2 Conclusiones y recomendaciones área ambiental

- ✓ Durante el mes de septiembre de 2025, se realizó 1 mesa de trabajo para resolver dudas sobre la elaboración del PAGA del Guavio dando cumplimiento a la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura modo carretero del 2022.
- ✓ En el mes de septiembre de 2025 se mantuvo la ejecución progresiva de las actividades del contrato de obra ICCU-CTO-138 de 2025, avanzando en las fases de diagnóstico, caracterización vial y obras de drenaje, desde el área técnica se trabaja en la definición de la metodología y la búsqueda de alternativas de estabilización. Por

otro lado, el contratista tiene pendiente la entrega del PAGA de la Provincia del Guavio con los ajustes solicitado por la interventoría.

- ✓ Se recomienda que el contratista realice recorridos previos al inicio de actividades constructivas para definir los tramites de permisos menores que se requieran en la zona de intervención.
- ✓ Se recomienda al contratista que el manejo de RCD generados en obra debe ser consultado con la supervisión y la interventoría para definir el destino de estos, ya que, no se puede entregar a terceros el 100% de estos RCD Fino no expansivos generados.

7.3 Conclusiones y recomendaciones área social

- ✓ Durante el mes de septiembre se evidenció avance en las actividades programadas, sin embargo, persisten retrasos en la entrega de productos como actas de vecindad, piezas de comunicación y radicación de correspondencia oficial ante alcaldías.
- ✓ Los informes semanales y mensuales del Contratista presentaron demoras en su radicación y observaciones recurrentes sobre registro fotográfico, fechas y soporte de campo, lo que ha retrasado su aprobación por parte de la Interventoría.
- ✓ Se presentaron incumplimientos en los horarios del Punto SAU afectando la cobertura del servicio de atención y recepción de PQRSD.
- ✓ Se identificaron dificultades en la coordinación entre el componente social y las áreas técnica y ambienta del Contratista l, lo que ha generado reprocesos en la elaboración de materiales de divulgación y gestión de residuos.
- ✓ Gestión documental y de comunicaciones:
- ✓ La correspondencia y trazabilidad administrativa se mantiene activa, pero con observaciones sobre la falta de respuesta o cierre formal de varios oficios, lo que refleja debilidades en el control y archivo de la información.

- ✓ Implementar un plan de mejora interna que garantice cumplimiento de cronogramas, trazabilidad documental y entrega oportuna de productos con los formatos exigidos por el ICCU.
- ✓ Asegurar la atención completa en los Puntos SAU con personal fijo y horario establecido, complementando la atención presencial con el uso activo de medios digitales.
- ✓ Establecer estrategias de comunicación interna para validar información antes de la elaboración de piezas de divulgación y para coordinar la gestión ambiental y predial.
- ✓ Cumplir estrictamente con la entrega física de documentos en alcaldías y entidades, con sello de recibido, y consolidar mensualmente los oficios atendidos para evitar pendientes administrativos.

7.4 Conclusiones y recomendaciones área SST

- ✓ De acuerdo con las actividades que se han venido desarrollando en Fase I Y II se han venido representando estrategias de auto cuidado por medio de la recopilación de la información desarrollando la capacidad de integrar bienestar y seguridad con nuestros colaboradores generando conciencia en cada uno de nuestros frentes de trabajo y en cada colaborador teniendo presente los riesgos y peligros inherentes a nuestras actividades y situaciones que salen de nuestros limites humanos. Los comportamientos son la base lo cual nos hace buscar alternativas de prevención, para mitigar los accidentes laborales y justificar soluciones por medio de la matriz de riesgos.

8 Anexos

8.1 Carpeta componente técnico

8.2 Carpeta componente social

8.3 Carpeta componente SST

8.4 Carpeta componente ambiental

8.5 Registro fotográfico del avance de las obras.

Registro fotográfico componente técnico	
	
Topografia municipio de Paratebueno provincia Medina	
	
Topografia municipio de Fómeque provincia Oriente	





Toma de muestras apiques municipio de Paratebueno provincia Medina













Ensayos de laboratorio










alcantarillas provincia del Guavio municipio de Ubalá tramo Casa Rosada – Laguna Azul





Fuente: elaboración propia, interventoría

Registro fotográfico componente social

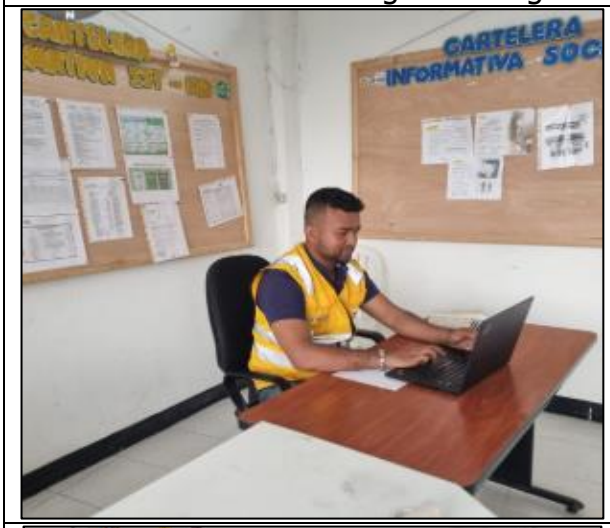











Fuente: elaboración propia, interventoría

Registro fotográfico componente SST	
	
Reposición de EPPS	Señalización campamento
	
Delimitación tubería	Charlas y capacitaciones

Registro fotográfico componente ambiental	
	
Punto ecologico	Orden y aseo
	
Señalización ambiental	Manejo ambiental de residuos

Fuente: elaboración propia, interventoría

8.6 Correspondencia

Se presenta el informe del Control de Correspondencia Recibida por la Interventoría durante el mes de septiembre de 2025, en el cual se detallan las comunicaciones recibidas y las respectivas respuestas emitidas, atendiendo a su prioridad, pertinencia y oportunidad, conforme a los procedimientos establecidos:

Se presenta el Control de Correspondencia Recibida por la Interventoría en el mes de septiembre de 2025:

COMUNICACIÓN		**ASUNTO**	**REMITENTE**	**FIRMADO**
CONSECUTIVO No.	**FECHA**			
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-186	01/09/2025	Respuesta Oficio 766-173-ICCU Informe Final del municipio de Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-187	02/09/2025	Atención oficio 766-168 “RESPUESTA COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-166 SOLICITUD DE REALIZACION DE LOS 4 PAGAS DE ACUERDO CON LAS PROVINCIAS GUAVIO, MEDINA, ORIENTE Y SOACHA”.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-188	03/09/2025	Respuesta al oficio No. 766-176 Informe Laboratorio Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-189	03/09/2025	Radicación presupuesto preliminar Tramo de Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-190	03/09/2025	Radicación Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA Provincia Soacha	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-191	03/09/2025	Radicación Preliminar – Cálculos e Información de Campo – Tramo de Chipaque	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-193	05/09/2025	Respuesta Oficio No. 766-151-ICCU – Observaciones a Informe de Topografía – Tramo Junín.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-194	05/09/2025	Respuesta parcial Oficios No. 766-161-ICCU y 766-164-ICCU – Geoposicionamientos.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-195	05/09/2025	Respuesta al Oficio No. 766-178 – Apremio No. 2 y Llamado de Atención	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-196	05/09/2025	ENTREGA DE INFORME MENSUAL SST No. 5- PERIODO AGOSTO	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITENTE	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-197	05/09/2025	Radicación Informe Técnico Mensual N.º 5 – Agosto de 2025	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-198	05/09/2025	Radicación Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA Provincia Medina	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-199	08/09/2025	Radicación complementaria – Oficios No. 766-161-ICCU y 766-164-ICCU – Geoposicionamientos.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-200	06/09/2025	Radicación Informe mensual Ambiental N°5 agostos 2025 Provincia Guavio	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-201	08/09/2025	Respuesta a Oficio No. 766-171-ICCU – Observaciones a los PMT Provincias de Soacha y Medina.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-202	08/09/2025	Envío para revisión y aprobación – Acta de Costos de Obra No. 01 (primer 25%).	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-204	09/09/2025	Radicación informe y presupuesto preliminar ajustado – Tramo de Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-206	09/09/2025	Respuesta oficio 766-185 – Observaciones topografía Tramo Chipaque.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-207	09/09/2025	Radicación Preliminar Topografía – Tramo de Gama	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-208	09/09/2025	Radicación del Informe Gerencial Mensual No. 3 – Solicitud de aprobación	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-209	10/09/2025	Respuesta oficio 766-169 – Observaciones topografía Tramo Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-210	10/09/2025	Radicación informe y presupuesto preliminar ajustado – Tramo de Ubalá	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITENTE	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-211	10/09/2025	Respuesta a Oficio No. 766-186-ICCU – Observaciones a los PMT Provincias de Soacha y Medina.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-212	10/09/2025	Radicación Hoja de vida Auxiliar Social	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-217	11/09/2025	Radicación Hoja de Vida director de Obra	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-218	11/09/2025	Radicación de presupuesto preliminar tramo Choachí.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-219	12/09/2025	Solicitud de pago primer 25%– Contrato ICCU-138 de 2025.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-220	12/09/2025	Radicación Geoposicionamiento – Tramo Sibaté	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-221	12/09/2025	Radicación Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA Provincia de Oriente	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-222	12/09/2025	Notificación – pérdida de banca cerca del PR 4+960	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-223	12/09/2025	Radicación Informe Topografía – Tramo Sibaté	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-225	12/09/2025	RADICACIÓN ACTAS DE VECINDAD UBALÁ EN RESPUESTA AL OFICIO 766-157 DE 2025.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-226	13/09/2025	Radicación informe laboratorio Tramo del municipio de Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-227	13/09/2025	Radicación informe laboratorio Tramo del municipio de Ubalá	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITENTE	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-228	14/09/2025	Radicación Hoja de Vida profesional social	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-229	15/09/2025	Radicación informe laboratorio Tramo del municipio de Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-230	15/09/2025	Respuesta Oficio 766-200 Apremio No 2 y llamado de atención	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-231	15/09/2025	Radicación Informe Topografía – Tramo Fosca	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-232	16/09/2025	Respuesta 766-199- Respuesta a Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-160- Documento de Justificación de Retraso y Solicitud de Reprogramación	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-233	15/09/2025	Respuesta oficio 766-192-ICCU solicitud de contratación del personal contractual del componente social	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-234	16/09/2025	Respuesta Oficio 766-207 - Presupuesto Preliminar de Choachí ajustado	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-235	16/09/2025	Respuesta Oficio 766-207 - Presupuesto Preliminar de Ubalá ajustado	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-236	17/09/2025	Respuesta oficio 766-177-ICCU	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-237	17/09/2025	Remisión archivo Excel actualizado – Giro 2 del anticipo.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-238	17/09/2025	Respuesta a observaciones Oficio No. 766-193 – Informes técnicos de geoposicionamiento.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-239	17/09/2025	Respuesta a observaciones Oficio No. 766-204 – Topografía tramo Gama.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITENTE	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
				LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-241	17/09/2025	Solicitud de remisión de actas de comité.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-242	17/09/2025	Radicación informe laboratorio Tramo del municipio de Gama	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-243	17/09/2025	RESPUESTA AL OFICIO NO. 766-209-ICCU RTA FOR-CO-03-ICCU031-214-RESPUESTA 766-184-ICCU - TRASLADO DEL INSTRUCTIVO ICCU PARA LA SOLICITUD DEL DISEÑO DE LAS VALLAS.	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-249	22/09/2025	Radicación Esquema de Zona de Intervención Tramo Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-250	22/09/2025	Respuesta Oficio No. 766-187-ICCU – Observaciones a Informe de Topografía – Tramo Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-251	22/09/2025	Remisión Orden de Giro No. 003 – Tercer desembolso para revisión y aprobación	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-252	22/09/2025	Respuesta a Oficio No. 766-213-ICCU – Observaciones a los PMT Provincias de Soacha y Medina	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-253	22/09/2025	Solicitud de envío de oficios radicados a correos oficiales del contrato	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-254	22/09/2025	Atención a observaciones #2 mediante oficio 766-181 informe ambiental N°4 correspondiente al mes de julio del 2025	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-255	16/09/2025	Respuesta Oficio 766-207 - Presupuesto Preliminar de Ubalá ajustado	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITENTE	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-256	22/09/2025	Respuesta Oficio No. 766-217-ICCU – Topografía y Capas Geográficas Chipaque	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-257	23/09/2025	Atención a observaciones informe SST N°5	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-260	24/09/2025	NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE POR PÉRDIDA DE BANCA EN EL PR4+960, TRAMO CASA ROSADA – LAGUNA AZUL	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-261	24/09/2025	NOTIFICACIÓN PÉRDIDA DE BANCA EN EL TRAMO VIAL VEREDA CHATASUGA, MUNICIPIO DE CHOACHÍ, PROVINCIA DE ORIENTE	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-262	24/09/2025	Contestación a observaciones Oficio No. 766-202-ICCU – Informe Técnico Mensual No. 5	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-265	24/09/2025	Respuesta oficio 766-233	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-266	24/09/2025	Respuesta oficio 766-234	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-267	25/09/2025	Respuesta al oficio No. 766-190 y solicitud de reprogramación de obra. oficio 766-234	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-269	25/09/2025	Respuesta Oficio No. 766-224-ICCU – Presupuesto Preliminar Ubalá	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-270	25/09/2025	Radicación Presupuesto Preliminar – Tramo Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-271	25/09/2025	Remisión Presupuesto Caracterización Vial y Ensayos – para revisión y firma	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-272	25/09/2025	Respuesta Oficio No. 766-245-ICCU – Radicación Esquema de Zona de Intervención Tramo Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO

COMUNICACIÓN		**ASUNTO**	**REMITENTE**	**FIRMADO**
CONSECUTIVO No.	**FECHA**			
				LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-273	25/09/2025	Respuesta a Oficio No. 766-220-ICCU – Presupuesto Preliminar Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-274	26/09/2025	Respuesta al Oficio No. 766-255 – Notificación de inicio de construcción de alcantarilla en el PR 14+800, Municipio de Ubalá	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-275	26/09/2025	Radicación Esquema de Zona de Intervención – Tramo Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-280	26/09/2025	Remisión Orden de Giro No. 004 – Cuarto desembolso para revisión y aprobación	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-287	29/09/2025	Documentos Maquinaria para frente de obra Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-290	30/09/2025	Respuesta Oficio No. 766-241-ICCU – Aprobación condicionada Informe de Laboratorio Municipio de Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO
SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-292	30/09/2025	Respuesta al Oficio 766-270 del 29/09/2025 – Presupuesto Preliminar Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	WILSON GERARDO LOAIZA GALINDO

Se presenta el Control de Correspondencia Enviada por la Interventoría en el mes de septiembre de 2025:

COMUNICACIÓN		**ASUNTO**	**REMITIDO AL**	**FIRMADO**
CONSECUTIVO No.	**FECHA**			
766-174-ICCU	01/09/2025	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 17, 18 y 19 CONTRATO DE INTERVENTORÍA	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS

COMUNICACIÓN		**ASUNTO**	**REMITIDO AL**	**FIRMADO**
CONSECUTIVO No.	**FECHA**			
766-175-ICCU	01/09/2025	SUBSANACION DE INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA: ABRIL, MAYO Y JUNIO	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-176-ICCU	01/09/2025	RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-186 // NO RECIBO DE SUBSANACIÓN INFORME FINAL TRAMO CHOACHÍ	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-177-ICCU	05/09/2025	Respuesta a los Comunicados SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-175, SOFANFOR-CO-03-ICCU031-176, SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-178 y SOFAN- FORCO-03-ICCU031-179.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-178-ICCU	03/09/2025	APREMIO N° 2 Y LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMES DE CARACTERIZACIÓN – CONTRATO DE OBRA ICCU-138 DE 2025	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-179-ICCU	07/09/2025	Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-183 APROBACIÓN GIRO 2 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-180-ICCU	08/09/2025	SEGUNDO LLAMADO DE ATENCIÓN CALIDAD DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-181-ICCU	08/09/2025	RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-168 OBSERVACIONES INFORME AMBIENTAL N° 4 JULIO 2025, CONTRATO 138 DE 2025.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-182-ICCU	08/09/2025	INFORMES MENSUALES DE INTERVENTORÍA MES DE JULIO DEL 2025	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-183-ICCU	05/09/2025	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL NO. 4 VERSIÓN 2 - COMPONENTE SOCIAL	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-184-ICCU	08/09/2025	TRASLADO DEL INSTRUCTIVO ICCU PARA LA SOLICITUD DEL DISEÑO DE LAS VALLAS.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-185-ICCU	08/09/2025	RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-191 RADICACIÓN PRELIMINAR – CÁLCULOS E INFORMACIÓN DE CAMPO – TRAMO CHIPAQUE (TOPOGRAFÍA)	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-186-ICCU	08/09/2025	Respuesta a los comunicados SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-201 Respuesta a Oficio No. 766-171-ICCU – Observaciones a los PMT Provincias de Soacha y Medina.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-187-ICCU	09/09/2025	RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-193 Respuesta Oficio No. 766-151-ICCU – Observaciones a Informe de Topografía – Tramo Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-188-ICCU	09/09/2025	RESPUESTA A OFICIO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-192, RESTRICCIÓN DE PASO A VEHÍCULOS DE OBRA – AFECTACIÓN AL PROYECTO	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-189-ICCU	09/09/2025	NOTIFICACIÓN ICCU Y RESPUESTA A OFICIO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-192, RESTRICCIÓN DE PASO A VEHÍCULOS DE OBRA – AFECTACIÓN AL PROYECTO	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-190-ICCU	09/09/2025	Incumplimiento a compromisos adquiridos, ENTREGA DE FORMULAS DE TRABAJO PARA FASE III, en comité de seguimiento del viernes, 5 de septiembre del 2025	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-191-ICCU	09/09/2025	Análisis técnico y social del cambio del trazado en la sección final del tramo Humea-San Cristóbal-Gazatavena-San Luis del Retiro, municipio de Medina, provincia Medina	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-192-ICCU	09/09/2025	solicitud de contratación del personal contractual del componente social.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-193-ICCU	09/09/2025	RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-194 Respuesta parcial Oficios No. 766-161-ICCU y 766-164-ICCU – Geoposicionamientos.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-194-ICCU	09/09/2025	Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-181-Situación actual tramo vial Quetame-Provincia Oriente.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-195-ICCU	09/09/2025	Notificación ICCU-Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-181-Situación actual tramo vial Quetame-Provincia Oriente.	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-196-ICCU	10/09/2025	Llamado de atención por actitudes inapropiadas en comités de seguimiento al contrato de obra ICCU-138-2025.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-197-ICCU	11/09/2025	Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-215 y FOR-CO-03-ICCU031-202 // Solicitud de aprobación y certificación para trámite de pago primer 25%.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-198-ICCU	12/09/2025	Informe y recomendación inicio proceso administrativo por presunto incumplimiento del contrato de obra ICCU-138-2025	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-199-ICCU	12/09/2025	766-199 Respuesta a Oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-160-Documento de Justificación de Retraso y Solicitud de Reprogramación	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-200-ICCU	12/09/2025	Respuesta a Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-195-Respuesta al Oficio No. 766-178 – Apremio No. 2 y Llamado de Atención	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-201-ICCU	12/09/2025	Revisión In Situ de actividades de limpieza de alcantarillas tramo Ubalá-Provincia Guavio	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-202-ICCU	12/09/2025	Respuesta a oficio SOFAN- FOR-CO-ICCU03-197, Radicación Informe Técnico Mensual N.º 5 – agosto de 2025.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-203-ICCU	12/09/2025	RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-199 Radicación complementaria – Oficios No. 766-161-ICCU y 766-164-ICCU – Geoposicionamientos.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-204-ICCU	12/09/2025	RESPUESTA A SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-207 TOPOGRAFÍA GAMA LLAMADO DE ATENCIÓN	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-205-ICCU	12/09/2025	RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-209 RADICACIÓN INFORME TOPOGRAFÍA – TRAMO CHOACHÍ (SEGUNDA REVISIÓN)	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-206-ICCU	13/09/2025	Remisión hoja de vida profesional Ambiental de interventoría Cto 219 de 2025.	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-207-ICCU	15/09/2025	Respuesta a oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-215-Radicación de presupuesto preliminar tramo Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-208-ICCU	15/09/2025	RESPUESTA A OFICIO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-212- Radicación Hoja de vida Auxiliar Social	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-209-ICCU	15/09/2025	RESPUESTA A COMUNICADO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-214-Respuesta 766-184-ICCU - TRASLADO DEL INSTRUCTIVO ICCU PARA LA SOLICITUD DEL DISEÑO DE LAS VALLAS.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-210-ICCU	18/09/2025	Respuesta a comunicado SOFÁN- FOR-CO-03-ICCU031-216-Respuesta al oficio 766-159-ICCU - Apremio por incumplimiento de las actividades planteadas en el plan de gestión social	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-211-ICCU	15/09/2025	RESPUESTA A SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-220 Y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031- 223 GEOPOSICIONAMIENTO Y TOPOGRAFÍA INICIAL TRAMO SIBATÉ	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-212-ICCU	16/09/2025	766-212 Aprobación de Informes Gerenciales mensuales No 2 y 3 CTO-138 de 2025. Respuesta oficios SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-131 y SOFANFOR- CO-03-ICCU031-208	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-213-ICCU	16/09/2025	Respuesta a Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-211 Respuesta a Oficio No. 766- 186-ICCU – Observaciones a los PMT Provincias de Soacha y Medina.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-214-ICCU	16/09/2025	Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-230- Respuesta Oficio 766-200 Apremio No 2 y llamado de atención y Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-232-Respuesta 766-199- Respuesta a Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-160-Documento de Justificación de Retraso y Solicitud de Reprogramación	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-215-ICCU	16/09/2025	RESPUESTA A SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-231 TOPOGRAFÍA FOSCA	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-216-ICCU	16/09/2025	APROBACIÓN ANEXO A COMUNICADO 766-138 RECIBO PRODUCTOS TOPOGRÁFICOS Y CAPAS GEOGRÁFICAS TRAMO UBALÁ	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-217-ICCU	16/09/2025	RESPUESTA A SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-206 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA CHIPAQUE	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-218-ICCU	17/09/2025	Respuesta al oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-222 Notificación – pérdida de banca cerca del PR 4+960	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-219-ICCU	17/09/2025	Notificación – pérdida de banca cerca del PR 4+960, provincia del Guavio, municipio de Ubalá tramo 1: Casa rosada - laguna azul- Respuesta Oficia SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-222	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-220-ICCU	17/09/2025	Respuesta a oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-234-Respuesta Oficio 766-207 - Presupuesto Preliminar de Choachí ajustado	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-221-ICCU	18/09/2025	OBSERVACIONES INFORME SST N° 5 AGOSTO 2025, CONTRATO 138 DE 2025.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-222-ICCU	18/09/2025	RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-198. PAGA MEDINA.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-223-ICCU	17/09/2025	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL NO. 5 VERSIÓN 1 – COMPONENTE SOCIAL	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-224-ICCU	18/09/2025	Respuesta a oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-235-Respuesta Oficio 766-207 - Presupuesto Preliminar de Ubalá ajustado	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-225-ICCU	18/09/2025	766-225 Traslado de requerimientos y solicitud de la Entidad ICCU-Oficio ICCU-S-2025-0006490	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-226-ICCU	18/09/2025	Respuesta FOR-CO-03-ICCU031-125 // Aprobación Hoja de Vida – Ingeniero Residente	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-227-ICCU	18/09/2025	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 20 y 21 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-219-2025	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-228-ICCU	18/09/2025	Respuesta FOR-CO-03-ICCU031-217 // Aprobación Hoja de Vida – Director de Obra.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-229-ICCU	18/09/2025	OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL NO. 4 VERSIÓN 3 - COMPONENTE SOCIAL	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-230-ICCU	19/09/2025	Aprobación individual de Informe Gerencial mensual No 2 CTO-138 de 2025. Respuesta oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-131 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-208	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-231-ICCU	19/09/2025	Aprobación Individual de Informe Gerencial mensual No. 3 CTO-138 de 2025. Respuesta oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-131 y SOFAN-FORCO-03-ICCU031-208	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-232-ICCU	19/09/2025	RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-238- informes geoposicionamientos Fómeque, Fosca y Chipaque. APROBACIÓN FOSCA Y CHIPAQUE – PENDIENTES FOMEQUE	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-233-ICCU	19/09/2025	Observaciones actividades alcantarilla N°4 PR 7+780, Municipio de Ubalá tramo Casa Rosada - Laguna Azul	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-234-ICCU	19/09/2025	Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-248-Respuesta al oficio 766-	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
		225 – Traslado de requerimientos y solicitud de la Entidad ICCU (Oficio ICCU-S-2025-0006490)		MORENO ARIAS
766-235-ICCU	22/09/2025	766-235 Remisión de actas de comité del N° 10 al 17-Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-241	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-236-ICCU	22/09/2025	766-236 Subsanación informe mensual N° 4 Mes de Julio Interventoría-Respuesta Oficio ICCU-S-2025-0006315	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-237-ICCU	22/09/2025	766-237 Aprobación PMT Medina y Soacha-Respuesta oficio SOFAN-FORCO-03-ICCU031-252 - Respuesta a Oficio No. 766-213-ICCU	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-238-ICCU	22/09/2025	766-238 Notificación Aprobación PMT Medina y Soacha-Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-252	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-239-ICCU	22/09/2025	RESPUESTA SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-250 – Observaciones a Informe de Topografía – Tramo Junín tercera revisión.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-240-ICCU	23/09/2025	Notificación Aprobación condicionada Informe de laboratorio municipio de Choachí y Junín- Respuesta oficio comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-226 y comunicación SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-229 respectivamente.	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-241-ICCU	23/09/2025	Aprobación condicionada Informe de laboratorio municipio de Choachí y Junín- Respuesta oficio comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-226 y comunicación SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-229 respectivamente.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-242-ICCU	23/09/2025	RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-190. PAGA SOACHA.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-243-ICCU	23/09/2025	RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-187. PAGA GUAVIO.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-244-ICCU	23/09/2025	RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-221. PAGA ORIENTE.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-245-ICCU	23/09/2025	766-245 Respuestas Radicación Esquemas de Zona de Intervención Junín y Ubalá-oficios SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-249 y SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-255	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-246-ICCU	23/09/2025	Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-259-Notificación cierre de la vía al llano e interior de Choachí, afectaciones en actividades preliminares y levantamiento de actas de vecindad	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-247-ICCU	23/09/2025	Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-251 APROBACIÓN GIRO 3 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-248-ICCU	23/09/2025	RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-225 - LLAMADO DE ATENCIÓN POR INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS PARA LA RADICACIÓN DE ACTAS DE VECINDAD	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-249-ICCU	23/09/2025	RESPUESTA A SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-256 OBSERVACIONES TOPOGRAFÍA Y CAPAS FEOGRÁFICAS CHIPAQUE	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-250-ICCU	24/09/2025	Acta de cobro No. 1 del Contrato de Interventoría No. ICCU- 219-2025.	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-252-ICCU	24/09/2025	RESPUESTA A LOS COMUNICADOS SOFAN-FOR-CO-03-228 Y SOFAN-FOR-CO-03-233. – APROBACIÓN PROFESIONAL SOCIAL KIMBERLY MENDOZA MORENO	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-253-ICCU	23/09/2025	Observaciones informe diseño de estabilización y estructura de pavimento provincia del Guavio tramo – Casa Rosada-San Luis – Ubalá en versión 3-Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-227	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-254-ICCU	24/09/2025	RESPUESTA AL COMUNICADO SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-236 - Respuesta oficio 766-177-ICCU	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-255-ICCU	25/09/2025	solicitud preaviso de inicio de actividades por parte del contratista de obra para la construcción de alcantarillas en el municipio de Ubalá. Tramo: Casa rosada - Laguna azul.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-256-ICCU	25/09/2025	Respuesta al comunicado SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-243 (Respuesta al oficio no. 766-209-ICCU rta FOR-CO-03-ICCU031-214-Respuesta 766-184-ICCU - traslado del instructivo ICCU para la solicitud del diseño de las vallas).	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-257-ICCU	25/09/2025	Respuesta comunicado SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-260 (Notificación de incidente por pérdida de banca en el PR4+960, tramo Casa Rosada – Laguna Azul).	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-258-ICCU	25/09/2025	Respuesta comunicado SOFÁN- FOR-CO-03-ICCU031-261 (Notificación pérdida de banca en el tramo vial vereda Chatasuga, Municipio de Choachí, Provincia de Oriente).	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-259-ICCU	25/09/2025	Notificación pérdida de banca en el tramo vial vereda Chatasuga, Municipio de Choachí, Provincia de Oriente- Respuesta oficio- comunicado SOFÁN-FORCO-03-ICCU031-261	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-260-ICCU	25/09/2025	RESPUESTA COMUNICADO SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-265-Respuesta oficio 766-233-	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-261-ICCU	25/09/2025	Respuesta al oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-266-Respuesta oficio 766-234	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-262-ICCU	25/09/2025	Notificación de cambio en la dinámica de las reuniones de inicio	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-263-ICCU	25/09/2025	Respuesta a oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-269-Respuesta Oficio No.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
		766-224-ICCU – Presupuesto Preliminar Ubalá		MORENO ARIAS
766-264-ICCU	26/09/2025	Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-262- Contestación a observaciones Oficio No. 766-202-ICCU – Informe Técnico Mensual No. 5	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-265-ICCU	26/09/2025	RESPUESTA A SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-239 TOPOGRAFÍA GAMA SEGUNDA REVISIÓN	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-266-ICCU	25/09/2025	766-266 Respuesta Oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-270-Radicación Presupuesto Preliminar – Tramo Junín	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-267-ICCU	26/09/2025	Alcance oficio 766-247 APROBACIÓN GIRO 3 Anticipo Contrato de obra ICCU-138-2025	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-268-ICCU	26/09/2025	Reiteración de los parámetros a seguir para la entrega de material proveniente de las actividades de obra a la comunidad.	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-269-ICCU	26/09/2025	Aprobación presupuesto fase de caracterización vial y ensayos según lineamientos de la entidad ICCU-Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-271	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-270-ICCU	29/09/2025	Respuesta Oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-273-Respuesta a Oficio No. 766-220-ICCU – Presupuesto Preliminar Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-271-ICCU	29/09/2025	Viabilidad esquema de Intervención Choachí-Respuesta SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-275	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-272-ICCU	29/09/2025	Notificación Viabilidad esquema de Intervención Choachí-Respuesta SOFAN- FORCO-03-ICCU031-275	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-273-ICCU	29/09/2025	766-273 Observaciones esquema de Intervención Junín-Respuesta Oficio No. 766-245-ICCU	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS

COMUNICACIÓN		ASUNTO	REMITIDO AL	FIRMADO
CONSECUTIVO No.	FECHA			
766-274-ICCU	29/09/2025	Respuesta oficio SOFAN-FOR-CO-03-ICCU031-267-Solicitud de reprogramación de obra	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-275-ICCU	29/09/2025	Requerimientos para inicio de intervenciones en Choachí y Junín-Según Oficio ICCU-S-2025-0006925	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-276-ICCU	30/09/2025	766-276 Respuesta oficio SOFAN- FOR-CO-03-ICCU031-287-Documentos Maquinaria para frente de obra Choachí	CONSORCIO SOFAN C-031	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS
766-277-ICCU	30/09/2025	REMISIÓN DE INFORME SEMANAL NO. 22 y 23 CONTRATO DE INTERVENTORÍA ICCU-219-2025	ICCU	CRISTIAN CAMILO MORENO ARIAS

8.7 Bitácora de obra

Este documento refleja las principales actividades ejecutadas, novedades técnicas, observaciones relevantes, instrucciones impartidas y hechos relevantes ocurridos durante el periodo del **1 al 30 de septiembre**, constituyéndose en una herramienta fundamental para la trazabilidad y verificación del avance físico y administrativo del proyecto. En la siguiente carpeta se presentan las bitácoras de las provincias de Guavio, Oriente, Medina y Soacha en donde se vienen realizando actividades de obra a la fecha. Ver anexo 1.7 Bitácora de obra

8.8 Certificación componente ambiental y social

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

TRANSVERSAL 55A NO. 115A-06
BARRIO ILARCO
TEL: +57(1) 3003053
CEL: +57(1) 301 3369740
BOGOTÁ D.C., COLOMBIA

CERTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE SANCIONES, MULTAS O INCUMPLIMIENTOS COMPONENTES AMBIENTAL Y/O SOCIAL

El Consorcio Intervención AC, en cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales, se permite CERTIFICAR que:

A corte del mes de septiembre del 2025, el Consorcio SOFAN C-031 no se encuentra sancionado ni tiene procesos de incumplimiento o multas en curso relacionados con el Contrato ICCU No. 138 del 2025, en lo que respecta a asuntos ambientales y/o sociales.

Dada a los tres (3) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Atentamente,

Laura Peñuela Botia
Laura Peñuela Botia
Profesional social de Interventoría

Catherine Castellanos
Especialista Ambiental Interventoría

Cristian Camilo Moreno Arias
Firmado digitalmente por Cristian Camilo Moreno Arias
Fecha: 2025.10.16 11:16:38 -05'00'
Cristian Camilo Moreno Arias
Director de la Interventoría de Obra

Firma:



Roberto Carlos López Julio

CONSORCIO INTERVENCIÓN AC

Director de Interventoría Fase III

Anexo: Carpeta con 4 componentes en sus anexos
Preparó: Anderson sierra- Roberto C. López J.
Revisó: Roberto C. López J.
Aprobó: Roberto C. López J.
