Dichos puntos serán seleccionados y acondicionados para garantizar el almacenamiento seguro de PROES, protegiéndolo de agentes externos y cumpliendo con todas las condiciones técnicas requeridas para la preservación de su integridad y calidad. Esta planificación asegura la disponibilidad oportuna del material y minimiza los tiempos de manipulación y transporte dentro del área de intervención.

Ilustración 13. Sustancias Químicas



Fuente: Propia

19.1.5. Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

En cumplimiento con las medidas de control de impactos por infraestructura de obra, se informa lo siguiente:

- El proyecto cuenta con un PMT debidamente estructurado y aprobado para la intervención de las vías vecinales. Este programa se encuentra plenamente implementado en los frentes de obra, garantizando la seguridad de los usuarios de la vía y del personal operativo.
- Se dispone de señalización preventiva, informativa y reglamentaria (conos, paleteros, señales de "Hombres trabajando", entre otras) que se desplaza conforme al avance de la estabilización y la conformación de la vía.

- No se presentan acopios temporales de material de cantera en la franja vial debido a su uso inmediato.

Ilustración 14. Señalización en la zona



Fuente: Propia

19.1.6. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos

Durante el periodo correspondiente al mes de julio de 2026, la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) fue de cero (0). Lo anterior se debe a que, dentro del cronograma de obra ejecutado en este mes, no se realizaron intervenciones ni actividades constructivas en las alcantarillas proyectadas. Al no ejecutarse excavaciones estructurales, demoliciones ni modificaciones en dichas estructuras hidráulicas, no se derivó ningún tipo de material sobrante asociado a este componente.

19.1.7. Procedencia y Localización del Material

No se registra procedencia ni localización de materiales asociados a Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

19.1.8. Gestión y Disposición Final

En el mes de julio de 2026 no se generaron **Residuos de Construcción y Demolición (RCD)** como resultado de las actividades ejecutadas en obra.

19.1.9. Protocolo de Entrega y Donación

Ante la ausencia de un PMARCD específico y siguiendo los lineamientos generales de buenas prácticas ambientales del proyecto, se aplicó el siguiente protocolo:

- El equipo ambiental y técnico realizó una visita previa al predio receptor de para verificar que el sitio de vertido no presentara riesgos de inestabilidad, afectación a cuerpos de agua o áreas de importancia ecológica.
- El transporte de los RCD se realizará con ayuda de la maquinaria amarilla, realizando el traslado directo desde la abscisa a intervenir hasta el predio receptor, evitando el acopio temporal en la vía.
- Una vez descargado el material, se procederá a realizar el extendido y nivelación básica en el área designada, asegurando condiciones de orden y limpieza.
- La actividad se legalizará mediante la suscripción de un Acta de Entrega de Material de Beneficio, firmada por la receptora y el ingeniero ambiental del Consorcio, donde se especifica la voluntariedad de la donación, el volumen entregado y el compromiso de uso adecuado por parte de la beneficiaria.

Tabla 49. Control de RCD Nilo Cundinamarca

AÑO	PERIODO	RCD	CANTIDAD m3
2026	julio	Excavación	0
		Demolición	0
TOTAL			0

19.1.10. Manejo de residuos peligrosos

El manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales y peligrosos (RESPEL) y residuos especiales generados durante la ejecución de la obra es un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento legal del proyecto. La naturaleza de las actividades de construcción y minería inevitablemente produce subproductos que, debido a sus características corrosivas, tóxicas, reactivas o inflamables, representan un riesgo significativo para la salud humana y los ecosistemas si no son gestionados correctamente.

Durante el presente período, las actividades ejecutadas en el tramo a intervenir de este municipio no generaron Residuos Peligrosos (RESPEL). En consecuencia, no

se cuenta con registros ni manifiestos de traslado aplicables para este ciclo de reporte.

19.1.10.1. Manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales

Los residuos sólidos comunes (o convencionales) son aquellos que se producen regularmente en hogares y empresas. Estos se clasifican en varias categorías para su manejo, incluyendo: los que no se pueden aprovechar, los aprovechables, los orgánicos aprovechables y los peligrosos o especiales.

Los residuos no aprovechables se caracterizan por no ser reciclables ni biodegradables. Tardan mucho tiempo en descomponerse naturalmente. Ejemplos de estos son las servilletas, el icopor (poliestireno expandido) y los papeles metalizados.

Tabla 50. Control de residuos sólidos convencionales Nilo

AÑO	PERIODO	RESIDUO	CANTIDAD (KG)
2026	julio	Aprovechables	35
		No Aprovechables	15
TOTAL			50

La Tabla. Control de residuos sólidos convencionales – Nilo presenta el registro de los residuos generados durante el mes de julio de 2026,

19.1.10.2. Acopio temporal de residuos sólidos convencionales generados.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente documento, en cada punto operativo de los municipios involucrados en el proyecto se ha implementado un punto ecológico para el acopio temporal de residuos sólidos convencionales. Estos puntos ecológicos cuentan con recipientes debidamente identificados y señalizados, permitiendo la adecuada separación, almacenamiento y manejo de los residuos generados durante las actividades de obra, garantizando condiciones de orden, higiene y control ambiental, previo a su recolección y disposición final conforme a la normativa vigente.

19.1.10.3. Disposición final de los residuos sólidos convencionales

La disposición final de los residuos sólidos convencionales generados en la obra se gestionará mediante la coordinación directa con la Alcaldía de cada municipio donde se ejecute el proyecto.

Esta coordinación buscará asegurar la entrega de los residuos a los operadores de servicios públicos competentes, quienes serán los encargados de realizar la respectiva disposición final de acuerdo con la normativa y las infraestructuras sanitarias autorizadas por la autoridad local (rellenos sanitarios o plantas de tratamiento)

Ilustración 15. Punto Ecológico



Fuente: Propia

19.1.10.4. Manejo de residuos peligrosos

Los residuos peligrosos o especiales son aquellos residuos que, por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgos a la salud humana y el medio ambiente. Una vez se generen RESPEL se deberán disponer adecuadamente.

Tabla 51. Control de RESPEL Nilo

AÑO	PERIODO	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EN KG	GESTOR DE DISPOSICION FINAL
2026	**julio**	0	0	NA
TOTAL			0	_____

En la Tabla 30, denominada 'Control de RESPEL Nilo', se presenta el consolidado de la generación de residuos peligrosos para el año 2026. Durante los meses de abril, mayo, junio, julio se reporta una generación de 0 kg, lo que indica que en el tramo intervenido no se realizaron actividades que derivaran en excedentes de naturaleza especial o peligrosa. En consecuencia, al no existir materiales para gestionar, no se requirió la contratación de gestores externos de disposición final durante este bimestre.

19.1.10.4.1. Clasificación y acopio de residuos peligrosos

Los residuos generados en la obra se clasifican como peligrosos cuando son de naturaleza química o tóxica, incluyendo productos como disolventes, pinturas, barnices y adhesivos. También se consideran peligrosos los aceites y lubricantes usados provenientes del mantenimiento de maquinaria y equipos.

Los residuos especiales están constituidos por los recipientes o envases que han contenido estas sustancias peligrosas.

VER ANEXO 13. CERTIFICADO DE RESIDUOS NILO

20. PROGRAMA 3 GESTION HIDRICA

El uso eficiente del agua es de vital importancia en la construcción para reducir el impacto ambiental del proyecto y garantizar la disponibilidad de este recurso. Por lo tanto, se deben implementar estrategias que optimicen su consumo y prevengan la contaminación de los cuerpos de agua cercanos.

20.1. Manejo de aguas superficiales

El programa del Manejo de aguas superficiales constituye el pilar de control dentro de la Gestión Hídrica del proyecto, cuyo objetivo primordial es doble: por un lado, prevenir la afectación y sedimentación de los cuerpos de agua naturales adyacentes a la vía mediante la implementación de controles de escorrentía, y por otro, garantizar la legalidad del recurso hídrico utilizado en el proceso constructivo.

Este recurso hídrico se utiliza exclusivamente para:

- El proceso constructivo del suelo en la obra
- El lavado de manos y cara del personal, garantizando la higiene básica en el sitio de trabajo.

Durante el periodo objeto de seguimiento no se requirió el suministro de agua para la ejecución de las actividades de obra, toda vez que las labores desarrolladas en el municipio de Nilo estuvieron enfocadas exclusivamente en el extendido y manejo de material granular, actividades que no demandaron el uso de agua proveniente del acueducto municipal ni la captación de fuentes naturales. En consecuencia, durante este periodo no se realizó suministro de agua mediante carro tanque ni fue necesaria la gestión de certificaciones asociadas a dicho recurso. Esta condición obedeció exclusivamente a las características y alcance de las actividades ejecutadas durante el periodo reportado, manteniéndose el compromiso de gestionar el abastecimiento mediante fuentes legalmente autorizadas en caso de que las actividades posteriores requieran el uso de este recurso.

Tabla 52. Control de recurso hídrico Nilo

AÑO	PERIODO	CANTIDAD EN m3	GESTOR
2026	**julio**	0	NA
TOTAL		0	

20.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

En este municipio no se hará uso de baterías sanitarias portátiles. Se ha determinado que la logística para conseguir un proveedor en la zona de Nilo Cundinamarca que garantice el suministro, el debido servicio de aseo y el mantenimiento de unidades portátiles es compleja. Por lo tanto, se ha optado por una solución de coordinación local:

Para el manejo de las aguas residuales domésticas generadas por el personal de obra durante el mes de julio de 2026, se han implementado las siguientes medidas:

20.2.1. Convenios y Soportes

El Consorcio ha suscrito acuerdos de arrendamiento y uso con propietarios de predios locales para garantizar el bienestar del personal. Durante este periodo, se mantiene vigente el convenio con el señor Anamenta Diaz, ubicado en Nilo Cundinamarca, para el uso de sus instalaciones sanitarias. Los soportes correspondientes.

20.2.2. Capacidad e infraestructura

- Se cuenta con 1 unidad sanitaria fijas para el uso exclusivo del personal administrativo y operativo.
- Las unidades sanitarias están conectadas directamente al sistema séptico del predio. En caso de sistema séptico, se ha verificado que este cuenta con la capacidad adecuada y se realiza el mantenimiento preventivo para evitar reboses o afectaciones al suelo.

20.2.3. Protocolo de Finalización y Paz y Salvo

Conforme a los compromisos establecidos en el PAGA, una vez concluidas las actividades en este frente de obra o al finalizar el contrato de uso, se procederá con el siguiente protocolo de cierre:

- Se realizará una verificación conjunta con el propietario para constatar que las unidades sanitarias se entregan en el mismo estado de funcionamiento y limpieza evidenciado al inicio del convenio.
- Se firmará un acta de cierre y paz y salvo donde el propietario deje constancia de que no existen pagos pendientes, que no hay requerimientos adicionales y que las condiciones del predio son satisfactorias.

VER ANEXO 14. ACTA ALQUILER UNIDAD SANITARIA NILO

Ilustración 16. Unidad sanitaria Nilo



Fuente: Propia

21. PROGRAMA 4 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

El manejo ambiental de la obra se enfoca en la prevención, mitigación y compensación de los impactos generados sobre la fauna, la vegetación y el paisaje en las Provincias de Alto Magdalena, Tequendama y Sumapaz.

21.1. Programa de manejo de descapote y cobertura vegetal

Busca preservar y restaurar la cobertura vegetal del suelo durante cualquier proyecto de construcción retirando la vegetación y tierra superficial de forma controlada para almacenarla y reutilizarla, previniendo así la erosión, la perdida de nutrientes y el deterioro paisajístico.

Durante el presente periodo, se llevó a cabo el retiro de la cobertura vegetal en los costados de la vía para la construcción de las cunetas. Debido a que el volumen de este material de excavación no representa un porcentaje significativo, se procedió a su aprovechamiento mediante labores de paisajismo.

21.2. Protección de la Fauna y Flora

Dada la presencia de especies de Fauna y Flora en la zona de influencia del proyecto, se cuenta con medidas de manejo ambiental con el fin de garantizar la no afectación de los mismos, por lo tanto, entre ellos se contemplan algunas de las siguientes actividades:

21.2.1. Prevención y Sensibilización:

- Identificación de áreas sensibles: Antes de iniciar cualquier actividad, se deben demarcar y señalizar las áreas cercanas a cuerpos de agua, parches de bosque o fragmentos vegetales en caso de que aplique.
- Capacitación: Todo el personal recibe inducción ambiental sobre la identificación de especies clave tanto de fauna y flora y la prohibición absoluta de caza, captura o alimentación.
- Control de Atractantes: Se gestionan los residuos sólidos y líquidos de manera rigurosa para evitar atraer fauna oportunista o depredadores.

21.2.2. Monitoreo:

- Inspección Previa: Se realizan inspecciones visuales diarias antes de cualquier actividad en obra. En caso de presencia de especies de fauna en medio de las actividades se detendrá la ejecución de la obra y se realizaran las medidas pertinentes.

Se informa que durante el presente periodo evaluado no se registraron hallazgos, avistamientos de especies de interés, ni situaciones de afectación biótica que requirieran acciones de manejo específicas. Debido a la ausencia de eventos significativos y de intervenciones en áreas de sensibilidad ecológica durante este mes, no se adjunta registro fotográfico ni descripción de actividades, ya que el estado de protección se mantuvo bajo condiciones normales de operación sin novedades.

22. PROGRAMA 5 MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Es fundamental para concentrar las operaciones logísticas y de personal en puntos específicos, minimizando la huella de impacto sobre el área de influencia directa de la vía. Este proyecto busca establecer un ordenamiento espacial y operativo riguroso, asegurando que el funcionamiento de estas áreas sea ambientalmente responsable mediante la implementación de medidas como la delimitación física, la protección del suelo, el manejo de residuos y la adecuada disposición de aguas residuales. Finalmente, su planificación incluye el desmantelamiento y restauración total de estos sitios temporales una vez concluidas las obras, garantizando que el terreno retorne a condiciones similares a las originales, cumpliendo así con los compromisos ambientales del Contrato ICCU No. 140-2025.

Ilustración 17. Parqueo de maquinaria



Fuente: Propia

22.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopios temporales

Dada la naturaleza de movimiento continuo del frente de obra, no se implementó un campamento base fijo. Se trabaja con un sistema de instalaciones transitorias para

el soporte logístico. Se verificó que los puntos de descanso y áreas de parqueo temporal de la maquinaria cumplieran con las distancias de aislamiento a cuerpos de agua.

22.2. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Un aspecto fundamental de cumplimiento en este periodo fue la gestión de un sitio de parqueo y acopio seguro, logrando una articulación directa con el municipio de Nilo, que facilitó un área previamente asignada para tal fin; esta acción no solo garantiza un lugar fijo para el resguardo de la maquinaria, evitando su dispersión y el riesgo de afectación de áreas circundantes al proyecto; esta área es un parqueadero ubicado en el municipio de Nilo.

En el presente periodo de acuerdo a los tramos de prueba realizados se utilizó un vibro compactador, retroexcavadora, motoniveladora, carro tanque, volquetas y se contaba con un Kit de control de derrames en caso de cualquier novedad ambiental.

Se certifica que la maquinaria presente en el frente de obra cuenta con sus respectivos planes de mantenimiento preventivo al día, garantizando su óptimo estado de funcionamiento. Es importante precisar que dichas actividades de mantenimiento, tanto preventivas como correctivas, se realizan rigurosamente en talleres externos autorizados fuera del área del proyecto; por tal motivo, durante el periodo reportado no se efectuaron intervenciones mecánicas en sitio, evitando así cualquier riesgo de fugas de aceites o lubricantes. En consecuencia, la operación no generó residuos peligrosos (RESPEL) derivados de estas labores, manteniendo la integridad ambiental del área de trabajo. Se anexa el registro fotográfico de los equipos operativos en obra como soporte de cumplimiento.

23. INDICADORES NILO

Los indicadores ambientales son herramientas fundamentales en una obra civil para medir y minimizar el impacto que el proceso constructivo genera sobre el entorno natural.

Tabla 53.Conformación del grupo de gestión ambiental y social.

OBJETIVO	
Definir las acciones y garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía ambiental-PAGA, en el que se definan las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o compensarlos impactos generados por las diferentes actividades constructivas.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

100% profesionales contratados,100% de informes entregados., ≥ 90% indicadores PAGA cumplidos.	$\frac{No\ de\ profesionales\ contratados}{No\ de\ profesionales\ requeridos}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ Requerimientos\ Emitidos}{No\ de\ Requerimientos\ superados}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ informes\ Emitidos}{No\ de\ informes\ requeridos}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ profesionales\ contratados}{No\ de\ profesionales\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{4}{4}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ Requerimientos\ Emitidos}{No\ de\ Requerimientos\ superados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ informes\ Emitidos}{No\ de\ informes\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 54. Capacitación y concienciación del personal de obra.

OBJETIVO	
Garantizar la inducción, capacitación, entrenamiento y actualización de los colaboradores en los temas referentes a los componentes ambiental, flora y fauna y de las medidas de manejo establecidas para prevenir, minimizar y/o corregir los impactos ambientales del proyecto durante su etapa de mantenimiento.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% del personal con inducción ≥ del personal de la obra capacitado,0% de quejas por afectación ambiental.	$\frac{No\ de\ personal\ con\ induccion}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ personal\ capacitadoen\ temas\ ambientales}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100$

$$\text{Nilo} = \frac{No\ de\ personal\ con\ induccion}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100 = \frac{7}{7}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ personal\ capacitado\ en\ temas\ ambientales}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100 = \frac{4}{4}\ x\ 100 = 100\%$$

El indicador de capacitación y concienciación del personal evidencia el cumplimiento de la meta establecida para el periodo, alcanzando un resultado del **100 %**, toda vez

que la totalidad de los trabajadores vinculados al frente de obra recibió la inducción y la capacitación programadas.

Tabla 55. Seguimiento y control de los requerimientos legales

OBJETIVO	
Definir las acciones y contar con los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones por uso e intervención de recursos naturales que requiere el proyecto, Cumplir con la normatividad vigente, en relación con los mecanismos de participación, control social, atención a los derechos de petición y las solicitudes de información.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de permisos obtenidos y aprobados, 100% de normas comunicadas y aplicadas.	$\frac{No\ de\ permisos\ obtenidos}{No\ de\ permisos\ requeridos\ por\ el\ proyecto}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ personal\ capacitado\ de\ normatividad\ ambiental}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ permisos\ obtenidos}{No\ de\ permisos\ requeridos\ por\ el\ proyecto}\ x\ 100 = \frac{1}{1} x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ personal\ capacitado\ de\ normatividad\ ambiental}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100 = \frac{7}{7}\ x\ 100 = 100\%$$

Se requería 1 permiso y se obtuvo 1 permiso. El resultado es del 100%, lo que indica un cumplimiento total de la normativa legal vigente hasta el momento. Este permiso hace parte de la cantera aprobada ya que cuenta con sus documentos al día

Tabla 56. Manejo integral de materiales de construccion

OBJETIVO	
Establecer las medidas y acciones conducentes a la obtención de materiales para la ejecución de obras y definir las acciones para el manejo de materiales en el sitio de las obras y sitios de acopio temporal.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de las medidas establecidas. 0% de requerimientos	$\frac{No\ de\ medidas\ implementadas\ en\ el\ periodo}{No\ de\ medidas\ que\ se\ debia\ ejecutar}\ x\ 100$ $\frac{Cantidad\ de\ material\ utilizados}{Cantidad\ de\ material\ requeridos}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ medidas\ implementadas\ en\ el\ periodo}{No\ de\ medidas\ que\ se\ debia\ ejecutar}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Cantidad\ de\ material\ utilizados}{Cantidad\ de\ material\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{3.097{,}57\ m^3}{3.097{,}57\ m^3}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 57.Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales.

OBJETIVO	
Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
90% de señales requeridas e instaladas, 90% de los frentes de obra señalizados, 90% de acopios protegidos, demarcados y señalizados.	$\frac{No\ de\ señales\ implementadas\ en\ obra}{No\ de\ señales\ establecidas\ en\ el\ PMT}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ frentes\ de\ obras\ señalizados}{No\ total\ de\ frentes\ de\ obra}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ señales\ implementadas\ en\ obra}{No\ de\ señales\ establecidas\ en\ el\ PMT}\ x\ 100 = \frac{10}{10}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ frentes\ de\ obras\ señalizados}{No\ total\ de\ frentes\ de\ obra}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 58. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos

OBJETIVO	
Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte, aprovechamiento y disposición final de los escombros, materiales sobrantes, RCD´s y/o lodos provenientes de las obras de infraestructura vial, de manera que prevenga, minimice y/o controle los impactos que producen sobre el ambiente.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de material de excavación aprovechado y reutilizado en obra, 100% de material de RCD dispuesto en	$\frac{Volumen\ de\ material\ de\ Excavacion}{Volumen\ de\ material\ reutilizados\ y\ aprovechado}\ x\ 100$ $\frac{Volumen\ de\ material\ de\ RCD\ generado\ en\ el\ Proyecto}{Volumen\ de\ material\ dispuesto\ en\ sitio\ autorizado}\ x\ 100$

escombreras autorizadas.	

$$\frac{Volumen\ de\ material\ de\ Excavacion}{Volumen\ de\ material\ reutilizados\ y\ aprovechado}\ x\ 100 = \frac{0\ m^3}{0\ m^3}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Volumen\ de\ material\ de\ RCD\ generado\ en\ el\ Proyecto}{Volumen\ de\ material\ dispuesto\ en\ sitio\ autorizado}\ x\ 100 = \frac{0m^3}{0\ m^3}\ x\ 100 = 100\ \%$$

Durante el periodo evaluado se realizaron actividades de excavación, lo cual refleja un cumplimiento del 100 % del indicador establecido.

Tabla 59. Manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales

OBJETIVO	
Manejar y disponer adecuadamente los residuos sólidos que se generan durante las actividades de construcción, adecuación y/o reparación del proyecto, Aplicar los lineamientos de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de los residuos aprovechables y no aprovechables gestionados adecuadamente	$\frac{Kg\ de\ residuos\ peligoros\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ peligrosos\ generados}\ x\ 100$ $\frac{Kg\ de\ residuos\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ aprovechables\ generados}\ x\ 100$ $\frac{Kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ generados}\ x\ 100$ $\frac{Puntos\ ecologicos\ instalados}{Puntos\ Ecologicos\ Programados}\ x\ 100$

$$\frac{Kg\ de\ residuos\ peligrosos\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ peligros\ generados}\ x\ 100 = \frac{0\ kg}{0\ kg}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Kg\ de\ residuos\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ aprovechables\ generados}\ x\ 100 = \frac{35\ kg}{35\ kg}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ generados}\ x\ 100 = \frac{15\ kg}{15\ kg}\ x\ 100 = 100\%$$

$$Nilo = \frac{Puntos\ ecologicos\ instalados}{Puntos\ Ecologicos\ Programados}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100$$

Se reporta la generación de residuos sólidos, el municipio de Nilo aportó 50 kg. Donde se generó 35 kg aprovechables y 15 kg no aprovechables, por lo tanto, el indicador es de un 100% de cumplimiento.

Finalmente, como parte de la adecuación logística de la obra, se instaló un (1) punto ecológico. Este avance, alineado con el cronograma del Plan de Gestión Integral de Residuos, permite centralizar la segregación en la fuente y optimizar el manejo de los materiales generados en el proyecto.

Tabla 60. Manejo de aguas superficiales

OBJETIVO	
Definir las medidas para cumplir con las normas legales vigentes para la captación, transporte y uso del agua, de tal manera que prevenga, minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de volumen de agua utilizado en obra debidamente cuantificado.	$\frac{Volumen\ de\ agua\ usado}{Volumen\ de\ actas\ de\ suministro\ o\ compras}\ x\ 100$

$$\frac{Volumen\ de\ agua\ usado}{Volumen\ de\ actas\ de\ suministro\ o\ compras}\ x\ 100 = \frac{0\ m^3}{0\ m^3}\ x\ 100\ \%$$

Tabla 61. Seguimiento y control al manejo de residuos líquidos

OBJETIVO	
Establecer medidas que para controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres requeridos para ejecución de los proyectos.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de instalación de USP en los frentes de obra, Por cada 15 trabajadores en obra se debe contar con 1 USP	$\frac{Baños\ alquilados}{Baños\ requeridos}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ derrames\ generados}{No\ de\ derrames\ controlados}\ x\ 100$

$$\frac{Baños\ alquilados}{Baños\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ derrames\ generados}{No\ de\ derrames\ controlados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Se alcanzó un 100% de cumplimiento en el indicador de prevención de vertimientos gracias a la concertación efectiva con los ciudadanos Anamenta (Nilo). Mediante estos acuerdos, se garantizó el manejo adecuado de aguas residuales en la zona de influencia, cumpliendo con los objetivos de protección del recurso hídrico.

Tabla 62. Manejo de descapote y cobertura vegetal.

OBJETIVO	
Establecer las acciones para el manejo de la vegetación que será intervenida y/o afectada por las obras del proyecto, de manera que se prevengan, minimicen y controlen los impactos producidos sobre la vegetación.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
0% de cobertura vegetal afectada	$\frac{No\ de\ acciones\ adelantadas}{No\ de\ acciones\ a\ ejecutar}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ acciones\ adelantadas}{No\ de\ acciones\ a\ ejecutar}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

Se ejecutó 1 acción de manejo de las 1 programada. El resultado es del 100%, lo cual indica que las medidas para proteger la vegetación se cumplieron según lo planeado.

Tabla 63.Protección de la Fauna en vías

OBJETIVO	
Prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos sobre la fauna silvestre, especialmente aquellas especies con algún grado de amenaza (CR, EN, VU) identificadas en las áreas de influencia del proyecto, y promover su conservación	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
0% de fauna afectada	$\frac{No\ de\ capacitaciones\ ejecutadas\ sobre\ fauna}{No\ de\ capacitaciones\ programadas\ sobre\ fauna}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ fauna\ evidenciada}{No\ de\ fauna\ reportada}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ capacitaciones\ ejecutadas\ sobre\ fauna}{No\ de\ capacitaciones\ programadas\ sobre\ fauna}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ fauna\ evidenciada}{No\ de\ fauna\ reportada}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Durante el período evaluado, la gestión ambiental del proyecto demostró un desempeño óptimo en materia de conservación de los recursos bióticos, alcanzando un 100% de cumplimiento en los indicadores de fauna analizados.

Tabla 64. Instalación funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopios temporales

OBJETIVO	
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de las zonas de acopios autorizadas 100% de áreas recuperadas 0% de requerimientos	$\frac{No\ Acopios\ utilizados}{No\ de\ acopios\ con\ autorizacion}\ x\ 100$ $\frac{m^2\ de\ zonas\ recuperadas}{m^2\ de\ areas}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ campamentos\ instalados}{No\ de\ campamentos\ requeridos}\ x\ 100$

$$\frac{No\ Acopios\ utilizados}{No\ de\ acopios\ con\ autorizacion}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{m^2\ de\ zonas\ recuperadas}{m^2\ de\ areas}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ campamentos\ instalados}{No\ de\ campamentos\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

En lo referente al manejo del suelo y la infraestructura operativa del proyecto, los indicadores evaluados registraron un 100% de cumplimiento institucional, reflejando la ausencia de nuevas intervenciones temporales durante el periodo. Por una parte, el indicador de acopios cerró en un escenario de total conformidad (100%), debido a que no se requirió la habilitación ni el uso de zonas de acopio dinámicas en los frentes de obra. Asimismo, al no registrarse la apertura de nuevos frentes que demandaran la entrega o abandono de terrenos, las variables de metros cuadrados de zonas recuperadas frente a áreas intervenidas se mantuvieron en cero, consolidando una efectividad del 100% en el control superficial. Finalmente, el indicador de campamentos operó bajo la misma dinámica de estabilidad (100%), toda vez que no se contempló la instalación de campamentos adicionales a la infraestructura logística ya establecida, garantizando un estricto control territorial y de planeación ambiental en el desarrollo de las actividades.

Tabla 65. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

OBJETIVO	
Definir las acciones a ejecutar para manejar los impactos generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos y cumplir con la legislación nacional vigente.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% vehículos con certificado de revisión técnico mecánica vigente, 0% de accidentes de maquinaria y equipos.	$\frac{No\ de\ vehiculos\ con\ revision\ tecnomecanica}{No\ de\ vehiculos\ trabajando\ en\ obra}\ x\ 100$ $\frac{No\ \ de\ derrames\ de\ combustibles\ ocurridos}{No\ de\ derrames\ de\ combustibles\ controlados}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ vehiculos\ con\ revision\ tecnomecanica}{No\ de\ vehiculos\ trabajando\ en\ obra}\ x\ 100 = \frac{6}{6}\ x\ 100 = 100\ \%$$

$$\frac{No\ \ de\ derrames\ de\ combustibles\ ocurridos}{No\ de\ derrames\ de\ combustibles\ controlados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

En lo concerniente al control operacional de maquinaria y prevención de la contaminación, las variables analizadas consolidaron un 100% de efectividad y cumplimiento normativo en el periodo.

CAPITULO 4 JERUSALEN

24. ACTIVIDADES DE OBRA JERUSALEN

Durante el período objeto del presente informe se logró la **estabilización de 2720 metros lineales de vía**, mediante la ejecución de las actividades contempladas en el alcance contractual, las cuales incluyeron la conformación de la superficie, el suministro, extendido, nivelación y compactación de los materiales requeridos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y los estándares de calidad establecidos para este tipo de intervención. Estas labores permitieron mejorar significativamente la capacidad estructural de la vía, incrementando su estabilidad y resistencia frente a las cargas del tránsito y a las condiciones climáticas de la zona. Asimismo, la intervención contribuye a optimizar las condiciones de movilidad, mejorar la seguridad vial, reducir los costos de operación y mantenimiento de los vehículos, facilitar el acceso de las comunidades rurales y fortalecer la conectividad del municipio, generando beneficios para el desarrollo económico y social de la región.

25. PROGRAMA 1 GESTION DEL PROYECTO

25.1. Reunión del grupo de gestión ambiental y social en Jerusalén

El objetivo de esta reunión fue alinear al equipo responsable en la ejecución de las medidas estipuladas en el PAGA V6.2. Se socializaron las obligaciones ambientales y técnicas necesarias para gestionar correctamente los impactos del proyecto, asegurando el estricto cumplimiento de la normativa ambiental.

Durante el mes de julio de 2026, de manera simultánea a la ejecución de los tramos, se reunió el Grupo de Gestión Ambiental del proyecto en el municipio de Jerusalen Cundinamarca. Este equipo quedó integrado por profesionales de las áreas ambiental, civil, social y sst, con el objetivo de garantizar un seguimiento interdisciplinario a los impactos generados durante esta fase inicial de la obra.

VER ANEXO 15. Reunión del grupo de gestión ambiental y social Jerusalén

25.2. Capacitación y concienciación para el personal de obra

Teniendo en cuenta el plan de adaptación del guía ambiental aprobado, el especialista ambiental se encargará de impartir charlas y capacitaciones al inicio de todos los trabajos sobre temas relacionados con gestión ambiental de acuerdo a lo establecido en el cronograma de capacitaciones de obra. Entre los temas ambientales para las capacitaciones se contempla:

- Inducción ambiental inicial
- Manejo adecuado de residuos de obra
- Uso eficiente del agua
- Control de polvos y partículas
- Prevención de derrames de sustancias peligrosas
- Cuidado de fauna y flora

Dichos temas están sujetos a modificaciones de acuerdo a la necesidad y tiempos del proyecto.

Tabla 66. Charlas y capacitaciones ambientales Jerusalén

MUNICIPIO	TIPO	FECHA	TEMA
PANDI	CHARLAS	14/7/2026	Inducción Ambiental A & SST
	CAPACITACIONES	15/7/2026	Proveedores y disposición final
		16/7/2026	Cuidado y protección de la fauna y la flora de la zona

Durante el periodo cubierto por el presente informe, se llevaron a cabo un total de una (1) charla y dos (2) capacitaciones en el municipio de Jerusalén cuyo detalle se encuentra especificado en la tabla adjunta.

Ilustración 18. Capacitaciones y charlas ambientales



Fuente: Propia

VER ANEXO 16. CAPACITACIONES Y CHARLAS AMBIENTALES JERUSALEN

25.3. Cumplimiento de requerimientos legales

El programa Cumplimiento de Requerimientos Legales (identificado como DAGA-1.3-03 en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA) constituye el pilar fundamental que asegura la legalidad de todas las actividades constructivas y operativas del proyecto.

Este apartado tiene como objetivo central garantizar la conformidad total del Contrato ICCU No. 140-2025 con las leyes, decretos, resoluciones, licencias, y demás instrumentos de gestión ambiental.

25.3.1. Documentación (permisos ambientales y mineros)

Para lograr los objetivos propuestos se requiere que Consorcio VICGER conozca los requisitos legales y contractuales establecidos para el contrato de obra ICCU-140 DE 2025, se relacionaran a los permisos aplicables de nuestros proveedores.

Tabla 67. Documentación proveedores

TIPO DE MATERIAL	UBICACIÓN	CANTERA	REGISTRO MINERO	LICENCIA AMBIENTAL	VIGENCIA	AÑO DE ADJUDICACION
Arenas y Gravas de Río	Municipio de Jerusalén Cundinamarca	AGREGADOS G7 S.A.S. – Título Minero **JAH-14171**	**JAH-14171** (vigente en el Registro Minero Nacional)	**Resolución CAR No. 2290 del 28 de noviembre de 2013**, mediante la cual se otorga la Licencia	**Vigente**, según certificación RUCOM expedida el 8 de marzo de 2023.	**2009**, correspondiente al Contrato de Concesión Minera No. JAH-14171 (expediente minero).

La fuente de materiales corresponde al título minero **JAH-14171**, cuyo titular es **AGREGADOS G7 S.A.S.**, ubicado en el municipio de Jerusalén, departamento de

Cundinamarca. Este título autoriza la exploración y explotación de un yacimiento de **arenas y gravas de río**, materiales aptos para su utilización en proyectos de infraestructura vial y obras civiles. De acuerdo con la información verificada, el título se encuentra **vigente e inscrito en el Registro Minero Nacional**, cuenta con el correspondiente **instrumento ambiental aprobado**, otorgado mediante la **Resolución CAR No. 2290 del 28 de noviembre de 2013**, y cumple con los requisitos establecidos por la normativa minera y ambiental vigente. Asimismo, la certificación expedida por el **Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM)** confirma que el titular se encuentra habilitado para desarrollar actividades de explotación y comercialización de los materiales, garantizando la legalidad de su procedencia. Finalmente, el contrato de concesión minera fue adjudicado en el **año 2009**, lo que evidencia que la fuente de materiales cuenta con el respaldo jurídico, minero y ambiental requerido para el suministro de agregados destinados a proyectos de obra pública.

26. PROGRAMA 2 MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

El programa Manejo integral de materiales de construcción (DAGA-2.1-01), enmarcado en el Programa de Manejo de Actividades Constructivas, es crucial para garantizar que el Contrato ICCU No. 140-2025 se ejecute bajo principios de sostenibilidad y legalidad; su objetivo primordial es asegurar la trazabilidad y eficiencia de todos los insumos, desde los agregados hasta los estabilizantes químicos no tradicionales, certificando que provengan de fuentes legales autorizadas y minimizando los impactos ambientales asociados a su almacenamiento, transporte y uso. La gestión rigurosa de este programa es fundamental para prevenir la contaminación del suelo y aire (por polvo, dispersión de material y/o derrames), optimizar el consumo de recursos y, en última instancia, avalar la calidad de la obra vial con un mínimo impacto ambiental.

Tabla 68. Cantidad de materiales Jerusalen

FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD (m3)	MATERIAL	Placa volqueta	Proveedor
31/7/2026	14	AFIRMADO	SOR538	AGREGADOS G7 S.A.S.
31/7/2026	21	ARENA	SOR538	AGREGADOS G7 S.A.S.
31/7/2026	28	GRAVILLA	SOR538	AGREGADOS G7 S.A.S.
TOTAL	63	___	____	___

VER ANEXO 17. CERTIFICADO DE MATERIAL JERUSALEN

26.1. Manejo integral de materiales de construcción

En cumplimiento con las medidas establecidas en el PAGA para el Contrato ICCU-140, se describen las acciones implementadas para el manejo de materiales:

26.1.1. Suministro y Transporte

- El material pétreo y de cantera proviene exclusivamente de fuentes con licencia ambiental vigente.
- Los vehículos de transporte cuentan con carpas debidamente aseguradas para evitar la dispersión de material particulado en el trayecto hacia los frentes de obra.
- Se verifica que la maquinaria y volquetas cuenten con revisiones técnico-mecánicas al día para prevenir derrames de hidrocarburos sobre la vía.

26.1.2. Acopio y Almacenamiento

- De acuerdo con la planificación operativa, el material granular recibido se extiende de forma inmediata sobre el corredor vial para su posterior conformación y estabilización.
- Dado que el material no permanece almacenado en zonas de reserva, no se requiere la implementación de medidas para el control de escorrentía o protección de taludes en puntos de acopio, mitigando así cualquier impacto visual o alteración del suelo adyacente.

26.1.3. Manejo de sustancias químicas

En la obra, se utilizó la siguiente sustancia química en los tramos estabilizados en el municipio de Jerusalén, la cual será previamente rotulada conforme a los requisitos del **Sistema Globalmente Armonizado (SGA)**. Y contara con el manejo adecuado de acuerdo a lo establecido en el PAGA.

Tabla 69. Tabla de sustancias químicas Tibacuy

No	SUSTANCIA	TIPO/ USO PRINCIPAL	FICHA DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES O PELIGROS
1	PROES	Construcción y rehabilitación de la malla vial como caminos mineros y petroleros, vías	SI	Nocivo en caso de ingestión (H302), contacto con la piel

No	SUSTANCIA	TIPO/ USO PRINCIPAL	FICHA DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES O PELIGROS
		industriales, vías urbanas y residenciales, plataformas industriales y logística, vías y concesiones de alto tráfico, vías rurales 2 y 3 orden.		(H312) e inhalación (H332)
2	ACPM	Combustible de destilación pesada. Se usa principalmente en maquinaria amarilla, volquetas y generadores eléctricos debido a su alto torque y eficiencia térmica.	ONU: 1202. Clase 3 (Líquido Inflamable). Punto de inflamación: 52°C. Es menos volátil que la gasolina, pero persistente en el ambiente.	Salud: Irritación cutánea por contacto prolongado. Ambiente: Altamente contaminante para suelos y fuentes hídricas (biodegradación lenta).
4	Gasolina	Combustible de destilación liviana. Se utiliza en vehículos livianos, motobombas, herramientas menores (cortadoras) y como solvente en limpiezas específicas.	ONU: 1203. Clase 3 (Líquido Inflamable). Punto de inflamación: $-43°C. Extremadamente volátil; genera vapores inflamables a temperatura ambiente.	Su alto octanaje la hace ideal para motores de alta revolución. No debe mezclarse con otros solventes ni usarse para "encender" fogatas por su riesgo de explosión súbita. Explosión: Riesgo extremo de incendio por chispas o estática. Salud: La inhalación de vapores puede causar mareos o pérdida del conocimiento.

26.1.4. Lugar de acopio de sustancias químicas

Dada la naturaleza móvil y progresiva de la obra, la gestión logística y el almacenamiento del material PROES se ejecutarán bajo un esquema de acopio temporal y dinámico. Se garantiza que, a partir del inicio de la ejecución de la obra (fase de construcción), se establecerán inmediatamente puntos de acopio provisionales en localizaciones estratégicas a lo largo del trayecto.

Dichos puntos serán seleccionados y acondicionados para garantizar el almacenamiento seguro de PROES, protegiéndolo de agentes externos y cumpliendo con todas las condiciones técnicas requeridas para la preservación de su integridad y calidad. Esta planificación asegura la disponibilidad oportuna del material y minimiza los tiempos de manipulación y transporte dentro del área de intervención.

Ilustración 19. Sustancias quimicas



Fuente: Propia

26.1.5. Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

En cumplimiento con las medidas de control de impactos por infraestructura de obra, se informa lo siguiente:

- El proyecto cuenta con un PMT debidamente estructurado y aprobado para la intervención de las vías vecinales. Este programa se encuentra plenamente implementado en los frentes de obra, garantizando la seguridad de los usuarios de la vía y del personal operativo.
- Se dispone de señalización preventiva, informativa y reglamentaria (conos, paleteros, señales de "Hombres trabajando", entre otras) que se desplaza conforme al avance de la estabilización y la conformación de la vía.

- Como se mencionó en el numeral 6.1, no se presentan acopios temporales de material de cantera en la franja vial debido a su uso inmediato.

Ilustración 20. SEÑALIZACION EN LA ZONA



Fuente: Propia

26.1.6. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos

Durante el periodo correspondiente al mes de julio de 2026, la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) fue de cero (0). Lo anterior se debe a que, dentro del cronograma de obra ejecutado en este mes, no se realizaron intervenciones ni actividades constructivas en las alcantarillas proyectadas. Al no ejecutarse excavaciones estructurales, demoliciones ni modificaciones en dichas estructuras hidráulicas, no se derivó ningún tipo de material sobrante asociado a este componente.

26.1.7. Procedencia y Localización del Material

No se registra procedencia ni localización de materiales asociados a Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

26.1.8. Gestión y Disposición Final

En consonancia con la nula generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) durante el mes de julio de 2026, no se ejecutaron actividades de gestión, transporte, aprovechamiento ni disposición final de este tipo de materiales.

26.1.9. Protocolo de Entrega y Donación

Ante la ausencia de un PMARCD específico y siguiendo los lineamientos generales de buenas prácticas ambientales del proyecto, se aplicó el siguiente protocolo:

- El equipo ambiental y técnico realizó una visita previa al predio receptor de para verificar que el sitio de vertido no presentara riesgos de inestabilidad, afectación a cuerpos de agua o áreas de importancia ecológica.
- El transporte de los RCD se realizará con ayuda de la maquinaria amarilla, realizando el traslado directo desde la abscisa a intervenir hasta el predio receptor, evitando el acopio temporal en la vía.
- Una vez descargado el material, se procederá a realizar el extendido y nivelación básica en el área designada, asegurando condiciones de orden y limpieza.
- La actividad se legalizará mediante la suscripción de un Acta de Entrega de Material de Beneficio, firmada por la receptora y el ingeniero ambiental del Consorcio, donde se especifica la voluntariedad de la donación, el volumen entregado y el compromiso de uso adecuado por parte de la beneficiaria.

Tabla 70. Control de RCD Jerusalén

AÑO	PERIODO	RCD	CANTIDAD m3
2026	julio	Excavación	0
		Demolición	0
TOTAL			0

26.1.10. Manejo de residuos peligrosos

El manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales y peligrosos (RESPEL) y residuos especiales generados durante la ejecución de la obra es un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento legal del proyecto. La naturaleza de las actividades de construcción y minería inevitablemente produce subproductos que, debido a sus características corrosivas, tóxicas, reactivas o inflamables, representan un riesgo significativo para la salud humana y los ecosistemas si no son gestionados correctamente.

Durante el presente período, las actividades ejecutadas en el tramo a intervenir de este municipio no generaron Residuos Peligrosos (RESPEL). En consecuencia, no se cuenta con registros ni manifiestos de traslado aplicables para este ciclo de reporte.

26.1.10.1. Manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales

Los residuos sólidos comunes (o convencionales) son aquellos que se producen regularmente en hogares y empresas. Estos se clasifican en varias categorías para su manejo, incluyendo: los que no se pueden aprovechar, los aprovechables, los orgánicos aprovechables y los peligrosos o especiales.

Los residuos no aprovechables se caracterizan por no ser reciclables ni biodegradables. Tardan mucho tiempo en descomponerse naturalmente. Ejemplos de estos son las servilletas, el icopor (poliestireno expandido) y los papeles metalizados.

Tabla 71. Control de residuos sólidos convencionales Jerusalén

AÑO	PERIODO	RESIDUO	CANTIDAD (KG)
2026	julio	Aprovechables	22
		No Aprovechables	8
TOTAL			30

Presenta el registro del control de residuos sólidos convencionales generado en el punto Jerusalén durante el año 2026, detallando los datos correspondientes al mes de julio.

26.1.10.2. Acopio temporal de residuos sólidos convencionales generados.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente documento, en cada punto operativo de los municipios involucrados en el proyecto se ha implementado un punto ecológico para el acopio temporal de residuos sólidos convencionales. Estos puntos ecológicos cuentan con recipientes debidamente identificados y señalizados, permitiendo la adecuada separación, almacenamiento y manejo de los residuos generados durante las actividades de obra, garantizando condiciones de orden, higiene y control ambiental, previo a su recolección y disposición final conforme a la normativa vigente.

26.1.10.3. Disposición final de los residuos sólidos convencionales

La disposición final de los residuos sólidos convencionales generados en la obra se gestionará mediante la coordinación directa con la Alcaldía de cada municipio donde se ejecute el proyecto.

Esta coordinación buscará asegurar la entrega de los residuos a los operadores de servicios públicos competentes, quienes serán los encargados de realizar la respectiva disposición final de acuerdo con la normativa y las infraestructuras sanitarias autorizadas por la autoridad local (rellenos sanitarios o plantas de tratamiento)

Ilustración 21. Punto ecológico



Fuente: Propia

26.1.10.4.Manejo de residuos peligrosos

Los residuos peligrosos o especiales son aquellos residuos que, por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgos a la salud humana y el medio ambiente. Una vez se generen RESPEL se deberán disponer adecuadamente.

Tabla 72. Control de RESPEL Jerusalen

AÑO	PERIODO	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EN KG	GESTOR DE DISPOSICION FINAL
2026	**junio**	0	0	NA
	julio	0	0	NA
TOTAL			_____	_____

Se presenta el consolidado de la generación de residuos peligrosos para el año 2026. Durante el mes de julio se reporta una generación de 0 kg, lo que indica que en el tramo intervenido no se realizaron actividades que derivaran en excedentes de

naturaleza especial o peligrosa. En consecuencia, al no existir materiales para gestionar, no se requirió la contratación de gestores externos de disposición final durante este bimestre.

26.1.10.4.1. Clasificación y acopio de residuos peligrosos

Los residuos generados en la obra se clasifican como peligrosos cuando son de naturaleza química o tóxica, incluyendo productos como disolventes, pinturas, barnices y adhesivos. También se consideran peligrosos los aceites y lubricantes usados provenientes del mantenimiento de maquinaria y equipos.

Los residuos especiales están constituidos por los recipientes o envases que han contenido estas sustancias peligrosas.

VER ANEXO 18. CERTIFICADO DE RESIDUOS JERUSALEN

27. PROGRAMA 3 GESTION HIDRICA

El uso eficiente del agua es de vital importancia en la construcción para reducir el impacto ambiental del proyecto y garantizar la disponibilidad de este recurso. Por lo tanto, se deben implementar estrategias que optimicen su consumo y prevengan la contaminación de los cuerpos de agua cercanos.

27.1. Manejo de aguas superficiales

El programa del Manejo de aguas superficiales constituye el pilar de control dentro de la Gestión Hídrica del proyecto, cuyo objetivo primordial es doble: por un lado, prevenir la afectación y sedimentación de los cuerpos de agua naturales adyacentes a la vía mediante la implementación de controles de escorrentía, y por otro, garantizar la legalidad del recurso hídrico utilizado en el proceso constructivo.

En este sentido, un punto crucial de cumplimiento en el período fue la formalización del suministro de agua para las actividades de obra, la cual fue gestionada exitosamente con la Alcaldía del municipio de Jerusalén, entidad que facilitó el volumen de agua con su respectiva certificación de calidad, lo que asegura que el recurso utilizado es totalmente legal, controlado y no depende de la captación directa no autorizada de fuentes naturales, mitigando así el riesgo ambiental y normativo.

El agua para la obra es suministrada por parte del acueducto del municipio de Jerusalén mediante un carro tanque. Es importante destacar que, aunque el agua suministrada es potable, no está destinada para consumo humano.

Este recurso hídrico se utiliza exclusivamente para:

- El proceso constructivo del suelo en la obra
- El lavado de manos y cara del personal, garantizando la higiene básica en el sitio de trabajo.

Tabla 73. Control de recurso hídrico Jerusalén

AÑO	PERIODO	CANTIDAD EN m3	GESTOR
2026	**junio**	0	NA
	julio	26	ALCALDIA MUNICIPAL DE JERUSALEN
TOTAL		26	

27.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

En este municipio no se hará uso de baterías sanitarias portátiles. Se ha determinado que la logística para conseguir un proveedor en la zona de Jerusalén que garantice el suministro, el debido servicio de aseo y el mantenimiento de unidades portátiles es compleja. Por lo tanto, se ha optado por una solución de coordinación local:

Para el manejo de las aguas residuales domésticas generadas por el personal de obra durante el mes de julio de 2026, se han implementado las siguientes medidas:

27.2.1. Convenios y Soportes

El Consorcio ha suscrito acuerdos de arrendamiento y uso con propietarios de predios locales para garantizar el bienestar del personal. Durante este periodo, se mantiene vigente el convenio con el señor Mauricia Rodríguez, ubicado en Jerusalén Cundinamarca, para el uso de sus instalaciones sanitarias. Los soportes correspondientes.

27.2.2. Capacidad e infraestructura

- Se cuenta con 1 unidad sanitaria fijas para el uso exclusivo del personal administrativo y operativo.
- Las unidades sanitarias están conectadas directamente al sistema séptico del predio. En caso de sistema séptico, se ha verificado que este cuenta con la capacidad adecuada y se realiza el mantenimiento preventivo para evitar reboses o afectaciones al suelo.

27.2.3. Protocolo de Finalización y Paz y Salvo

Conforme a los compromisos establecidos en el PAGA, una vez concluidas las actividades en este frente de obra o al finalizar el contrato de uso, se procederá con el siguiente protocolo de cierre:

- Se realizará una verificación conjunta con el propietario para constatar que las unidades sanitarias se entregan en el mismo estado de funcionamiento y limpieza evidenciado al inicio del convenio.
- Se firmará un acta de cierre y paz y salvo donde el propietario deje constancia de que no existen pagos pendientes, que no hay requerimientos adicionales y que las condiciones del predio son satisfactorias.

VER ANEXO 19. CERTIFICADO AGUA, ALQUILER DE BAÑOS JERUSALEN

Ilustración 22. Unidad sanitaria



Fuente: Propia

28. PROGRAMA 4 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

El manejo ambiental de la obra se enfoca en la prevención, mitigación y compensación de los impactos generados sobre la fauna, la vegetación y el paisaje en las Provincias de Alto Magdalena, Tequendama y Sumapaz.

28.1. Programa de manejo de descapote y cobertura vegetal

Busca preservar y restaurar la cobertura vegetal del suelo durante cualquier proyecto de construcción retirando la vegetación y tierra superficial de forma controlada para

almacenarla y reutilizarla, previniendo así la erosión, la perdida de nutrientes y el deterioro paisajístico.

Durante el presente periodo, se llevó a cabo el retiro de la cobertura vegetal en los costados de la vía para la construcción de las cunetas. Debido a que el volumen de este material de excavación no representa un porcentaje significativo, se procedió a su aprovechamiento mediante labores de paisajismo.

28.2. Protección de la Fauna y Flora

Dada la presencia de especies de Fauna y Flora en la zona de influencia del proyecto, se cuenta con medidas de manejo ambiental con el fin de garantizar la no afectación de los mismos, por lo tanto, entre ellos se contemplan algunas de las siguientes actividades:

28.2.1. Prevención y Sensibilización:

- Identificación de áreas sensibles: Antes de iniciar cualquier actividad, se deben demarcar y señalizar las áreas cercanas a cuerpos de agua, parches de bosque o fragmentos vegetales en caso de que aplique.
- Capacitación: Todo el personal recibe inducción ambiental sobre la identificación de especies clave tanto de fauna y flora y la prohibición absoluta de caza, captura o alimentación.
- Control de Atractantes: Se gestionan los residuos sólidos y líquidos de manera rigurosa para evitar atraer fauna oportunista o depredadores.

28.2.2. Monitoreo:

- Inspección Previa: Se realizan inspecciones visuales diarias antes de cualquier actividad en obra. En caso de presencia de especies de fauna en medio de las actividades se detendrá la ejecución de la obra y se realizaran las medidas pertinentes.

Se informa que durante el presente periodo evaluado no se registraron hallazgos, avistamientos de especies de interés, ni situaciones de afectación biótica que requirieran acciones de manejo específicas. Debido a la ausencia de eventos significativos y de intervenciones en áreas de sensibilidad ecológica durante este mes, no se adjunta registro fotográfico ni descripción de actividades, ya que el estado de protección se mantuvo bajo condiciones normales de operación sin novedades.

29. PROGRAMA 5 MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Es fundamental para concentrar las operaciones logísticas y de personal en puntos específicos, minimizando la huella de impacto sobre el área de influencia directa de la vía. Este proyecto busca establecer un ordenamiento espacial y operativo riguroso, asegurando que el funcionamiento de estas áreas sea ambientalmente responsable mediante la implementación de medidas como la delimitación física, la protección del suelo, el manejo de residuos y la adecuada disposición de aguas residuales. Finalmente, su planificación incluye el desmantelamiento y restauración total de estos sitios temporales una vez concluidas las obras, garantizando que el terreno retorne a condiciones similares a las originales, cumpliendo así con los compromisos ambientales del Contrato ICCU No. 140-2025.

Ilustración 23. Parqueo de maquinaria



Fuente: Propia

29.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopios temporales

Dada la naturaleza de movimiento continuo del frente de obra, no se implementó un campamento base fijo. Se trabaja con un sistema de instalaciones transitorias para el soporte logístico. Se verificó que los puntos de descanso y áreas de parqueo temporal de la maquinaria cumplieran con las distancias de aislamiento a cuerpos de agua.

29.2. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Un aspecto fundamental de cumplimiento en este periodo fue la gestión de un sitio de parqueo y acopio seguro, logrando una articulación directa con el municipio de Tibacuy, que facilitó un área previamente asignada para tal fin; esta acción no solo garantiza un lugar fijo para el resguardo de la maquinaria, evitando su dispersión y el riesgo de afectación de áreas circundantes al proyecto; esta área es un parqueadero ubicado en el municipio de Jerusalén.

En el presente periodo de acuerdo a los tramos de prueba realizados se utilizó un vibro compactador, retroexcavadora, motoniveladora, carro tanque, volquetas y se contaba con un Kit de control de derrames en caso de cualquier novedad ambiental.

Se certifica que la maquinaria presente en el frente de obra cuenta con sus respectivos planes de mantenimiento preventivo al día, garantizando su óptimo estado de funcionamiento. Es importante precisar que dichas actividades de mantenimiento, tanto preventivas como correctivas, se realizan rigurosamente en talleres externos autorizados fuera del área del proyecto; por tal motivo, durante el periodo reportado no se efectuaron intervenciones mecánicas en sitio, evitando así cualquier riesgo de fugas de aceites o lubricantes. En consecuencia, la operación no generó residuos peligrosos (RESPEL) derivados de estas labores, manteniendo la integridad ambiental del área de trabajo. Se anexa el registro fotográfico de los equipos operativos en obra como soporte de cumplimiento.

30. INDICADORES JERUSALEN

Los indicadores ambientales son herramientas fundamentales en una obra civil para medir y minimizar el impacto que el proceso constructivo genera sobre el entorno natural.

Tabla 74.Conformación del grupo de gestión ambiental y social.

OBJETIVO	
Definir las acciones y garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía ambiental-PAGA, en el que se definan las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o compensarlos impactos generados por las diferentes actividades constructivas.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

100% profesionales contratados,100% de informes entregados., ≥ 90% indicadores PAGA cumplidos.	$\frac{No\ de\ profesionales\ contratados}{No\ de\ profesionales\ requeridos}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ Requerimientos\ Emitidos}{No\ de\ Requerimientos\ superados}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ informes\ Emitidos}{No\ de\ informes\ requeridos}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ profesionales\ contratados}{No\ de\ profesionales\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{4}{4}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ Requerimientos\ Emitidos}{No\ de\ Requerimientos\ superados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ informes\ Emitidos}{No\ de\ informes\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 75. Capacitación y concienciación del personal de obra.

OBJETIVO	
Garantizar la inducción, capacitación, entrenamiento y actualización de los colaboradores en los temas referentes a los componentes ambiental, flora y fauna y de las medidas de manejo establecidas para prevenir, minimizar y/o corregir los impactos ambientales del proyecto durante su etapa de mantenimiento.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% del personal con inducción ≥ del personal de la obra capacitado,0% de quejas por afectación ambiental.	$\frac{No\ de\ personal\ con\ induccion}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ personal\ capacitadoen\ temas\ ambientales}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100$

$$\text{JERUSALEN} = \frac{No\ de\ personal\ con\ induccion}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100 = \frac{7}{7}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ personal\ capacitado\ en\ temas\ ambientales}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100 = \frac{7}{7}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 76. Seguimiento y control de los requerimientos legales

OBJETIVO	
Definir las acciones y contar con los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones por uso e intervención de recursos naturales que requiere el proyecto, Cumplir con la normatividad vigente, en relación con los mecanismos de participación, control social, atención a los derechos de petición y las solicitudes de información.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de permisos obtenidos y aprobados, 100% de normas comunicadas y aplicadas.	$\frac{No\ de\ permisos\ obtenidos}{No\ de\ permisos\ requeridos\ por\ el\ proyecto}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ personal\ capacitado\ de\ normatividad\ ambiental}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ permisos\ obtenidos}{No\ de\ permisos\ requeridos\ por\ el\ proyecto}\ x\ 100 = \frac{1}{1} x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ personal\ capacitado\ de\ normatividad\ ambiental}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100 = \frac{7}{7}\ x\ 100 = 100\%$$

Se requería 1 permiso y se obtuvo 1 permiso. El resultado es del 100%, lo que indica un cumplimiento total de la normativa legal vigente hasta el momento. Este permiso hace parte de la cantera aprobada ya que cuenta con sus documentos al día.

Tabla 77. Manejo integral de materiales de construccion

OBJETIVO	
Establecer las medidas y acciones conducentes a la obtención de materiales para la ejecución de obras y definir las acciones para el manejo de materiales en el sitio de las obras y sitios de acopio temporal.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de las medidas establecidas. 0% de requerimientos	$\frac{No\ de\ medidas\ implementadas\ en\ el\ periodo}{No\ de\ medidas\ que\ se\ debia\ ejecutar}\ x\ 100$ $\frac{Cantidad\ de\ material\ utilizados}{Cantidad\ de\ material\ requeridos}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ medidas\ implementadas\ en\ el\ periodo}{No\ de\ medidas\ que\ se\ debia\ ejecutar}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Cantidad\ de\ material\ utilizados}{Cantidad\ de\ material\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{63\ m^3}{63\ \ m^3}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 78.Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales.

OBJETIVO	
Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
90% de señales requeridas e instaladas, 90% de los frentes de obra señalizados, 90% de acopios protegidos, demarcados y señalizados.	$\frac{No\ de\ señales\ implementadas\ en\ obra}{No\ de\ señales\ establecidas\ en\ el\ PMT}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ frentes\ de\ obras\ señalizados}{No\ total\ de\ frentes\ de\ obra}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ señales\ implementadas\ en\ obra}{No\ de\ señales\ establecidas\ en\ el\ PMT}\ x\ 100 = \frac{10}{10}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ frentes\ de\ obras\ señalizados}{No\ total\ de\ frentes\ de\ obra}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 79. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos

OBJETIVO	
Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte, aprovechamiento y disposición final de los escombros, materiales sobrantes, RCD´s y/o lodos provenientes de las obras de infraestructura vial, de manera que prevenga, minimice y/o controle los impactos que producen sobre el ambiente.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de material de excavación aprovechado y reutilizado en obra, 100% de material de RCD dispuesto en escombreras autorizadas.	$\frac{Volumen\ de\ material\ de\ Excavacion}{Volumen\ de\ material\ reutilizados\ y\ aprovechado}\ x\ 100$ $\frac{Volumen\ de\ material\ de\ RCD\ generado\ en\ el\ Proyecto}{Volumen\ de\ material\ dispuesto\ en\ sitio\ autorizado}\ x\ 100$

$$\frac{Volumen\ de\ material\ de\ Excavacion}{Volumen\ de\ material\ reutilizados\ y\ aprovechado}\ x\ 100 = \frac{0\ m^3}{0\ m^3}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Volumen\ de\ material\ de\ RCD\ generado\ en\ el\ Proyecto}{Volumen\ de\ material\ dispuesto\ en\ sitio\ autorizado}\ x\ 100 = \frac{0m^3}{0\ m^3}\ x\ 100 = 100\ \%$$

Durante el periodo evaluado no se realizaron actividades de excavación, lo cual refleja un cumplimiento del 100 % del indicador establecido.

Tabla 80. Manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales

OBJETIVO	
Manejar y disponer adecuadamente los residuos sólidos que se generan durante las actividades de construcción, adecuación y/o reparación del proyecto, Aplicar los lineamientos de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de los residuos aprovechables y no aprovechables gestionados adecuadamente	$\frac{Kg\ de\ residuos\ peligoros\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ peligrosos\ generados}\ x\ 100$ $\frac{Kg\ de\ residuos\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ aprovechables\ generados}\ x\ 100$ $\frac{Kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ generados}\ x\ 100$ $\frac{Puntos\ ecologicos\ instalados}{Puntos\ Ecologicos\ Programados}\ x\ 100$

$$\frac{Kg\ de\ residuos\ peligrosos\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ peligros\ generados}\ x\ 100 = \frac{0\ kg}{0\ kg}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Kg\ de\ residuos\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ aprovechables\ generados}\ x\ 100 = \frac{22kg}{22\ kg}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ generados}\ x\ 100 = \frac{8\ kg}{8\ kg}\ x\ 100 = 100\%$$

$$Jerusalen = \frac{Puntos\ ecologicos\ instalados}{Puntos\ Ecologicos\ Programados}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100$$

Se reporta la generación de residuos sólidos, el municipio de Jerusalén aportó 30 kg. Donde se generó 22 kg aprovechables y 8 kg no aprovechables, por lo tanto, el indicador es de un 100% de cumplimiento.

Finalmente, como parte de la adecuación logística de la obra, se instaló un (1) punto ecológico. Este avance, alineado con el cronograma del Plan de Gestión Integral de Residuos, permite centralizar la segregación en la fuente y optimizar el manejo de los materiales generados en el proyecto.

Tabla 81. Manejo de aguas superficiales

OBJETIVO	
Definir las medidas para cumplir con las normas legales vigentes para la captación, transporte y uso del agua, de tal manera que prevenga, minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de volumen de agua utilizado en obra debidamente cuantificado.	$\frac{Volumen\ de\ agua\ usado}{Volumen\ de\ actas\ de\ suministro\ o\ compras}\ x\ 100$

$$\frac{Volumen\ de\ agua\ usado}{Volumen\ de\ actas\ de\ suministro\ o\ compras}\ x\ 100 = \frac{26\ m^3}{26\ m^3}\ x\ 100\ \%$$

Tabla 82. Seguimiento y control al manejo de residuos líquidos

OBJETIVO	
Establecer medidas que para controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres requeridos para ejecución de los proyectos.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de instalación de USP en los frentes de obra, Por cada 15 trabajadores en obra se debe contar con 1 USP	$\frac{Baños\ alquilados}{Baños\ requeridos}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ derrames\ generados}{No\ de\ derrames\ controlados}\ x\ 100$

$$\frac{Baños\ alquilados}{Baños\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ derrames\ generados}{No\ de\ derrames\ controlados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Se alcanzó un 100% de cumplimiento en el indicador de prevención de vertimientos gracias a la concertación efectiva con los ciudadanos Mónica Ramirez(Jerusalén). Mediante estos acuerdos, se garantizó el manejo adecuado de aguas residuales en la zona de influencia, cumpliendo con los objetivos de protección del recurso hídrico.

Tabla 83. Manejo de descapote y cobertura vegetal.

OBJETIVO	
Establecer las acciones para el manejo de la vegetación que será intervenida y/o afectada por las obras del proyecto, de manera que se prevengan, minimicen y controlen los impactos producidos sobre la vegetación.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
0% de cobertura vegetal afectada	$\frac{No\ de\ acciones\ adelantadas}{No\ de\ acciones\ a\ ejecutar}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ acciones\ adelantadas}{No\ de\ acciones\ a\ ejecutar}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

Se ejecutó 1 acción de manejo de las 1 programada. El resultado es del 100%, lo cual indica que las medidas para proteger la vegetación se cumplieron según lo planeado.

Tabla 84.Protección de la Fauna en vías

OBJETIVO	
Prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos sobre la fauna silvestre, especialmente aquellas especies con algún grado de amenaza (CR, EN, VU) identificadas en las áreas de influencia del proyecto, y promover su conservación	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
0% de fauna afectada	$\frac{No\ de\ capacitaciones\ ejecutadas\ sobre\ fauna}{No\ de\ capacitaciones\ programadas\ sobre\ fauna}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ fauna\ evidenciada}{No\ de\ fauna\ reportada}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ capacitaciones\ ejecutadas\ sobre\ fauna}{No\ de\ capacitaciones\ programadas\ sobre\ fauna}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ fauna\ evidenciada}{No\ de\ fauna\ reportada}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Durante el período evaluado, la gestión ambiental del proyecto demostró un desempeño óptimo en materia de conservación de los recursos bióticos, alcanzando un 100% de cumplimiento en los indicadores de fauna analizados.

Tabla 85. Instalación funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopios temporales

OBJETIVO	
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de las zonas de acopios autorizadas 100% de áreas recuperadas 0% de requerimientos	$\frac{No\ Acopios\ utilizados}{No\ de\ acopios\ con\ autorizacion}\ x\ 100$ $\frac{m^2\ de\ zonas\ recuperadas}{m^2\ de\ areas}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ campamentos\ instalados}{No\ de\ campamentos\ requeridos}\ x\ 100$

$$\frac{No\ Acopios\ utilizados}{No\ de\ acopios\ con\ autorizacion}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{m^2\ de\ zonas\ recuperadas}{m^2\ de\ areas}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ campamentos\ instalados}{No\ de\ campamentos\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

En lo referente al manejo del suelo y la infraestructura operativa del proyecto, los indicadores evaluados registraron un 100% de cumplimiento institucional, reflejando la ausencia de nuevas intervenciones temporales durante el periodo. Por una parte, el indicador de acopios cerró en un escenario de total conformidad (100%), debido a que no se requirió la habilitación ni el uso de zonas de acopio dinámicas en los frentes de obra. Asimismo, al no registrarse la apertura de nuevos frentes que demandaran la entrega o abandono de terrenos, las variables de metros cuadrados de zonas recuperadas frente a áreas intervenidas se mantuvieron en cero,

consolidando una efectividad del 100% en el control superficial. Finalmente, el indicador de campamentos operó bajo la misma dinámica de estabilidad (100%), toda vez que no se contempló la instalación de campamentos adicionales a la infraestructura logística ya establecida, garantizando un estricto control territorial y de planeación ambiental en el desarrollo de las actividades.

Tabla 86. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

OBJETIVO	
Definir las acciones a ejecutar para manejar los impactos generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos y cumplir con la legislación nacional vigente.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% vehículos con certificado de revisión técnico mecánica vigente, 0% de accidentes de maquinaria y equipos.	$\frac{No\ de\ vehiculos\ con\ revision\ tecnomecanica}{No\ de\ vehiculos\ trabajando\ en\ obra}\ x\ 100$ $\frac{No\ \ de\ derrames\ de\ combustibles\ ocurridos}{No\ de\ derrames\ de\ combustibles\ controlados}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ vehiculos\ con\ revision\ tecnomecanica}{No\ de\ vehiculos\ trabajando\ en\ obra}\ x\ 100 = \frac{6}{6}\ x\ 100 = 100\ \%$$

$$\frac{No\ \ de\ derrames\ de\ combustibles\ ocurridos}{No\ de\ derrames\ de\ combustibles\ controlados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

En lo concerniente al control operacional de maquinaria y prevención de la contaminación, las variables analizadas consolidaron un 100% de efectividad y cumplimiento normativo en el periodo.

CAPITULO 5 PANDI

31. ACTIVIDADES DE OBRA PANDI

Durante el período reportado, se ejecutaron en el municipio aplicación de doble riego, como parte de las actividades orientadas al mejoramiento de la capa de rodadura y la conservación de la infraestructura vial. Esta intervención contribuye a impermeabilizar la superficie, fortalecer las condiciones de transitabilidad y seguridad en el sector intervenido, y prolongar la vida útil de la vía, favoreciendo la movilidad de la comunidad.

32. PROGRAMA 1 GESTION DEL PROYECTO

32.1. Conformación del grupo de gestión ambiental y social en Pandi

Durante el presente período no fue necesario realizar la reunión de socialización y alineación del equipo responsable para la ejecución de las medidas establecidas en el PAGA V6.2 en este municipio, debido a que las actividades desarrolladas correspondieron únicamente a labores de carácter provisional y de baja incidencia ambiental. En consecuencia, estas actividades no implicaron la conformación de nuevos frentes de trabajo ni modificaciones en las condiciones de ejecución que hicieran necesaria una nueva socialización de las obligaciones ambientales y técnicas. No obstante, las labores ejecutadas se desarrollaron en estricto cumplimiento de los lineamientos ambientales aplicables y de las medidas de manejo establecidas para este tipo de intervenciones.

32.2. Capacitación y concienciación para el personal de obra

Teniendo en cuenta el plan de adaptación del guía ambiental aprobado, el especialista ambiental se encargará de impartir charlas y capacitaciones al inicio de todos los trabajos sobre temas relacionados con gestión ambiental de acuerdo a lo establecido en el cronograma de capacitaciones de obra. Entre los temas ambientales para las capacitaciones se contempla:

- Inducción ambiental inicial
- Manejo adecuado de residuos de obra
- Uso eficiente del agua
- Control de polvos y partículas
- Prevención de derrames de sustancias peligrosas
- Cuidado de fauna y flora

Dichos temas están sujetos a modificaciones de acuerdo a la necesidad y tiempos del proyecto.

Respecto a las actividades de capacitación y concienciación para el personal de obra, se informa que estas no se llevaron a cabo en el municipio de Pandi debido a la ausencia de personal local contratado en dicho punto.

32.3. Cumplimiento de requerimientos legales

Se precisa que el presente contrato no contempla la gestión, trámite ni obtención de permisos ambientales ante las autoridades competentes. En consecuencia, el seguimiento ambiental se orienta exclusivamente a la verificación del cumplimiento de la normativa ambiental vigente, de las obligaciones contractuales aplicables y de los requisitos ambientales exigibles a terceros, específicamente a los proveedores de materiales.

En este sentido, los controles de cumplimiento ambiental aplicables dentro del alcance contractual corresponden a la verificación de la documentación asociada a las fuentes de materiales granulares, incluyendo las Licencias Ambientales, el Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) y los respectivos contratos o documentos comerciales que acrediten la relación con los proveedores. Sobre este particular, se deja constancia de que la documentación soporte correspondiente a la Cantera Agregados La Floresta fue allegada formalmente durante periodos anteriores y se encuentra incorporada dentro de los soportes del seguimiento ambiental del contrato.

32.3.1. Documentación (permisos ambientales y mineros)

Para lograr los objetivos propuestos se requiere que Consorcio VICGER conozca los requisitos legales y contractuales establecidos para el contrato de obra ICCU-140 DE 2025, se relacionaran a los permisos aplicables de nuestros proveedores.

Tabla 87. Documentación proveedores

TIPO DE MATERIAL	UBICACIÓN	CANTERA	REGISTRO MINERO	LICENCIA AMBIENTAL	VIGENCIA	AÑO DE ADJUDICACION
Materiales de arrastre (gravas, arenas y conglomerados)	Nilo, Departamento de Cundinamarca, específicamente en la confluencia de los ríos Paguey y Sumapaz	Agregados La Floresta	El contrato de concesión de mediana minería tiene el número BGI-141. Su inscripción	Resolución DJUR No. 5024700005 4 del 2 de abril de 2024. El expediente ambiental asociado es el N°30222.	07-05-2025 hasta el 31-07-2026.	30 de marzo de 2007

			en el Registro Minero Nacional se realizó el 24 de noviembre de 2003.			

El proyecto de explotación de materiales de construcción cuenta con el respaldo legal indispensable para su operación, formalizado mediante la Resolución No. 2288 del 07 de octubre de 2014, expedida por la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Esta resolución constituye la Licencia Ambiental obligatoria que autoriza el desarrollo de la actividad extractiva y de beneficio en el predio "El Espino". Adicionalmente, la compatibilidad territorial está asegurada, ya que el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Nilo (Acuerdo 004-2001) define la zona como apta para actividades mineras de materiales de construcción, lo cual valida el uso del suelo conforme a la normativa municipal.

La selección de esta cantera se fundamentó en una evaluación estratégica de la logística de transporte, lo cual es un factor crítico de viabilidad económica. Su ubicación en la Vereda Cobos es geográficamente favorable para el suministro de materiales a las provincias y municipios objetivo de las intervenciones. Esta proximidad estratégica permite minimizar significativamente los costos y tiempos de transporte.

33. PROGRAMA 2 MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

El programa Manejo integral de materiales de construcción (DAGA-2.1-01), enmarcado en el Programa de Manejo de Actividades Constructivas, es crucial para garantizar que el Contrato ICCU No. 140-2025 se ejecute bajo principios de sostenibilidad y legalidad; su objetivo primordial es asegurar la trazabilidad y eficiencia de todos los insumos, desde los agregados hasta los estabilizantes químicos no tradicionales, certificando que provengan de fuentes legales autorizadas y minimizando los impactos ambientales asociados a su almacenamiento, transporte y uso. La gestión rigurosa de este programa es fundamental para prevenir la contaminación del suelo y aire (por polvo, dispersión de material y/o derrames), optimizar el consumo de recursos y, en última instancia, avalar la calidad de la obra vial con un mínimo impacto ambiental.

Tabla 88. Cantidad de materiales Pandi

FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD (m3)	MATERIAL	Placa volqueta	Proveedor
1/7/2026	15	GRAVILLA 1/2"	TAV 258	AGREGADOS LA FLORESTA
1/7/2026	15	GRAVILLA 1"	TGN 084	AGREGADOS LA FLORESTA
1/7/2026	15	GRAVILLA 1"	SWO 191	AGREGADOS LA FLORESTA
2/7/2026	15	GRAVILLA 1"	TGN 084	AGREGADOS LA FLORESTA
2/7/2026	15	GRAVILLA 1/2"	SWO 191	AGREGADOS LA FLORESTA
4/7/2026	15	GRAVILLA 1/2"	THV 078	AGREGADOS LA FLORESTA
4/7/2026	15	GRAVILLA 1/2"	SQZ 298	AGREGADOS LA FLORESTA
3/7/2026	15	GRAVILLA 1/2"	SOA 573	AGREGADOS LA FLORESTA
6/7/2026	15	GRAVILLA 1"	TAQ 219	AGREGADOS LA FLORESTA
6/7/2026	15	GRAVILLA 1"	TRK 537	AGREGADOS LA FLORESTA
6/7/2026	15	GRAVILLA 1"	SWO 191	AGREGADOS LA FLORESTA
15/7/2026	15	GRAVILLA 1"	SWO 191	AGREGADOS LA FLORESTA
15/7/2026	15	GRAVILLA 1/2"	GQT 917	AGREGADOS LA FLORESTA
16/7/2026	15	GRAVILLA 1/2"	TAX 354	AGREGADOS LA FLORESTA
16/7/2026	15	GRAVILLA 1/2"	SWO 191	AGREGADOS LA FLORESTA
16/7/2026	15	GRAVILLA 1/2"	TLO 178	AGREGADOS LA FLORESTA
17/7/2026	15	GRAVILLA 1/2"	SWO 191	AGREGADOS LA FLORESTA
17/7/2026	15	ARENA LAVADA	SWO 191	AGREGADOS LA FLORESTA
TOTAL	270	_____	_____	_____

VER ANEXO 20. CERTIFICADO DE MATERIAL PANDI

33.1. Manejo integral de materiales de construcción

Durante el período reportado, se ejecutaron en el municipio actividades correspondientes a la aplicación de doble riego, como parte de las intervenciones orientadas al mejoramiento de la capa de rodadura y la conservación de la infraestructura vial, contribuyendo a mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad del sector intervenido y a prolongar la vida útil de la vía. Para la ejecución de esta actividad se realizó el suministro e ingreso de aproximadamente 270 m³ de material granular, correspondientes a gravilla y arena, empleados de acuerdo con las necesidades y especificaciones técnicas del tratamiento ejecutado. En consecuencia, durante el presente período se contó con el ingreso y utilización de dichos materiales, por lo que los respectivos soportes y registros de suministro deberán corresponder a las cantidades efectivamente recibidas y utilizadas en el frente de obra.

33.1.1. Manejo de sustancias químicas

En la obra, se utilizó la siguiente sustancia química en los tramos estabilizados en el municipio de Pandi, la cual será previamente rotulada conforme a los requisitos del **Sistema Globalmente Armonizado (SGA)**. Y contara con el manejo adecuado de acuerdo a lo establecido en el PAGA.

Tabla 89. Tabla de sustancias químicas Pandi

No	SUSTANCIA	TIPO/ USO PRINCIPAL	FICHA DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES O PELIGROS
1	ACPM	Combustible de destilación pesada. Se usa principalmente en maquinaria amarilla, volquetas y generadores eléctricos debido a su alto torque y eficiencia térmica.	ONU: 1202. Clase 3 (Líquido Inflamable). Punto de inflamación: 52°C. Es menos volátil que la gasolina, pero persistente en el ambiente.	Salud: Irritación cutánea por contacto prolongado. Ambiente: Altamente contaminante para suelos y fuentes hídricas (biodegradación lenta).
2	Gasolina	Combustible de destilación liviana. Se utiliza en vehículos livianos, motobombas,	ONU: 1203. Clase 3 (Líquido Inflamable). Punto de inflamación:	Su alto octanaje la hace ideal para motores de alta revolución. No debe mezclarse con otros solventes

No	SUSTANCIA	TIPO/ USO PRINCIPAL	FICHA DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES O PELIGROS
		herramientas menores (cortadoras) y como solvente en limpiezas específicas.	43°C. Extremadamente volátil; genera vapores inflamables a temperatura ambiente.	ni usarse para "encender" fogatas por su riesgo de explosión súbita. Explosión: Riesgo extremo de incendio por chispas o estática.

33.1.2. Lugar de acopio de sustancias químicas

Durante el período evaluado en el municipio de Pandi, no fue necesaria la adecuación ni implementación de un área física para el acopio de sustancias químicas o materiales, debido a que las actividades ejecutadas durante el período correspondieron exclusivamente a la aplicación de doble riego. La naturaleza de esta actividad y su programación operativa no requirieron la permanencia, almacenamiento o conformación de acopios de insumos en el frente de obra. En este sentido, los materiales granulares requeridos para la ejecución del doble riego, correspondientes aproximadamente a 270 m³ de gravilla y arena, fueron suministrados de manera directa al frente de trabajo y utilizados conforme al desarrollo de las actividades, sin que se generaran zonas de almacenamiento permanente o temporal. De igual manera, no se presentó acopio de sustancias químicas en el área intervenida, dado que la actividad ejecutada no requirió la disposición de un espacio destinado para su almacenamiento. En consecuencia, durante el período reportado no se generaron áreas de acopio de materiales ni de sustancias químicas, manteniendo un manejo operativo orientado a la entrega y utilización directa de los insumos requeridos para la ejecución del doble riego.

33.1.3. Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales.

Como herramienta de gestión preventiva fundamental incluida en el Programa de Manejo de Actividades Constructivas, su propósito esencial es informar, advertir y orientar tanto al personal como a la comunidad sobre los riesgos y protocolos del proyecto. No obstante, para el período objeto de este informe, se determinó que no fue necesaria la implementación de señalización ambiental fija o de gran envergadura, toda vez que las labores se ejecutaron de manera puntual y confinada exclusivamente al costado de la vía (franja de retiro de las estructuras de drenaje). Al no registrarse intervenciones directas sobre zonas de veda, coberturas vegetales críticas o cuerpos de agua adyacentes, el área de influencia directa se mantuvo estrictamente delimitada por la propia calzada existente y los elementos de seguridad

vial estándar, garantizando la prevención de impactos sin requerir infraestructura de señalización ambiental adicional en este frente.

33.1.4. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos

Es una directriz ambiental de alta criticidad, ya que aborda la gestión adecuada de los volúmenes de residuos no peligrosos que resultan directamente de las intervenciones viales, tales como concreto, mezclas asfálticas, escombros, tierra de excavación y lodos, entre otros. El objetivo esencial de este programa es garantizar que todos los RCD y lodos se gestionen de manera jerarquizada, priorizando la reducción en la fuente, la reutilización o el aprovechamiento dentro del proyecto (si es técnica y legalmente viable), y asegurando que aquellos residuos que no puedan ser recuperados sean dispuestos en sitios autorizados (sitios de disposición de RCD), con el fin de prevenir la afectación de cauces de agua, suelos y coberturas vegetales, cumpliendo así con la normativa ambiental vigente para residuos sólidos.

Durante el mes de junio de 2026 no se presentó generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), tales como material de excavación, demolición, escombros o lodos. Debido a que las actividades de estabilización se ejecutaron optimizando el terreno existente y sin producir excedentes, no se requirió realizar ninguna labor de acopio, transporte ni disposición final de este tipo de materiales en predios de la comunidad durante el presente periodo.

Tabla 90. Control de RCD Pandi

ºAÑO	PERIODO	RCD	CANTIDAD m3
2025	octubre	Excavación	0
		Demolición	0
	noviembre	Excavación	0
		Demolición	0
	diciembre	Excavación	0
		Demolición	0
2026	enero	Excavación	0
		Demolición	0
	febrero	Excavación	0
		Demolición	0
	marzo	Excavación	20
		Demolición	20
	junio	Excavación	0
		Demolición	0
	julio	Excavación	0
		Demolición	0

TOTAL	40

33.1.5. Manejo de residuos peligrosos

El manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales y peligrosos (RESPEL) y residuos especiales generados durante la ejecución de la obra es un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento legal del proyecto. La naturaleza de las actividades de construcción y minería inevitablemente produce subproductos que, debido a sus características corrosivas, tóxicas, reactivas o inflamables, representan un riesgo significativo para la salud humana y los ecosistemas si no son gestionados correctamente.

Durante el período objeto del presente informe, no se requirió la ejecución de actividades asociadas al manejo, almacenamiento temporal o disposición final de residuos peligrosos, toda vez que la generación de este tipo de elementos fue completamente nula en el frente de obra. Debido a que las labores se concentraron exclusivamente en actividades que no involucran el uso de sustancias químicas complejas, mantenimiento mayor de maquinaria en sitio, ni generación de aceites usados o envases contaminados, no se activaron los protocolos de acopio ni entrega a gestores ambientales autorizados para este rublo, manteniendo un balance limpio y libre de afectaciones por componentes peligrosos en el tramo ejecutado

33.1.5.1. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, CONVENCIONALES Y ESPECIALES

Durante el periodo evaluado, se aclara que en el frente de obra no se presentó una generación significativa de residuos sólidos convencionales que requiriera su reporte como residuo generado en el sitio de ejecución de las actividades. Lo anterior obedece principalmente a las condiciones operativas del frente de trabajo, donde la permanencia del personal no es continua y se contó únicamente con dos (2) trabajadores de manera puntual, asociados a las actividades ejecutadas durante el periodo.

Adicionalmente, las actividades desarrolladas correspondieron principalmente a labores operativas y de mantenimiento, las cuales no implicaron la generación permanente de residuos de tipo doméstico o convencional en el frente de obra. El personal no permaneció de manera permanente en el sitio, por lo que no se estableció allí un punto fijo de alimentación, descanso o permanencia que generara residuos ordinarios de manera continua.

En consecuencia, durante el periodo objeto de seguimiento no se identificaron cantidades de residuos sólidos convencionales susceptibles de ser cuantificadas y reportadas como generación propia del frente de obra. No obstante, se mantuvo el

seguimiento y control ambiental correspondiente, verificando que, en caso de presentarse residuos durante el desarrollo de las actividades, estos sean manejados y dispuestos adecuadamente conforme a las obligaciones ambientales y contractuales aplicables.

Por lo anterior, el reporte de cero (0) residuos sólidos convencionales generados durante el periodo corresponde a las condiciones reales de operación y permanencia del personal en el frente de trabajo, y no a la omisión del seguimiento o control ambiental.

Tabla 91. Control de residuos sólidos convencionales Pandi

AÑO	PERIODO	RESODUO	CANTIDAD (KG)
2025	octubre	Aprovechables	0
		No aprovechables	0
	noviembre	Aprovechables	0
		No aprovechables	0
	diciembre	Aprovechables	0
		No aprovechables	0
2026	enero	Aprovechables	6
		No aprovechables	5
	febrero	Aprovechables	9
		No aprovechables	7
	marzo	Aprovechables	4
		No aprovechables	7
	junio	Aprovechables	5
		No aprovechables	5
	julio	Aprovechables	0
		No aprovechables	0
TOTAL			48

Detalla el control de residuos sólidos convencionales en Pandi para el periodo comprendido entre octubre de 2025 y julio de 2026, clasificando los elementos en residuos aprovechables y no aprovechables. Durante los últimos tres meses de 2025 se registró una generación nula (0 kg) en ambas categorías; sin embargo, a partir de enero de 2026 se evidencia el inicio de las actividades de disposición, registrándose el volumen más alto en el mes de febrero con un total de 16 kg (9 kg aprovechables y 7 kg no aprovechables), seguido de un comportamiento relativamente estable entre marzo y junio. En total, el periodo evaluado consolida una generación acumulada de 48 kg de residuos, lo que permite monitorear el impacto y la gestión ambiental de la zona en el marco del presente informe mensual.

33.1.5.2. Acopio temporal de residuos sólidos convencionales generados.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente documento, en cada punto operativo de los municipios involucrados en el proyecto se ha implementado un punto ecológico para el acopio temporal de residuos sólidos convencionales. Estos puntos ecológicos cuentan con recipientes debidamente identificados y señalizados, permitiendo la adecuada separación, almacenamiento y manejo de los residuos generados durante las actividades de obra, garantizando condiciones de orden, higiene y control ambiental, previo a su recolección y disposición final conforme a la normativa vigente.

33.1.5.3. Disposición final de los residuos sólidos convencionales

Durante el periodo evaluado en el municipio de Pandi no se generaron residuos sólidos convencionales en el frente de obra, razón por la cual no se requirió realizar actividades de recolección, almacenamiento temporal ni entrega de residuos al operador del servicio público de aseo durante el periodo reportado.

Esta condición obedeció a las características y dinámica de las actividades ejecutadas, así como a la permanencia no continua del personal en el frente de trabajo, donde se contó únicamente con dos (2) trabajadores de manera puntual. En consecuencia, no se presentó una generación de residuos ordinarios o domésticos que pudiera ser cuantificada y reportada durante el periodo.

No obstante, se mantuvo establecido como mecanismo de manejo que, en caso de generarse residuos sólidos convencionales durante la ejecución de las actividades, estos serían separados adecuadamente y entregados a través de la ruta de recolección del operador del servicio público de aseo correspondiente al municipio, en coordinación con las autoridades locales y de conformidad con la normativa ambiental y sanitaria vigente.

or lo anterior, para el periodo objeto de seguimiento, el registro corresponde a cero (0) kg de residuos sólidos convencionales generados, sin que ello implique ausencia de las medidas de prevención y control ambiental previstas para su manejo.

Ilustración 24. Punto ecológico



Fuente: Propia

33.1.5.4. Manejo de residuos peligrosos

Los residuos peligrosos o especiales son aquellos residuos que, por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgos a la salud humana y el medio ambiente. Una vez se generen RESPEL se deberán disponer adecuadamente

Tabla 92. Control de RESPEL Pandi

AÑO	PERIODO	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD (KG)	GESTOR DE DISPOSICION FINAL
2025	octubre	0	0	NA
	noviembre	0	0	NA
	diciembre	0	0	NA
2026	enero	0	0	NA
	febrero	Bolsas de cemento	144	SOLUCIONES AMBIENTALES REMET S.A.S
	marzo	0	0	NA
	junio	0	0	NA
	julio	0	0	NA
TOTAL			144	———

Durante el presente periodo no se generaron residuos peligrosos en este tramo, debido a la finalización de las actividades programadas.

33.1.5.4.1. Clasificación y acopio de residuos peligrosos

Los residuos generados en la obra se clasifican como peligrosos cuando son de naturaleza química o tóxica, incluyendo productos como disolventes, pinturas, barnices y adhesivos. También se consideran peligrosos los aceites y lubricantes usados provenientes del mantenimiento de maquinaria y equipos.

Los residuos especiales están constituidos por los recipientes o envases que han contenido estas sustancias peligrosas.

34. PROGRAMA 3 GESTION HIDRICA

El uso eficiente del agua es de vital importancia en la construcción para reducir el impacto ambiental del proyecto y garantizar la disponibilidad de este recurso. Por lo tanto, se deben implementar estrategias que optimicen su consumo y prevengan la contaminación de los cuerpos de agua cercanos.

34.1. Manejo de aguas superficiales

El programa del Manejo de aguas superficiales constituye el pilar de control dentro de la Gestión Hídrica del proyecto, cuyo objetivo primordial es doble: por un lado, prevenir la afectación y sedimentación de los cuerpos de agua naturales adyacentes a la vía mediante la implementación de controles de escorrentía, y por otro, garantizar la legalidad del recurso hídrico utilizado en el proceso constructivo.

En este sentido, un punto crucial de cumplimiento en el período fue la formalización del suministro de agua para las actividades de obra, la cual fue gestionada exitosamente con la Alcaldía del municipio de Pandi, entidad que facilitó el volumen de agua con su respectiva certificación de calidad, lo que asegura que el recurso utilizado es totalmente legal, controlado y no depende de la captación directa no autorizada de fuentes naturales, mitigando así el riesgo ambiental y normativo.

El agua para la obra es suministrada por parte del acueducto del municipio de pandi. Es importante destacar que, aunque el agua suministrada es potable, no está destinada para consumo humano.

Este recurso hídrico se utiliza exclusivamente para:

- El proceso constructivo del suelo en la obra
- El lavado de manos y cara del personal, garantizando la higiene básica en el sitio de trabajo.

Durante el período reportado, en el municipio de Pandi se ejecutaron actividades de aplicación de doble riego, orientadas al mejoramiento de la capa de rodadura, la conservación de la infraestructura vial y el fortalecimiento de las condiciones de transitabilidad y seguridad para los usuarios de la vía.

En desarrollo de estas actividades, no se requirió la captación ni el aprovechamiento de recurso hídrico proveniente de fuentes naturales o de sistemas de abastecimiento del municipio, dado que el procedimiento constructivo implementado para la aplicación del doble riego no contempló el uso de agua como insumo para su ejecución. En consecuencia, durante el período evaluado no se generó consumo, intervención ni presión sobre las fuentes hídricas de la zona asociada a esta actividad.

La ejecución del doble riego permitió mejorar las condiciones superficiales de la vía, contribuyendo a su impermeabilización, protección frente a los efectos de la acción del agua y prolongación de la vida útil de la estructura vial, en beneficio de la movilidad y seguridad de la comunidad.

Tabla 93. Control de recurso hídrico Pandi

AÑO	PERIODO	CANTIDAD EN m3	GESTOR	OBSERVACION
2025	octubre	0	NA	NA
	noviembre	4	En pandi S.A.S. E.S.P.	Tramos de prueba
	diciembre	0	NA	NA
2026	enero	0	NA	NA
	febrero	43,5	En pandi S.A.S. E.S.P.	NA
	marzo	0	NA	NA
	junio	15	En pandi S.A.S. E.S.P.	NA
	julio	0	0	NA
TOTAL		62,5		

34.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

Durante el período reportado (mes de julio), no se requirió el alquiler ni la instalación de unidades sanitarias portátiles o alquiladas a terceros en el municipio de Pandi. Lo anterior se fundamenta en la naturaleza itinerante y discontinua de la actividad de doble riego ejecutada en este frente de obra, la cual correspondió a labores de corta duración y bajo rendimiento horario continuo en sitio. Por lo tanto, la

permanencia del personal en el área de trabajo no justificó ni hizo necesaria la habilitación de infraestructura sanitaria temporal durante este lapso.

35. PROGRAMA 4 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

El manejo ambiental de la obra se enfoca en la prevención, mitigación y compensación de los impactos generados sobre la fauna, la vegetación y el paisaje en las Provincias de Alto Magdalena, Tequendama y Sumapaz.

35.1. Programa de manejo de descapote y cobertura vegetal

Busca preservar y restaurar la cobertura vegetal del suelo durante cualquier proyecto de construcción retirando la vegetación y tierra superficial de forma controlada para almacenarla y reutilizarla, previniendo así la erosión, la perdida de nutrientes y el deterioro paisajístico.

Se aclara de manera expresa que, durante el presente periodo, así como en el alcance general de las intervenciones programadas, no se contempló ni se ejecutó el retiro de cobertura vegetal en los costados de la vía, ni se realizaron excavaciones para la construcción de cunetas o actividades de paisajismo. Toda vez que el proyecto se enfoca de manera exclusiva en la estabilización química de la estructura de la subrasante sobre el corredor existente, no se generó remoción de capa orgánica ni afectación a las coberturas vegetales colindantes, por lo cual no se reportan volúmenes de excavación ni actividades de manejo asociadas a este concepto.

35.2. Protección de la Fauna y Flora

Dada la presencia de especies de Fauna y Flora en la zona de influencia del proyecto, se cuenta con medidas de manejo ambiental con el fin de garantizar la no afectación de los mismos, por lo tanto, entre ellos se contemplan algunas de las siguientes actividades:

35.2.1. Prevención y Sensibilización:

- Identificación de áreas sensibles: Antes de iniciar cualquier actividad, se deben demarcar y señalizar las áreas cercanas a cuerpos de agua, parches de bosque o fragmentos vegetales en caso de que aplique.
- Capacitación: Todo el personal recibe inducción ambiental sobre la identificación de especies clave tanto de fauna y flora y la prohibición absoluta de caza, captura o alimentación.
- Control de Atractantes: Se gestionan los residuos sólidos y líquidos de manera rigurosa para evitar atraer fauna oportunista o depredadores.

35.2.2. Monitoreo:

- Inspección Previa: Se realizan inspecciones visuales diarias antes de cualquier actividad en obra. En caso de presencia de especies de fauna en medio de las actividades se detendrá la ejecución de la obra y se realizaran las medidas pertinentes.

Se informa que, durante el presente periodo evaluado, no se registraron hallazgos de especies de interés ni situaciones de afectación biótica que requirieran acciones de manejo específicas. Debido a la ausencia de intervenciones en áreas de sensibilidad ecológica y a que el estado de protección se mantuvo bajo condiciones normales de operación, no se adjunta registro fotográfico ni descripción de actividades, ya que no se presentaron eventos significativos que alteraran la estabilidad del entorno.

36. PROGRAMA 5 MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Cabe precisar que, en consistencia con esta estrategia de minimización de impactos, actualmente no se registra la presencia ni el estacionamiento de maquinaria pesada dentro del tramo de la vía objeto de intervención. La ausencia de estos equipos en el sitio responde a una rigurosa planificación logística, orientada a evitar la saturación del corredor vial, mitigar posibles afectaciones directas sobre el suelo y el entorno, y garantizar que cualquier frente de trabajo se active bajo estrictas condiciones de ordenamiento y control ambiental.

36.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopios temporales

Dada la naturaleza de movimiento continuo del frente de obra, no se implementó un campamento base fijo. Se trabaja con un sistema de instalaciones transitorias para el soporte logístico. Se verificó que los puntos de descanso y áreas de parqueo temporal de la maquinaria cumplieran con las distancias de aislamiento a cuerpos de agua.

36.2. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el período reportado, en el municipio de Pandi se ejecutaron actividades correspondientes a la aplicación de doble riego, como parte de las acciones orientadas al mejoramiento y conservación de la capa de rodadura de la vía. Esta intervención permitió mejorar las condiciones superficiales del corredor vial,

favorecer la transitabilidad y contribuir a la protección y prolongación de la vida útil de la vía intervenida.

Las actividades desarrolladas en el frente de trabajo no requirieron el ingreso, movilización ni utilización de vehículos o maquinaria pesada, dado que las labores ejecutadas se realizaron mediante procedimientos y herramientas acordes con las condiciones particulares del tramo intervenido. En consecuencia, durante el período evaluado no se generaron impactos ambientales asociados a la operación de maquinaria o tránsito de vehículos dentro del frente de obra.

En materia ambiental, se realizó seguimiento a los aspectos relacionados con la ejecución del doble riego, especialmente al manejo y disposición adecuada de los materiales e insumos utilizados, prevención de derrames, manejo de residuos y conservación de las condiciones ambientales del área intervenida. De esta manera, se procuró mantener bajo control los posibles impactos derivados de la actividad y garantizar la aplicación de las medidas de manejo ambiental correspondientes.

Los indicadores ambientales constituyen herramientas de seguimiento que permiten verificar el cumplimiento de las medidas establecidas para prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales asociados a las actividades ejecutadas, así como evaluar el desempeño ambiental durante el desarrollo de las obras.

37. INDICADORES PANDI

Los indicadores ambientales son herramientas fundamentales en una obra civil para medir y minimizar el impacto que el proceso constructivo genera sobre el entorno natural.

Tabla 94.Conformación del grupo de gestión ambiental y social.

OBJETIVO	
Definir las acciones y garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía ambiental-PAGA, en el que se definan las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o compensarlos impactos generados por las diferentes actividades constructivas.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

100% profesionales contratados,100% de informes entregados., ≥ 90% indicadores PAGA cumplidos.	$\frac{No\ de\ profesionales\ contratados}{No\ de\ profesionales\ requeridos}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ Requerimientos\ Emitidos}{No\ de\ Requerimientos\ superados}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ informes\ Emitidos}{No\ de\ informes\ requeridos}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ profesionales\ contratados}{No\ de\ profesionales\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ Requerimientos\ Emitidos}{No\ de\ Requerimientos\ superados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ informes\ Emitidos}{No\ de\ informes\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

Se informa que, durante el periodo evaluado, el indicador correspondiente a la Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social registra un valor de cero (0), en razón a que no se requirió la estructuración formal de dicho comité. Esta decisión está plenamente justificada por el alcance actual de las actividades, las cuales se limitan exclusivamente a la intervención, adecuación y mantenimiento puntual de las alcantarillas. Al tratarse de labores localizadas, de bajo impacto y de carácter eminentemente técnico y manual, no se generan las dinámicas socioambientales complejas que ameriten la activación de un grupo de gestión a gran escala, garantizando de igual manera el cumplimiento de las obligaciones contractuales mediante el control directo en obra.

Tabla 95. Capacitación y concienciación del personal de obra.

OBJETIVO	
Garantizar la inducción, capacitación, entrenamiento y actualización de los colaboradores en los temas referentes a los componentes ambiental, flora y fauna y de las medidas de manejo establecidas para prevenir, minimizar y/o corregir los impactos ambientales del proyecto durante su etapa de mantenimiento.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% del personal con inducción ≥ del personal de la obra capacitado,0% de	$\frac{No\ de\ personal\ con\ induccion}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ personal\ capacitadoen\ temas\ ambientales}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100$

quejas por afectación ambiental.	

$$\text{Pandi} = \frac{No\ de\ personal\ con\ induccion}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ personal\ capacitadoen\ temas\ ambientales}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 96. Seguimiento y control de los requerimientos legales

OBJETIVO	
Definir las acciones y contar con los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones por uso e intervención de recursos naturales que requiere el proyecto, Cumplir con la normatividad vigente, en relación con los mecanismos de participación, control social, atención a los derechos de petición y las solicitudes de información.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de permisos obtenidos y aprobados, 100% de normas comunicadas y aplicadas.	$\frac{No\ de\ permisos\ obtenidos}{No\ de\ permisos\ requeridos\ por\ el\ proyecto}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ personal\ capacitado\ de\ normatividad\ ambiental}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ permisos\ obtenidos}{No\ de\ permisos\ requeridos\ por\ el\ proyecto}\ x\ 100 = \frac{1}{1} x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ personal\ capacitado\ de\ normatividad\ ambiental}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Se requería 1 permiso y se obtuvo 1 permiso. El resultado es del 100%, lo que indica un cumplimiento total de la normativa legal vigente hasta el momento. Este permiso hace parte de la cantera aprobada ya que cuenta con sus documentos al día.

Tabla 97. Manejo integral de materiales de construccion

OBJETIVO	
Establecer las medidas y acciones conducentes a la obtención de materiales para la ejecución de obras y definir las acciones para el manejo de materiales en el sitio de las obras y sitios de acopio temporal.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

100% de las medidas establecidas. 0% de requerimientos	$\frac{No\ de\ medidas\ implementadas\ en\ el\ periodo}{No\ de\ medidas\ que\ se\ debia\ ejecutar}\ x\ 100$ $\frac{Cantidad\ de\ material\ utilizados}{Cantidad\ de\ material\ requeridos}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ medidas\ implementadas\ en\ el\ periodo}{No\ de\ medidas\ que\ se\ debia\ ejecutar}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Cantidad\ de\ material\ utilizados}{Cantidad\ de\ material\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{270\ m^3}{270\ m^3}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 98.Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales.

OBJETIVO	
Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
90% de señales requeridas e instaladas, 90% de los frentes de obra señalizados, 90% de acopios protegidos, demarcados y señalizados.	$\frac{No\ de\ señales\ implementadas\ en\ obra}{No\ de\ señales\ establecidas\ en\ el\ PMT}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ frentes\ de\ obras\ señalizados}{No\ total\ de\ frentes\ de\ obra}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ señales\ implementadas\ en\ obra}{No\ de\ señales\ establecidas\ en\ el\ PMT}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ frentes\ de\ obras\ señalizados}{No\ total\ de\ frentes\ de\ obra}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 99. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos

OBJETIVO	
Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte, aprovechamiento y disposición final de los escombros, materiales sobrantes, RCD´s y/o lodos provenientes de las obras de infraestructura vial, de manera que prevenga, minimice y/o controle los impactos que producen sobre el ambiente.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

100% de material de excavación aprovechado y reutilizado en obra, 100% de material de RCD dispuesto en escombreras autorizadas.	$\frac{Volumen\ de\ material\ de\ Excavacion}{Volumen\ de\ material\ reutilizados\ y\ aprovechado}\ x\ 100$ $\frac{Volumen\ de\ material\ de\ RCD\ generado\ en\ el\ Proyecto}{Volumen\ de\ material\ dispuesto\ en\ sitio\ autorizado}\ x\ 100$

$$\frac{Volumen\ de\ material\ de\ Excavacion}{Volumen\ de\ material\ reutilizados\ y\ aprovechado}\ x\ 100 = \frac{0\ m^3}{0\ m^3}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Volumen\ de\ material\ de\ RCD\ generado\ en\ el\ Proyecto}{Volumen\ de\ material\ dispuesto\ en\ sitio\ autorizado}\ x\ 100 = \frac{0m^3}{0\ m^3}\ x\ 100 = 100\ \%$$

Durante el periodo evaluado no se realizaron actividades de excavación, lo cual refleja un cumplimiento del 100 % del indicador establecido.

Tabla 100. Manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales

OBJETIVO	
Manejar y disponer adecuadamente los residuos sólidos que se generan durante las actividades de construcción, adecuación y/o reparación del proyecto, Aplicar los lineamientos de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de los residuos aprovechables y no aprovechables gestionados adecuadamente	$\frac{Kg\ de\ residuos\ peligoros\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ peligrosos\ generados}\ x\ 100$ $\frac{Kg\ de\ residuos\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ aprovechables\ generados}\ x\ 100$ $\frac{Kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ generados}\ x\ 100$ $\frac{Puntos\ ecologicos\ instalados}{Puntos\ Ecologicos\ Programados}\ x\ 100$

$$\frac{Kg\ de\ residuos\ peligrosos\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ peligros\ generados}\ x\ 100 = \frac{0\ kg}{0\ kg}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Kg\ de\ residuos\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ aprovechables\ generados}\ x\ 100 = \frac{0\ kg}{0\ kg}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ generados}\ x\ 100 = \frac{0\ kg}{0\ kg}\ x\ 100 = 100\%$$

$$Pandi = \frac{Puntos\ ecologicos\ instalados}{Puntos\ Ecologicos\ Programados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100$$

Finalmente, como parte de la adecuación logística de la obra, se instaló un (1) punto ecológico. Este avance, alineado con el cronograma del Plan de Gestión Integral de Residuos, permite centralizar la segregación en la fuente y optimizar el manejo de los materiales generados en el proyecto.

Tabla 101. Manejo de aguas superficiales

OBJETIVO	
Definir las medidas para cumplir con las normas legales vigentes para la captación, transporte y uso del agua, de tal manera que prevenga, minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de volumen de agua utilizado en obra debidamente cuantificado.	$\frac{Volumen\ de\ agua\ usado}{Volumen\ de\ actas\ de\ suministro\ o\ compras}\ x\ 100$

$$\frac{Volumen\ de\ agua\ usado}{Volumen\ de\ actas\ de\ suministro\ o\ compras}\ x\ 100 = \frac{0\ m^3}{0\ m^3}\ x\ 100\ \%$$

Tabla 102. Seguimiento y control al manejo de residuos líquidos

OBJETIVO	
Establecer medidas que para controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres requeridos para ejecución de los proyectos.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

100% de instalación de USP en los frentes de obra, Por cada 15 trabajadores en obra se debe contar con 1 USP	$\frac{Baños\ alquilados}{Baños\ requeridos}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ derrames\ generados}{No\ de\ derrames\ controlados}\ x\ 100$

$$\frac{Baños\ alquilados}{Baños\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ derrames\ generados}{No\ de\ derrames\ controlados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Se alcanzó un 100% de cumplimiento en el indicador de prevención de vertimientos gracias a la concertación efectiva con los ciudadanos Cesilia Guerrero (Pandi). Mediante estos acuerdos, se garantizó el manejo adecuado de aguas residuales en la zona de influencia, cumpliendo con los objetivos de protección del recurso hídrico.

Tabla 103. Manejo de descapote y cobertura vegetal.

OBJETIVO	
Establecer las acciones para el manejo de la vegetación que será intervenida y/o afectada por las obras del proyecto, de manera que se prevengan, minimicen y controlen los impactos producidos sobre la vegetación.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
0% de cobertura vegetal afectada	$\frac{No\ de\ acciones\ adelantadas}{No\ de\ acciones\ a\ ejecutar}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ acciones\ adelantadas}{No\ de\ acciones\ a\ ejecutar}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

Se ejecutó 1 acción de manejo de las 1 programada. El resultado es del 100%, lo cual indica que las medidas para proteger la vegetación se cumplieron según lo planeado.

Tabla 104.Protección de la Fauna en vías

OBJETIVO	
Prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos sobre la fauna silvestre, especialmente aquellas especies con algún grado de amenaza (CR, EN, VU) identificadas en las áreas de influencia del proyecto, y promover su conservación	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

0% de fauna afectada	$\frac{No\ de\ capacitaciones\ ejecutadas\ sobre\ fauna}{No\ de\ capacitaciones\ programadas\ sobre\ fauna}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ fauna\ evidenciada}{No\ de\ fauna\ reportada}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ capacitaciones\ ejecutadas\ sobre\ fauna}{No\ de\ capacitaciones\ programadas\ sobre\ fauna}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ fauna\ evidenciada}{No\ de\ fauna\ reportada}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Durante el período evaluado, la gestión ambiental del proyecto demostró un desempeño óptimo en materia de conservación de los recursos bióticos, alcanzando un 100% de cumplimiento en los indicadores de fauna analizados.

Tabla 105. Instalación funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopios temporales

OBJETIVO	
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de las zonas de acopios autorizadas 100% de áreas recuperadas 0% de requerimientos	$\frac{No\ Acopios\ utilizados}{No\ de\ acopios\ con\ autorizacion}\ x\ 100$ $\frac{m^2\ de\ zonas\ recuperadas}{m^2\ de\ areas}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ campamentos\ instalados}{No\ de\ campamentos\ requeridos}\ x\ 100$

$$\frac{No\ Acopios\ utilizados}{No\ de\ acopios\ con\ autorizacion}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{m^2\ de\ zonas\ recuperadas}{m^2\ de\ areas}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ campamentos\ instalados}{No\ de\ campamentos\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

En lo referente al manejo del suelo y la infraestructura operativa del proyecto, los indicadores evaluados registraron un 100% de cumplimiento institucional, reflejando

la ausencia de nuevas intervenciones temporales durante el periodo. Por una parte, el indicador de acopios cerró en un escenario de total conformidad (100%), debido a que no se requirió la habilitación ni el uso de zonas de acopio dinámicas en los frentes de obra. Asimismo, al no registrarse la apertura de nuevos frentes que demandaran la entrega o abandono de terrenos, las variables de metros cuadrados de zonas recuperadas frente a áreas intervenidas se mantuvieron en cero, consolidando una efectividad del 100% en el control superficial. Finalmente, el indicador de campamentos operó bajo la misma dinámica de estabilidad (100%), toda vez que no se contempló la instalación de campamentos adicionales a la infraestructura logística ya establecida, garantizando un estricto control territorial y de planeación ambiental en el desarrollo de las actividades.

Tabla 106. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

OBJETIVO	
Definir las acciones a ejecutar para manejar los impactos generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos y cumplir con la legislación nacional vigente.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% vehículos con certificado de revisión técnico mecánica vigente, 0% de accidentes de maquinaria y equipos.	$\frac{No\ de\ vehiculos\ con\ revision\ tecnomecanica}{No\ de\ vehiculos\ trabajando\ en\ obra}\ x\ 100$ $\frac{No\ \ de\ derrames\ de\ combustibles\ ocurridos}{No\ de\ derrames\ de\ combustibles\ controlados}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ vehiculos\ con\ revision\ tecnomecanica}{No\ de\ vehiculos\ trabajando\ en\ obra}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\ \%$$

$$\frac{No\ \ de\ derrames\ de\ combustibles\ ocurridos}{No\ de\ derrames\ de\ combustibles\ controlados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

En lo concerniente al control operacional de maquinaria y prevención de la contaminación, las variables analizadas consolidaron un 100% de efectividad y cumplimiento normativo en el periodo.

CAPITULO 6 TIBACUY

31. ACTIVIDADES DE OBRA TIBACUY

Durante el período reportado (mes de julio), únicamente se ejecutaron trabajos de conformación de cunetas en el municipio. Esta actividad se desarrolló con el propósito de optimizar el manejo de las aguas de escorrentía superficial, garantizar el adecuado drenaje de la vía y prevenir afectaciones por erosión o estancamiento

en la banca. De esta manera, se contribuye directamente a la conservación de la infraestructura vial, asegurando la transitabilidad y seguridad para la comunidad.

38. PROGRAMA 1 GESTION DEL PROYECTO

38.1. Reunión del grupo de gestión ambiental y social en Tibacuy

Durante el período reportado, no se requirió la realización de reuniones ni socializaciones presenciales del Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA V6.2) en el municipio de Tibacuy. Lo anterior se debe a la dinámica operativa e itinerante de los trabajos ejecutados en este frente, los cuales no contemplaron la permanencia continua de personal ni frentes de obra fijos en sitio.

No obstante, las actividades puntuales desarrolladas se ejecutaron bajo el estricto cumplimiento de los lineamientos, obligaciones ambientales y técnicas estipuladas en el PAGA V6.2, garantizando la correcta prevención y manejo de los impactos ambientales según la normativa vigente.

38.2. Capacitación y concienciación para el personal de obra

Teniendo en cuenta el plan de adaptación del guía ambiental aprobado, el especialista ambiental se encargará de impartir charlas y capacitaciones al inicio de todos los trabajos sobre temas relacionados con gestión ambiental de acuerdo a lo establecido en el cronograma de capacitaciones de obra. Entre los temas ambientales para las capacitaciones se contempla:

- Inducción ambiental inicial
- Manejo adecuado de residuos de obra
- Uso eficiente del agua
- Control de polvos y partículas
- Prevención de derrames de sustancias peligrosas
- Cuidado de fauna y flora

Dichos temas están sujetos a modificaciones de acuerdo a la necesidad y tiempos del proyecto.

Respecto a las actividades de capacitación y concienciación para el personal de obra, se informa que estas no se llevaron a cabo en el municipio de Tibacuy debido a la ausencia de personal local contratado en dicho punto.

38.3. Cumplimiento de requerimientos legales

El programa Cumplimiento de Requerimientos Legales (identificado como DAGA-1.3-03 en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental – PAGA) constituye el pilar fundamental que asegura la legalidad de todas las actividades constructivas y operativas del proyecto.

Este apartado tiene como objetivo central garantizar la conformidad total del Contrato ICCU No. 140-2025 con las leyes, decretos, resoluciones, licencias, y demás instrumentos de gestión ambiental.

38.3.1. Documentación (permisos ambientales y mineros)

Para lograr los objetivos propuestos se requiere que Consorcio VICGER conozca los requisitos legales y contractuales establecidos para el contrato de obra ICCU-140 DE 2025, se relacionaran a los permisos aplicables de nuestros proveedores.

Tabla 107. Documentación proveedores

TIPO DE MATERIAL	UBICACIÓN	CANTERA	REGISTRO MINERO	LICENCIA AMBIENTAL	VIGENCIA	AÑO DE ADJUDICACION
Materiales de arrastre (gravas, arenas y conglomerados)	Nilo, departamento de Cundinamarca, específicamente en la confluencia de los ríos Paguey y Sumapaz.	Agregados La Floresta.	El contrato de concesión de mediana minería tiene el número BGI-141. Su inscripción en el Registro Minero Nacional se realizó el 24 de noviembre de 2003.	Resolución DJUR No. 50247000054 del 2 de abril de 2024. El expediente ambiental asociado es el N°30222.	07-05-2025 hasta el 31-07-2026.	30 de marzo de 2007

La tabla detalla la información técnica y legal del contrato de concesión BGI-141, identificado comercialmente a través de la cantera La Floresta. Este proyecto se dedica a la explotación de materiales de construcción, específicamente materiales de arrastre como gravas, arenas y conglomerados, además de sílices y recebo. Se encuentra ubicado estratégicamente en el municipio de Nilo, Cundinamarca, en la zona de confluencia de los ríos Paguey y Sumapaz, un área clave para la obtención de estos agregados naturales de alta demanda en el sector de la infraestructura.

En cuanto a su respaldo jurídico, la tabla refleja que el título minero fue adjudicado inicialmente en 2001 y formalizado como contrato en 2007, con una vigencia que se extiende hasta el 16 de septiembre de 2037. Su operación está plenamente autorizada por la reciente Licencia Ambiental (Resolución 054 de abril de 2024) emitida por la CAR y cuenta con el registro RUCOM vigente para la comercialización legal de los minerales. En resumen, la información describe una actividad minera de mediana escala que cumple con todos los requisitos de ley para operar y vender sus productos durante la próxima década.

39. PROGRAMA 2 MANEJO DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

El programa Manejo integral de materiales de construcción (DAGA-2.1-01), enmarcado en el Programa de Manejo de Actividades Constructivas, es crucial para garantizar que el Contrato ICCU No. 140-2025 se ejecute bajo principios de sostenibilidad y legalidad; su objetivo primordial es asegurar la trazabilidad y eficiencia de todos los insumos, desde los agregados hasta los estabilizantes químicos no tradicionales, certificando que provengan de fuentes legales autorizadas y minimizando los impactos ambientales asociados a su almacenamiento, transporte y uso. La gestión rigurosa de este programa es fundamental para prevenir la contaminación del suelo y aire (por polvo, dispersión de material y/o derrames), optimizar el consumo de recursos y, en última instancia, avalar la calidad de la obra vial con un mínimo impacto ambiental.

Tabla 108. Cantidad de materiales Tibacuy

FECHA DE ENTREGA	CANTIDAD (m3)	MATERIAL	Placa volqueta	Proveedor
31/7/2026	15	B-400	SOR538	AGREGADOS LA FLORESTA

VER ANEXO 21. CERTIFICADO DE MATERIAL TIBACUY

39.1. Manejo integral de materiales de construcción

En cumplimiento con las medidas establecidas en el PAGA para el Contrato ICCU-140, se describen las acciones implementadas para el manejo de materiales:

39.1.1. Suministro y Transporte

- El material pétreo y de cantera proviene exclusivamente de fuentes con licencia ambiental vigente.
- Los vehículos de transporte cuentan con carpas debidamente aseguradas para evitar la dispersión de material particulado en el trayecto hacia los frentes de obra.
- Se verifica que la maquinaria y volquetas cuenten con revisiones técnico-mecánicas al día para prevenir derrames de hidrocarburos sobre la vía.

39.1.2. Acopio y Almacenamiento

- De acuerdo con la planificación operativa, el material granular recibido se extiende de forma inmediata sobre el corredor vial para su posterior conformación y estabilización.
- Dado que el material no permanece almacenado en zonas de reserva, no se requiere la implementación de medidas para el control de escorrentía o protección de taludes en puntos de acopio, mitigando así cualquier impacto visual o alteración del suelo adyacente.

39.1.3. Manejo de sustancias químicas

En la obra, se utilizó la siguiente sustancia química en los tramos estabilizados en el municipio de Tibacuy, la cual será previamente rotulada conforme a los requisitos del **Sistema Globalmente Armonizado (SGA)**. Y contara con el manejo adecuado de acuerdo a lo establecido en el PAGA.

Tabla 109. Tabla de sustancias químicas Tibacuy

No	SUSTANCIA	TIPO/ USO PRINCIPAL	FICHA DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES O PELIGROS
1	PROES	Construcción y rehabilitación de la malla vial como caminos mineros y petroleros, vías	SI	Nocivo en caso de ingestión (H302), contacto con la piel

No	SUSTANCIA	TIPO/ USO PRINCIPAL	FICHA DE SEGURIDAD	OBSERVACIONES O PELIGROS
		industriales, vías urbanas y residenciales, plataformas industriales y logística, vías y concesiones de alto tráfico, vías rurales 2 y 3 orden.		(H312) e inhalación (H332)
2	ACPM	Combustible de destilación pesada. Se usa principalmente en maquinaria amarilla, volquetas y generadores eléctricos debido a su alto torque y eficiencia térmica.	ONU: 1202. Clase 3 (Líquido Inflamable). Punto de inflamación: 52°C. Es menos volátil que la gasolina, pero persistente en el ambiente.	Salud: Irritación cutánea por contacto prolongado. Ambiente: Altamente contaminante para suelos y fuentes hídricas (biodegradación lenta).
4	Gasolina	Combustible de destilación liviana. Se utiliza en vehículos livianos, motobombas, herramientas menores (cortadoras) y como solvente en limpiezas específicas.	ONU: 1203. Clase 3 (Líquido Inflamable). Punto de inflamación: $-43°C. Extremadamente volátil; genera vapores inflamables a temperatura ambiente.	Su alto octanaje la hace ideal para motores de alta revolución. No debe mezclarse con otros solventes ni usarse para "encender" fogatas por su riesgo de explosión súbita. Explosión: Riesgo extremo de incendio por chispas o estática. Salud: La inhalación de vapores puede causar mareos o pérdida del conocimiento.

39.1.4. Lugar de acopio de sustancias químicas

Dada la naturaleza móvil y progresiva de la obra, la gestión logística y el almacenamiento del material PROES se ejecutarán bajo un esquema de acopio temporal y dinámico. Se garantiza que, a partir del inicio de la ejecución de la obra (fase de construcción), se establecerán inmediatamente puntos de acopio provisionales en localizaciones estratégicas a lo largo del trayecto.

Dichos puntos serán seleccionados y acondicionados para garantizar el almacenamiento seguro de PROES, protegiéndolo de agentes externos y cumpliendo con todas las condiciones técnicas requeridas para la preservación de su integridad y calidad. Esta planificación asegura la disponibilidad oportuna del material y minimiza los tiempos de manipulación y transporte dentro del área de intervención.

39.1.5. Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales

En cumplimiento con las medidas de control de impactos por infraestructura de obra, se informa lo siguiente:

- El proyecto cuenta con un PMT debidamente estructurado y aprobado para la intervención de las vías vecinales. Este programa se encuentra plenamente implementado en los frentes de obra, garantizando la seguridad de los usuarios de la vía y del personal operativo.
- Se dispone de señalización preventiva, informativa y reglamentaria (conos, paleteros, señales de "Hombres trabajando", entre otras) que se desplaza conforme al avance de la estabilización y la conformación de la vía.
- Como se mencionó en el numeral 6.1, no se presentan acopios temporales de material de cantera en la franja vial debido a su uso inmediato.

39.1.6. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos

Durante el periodo correspondiente al mes de julio de 2026, la generación de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) fue de cero (0). Lo anterior se debe a que, dentro del cronograma de obra ejecutado en este mes, no se realizaron intervenciones ni actividades constructivas en las alcantarillas proyectadas. Al no ejecutarse excavaciones estructurales, demoliciones ni modificaciones en dichas estructuras hidráulicas, no se derivó ningún tipo de material sobrante asociado a este componente.

39.1.7. Procedencia y Localización del Material

No se registra procedencia ni localización de materiales asociados a Residuos de Construcción y Demolición (RCD).

39.1.8. Gestión y Disposición Final

Durante el período reportado, las actividades se limitaron exclusivamente a la conformación de cunetas, procedimiento que consistió únicamente en el reacomodamiento, perfilado y limpieza de la franja vial existente. En consecuencia, no se generó ningún tipo de Residuo de Construcción y Demolición (RCD) ni material sobrante de excavación, por lo que no se requirieron labores de transporte, aprovechamiento ni disposición final de residuos durante este lapso.

39.1.9. Protocolo de Entrega y Donación

Ante la ausencia de un PMARCD específico y siguiendo los lineamientos generales de buenas prácticas ambientales del proyecto, se aplicó el siguiente protocolo:

- El equipo ambiental y técnico realizó una visita previa al predio receptor de para verificar que el sitio de vertido no presentara riesgos de inestabilidad, afectación a cuerpos de agua o áreas de importancia ecológica.
- El transporte de los RCD se realizará con ayuda de la maquinaria amarilla, realizando el traslado directo desde la abscisa a intervenir hasta el predio receptor, evitando el acopio temporal en la vía.
- Una vez descargado el material, se procederá a realizar el extendido y nivelación básica en el área designada, asegurando condiciones de orden y limpieza.
- La actividad se legalizará mediante la suscripción de un Acta de Entrega de Material de Beneficio, firmada por la receptora y el ingeniero ambiental del Consorcio, donde se especifica la voluntariedad de la donación, el volumen entregado y el compromiso de uso adecuado por parte de la beneficiaria.

Tabla 110. Control de RCD Tibacuy

AÑO	PERIODO	RCD	CANTIDAD m3
2026	Abril	Excavación	0
		Demolición	0
	mayo	Excavación	96
		Demolición	16
	junio	Excavación	114,65
		Demolición	0

	julio	Excavación	0
		Demolición	0
TOTAL			112

39.1.10. Manejo de residuos peligrosos

El manejo adecuado de los residuos sólidos convencionales y peligrosos (RESPEL) y residuos especiales generados durante la ejecución de la obra es un pilar fundamental para garantizar la sostenibilidad ambiental y el cumplimiento legal del proyecto. La naturaleza de las actividades de construcción y minería inevitablemente produce subproductos que, debido a sus características corrosivas, tóxicas, reactivas o inflamables, representan un riesgo significativo para la salud humana y los ecosistemas si no son gestionados correctamente.

Durante el presente período, las actividades ejecutadas en el tramo a intervenir de este municipio no generaron Residuos Peligrosos (RESPEL). En consecuencia, no se cuenta con registros ni manifiestos de traslado aplicables para este ciclo de reporte.

39.1.10.1. Manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales

Los residuos sólidos comunes (o convencionales) son aquellos que se producen regularmente en hogares y empresas. Estos se clasifican en varias categorías para su manejo, incluyendo: los que no se pueden aprovechar, los aprovechables, los orgánicos aprovechables y los peligrosos o especiales.

Los residuos no aprovechables se caracterizan por no ser reciclables ni biodegradables. Tardan mucho tiempo en descomponerse naturalmente. Ejemplos de estos son las servilletas, el icopor (poliestireno expandido) y los papeles metalizados.

Durante el período reportado, no se evidenció generación de residuos sólidos no aprovechables asociada al desarrollo de las actividades ejecutadas en el municipio de Tibacuy. Lo anterior se debe a que la actividad de aplicación de doble riego fue desarrollada por un grupo reducido de dos (2) trabajadores, quienes no permanecieron de manera constante en el punto de intervención, sino que realizaron las labores de acuerdo con el avance y las necesidades específicas de la actividad.

Adicionalmente, por las características y duración de las labores ejecutadas, no se desarrollaron actividades permanentes de permanencia, alimentación o generación de residuos domésticos en el frente de obra. En consecuencia, durante el período evaluado no se registró generación de residuos tales como servilletas, icopor,

papeles metalizados u otros residuos no aprovechables asociados directamente al desarrollo de la actividad.

En caso de generarse eventualmente algún residuo durante la ejecución de las actividades, este deberá ser recogido inmediatamente y manejado de acuerdo con las disposiciones establecidas para su adecuada separación, almacenamiento y disposición final, evitando su abandono en el área intervenida.

Tabla 111. Control de residuos sólidos convencionales Tibacuy

AÑO	PERIODO	RESIDUO	CANTIDAD (KG)
2026	abril	Aprovechables	50
		No Aprovechables	8
	mayo	Aprovechables	12
		No Aprovechables	4
	junio	Aprovechables	10
		No Aprovechables	5
	julio	Aprovechables	0
		No Aprovechables	0
TOTAL			89

En la Tabla 8 se detalla la gestión y cuantificación del Consorcio respecto a la separación en la fuente de residuos aprovechables y no aprovechables. Durante el mes de abril, se registró una generación total de 58 kg de residuos, de los cuales 50 kg correspondieron a material aprovechable y 8 kg a no aprovechables. Por su parte, en el mes de mayo y junio se evidenció una reducción significativa en el volumen total, alcanzando los 15 kg; de estos, 10 kg fueron clasificados como aprovechables y 5 kg como no aprovechables. Esta tendencia refleja la efectividad de las medidas de minimización implementadas en los frentes de obra.

39.1.10.2. Acopio temporal de residuos sólidos convencionales generados.

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el presente documento, en cada punto operativo de los municipios involucrados en el proyecto se ha implementado un punto ecológico para el acopio temporal de residuos sólidos convencionales. Estos puntos ecológicos cuentan con recipientes debidamente identificados y señalizados, permitiendo la adecuada separación, almacenamiento y manejo de los residuos generados durante las actividades de obra, garantizando condiciones de orden, higiene y control ambiental, previo a su recolección y disposición final conforme a la normativa vigente.

39.1.10.3. Disposición final de los residuos sólidos convencionales

La disposición final de los residuos sólidos convencionales generados en la obra se gestionará mediante la coordinación directa con la Alcaldía de cada municipio donde se ejecute el proyecto.

Esta coordinación buscará asegurar la entrega de los residuos a los operadores de servicios públicos competentes, quienes serán los encargados de realizar la respectiva disposición final de acuerdo con la normativa y las infraestructuras sanitarias autorizadas por la autoridad local (rellenos sanitarios o plantas de tratamiento)

39.1.10.4. Manejo de residuos peligrosos

Los residuos peligrosos o especiales son aquellos residuos que, por sus características infecciosas, tóxicas, explosivas, corrosivas, inflamables, volátiles, combustibles, radiactivas o reactivas puedan causar riesgos a la salud humana y el medio ambiente. Una vez se generen RESPEL se deberán disponer adecuadamente.

Tabla 112. Control de RESPEL Tibacuy

AÑO	PERIODO	TIPO DE MATERIAL	CANTIDAD EN KG	GESTOR DE DISPOSICION FINAL
2026	Abril	0	0	NA
	mayo	0	0	NA
	junio	0	0	NA
	julio	0	0	NA
TOTAL			0	_____

En la Tabla 92, denominada 'Control de RESPEL Tibacuy', se presenta el consolidado de la generación de residuos peligrosos para el año 2026. Durante los meses de abril, mayo, junio se reporta una generación de 0 kg, lo que indica que en el tramo intervenido no se realizaron actividades que derivaran en excedentes de naturaleza especial o peligrosa. En consecuencia, al no existir materiales para gestionar, no se requirió la contratación de gestores externos de disposición final durante este bimestre.

39.1.10.4.1. Clasificación y acopio de residuos peligrosos

Los residuos generados en la obra se clasifican como peligrosos cuando son de naturaleza química o tóxica, incluyendo productos como disolventes, pinturas,

barnices y adhesivos. También se consideran peligrosos los aceites y lubricantes usados provenientes del mantenimiento de maquinaria y equipos.

Los residuos especiales están constituidos por los recipientes o envases que han contenido estas sustancias peligrosas.

40. PROGRAMA 3 GESTION HIDRICA

El uso eficiente del agua es de vital importancia en la construcción para reducir el impacto ambiental del proyecto y garantizar la disponibilidad de este recurso. Por lo tanto, se deben implementar estrategias que optimicen su consumo y prevengan la contaminación de los cuerpos de agua cercanos.

40.1. Manejo de aguas superficiales

El programa del Manejo de aguas superficiales constituye el pilar de control dentro de la Gestión Hídrica del proyecto, cuyo objetivo primordial es doble: por un lado, prevenir la afectación y sedimentación de los cuerpos de agua naturales adyacentes a la vía mediante la implementación de controles de escorrentía, y por otro, garantizar la legalidad del recurso hídrico utilizado en el proceso constructivo.

En este sentido, un punto crucial de cumplimiento en el período fue la formalización del suministro de agua para las actividades de obra, la cual fue gestionada exitosamente con la Alcaldía del municipio de Tibacuy, entidad que facilitó el volumen de agua con su respectiva certificación de calidad, lo que asegura que el recurso utilizado es totalmente legal, controlado y no depende de la captación directa no autorizada de fuentes naturales, mitigando así el riesgo ambiental y normativo.

El agua para la obra es suministrada por parte del acueducto del municipio de Tibacuy mediante un carro tanque. Es importante destacar que, aunque el agua suministrada es potable, no está destinada para consumo humano.

Este recurso hídrico se utiliza exclusivamente para:

- El proceso constructivo del suelo en la obra
- El lavado de manos y cara del personal, garantizando la higiene básica en el sitio de trabajo.

En relación con el manejo del recurso hídrico durante el presente periodo, se informa que no se realizó un consumo de agua en el municipio de Tibacuy, tal como se encuentra consignado en la Tabla.

Tabla 113. Control de recurso hídrico Tibacuy

AÑO	PERIODO	CANTIDAD EN m3	GESTOR
2026	**abril**	21	Secretaria de planeación del municipio de Tibacuy – Cundinamarca
	mayo	40	Secretaria de planeación del municipio de Tibacuy – Cundinamarca
	junio	70	Secretaria de planeación del municipio de Tibacuy – Cundinamarca
	julio	0	NA
TOTAL		131	

40.2. Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales

En este municipio no se hará uso de baterías sanitarias portátiles. Se ha determinado que la logística para conseguir un proveedor en la zona de Tibacuy que garantice el suministro, el debido servicio de aseo y el mantenimiento de unidades portátiles es compleja. Por lo tanto, se ha optado por una solución de coordinación local:

Para el manejo de las aguas residuales domésticas generadas por el personal de obra durante el mes de julio de 2026, se han implementado las siguientes medidas:

40.2.1. Convenios y Soportes

El Consorcio ha suscrito acuerdos de arrendamiento y uso con propietarios de predios locales para garantizar el bienestar del personal. Durante este periodo, se mantiene vigente el convenio con el señor Ana Moreno, ubicado en Tibacuy Cundinamarca, para el uso de sus instalaciones sanitarias. Los soportes correspondientes.

40.2.2. Capacidad e infraestructura

- Se cuenta con 1 unidad sanitaria fijas para el uso exclusivo del personal administrativo y operativo.
- Las unidades sanitarias están conectadas directamente al sistema séptico del predio. En caso de sistema séptico, se ha verificado que este cuenta con la capacidad adecuada y se realiza el mantenimiento preventivo para evitar reboses o afectaciones al suelo.

40.2.3. Protocolo de Finalización y Paz y Salvo

De conformidad con los compromisos del PAGA, se precisa que durante el período reportado no se realizó el alquiler de instalaciones sanitarias ni de unidades portátiles en este frente de obra. Lo anterior se debe a que las labores ejecutadas correspondieron a actividades puntuales e itinerantes que no requirieron la presencia ni permanencia constante de personal en el sitio.

En consecuencia, para el presente período no aplica la ejecución de protocolos de entrega, verificación de estado de infraestructura sanitaria, ni suscripción de actas de paz y salvo por este concepto. En caso de que en etapas posteriores del proyecto se requiera la contratación fija de dichos servicios sanitarios por cambio en las condiciones operativas, se aplicarán rigurosamente los procedimientos de verificación y cierre contemplados en el plan ambiental.

41. PROGRAMA 4 BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS

El manejo ambiental de la obra se enfoca en la prevención, mitigación y compensación de los impactos generados sobre la fauna, la vegetación y el paisaje en las Provincias de Alto Magdalena, Tequendama y Sumapaz.

41.1. Programa de manejo de descapote y cobertura vegetal

Busca preservar y restaurar la cobertura vegetal del suelo durante cualquier proyecto de construcción retirando la vegetación y tierra superficial de forma controlada para almacenarla y reutilizarla, previniendo así la erosión, la perdida de nutrientes y el deterioro paisajístico.

41.2. Protección de la Fauna y Flora

Dada la presencia de especies de Fauna y Flora en la zona de influencia del proyecto, se cuenta con medidas de manejo ambiental con el fin de garantizar la no afectación de los mismos, por lo tanto, entre ellos se contemplan algunas de las siguientes actividades:

41.2.1. Prevención y Sensibilización:

- Identificación de áreas sensibles: Antes de iniciar cualquier actividad, se deben demarcar y señalizar las áreas cercanas a cuerpos de agua, parches de bosque o fragmentos vegetales en caso de que aplique.
- Capacitación: Todo el personal recibe inducción ambiental sobre la identificación de especies clave tanto de fauna y flora y la prohibición absoluta de caza, captura o alimentación.
- Control de Atractantes: Se gestionan los residuos sólidos y líquidos de manera rigurosa para evitar atraer fauna oportunista o depredadores.

41.2.2. Monitoreo:

- Inspección Previa: Se realizan inspecciones visuales diarias antes de cualquier actividad en obra. En caso de presencia de especies de fauna en medio de las actividades se detendrá la ejecución de la obra y se realizaran las medidas pertinentes.

Se informa que durante el presente periodo evaluado no se registraron hallazgos, avistamientos de especies de interés, ni situaciones de afectación biótica que requirieran acciones de manejo específicas. Debido a la ausencia de eventos significativos y de intervenciones en áreas de sensibilidad ecológica durante este mes, no se adjunta registro fotográfico ni descripción de actividades, ya que el estado de protección se mantuvo bajo condiciones normales de operación sin novedades.

42. PROGRAMA 5 MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPOS.

Es fundamental para concentrar las operaciones logísticas y de personal en puntos específicos, minimizando la huella de impacto sobre el área de influencia directa de la vía. Este proyecto busca establecer un ordenamiento espacial y operativo riguroso, asegurando que el funcionamiento de estas áreas sea ambientalmente responsable mediante la implementación de medidas como la delimitación física, la protección del suelo, el manejo de residuos y la adecuada disposición de aguas residuales. Finalmente, su planificación incluye el desmantelamiento y restauración total de estos sitios temporales una vez concluidas las obras, garantizando que el terreno retorne a condiciones similares a las originales, cumpliendo así con los compromisos ambientales del Contrato ICCU No. 140-2025.

42.1. Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopios temporales

Dada la naturaleza de movimiento continuo del frente de obra, no se implementó un campamento base fijo. Se trabaja con un sistema de instalaciones transitorias para el soporte logístico. Se verificó que los puntos de descanso y áreas de parqueo temporal de la maquinaria cumplieran con las distancias de aislamiento a cuerpos de agua.

42.2. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos

Durante el período reportado, de acuerdo con las actividades ejecutadas en el municipio de Pandi, correspondientes a la aplicación de doble riego, no fue necesario disponer de un sitio de parqueo, acopio o almacenamiento de maquinaria y

vehículos, toda vez que no se realizó ingreso ni permanencia de vehículos, maquinaria pesada o equipos móviles en el frente de intervención.

Las actividades desarrolladas fueron de carácter puntual y localizado, con la participación del personal estrictamente necesario para la ejecución del doble riego, sin requerir la instalación de áreas destinadas al estacionamiento o almacenamiento de equipos en el área del proyecto. En consecuencia, durante el período evaluado no se generaron impactos ambientales asociados al tránsito, operación o permanencia de maquinaria y vehículos en el frente de obra.

De igual manera, al no haberse realizado actividades de mantenimiento, abastecimiento de combustible, cambio de aceites, lubricantes o reparaciones de maquinaria dentro del área de intervención, no se generaron residuos peligrosos (RESPEL) derivados de estas actividades, ni se presentaron riesgos asociados a derrames de combustibles, aceites o lubricantes provenientes de maquinaria.

En consecuencia, para el período objeto de seguimiento, el componente relacionado con parqueo de maquinaria, mantenimiento de equipos y manejo de residuos peligrosos asociados a dichas actividades no presentó requerimientos ni novedades ambientales, manteniéndose las condiciones del área intervenida sin afectaciones derivadas de estos aspectos.

43. INDICADORES TIBACUY

Los indicadores ambientales son herramientas fundamentales en una obra civil para medir y minimizar el impacto que el proceso constructivo genera sobre el entorno natural.

Tabla 114.Conformación del grupo de gestión ambiental y social.

OBJETIVO	
Definir las acciones y garantizar el cumplimiento y desarrollo eficaz de las acciones propuestas en cada programa del Plan de Adaptación de la Guía ambiental-PAGA, en el que se definan las medidas necesarias para prevenir, minimizar, controlar y/o compensarlos impactos generados por las diferentes actividades constructivas.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

100% profesionales contratados,100% de informes entregados., ≥ 90% indicadores PAGA cumplidos.	$\frac{No\ de\ profesionales\ contratados}{No\ de\ profesionales\ requeridos}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ Requerimientos\ Emitidos}{No\ de\ Requerimientos\ superados}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ informes\ Emitidos}{No\ de\ informes\ requeridos}\ x\ 100$

- $\frac{No\ de\ profesionales\ contratados}{No\ de\ profesionales\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$

$$\frac{No\ de\ Requerimientos\ Emitidos}{No\ de\ Requerimientos\ superados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ informes\ Emitidos}{No\ de\ informes\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 115. Capacitación y concienciación del personal de obra.

OBJETIVO	
Garantizar la inducción, capacitación, entrenamiento y actualización de los colaboradores en los temas referentes a los componentes ambiental, flora y fauna y de las medidas de manejo establecidas para prevenir, minimizar y/o corregir los impactos ambientales del proyecto durante su etapa de mantenimiento.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% del personal con inducción ≥ del personal de la obra capacitado,0% de quejas por afectación ambiental.	$\frac{No\ de\ personal\ con\ induccion}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ personal\ capacitadoen\ temas\ ambientales}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100$

$$\text{Tibacuy} = \frac{No\ de\ personal\ con\ induccion}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ personal\ capacitado\ en\ temas\ ambientales}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 116. Seguimiento y control de los requerimientos legales

OBJETIVO	
Definir las acciones y contar con los permisos, autorizaciones, licencias y concesiones por uso e intervención de recursos naturales que requiere el proyecto, Cumplir con la normatividad vigente, en relación con los mecanismos de participación, control social, atención a los derechos de petición y las solicitudes de información.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de permisos obtenidos y aprobados, 100% de normas comunicadas y aplicadas.	$\frac{No\ de\ permisos\ obtenidos}{No\ de\ permisos\ requeridos\ por\ el\ proyecto}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ personal\ capacitado\ de\ normatividad\ ambiental}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ permisos\ obtenidos}{No\ de\ permisos\ requeridos\ por\ el\ proyecto}\ x\ 100 = \frac{1}{1} x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ personal\ capacitado\ de\ normatividad\ ambiental}{No\ de\ trabajadores}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Se requería 1 permiso y se obtuvo 1 permiso. El resultado es del 100%, lo que indica un cumplimiento total de la normativa legal vigente hasta el momento. Este permiso hace parte de la cantera aprobada ya que cuenta con sus documentos al día.

Tabla 117. Manejo integral de materiales de construccion

OBJETIVO	
Establecer las medidas y acciones conducentes a la obtención de materiales para la ejecución de obras y definir las acciones para el manejo de materiales en el sitio de las obras y sitios de acopio temporal.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de las medidas establecidas. 0% de requerimientos	$\frac{No\ de\ medidas\ implementadas\ en\ el\ periodo}{No\ de\ medidas\ que\ se\ debia\ ejecutar}\ x\ 100$ $\frac{Cantidad\ de\ material\ utilizados}{Cantidad\ de\ material\ requeridos}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ medidas\ implementadas\ en\ el\ periodo}{No\ de\ medidas\ que\ se\ debia\ ejecutar}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Cantidad\ de\ material\ utilizados}{Cantidad\ de\ material\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{15m^3}{15\ m^3}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 118.Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales.

OBJETIVO	
Prevenir los impactos que se generen por la falta de una adecuada señalización de los frentes de obra y de los sitios de uso temporal.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
90% de señales requeridas e instaladas, 90% de los frentes de obra señalizados, 90% de acopios protegidos, demarcados y señalizados.	$\frac{No\ de\ señales\ implementadas\ en\ obra}{No\ de\ señales\ establecidas\ en\ el\ PMT}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ frentes\ de\ obras\ señalizados}{No\ total\ de\ frentes\ de\ obra}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ señales\ implementadas\ en\ obra}{No\ de\ señales\ establecidas\ en\ el\ PMT}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ frentes\ de\ obras\ señalizados}{No\ total\ de\ frentes\ de\ obra}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

Tabla 119. Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos

OBJETIVO	
Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte, aprovechamiento y disposición final de los escombros, materiales sobrantes, RCD´s y/o lodos provenientes de las obras de infraestructura vial, de manera que prevenga, minimice y/o controle los impactos que producen sobre el ambiente.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de material de excavación aprovechado y reutilizado en obra, 100% de material de RCD dispuesto en escombreras autorizadas.	$\frac{Volumen\ de\ material\ de\ Excavacion}{Volumen\ de\ material\ reutilizados\ y\ aprovechado}\ x\ 100$ $\frac{Volumen\ de\ material\ de\ RCD\ generado\ en\ el\ Proyecto}{Volumen\ de\ material\ dispuesto\ en\ sitio\ autorizado}\ x\ 100$

$$\frac{Volumen\ de\ material\ de\ Excavacion}{Volumen\ de\ material\ reutilizados\ y\ aprovechado}\ x\ 100 = \frac{0\ \ m^3}{0\ m^3}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Volumen\ de\ material\ de\ RCD\ generado\ en\ el\ Proyecto}{Volumen\ de\ material\ dispuesto\ en\ sitio\ autorizado}\ x\ 100 = \frac{0m^3}{0\ m^3}\ x\ 100 = 100\ \%$$

Durante el periodo evaluado se realizaron actividades de excavación, lo cual refleja un cumplimiento del 100 % del indicador establecido.

Tabla 120. Manejo integral de los residuos sólidos convencionales y especiales

OBJETIVO	
Manejar y disponer adecuadamente los residuos sólidos que se generan durante las actividades de construcción, adecuación y/o reparación del proyecto, Aplicar los lineamientos de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de los residuos aprovechables y no aprovechables gestionados adecuadamente	$\frac{Kg\ de\ residuos\ peligoros\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ peligrosos\ generados}\ x\ 100$ $\frac{Kg\ de\ residuos\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ aprovechables\ generados}\ x\ 100$ $\frac{Kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ generados}\ x\ 100$ $\frac{Puntos\ ecologicos\ instalados}{Puntos\ Ecologicos\ Programados}\ x\ 100$

$$\frac{Kg\ de\ residuos\ peligrosos\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ peligros\ generados}\ x\ 100 = \frac{0\ kg}{0\ kg}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Kg\ de\ residuos\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ aprovechables\ generados}\ x\ 100 = \frac{0\ kg}{0\ kg}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{Kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ entregados\ a\ gestores}{kg\ de\ residuos\ no\ aprovechables\ generados}\ x\ 100 = \frac{0\ kg}{0\ kg}\ x\ 100 = 100\%$$

$$Tibacuy = \frac{Puntos\ ecologicos\ instalados}{Puntos\ Ecologicos\ Programados}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100$$

Finalmente, como parte de la adecuación logística de la obra, se instaló un (1) punto ecológico. Este avance, alineado con el cronograma del Plan de Gestión Integral de Residuos, permite centralizar la segregación en la fuente y optimizar el manejo de los materiales generados en el proyecto.

Tabla 121. Manejo de aguas superficiales

OBJETIVO	
Definir las medidas para cumplir con las normas legales vigentes para la captación, transporte y uso del agua, de tal manera que prevenga, minimice y/o controle los impactos que se producen sobre el recurso hídrico.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de volumen de agua utilizado en obra debidamente cuantificado.	$\frac{Volumen\ de\ agua\ usado}{Volumen\ de\ actas\ de\ suministro\ o\ compras}\ x\ 100$

$$\frac{Volumen\ de\ agua\ usado}{Volumen\ de\ actas\ de\ suministro\ o\ compras}\ x\ 100 = \frac{0\ m^3}{0\ m^3}\ x\ 100\ \%$$

Tabla 122. Seguimiento y control al manejo de residuos líquidos

OBJETIVO
Establecer medidas que para controlar y mitigar los impactos generados por los vertimientos residuales resultantes del funcionamiento de campamentos, oficinas y talleres requeridos para ejecución de los proyectos.

META	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
100% de instalación de USP en los frentes de obra, Por cada 15 trabajadores en obra se debe contar con 1 USP	$\frac{Baños\ alquilados}{Baños\ requeridos}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ derrames\ generados}{No\ de\ derrames\ controlados}\ x\ 100$

$$\frac{Baños\ alquilados}{Baños\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ derrames\ generados}{No\ de\ derrames\ controlados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Se alcanzó un 100% de cumplimiento en el indicador de prevención de vertimientos gracias a la concertación efectiva con los ciudadanos Ana Joaquina Moreno (Tibacuy). Mediante estos acuerdos, se garantizó el manejo adecuado de aguas residuales en la zona de influencia, cumpliendo con los objetivos de protección del recurso hídrico.

Tabla 123. Manejo de descapote y cobertura vegetal.

OBJETIVO	
Establecer las acciones para el manejo de la vegetación que será intervenida y/o afectada por las obras del proyecto, de manera que se prevengan, minimicen y controlen los impactos producidos sobre la vegetación.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
0% de cobertura vegetal afectada	$\frac{No\ de\ acciones\ adelantadas}{No\ de\ acciones\ a\ ejecutar}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ acciones\ adelantadas}{No\ de\ acciones\ a\ ejecutar}\ x\ 100 = \frac{1}{1}\ x\ 100 = 100\%$$

Se ejecutó 1 acción de manejo de las 1 programada. El resultado es del 100%, lo cual indica que las medidas para proteger la vegetación se cumplieron según lo planeado.

Tabla 124.Protección de la Fauna en vías

OBJETIVO	
Prevenir, mitigar y controlar los impactos negativos sobre la fauna silvestre, especialmente aquellas especies con algún grado de amenaza (CR, EN, VU) identificadas en las áreas de influencia del proyecto, y promover su conservación	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**

0% de fauna afectada	$\frac{No\ de\ capacitaciones\ ejecutadas\ sobre\ fauna}{No\ de\ capacitaciones\ programadas\ sobre\ fauna}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ fauna\ evidenciada}{No\ de\ fauna\ reportada}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ capacitaciones\ ejecutadas\ sobre\ fauna}{No\ de\ capacitaciones\ programadas\ sobre\ fauna}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ fauna\ evidenciada}{No\ de\ fauna\ reportada}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

Durante el período evaluado, la gestión ambiental del proyecto demostró un desempeño óptimo en materia de conservación de los recursos bióticos, alcanzando un 100% de cumplimiento en los indicadores de fauna analizados.

Tabla 125. Instalación funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopios temporales

OBJETIVO	
Prevenir, minimizar y controlar los impactos generados por la instalación, operación desmantelamiento del campamento y áreas de acopio temporal.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% de las zonas de acopios autorizadas 100% de áreas recuperadas 0% de requerimientos	$\frac{No\ Acopios\ utilizados}{No\ de\ acopios\ con\ autorizacion}\ x\ 100$ $\frac{m^2\ de\ zonas\ recuperadas}{m^2\ de\ areas}\ x\ 100$ $\frac{No\ de\ campamentos\ instalados}{No\ de\ campamentos\ requeridos}\ x\ 100$

$$\frac{No\ Acopios\ utilizados}{No\ de\ acopios\ con\ autorizacion}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{m^2\ de\ zonas\ recuperadas}{m^2\ de\ areas}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

$$\frac{No\ de\ campamentos\ instalados}{No\ de\ campamentos\ requeridos}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

En lo referente al manejo del suelo y la infraestructura operativa del proyecto, los indicadores evaluados registraron un 100% de cumplimiento institucional, reflejando

la ausencia de nuevas intervenciones temporales durante el periodo. Por una parte, el indicador de acopios cerró en un escenario de total conformidad (100%), debido a que no se requirió la habilitación ni el uso de zonas de acopio dinámicas en los frentes de obra. Asimismo, al no registrarse la apertura de nuevos frentes que demandaran la entrega o abandono de terrenos, las variables de metros cuadrados de zonas recuperadas frente a áreas intervenidas se mantuvieron en cero, consolidando una efectividad del 100% en el control superficial. Finalmente, el indicador de campamentos operó bajo la misma dinámica de estabilidad (100%), toda vez que no se contempló la instalación de campamentos adicionales a la infraestructura logística ya establecida, garantizando un estricto control territorial y de planeación ambiental en el desarrollo de las actividades.

Tabla 126. Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.

OBJETIVO	
Definir las acciones a ejecutar para manejar los impactos generados por la operación y mantenimiento de la maquinaria, equipos y vehículos y cumplir con la legislación nacional vigente.	
META	**INDICADORES DE CUMPLIMIENTO**
100% vehículos con certificado de revisión técnico mecánica vigente, 0% de accidentes de maquinaria y equipos.	$\frac{No\ de\ vehiculos\ con\ revision\ tecnomecanica}{No\ de\ vehiculos\ trabajando\ en\ obra}\ x\ 100$ $\frac{No\ \ de\ derrames\ de\ combustibles\ ocurridos}{No\ de\ derrames\ de\ combustibles\ controlados}\ x\ 100$

$$\frac{No\ de\ vehiculos\ con\ revision\ tecnomecanica}{No\ de\ vehiculos\ trabajando\ en\ obra}\ x\ 100 = \frac{6}{6}\ x\ 100 = 100\ \%$$

$$\frac{No\ \ de\ derrames\ de\ combustibles\ ocurridos}{No\ de\ derrames\ de\ combustibles\ controlados}\ x\ 100 = \frac{0}{0}\ x\ 100 = 100\%$$

En lo concerniente al control operacional de maquinaria y prevención de la contaminación, las variables analizadas consolidaron un 100% de efectividad y cumplimiento normativo en el periodo.

44. Matriz de cumplimiento ambiental paga

Este documento funciona como el tablero de control principal para asegurar que el proyecto respete la normativa legal y los compromisos adquiridos en el Plan de Acción de Gestión Ambiental (PAGA). Su propósito es listar cada una de las obligaciones ambientales, identificar los requisitos legales aplicables y permitir un seguimiento detallado para verificar si se están cumpliendo las medidas de

mitigación o compensación propuestas, evitando así sanciones o impactos negativos no controlados.

VER ANEXO 22. MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA CABRERA
VER ANEXO 23. MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA NARIÑO
VER ANEXO 24. MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA NILO
VER ANEXO 25. MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA JERUSALEN
VER ANEXO 26. MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA PANDI
VER ANEXO 27. MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA TIBACUY

45. Formato radicación y actualización ambiental proyectos.

Este formato es la herramienta administrativa oficial para formalizar el registro de un proyecto ante las áreas ambientales competentes y mantener su información al día. Sirve para documentar el estado inicial del proyecto, reportar cualquier cambio en el diseño o alcance que pueda alterar su impacto ambiental y garantizar que toda la trazabilidad documental esté organizada para auditorías o procesos de licenciamiento.

VER ANEXO 28. FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL PROYECTOS.

46. Seguimiento presupuesto PAGA

Este anexo tiene una función estrictamente financiera y de ejecución, orientada a garantizar que los recursos económicos asignados a la gestión ambiental se utilicen de manera eficiente. Permite monitorear cuánto dinero se ha invertido en actividades como manejo de residuos, reforestación o control de emisiones, comparando lo ejecutado contra lo planeado para asegurar que las metas ambientales no se vean comprometidas por falta de fondos.

VER ANEXO 29. SEGUIMIENTO PRESUPUESTO PAGA.

47. COMUNICADOS PRESENTADOS EN EL PERIODO

Tabla 127. Correspondencia del periodo.

RECIBIDAS
HALLAZGOS – RECORRIDO 02 DE JULIO DE 2026 CTO ICCU
HALLAZGOS – RECORRIDO 18 DE JUNIO DE 2026 CTO ICCU

OBSERVACIONES DEL INFORME MENSUAL DE ICCU - JUNIO 2026 ENVIADO 21 DE JULIO
Solicitud implementación medidas ambientales en obra enviado 21 de julio
Observaciones informe mayo versión 2 enviado el 15 y 20 de julio
Aprobación informe de mayo versión 2 enviado el 23 de julio
ENVIADAS
CVG – ICCU –OF-492-2026 Respuesta a Observación Ambiental AM – Proveedor TRAILERSMAN E.U.
CVG – ICCU –OF-489-2026 Remisión de documentación técnica y legal de la fuente de materiales para los municipios Nariño y Jerusalén
INFORME AMBIENTAL ABRIL VERSION 2 ENVIADO 6 DE JULIO
INFORME AMBIENTAL MAYO VERSION 2 ENVIADON 8 DE JULIO
INFORME AMBIENTAL JUNIO VERSION 2 enviado 30 de julio

48. CONCLUSIONES

48.1. Cabrera

- Construcción de 3 alcantarillas para el mejoramiento del sistema de drenaje vial.
- Se impartieron 1 charla y 2 capacitaciones al personal. No se requirió conformar un nuevo grupo de gestión ambiental por tratarse de labores puntuales de baja incidencia.
- Residuos (RCD, Convencionales y RESPEL): Se gestionaron 6 kg de residuos convencionales (4 kg aprovechables y 2 kg no aprovechables) entregados a la ruta de recolección municipal. La generación de RCD y de RESPEL fue de 0 m³ y 0 kg respectivamente durante este período.
- Gestión hídrica y saneamiento: Se utilizaron 15 m³ de agua suministrados por la Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos. Las necesidades sanitarias se cubrieron mediante convenio de alquiler de instalaciones locales con sistema séptico.
- Indicadores PAGA: 100% de cumplimiento en los indicadores evaluados.

48.2. Nariño

- Pavimentación de 938 metros lineales con asfaltita.
- Se ejecutaron 1 charla de inducción en SST/Ambiental y 2 capacitaciones enfocadas en materiales, señalización y protección de fauna/flora.

- Se recolectaron y clasificaron 40 kg de residuos convencionales (30 kg aprovechables y 10 kg no aprovechables) dispuestas con el municipio. No se registraron excedentes de RCD ni generación de RESPEL.
- Se reportó un consumo de 14.45 m³ de agua suministrada formalmente por la administración municipal. El servicio sanitario operó bajo acuerdo de alquiler de infraestructura local.
- 100% de efectividad en las metas ambientales aplicables.

48.3. Nilo

- Extendido de afirmado a lo largo de 3,998 metros lineales de vía.
- Conformación formal del Grupo de Gestión Ambiental y Social interdisciplinario. Dictado de 1 charla y 2 capacitaciones ambientales.
- Gestión de 50 kg de residuos sólidos convencionales (35 kg aprovechables y 15 kg no aprovechables). La generación de RCD y RESPEL se mantuvo en 0 kg.
- No se requirió consumo de agua para la actividad de extendido de material. Se sostuvo el convenio local para el acceso a unidades sanitarias fijas conectadas a pozo séptico.
- Cumplimiento total (100%) en los indicadores del programa.

48.4. Jerusalén

- Estabilización de 2,720 metros lineales de corredor vial.
- Reunión del equipo socioambiental y ejecución de 1 charla de inducción más 2 capacitaciones.
- Manejo y acopio de 30 kg de residuos convencionales (22 kg aprovechables y 8 kg no aprovechables). Generación nula (0 kg / 0 m³) de RCD y RESPEL.
- Suministro de 26 m³ de agua por parte de la Alcaldía Municipal mediante carro tanque. Baterías sanitarias atendidas mediante alquiler de instalaciones locales.
- 100% de cumplimiento en las matrices y metas ambientales.

48.5. Pandi

- Aplicación de doble riego sobre la capa de rodadura.
- No se requirió conformar grupo de gestión ni impartir capacitaciones debido a la ausencia de personal local contratado y la naturaleza itinerante de la labor.
- Se registró una generación de 0 kg de residuos convencionales, 0 m³ de RCD y 0 kg de RESPEL.
- Consumo de 0 m³ de agua. No se requirió la contratación ni instalación de servicios sanitarios temporales debido a la corta duración y rendimiento horario continuo de las labores en sitio.
- Desempeño acorde con las actividades operadas en el periodo.

48.6. Tibacuy

- Conformación de cunetas para optimizar el drenaje de la banca vial.
- No aplicó la realización de reuniones ni capacitaciones presenciales por la dinámica itinerante y no continua del personal.
- Cero generación de RCD (el material perfilado se reacomodó en el sitio), 0 kg de residuos convencionales y 0 kg de RESPEL en el periodo reportado.
- Consumo de 0 m³ de agua. Inaplicabilidad de alquiler de unidades sanitarias al no haber permanencia continua de personal en el sitio.
- Cumplimiento de los criterios operativos y ambientales aplicables al frente.

49. ANEXOS

- ANEXO 1. CAPACITACIONES Y CHARLAS AMBIENTALES CABRERA
- ANEXO 2. CRONOGRAMA AMBIENTAL DE CONSTRUCCION
- ANEXO 3.CERTIFICADO MATERIAL ACTAS RCD CABRERA
- ANEXO 4. CERTIFICADO RESIDUOS CABRERA
- ANEXO 5 CERTIFICADO AGUA, ACTAS DE ALQUILER UNIDAD SANITARIA
- ANEXO 6. CAPACITACIONES Y CHARLAS AMBIENTALES NARIÑO
- ANEXO 7. CERTIFICADO DE MATERIAL NARIÑO
- ANEXO 8. CERTIFICADOS RESIDUOS NARIÑO
- ANEXO 9. CERTIFICADO DE AGUA Y ACTA ALQUILER UNIDAD SANITARIA NARIÑO
- ANEXO 10. CONFORMACION DEL GRUPO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL NILO
- ANEXO 11. CAPACITACIONES Y CHARLAS AMBIENTALES NILO
- ANEXO 12. CERTIFICADO DE MATERIAL NILO CUNDINAMARCA
- ANEXO 13. CERTIFICADO DE RESIDUOS NILO
- ANEXO 14. ACTA DE ALQUILER UNIDAD SANITARIA NILO
- ANEXO 15. REUNION DEL GRUPO DE GESTION AMBIENTAL Y SOCIAL JERUSALEN
- ANEXO 16. CAPACITACIONES Y CHARLAS AMBIENTALES JERUSALEN
- ANEXO 17. CERTIFICADO MATERIAL JERUSALEN
- ANEXO 18. CERTIFICADO DE RESIDUOS JERUSALEN
- ANEXO 19. CERTIFICADO AGUA Y ACTA ALQUILER UNIDAD SANITARIA JERUSALEN
- ANEXO 20. CERTIFICADO MATERIAL PANDI
- ANEXO 21. CERTIFICADO MATERIAL TIBACUY

- ANEXO 22. MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA CABRERA
- ANEXO 23. MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA NARIÑO
- ANEXO 24. MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA NILO
- ANEXO 25. MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA JERUSALEN
- ANEXO 26. MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA PANDI
- ANEXO 27. MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA TIBACUY
- ANEXO 28. FORMATO RADICACION Y ACTUALIZACION AMBIENTAL DE PROYECTOS
- ANEXO 29. SEGUIMIENTO PRESUPUESTO PAGA

ANEXO 1

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: 1-7-26 Cabrera Cundinamarca

CAPACITADOR: Brayan Felipe cosos Garcia

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: Induccion Ambiental A y SST

HORA DE INICIO: 11:00 Am HORA TERMINACION: 12:00 Pm

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACION [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] ENTRENAMIENTO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Fredy Parra	74810512	Maestro	
Carlos Garcia	1195131G	Ayudante	CARLOS G.
Jose Delgadillo	1117460221	Ayudante	

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: 2-7-26 Cabrera Cundinamarca

CAPACITADOR: Brayan Felipe Cosas Garcia

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: Señalizacion y PMT en obra

HORA DE INICIO: 8:00 Am HORA TERMINACION: 9:00 AM

TIPO

INDUCCIÓN: ☐ CAPACITACION: ☒

CHARLA INFORMATIVA: ☐ ENTRENAMIENTO: ☐

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Fredy Parra	74810512	Maestro	
Carlos Garcia	11951316	Ayudante	
Jose Delgadillo	1117460221	Ayudante	

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: 3-7-26 Cabrera Cundinamarca

CAPACITADOR: Brayan Felipe Casas García

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: Manejo integral de los materiales de construcción

HORA DE INICIO: 8:00 AM HORA TERMINACION: 9:00 AM

TIPO

INDUCCIÓN: ☐ CAPACITACION: ☒

CHARLA INFORMATIVA: ☐ ENTRENAMIENTO: ☐

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Fredy Parra	74810512	Maestro	
Carlos García	1145131G	Ayudante	
José Delgadillo	1117460721	Ayudante	

ANEXO 2

Consorcio VICGER 2021	**CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL-PAGA V6.2**
CONTRATO ICCU-140 DE 2025	

Objeto:	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 3.

PLAN / PROGRAMA	ITEM	ACTIVIDAD A DESARROLLAR	RESPONSABLE	ACCION	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26	may-26	jun-26	jul-26
INDUCCIONES Y CAPACITACIONES AMBIENTALES	1,1	Inducción Ambiental A&SST	RESIDENTE AMBIENTAL-SST	PROGRAMADO										
				EJECUTADO										
	1,2	Capacitación Señalización y PMT en Obra	RESIDENTE AMBIENTAL	PROGRAMADO										
				EJECUTADO										
	1,3	Capacitación de manejo de residuos sólidos	RESIDENTE AMBIENTAL	PROGRAMADO										
				EJECUTADO										
	1,4	Capacitación de proveedores y sitios de disposición final.	RESIDENTE AMBIENTAL	PROGRAMADO										
				EJECUTADO										
	1,5	Capacitación de Orden Aseo y Limpieza	RESIDENTE AMBIENTAL	PROGRAMADO										
				EJECUTADO										
	1,6	Control de Derrames y uso del kit antiderrames	RESIDENTE AMBIENTAL	PROGRAMADO										
				EJECUTADO										
	1,7	Uso eficiente de recursos naturales.	RESIDENTE AMBIENTAL	PROGRAMADO										
				EJECUTADO										
	1,8	Manejo de RESPEL administrativos y de obra.	RESIDENTE AMBIENTAL	PROGRAMADO										
				EJECUTADO										
	1,9	Capacitación Normatividad Ambiental	RESIDENTE AMBIENTAL	PROGRAMADO										
				EJECUTADO										
	1,1	Cuidado y protección de la fauna y flora de la zona	RESIDENTE AMBIENTAL	PROGRAMADO										
				EJECUTADO										
	1,11	Manejo integral de los materiales de construcción.	RESIDENTE AMBIENTAL	PROGRAMADO										
				EJECUTADO										

	ELABORÓ
NOMBRE	**Brayan Felipe Casas Garcia**
CARGO	Especialista Ambiental
FIRMA	

ANEXO 3

Agregados la floresta S.A.S
NIT. 900.568.753-0

Concretos Floresta

AGREGADOS LA FLORESTA SAS

NIT. 900.568.753 - 0

CERTIFICA QUE:

Del 1 al 30 de junio de 2026, hemos hecho entrega al cliente BIA INGENIERIA SAS, identificado con NIT. 901.922.959 – 2, bajo el contrato de media minería para la explotación de un yacimiento de materiales de arrastre número BGI141 y RUCOM-201605166854, los siguientes materiales con las respectivas cantidades:

MATERIAL	CANTIDAD
B-400	75 m3
ARENA	7 m3
GRAVA 1”	7 m3

La presente se firma a los seis (06) días del mes de julio del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

MONICA SANCHEZ
GERENCIA
Móvil: 3114544207 - 3203876292
E-Mail: concretosfloresta.planta@gmail.com

DESPACHOS									
N° REM.	**FECHA**	**CLIENTE**	**DESTINO**	**MATERIAL**	**M3**	**PLANTA**	**PATIO**	**PLACA**	**CONDUCTOR**
15961	martes, 9 de junio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	CABRERA	B−400	15	1	2	SOI 807	RODRIGO MARTINEZ
16146	miércoles, 17 de junio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	CABRERA	B−400	15	1	2	SWO 191	FREDY MUNEVAR
16190	jueves, 18 de junio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	CABRERA	GRAVILLA 1"	7	1	2	TGN 084	REINEL CARDENAS
16190	jueves, 18 de junio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	CABRERA	ARENA LAVADA	7	1	2	TGN 084	REINEL CARDENAS
16273	lunes, 22 de junio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	CABRERA	B−400	15	1	2	SWO 191	FREDY MUNEVAR
16282	martes, 23 de junio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	CABRERA	B−400	15	1	2	SWO 191	FREDY MUNEVAR
16325	martes, 23 de junio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	CABRERA	B−400	15	1	2	SWO 191	FREDY MUNEVAR

ICCU	PROCESO			VERSIÓN	XX-MC-PR-XX
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	03/12/2025

FECHA DE REUNIÓN:	1-7-26	ACTA No.	1
HORA DE INICIO:	3:00 PM	HORA FINALIZACIÓN:	
LUGAR DE REUNIÓN:	Quebrada negra Cabrera		
REFERENCIA:	N/A		

OBJETO DE LA REUNIÓN

formalizar la entrega y transferencia de responsabilidad de los residuos de construcción y demolición (RCD), garantizando que su disposición final se realice en un predio autorizado por el receptor para actividades de relleno y nivelación, dando cumplimiento a la normatividad ambiental vigente.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En municipio de Cabrera -, siendo las 8:00 AM horas del día 1 del mes de Julio, de 2026, se reúnen las partes interesadas con el fin de formalizar el proceso de disposición de residuos de construcción y demolición (RCD).

Se procede a verificar la descarga del material en el predio ubicado en: Cabrera, de propiedad del señor (a) Maria Teresa -, identificado (a) con C.C numero 20860122 durante la diligencia se hace entrega de un volumen total de 20 metros cúbicos (m3) de material consistente en Excavacion

CONCLUSIONES

1. Transferencia de responsabilidad legal y ambiental: legal y ambiental con la firma de esta acta el señor (a) Maria IBague asume la propiedad y custodia total de los 20 m3 de RCD entregados a partir de este momento, el receptor es el único responsable ante las autoridades ambientales y civiles por el manejo, estabilidad y disposición final del material en el predio ubicado en Quebrada Negra
2. Conformidad de uso y calidad del material: el receptor declara que a verificado visualmente el material recibido y confirma que es apto para los fines de relleno y nivelación de su propiedad. Se concluye que el RCD entregado esta libre de contaminantes químicos o residuos orgánicos peligrosos, cumpliendo con las expectativas de ambas partes al momento de la descarga.
3. Cierre de las obligaciones de entrega: se da por finalizada y perfeccionada la entrega física del material en el municipio de Cabrera, las partes manifiestan que no existe reclamaciones pendientes ni obligaciones adicionales, quedando el entregante exonerado de cualquier efecto derivado del uso que el receptor decida darle al material en el futuro.

COMPROMISOS ASUMIDOS

El receptor del material manifiesta conocer la naturaleza de los residuos entregados y asume los siguientes puntos:

1. El material será utilizado exclusivamente para rellenos dentro de los límites de su propiedad y no será comercializado ni trasladado a zonas de protección ambiental
2. El receptor se hace responsable de la estabilidad del terreno donde se deposita el material, evitando que este cauce deslizamientos o afectaciones a predios vecinos
3. A partir de la firma de este documento el señor (a) Maria IBague asume la propiedad y custodia del RCD, exonerado a quien entrega de cualquier responsabilidad administrativa, civil o ambiental posterior.

ASISTENTES

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
ING. Brayan Felipe Casas Garcia	Casasgarciafelipe82 @gmail.com	
Maria Teresa IBague	20860122	

ANEXO 4

MC-OSP-121-2026-091
Al responder cite este número

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA

C E R T I F I C A:

Que, de acuerdo con el registro de entregas realizadas por el usuario, desde el 01 de Julio de 2026 al 30 de Julio de 2026, se entregaron los martes y viernes 6 kg de residuos, discriminados así:

- 2 kg de residuos convencionales (no aprovechables)
- 4 kg de residuos aprovechables

Esta certificación se expide a solicitud del interesado, para los fines pertinentes a los tres (03) dias del mes de agosto de 2026

ING. SERGIO ANDRÉS PÁEZ BELLO
Secretario de Planeación Obras y Servicios Públicos

Elaboró: Alejandra Stefania Niño Ojeda – técnico Administrativo
Revisó: Sergio Andres Paez Bello – secretario de planeación, obras y servicios públicos.
Aprobó: Sergio Andres Paez Bello – secretario de planeación, obras y servicios públicos.

Powered by CamScanner

ANEXO 5

MC-OSP-121-2026-092
Al responder cite este número

LA SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE CABRERA CUNDINAMARCA

C E R T I F I C A:

La Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP del Municipio de Cabrera se encuentra en operación y es la encargada del proceso de potabilización del agua que se distribuye a la población urbana del municipio.

El sistema de acueducto municipal suministra agua tratada bajo los parámetros de potabilidad establecidos por la normatividad vigente en Colombia, garantizando la aptitud del agua para consumo humano.

El servicio de abastecimiento de agua potable se presta de manera continua a los usuarios del área urbana, cumpliendo con los estándares mínimos de calidad exigidos para el consumo seguro.

El **CONSORCIO VICGER 2021**, identificado con Numero de Nit: 901902610 en ejecución de sus actividades dentro del municipio, puede contar con el apoyo del sistema de acueducto municipal para el suministro de agua potable, cuando sea requerido y conforme a la disponibilidad operativa de la PTAP y a las disposiciones administrativas vigentes.

Agua potable suministrada Mes de Julio: 15 M3

ING. SERGIO ANDRÉS PÁEZ BELLO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Proyectó: Alejandra Stefanía Niño Cipda / Técnico Administrativo de Servicios Públicos
Revisó: Ing. Sergio Andrés Páez Bello/ secretario planeación, obras y servicios públicos
Aprobó: Ing. Sergio Andrés Páez Bello/ secretario planeación, obras y servicios públicos

Powered by CamScanner

ICCU	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN			FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	1-07-26	ACTA No.	1
HORA DE INICIO:	2:00 pm	HORA FINALIZACIÓN:	2:30 pm
LUGAR DE REUNIÓN:	Finca la Dorada Cabrera Cundinamarca.		
DEPENDENCIA:	N.A		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Alquiler Unidad Sanitaria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reune el ingeniero Ambiental del contrato con la Dueña del Predio Finca la Dorada para el Alquiler de la unidad Sanitaria Para el Personal que realiza las alcantarillas, se envia Dinero al nequi con número 3161877812, se deja con paz y salvo a nombre de Nancy Peret.

CONCLUSIONES

N.A

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Aseo y limpieza a la unidad Sanitaria Alquilada	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Ing Brayan Casas	felipecasas82@Gmail.com	Brayan Casas
Marlene Prado	N.A	Marlene Prado Caballero

ANEXO 6

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: Nariño, 15-7-26

CAPACITADOR: Brayan Felipe Casas García

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: Induccion Ambiental y SST

HORA DE INICIO: 10:00 Am HORA TERMINACION: 11:00 Am

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACION [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] ENTRENAMIENTO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Fdo Cardoso	93'724.309	Maestro	[firma]
Robinson Skee	1105083109	MAESTRO	[firma]
Carlos Romero	1012407146	Ayudante	[firma]
Miguel Sepulveda	14319939	operador	[firma]
Carlos osorio	14318066	ayudante	[firma]
Dyhodado	3701 788	Reyes	[firma]
Nelson Rojas	1.0032888694	Rojas	[firma]
Albeiro Ramirez	CC 1024486066	Ayudante	[firma]
Carlos Romero	1012407146	Ayudante	[firma]
Nicolas ...	1105693279	Ayudante	Nicolas
Alfonso lozano	14652566	ayudante	[firma]

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: Nariño 17-7-26

CAPACITADOR: Brayan Felipe Casas García

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: Proveedores y sitios de disposición final

HORA DE INICIO: 8:00 an HORA TERMINACION: 9:00 an

TIPO

INDUCCIÓN: ☐ CAPACITACION: ☒

CHARLA INFORMATIVA: ☐ ENTRENAMIENTO: ☐

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Miguel Sepulveda R	14319838	operador	
Carlos Ospina	14318076	ayudante	
Los Fernandez Cadena	93119.308	Monitor	
Carlos Zapata	1087407146	Ayudante	
Alberto Rodriguez	16741166066		
Nelson Abel	1085285163	Maestro	
Nilson Reyes	1.003749184	Rojas	
Ramiro	3107788	Reyes	
Nicolas Ui	1085272719	Ayudante	Nicolas Ui
Alfonzelozano	1765250	Ayudante	

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: Nariño, 18-7-16

CAPACITADOR: Brayan Felipe Casas García

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: cuidado de proteccion de la fauna y la flora de la zona

HORA DE INICIO: 11:00 Am HORA TERMINACION: 12:00 pm

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACION [X]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Nicolas	1105693279	ayudante	Nicolas
Luis Edu Cardoso	93169308	maestro	[illegible]
Carlos Osorio	1431802C	ayudante	[illegible]
Alberto Rodriguez	1074AL46060		[illegible]
Miguel sepulveda	14319838	operador	[illegible]
[illegible]	1012 40E146	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Reyes	[illegible]	[illegible]
Yilson n. [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] Sleed	1105683169	maestro	[illegible]
Alfonso losano	17052565	ayudante	[illegible]
RC			

ANEXO 7

INGEMIN

CERTIFICACIÓN MATERIALES

En calidad de representante Legal de la empresa INGENIERIA Y MINERIA INGEMIN SAS, certifico que: a el CONSORCIO VICGER identificados con NIT: 901.902.610 se le ha suministrado Materiales de Cantera MINA SAN PEDRO de Armero Guayabal Tolima durante el mes de **JULIO** de 2026, Para la ejecución del Contrato ICCU 140 de 2025 cuyo objeto es: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA***",*** se relaciona de la siguiente manera:

ENTREGADO A CONSORCIO VICGER				
FECHA DE ENTREGA	**CANTIDAD (m3)**	**MATERIAL**	**PLACA VOLQUETA**	**PROVEEDOR**
1/07/2026	7	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
1/07/2026	7	ASFALTITA	KFH419	INGEMIN S.A.S
1/07/2026	8	ASFALTITA	OTI321	INGEMIN S.A.S
1/07/2026	8	ASFALTITA	OGL050	INGEMIN S.A.S
1/07/2026	8	ASFALTITA	VKQ187	INGEMIN S.A.S
1/07/2026	8	ASFALTITA	KFH419	INGEMIN S.A.S
2/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
2/07/2026	8	ASFALTITA	VKQ187	INGEMIN S.A.S
2/07/2026	8	ASFALTITA	OGL050	INGEMIN S.A.S
2/07/2026	8	ASFALTITA	OTI321	INGEMIN S.A.S
3/07/2026	8	ASFALTITA	OTI321	INGEMIN S.A.S
3/07/2026	8	ASFALTITA	KFH419	INGEMIN S.A.S
3/07/2026	8	ASFALTITA	OGL050	INGEMIN S.A.S
3/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
3/07/2026	8	ASFALTITA	VKQ187	INGEMIN S.A.S
6/07/2026	8	ASFALTITA	OGL050	INGEMIN S.A.S
8/07/2026	8	ASFALTITA	OGL050	INGEMIN S.A.S
8/07/2026	8	ASFALTITA	DVT295	INGEMIN S.A.S
8/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
8/07/2026	8	ASFALTITA	OKA279	INGEMIN S.A.S
8/07/2026	8	ASFALTITA	KFH419	INGEMIN S.A.S
8/07/2026	8	ASFALTITA	OGL050	INGEMIN S.A.S
8/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
9/07/2026	8	ASFALTITA	OGL050	INGEMIN S.A.S

9/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
9/07/2026	8	ASFALTITA	DVT295	INGEMIN S.A.S
9/07/2026	8	ASFALTITA	OKA279	INGEMIN S.A.S
9/07/2026	8	ASFALTITA	JFE899	INGEMIN S.A.S
9/07/2026	8	ASFALTITA	KFH419	INGEMIN S.A.S
10/07/2026	8	ASFALTITA	OGL050	INGEMIN S.A.S
10/07/2026	8	ASFALTITA	DVT295	INGEMIN S.A.S
10/07/2026	8	ASFALTITA	OOR015	INGEMIN S.A.S
10/07/2026	8	ASFALTITA	NTI100	INGEMIN S.A.S
10/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
14/07/2026	8	ASFALTITA	VKQ187	INGEMIN S.A.S
14/07/2026	8	ASFALTITA	OOR015	INGEMIN S.A.S
14/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
14/07/2026	8	ASFALTITA	OOR015	INGEMIN S.A.S
14/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
14/07/2026	8	ASFALTITA	VKQ187	INGEMIN S.A.S
14/07/2026	8	ASFALTITA	JFE899	INGEMIN S.A.S
14/07/2026	8	ASFALTITA	SQI976	INGEMIN S.A.S
14/07/2026	8	ASFALTITA	DVT295	INGEMIN S.A.S
14/07/2026	8	ASFALTITA	WZA141	INGEMIN S.A.S
15/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
15/07/2026	8	ASFALTITA	OKA279	INGEMIN S.A.S
15/07/2026	8	ASFALTITA	JFE899	INGEMIN S.A.S
15/07/2026	8	ASFALTITA	SQI976	INGEMIN S.A.S
15/07/2026	8	ASFALTITA	OKA279	INGEMIN S.A.S
16/07/2026	8	ASFALTITA	KFH419	INGEMIN S.A.S
16/07/2026	8	ASFALTITA	WZA141	INGEMIN S.A.S
16/07/2026	8	ASFALTITA	JFE899	INGEMIN S.A.S
16/07/2026	8	ASFALTITA	SQI976	INGEMIN S.A.S
16/07/2026	8	ASFALTITA	DVT295	INGEMIN S.A.S
16/07/2026	8	ASFALTITA	OKA279	INGEMIN S.A.S
16/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
16/07/2026	8	ASFALTITA	WZA141	INGEMIN S.A.S
16/07/2026	8	ASFALTITA	JFE899	INGEMIN S.A.S
16/07/2026	8	ASFALTITA	SQI976	INGEMIN S.A.S
16/07/2026	8	ASFALTITA	DVT295	INGEMIN S.A.S
17/07/2026	8	ASFALTITA	KFH419	INGEMIN S.A.S
21/07/2026	8	ASFALTITA	KFH419	INGEMIN S.A.S
21/07/2026	8	ASFALTITA	OOR015	INGEMIN S.A.S
21/07/2026	8	ASFALTITA	WZA141	INGEMIN S.A.S
21/07/2026	8	ASFALTITA	JFE899	INGEMIN S.A.S

21/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
21/07/2026	8	ASFALTITA	WZA141	INGEMIN S.A.S
21/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
21/07/2026	8	ASFALTITA	OOR015	INGEMIN S.A.S
22/07/2026	8	ASFALTITA	OKA279	INGEMIN S.A.S
22/07/2026	8	ASFALTITA	WZA141	INGEMIN S.A.S
22/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
30/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
30/07/2026	8	ASFALTITA	WZA141	INGEMIN S.A.S
30/07/2026	8	ASFALTITA	DVT295	INGEMIN S.A.S
30/07/2026	8	ASFALTITA	OKA279	INGEMIN S.A.S
30/07/2026	8	ASFALTITA	TNC060	INGEMIN S.A.S
30/07/2026	8	ASFALTITA	VKQ187	INGEMIN S.A.S
30/07/2026	8	ASFALTITA	WZA141	INGEMIN S.A.S
30/07/2026	8	ASFALTITA	KFH419	INGEMIN S.A.S
30/07/2026	8	ASFALTITA	OOR015	INGEMIN S.A.S
31/07/2026	8	ASFALTITA	WZA141	INGEMIN S.A.S
31/07/2026	8	ASFALTITA	KFH419	INGEMIN S.A.S
31/07/2026	8	ASFALTITA	DVT295	INGEMIN S.A.S
31/07/2026	8	ASFALTITA	OKA279	INGEMIN S.A.S
31/07/2026	8	ASFALTITA	VKQ187	INGEMIN S.A.S
TOTAL	**686**	**M3**		

Nuestra Planta cuenta con los Permisos Necesarios y cumple a cabalidad como lo estipula la Resolución 2213 del 7 de noviembre de 1996, le fue otorgada bajo el expediente L – 2345, por parte de la Corporación Autónoma Regional del Tolima – CORTOLIMA, autorización ambiental para la explotación de gravas, arenas, asfaltitas y demás concesibles del proyecto minero.

Se expide a solicitud del Interesado a los TRES (3) días del mes de AGOSTO de 2026.

Cordialmente;

FRANZ MOLLER REYES
Representante legal
INGEMIN SAS

LA FLOREST A

Agregados la floresta S.A.S
NIT. 900.568.753-0

Concretos Floresta

AGREGADOS LA FLORESTA SAS

NIT. 900.568.753 - 0

CERTIFICA QUE:

Del 1 al 31 de julio de 2026, hemos hecho entrega al cliente CONSORCIO VICGER 2021, identificado con NIT. 901.902.610 – 2, bajo el contrato de media minería para la explotación de un yacimiento de materiales de arrastre número BGI141 y RUCOM-201605166854, los siguientes materiales con las respectivas cantidades:

MATERIAL	CANTIDAD
B-400	28 m3
ARENA	38,71 m3
GRAVA 1”	18,22 m3
GRAVA ½”	21 m3

La presente se firma a los cuatro (04) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

MONICA SANCHEZ
GERENCIA
Móvil: 3114544207 - 3203876292
E-Mail: concretosfloresta.planta@gmail.com

DESPACHOS							
N° REM.	**FECHA**	**CLIENTE**	**DESTINO**	**MATERIAL**	**M3**	**PLACA**	**CONDUCTOR**
16425	miércoles, 1 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	B−400	7	TGM 709	WILSON PACHON
16427	miércoles, 1 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	GRAVILLA 1"	6,25	TGM 709	WILSON PACHON
16451	miércoles, 1 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	ARENA LAVADA	6,18	TGM 709	WILSON PACHON
16466	jueves, 2 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	B−400	6	TGM 709	WILSON PACHON
16477	jueves, 2 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	ARENA LAVADA	6,18	TGM 709	WILSON PACHON
16494	viernes, 3 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	GRAVILLA 1"	6,01	TGM 709	WILSON PACHON
16529	lunes, 6 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	B−400	15	TGM 709	WILSON PACHON
16533	lunes, 6 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	GRAVILLA 1"	5,96	TGM 709	WILSON PACHON
16539	martes, 7 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	ARENA LAVADA	5,35	TGM 709	WILSON PACHON
16660	martes, 14 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	GRAVILLA 1/2"	7	TGM 709	WILSON PACHON
16754	martes, 21 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	GRAVILLA 1/2"	7	TGM 709	WILSON PACHON
16766	martes, 21 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	ARENA LAVADA	7	TGM 709	WILSON PACHON
16875	viernes, 24 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	ARENA LAVADA	7	TGM 709	WILSON PACHON
16966	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	GRAVILLA 1/2"	7	TGM 709	WILSON PACHON
16972	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NARIÑO	ARENA LAVADA	7	TGM 709	WILSON PACHON

ANEXO 8

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE:

Que, de acuerdo con el registro de entregas realizadas por el usuario, desde el 01 de julio de 2026 al 30 de julio de 2026, se entregaron los martes y viernes 11 kg de residuos, discriminados así:

- 8 kg de residuos convencionales (no aprovechables)
- 3 kg de residuos aprovechables

Dada en la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial Municipal de Nariño Cundinamarca a los tres (03) días del mes de agosto del dos mil veintiséis (2026).

ING. JOHN ALEXANDER CARTAGENA RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Alcaldía Municipal de Nariño Cundinamarca

Servidores Públicos	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nombres	Ing. Juan Rodríguez	Ing. John Cartagena	Ing. John Cartagena
Cargo	Apoyo técnico	Secretario de Planeación	Secretario de Planeación
Firmas			
Fecha	03 de agosto del 2026		

ANEXO 9

EL SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE NARIÑO CUNDINAMARCA

CERTIFICA QUE:

La Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP del Municipio de Nariño-Cundinamarca se encuentra en operación y es la encargada del proceso de potabilización del agua que se distribuye a la población urbana del municipio.

El sistema de acueducto municipal suministra agua tratada bajo los parámetros de potabilidad establecidos por la normatividad vigente en Colombia, garantizando la aptitud del agua para consumo humano.

El servicio de abastecimiento de agua potable se presta de manera continua a los usuarios del área urbana, cumpliendo con los estándares mínimos de calidad exigidos para el consumo seguro.

El **CONSORCIO VICGER 2021**, identificado con Numero de Nit: 901902610-2 en ejecución de sus actividades dentro del municipio, puede contar con el apoyo del sistema de acueducto municipal para el suministro de agua potable, cuando sea requerido y conforme a la disponibilidad operativa de la PTAP y a las disposiciones administrativas vigentes.

Agua potable suministrada Mes de Julio: 70 M3

Dada en la secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial Municipal de Nariño Cundinamarca a los tres (03) días del mes de agosto del dos mil veintiséis (2026).

ING. JOHN ALEXANDER CARTAGENA RODRIGUEZ
Secretario de Planeación y Desarrollo Territorial
Alcaldía Municipal de Nariño Cundinamarca

Servidores Públicos	Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Nombres	Ing. Juan Rodríguez	Ing. John Cartagena	Ing. John Cartagena
Cargo	Apoyo técnico	Secretario de Planeación	Secretario de Planeación
Firmas			
Fecha	03 de agosto del 2026		

ICCU	FORMATO	CODIGO	EG-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2023

FECHA DE REUNIÓN:	16-07-25	ACTA No:	2
HORA DE INICIO:	2:00 pm	HORA FINALIZACIÓN:	3:00 Pm
LUGAR DE REUNIÓN:	Nariño, Hacienda el pital		
DEPENDENCIA:	N/A		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Alquiler unidad sanitaria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reune el ingeniero ambiental del proyecto Brayan Felipe Casas Garcia, con la dueña del predio hacienda el pital Ernestina Reyes, con CC 34559997, Para alquiler de unidad Sunitaria.

Nota: Se greda Paz y Salvo del alquiler en el mes de julio, se entrega pago en efectivo, Tambien se Presta el servicio de parqueo de Maquinaria en el predio

CONCLUSIONES

N/A

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Alquiler unidad sanitaria – Julio	
Aseo unidad sanitaria	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Ernestina Reyes	CC. 34559997	Ernestina Reyes
Brayan Casas	1016092534	Brayan Casas

Scanned with CamScanner

ANEXO 10

1. INFORMACION DEL PROYECTO

CAMPO	DETALLE
Contrato	ICCU No. 140-2025 (Intervención de Vías Lote 3)
Documento Base	Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) V6.2
Ubicación	Provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena (Cundinamarca)
Objeto del Contrato	Intervención de las vías que conforman el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse.

2. OBJETIVO DEL GRUPO

Formalizar la Conformación del equipo responsable de la gestión ambiental y social del proyecto, estableciendo sus roles y compromisos para la **implementación y cumplimiento integral** de todos los programas, medidas y obligaciones estipuladas en el **PAGA** y la normativa ambiental vigente.

3. ESTRUCTURA DEL GRUPO

El Grupo de Gestión Ambiental y Social se integra por los siguientes profesionales, quienes asumen la responsabilidad directa de las acciones definidas en el PAGA:

ROL PRINCIPAL	PROFESIONAL ASIGNADO	CEDULA DE CIUDADANIA	FECHA DE ASIGNACION
Residente de obra	Gilberth Mateus	1.096.906.644	22/7/2026
Profesional SST	Claudia Patricia Ballestas Barandica	1.019.022.615	22/7/2026
Profesional Social	Esther Tuñion Pérez	1.048.609.602	22/7/2026
Especialista ambiental	Brayan Felipe Casas García	1.016.082.534	22/7/2026

4. ALCANCE Y RESPONSABILIDAD CLAVE


El grupo se compromete a liderar los siguientes programas del PAGA, asegurando que las funciones se articulen con la operación diaria de la obra:

PROGRAMA DEL PAGA	RESPONSABILIDAD PRIMARIA	TAREAS CLAVE A CARGO DEL GRUPO
Gestión del Proyecto	Especialista Ambiental	Liderazgo, asignación de recursos, capacitación inicial (Inducción y Reinducción del PAGA), elaboración de informes de cumplimiento, gestión de permisos.
Manejo de Materiales	Residente de Obra y Especialista Ambiental	Gestión de sobrantes, RCD (Residuos de Construcción y Demolición) y residuos sólidos (Programa 2.1 y 2.2), asegurando el transporte, disposición y sitios de aprovechamientos autorizados.
Manejo de Recursos Naturales	Residente de Obra / Especialista Ambiental	Control de emisiones atmosféricas (polvo y gases), manejo de aguas (vertimientos, campamentos) y gestión de la flora y fauna afectada por la obra.
Gestión Social	Profesional Social	Mecanismo de PQR, información y participación comunitaria, manejo de conflictos, relaciones con autoridades locales.

PROGRAMA DEL PAGA	RESPNSABILIDAD PRIMARIA	TAREAS CLAVE A CARGO DEL GRUPO
Plan de Contingencia	Especialista Ambiental Profesional SST	Preparación y respuesta ante emergencias ambientales (derrames, incendios), capacitación al personal en procedimientos de respuesta.

5. DECLARACION Y ACEPTACIÓN

Los abajo firmantes declaran conocer el contenido y alcance del Plan de Adaptación a la Guía Ambiental y, mediante la suscripción de este documento, aceptan las responsabilidades inherentes a sus roles y se comprometen a implementar y hacer cumplir todas las medidas ambientales y sociales en las áreas bajo su dirección.

PROFESIONAL	CARGO	FIRMA
Gilberth Mateus	Residente de obra	
Claudia Patricia Ballestas Barandica	Profesional SST	
Esther Tuñion Pérez	Profesional social	
Brayan Felipe Casas García	Especialista Ambiental	

ANEXO 11

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: Nilo, 16-7-26

CAPACITADOR: Brayan Felipe Cossio Garcia

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: Induccion Ambiental y SST

HORA DE INICIO: 10:00 AM HORA TERMINACION 11:00 AM

TIPO

INDUCCIÓN [X] CAPACITACION [ ]

CHARLA INFORMATIVA [X] ENTRENAMIENTO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Jeimy Calixto Pinzón	1069925761	Contratadora	Jeimy Calixto P.
Mario A Diaz T	1069914819	Auxiliar	
Luis Felipe Rodriguez	1003523427	Auxiliar	
Duvan Pico Sedano	1069733353	Auxiliar	
Wilmer Parra Rodriguez	1003568343	Auxiliar	
Luis Carlos Ramos	1063912422	Auxiliar	
Patricio Higuera	3361196	operador	

Scanned with CamScanner

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: Nilo, 21-7-26

CAPACITADOR: Brayan Felipe casas Barrera

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: Protectores y sitios de disposicion Final

HORA DE INICIO: 9:00 AM HORA TERMINACION: 10:00 AM

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACION [X]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Jenny Cayga Rengifo	1069925161	Controlador	Jenny Cayga R.
Wilson Rodriguez S	1003523427	Auxiliar	
Harold Diaz Torres	1069924821	Auxiliar	
[illegible]	1003683845	Auxiliar	[illegible]
Yhonier H Grajales	336126	operador	Yhonier Hoyos

Scanned with CamScanner

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: N,10, 22-7-26

CAPACITADOR: Brayan Felpe Casas García

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: Cuidado y proteccion de la Fauna y flora de la zona

HORA DE INICIO: 8:00 Am HORA TERMINACION: 9:00 am

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACION [X]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Teimy Colon Arango	1069925161	Controladora	Teimy Colon A.
Luis Felipe Lubo Lopez	1003523417	Auxiliar	Luis Felipe Lubo L.
Mario Diaz Torres	1069974929	Auxiliar	
Brandon Hoyos M.	3361126	operador B.	Brandon Hoyos M.

ANEXO 12

LA FLORESTA

Agregados la floresta S.A.S
NIT. 900.568.753-0

Concretos Floresta

AGREGADOS LA FLORESTA SAS

NIT. 900.568.753 - 0

CERTIFICA QUE:

Del 1 al 31 de julio de 2026, hemos hecho entrega al cliente CONSORCIO VICGER 2021, identificado con NIT. 901.902.610 – 2, bajo el contrato de media minería para la explotación de un yacimiento de materiales de arrastre número BGI141 y RUCOM-201605166854, los siguientes materiales con las respectivas cantidades:

MATERIAL	CANTIDAD
B-400	1425 m3

La presente se firma a los cuatro (04) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

MONICA SANCHEZ
GERENCIA
Móvil: 3114544207 - 3203876292
E-Mail: concretosfloresta.planta@gmail.com

DESPACHOS							
N° REM.	**FECHA**	**CLIENTE**	**DESTINO**	**MATERIAL**	**M3**	**PLACA**	**CONDUCTOR**
16541	martes, 7 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	SIMON VILLA
16542	martes, 7 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	UFE 816	MAURICIO GALEANO
16567	miércoles, 8 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	MAURICIO GALEANO
16568	miércoles, 8 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	UFE 816	EDUARD AGUILAR
16579	miércoles, 8 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	MAURICIO GALEANO
16580	miércoles, 8 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	UFE 816	EDUARD AGUILAR
16582	miércoles, 8 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	MAURICIO GALEANO
16591	jueves, 9 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	UFE 816	EDUARD AGUILAR
16592	jueves, 9 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSI 176	JUAN CASTILLO
16593	jueves, 9 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	SIMON VILLA
16594	jueves, 9 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16597	jueves, 9 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	SIMON VILLA
16598	jueves, 9 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSI 176	JUAN CASTILLO
16599	jueves, 9 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	UFE 816	EDUARD AGUILAR
16600	jueves, 9 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16601	jueves, 9 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSZ 288	GIOVANNY GARCIA
16604	jueves, 9 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	SIMON VILLA
16605	jueves, 9 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSI 176	JUAN CASTILLO
16606	jueves, 9 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16607	viernes, 10 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	SIMON VILLA
16608	viernes, 10 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16613	viernes, 10 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSI 176	JUAN CASTILLO
16615	viernes, 10 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSZ 288	GIOVANNY GARCIA
16621	viernes, 10 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SXR 666	KELER RIVEROS
16634	viernes, 10 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSI 176	JUAN CASTILLO
16635	viernes, 10 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16637	viernes, 10 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	SIMON VILLA
16639	viernes, 10 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	SIMON VILLA
16646	martes, 14 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16647	martes, 14 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSZ 288	GIOVANNY GARCIA
16650	martes, 14 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	RAMON RAMIREZ
16652	martes, 14 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSI 176	JUAN CASTILLO
16653	martes, 14 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SXR 666	KELER RIVEROS
16654	martes, 14 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16655	martes, 14 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSZ 288	GIOVANNY GARCIA
16661	martes, 14 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SXR 666	KELER RIVEROS
16662	martes, 14 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16665	martes, 14 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSZ 288	GIOVANNY GARCIA

16671	miércoles, 15 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSZ 288	GIOVANNY GARCIA
16672	miércoles, 15 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16679	miércoles, 15 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	RAMON RAMIREZ
16681	miércoles, 15 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSI 176	JUAN CASTILLO
16682	miércoles, 15 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SXR 666	KELER RIVEROS
16687	miércoles, 15 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSZ 288	GIOVANNY GARCIA
16689	miércoles, 15 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSI 176	JUAN CASTILLO
16690	miércoles, 15 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SXR 666	KELER RIVEROS
16695	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16705	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SXR 666	KELER RIVEROS
16708	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SMI 300	JONATHAN RODRIGUEZ
16709	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16711	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	RAMON RAMIREZ
16712	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSZ 288	GIOVANNY GARCIA
16713	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SXR 666	KELER RIVEROS
16714	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SPX 063	JOSE SANCHEZ
16718	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16719	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SMI 300	JONATHAN RODRIGUEZ
16720	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	RAMON RAMIREZ
16724	viernes, 17 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16727	viernes, 17 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	RAMON RAMIREZ
16729	viernes, 17 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSI 176	JUAN CASTILLO
16730	viernes, 17 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SXR 666	KELER RIVEROS
16733	viernes, 17 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16735	viernes, 17 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	RAMON RAMIREZ
16736	viernes, 17 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSI 176	JUAN CASTILLO
16739	viernes, 17 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SXR 666	KELER RIVEROS
16752	martes, 21 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16759	martes, 21 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSZ 288	GIOVANNY GARCIA
16763	martes, 21 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SXR 666	KELER RIVEROS
16768	martes, 21 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SSI 176	JUAN CASTILLO
16769	martes, 21 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOO 726	RAMON RAMIREZ
16770	martes, 21 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	WCX 056	EDWIN PRADO
16775	martes, 21 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SXR 666	KELER RIVEROS
16885	sábado, 25 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOA 573	OSCAR PULIDO
16886	sábado, 25 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	TBO 103	JUAN HERNANDEZ
16887	sábado, 25 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	THY 755	EDISON GALEANO
16888	sábado, 25 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOR 499	DUVAN SANCHEZ
16889	sábado, 25 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOR 538	GUILLERMO PRIETO
16890	sábado, 25 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SOR 773	JUAN PALACIOS
16895	sábado, 25 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B–400	15	SWO 191	FREDY MUNEVAR

16955	sábado, 25 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	SOR 500	FREDY MUNEVAR
16957	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	TLO 178	VICTOR GOMEZ
16958	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	SOR 538	GUILLERMO PRIETO
16959	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	SOR 773	JUAN PALACIOS
16970	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	TBO 103	JUAN HERNANDEZ
16973	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	TAX 354	CARLOS CALA
16974	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	TDS 934	OMAR CALA
16975	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	TLO 178	VICTOR GOMEZ
16976	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	SOR 538	GUILLERMO PRIETO
16977	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	SOR 773	JUAN PALACIOS
16981	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	SSX 048	PEDRO GARCIA
16982	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	SKO 799	MILLER CUPER
16984	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	SOR 500	FREDY SANCHEZ
16985	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	TRK 537	JAMES RAMIREZ
16991	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	TAX 354	CARLOS CALA
16992	lunes, 27 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	NILO	B−400	15	TDS 934	OMAR CALA

LA
COLINA

CERTIFICADO DE MATERIALES DE CANTERA

CERTIFICACIÓN:

En calidad de representante Legal de la empresa LA COLINA SAS, certifico que: a el CONSORCIO VICGER 2021 identificados con NIT: 901.902.610-2 se le ha suministrado Materiales de Cantera La Colina durante el mes de julio. Para el proyecto ***"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.",*** se relaciona de la siguiente manera:

FECHA	DESPACHO	PLACA	CANT	VALOR
15/07/2026	122860	UVV351	B-400	15
15/07/2026	122861	SKN784	B-400	15
15/07/2026	122883	SKN784	B-400	15
15/07/2026	122884	UVV351	B-400	15
16/07/2026	122899	UVV351	B-400	15
16/07/2026	122900	SKN784	B-400	15
16/07/2026	122925	SKN784	B-400	15
16/07/2026	122944	SKN784	B-400	15
17/07/2026	122972	SKN784	B-400	15
21/07/2026	123025	UVV351	B-400	15
21/07/2026	123007	UFP878	B-400	15
21/07/2026	123008	SWO564	B-400	15
21/07/2026	123009	UFP875	B-400	15
25/07/2026	123230	TLO178	B-400	15
27/07/2026	123255	TLM710	B-400	15
27/07/2026	123266	SKN784	B-400	15
27/07/2026	123273	TLM710	B-400	15
27/07/2026	123282	TLM710	B-400	15
28/07/2026	123301	TLM710	B-400	15
28/07/2026	123307	TLM710	B-400	15
28/07/2026	123290	TLM710	B-400	15
30/07/2026	123351	TAX354	B-400	15
30/07/2026	123352	TDS934	B-400	15
30/07/2026	123356	SQZ298	B-400	15
30/07/2026	123358	TGM179	B-400	15
30/07/2026	123365	THV078	B-400	15
30/07/2026	123368	SOR538	B-400	15
30/07/2026	123371	TAX354	B-400	15
30/07/2026	123372	TDS934	B-400	15
30/07/2026	123376	TRK537	B-400	15
30/07/2026	123377	SQZ298	B-400	15
30/07/2026	123378	TGM179	B-400	15
30/07/2026	123383	THV078	B-400	15
30/07/2026	123387	SOR773	B-400	15
30/07/2026	123388	SOA573	B-400	15
30/07/2026	123396	TLM710	B-400	15
31/07/2026	123417	SOR499	B-400	15
24/07/2026	123209	SRM369	B-400	15
24/07/2026	123210	SNH639	B-400	15
25/07/2026	123231	UVV351	B-400	15
28/07/2026	123296	SQN784	B-400	15
28/07/2026	123305	SQN784	B-400	15
28/07/2026	123312	SQN784	B-400	15
29/07/2026	123341	SKN784	PIEDRA FILTRO	15
29/07/2026	123329	SKN784	B-400	15
29/07/2026	123340	SKN784	B-400	15
29/07/2026	123350	TLM710	GRAVA 1/2	15,26
29/07/2026	123327	TDS934	GRAVA 3/4	14,38
29/07/2026	123328	TAX354	GRAVA 3/4	14,38
30/07/2026	123360	SKN784	B-400	15
30/07/2026	123380	TGM709	ARENA	7,07
30/07/2026	123364	TGM709	GRAVA 1/2	6,47
30/07/2026	123390	SWO191	GRAVA 1/2	15,26
31/07/2026	123403	SQZ298	GRAVA 1/2	13,6
31/07/2026	123404	TGGM179	GRAVA 1/2	12,7
31/07/2026	123405	THV078	GRAVA 1/2	13,45
1/08/2026	123435	SQZ298	GRAVA 3/4	14,33
1/08/2026	123436	THV078	GRAVA 3/4	14,31
1/08/2026	123441	TLM710	GRAVA 3/4	16,3

Nuestra Planta cuenta con los Permisos Necesarios y cumple a cabalidad como lo estipula la Resolución 2288 del 7 de octubre del 2014 y el Certificado de Registro Minero DKI-111 del 20 de noviembre del 2003 hasta el 19 de noviembre de 2033.

Se expide a solicitud del Interesado el de 4 de agosto del 2026.

Cordialmente;



NUBIA ANDREA CÓRDOBA NAGLES
CC. 53.002.335 de DC Bogotá
Teléfono: 3203043382
Dirección: Km 14 Vda Los Cobos Sector Pacolí / Vía Girardot – Bogotá Cantera La Colina

ANEXO 13

EL SUSCRITO GERENTE GENERAL DE EMPRESAS PUBLICAS DE NILO SAS ESP SE PERMITE

CERTIFICAR

Que, el **CONSORCIO VICGER 2021,** con número de Nit. 901.902.610 -2, el cual está llevando a cabo la ejecución del contrato ICCU-140 DE 2025 el cual tiene por objeto **"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** llevo a cabo el traslado de los residuos sólidos hasta el casco urbano donde el municipio es el prestador directo del servicio de recolección y el cual procedió a realizar la disposición final de los residuos recibidos así:

- 15 kg de residuos ordinarios.
- 35 kg de residuos aprovechables.

Dado en Nilo Cundinamarca a los 31 días del mes de Julio de 2026.

Alejandro Rincón

ALIRIO ALEJANDRO RINCON HERNANDEZ
GERENTE GENERAL

ANEXO 14

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-24
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2024

FECHA DE REUNION:	23-7-26	ACTA No	
HORA DE INICIO:	3:00 pm	HORA FINALIZACIÓN:	4:00 Pm
LUGAR DE REUNIÓN:	Nilo Cundinamarca		
DEPENDENCIA:	N.A		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Alquiler Unidad Sanitaria

DESARROLLO DE LA REUNION

Se reune el ingeniero Ambiental del proyecto con la Dueña del predio, la señora Araneta Diaz identificada con # de cc 20610681 para el alquiler de unidad sanitaria ubicado en la Via Nilo Cundinamarca para el mes de Juno del Presente año.

Nota: se deja a paz y salvo de todo concepto se consigna a 644879449 cuenta Bancolombia cc 52447897 Maria sanchez.

CONCLUSIONES

N.A

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Alquiler Baño	
Aseo Diario del Baño	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Araneta Diaz	CC 20610681	
Brayan Cano	CC 1160845 24	

Scanned with CamScanner

ANEXO 15

ACTA DE REUNION DEL GRUPO DE GESTIÓNSOCIOAMBIENTAL JERUSALEN

1. INFORMACION DEL PROYECTO

CAMPO	DETALLE
Contrato	ICCU No. 140-2025 (Intervención de Vías Lote 3)
Documento Base	Plan de Adaptación a la Guía Ambiental (PAGA) V6.2
Ubicación	Provincias de Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena (Cundinamarca)
Objeto del Contrato	Intervención de las vías que conforman el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse.

2. OBJETIVO DEL GRUPO

Realizar la sesión ordinaria mensual de seguimiento, evaluación y control a la implementación de las medidas socioambientales del PAGA vigentes para el frente de obra del municipio de Jerusalén. Se aclara que el Grupo de Gestión Socioambiental ya se encuentra debidamente conformado y activo, por lo cual esta sesión tiene como fin evaluar el desempeño, identificar hallazgos en campo y establecer compromisos de mejora en el marco del Contrato ICCU-140.

3. ESTRUCTURA DEL GRUPO

El Grupo de Gestión Ambiental y Social se integra por los siguientes profesionales, quienes asumen la responsabilidad directa de las acciones definidas en el PAGA:

ROL PRINCIPAL	PROFESIONAL ASIGNADO	CEDULA DE CIUDADANIA	FECHA DE ASIGNACION
Residente de obra	Cristian Henao	1.018.505.287	16/7/2026
Profesional SST	Claudia Patricia Ballestas Barandica	1.019.022.615	16/7/2026
Profesional Social	EstherTuñion Perez	1.048.609.602	16/7/2026

ROL PRINCIPAL	PROFESIONAL ASIGNADO	CEDULA DE CIUDADANIA	FECHA DE ASIGNACION
Especialista ambiental	Brayan Felipe Casas García	1.016.082.534	16/7/2026

4. RESUMEN DE TEMAS TRATADOS Y DESARROLLO DE LA SESIÓN

Durante la reunión mensual, cada una de las áreas expuso el balance de actividades ejecutadas en Jerusalén y el estado de cumplimiento de los programas del PAGA:

- Capacitación y Concienciación del Personal: El Especialista Ambiental y la Profesional SST confirmaron la ejecución del plan de formación al personal de obra y administrativo en Cabrera, destacando tres jornadas clave de una hora de duración cada una:

  - Inducción Ambiental A & SST.
  - Capacitación Normatividad Ambiental
  - Capacitación al 100% del personal de obra sobre Cuidado y protección de la fauna y flora de la zona.

- Gestión Social: La Profesional Social presentó el estado de la atención a las comunidades vecinas, confirmando que se mantiene activo el canal de peticiones, quejas y reclamos (PQR). Asimismo, se revisó el cumplimiento de los acuerdos de entrega voluntaria de material sobrante de excavación (tierra limpia y recebo sobrante) a los habitantes locales.

5. HALLAZGOS IDENTIFICADOS Y ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS

En el desarrollo de las inspecciones de campo conjuntas del mes, se identificaron los siguientes hallazgos, para los cuales se definieron acciones inmediatas:

- Hallazgo Ambiental (Logística de Materiales): Se constató la excelente práctica de no generar acopios fijos de materiales granulares en la vía de Jerusalén, ya que el material se distribuyó directamente sobre la vía.

  - Mantener esta misma directriz logística en los demás municipios activos del contrato para evitar afectaciones por escorrentía o polvo.




- Hallazgo Social: Se evidenció una alta favorabilidad por parte de los beneficiarios de los aportes de material de excavación para la adecuación de sus terrenos.

  - Asegurar que todas las actas de entrega de material y las firmas de los beneficiarios locales queden debidamente archivadas en el anexo ambiental del informe para soportar el cumplimiento ante la interventoría.

6. COMPROMISOS Y CONCLUSIONES

- Archivar los registros fotográficos y las actas de vecindad de cierre que evidencien que las zonas donde operó el campamento y la maquinaria en Jerusalén quedaron 100% limpias y restauradas.
- Mantener el canal de comunicación social abierto con las autoridades de Jerusalen en caso de cualquier requerimiento post-obra.
- Responsable: Profesional Social.

Para constancia de lo tratado, los hallazgos identificados y los compromisos adquiridos para el cumplimiento riguroso del PAGA, se firma el presente ajuste al acta:

PROFESIONAL	CARGO	FIRMA
Cristian Henao	Residente de obra	
Claudia Patricia Ballestas Barandica	Profesional SST	
Lorena Pinilla Galindo	Profesional social	
Brayan Felipe Casas García	Especialista Ambiental	

ANEXO 16

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: Jericoacoara 14-7-25

CAPACITADOR: Oscar Felipe Casas Barrera

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: Inducción Ambiental y SST

HORA DE INICIO: 11:30 AM HORA TERMINACION: 12:30 PM

TIPO

INDUCCIÓN: [X] CAPACITACION: [ ]

CHARLA INFORMATIVA: [X] ENTRENAMIENTO: [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Claudia Chavez	52811511	Auxiliar	Claudia
Luis Fernando Varela	1010751299	Ayudante	
Wendy Daniela Cruz	1014179427	Ayudante	Wendy Cruz
Jairo Borja	7464 96	Operador	
Laura Cordoba	1010089873	auxiliar	Laura C.
Carlos Alberto [illegible]	[illegible]	Ayudante	Carlos
Jhonny Romero	1069230091	Ayudante	

Scanned with CamScanner

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: Jerusalén 15-7-26

CAPACITADOR: Brayan Felipe Casas García

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: Proveedores y disposición final

HORA DE INICIO: 8:00 Am HORA TERMINACION: 9:00 Am

TIPO

INDUCCIÓN [ ] CAPACITACION [X]

CHARLA INFORMATIVA [ ] ENTRENAMIENTO [ ]

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
carlos Alberto	1033796250	Ayudante	Carlos
laura Carvajal	1070085873	auxiliar	Carvajal
Luis felipe varela	1010751279	Ayudante	[firma]
Claudia chavez	52811771	Auxiliar	Claudia
Juan Pérez	2969503	Operador	[firma]
Jimmy Romero	1069230091	Ayudante	[firma]
Wendy Donelacruz	1014279422	Ayudante	Wendy C.

REGISTRO DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO

LUGAR Y FECHA: Arcabuco 16-7-26

CAPACITADOR: Brayan Felipe Casas Garcia

EMPRESA: CONSORCIO VICGER 2021

TEMA ESPECIFICO: Cuidado y proteccion de la fauna y la flora en la zona

HORA DE INICIO: 9:00 Am HORA TERMINACION: 10:00 Am

TIPO

INDUCCIÓN		CAPACITACION	X
CHARLA INFORMATIVA		ENTRENAMIENTO	

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO	FIRMA
Luis Felipe Varela	1070751299	Ayudante	
Laura Cardozo	1010089873	Auxiliar	
Jimmy Romero	1064250091	Ayudante	
Carlos Alberto	1033779250	Ayudante	
Jendy Daniela Cam	1012794222	Ayudante	
Jhon Bayron	2969562	Operador	
Claudia Chavez	52811371	Auxiliar	Claudia

Scanned with CamScanner

ANEXO 17



ELKIN ANTONIO ZAPATA JARAMILLO
NIT 8.014.122-0
jerusalen cundinamarca vereda el tabaco
Tel: 3166763810
Bogotá - Colombia
elkinzapatajaraamillo@gmail.con

Remisión
No. 1-1

Señores	BIA INGENIERIA S.A.S		
NIT	901.922.959-2	**Teléfono**	(2) 3002089435 - Ext. 000
Dirección	CR 70 NO.110 10	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha Elaboración	14/08/2026
Vendedor	Elkin Antonio Zapata

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	AFIRMADO	14.00	882,980.00
2	ARENA LAVADA DE RIO	21.00	1,249,500.00
3	GRAVILLA DE RIO 1/2	28.00	2,065,840.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones:
CERTIFICADO DE DESPACHO DE MATERIAL TERRESTRE

ELKIN ANTONIO ZAPATA JARAMILLO
NIT: 8.014.122-0
Jerusalén, Cundinamarca – Vereda El Tabaco
Teléfono: 3166763810
Correo electrónico: elkinzapatajaramillo@gmail.com

CERTIFICA:

Que, durante el mes de julio de 2026, se realizó el despacho de material terrestre desde las instalaciones de ELKIN ANTONIO ZAPATA JARAMILLO con destino a la empresa BIA INGENIERIA S.A.S (NIT: 901.922.959-2).

El Vehículo de transporte del material fue tipo volqueta
Placa del vehículo: FUD 8

Total Bruto	3,528,000.00
IVA 19%	670,320.00
Total a Pagar	4,198,320.00

Entregado por: _____ Recibido por: _____

ANEXO 18

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE JERUSALÉN, CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que, el contratista **CONSORCIO VICGER 2021,** con numero de Nit. 901.902.610 -2, el cual está llevando a cabo la ejecución del contrato ICCU-140 DE 2025 el cual tiene por objeto **"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** llevo a cabo el traslado de los residuos solidos hasta el casco urbano donde el municipio es el prestador directo del servicio de recolección y el cual procedió a realizar la disposición final de los residuos recibidos así:

- 45 kg de residuos convencionales (no aprovechables)
- 20 kg de residuos aprovechables

La presente certificación se expide a solitud del interesado, en Jerusalén el primer (01) día del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

MES RECICLADO : DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026

ADRIANA GUTIERREZ

ING. ADRIANA LUCIA GUTIERREZ BERRIO
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Scanned with CamScanner

ANEXO 19

EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS DE JERUSALÉN, CUNDINAMARCA

CERTIFICA:

Que, el contratista **CONSORCIO VICGER 2021**, con número de Nit. **901.902.610-2**, el cual está llevando a cabo la ejecución del contrato ICCU-140 DE 2025 el cual tiene por objeto **"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"** adquirió y canceló ante la Alcaldía Municipal de Jerusalén, Cundinamarca, la suma de **TRESCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (305.474,00)** por concepto de la compra de VEINTISÉIS (26) BLOQUES DE AGUA en metros cúbicos, para el desarrollo de las actividades relacionadas con la ejecución del referido contrato.

La presente certificación se expide a solitud del interesado, en Jerusalén el primer (01) día del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026).

MES SUMINISTRADO: DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2026.

ADRIANA GUTIERREZ

ING. ADRIANA LUCIA GUTIERREZ BERRIO
Secretaria de Planeación y Obras Públicas

Scanned with CamScanner

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	[illegible]
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2023

FECHA DE REUNIÓN :	29-7-26	ACTA No.	1
HORA DE INICIO:	11:46	HORA FINALIZACIÓN:	12:46
LUGAR DE REUNIÓN:	Finca la Ceiba		
DEPENDENCIA:	NA		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Alquiler unidad Sanitaria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se reune el ingeniero Ambiental del Proyecto para Alquiler de Unidad Sanitaria Con la dueña del Predio Monica Ramret con # cc 1019025843, se realiza el pago al # de Nequi 3212502179 para el mes de Julio.

Nota:
Se deja el pago en paz y salvo en todo concepto, Durante el mes de Julio

CONCLUSIONES

NA

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Pago unidad sanitaria Alquiler unidad Sanitaria	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Ing Brayan Cossio	fdjcrazy829@gmail.com	
Monica Ramret	Monicaramret1980@hotmail.com	Monica Ramret

Scanned with CamScanner

ANEXO 20

Agregados la floresta S.A.S
NIT. 900.568.753-0

Concretos Floresta

AGREGADOS LA FLORESTA SAS

NIT. 900.568.753 - 0

CERTIFICA QUE:

Del 1 al 31 de julio de 2026, hemos hecho entrega al cliente CONSORCIO VICGER 2021, identificado con NIT. 901.902.610 – 2, bajo el contrato de media minería para la explotación de un yacimiento de materiales de arrastre número BGI141 y RUCOM-201605166854, los siguientes materiales con las respectivas cantidades:

MATERIAL	CANTIDAD
ARENA	15 m3
GRAVA 1”	105 m3
GRAVA ½”	150 m3

La presente se firma a los cuatro (04) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

MONICA SANCHEZ
GERENCIA
Móvil: 3114544207 - 3203876292
E-Mail: concretosfloresta.planta@gmail.com

DESPACHOS							
N° REM.	**FECHA**	**CLIENTE**	**DESTINO**	**MATERIAL**	**M3**	**PLACA**	**CONDUCTOR**
16421	miércoles, 1 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1/2"	15	TAV 258	LUIS MEDINA
16422	miércoles, 1 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1"	15	TGN 084	JOSE CARDENAS
16458	miércoles, 1 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1"	15	SWO 191	FREDY MUNEVAR
16472	jueves, 2 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1"	15	TGN 084	JOSE CARDENAS
16484	jueves, 2 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1/2"	15	SWO 191	FREDY MUNEVAR
16498	sábado, 4 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1/2"	15	THV 078	JAMES ROMERO
16499	sábado, 4 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1/2"	15	SQZ 298	JEFFERSON BAUTISTA
16517	viernes, 3 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1/2"	15	SOA 573	OSCAR PULIDO
16522	lunes, 6 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1"	15	TAQ 219	JAMES RAMIREZ
16523	lunes, 6 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1"	15	TRK 537	JOSE RAMIREZ
16524	lunes, 6 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1"	15	SWO 191	FREDY MUNEVAR
16678	miércoles, 15 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1"	15	SWO 191	FREDY MUNEVAR
16680	miércoles, 15 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1/2"	15	GQT 917	ROBINSON TOVAR
16693	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1/2"	15	TAX 354	CARLOS CALA
16694	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1/2"	15	SWO 191	FREDY MUNEVAR
16707	jueves, 16 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1/2"	15	TLO 178	VICTOR GOMEZ
16723	viernes, 17 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	GRAVILLA 1/2"	15	SWO 191	FREDY MUNEVAR
16744	viernes, 17 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	PANDI	ARENA LAVADA	15	SWO 191	FREDY MUNEVAR

ANEXO 21

Agregados la floresta S.A.S
NIT. 900.568.753-0

Concretos Floresta

AGREGADOS LA FLORESTA SAS

NIT. 900.568.753 - 0

CERTIFICA QUE:

Del 1 al 31 de julio de 2026, hemos hecho entrega al cliente CONSORCIO VICGER 2021, identificado con NIT. 901.902.610 – 2, bajo el contrato de media minería para la explotación de un yacimiento de materiales de arrastre número BGI141 y RUCOM-201605166854, los siguientes materiales con las respectivas cantidades:

MATERIAL	CANTIDAD
B-400	15 m3

La presente se firma a los cuatro (04) días del mes de agosto del año dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,

MONICA SANCHEZ
GERENCIA
Móvil: 3114544207 - 3203876292
E-Mail: concretosfloresta.planta@gmail.com

DESPACHOS							
N° REM.	**FECHA**	**CLIENTE**	**DESTINO**	**MATERIAL**	**M3**	**PLACA**	**CONDUCTOR**
17137	viernes, 31 de julio de 2026	CONSORCIO VICGER 2021	TIBACUY	B−400	15	SOR 538	GUILLERMO PRIETO

ANEXO 22

[redacted]

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DIRECCIÓN NACIONAL DE BOSQUES, GESTIÓN AMBIENTAL NACIONAL, PREDIOS Y DE ECOSISTEMAS GRANDES DE PÁRAMOS
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PMA-SOCIAL
MATRIZ DE CONTROL AMBIENTAL DE OBRA (LITADA)

CÓDIGO	GG-SPC-MAN-IN-2-FO-3
VERSIÓN	1
VIGENCIA	[redacted]
FECHA	VERSIÓN (DIA / MES / AÑO)

PROYECTO LICENCIADO	SI / NO
	(indicar con una X)

LICENCIA AMBIENTAL Nº: N/A
RESOLUCIÓN: [redacted]
OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEBRADAS, PALMAS PROVINCIALES DE SUAREZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

UNIDAD EJECUTORA: [redacted]
DIRECCIÓN TERRITORIAL: [redacted]

INFORME	PERIODO	DESDE	(DIA)	HASTA	(DIA/MES)	Número	0

FECHA ARRANQUE	(D / M / A)

CONTRATO DE OBRA Nº: EDCAME
LICENCIA AMBIENTAL Nº: [redacted]
OBJETO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEBRADAS, PALMAS PROVINCIALES DE SUAREZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA DE INICIO: (DIA/MES/AÑO)
FECHA DE TERMINACIÓN: (DIA/MES/AÑO)
PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA: MIRAYA FELIPE CASAS GARCIA
No TJ/MATR. PROFESIONAL: [redacted]
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA: [redacted]
No TJ/MATR. PROFESIONAL: [redacted]
ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATISTA: Raquen Felipe Casas Garcia
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA: [redacted]

MEDIO	Nº FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA PERIODO	1. EVALUACIÓN DETALLADA EN EL PMA- S Fichas: INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO		2. RELACIÓN DE CUMPLIMIENTO AL PERIODO						3. RELACIÓN DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			RELACIONAR SOPORTES	
								INDICADOR VERIFICABLE	FICHA ACTIVIDAD	% CUMPLIMIENTO	SI	N	NA	A CUMPLIR	CONCEPTO ACTIVIDAD INTERVENTORIA	SI	N	NA	A CUMPLIR	DOCUMENTACIÓN SOPORTE CONCEPTO ACTIVIDAD INTERVENTORIA	ACTIVIDAD INCLUIDA EN ACTA DE INICIO DEL CONTRATO SI/NO	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVIDADES AMBIENTALES REQUERIDAS DE ESPECIALIDAD CONTRATO	CONCEPTO ESPECIALISTA AMBIENTAL ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTO ANEXO	FOTOGRAFICA
Socioeconomico	SAGA-1.1-01	Gestion del proyecto	Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social	0	UNIDAD	0	[redacted]	[redacted]	100%		X											NA	NA
Capacitaciones	SAGA-1.2-02	Gestion del proyecto	Capacitación y Concientización del Personal de Obra	1	UNIDAD	1	[redacted]	[redacted]	100%		X											VER ANEXO 1	[redacted]
Legal	SAGA- 1.3-03	Gestion del proyecto	Seguimiento y control de los requerimientos legales	1	UNIDAD	1	[redacted]	[redacted]	100%		X											NA	NA
Residuos	RHC- 2.1-04	Actividades constructivas	Manejo integral de materiales de construcción	60	m3	60	[redacted]	[redacted]	100%		X											NA	NA
RCD	SAGA-3.4-07	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y mezc	20	m3	20	[redacted]	[redacted]	100%		X											VER ANEXO 3	[redacted]
Flora	RHC-3.5-08	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo Integral de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales	6	UNIDAD	6	[redacted]	[redacted]	100%		X											VER ANEXO 4	[redacted]
Hídrico	RLD-3.2-11	Gestión Hídrica	Seguimiento y control al manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	15	m3	15	[redacted]	[redacted]	100%		X											VER ANEXO 5	[redacted]
Biótico	REGE-4.1-12	Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Manejo de Descapote y Cobertura Vegetal	1	UNIDAD	1	[redacted]	[redacted]	100%		X											NA	NA
Maquinaria	RMT-5.3-20	MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE CAMPAMENTO Y EQUIPOS	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	6	UNIDAD	6	[redacted]	[redacted]	100%		X											NA	NA

Ingeniar: Acciones del ambiente de Mejora.
Cuidar: Cumplimiento, Normatividad, Responsabilidad Ambiental

ANEXO 23

[redacted]

CÓDIGO	HSEPR-MAN-IN-2-FO-3
VERSIÓN	1
VIGENTE	
FECHA	2025/05 (DIA/ TRIM./ AÑO)

PROYECTO LICENCIADO	SI / NO
	(indicar con una X)

LICENCIA AMBIENTAL N°: N/A
RESOL: N/A
OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA EL CAMINO VECINAL EL CAMINO PARA QUEBRADA EN LAS PROVINCIAS DE SUAREZ, TIQUENDAMA Y ALTO MACEDONIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN TERRITORIAL:

INFORME	PERIODO	DESDE	DIA/MES	HASTA	DIA/MES	Número	2

FICHA VERSIÓN N° 0.2

CONTRATO DE OBRA Nº: 4214446
CONTRATO DE LA OBRA DIVISIÓN LARGA Nº:
OBJETO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA EL CAMINO VECINAL EL CAMINO PARA QUEBRADA, EN LAS PROVINCIAS DE SUAREZ, TIQUENDAMA Y ALTO MACEDONIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
OBJETO:

FECHA DE INICIO: 2/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/7/25
FECHA DE TERMINACIÓN:

PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA: MARYA FELIPE CASAS GARCIA — [redacted] — No TJ/MTA PROFESIONAL: [redacted] — 3002021-AGENTO CAD
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA: [redacted] — [redacted] — No TJ/MTA PROFESIONAL: [redacted]

ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATISTA: Raquen Felipe Casas Garcia — [redacted] — No TJ/MTA PROFESIONAL: 3002021-AGENTO CAD
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA: [redacted] — [redacted] — No TJ/MTA PROFESIONAL:

1. EVALUACIÓN DETALLADA EN EL PAA: 5 Fichas

MEDIO	N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA PERIODO	INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO		2. RELACIÓN CUMPLIMIENTO AL PERIODO						3. RELACIÓN CUMPLIMIENTO AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN		4. RELACIÓN SOPORTES	
								INDICADOR APLICABLE A	FICHA ACTIVIDAD	% CUMPLIMIENTO	SI	N	NA	A CUMPLIR	CONCEPTO ACTIVIDAD EN OBRA	% CUMPLIMIENTO	SI	N	NA	A CUMPLIR	DOCUMENTO EN EL CUMPLIMIENTO INICIAL CONCEPTO ACTIVIDAD EN OBRA	ESTADO FINAL (Cumplimiento de acuerdo con criterios de aceptación)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AMBIENTAL NO PRESENTE EN EJECUCIONAL CERRADA DEL CONTRATO	CONCEPTO DE ACTIVIDAD FINAL ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTOS AB.	FOTOGRAFICOS
Socioeconomico	SAGA-1.1-01	Gestion del proyecto	Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social	Reunion de gestión ambiental y social	0	UNIDAD	0	[redacted]	[redacted]	100%	X												NA	NA
Capacitaciones	SAGA-1.2-02	Gestion del proyecto	Capacitación y Concientización del Personal de Obra	Realice inducción y capacitación al personal de obra	6	UNIDAD	6	[redacted]	[redacted]	100%	X												VER ANEXO 14	
Legal	SAGA-1.3-03	Gestion del proyecto	Seguimiento y control de los requerimientos legales	Obtención de Permisos Ambientales. (En caso de requerirse) Ejecución de la Normatividad Ambiental	1	UNIDAD	1	[redacted]	[redacted]	100%	X												NA	NA
Residuos	RCC- 2-1-04	Actividades constructivas	Manejo integral de materiales de construcción	Medidas implementadas para el almacenamiento de materiales. Medidas implementadas para transporte de materiales	277	m3	277	[redacted]	[redacted]	100%	X												VER ANEXO 15	NA
RCD	SAGA-3-4-07	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y tierra.	Implementación gestionada del manejo, almacenamiento temporal de los residuos de RCD. Transporte de los residuos de las excavaciones, demoliciones, materiales sobrantes, embalajes, evaluación y alternativas para este proyecto.	0	m3	0	[redacted]	[redacted]	100%	X												NA	NA
Flora	RLC-2-5-08	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo integral de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales	Implementación del manejo de residuos sólidos, convencionales y especiales, tratase un suelo ecológico o [redacted] en el campamento de obra ya en el proyecto de obra de [redacted] Verificar la implementación de recolección de residuos, que [redacted] Verificar que los [redacted] cuenten con bolsas, canecas y papeleras aquellos que se consumen [redacted] Verificar que los trabajadores y personal no mezclen los [redacted] Solicitar y almacenar los [redacted] de obra en sitios [redacted]	11	UNIDAD	11	[redacted]	[redacted]	100%	X												VER ANEXO 16	
Hídrico	RLD-3-2-11	Gestión Hídrica	Seguimiento y control al manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	Verificar la implementación de [redacted] Verificar que se garantice el manejo apropiado de los residuos líquidos, tal es los orgánicos, y aceites. [redacted] permitan verificar el [redacted] de los residuos líquidos, Realizar un manejo adecuado [redacted] Verificar que los [redacted] utilizados en el proyecto. Disponer adecuadamente [redacted] aguas residuales [redacted] de los sanitarios de obra. Verificar el uso adecuado de [redacted] Inserte los [redacted] para los trabajadores del proyecto.	70	m3	70	[redacted]	[redacted]	100%	X												VER ANEXO 13	
Bióticos	RBSE-1-1-12	Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos	Manejo de Descapote y Cobertura Vegetal	Realice descapote en áreas estrictamente necesarias.	1	0	1	[redacted]	[redacted]	100%	X												NA	NA
	PMT-3-3-20	MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES (ZONA QUIMICA Y PLANTA)	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	Actividades de manejo de maquinaria, equipo y vehículos. Revision de Maquinaria, Equipo y Vehículos. Verificar que [redacted] (SOAT, Revisión Técnico Mecánica, Cartas, entre otras). Verificar las condiciones de la [redacted] empleados.	3	UNIDAD	3	[redacted]	[redacted]	100%	X												NA	NA

Original: Archivo de Gestión del Área G
Copias: Dependencia Interesadas - Subdirección de Sostenibilidad

ANEXO 24

[redacted]

CÓDIGO	HSEPR-MAN-IN-2-FO-3
VERSIÓN	1
VIGENTE	
FECHA	2025/05 (DIA/ TRIM./ AÑO)

PROYECTO LICENCIADO	SI / NO
	(indicar con una X)

LICENCIA AMBIENTAL N°: N/A
RESOL: N/A
OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA EL CAMINO VECINAL EL CAMINO PARA QUEBRADA EN LAS PROVINCIAS DE SUAREZ, TIQUENDAMA Y ALTO MACEDONIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN TERRITORIAL:

INFORME	PERIODO	DESDE	DIA/MES	HASTA	DIA/MES	Número	2

FICHA VERSIÓN N° 0.2

CONTRATO DE OBRA Nº: 4214446
CONTRATO DE LA OBRA DIVISIÓN LARGA Nº:
OBJETO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA EL CAMINO VECINAL EL CAMINO PARA QUEBRADA, EN LAS PROVINCIAS DE SUAREZ, TIQUENDAMA Y ALTO MACEDONIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
OBJETO:

FECHA DE INICIO: 2/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/7/25
FECHA DE TERMINACIÓN:

PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA: MARYA FELIPE CASAS GARCIA — [redacted] — No TJ/MTA PROFESIONAL: [redacted] — 3002021-AGENTO CAD
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA: [redacted] — [redacted] — No TJ/MTA PROFESIONAL: [redacted]

ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATISTA: Raquen Felipe Casas Garcia — [redacted] — No TJ/MTA PROFESIONAL: 3002021-AGENTO CAD
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA: [redacted] — [redacted] — No TJ/MTA PROFESIONAL:

1. EVALUACIÓN DETALLADA EN EL PAA: 5 Fichas

MEDIO	N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA PERIODO	INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO		2. RELACIÓN CUMPLIMIENTO AL PERIODO						3. RELACIÓN CUMPLIMIENTO AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO SEGÚN		4. RELACIÓN SOPORTES	
								INDICADOR APLICABLE A	FICHA ACTIVIDAD	% CUMPLIMIENTO	SI	N	NA	A CUMPLIR	CONCEPTO ACTIVIDAD EN OBRA	% CUMPLIMIENTO	SI	N	NA	A CUMPLIR	DOCUMENTO EN EL CUMPLIMIENTO INICIAL CONCEPTO ACTIVIDAD EN OBRA	ESTADO FINAL (Cumplimiento de acuerdo con criterios de aceptación)	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE AMBIENTAL NO PRESENTE EN EJECUCIONAL CERRADA DEL CONTRATO	CONCEPTO DE ACTIVIDAD FINAL ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTOS AB.	FOTOGRAFICOS
Socioeconomico	SAGA-1.1-01	Gestion del proyecto	Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social	Reunion de gestión ambiental y social	0	UNIDAD	0	[redacted]	[redacted]	100%	X												NA	NA
Capacitaciones	SAGA-1.2-02	Gestion del proyecto	Capacitación y Concientización del Personal de Obra	Realice inducción y capacitación al personal de obra	6	UNIDAD	6	[redacted]	[redacted]	100%	X												VER ANEXO 14	
Legal	SAGA-1.3-03	Gestion del proyecto	Seguimiento y control de los requerimientos legales	Obtención de Permisos Ambientales. (En caso de requerirse) Ejecución de la Normatividad Ambiental	1	UNIDAD	1	[redacted]	[redacted]	100%	X												NA	NA
Residuos	RCC- 2-1-04	Actividades constructivas	Manejo integral de materiales de construcción	Medidas implementadas para el almacenamiento de materiales. Medidas implementadas para transporte de materiales	277	m3	277	[redacted]	[redacted]	100%	X												VER ANEXO 15	NA
RCD	SAGA-3-4-07	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y tierra.	Implementación gestionada del manejo, almacenamiento temporal de los residuos de RCD. Transporte de los residuos de las excavaciones, demoliciones, materiales sobrantes, embalajes, evaluación y alternativas para este proyecto.	0	m3	0	[redacted]	[redacted]	100%	X												NA	NA
Flora	RLC-2-5-08	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo integral de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales	Implementación del manejo de residuos sólidos, convencionales y especiales, tratase un suelo ecológico o [redacted] en el campamento de obra ya en el proyecto de obra de [redacted] Verificar la implementación de recolección de residuos, que [redacted] Verificar que los [redacted] cuenten con bolsas, canecas y papeleras aquellos que se consumen [redacted] Verificar que los trabajadores y personal no mezclen los [redacted] Solicitar y almacenar los [redacted] de obra en sitios [redacted]	11	UNIDAD	11	[redacted]	[redacted]	100%	X												VER ANEXO 16	
Hídrico	RLD-3-2-11	Gestión Hídrica	Seguimiento y control al manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	Verificar la implementación de [redacted] Verificar que se garantice el manejo apropiado de los residuos líquidos, tal es los orgánicos, y aceites. [redacted] permitan verificar el [redacted] de los residuos líquidos, Realizar un manejo adecuado [redacted] Verificar que los [redacted] utilizados en el proyecto. Disponer adecuadamente [redacted] aguas residuales [redacted] de los sanitarios de obra. Verificar el uso adecuado de [redacted] Inserte los [redacted] para los trabajadores del proyecto.	70	m3	70	[redacted]	[redacted]	100%	X												VER ANEXO 13	
Bióticos	RBSE-1-1-12	Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos	Manejo de Descapote y Cobertura Vegetal	Realice descapote en áreas estrictamente necesarias.	1	0	1	[redacted]	[redacted]	100%	X												NA	NA
	PMT-3-3-20	MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES (ZONA QUIMICA Y PLANTA)	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	Actividades de manejo de maquinaria, equipo y vehículos. Revision de Maquinaria, Equipo y Vehículos. Verificar que [redacted] (SOAT, Revisión Técnico Mecánica, Cartas, entre otras). Verificar las condiciones de la [redacted] empleados.	3	UNIDAD	3	[redacted]	[redacted]	100%	X												NA	NA

Original: Archivo de Gestión del Área G
Copias: Dependencia Interesadas - Subdirección de Sostenibilidad

ANEXO 25

CONSORCIO VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PMA O PAGA

CODIGO	MASPS-MN1-IN-2-FR-3
VERSIÓN	1
PAGINA	
FECHA	30/06/26 (Día / Mes / Año)

PROYECTO LICENCIADO: SI ( ) NO (X) (indicar con una X)

LICENCIA AMBIENTAL Nº: NA
FECHA: NA
OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN TERRITORIAL:

INFORME	PERIODO	DESDE	1/06/26	HASTA	30/06/26	Número	1

PAGA VERSIÓN Nº: 6.2

CONTRATO DE OBRA Nº: ICCU140
OBJETO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA DE INICIO: 2/04/25
FECHA DE TERMINACIÓN: 8/07/25
PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA: BRAYA FELIPE CASAS GARCIA (NOMBRE) — FIRMA
No TARJETA PROFESIONAL: 091021-0525767 CND
ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATISTA: Brayan Felipe Casas Garcia (NOMBRE) — FIRMA
No TARJETA PROFESIONAL: 091021-0525767 CND

CONTRATO DE INTERVENTORIA Nº:
OBJETO:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TERMINACIÓN:
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA: NOMBRE — FIRMA
No TARJETA PROFESIONAL:
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORÍA: NOMBRE — FIRMA
No TARJETA PROFESIONAL:

MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA O PAGA

1. OBLIGACIÓN ESTABLECIDA EN EL PMA O PAGA										2. BALANCE DE CUMPLIMIENTO AL PERIODO										3. BALANCE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			RELACIÓN DE SOPORTES	
					META			INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO		SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE INDICADORES					SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS									
										PERIODO REPORTADO					ACUMULADO									
MEDIO	Nº FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA PERÍODO	INDICADOR (FORMULA)	EVALUACIÓN INDICADOR	% CUMPLIMIENTO	SI	NO	PARCIAL	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA	VALOR	SI	NO	PARCIAL	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA	ACTIVIDAD AMBIENTAL CULMINADA AL CIERRE DEL CONTRATO (SI/NO)	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES PENDIENTES DE EJECUCIÓN AL CIERRE DEL CONTRATO	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTALES	FOTOGRÁFICOS
Socioeconomico	DAGA-1.1-01	Gestion del proyecto	Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social	Reunion de gestión ambiental y social.	23	UNIDAD	23	[illegible]	[illegible]	100%	X												VER ANEXO 23	NA
Capacitaciones	DAGA-1.2-02	Gestion del proyecto	Capacitación y Concienciación del Personal de Obra	Realizar inducción y capacitación al personal de obra.	6	UNIDAD	3	[illegible]	[illegible]	100%	X												VER ANEXO 24	
Legal	DAGA -1.3-03	Gestion del proyecto	Seguimiento y control de los requerimientos legales	Obtención de Permisos Ambientales. (En caso de requerirse) y Capacitación de la Normatividad Ambiental.	1	UNIDAD	1	[illegible]	[illegible]	100%	x												NA	NA
Residuos	PAC- 2.1-04	Actividades constructivas	Manejo integral de materiales de construccion	Medidas implementadas para el almacenamiento de materiales, Medidas implementadas para transporte de materiales.		m3		[illegible]	[illegible]	100%	x													
Señalizacion	DAGA-2.3-06	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Señalización para el Manejo Ambiental en Frentes de Obra y sitios temporales	Implementación de señalización en los frentes de obra y campamento.	10	UNIDAD	10	[illegible]	[illegible]	100%	X												NA	
RCD	DAGA 2.4-07	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y lodos.	Implementación garantizada del manejo, Almacenamiento temporal de los sobrantes o RCD., Transporte de los RCD, Disposición final de los residuos de las excavaciones, en los sitios previamente seleccionados, evaluados y adecuados para este propósito.	0	m3	0	[illegible]	[illegible]	100%	X												NA	NA
Fisico	PAC-2.5-08	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo Integral de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales	Implementación del manejo de la disposición de residuos sólidos, convencionales y especiales, Instalar un punto ecológico o de acuerdo como se requiera, en el campamento de obra y/o en los frentes de obra, Organizar cuadrillas de recolección de residuos, que recorran en su totalidad los tramos en obras, recogiendo aquellos que se encuentran dispuestos de manera inadecuada y posteriormente conducirlos al sitio de acopio, Señalar y demarcar las zonas de almacenamiento de los residuos sólidos, Instalar canecas rojas o sitios adecuados para el acopio temporal de respel según se requiera.	13	UNIDAD	13	[illegible]	[illegible]	100%	x												VER ANEXO 26	
Hidrico	RLDI-3.2-11	Gestión Hidrica	Seguimiento y control al manejo de residuos liquidos,domésticos e Industriales.	Verificar la implementación de las medidas orientadas a garantizar el manejo apropiado de los residuos liquidos, Llevar los registros y actas que permitan verificar el cumplimiento de tales medidas, Realizar un manejo adecuado a las sustancias químicas utilizadas en el proyecto, Disponer adecuadamente las aguas residuales resultantes de las actividades de obra, Verificar el uso adecuado de la batería sanitaria alquilada para los trabajadores del proyecto.	0	m3	0	[illegible]	[illegible]	100%	X												VER ANEXO 27	
Biótico	PBSE-4.1-12	Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Manejo de Descapote y Cobertura Vegetal	Realizar descapote en áreas estrictamente necesarias.	0	UNIDAD	0	[illegible]	[illegible]	100%	X												NA	NA
Maquinaria	PMT-5.3-20	MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	Actividades de manejo de maquinaria, equipos y vehículos, Revisión de Maquinaria, equipos y vehículos a contratar (SOAT, Revisión Emisión de Gases, entre otros), Verificar las condiciones de la maquinaria por medio de preoperacionales.	6	UNIDAD	6	[illegible]	[illegible]	100%	X												NA	

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor, Subdirección de Sostenibilidad.

ANEXO 26

ACUERDO DE ACCIÓN (ADA)

INSPECCIÓN AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICA DE CUMPLIMIENTO
PROCESO NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE RESTABLECIMIENTO DE PROYECTOS
Nacional, DE INFRAESTRUCTURA VIAL PUBLICA
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DEL PAGA ACTIVO

CÓDIGO	MADITU-MAN-PA-2-FR-3
VERSIÓN	1.0
VIGENCIA	
FECHA	VERSIÓN
	(DIA/ MES/ AÑO)

PROYECTO LICENCIADO	SI	X
	NO	

(Indicar con una X)

LICENCIA AMBIENTAL N°: N/A
FECHA: N/A
OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEBRADAS, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN TERRITORIAL:

INFORME	PERIODO	DESDE	DIA/DE	HASTA	DIA/DE	Número	1

FASE/ VIGENCIA: 0.0

CONTRATO OP/ORDEN N°: ICC-0-445
OBJETO: "INTERVENTORIA CON LAS QUE SE CONTRATARAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEBRADAS, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA DE INICIO: 2024/05 (DIA/ MES/ AÑO)
FECHA DETERMINACIÓN: 06/7/25
PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA: Mirla Vis. Villa Arteaga Garcia
No TJ/GESTA PROFESIONAL:
GRADO ARQ/PET CND:
ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATISTA: Brayan Felipe Canas Garcia
No TJ/GESTA PROFESIONAL:

CONTRATO CONVENIO N°:
OBJETO:
FECHA DETERMINACIÓN:
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORÍA:
No TJ/GESTA PROFESIONAL:
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORÍA:
No TJ/GESTA PROFESIONAL:

ACTIVIDADES DE CAMPO (MARCAR CON UNA X)

N/MERO	N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	1. OBLIGACIÓN PDT/LICENCIA EN EL PAGA O PACA			INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO		2. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO EN EL PERIODO										3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA		RELACIÓN DE SOPORTES	
					CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA DEL PERIODO	INDICADOR FÍSICO (1)	INDICADOR SOCIOECONÓMICO (2)	% EJECUCIÓN ACTIVIDAD	SI	NO	N/A	CUMPLE	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA	SI	NO	N/A	CUMPLE	OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA	SOLICITUDES ACEPTADAS AL CIERRE DEL CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES PENDIENTES DE EJECUCIÓN AL CIERRE DEL CONTRATO	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA A ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTALES	FOTOGRÁFICOS
Socioeconomico	GAGA-1.1-01	Gestion del proyecto	Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social	Reunion de gestión ambiental y social	0	UNIDAD	0			100%	X													NA	NA
Capacitaciones	GAGA-1.2-02	Gestion del proyecto	Capacitación y Concientización del Personal de Obra	Realizar inducción y capacitación al personal de obra.	0	UNIDAD	0			100%	X													NA	NA
Legal	GAGA-1.3-03	Gestion del proyecto	Seguimiento y control de los requerimientos legales	Obtención de Permisos Ambientales. (Sin usos de aguas superficiales ni de la Humedad del Subsuelo)	1	UNIDAD	1			100%	x													NA	NA
Residuos	PAC- 2-1-04	Actividades constructivas	Manejo integral de materiales de construcción	Medidas implementadas para reducir, reutilizar y reciclar materiales. Medidas implementadas para transporte de materiales.	10	m3	10			100%	x													NA	NA
RCD	GAGA-2-4-07	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y Suelo	Implementación garantizada del manejo, almacenamiento temporal de los residuos de construcción y demolición (RCD). Disposición final de los residuos de tipo inconveniente, peligroso, especial, ordinario, radioactivos, inclusivos y asimilables para cada proyecto.	0	m3	0			100%	X													NA	NA
Pavco	PAC-2-5-06	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo Integral de Residuos Sólidos Convencionales y Especiales	Implementación del manejo de residuos sólidos, convencionales y especiales, tratar un almacenamiento temporal de acuerdo como lo requiera, Disponer adecuadamente en los frentes de obra. Organizar cuadrillas de recolección de residuos, que recojan todos los residuos en los frentes de obra, recogiendo aquellos que se encuentren dispersos en el área de construcción, posteriormente depositarlos en el sitio de almacenamiento temporal de los residuos sólidos. Instalar canecas rojas o otras adecuadas para el acopio temporal de material no reciclable.						100%	x													VER ANEXO 12	
Hídrico	RLS-3.2-11	Gestión Hídrica	Requerimiento y control al manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	Verificar la implementación de sistemas de tratamiento que garanticen el manejo apropiado de los residuos líquidos domésticos y evitar la contaminación del suelo y aguas superficiales. Realizar el cumplimiento de dichas medidas. Realizar un manejo adecuado de los residuos líquidos que se utilicen en el proyecto. Disponer adecuadamente aguas residuales domésticas, dichas actividades de obra. Verificar el uso adecuado de la batería sanitaria dispuesta para los trabajadores del proyecto.						100%	x													VER ANEXO 13	
Biótico	PBSE-4-1-12	Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Manejo de Descapote y Cobertura Vegetal	Realizar descapote en áreas exclusivamente necesarias.	1	UNIDAD	1			100%	x													NA	NA
	PMT-5-3-24	MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	Actividades de manejo de maquinaria, equipos y vehículos, Revisión de Maquinaria, Equipos y Vehículos. Cumplimiento de SOAT, Revisión Técnico-Mecánica y de Gases, Control de Emisiones. Manejo de la maquinaria por medio de preoperacionales.	0	UNIDAD	0			100%	x													NA	NA

Leyenda: (1) Indicador cantidad realizada
(2) Indicador socioeconómico: Cantidad de contratos

ANEXO 27

CONSORCIO CUIDAR AMA

INSTITUTO DE AMBIENTE Y DESARROLLO DE CUENCA AMAZONICA
PROGRAMA NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PENAL Y DE SALUD OCUPACIONAL EN PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA AMBIENTAL
MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PMA-GIRASOL

CÓDIGO	INCOPTURAS-AS-FTO-3
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	VERSIÓN (Día / Mes / Año)

PROYECTO LICENCIADO	SI: X NO:
	(Indicar con una X)

LICENCIA AMBIENTAL N°: SI
FECHA: EMISIÓN
OBJETO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONTIENEN DOS PROGRAMAS DE CAMBIO VEGETAL, CAMINOS PARA QUEBARSE EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTOMAYOLLENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

UNIDAD EJECUTORA:
DIRECCIÓN TERRITORIAL:

INFORME	PERIODO:	DESDE:	(DÍA/MES/AÑO)	HASTA:	(DÍA/MES/AÑO)	Número:	4

FECHA VERIFICACIÓN: 4/1

CONTRATO OBTENIDA N°: ECOAAB
OBJETO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONTIENEN DOS PROGRAMAS DE CAMBIO VEGETAL, CAMINOS PARA QUEBARSE EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA DE INICIO: (DÍA/MES/AÑO)
FECHA DE TERMINACIÓN: EMISIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL CONTRATISTA: BRAYAN FELIPE CACUAS GARCIA
No. TARJETA PROFESIONAL: 3550251-302707 CMD
ESPECIALISTA AMBIENTAL CONTRATISTA: Brayan Felipe Cacuas Garcia
No. TARJETA PROFESIONAL: 3550251-302707 CMD

CONTRATO LICENCIADO N°:
OBJETO:
FECHA DE INICIO: (DÍA/MES/AÑO)
FECHA DE TERMINACIÓN: EMISIÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA:
No. TARJETA PROFESIONAL:
ESPECIALISTA AMBIENTAL INTERVENTORIA:
No. TARJETA PROFESIONAL:

ACTIVIDADES DEL MANEJO AMBIENTAL DEL PMA-GIRASOL

1. OBLIGACIÓN INCUMPLIDA (No.Ev. PMA o D.Ficha)										2. BALANCE DE CUMPLIMIENTO AL PERIODO										3. BALANCE DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			RELACIÓN DE SOPORTES	
MEDIO	N° FICHA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	CUANTÍA	UNIDAD	CANTIDAD PROGRAMADA PERIODO	INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO			% CUMPLIMIENTO	SI	A	NO	CUANTÍA	CONCEPTO DADO AN INTERVENTORIA	CUANTÍA	SI	A	NO	CUANTÍA	CONCEPTO DADO EN INTERVENTORIA	ACTIVIDADES AMBIENTALES PENDIENTES DE EJECUTARSE, CUENTE DEL CONTRATO DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AMBIENTALES PENDIENTES DE EJECUTARSE, CUENTE DEL CONTRATO	CONCEPTO DE INTERVENTORÍA: ACTIVIDADES PENDIENTES DE EJECUCIÓN	DOCUMENTALES	FOTOGRÁFICOS
Socioeconomico	EASA-3.1.01	Gestion del proyecto	Conformacion del Grupo de Gestión Ambiental y Social	Conformar el equipo de gestión ambiental y social	4	UNIDAD	4				100%	X													VER ANEXO 18	N/A
Capacitaciones	EASA-3.2.02	Gestion del proyecto	Capacitación y Concientización del Personal de Obra	Realizar inducción y capacitación al personal de obra.	3.0	UNIDAD	3				100%	X													VER ANEXO 19	
Legal	EASA - 3.3.03	Gestion del proyecto	Seguimiento y control de los requerimientos legales	Obtención de Permisos Ambientales. (En caso de requerirse) y Capacitación de la normatividad ambiental	1	UNIDAD	1				100%	X													NA	NA
Residuos	PAC- 3.4.04	Actividades constructivas	Manejo integral de materiales de construcción	Medidas implementadas para el almacenamiento de materiales, Medidas implementadas para transporte de materiales.	0	m3	0				100%	X													VER ANEXO 20	NA
Señalizacion	EASA- 3.5.06	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Señalización para el Manejo Ambiental en Frentes de Obra y vías temporales	Implementación de señalización en los frentes de obra y campamento	10	UNIDAD	10				100%	X													NA	
RCD	EASA- 3.4.07	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición (RCD) y basura	Implementación general sobre disposición y manejo adecuado de los subsuelos y RCD, Transporte de los RCD, Disposición final de los escombros, Implementación de un sitio para temporal almacenamiento de residuos y adecuados para estos proyectos.	1111,65	m3	1111,65				100%	X													NA	NA
Flora	PAC-3.6.08	ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS	Manejo Integral de Residuos Sólidos Convencionales y Peligrosos	Implementación del manejo de la disposición de residuos sólidos, Recolección de residuos en un punto ecológico o de almacenamiento temporal, en el campamento de obra y/o en los frentes de obra, Organizar cuadrillas de limpieza para que recojan y transporten la totalidad los residuos sólidos, ocasionados por el personal, Implementar dispositivos de retención de residuos sólidos, como costalones en sitio de acopio, Señalar y demarcar las zonas de almacenamiento de los residuos sólidos, Instalar canecas rojas y sitio de almacenamiento temporal de respel según sea requerido.	10	UNIDAD	10				100%	X													VER ANEXO 21	
Ruido	Ruido 3.2.11	Gestión Ruido	Seguimiento y control al manejo de residuos líquidos domésticos e industriales.	Verificar la implementación de medidas para minimizar la generación de ruido generado por el manejo apropiado de los residuos líquidos, Libros los registros y actas. Verificar que el operador realice el mantenimiento a las maquinas, Realizar un manejo adecuado de los residuos líquidos que se utilizaran en el proyecto, Equipos adecuadamente ajuste, controles, resultados de los actividades de obra, Verificar el uso adecuado de los elementos de protección personal para los trabajadores del proyecto.	10	m3	10				100%	X													VER ANEXO 22	
Bióticos	PBSE-4.1.12	Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos	Manejo de Descapote y Cobertura Vegetal	Realizar descapote en áreas estrictamente necesarias.	1	ha	1				100%	X													NA	N/A
Maquinaria	PMT-3.5.10	MUSEO DE INSTALACIONES EMPOZALES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Manejo de maquinaria, equipos y vehículos.	Actividades de manejo de maquinaria, equipos y vehículos, Revisión de Maquinaria, equipos y vehículos a contratar (Ficha técnica, Certificado de Gases, entre otros), Verificar las condiciones de la maquinaria por medio de preoperacionales.	6	UNIDAD	6				100%	X													NA	

Original: Archivo de Gestión del SIGAC
Copias: Laboratorio, Proveedores, Subcontratistas del consorciados

ANEXO 28

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA FORMATO DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	
		FECHA	31/07/26 (Día / Mes / Año)

FORMATO DE RADICACION Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL No. 9

(Indicar el número consecutivo del Formato de Radicación y Actualización)

UNIDAD EJECUTORA INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU **DIRECCIÓN TERRITORIAL** INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

1. DATOS DEL PROYECTO

1.1. CONTRATO DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.								
TIPO DE PROYECTO	**LICENCIADO**		**Resolución N°**		**NO LICENCIADO - PAGA**	X	**Version N°**	**6.2**	**MINIMO IMPACTO**

RAZON SOCIAL CONTRATISTA	**CONSORCIO VICGER 2021**					
TIPO DE PERSONA JURÍDICA	Consorcio	**PARTICIPANTES**	**Razón Social**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación**	**Porcentaje de participación (%)**
			CONSORCIO VICGER 2021	NIT	901902610	100
			Sumatoria %			100
NIT	901902610					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO					
NOMBRE DEL DIRECTOR DE OBRA	CARLOS ANDRÉS BALLESTAS					
CONTRATO N°	CONTRATO ICCU-140 DE 2025					
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."					
ACTA DE INICIO	ACTA No. 1.					
FECHA INICIO	2 DE ABRIL DE 2025					
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025 U ONCE MESES, LO QUE PRIMERO OCURRA					
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	19 DE JULIO DE 2026.					
FECHA FINAL	19 DE JULIO DE 2026.					
VALOR DEL CONTRATO	$ 32.246.753.687,00					
VALOR PROVISIÓN GESTION AMBIENTAL (incluye PAGA)	**$ 527.473.918,00**	**VALOR PLAN DE INVERSION AMBIENTAL:**		**VALOR PLAN DE INVERSIÓN SOCIAL**		
OBSERVACIONES: Teniendo en cuenta que el proyecto aún no inicia etapa de ejecución, no se realiza acta de cobro para la presente periodo.						
VALOR PROYECTADO PLAN DE INVERSIÓN AMBIENTAL VERSIÓN 1	$ 527.473.918,00					
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	Carrera 70a #110-10					
CELULAR	3002089435					
CORREO ELECTRONICO	consorciovicger@gmail.com					

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

RAZON SOCIAL INTERVENTORÍA						
TIPO DE ASOCIACION	Sociedad por Acciones Simplificada	**PARTICIPANTES**	**Razón Social**	**Tipo de identificación**	**Número de identificación**	**Porcentaje de participación (%)**
			ECG ING.ENIERIA S-AS	NIT	901.289.190-0	100
			Sumatoria %			100
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIAN PASTOR VALB.UENA					
NOMBRE DEL DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	GUSTAVO ADOLFO CROSBY LOPEZ					
CONTRATO N°	ICCU 218 DE 2025					
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓNDE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARAQUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA					
ACTA DE INICIACION	Acta No. 1					
FECHA DE INICIO						
VENCIMIENTO PLAZO INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025 U ONCE MESES, LO QUE PRIMERO OCURRA					
VENCIMIENTO PLAZO TOTAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025					
FECHA FINAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025					
VALOR DEL CONTRATO	$ 3.903.576.140,00					
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA	CARRERA 7#156-78 OF. 701					
CELULAR	(+)571 7170642 - 3138361268					
CORREO ELECTRONICO	correspondencia@euroconsult.co					

2. INFORMACIÓN AMBIENTAL

2.1. PERSONAL AMBIENTAL

2.1.1. CONTRATO DE OBRA

NOMBRE	N° CEDULA	PROFESION	No TARJETA PROFESIONAL	CARGO	%DE DEDICACION	No CELULAR	DIRECCION ELECTRONICA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
Brayan Felipe Casas Garcia	1016082534	Ingeniero Ambiental	091021-0525767CND	Especialista Ambiental	100	3202344336	casasgarciafelipe82@gmail.com	SI	NA

2.1.2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

NOMBRE	N° CEDULA	PROFESION	No TARJETA PROFESIONAL	CARGO	%DE DEDICACION	No CELULAR	DIRECCION ELECTRONICA	REVISADO Y APROBADO POR INVIAS (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
Viviana Villamarín Tirano		Ingeniera Ambiental		Especialista Ambiental	100	3147938815	villamarin@ec-pi.com	SI	NA

2.2. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR

"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

2.3. DESCRIPCIÓN AMBIENTAL DEL ÁREA DEL PROYECTO

El PAGA describe la zona del proyecto (Sumapaz, Tequendama y Alto Magdalena) como un entorno ecológicamente sensible, destacando el riesgo de erosión del suelo y la cercanía al Páramo de Sumapaz. El documento concluye que los mayores impactos serán en el aire (ruido/polvo) y en el suelo, por lo que se exige un estricto Plan de Manejo Ambiental.

2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE AREAS PROTEGIDAS PUBLICAS NACIONALES Y REGIONALES O ECOSISTEMAS ESTRATÉGICAS

NA

2.4. OBLIGACIONES AMBIENTALES CEDIDAS DE OTROS CONTRATO DE OBRA

No. CONTRATO INVIAS QUE ORIGINO LA OBLIGACION	N° Y FECHA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DEL REQUERIMIENTO Y/O CESION	ENTIDAD QUE LO REQUIERE	REQUERIMIENTO	ACTIVIDADES REQUERIDAS EN EL ACTO ADMINISTRATIVO		ACTIVIDADES PENDIENTES DEL ACTO ADMINISTRATIVO		FECHA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES		COSTO ESTIMADO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
				CANTIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	INICIO	FIN			

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
FORMATO DE RADICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS

CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-1-FR-1
VERSIÓN	1
PAGINA	

2.6. CAMPAMENTOS

COORDENADAS (En notación sexagesimal)		LOCALIZACION					TIPO DE CAMPAMENTO		MANEJO DE AGUAS		TIPO DE PERMISOS QUE REQUIERE	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
LATITUD	LONGITUD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	PUNTO DE REFERENCIA (PR)	DIRECCION	EXISTENTE	NUEVO	SISTEMA DE TRATAMIENTO	RED DE ALCANTARILLADO					
											NA				

2.7. DEMANDA DE RECURSOS

2.7.1. SITIOS DE DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES DE OBRA

NOMBRE DEL SITIO	TIPO (Marque con una x)		COORDENADA (En notación sexagesimal)		LOCALIZACION				ESTADO LEGAL					
									AUTORIDAD AMBIENTAL ( ) ALCALDIA MUNICIPAL ( )					
	ZODME O RCD	ESCOMBRERA	LATITUD	LONGITUD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	No. CATASTRAL	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VOLÚMEN AUTORIZADO (m3)	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION

2.7.2. FUENTES DE MATERIALES

NOMBRE DEL SITIO	TIPO DE FUENTE	LOCALIZACION						ESTADO LEGAL												
		COORDENADA (En notación sexagesimal		MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	No. CATASTRAL	AUTORIDAD AMBIENTAL						AUTORIDAD MINERA						MOTIVO DE NO APROBACION
		LATITUD	LONGITUD					ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VOLÚMEN AUTORIZADO (m3)	VOLUMEN REQUERIDOS PAR EL PROYECTO (m3)	FECHA DE REVISIÓN Y APROBADO DE INTERVENTORIA	OBSERVACIONES	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO		VOLÚMEN AUTORIZADO (m3)	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	
AGREGADOS LA BENDICION	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	NA	NA	TOCAIMA	NA	CORINTO	Troya (La Meseta): 00-03-	APROBADO	Resolución No. 2229.	60.000	NA			APROBADO				27-dic-36		
LA FLORESTA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	NA	NA	Nilo, Cundinamarca	NA	Cerro Cobos y La Esmera	Predio "Zonas Comunes "	APROBADO	50247000054	4667	NA			APROBADO				VIGENTE		
INGEMIN SAS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	NA	NA	TOLIMA	NA	NA	NA	APROBADO	SEGÚN LICENCIA ABIENTAL	SEGÚN LICENCIA ABIENT.	NA			APROBADO				VIGENTE		
AGREGADOS G7 SAS	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	NA	NA	JERUSALEN	NA	NA	NA	APROBADO	SEGÚN LICENCIA ABIENTAL	SEGÚN LICENCIA ABIENT.	NA			APROBADO				VIGENTE		

2.7.3. PLANTAS

PLANTAS	LOCALIZACION				ESTADO LEGAL PERMISO DE EMISIONES					ESTADO LEGAL PERMISO DE VERTIMIENTO						ESTADO PERMISO DE CAPTACIÓN DE AGUA				
	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	No. CATASTRAL	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VOLUMEN AUTORIZADO (M3)	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VOLUMEN AUTORIZADO (M3)	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
TRITURACIÓN	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
ASFALTO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
CONCRETO	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2.7.4. USO RECURSO AGUA

2.7.4.1. CAPTACION

CONCESION DE AGUAS			NOMBRE DEL PROVEEDOR DE AGUA		No. PERMISO DE CONCESION DEL PROVEEDOR DE AGUA		AUTORIDAD AMBIENTAL	
	NO	X		PTAP CABRERA, PTAP PANDI				CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL
	SI							

NOMBRE DE LA FUENTE	COORDENADA (En notación sexagesimal)		LOCALIZACION				ESTADO LEGAL PERMISO DE CONCESION					
	LATITUD	LONGITUD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	No. CATASTRAL	ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	CAUDAL AUTORIZADO (Lt/seg)	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION

2.7.4.2. OCUPACION DE CAUCE

NOMBRE DE LA FUENTE	COORDENADA (En notación sexagesimal		LOCALIZACION				TIPO DE PERMISO		ESTADO PERMISO	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
	LATITUD	LONGITUD	MUNICIPIO	CORREGIMIENTO	VEREDA	PUNTO DE REFERENCIA (PR)	TEMPORAL	PERMANENTE					
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2.8. MANEJO DE COBERTURA VEGETAL

TRATAMIENTO	Nº DE INDIVIDUOS	Estado permiso	No. Del Acto Administrativo o No. De Radicado	VIGENCIA	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
TALA	NA					
TOTAL						
PODA	NA					
TOTAL						
TRASLADO	NA					
TOTAL						
LEVANTAMIENTO DE VEDA	NA					
TOTAL						

SUSTRACCIÓN DE RESERVA			Nº HA SUSTRAIDAS	NOMBRE DE LA RESERVA	Estado permiso	No. Del Acto Administrativo o No. De Radicado	VIGENCIA	AUTORIDAD AMBIENTAL	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
	NO	X								
	SI									

2.9. FAUNA OBSERVADA

NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	ESPECIE VEDADA (SI/NO)	ESPECIE AMENAZADA (SI/NO)	LUGAR DE OBSERVACION	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2.10. MONITOREOS

MONITOREO	SE REQUIERE		PERIODICIDAD	No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO O No. DE RADICADO	REVISADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA (SI/NO)	MOTIVO DE NO APROBACION
	SI	NO				
AGUA		x				
AIRE		x				
RUIDO		x				
OTRO (CUAL)		x				

Firma
Nombre: Carlos Andres Ballestas
Director de Obra
Matrícula No.: 25202-120103

Firma
Nombre: GUSTAVO ADOLFO CROSBY LOPEZ
Director de Interventoría
Matrícula No.:

ANEXO 29

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

PRESUPUESTO GENERAL DEL PAGA PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PLAZO	8
No. de frentes	5

PROGRAMA	PROYECTOS	Ítem	Unidad	Cantidad	Tiempo (meses)	Dedicación (%)	Valor ($) Unitario	Valor ($) Parcial	CANTIDAD EJECUTADA MES	CANTIDAD ACUMULADO	VALOR TOTAL EJECUTADO	SALDO POR EJECUTAR
1. DESARROLLO Y ATENCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.	1.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL.	Profesional Ambiental	hmes	5	8	0,5	$ 6.150.000,00	$ 123.000.000,0	$ 1,0	$ 1,0	$ 3.075.000,0	$ 119.925.000,0
		Profesional Social	hmes	5	8	0,5	$ 6.150.000,00	$ 123.000.000,0	$ 2,0	$ 2,0	$ 6.150.000,0	$ 116.850.000,0
		Profesional ítecnólogo /Técnico SST	Se incluye en los costos administrativos de la obra.					$ -				
		Cuadrilla para orden, aseo y señalización	Se incluye en los costos administrativos de la obra.					$ -				
							Costo de personal	$ 246.000.000,0			$ 9.225.000,0	$ 236.775.000,0
							Factor Prestacional	1,6			$ 1,0	
							SUBTOTAL PERSONAL CON FACTOR MULTIPLICADOR	$ 393.600.000,00	SUB TOTAL		$	14.760.000,0
		Elaboración de informes mensuales y respuesta a requerimientos de la Corporación Ambiental, Gobernación de Cundinamarca-ICCU, y otros. Gastos de papelería y otros.	Informes	Se incluye en los costos administrativos de la obra.				$ -				
							Costo de informes mensuales y respuestas	$ -				
							SUBTOTAL CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL.	$ 393.600.000,00				
	1.2 CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA.	Material didáctico para capacitaciones. El personal esta contemplado Conformación grupo gestión ambiental.	Folleto impreso a blanco y negro y/o a color	400			$ 1.250,00	$ 500.000,0	$ 9,0	$ 22,0	$ 27.500,0	$ 472.500,0
							SUBTOTAL CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA.	$ 500.000,00	SUB TOTAL		$	27.500,0
	1.3 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES.	El proyecto no contempla el tramite de permisos,licencia u otros requerimientos adicionales						$ -				
							SUBTOTAL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES.	$ 0,00				
2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.	2.1 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	Polisombra negra 4 m ancho.	m	1000			$ 11.800,00	$ 11.800.000,0	$ -	$ -	$ -	$ -
		Cinta para señalización de 4" PELIGRO no pase.	rollo x 500 m	20			$ 52.600,00	$ 1.315.000,0	$ -	$ -	$ -	$ 1.315.000,0
		Estacas de madera.	unid	250			$ 3.900,00	$ 975.000,0				
							SUBTOTAL MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	$ 14.090.000,00	SUB TOTAL		$ -	
	2.3 SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES.	Señalización según programa de tráfico y Programa SST del contratista	Costos incluidos en el PMT y administración					$ -				
							SUBTOTAL SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES.	$ 0,00				
	2.4 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS.	Transporte y disposición final de escombros y residuos de obra (RCD)	Costo de obra									
		Polisombra negra 4 m ancho.	m	250			$ 7.300,00	$ 1.825.000,0	$ -	$ -	$ -	$ -
		Cinta para señalización de 4" PELIGRO no pase	rollo x 500 m	10			$ 52.600,00	$ 526.000,0	1	1	$ 157.800,0	$ 368.200,0
		Sedimentador de lodos					$ -		$ -	$ -	$ -	$ -
		Canecas metálicas o plásticas.	unid	20			$ 88.000,00	$ 1.760.000,0	$ 1,0	$ 1,0	$ 88.000,0	$ 1.672.000,0
		Manguera negra agrícola	rollo x 50 m	5			$ 44.000,00	$ 220.000,0	$ -	$ -	$ -	$ -
		Alambre dulce	kg	5			$ 10.600,00	$ 53.000,0	$ -	$ -	$ -	$ -
							SUBTOTAL MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS.	$ 4.384.000,00	SUB TOTAL		$ -	245.800,0
	2.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.	Punto ecológico 3 canecas 40 lt c/u para campamento -oficina.	Punto	5			$ 262.000,00	$ 1.310.000,0	$ 2,0	$ 2,0	$ 524.000,0	$ 786.000,0
		Canecas metálicas de 55 gls con tapa y en colores según especificaciones para separar residuos. (4 por hotes de obra)	unid	20			$ 94.100,00	$ 1.882.000,0	$ 3,0	$ 3,0	$ 282.300,0	$ 1.599.700,0
		Bolsa plásticas industrial de 65 cm * 85 cm, de colores para campamento-oficina.	Paquete x 50 unidades	20			$ 27.600,00	$ 552.000,0	$ 1,0	$ 2,0	$ 55.200,0	$ 496.800,0
		Bolsa plásticas industrial de 100 cm * 120 cm, de colores para frentes de obra.	paquete x 30 unid	100			$ 52.700,00	$ 5.270.000,0	$ 1,0	$ 2,0	$ 105.400,0	$ 5.164.600,0
		Recolección y disposición final de residuos ordinarios e inertes generados en campamento, sitios de acopio temporal y obras por personal laborando.	Kg	5.000			$ 8.600,00	$ 43.000.000,0	$ 31,0	$ 77,0	$ 662.200,0	$ 42.337.800,0
		Recolección y disposición final de residuos peligrosos (bolsas de cemento, empaques con aceites, combustibles, etc). (Fuente Albedo ESP 2018) Cantidad estimada.	Kg	3.000			$ 2.200,00	$ 6.600.000,0	$ -	$ -	$ -	$ 6.600.000,0
							SUBTOTAL MANEJO DE RESEUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.	$ 58.614.000,00	SUB TOTAL		$	1.829.100,0
3. GESTIÓN HÍDRICA.	3.1 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES.	Implemetar medidas ambientales	Costo de personal ya incluido					$ -				
							SUBTOTAL MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES.	$ 0,00				
	3.2 MANEO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES.	Alquiler, Instalación, funcionamiento y mantenimiento de baños portátiles con su respectivo mantenimiento una vez por semana.	Meses	8	4 Baños		$ 585.000,00	$ 18.720.000,0	$ 3,0	$ 2,0	$ 1.170.000,0	$ 17.550.000,0
		Sedimentador para concretos					$ -					
		Canecas metálicas o plásticas.	unid	30			$ 88.000,00	$ 2.640.000,0	$ -	$ 3,0	$ 264.000,0	$ 2.376.000,0
		Manguera negra agrícola	rollo x 50 m	5			$ 44.000,00	$ 220.000,0	$ -	$ -	$ -	$ -
		Alambre dulce.	kg	5			$ 10.600,00	$ 53.000,0	$ -	$ -	$ -	$ -
		Recolección y disposición final de residuos líquidos especiales por empresa RESPEL.	Incluido en costos de Programa manejo de residuos sólidos.				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
							SUBTOTAL MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES.	$ 21.633.000,00	SUB TOTAL		$	1.434.000,0
4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.	4.1 MANEJO DE DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL.	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas (Incluye tala de árboles, desmonte y retiro de capa orgánica)	Costo de obra si aplica									
		Malla azul para aislar zonas de ronda de cuerpos de agua por 4 m de ancho	m	1000			$ 15.500,00	$ 15.500.000,0	$ -	$ -	$ -	$ -
		Cinta para señalización de 4" PELIGRO no pase.	rollo x 500 m	20			$ 52.600,00	$ 1.052.000,0	$ -	$ -	$ -	$ -
		Estacones de madera de 2,20 m x 10 cm	unid	150			$ 3.500,00	$ 525.000,0	$ -	$ -	$ -	$ -
							SUBTOTAL MANEJO DE DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL.	$ 17.077.000,00	SUB TOTAL		$	-
	4.2 RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS.	Protección de taludes con material vegetal - empradización y/o arborización (Incluye Ing. Forestal y cuadrilla, materiales e insumos)	Costo de obra si aplica					$ -				
							SUBTOTAL RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS.	$ 0,00				
	4.3 PROTECCIÓN DE FAUNA.	Capacitación de personal.	Costos incluido en Personal gestión socioambiental y capacitaciones					$ -				
							SUBTOTAL PROTECCIÓN DE FAUNA.	$ 0,00				
5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	5.1 INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO.	Alquiler una casa para campamento-oficina o el pago de los servicios públicos durante la ejecución del proyecto y para gastos de sitios en el frente de obra alquilados como almacenes para materiales, equipos, herramientas y parqueo de maquinaria.	Se incluye en los costos administrativos de la obra.					$ -				
							SUBTOTAL INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO	$ 0,00				
	5.3 MANEJO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS.	Kit para derrames de sustancias químicas	unid	10			$ 250.000,00	$ 2.500.000,0	$ 2,0	$ 2,0	$ 500.000,0	$ 2.000.000,0
		Absorvente orgánicoindustrial para aislar y contener derrames y contingencias (aserrín, estopas, otros). La disposición final se contempló en el Programa Manejo de residuos sólidos.	Kg	75			$ 50.000,00	$ 3.750.000,0	$ -	$ -	$ -	$ -
							SUBTOTAL MANEJO DE MAQUINARIA, VEHICULOS Y EQUIPOS.	$ 6.250.000,00	SUB TOTAL		$	500.000,0
6. GESTIÓN SOCIAL	6.1 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.	Funcionamiento oficina para atención autoridades y comunidad :										
		Computador portátil						$ -				
		Impresora Multifuncional						$ -				
		Cámara fotográfica para fotografías y videos	Se incluye en los costos administrativos de la obra.					$ -				
		Material de oficina (papel, bolígrafos etc.)						$ -				
							SUBTOTAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	$ 0,00				
	6.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	Valla informativa del contrato, tablero en lámina galvanizada, arte en lona impresa eijerlc con anticorrosivo. Incluye instalación. Aprobada por Interventoría e ICCU.	Se incluye en los costos administrativos de la obra.					$ -				
		Reuniones con comunidad en Municipio (inicio, avance 50% y terminación al 95% obra)										
		Alquiler de salón con video beam	Unid	3			$ 125.400,00	$ 376.200,0				
		Refrigerio personas asistentes (50 personas/reunión)	Unid	150			$ 6.500,00	$ 975.000,0				
		Material para información y divulgación del proyecto (afiches, volantes informativos y de convocatorias, cartas de convocatorias, información buzones satélites, otros)	Unid	1			$ 1.700.000,00	$ 1.700.000,0				
		Instalación buzones satélites (2) en alcaldía municipal, Salón Comunal de la JAC.	Unid	2			$ 62.700,00	$ 125.400,0				
							SUBTOTAL INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.	$ 3.176.600,00				
	6.3 MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Elaboración actas de vecindad de inicio y terminación (papelería incluida en dotación del SAU)	Incluido en el costo de personal y papelería.					$ -				
		Elaboración actas de compromiso de inicio y cierre de las mismas, para uso temporal de predios o áreas por obras. (papelería incluida en dotación del SAU)	Incluido en el costo de personal y papelería.					$ -				
		Provisión para atención de eventuales emergencias por afectación de servicios públicos que afecten a la comunidad	Unid	1			$ 2.054.159,00	$ 2.054.159,0				
							SUBTOTAL CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES.	$ 2.054.159,00				
	6.5 CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.	Talleres pedagógicos con sedes educativas: se realizarán como mínimo 3 talleres con la población estudiantil de la Institución Educativa Municipal .										
		Material para talleres	Taller	3			$ 195.000,00	$ 585.000,0				
		Refrigerios para alumnos y docentes	Refrigerios	400			$ 6.300,00	$ 2.520.000,0				
		Material para estrategia comunicativa	Piezas comunicativas	1			$ 2.054.159,00	$ 2.054.159,0				
		Reuniones Comité Paritario										
		Insumos para talleres, reuniones y documentos informativos	Reunión (una mensual)	8			$ 65.000,00	$ 520.000,0				
		Refrigerios reuniones Comité (10 personas/comité)	Refrigerios	80			$ 5.200,00	$ 416.000,0				
							SUBTOTAL CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	$ 6.095.159,00				
	6.6 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA	Contratación mano de obra y afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud	Costo administrativo.					$ -				
							SUBTOTAL CONTRATACIÓN MANO DE OBRA	$ 0,00				
	6.9 GESTIÓN SOCIO PREDIAL	Consultoría para la adquisición de predios y cesión de áreas mínimas requeridas para el proyecto.	No se requerirá la adquisición de areas diferentes a la franja vial.					$ -				
							SUBTOTAL GESTIÓN SOCIO-PREDIAL	$ 0,00				
							TOTAL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	$ 527.473.918,00	SUBTOTAL		$ 18.596.400,0	$ 508.877.518,0

Nota: Los costos que se tienen en cuenta en el presupuesto de obra, no se contemplaron en el presente presupuesto y estan discriminados en cada item como " Costo de obra"

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCES

PRESUPUESTO GENERAL DEL PAGA PROYECTO INTERVE VECINALES, CAMINOS PARA QUEDA

PROGRAMA	PROYECTOS	Ítem
1. DESARROLLO Y ATENCIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL.	1.1 CONFORMACIÓN DEL GRUPO DE GESTIÓN AMBIENTAL.	Profesional Ambiental
		Profesional Social
		Profesional /tecnólogo /Técnico SST
		Cuadrilla para orden, aseo y señalización
		Elaboración de informes mensuales y respuesta a requerimientos de la Corporación Ambiental, Gobernación de Cundinamarca-ICCU, y otros. Gastos de papelería y otros.
	1.2 CAPACITACIÓN AMBIENTAL AL PERSONAL DE OBRA.	Material didáctico para capacitaciones. El personal esta contemplado Conformación grupo gestión ambiental.
	1.3 CUMPLIMIENTO DE REQUERIMIENTOS LEGALES.	El proyecto no contempla el tramite de permisos,licencia u otros requirimientos ambientales.
	2.1 MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	Polisombra negra 4 m ancho.
		Cinta para señalización de 4" PELIGRO no pase.
		Estacas de madera.

	2.3 SEÑALIZACIÓN DE FRENTES DE OBRA Y SITIOS TEMPORALES.	Señalización según programa de tráfico y Programa SST del contratista
		SUB
	2.4 MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y LODOS.	Transporte y disposición final de escombros y residuos de obra (RCD)
		Polisombra negra 4 m ancho.
		Cinta para señalización de 4" PELIGRO no pase.
		Sedimentador de lodos
		Canecas metálicas o plásticas.
		Manguera negra agrícola
		Alambre dulce.
2. ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS.	**2.5 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES.**	Punto ecológico 3 canecas 40 lt c/u para campamento -oficina.
		Canecas metálicas de 55 gls con tapa y en colores según especificaciones para separar residuos. (4 por fretes de obra)
		Bolsa plásticas industrial de 65 cm * 85 cm, de colores para campamento-oficina.
		Bolsa plásticas industrial de 100 cm * 120 cm, de colores para frentes de obra.
		Recolección y disposición final de residuos ordinarios e inertes generados en campamento, sitios de acopio temporal y obras por personal laborando.
		Recolección y disposición final de residuos peligrosos (bolsas de cemento, empaques con aceites, combustibles, etc). (Fuente Albedo ESP 2018) Cantidad estimada.
		SUBTOT
3. GESTIÓN HÍDRICA.	**3.1 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES.**	Implemetar medidas ambientales
	3.2 MANEO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIALES.	Alquiler, Instalación, funcionamiento y mantenimiento de baños portátiles con su respectivo mantenimiento una vez por semana.
		Sedimentador para concretos
		Canecas metálicas o plásticas.
		Manguera negra agrícola
		Alambre dulce.
		Recolección y disposición final de residuos líquidos especiales por empresa RESPEL.

		SUBT
4. BIODIVERSIDAD Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS.	**4.1 MANEJO DE DESCAPOTE Y COBERTURA VEGETAL.**	Desmonte y limpieza de zonas no boscosas (Incluye tala de árboles, desmonte y retiro de capa orgánica)
		Malla azul para aislar zonas de ronda de cuerpos de agua por 4 m de ancho
		Cinta para señalización de 4" PELIGRO no pase.
		Estacones de madera de 2,20 m x 10 cm
	4.2 RECUPERACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS.	Protección de taludes con material vegetal - empradización y/o arborización (incluye Ing. Forestal y cuadrilla, materiales e insumos)
	4.3 PROTECCIÓN DE FAUNA.	Capacitación de personal.
5. MANEJO DE INSTALACIONES TEMPORALES, DE MAQUINARIA Y EQUIPO.	**5.1 INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y DESMANTELAMIENTO DE CAMPAMENTOS Y SITIOS DE ACOPIO.**	Alquiler una casa para campamento-oficina y el pago de los servicios públicos durante la ejecución del proyecto y para gastos de sitios en el frente de obra alquilados como almacenes para materiales, equipos, herramientas y parqueo de maquinaria.
		SUBTOTAL INSTALACIÓN, FUNCIONAMI
	5.3 MANEJO DE MAQUINARIA, VEHÍCULOS Y EQUIPOS.	Kit para derrames de sustancias químicas
		Absorvente orgánicoindustrail para asilar y contener derrames y contingencias (aserrín, estopas, otros). La disposición final se contempló en el Programa Manejo de residuos sólidos.
	6.1 ATENCIÓN A LA COMUNIDAD.	**Funcionamiento**
		Computador portátil
		Impresora Multifuncional
		Cámara fotográfica para fotografías y videos
		Material de oficina (papel, bolígrafos etc.)
		Valla informativa del contrato, tablero en lámina galvanizada, arte en lona impresa injetk; con anticorrosivo. Incluye instalación. Aprobada por Interventoría e ICCU.
		Reuniones con comunidad

6, GESTIÓN SOCIAL	**6.2 INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.**	Alquiler de salón con video beam
		Refrigerio personas asistentes (50 personas/reunión)
		Material para información y divulgación del proyecto (afiches, volantes informativos y de convocatorias, cartas de convocatorias, información buzones satélites, otros)
		Instalación buzones satélites (2) en alcaldía municipal, Salón Comunal de la JAC.
	6.3 MANEJO DE LA INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS	Elaboración actas de vecindad de inicio y terminación (papelería incluida en dotación del SAU)
		Elaboración actas de compromiso de inicio y cierre de las mismas, para uso temporal de predios o áreas por obras. (papelería incluida en dotación del SAU)
		Provisión para atención de eventuales emergencias por afectación de servicios públicos que afecten a la comunidad.
	6.5 CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.	Talleres pedagógicos con sedes educativas: Institución Educativa Municipal .
		Material para talleres
		Refrigerios para alumnos y docentes
		Material para estrategia comunicativa
		Insumos para talleres, reuniones y documentos informativos
		Refrigerios reuniones Comité (10 personas/comité)
	6.6 CONTRATACIÓN MANO DE OBRA	Contratación mano de obra y afiliación al Sistema General de Seguridad en Salud
	6.9 GESTIÓN SOCIO PREDIAL	Consultoría para la adquisición de predios y cesión de áreas mínimas requeridas para el proyecto.

11.11 COMPONENTE SOCIAL

INFORME MENSUAL NO. 016 DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026

CONTRATO ICCU-140 DE 2025

"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

VERSIÓN 3.0
BOGOTÁ D.C.

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN		
Título del Documento	INFORME MENSUAL SOCIAL No 16 V3	
CONTROL DE CAMBIOS		
Rev.	Fecha	Descripción
1	Agosto de 2026	Elaboración del documento
2	Septiembre de 2026	Ajustes solicitados con oficio 2502_DTO-531
3	Septiembre de 2026	Ajustes solicitados con oficio 2502_DTO-548

REPRESENTANTES CONSULTORÍA – CONSORCIO VICGER 2021		
ELABORÓ	NOMBRE:	T.S. Esther Tuñón Pérez T.S. Diana Esperanza Bojacá
	FIRMA	Diana Bojacá
REVISÓ Y APROBÓ	NOMBRE:	Carlos Andrés Ballestas Director de Obra
	FIRMA	

REPRESENTANTES INTERVENTORÍA - ECG INGENIERIA S.A.S		
INTERVENTORÍA APRUEBA	NOMBRE:	T.S. María Fernanda Quitian Rovira
	FIRMA	

CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

El informe mensual inicia con el siguiente índice o contenido que hace las veces de Lista de Chequeo y corresponde a la página uno (1) del informe:

Contrato de Obra No.	**ICCU-140 - 2025**	**Contratista: CONSORCIO VICGER 2021**
Objeto Contrato de Obra: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 3.		
INFORME MENSUAL No. 016		**MES O PERIODO: JULIO**



CARLOS ANDRES BALLESTAS
DIRECTOR DEL CONTRATO DE OBRA

Original: Informe mensual de obra

Contenido

1. Introducción 5
2. Objetivos 6
3. Características generales del proyecto 7
3.1. Información contractual Contratista 7
3.2. Información Contractual Interventoría 8
3.3. Alcance de intervención del contrato. 9
4. Personal Social del Contratista 10
5. Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA - Social al contrato 10
5.1. Subprograma de atención a la comunidad. 10
5.2. Subprograma de información y divulgación 14
5.3. Subprograma de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos 22
5.4. Subprograma Cultura vial y participación comunitaria. 25
5.5. Subprograma de mano de obra contratada 28
6. Comités de Seguimiento para el Contrato 32
7. Conclusiones 34

Lista de tablas

Tabla 1.Información contractual del contratista 7
Tabla 2. Información contractual de la interventoría 8
Tabla 3. Sectores y Km a intervenir con el contrato ICCU140-2025 -lote 3. 9
Tabla 4. Profesionales sociales vinculados. 10
Tabla 5. canales de atención a la comunidad. 11
Tabla 6. Ubicación de buzones en la provincia de Sumapaz. 11
Tabla 7. Atención en la provincia de Sumapaz. 11
Tabla 8. Atenciones ciudadanas recibidas en la provincia de Sumapaz. 12
Tabla 9. Ubicación de buzones en la provincia de Alto Magdalena. 12
Tabla 10. Atención en la provincia de Alto Magdalena. 13
Tabla 11. Atenciones ciudadanas recibidas en la provincia de Alto Magdalena. 13
Tabla 12. Ubicación de buzones en la provincia de Tequendama 13
Tabla 13. Atención en la provincia de Tequendama 14
Tabla 14. Atenciones ciudadanas recibidas en la provincia de Tequendama. 14
Tabla 15. Indicadores de cumplimiento del subprograma de atención a la comunidad. 14
Tabla 16. Reuniones desarrolladas con comunidad. 16
Tabla 17. Reuniones Extraordinaria ICCU - Sumapaz 17
Tabla 18. Reuniones de socialización de PMT Alto Magdalena 17
Tabla 19. Reuniones Extraordinarias ICCU - Tequendama 18
Tabla 20. Vallas informativas instaladas en la provincia de Sumapaz. 19
Tabla 21. Vallas informativas instaladas en la provincia de Alto Magdalena. 19
Tabla 22. Vallas informativas instaladas en la provincia de Tequendama. 19
Tabla 23. Piezas de divulgación implementadas en el periodo. 20
Tabla 24. Entrega de piezas de divulgación en la provincia de Alto Magdalena 21

Tabla 25. Remisión de información vía WhatsApp. 21
Tabla 26. Entrega de piezas de divulgación en la provincia de Tequendama. 21
Tabla 27. Indicadores de cumplimiento del subprograma de información y divulgación. .. 22
Tabla 28. Actas de vecindad levantadas en Alto Magdalena – Jerusalén. 22
Tabla 29. Actas de vecindad levantadas en Tequendama - Viotá 23
Tabla 30. Actas de vecindad levantadas en Tequendama - Anolaima 24
Tabla 31. Indicadores de cumplimiento del subprograma de información y divulgación. .. 25
Tabla 32. Desarrollo del taller de seguridad vial y auto cuidado – Alto Magdalena 26
Tabla 33. Evidencia COPACO Tibacuy. 27
Tabla 34. Indicadores de cumplimiento del subprograma de cultura vial y participación ciudadana. 27
Tabla 35. Personal reportado por el componente SST. 28
Tabla 36. Personal MONC en la provincia de Alto Magdalena. 30
Tabla 37. Personal MONC en la provincia de Tequendama. 30
Tabla 38. Personal femenino MONC. 31
Tabla 39. Personal femenino MOC. 31
Tabla 40. Indicadores de Cumplimiento del subprograma de mano de obra contratada. . 32
Tabla 41. Comités de seguimiento del contrato. 33
Tabla 42. Comités de seguimiento social del contrato. 33
Tabla 43. Remisión de cronogramas de actividades sociales. 34

Lista de Ilustraciones

Ilustración 1. Personal vinculado al contrato ICCU 140-2025. 29
Ilustración 2. Personal MONC por provincia. 30
Ilustración 3. Vinculación por género. 31

1. Introducción

El presente informe mensual social de obra tiene como finalidad documentar y contextualizar las actividades realizadas entre el 1 y el 31 de julio de 2026, consolidando la información social relevante y sirviendo como soporte de verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas y el avance del proyecto conforme a los lineamientos establecidos en el marco del contrato de obra ICCU – 140 – 2025, cuyo objeto es “INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 3.”, suscrito entre el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU, en calidad de contratante, y el Consorcio VICGER 2021, como contratista ejecutor del mismo.

2. Objetivos

2.1. Objetivo general

Presentar un informe consolidado de las actividades sociales ejecutadas en el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2026 con el fin de evidenciar el cumplimiento de las actividades contractualmente establecidas en el programa de gestión social.

2.2. Objetivos específicos

- Dar cuenta de las actividades sociales ejecutadas durante el periodo reportado
- Presentar el avance de las actividades de gestión social dentro del componente, ejecutadas durante el periodo reportado.
- Realizar la evaluación de las actividades de gestión social ejecutadas en el periodo reportado con base en los indicadores propuestos.

3. Características generales del proyecto

3.1. Información contractual Contratista

Tabla 1.Información contractual del contratista

No. de Contrato	**140-2025**	
Objeto	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 3.	
Entidad Contratante	Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU.	
Contratista	CONSORCIO VICGER 2021.	
Valor Inicial del Contrato	$32.246.753.687,00	
Plazo de Obra	Descripción	Fecha o plazo
	Suscripción del contrato	24 de enero de 2025
	Inicio	2 de abril de 2025
	Plazo inicial	11 meses
	Terminación inicial	31 de diciembre de 2025
	Suspensión 1	26 de diciembre de 2025
	Reinicio	13 de enero de 2026
	Prorroga 1	6 meses
	Prorroga 2	3,5 meses
	Fecha de terminación con prorroga	31 de octubre de 2026
Director de Obra	Carlos Andrés Ballestas.	
Especialista Ambiental	Brayan Felipe Casas	
Profesionales Sociales	Diana Esperanza Bojacá I. Esther Tuñón Pérez	
Profesional SST	Claudia Patricia Ballestas.	
Actividades Generales	Realizar recorridos en cada una de las vías seleccionadas para determinar las características y elementos que la componen; analizar física, química y mecánicamente los materiales de la rasante; recomendaciones de las opciones a utilizar en cada tramo vial y selección de la alternativa que el contratista garantice la estabilidad; y actividades de obra para la materialización de los mantenimientos proyectados. Los corredores para el desarrollo de la obra son los existentes y no hay cambio en la geometría de la vía.	

Fuente Consorcio VICGER 2021

3.2. Información Contractual Interventoría

Tabla 2. Información contractual de la interventoría

No. de Contrato	**218-2025**	
Objeto	INTERVENTORÍA DE LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. LOTE 3.	
Entidad Contratante	Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU.	
Contratista	CONSORCIO ECG INGENIERIA SAS	
Valor Inicial del Contrato	$3.903.576.140	
Plazo de Obra	Descripción	Fecha o plazo
	Suscripción del contrato	24 de enero de 2025
	Inicio	2 de abril de 2025
	Plazo inicial	11 meses
	Terminación inicial	31 de diciembre de 2025
	Suspensión 1	26 de diciembre de 2025
	Reinicio	13 de enero de 2026
	Prorroga 1	6 meses
	Prorroga 2	3,5 meses
	Fecha de terminación con prorroga	31 de octubre de 2026
Director de Obra	Gustavo Adolfo Crosby López	
Profesional Social	María Fernanda Quitian Rovira	

Fuente Consorcio VICGER 2021

3.3. Alcance de intervención del contrato.

El contrato incluye tres fases que corresponden a diagnósticos y caracterización de vías, propuesta de intervención (diseño) y sectorización y ejecución de obras. Producto de las fases I y II, se estableció el alcance para cada uno de los municipios objeto del contrato y en recorrido de sectorización en cabeza de personal de ICCU, con los alcaldes municipales, en donde se requirió la asistencia de interventoría y contratista, se asignaron los tramos de intervención que se atienden en la fase III con el presente contrato.

Tabla 3. Sectores y Km a intervenir con el contrato ICCU140-2025 -lote 3.

PROVINCIA	MUNICIPIO	VEREDAS	KM	TOTAL
Alto Magdalena	Jerusalén	La Libertad -San José - La Victoria - Alto Del Roble Bajo - Alto Del Roble Alto - Alto Del Trigo.	24.2	42.20
	Nariño	Casco Urbano Juan Chiquillo	6	
	Nilo	Bellavista - Pradito - Pajas Blancas - Margaritas	12	
Sumapaz	Cabrera	Villarrica (Límite Departamental Con Tolima) - Núñez - Quebrada Negra - Santa Marta - San Isidro - Casco Urbano Cabrera - Peñas Blancas - Paquiló - Sumapaz	23	58.41
	Pandi	La Hunchia - Santa Rita	7.71	
	Tibacuy	San Francisco - Calandaima - El Ocobo - La Cajita – Albania – Bateas - Boquerón	27.7	
Tequendama	Anapoima	San Antonio De Anapoima - El Tigre (Hacia San Joaquín)	4.68	43.33
	El Colegio	Yalconia - El Nueve	8.65	
	Anolaima	Anolaima - La Trampa Hacia Quipile	10.5	
	Viotá	Trocal Del Café. Las Palmas - Ceylán - Escuela Alto Palmar -IED Bajo Palmar - San Martin - San Nicolas - Palestina	19.5	
Cantidad total de kilómetros a intervenir con el contrato ICCU140-2025 lote 3				148.94

Fuente Consorcio VICGER 2021

4. Personal Social del Contratista

Para el presente periodo el equipo social se compone de dos profesionales sociales, que desempeñan cada una de las actividades y acciones sociales previstas en el anexo técnico, minuta del contrato y PAGA Social que son de obligatorio cumplimiento y las cuales han venido desarrollándose de manera paralela a la dinámica y ejecución de la obra.

Conforme a lo anterior, a continuación, se relacionan los datos del personal social responsable de la ejecución del PAGA Social en el marco del CTO ICCU 140 de 2025.

Tabla 4. Profesionales sociales vinculados.

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEDICACIÓN	FECHA DE VINCULACIÓN	FECHA DE RETIRO
Diana Esperanza Bojacá Izquierdo	Gestor Social	100%	27.04.2026	N/A
Esther Tuñón Pérez	Gestor Social	100%	10.02.2026	N/A

Fuente Consorcio VICGER 2021

5. Plan de adaptación de la guía ambiental PAGA - Social al contrato

Para el periodo comprendido entre el 1 al 31 de julio de 2026, las profesionales sociales llevaron a cabo diversas actividades sociales encaminadas a dar cumplimiento al contrato de obra, de acuerdo a los subprogramas establecidos Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA en el componente social.

5.1. Subprograma de atención a la comunidad.

Este subprograma tiene como objetivo recibir, atender y dar respuesta oportuna a todas las inquietudes, quejas, reclamos y demás manifestaciones que las comunidades, alcaldías, Juntas de Acción Comunal, directivas de instituciones, líderes, propietarios, directivas de empresas de servicios públicos y autoridades ambientales, entre otros presenten por las actividades de obra y las medidas de manejo de los impactos del proyecto, garantizando la atención oportuna y eficiente a los requerimientos de la población del área de influencia, evitando que la comunidad acuda a otras instancias.

Desde el inicio del proyecto y en pro de potenciar los efectos positivos del mismo, a través de mecanismos y acciones que complementan la transformación física y espacial de los territorios, se implementaron canales de atención de forma presencial, virtual y telefónica a la comunidad, a través de los cuales podrán comunicar cualquier inquietud, queja, reclamo o solicitud, canalizando de manera adecuada las dudas o requerimientos de la comunidad frente al proceso constructivo objeto del contrato.

Tabla 5. canales de atención a la comunidad.

CANAL DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD	
Correo electrónico	Línea telefónica
atnciudadania.cto140@gmail.com	314 7301734

Fuente Consorcio VICGER 2021

5.1.1. Provincia de Sumapaz.

En las oficinas de las alcaldías municipales de Tibacuy, Pandi y Cabrera, se mantienen buzones de atención, los cuales se revisan en recorridos permanentes.

Tabla 6. Ubicación de buzones en la provincia de Sumapaz.

		
Tibacuy	San bernardo - Pandi	Cabrera

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 7. Atención en la provincia de Sumapaz.


Atención Tibacuy

Fuente Consorcio VICGER 2021

Dentro del periodo anterior se registró una solicitud de información a través de la dirección electrónica, por parte de la oficina de planeación municipal, en donde solicita información relacionada con:

- Analizar la viabilidad técnica, jurídica y presupuestal para la ejecución de dichas obras o, en su defecto, para la implementación de alternativas que resulten pertinentes con el fin de atender esta necesidad manifestada por la comunidad y contribuir al adecuado manejo de las aguas superficiales, la estabilidad del corredor

vial y la prevención de futuras afectaciones a la infraestructura existente.

- Si es posible incorporar estas obras dentro del proyecto actualmente en ejecución o adelantar alguna intervención complementaria que permita atender esta necesidad de la comunidad.

- Cuáles serían los requisitos, procedimientos o gestiones que debe adelantar el Municipio para apoyar o gestionar la ejecución de estas obras.

Dicha solicitud se remitió al área técnica para su revisión y proyección de respuesta, la cual fue dada durante la reunión extraordinaria convocada por la veeduría municipal para la administración municipal y el ICCU, quienes a su vez convocaron a la interventoría y contratista de obra.

Adicionalmente, se recepcionó una solicitud a través del chat de WhatsApp, por parte de la presidente de la JAC de Bateas, en donde se queja por el diseño y construcción de una alcantarilla en su vereda. Ver anexo 1

Tabla 8. Atenciones ciudadanas recibidas en la provincia de Sumapaz.

Fecha	Municipio	Nombre	Teléfono	Tipo de requerimiento	Estado
27.07.26	Tibacuy	JAC BATEAS	3196276365	Queja por construcción de alcantarilla	En trámite
Cantidad de atenciones recepcionadas					1
Cantidad de atenciones abiertas					1
Cantidad de atenciones cerradas					0

Fuente Consorcio VICGER 2021

5.1.2. Provincia de Alto Magdalena.

En las oficinas de Planeación de las alcaldías municipales de Nilo, Nariño y Jerusalén, se mantienen buzones de atención, los cuales se revisan en recorridos permanentes, verificando la presentación de cualquier solicitud por parte de estas comunidades.

Tabla 9. Ubicación de buzones en la provincia de Alto Magdalena.

		
Nilo	Nariño	Jerusalén

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 10. Atención en la provincia de Alto Magdalena.



Atención Alto del Trigo

Fuente Consorcio VICGER 2021

En el periodo no se recepcionaron solicitudes a través de los diferentes canales de atención del contrato, para los municipios de esta provincia.

Tabla 11. Atenciones ciudadanas recibidas en la provincia de Alto Magdalena.

Fecha	Municipio	Nombre	Teléfono	Tipo de requerimiento	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cantidad de atenciones recepcionadas					0
Cantidad de atenciones abiertas					0
Cantidad de atenciones cerradas					0

Fuente Consorcio VICGER 2021

5.1.3. Provincia de Tequendama.

En las oficinas la alcaldía municipal de El Colegio se proyecta disponer de buzón de atención en el siguiente periodo; en los puntos de atención ciudadana de las alcaldías de Anapoima, Anolaima y Viotá, se mantienen buzones de atención, los cuales se revisan en recorridos permanentes, verificando la presentación de cualquier solicitud por parte de estas comunidades.

Tabla 12. Ubicación de buzones en la provincia de Tequendama

		
Anapoima	Viotá	Anolaima

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 13. Atención en la provincia de Tequendama.



Atención Alcaldía Viotá

Fuente Consorcio VICGER 2021

En el periodo no se han recepcionado solicitudes a través de los diferentes canales de atención del contrato, para los municipios de esta provincia.

Tabla 14. Atenciones ciudadanas recibidas en la provincia de Tequendama.

Fecha	Municipio	Nombre	Teléfono	Tipo de requerimiento	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Cantidad de atenciones recepcionadas					0
Cantidad de atenciones abiertas					0
Cantidad de atenciones cerradas					0

Fuente Consorcio VICGER 2021

Indicadores de cumplimiento del subprograma de atención a la comunidad.

En el siguiente apartado, se relacionan los indicadores de cumplimiento correspondiente al subprograma mencionado según lo establecido en el PAGA Social.

Tabla 15. Indicadores de cumplimiento del subprograma de atención a la comunidad.

Nombre	Indicador	Cantidad	Cumplimiento
Atención al Ciudadano	No. de solicitudes presentadas en el mes X 100 No. De solicitudes tramitadas	1 1	100%
Atención al Ciudadano	No. de solicitudes presentadas en el mes X 100 No. De solicitudes resueltas en el mes	1 0	0%

Fuente Consorcio VICGER 2021

5.2. Subprograma de información y divulgación

Este subprograma tiene como objetivo desarrollar acciones de información dirigidas a las comunidades con las que se busca que estas conozcan de manera clara, veraz y oportuna el inicio, avance y finalización de las obras, las condiciones técnicas, ambientales y sociales del desarrollo del proyecto. Ver anexo 2.

Acciones De Información

Dentro de las acciones de información, se encuentra específicamente el desarrollo de reuniones orientadas a brindar información de primera mano a las comunidades involucradas, generando tranquilidad y manteniendo abiertos los canales de comunicación.

Reuniones de Inicio: Durante el presente periodo no se ejecutaron actividades relacionadas con reuniones de inicio, dado que estas se realizaron en periodos anteriores, cumpliendo con lo establecido en los documentos preliminares del contrato.

- Sumapaz: De acuerdo con los lineamientos dados por la entidad, fue celebrada el 10 de Julio de 2025 en el municipio de Pandi, no contando con la asistencia de representantes municipales de Cabrera y Tibacuy. Teniendo en cuenta la solicitud de estas comunidades, se realizaron reuniones adicionales con el fin de dar a conocer el proyecto y sus actividades, con lo que se dio inicio a la intervención de un tramo piloto en el mes de octubre de 2025, de acuerdo con la reunión realizada el 3 de octubre del mismo año. Finalmente se realizaron reuniones adicionales de socialización los días 23 y 24 de enero de 2026.

- Alto Magdalena: De acuerdo con los lineamientos dados por la entidad, fue celebrada el día 4 de julio de 2025 en el municipio de Nilo y en la cual se contó con la asistencia de representantes de las entidades municipales tanto de Jerusalén como de Nariño.

- Tequendama: De acuerdo con los lineamientos dados por la entidad, fue celebrada el día 20 de abril de 2026 en el municipio de Anapoima y en la cual se contó con la asistencia de representantes de las entidades municipales tanto de Anolaima, El Colegio y Viotá.

Reuniones extraordinarias: Durante el presente periodo se desarrollaron las siguientes reuniones extraordinarias:

- Una (1) reunión extraordinaria en la provincia de Sumapaz, convocada por la veeduría municipal para la administración municipal y el ICCU, quienes a su vez convocaron a la interventoría y contratista de obra, para socializar avance y aspectos técnicos del proyecto, atender inquietudes de la comunidad y dar respuesta a solicitud de la administración municipal. El acta de reunión se remitió con oficio CVG-ICCU-OF-517-2026 del 31 de julio de 2026 para trámite de revisión por parte de la interventoría.

- Tres (3) reuniones de carácter extraordinario en la provincia de Alto Magdalena, para socialización de PMT. Las actas de reunión se remitieron con oficio CVG-

ICCU-OF-517-2026 del 31 de julio de 2026 para trámite de revisión por parte de la interventoría.

- una (1) reunión extraordinaria en la provincia de Tequendama, convocada por la interventoría para revisión y definición de alternativa de diseño a implementar en el municipio de Anolaima y a solicitud de la administración municipal y el ICCU, se realizó acompañamiento a reunión convocada en la fecha por la administración municipal, para socialización de alternativa de diseño a implementar. El acta de reunión unificada levantada por el consorcio y el Acta compartida por el ICCU se remitieron con oficio CVG-ICCU-OF-517-2026 del 31 de julio de 2026 para trámite de revisión por parte de la interventoría.

Tabla 16. Reuniones desarrolladas con comunidad.

No	Comunidad asistente	Fecha	Asistentes	Municipio	Tema tratado
1	ICCU, administración municipal, líderes comunales, comunidad, interventoría y contratista	03.07.26	102	Anolaima	Revisión y definición de alternativa de diseño a implementar y socialización a comunidad
2	Alcaldía municipal, líderes comunales, comunidad interventoría y contratista	22.07.26	27	Jerusalén	Socialización de PMT – Alto del Trigo
3	ICCU, administración municipal, líderes comunales, comunidad, interventoría y contratista	23.07.26	60	Tibacuy	Socializar avance y aspectos técnicos del proyecto, atender inquietudes de la comunidad y dar respuesta a solicitud de la administración municipal.
4	Alcaldía municipal, líderes comunales, comunidad interventoría y contratista	27.07.26	45	Jerusalén	Socialización de PMT – Alto del Roble
5	Alcaldía municipal, líderes comunales, comunidad interventoría y contratista	27.07.26	20	Jerusalén	Socialización de PMT – La Victoria

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 17. Reuniones Extraordinaria ICCU - Sumapaz





Socialización de avance, atención a inquietudes y respuesta a solicitud de planeación municipal de Tibacuy.

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 18. Reuniones de socialización de PMT Alto Magdalena





Socialización de PMT Jerusalén Alto del Trigo





Socialización de PMT Jerusalén - Alto del Roble





Socialización de PMT Jerusalén – La Victoria

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 19. Reuniones Extraordinarias ICCU - Tequendama





Anolaima - Despacho | Socialización de Alternativa - Anolaima

Fuente Consorcio VICGER 2021

Reunión avance: Estas reuniones serán ejecutadas al 50% de avance de las actividades de obra. De acuerdo a indicación dada en el comité de seguimiento 48 del 29 de julio de 2026, se programará reunión de avance para la provincia de Sumapaz en el siguiente periodo.

Reunión cierre: Estas reuniones serán desarrolladas al 95% de ejecución de actividades de obra.

Acciones de divulgación

Vallas informativas: El Consorcio VICGER 2021 realizó el trámite ante la entidad para la entrega de diseños correspondientes a las vallas informativas y su instalación en cada uno de los municipios a intervenir. A la fecha, cuenta con nueve de las diez vallas proyectadas a implementar en cada uno de los municipios definidos en las provincias de Sumapaz, Alto Magdalena y Tequendama. Se espera para el próximo periodo, presentar la instalación de

la valla faltante en el municipio de El Colegio.

Tabla 20. Vallas informativas instaladas en la provincia de Sumapaz.

		
Tibacuy	Pandi	Cabrera

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 21. Vallas informativas instaladas en la provincia de Alto Magdalena.

		
Jerusalén	Nariño	Nilo

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 22. Vallas informativas instaladas en la provincia de Tequendama.

		
Anolaima	Anapoima	Viotá

Fuente Consorcio VICGER 2021

<u>Elaboración y distribución de piezas de comunicación a la población del Área de Influencia Directa:</u>

Para este periodo se elaboraron y distribuyeron piezas informativas referentes a las actividades y reuniones a desarrollar en cada uno de los municipios visitados, previamente

aprobadas tanto por la interventoría como por la entidad, sin embargo, en el caso de las piezas que no alcanzaron a ser aprobadas de acuerdo con la programación, no se realizó su implementación en el periodo.

- Para la provincia de Sumapaz se remitió una (1) pieza de divulgación el 18 de julio a la interventoría, correspondiente a la convocatoria a reunión solicitada por la supervisión, sin embargo, no se recibió aprobación ni de la interventoría ni de la entidad, por lo que no se implementó y la convocatoria fue realizada por parte de la veeduría municipal.

- Para la provincia de Alto Magdalena se implementaron dos (2) piezas de divulgación, el 23 de julio a la interventoría, correspondientes a convocatorias a reuniones de socialización de PMT en veredas de Jerusalén.

- Para la provincia de Tequendama se remitió dos (2) piezas de divulgación el 3 y 14 de julio a la interventoría, correspondiente a volantes informativos de actas de vecindad en los municipios de Anolaima y El Colegio. El volante de El Colegio no ha sido aprobado a la fecha, por lo que no se implementó.

Tabla 23. Piezas de divulgación implementadas en el periodo.

No.	Tipo de pieza	Pieza	Forma y sitio de distribución	Fecha de divulgación	Cantidad	Observaciones
56	Volante Informativo	Actas de vecindad Anolaima	Predio a predio en territorio	07.07.26	12	Convocatoria apoyada por la JAC de Mesitas del Caballero
57	Volante Informativo	Actas de vecindad El Colegio	No se implementó	N/A	N/A	Sin aprobación a la fecha
58	Volante Convocatoria	PMT Jerusalén Alto del Roble	Predio a predio en territorio y Vía WhatsApp	21 y 27.07.26	7	Convocatoria apoyada por la alcaldía municipal
59	Volante Convocatoria	Reunión extraordinaria Tibacuy	No se implementó	N/A	N/A	Convocatoria realizada por la veeduría municipal
60	Volante Convocatoria	PMT Jerusalén La Victoria	Vía WhatsApp	25.06.26	1	Convocatoria apoyada por la alcaldía municipal
Cantidad total de volantes informativos					20	
Cantidad total de piezas divulgadas durante el periodo					20	

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 24. Entrega de piezas de divulgación en la provincia de Alto Magdalena.

6

Jerusalén

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 25. Remisión de información vía WhatsApp.

	
Información compartida con la alcaldesa municipal de Jerusalén	

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 26. Entrega de piezas de divulgación en la provincia de Tequendama.


Anolaima

Fuente Consorcio VICGER 2021

Indicadores de Cumplimiento del subprograma de información y divulgación**.**

En el siguiente apartado presentan los indicadores de cumplimiento correspondientes al subprograma de información y divulgación, conforme a lo establecido en el PAGA Social.

Tabla 27. Indicadores de cumplimiento del subprograma de información y divulgación.

Nombre	Indicador	Cantidad	Cumplimiento
Reuniones	No. De reuniones realizadas X 100 No. De reuniones programadas	6 3	100%
Piezas informativas	No. De piezas entregadas X 100 No. De piezas programadas	20 20	100%

Fuente Consorcio VICGER 2021

5.3. Subprograma de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos

Durante el presente periodo se desarrollaron actividades de levantamiento de actas de vecindad. Ver anexo 3.

- En la provincia de Sumapaz, no se realizó levantamiento de actas de vecindad en el periodo reportado.

- En la provincia de Alto Magdalena, municipio de Jerusalén, vereda Alto del Trigo, se realizó levantamiento de quince (15) actas de vecindad, las cuales se encuentran en procesamiento para su copiado y entrega posterior a comunidad.

Tabla 28. Actas de vecindad levantadas en Alto Magdalena – Jerusalén.

Fecha	Propietario y/o encargado	Documento de Identidad	Teléfono	Municipio	Ubicación
21.07.26	Yeimy Rocío Fonseca	1072431087	3214448610	Jerusalén	K24+480D
21.07.26	Yamile Nasayo Cuchabe	1033788478	3227719841	Jerusalén	K24+450D
21.07.26	Yamile Nasayo Cuchabe	1033788478	3227719841	Jerusalén	K24+450I
21.07.26	Rodrigo Pedreros	11315780	3103241646	Jerusalén	K24+400I
21.07.26	Rodrigo Pedreros	11315780	3103241646	Jerusalén	K24+390D
21.07.26	Rodrigo Pedreros	11315780	3103241646	Jerusalén	K24+335D
21.07.26	Rodrigo Pedreros	11315780	3103241646	Jerusalén	Alto del Trigo
21.07.26	Rodrigo Pedreros	11315780	3103241646	Jerusalén	Alto del Trigo
21.07.26	Yamile Nasayo Cuchabe	1033788478	3227719841	Jerusalén	K23+750D
21.07.26	María Rosalba Sánchez	20662280	3125502912	Jerusalén	K23+700I
21.07.26	María Rosalba Sánchez	20662280	3125502912	Jerusalén	K23+700D
21.07.26	Iván Francisco Orjuela	107621506	3006096755	Jerusalén	K23+650D
21.07.26	Yamile Nasayo Cuchabe	1033788478	3227719841	Jerusalén	K23+650I
21.07.26	Yamile Nasayo Cuchabe	1033788478	3227719841	Jerusalén	K23+500

Fecha	Propietario y/o encargado	Documento de Identidad	Teléfono	Municipio	Ubicación
22.07.26	Orfelina Sarria	20.410.716	3114573725	Jerusalén	Alto del Trigo

Fuente Consorcio VICGER 2021

- En la provincia de Tequendama, municipio de Anolaima, en el tramo ubicado en la vereda Mesitas del Caballero, se realizó levantamiento de cincuenta y dos (52) actas de vecindad, las cuales se encuentran en procesamiento para su copiado y entrega posterior a comunidad y en el municipio de Viotá, en las veredas de El Trapiche, Las Palmas y Alto Ceylán se realizó levantamiento de veinticuatro (24) actas de vecindad, las cuales se remitirán a interventoría en territorio, para solicitar firma del componente técnico y posteriormente para copiado y entrega a comunidad.

Tabla 29. Actas de vecindad levantadas en Tequendama - Viotá

Fecha	Propietario y/o encargado	Documento de Identidad	Teléfono	Municipio	Ubicación
09.07.26	Carlos Gámez	458366	3128256922	Viotá	K17+300I
09.07.26	Carlos Gámez	458366	3128256922	Viotá	K17+300D
09.07.26	Carlos Gámez	458366	3128256922	Viotá	K16+600D
09.07.26	Carlos Gámez	458366	3128256922	Viotá	K16+500D
09.07.26	José Esnoraldo Sánchez	455643	323228672	Viotá	K16+510I
09.06.26	Dilia Moreno	51742922	3209655949	Viotá	K16+480I
09.07.26	Carlos Gámez	458366	3128256922	Viotá	K16+475D
09.07.26	Yehimi Nataly Pulido Leal	1068827033	3232480928	Viotá	K13+970D
09.07.26	Clodoveo Quintero	17114217	3118314894	Viotá	K14+050I
09.07.26	Juan Ávila	1078826545	3112649090	Viotá	K14+560
09.07.26	Blanca Nubia Rubio	21119105	3138035875	Viotá	K14+565D
09.07.26	Carlos Gámez	458366	3128256922	Viotá	K14+600I
09.07.26	José Miguel Abreo	19496147	3203710624	Viotá	K14+460D
10.07.26	Yehimi Nataly Pulido Leal	1068827033	3232480928	Viotá	K13+970I
10.07.26	Raúl Ruíz	901301127	3209807664	Viotá	K13+870D
10.07.26	Oscar Velázquez	457988	3113890346	Viotá	K13+825I
10.07.26	Luz Nancy Aldana López	21118963	3154009347	Viotá	K13+800I
10.07.26	María Gilma Ortiz	42698457	3177357229	Viotá	K13+775I
10.07.26	Lidia Yaneth León R.	1070585161	3112951152	Viotá	K13+725D
16.07.26	Leopoldo Camargo M.	3207158	3224539019	Viotá	K13+675D
16.07.26	Ricardo Parra Rodríguez	458295	3166386673	Viotá	K11+265D
16.07.26	Clelia Rojas	39787454	3138516635	Viotá	K11+270D
16.07.26	Clelia Rojas	39787454	3138516635	Viotá	K11+280D
16.07.26	Clelia Rojas	39787454	3138516635	Viotá	K11+310D

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 30. Actas de vecindad levantadas en Tequendama - Anolaima

Fecha	Propietario y/o encargado	Documento de Identidad	Teléfono	Municipio	Ubicación
07.07.26	Luz Mary Calderón R.	20368974	3112197325	Anolaima	K8+165D
07.07.26	Liliana Gutiérrez	52314524	3114717045	Anolaima	K8+135D
07.07.26	Carlos Suárez López	6759885	3125925925	Anolaima	K8+120D
07.07.26	Blanca Cecilia Castro	20368195	3102940022	Anolaima	K8+100D
07.07.26	Elva Velazco	28168831	3208021648	Anolaima	K7+685I
07.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K7+655I.
07.07.26	José Arismendi León B.	79943641	3132498649	Anolaima	K7+640I.
07.07.26	Elva Velazco	29068831	3208021648	Anolaima	K7+610I
07.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K7+655D
07.07.26	Elva Velazco	29068831	3208021648	Anolaima	K7+640D
07.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K7+550D
07.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K7+535I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+998I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+995D
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+965I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+965D
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+960D
15.07.26	María Eugenia Correa	20369653	3107782169	Anolaima	K8+955I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+920I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+915D
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+895D
15.07.26	Guillermo León	4096233	3102227673	Anolaima	K8+850D
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+830D
15.07.26	Sandra Reyes	20370237	3138119866	Anolaima	K8+815I
15.07.26	Arturo Cala Orjuela	109840816	3014490532	Anolaima	K8+745I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+720I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+560I
15.07.26	Ruperto Hernández	186701	3132804547	Anolaima	K8+550D
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+548I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+540I
15.07.26	Rafael León	19244738	3057072108	Anolaima	K8+525D
15.07.26	Carmen Beltrán	20367164	3115647817	Anolaima	K8+510D
15.07.26	Olga Martínez	20370148	3123453840	Anolaima	K8+490I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+465I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+417I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+415I
15.07.26	Luis Alberto González	19312757	3112466582	Anolaima	K8+415D
15.07.26	Oscar Susa	2957439	3203837734	Anolaima	K8+345D
15.07.26	Crescencio María Pulido	17120839	3104843971	Anolaima	K8+300I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+215I
15.07.26	Imelda Cubillos	41462829	3502953595	Anolaima	K8+215D
15.07.26	Ángel María Malagón	2955714	3115034173	Anolaima	K8+105D

Fecha	Propietario y/o encargado	Documento de Identidad	Teléfono	Municipio	Ubicación
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+020D
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K8+000D
15.07.26	Helver Zamora Muñoz	2955614	3108896701	Anolaima	K7+970I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K7+910D
15.07.26	Elizabeth Yate	41662634	3125081942	Anolaima	K7+850D
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K7+840D
15.07.26	Modesto Silva	457031	3125460544	Anolaima	K7+814I
15.07.26	Edilberto A. Hernández L.	20520815	3165430704	Anolaima	K7+769I
15.07.26	Julio Oliveros Gómez	186827	3102042877	Anolaima	K7+752I
15.07.26	Omar Cesar Franco R.	2954014	3115647817	Anolaima	K7+715D

Fuente Consorcio VICGER 2021

Indicadores de Cumplimiento del subprograma de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos**.**

En el siguiente apartado presentan los indicadores de cumplimiento correspondientes al subprograma manejo de infraestructura de predios y servicios públicos, conforme a lo establecido en el PAGA Social.

Tabla 31. Indicadores de cumplimiento del subprograma de información y divulgación.

Nombre	Indicador	Cantidad	Cumplimiento
Actas de vecindad	No. De actas de vecindad realizadas X 100 No. De actas de vecindad programadas	91 91	100
Actas de compromiso	No. De actas de compromiso realizadas X 100 No. De actas de compromiso requeridas.	N/A N/A	N/A

Fuente Consorcio VICGER 2021

5.4. Subprograma Cultura vial y participación comunitaria.

Este subprograma busca ayudar a vincular a la comunidad en la ejecución de la obra de una manera voluntaria, comprometida y desinteresada, haciendo que se sientan beneficiarios de la misma y así satisfacer masivamente, en la medida de las posibilidades, las expectativas que pueda tener la comunidad con la ejecución de la obra.

Talleres pedagógicos: Desarrollado bajo una metodología participativa, experiencial y lúdica, se busca fortalecer en estudiantes de una institución educativa por provincia, conocimientos, actitudes y comportamientos responsables frente a la seguridad vial, promoviendo una cultura de prevención, respeto por las normas de tránsito y autocuidado, permitiendo el aprendizaje y refuerzo de conceptos.

- En las Provincias de Sumapaz y Tequendama se desarrollaron los talleres de

seguridad vial y auto cuidado reportados en informe mensual de gestión social de junio de 2026 y se remitieron con oficio CVG-ICCU-OF-517-2026 del 31 de julio de 2026 para trámite correspondiente.

- Provincia de Alto Magdalena se desarrolló el taller de seguridad vial y auto cuidado en la Institución Educativa Departamental Nacionalizado de Jerusalén, con 8 menores de grados mixtos de primaria, atendiendo el requerimiento 28 de julio de 2026 y se remitieron con oficio CVG-ICCU-OF-517-2026 del 31 de julio de 2026 para trámite correspondiente. Ver anexo 4.

Tabla 32. Desarrollo del taller de seguridad vial y auto cuidado – Alto Magdalena

		
Taller pedagógico de seguridad vial y autocuidado en la provincia de Alto Magdalena.		

Fuente Consorcio VICGER 2021

Participación comunitaria: El comité de Participación Comunitaria COPACO, busca generar un espacio de participación, en donde algunos líderes o representantes de las comunidades estén un poco más cercanos al desarrollo del contrato, facilitando la atención de inquietudes y el acercamiento a las comunidades.

- Provincia de Sumapaz, se encuentran conformados dos comités de participación ciudadana en el municipio de Tibacuy, un comité de participación ciudadana en el municipio de Cabrera y un comité de participación ciudadana en el municipio de Pandi, integrados por actores sociales y/o habitantes de las veredas donde se encuentran ubicados los tramos a intervenir.

  Dentro del periodo, se convocó el COPACO de Bateas de manera virtual con el link: https://meet.google.com/fob-jagq-ssf. Teniendo en cuenta que no se contó con participación de los líderes comunales inscritos, se concertó su reprogramación para el siguiente periodo, de acuerdo a disponibilidad de los mismos.

Tabla 33. Evidencia COPACO Tibacuy.





Remisión de link para reunión virtual y comunicación de miembros

Fuente Consorcio VICGER 2021

- Provincia de Alto Magdalena se conformó un comité en Jerusalén y en los municipios de Nilo y Nariño, las comunidades manifestaron que este espacio de participación se desarrollará a través de las alcaldías y líderes comunales.

- Provincia de Tequendama no se conformaron comités de participación comunitaria COPACO en los municipios de Anapoima ni Viotá. Las comunidades manifestaron que este espacio de participación se desarrollará a través de las alcaldías y líderes comunales. Los municipios de Anolaima y El Colegio a la fecha no se encuentran activos, por lo que no se tienen aún conformación de comités.

Indicadores de Cumplimiento del subprograma de Cultura vial y participación comunitaria**.**

En el siguiente apartado presentan los indicadores de cumplimiento correspondientes al subprograma manejo de Cultura vial y participación comunitaria, conforme a lo establecido en el PAGA Social.

Tabla 34. Indicadores de cumplimiento del subprograma de cultura vial y participación ciudadana.

Nombre	Indicador	Cantidad	Cumplimiento
Talleres	No. De Talleres pedagógicos realizadas X 100 No. De Talleres pedagógicos programadas	3 3	100%

Nombre	Indicador	Cantidad	Cumplimiento
COPACO	No. De comités conformados X 100 No. De comités programados	5 4	100%
COPACO	No. De comités convocados X 100 No. De comités programados	1 1	100%

5.5. Subprograma de mano de obra contratada

Este subprograma busca mejorar la calidad de vida de los pobladores de los corregimientos, veredas, y centros poblados que componen el Área de Influencia Directa del proyecto a través de la vinculación laboral de Mano de Obra No Calificada para la etapa de ejecución del proyecto.

El Consorcio VICGER 2021 cuenta con un personal calificado de base que realiza acciones de obra dentro de las tres provincias y un personal no calificado de los municipios correspondientes a las provincias en intervención, atendiendo a los requerimientos contractuales de vinculación laboral. A continuación, se presenta el listado de personal vinculado durante el periodo del reporte, de acuerdo con la información suministrada por el área SST. Ver anexo 5.

Tabla 35. Personal reportado por el componente SST.


No.	Nombre Del Trabajador	Identificación	Cargo	Ingreso	Retiro
Personal Nuevo					
1	Cruz Arámbula Wendy Daniela	1.014.279.422	Aux Tránsito Jerusalén	30/06/2026	
2	Ramos Cordero Luis Carlos	1.067.912.432	Ayudante Nilo	30/06/2026	
3	Escamilla Criollo Astris	20.761.831	Aux Tránsito Nilo	30/06/2026	
4	Correa Penagos Jeimmy Alejandra	1.069.925.161	Aux Tránsito Nilo	30/06/2026	
5	Rodríguez Sierra Luis Felipe	1.003.523.427	Ayudante Nilo	30/06/2026	
6	Rico Escobar Duban Ernesto	1.069.732.357	Ayudante Nilo	1/07/2026	
7	Diaz Torres Mario Alejandro	1.069.924.828	Ayudante Nilo	1/07/2026	
8	Reyes Gómez Wernel Daniel	1.003.568.843	Ayudante Nilo	1/07/2026	
9	Villalba Rojas Carlos Albero	1.033.792.250	Ayudante Jerusalén	6/07/2026	
10	Parrado Ruíz Angie Lorena	1.004.037.144	Aux. Tránsito Viotá	21/07/2026	
11	Torres Castro Laura Yulieth	1.078.826.670	Aux Tránsito Viotá	21/07/2026	
12	Romero Restrepo Andrey Bernardo	1.026.250.212	Ayudante Viotá	27/01/2026	
13	Daza Diego Armando	1.069.759.419	Ayudante Viotá	27/01/2026	
14	Pérez Capera Albeiro Euclides	5.823.225	Ayudante Viotá	27/01/2026	
15	Montaño Moya Kebin Arbey	1.007.413.305	Ayudante Viotá	27/01/2026	
16	Estepa Diana	52.968.492	Secretaria	1/0//2026	
Personal Antiguo					
1	Ballestas Carlos Andrés	80.023.146	Director	2/04/2025	
2	Gutiérrez Carlos Iván	19.165.638	Especialista	2/04/2025	
3	Ballestas Claudia	1.019.022.615	SST	2/04/2025	
4	Casas García Brayan Felipe	1.016.082.534	Ingeniero Ambiental	4/11/2025	
5	Núñez Guillermo	1.052.616	Ingeniero Residente	20/01/2025	
6	Tuñón Pérez Esther	1.048.609.602	Residente Social	11/02/2026	
7	Bojacá Diana Esperanza	52.154.882	Residente Social	27/04/2026	
8	Cardozo Andrés Fernando	10.105.688.025	Ingeniero Residente	2/01/2026	
9	Gordillo Gómez Angela	52.394.442	Residente SST	15/05/2026	

10	Mateus Pardo Gilbert	1.096.906.644	Ingeniero Residente	2/05/2026	
11	Henao Cristian Camilo	1.018.505.287	Ingeniero Residente	2/05/2026	
12	Soler Johan Stiven	1.070.004.440	Operador Retro	30/09/2025	
13	González Ramiro Hernando	3.361.126	Operador Vibro Nilo	1/10/2025	
14	Pedraza Jorge Dilmar	79.820.750	Conductor Carrotanque	3/10/2025	
15	Rico Rico Héctor Isaías	3.155.071	Operador Retroexcavadora	19/01/2026	
16	Forigua Carlos Hernando	79.238.199	Operador Motoniveladora Jerusalén	9/02/2026	
17	Bonilla Juan Alfonso	2.969.563	Operador Vibro	16/02/2026	
18	Rodríguez Amaya Ciro	14.105.469	Operador Motoniveladora	17/03/2026	
19	Alejo Cruz Edison Alberto	1.022.351.814	Ayudante Viotá	13/04/2025	
20	Puín Hernández John Edison	413.525	Operador Vibro compactador	16/04/2026	
21	Varela Rodríguez Jesús Eduardo	93.461.471	Ayudante Jerusalén	3/01/2026	
22	Varela Moreno Luis Felipe	1.070.751.279	Ayudante Jerusalén	3/01/2026	
23	Romero González Jimmy Darío	1.069.230.091	Ayudante Jerusalén	3/10/2025	
24	Romero José Miguel	79.869.713	Operador Motoniveladora Nilo	11/05/2026	
25	Reyes Luis Carlos	3.102.127	Aux Tránsito Nariño	18/06/2026	
26	Reyes Rojas Yuleidy	1.003.748.724	Aux Tránsito Nariño	18/06/2026	
27	Carvajal Laura Camila	1.010.089.873	Aux Tránsito Jerusalén	25/06/2026	
28	Fara Víctor Danilo	1.073.558.668	Ayudante Jerusalén	23/06/2026	
29	Chávez Claudia Lili	52.811.371	Aux Tránsito Jerusalén	24/06/2026	
Retiro De Personal					
1	Morales Cristian Camilo	1.069.763.750	Ayudante Viotá	5/05/2026	1/07/2026
2	Díaz Ávila Lady Lizeth	1.052.402.293	Ingeniera Residente	11/05/2026	21/07/2026

Fuente Consorcio VICGER 2021

Durante el periodo se contó con un total de cuarenta y siete (47) trabajadores vinculados al contrato, de los cuales trece (13) corresponden a profesionales, nueve (9) corresponden a operadores de maquinaria o conductores calificados y veinticinco (25) corresponden a mano de obra no calificada.

Ilustración 1. Personal vinculado al contrato ICCU 140-2025.

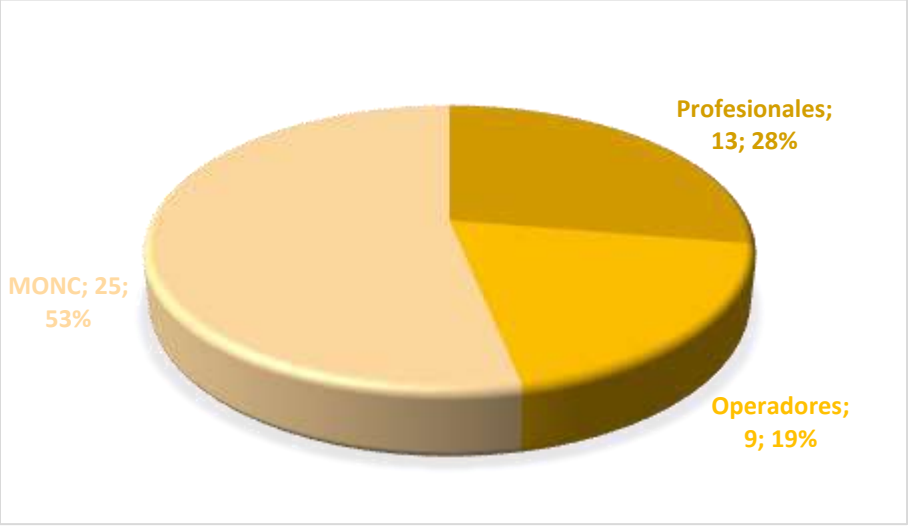

Fuente Consorcio VICGER 2021

Tabla 36. Personal MONC en la provincia de Alto Magdalena.

Nombre	Identificación	Cargo	Ingreso	Retiro
Cruz Arámbula Wendy Daniela	1.014.279.422	Aux Tránsito Jerusalén	30/06/2026	N/A
Ramos Cordero Luis Carlos	1.067.912.432	Ayudante Nilo	30/06/2026	N/A
Escamilla Criollo Astris	20.761.831	Aux Tránsito Nilo	30/06/2026	N/A
Correa Penagos Jeimmy Alejandra	1.069.925.161	Aux Tránsito Nilo	30/06/2026	N/A
Rodríguez Sierra Luis Felipe	1.003.523.427	Ayudante Nilo	30/06/2026	N/A
Rico Escobar Duban Ernesto	1.069.732.357	Ayudante Nilo	1/07/2026	N/A
Diaz Torres Mario Alejandro	1.069.924.828	Ayudante Nilo	1/07/2026	N/A
Reyes Gómez Wernel Daniel	1.003.568.843	Ayudante Nilo	1/07/2026	N/A
Villalba Rojas Carlos Albero	1.033.792.250	Ayudante Jerusalén	6/07/2026	N/A
Varela Rodríguez Jesús Eduardo	93.461.471	Ayudante Jerusalén	3/01/2026	N/A
Varela Moreno Luis Felipe	1.070.751.279	Ayudante Jerusalén	3/01/2026	N/A
Romero González Jimmy Darío	1.069.230.091	Ayudante Jerusalén	3/10/2025	N/A
Reyes Luis Carlos	3.102.127	Aux Tránsito Nariño	18/06/2026	N/A
Reyes Rojas Yuleidy	1.003.748.724	Aux Tránsito Nariño	18/06/2026	N/A
Carvajal Laura Camila	1.010.089.873	Aux Tránsito Jerusalén	25/06/2026	N/A
Fara Víctor Danilo	1.073.558.668	Ayudante Jerusalén	23/06/2026	N/A
Chávez Claudia Lili	52.811.371	Aux Tránsito Jerusalén	24/06/2026	N/A

Fuente Consorcio VICGER 2021


Tabla 37. Personal MONC en la provincia de Tequendama.

Nombre	Identificación	Cargo	Ingreso	Retiro
Parrado Ruíz Angie Lorena	1.004.037.144	Aux Tránsito Viotá	21/07/2026	N/A
Torres Castro Laura Yulieth	1.078.826.670	Aux Tránsito Viotá	21/07/2026	N/A
Romero Restrepo Andrey Bernardo	1.026.250.212	Ayudante Viotá	27/01/2026	N/A
Daza Diego Armando	1.069.759.419	Ayudante Viotá	27/01/2026	N/A
Pérez Capera Albeiro Euclides	5.823.225	Ayudante Viotá	27/01/2026	N/A
Montaño Moya Kebin Arbey	1.007.413.305	Ayudante Viotá	27/01/2026	N/A
Alejo Cruz Edison Alberto	1.022.351.814	Ayudante Viotá	13/04/2025	N/A
Morales Cristian Camilo	1.069.763.750	Ayudante Viotá	5/05/2026	1/07/2026

Fuente Consorcio VICGER 2021

Dentro del periodo, la vinculación de mano de obra no calificada se mantuvo en su totalidad con personal de las provincias intervenidas. De un total de veinticinco (25) personas no calificadas vinculadas, diecisiete (17) corresponden a la provincia de Alto Magdalena y ocho (8) a la provincia de Tequendama.

Ilustración 2. Personal MONC por provincia.

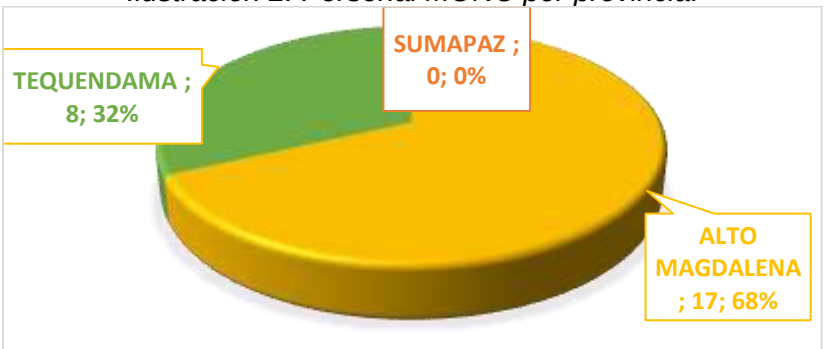

Fuente Consorcio VICGER 2021

De acuerdo con lo establecido en los pliegos del consorcio VICGER 2021, está dando cumplimiento al porcentaje mínimo requerido de Mano de Obra No Calificada Local o Municipal, superando el 30% exigido.

Tabla 38. Personal femenino MONC.

Nombre	Identificación	Cargo	Ingreso	Retiro
Cruz Arámbula Wendy Daniela	1.014.279.422	Aux Tránsito Jerusalén	30/06/2026	N/A
Escamilla Criollo Astris	20.761.831	Aux Tránsito Nilo	30/06/2026	N/A
Correa Penagos Jeimmy Alejandra	1.069.925.161	Aux Tránsito Nilo	30/06/2026	N/A
Parrado Ruíz Angie Lorena	1.004.037.144	Aux Tránsito Viotá	21/07/2026	N/A
Torres Castro Laura Yulieth	1.078.826.670	Aux Tránsito Viotá	21/07/2026	N/A
Reyes Rojas Yuleidy	1.003.748.724	Aux Tránsito Nariño	18/06/2026	N/A
Carvajal Laura Camila	1.010.089.873	Aux Tránsito Jerusalén	25/06/2026	N/A

Fuente Consorcio VICGER 2021


Tabla 39. Personal femenino MOC.

Nombre	Identificación	Cargo	Ingreso	Retiro
Estepa Diana	52.968.492	Secretaria	1/07/2026	N/A
Ballestas Claudia	1.019.022.615	SST	2/04/2025	N/A
Tuñón Pérez Esther	1.048.609.602	Residente Social	11/02/2026	N/A
Bojacá Diana Esperanza	52.154.882	Residente Social	27/04/2026	N/A
Gordillo Gómez Angela	52.394.442	Residente SST	15/05/2026	N/A
Díaz Ávila Lady Lizeth	1.052.402.293	Ingeniera Residente	11/05/2026	N/A

Fuente Consorcio VICGER 2021

El Consorcio VICGER 2021, dentro de los cuarenta y siete (47) vinculados reportados en el periodo, se mantuvo la vinculación de siete (7) mujeres MONC y seis (6) mujeres profesionales, superando el 5% de vinculación en atención al requerimiento contractual de vinculación de mujeres

Ilustración 3. Vinculación por género.

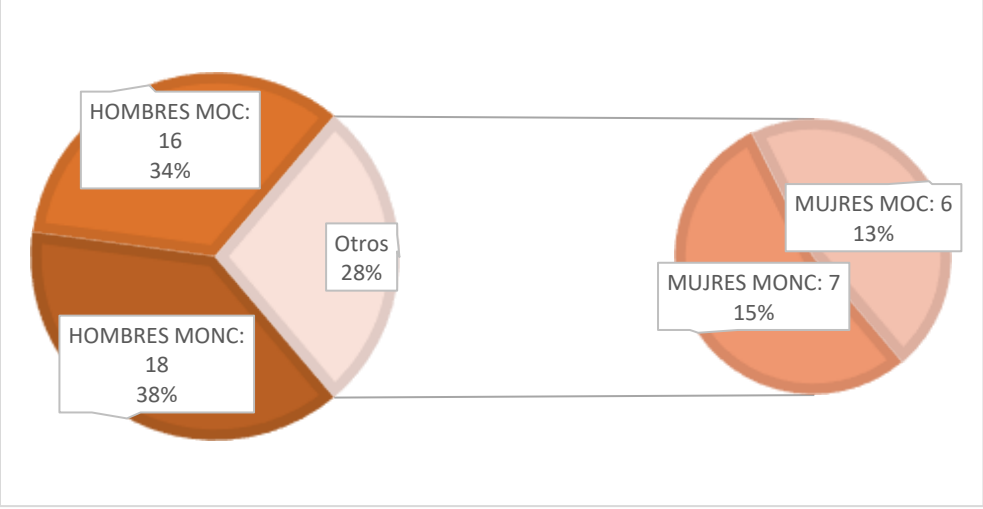

Fuente Consorcio VICGER 2021

El Consorcio VICGER 2021 supera el 90% de vinculación requerido en los pliegos contractuales de personal colombiano.

En cuanto a la Mano de Obra Calificada, no ha requerido la vinculación de nuevo personal, sin embargo, en las comunidades intervenidas se mantiene abierta la recepción de hojas de vida a la espera de perfiles que cumplan con los requisitos técnicos que se puedan necesitar.

Tampoco se ha vinculado personal víctima de conflicto, ya que ARN no reporta personal disponible en la zona. Se mantuvo comunicación con la entidad, con el fin de actualizar la solicitud, la cual mantiene su reporte de no contar con personal en el momento en su base de datos.

Indicadores de Cumplimiento del subprograma de mano de obra contratada.

En el siguiente apartado se presentan los indicadores de cumplimiento correspondientes al subprograma mano de obra contratada, conforme a lo establecido en el PAGA Social. Se evidencia el cumplimiento de los porcentajes requeridos en los pliegos del contrato, en los ítems que aplican para el periodo.

Tabla 40. Indicadores de Cumplimiento del subprograma de mano de obra contratada.

Nombre	Indicador	Cantidad	Cumplimiento
Mano de Obra No Calificada Local	No. personas MONC Locales vinculadas X 100 No. Personas MONC vinculadas totales	25 25	100%
Mano de Obra Nacional	No. personas nacionales vinculadas X 100 No. personas vinculadas totales	47 47	100%
Víctima del Conflicto	No. personas víctimas de conflicto vinculadas X 100 No. personas víctimas de conflicto totales	N/A N/A	N/A
Mujeres vinculadas	No. mujeres vinculadas X 100 No. personas mujeres totales	13 47	27,65%

6. Comités de Seguimiento para el Contrato

Con el propósito de realizar seguimiento a las actividades que se desarrollaran en el contrato, se asistió en este periodo a dos (2) comités de seguimiento, con participación de la supervisión técnica del ICCU, la dirección y profesionales técnicos, SST, Ambientales y Sociales de la interventoría ECG INGENIERÍA S.A.S y la dirección y profesionales técnicos SST, Ambientales y Sociales del contratista CONSORCIO VICGER 2021 de manera presencial o de manera virtual.

Tabla 41. Comités de seguimiento del contrato.

FECHA	TIPO DE REUNIÓN	ENLACE DE REUNIÓN
24.07.26	Comité de seguimiento # 47	Reunión de Microsoft Teams Unirse: https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F252061777672012%3Fp%3DCOLPr62JXAZfby0EE7%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=802a2ac4-c812-40a5-ad04-b1c6cdc4a1e5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
30.07.26	Comité de seguimiento # 48	Reunión de Microsoft Teams Unirse: teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F258102584099153%3Fp%3DaEGK964ShSJ9oRkjsY%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=88b762fc-6860-4bb8-9b1a-68d784f78940&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Adicionalmente y con el propósito de realizar seguimiento a las actividades de gestión social que se desarrollaran en el contrato, se asistió en este periodo a dos (2) comités de seguimiento social, con participación de las profesionales sociales de la interventoría ECG INGENIERÍA S.A.S y las profesionales sociales del contratista CONSORCIO VICGER 2021 de manera telefónica y virtual. Las actas fueron enviadas por la interventoría el 17 y 29 de julio y se remitieron firmadas con oficio CVG-ICCU-OF-517-2026 del 31 de julio de 2026 para trámite correspondiente. Ver anexo 6.


Tabla 42. Comités de seguimiento social del contrato.

FECHA	TIPO DE REUNIÓN	ENLACE DE REUNIÓN
09.07.26	Comité de seguimiento social # 15	Llamada telefónica de la profesional social de interventoría ECG INGENIERÍA S.A.S.
17.07.26	Comité de seguimiento social # 16	Reunión de Microsoft Teams Unirse: https://meet.google.com/ksw-qxua-emz

Se encuentra pendiente la firma de algunos formatos implementados en el periodo por parte de los profesionales técnicos y sociales de interventoría, los cuales se estarán gestionando en territorio, para dar continuidad al proceso documental y en territorio.

El consorcio VICGER 2021, realiza reporte de actividades a través del chat de WhatsApp a la interventoría social y de acuerdo con las instrucciones recibidas por la dirección de obra para el desarrollo de actividades.

Tabla 43. Remisión de cronogramas de actividades sociales.

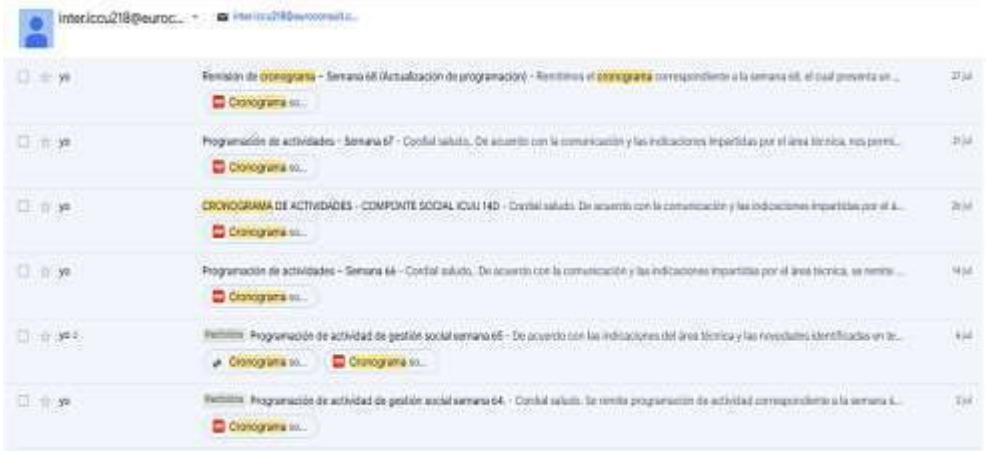

Remisión de cronograma semanal de actividad social a interventoría los días 2,6,14,21,26y 27 de julio de 2026

7. Conclusiones

El área de gestión social del Consorcio VICGER 2021, ha adelantado las gestiones requeridas de acuerdo a su alcance para el cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el programa de gestión social radicado, revisado y aprobado por la interventoría ECG INGENIERÍA S.A.S.

El área de gestión social del Consorcio VICGER 2021, dentro del periodo:

- Ha asistido a todos los comités citados por la interventoría o el ICCU, y se han tomado en cuenta las sugerencias realizadas en estos espacios.
- Ha realizado acercamientos con alcaldías municipales, líderes comunales y comunidades de las provincias involucradas, permitiendo establecer un canal eficaz para el desarrollo de las actividades requeridas y obras programadas.
- Ha atendido las observaciones de la entidad, disponiendo espacios de atención presencial y buzones en alcaldías municipales en donde se tiene actividad para atención de comunidades en las provincias involucradas, brindando canales adicionales para la atención durante el desarrollo de las obras.
- Ha realizado acompañamiento a las reuniones extraordinarias requeridas, elaborando, gestionando y entregando los volantes informativos aprobados para los municipios de las provincias en intervención, manteniendo la información de manera directa a las comunidades involucradas.
- Ha dado cumplimiento a la promoción entre las comunidades de la conformación del COPACO, sin embargo, las comunidades han mantenido la decisión de no conformarlos y mantenerse informados a través de las alcaldías municipales y líderes comunales y en el caso de Bateas, a pesar de la convocatoria, no se contó con asistencia.

ANEXO 1:

SUBPROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD

Consorcio VICGER 2021	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA** **OBJETO DEL CONTRATO ICCU - 140 "INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."** **FICHA PQRS**	ICCU

1. DATOS GENERALES

NOMBRE OAC	

2. IDENTIFICACIÓN DEL MUNICIPIO

LOCALIZACIÓN TRAMO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CÓDIGO DANE	VEREDA
	Cundinamarca	Tibacuy	25805	Bateas

NÚMERO DE CONVENIO	NO TENGO INFORMACION	**FECHA DILIGENCIAMIENTO**
OBJETO DEL CONVENIO	NO TENGO INFORMACION	DÍA /MES /AÑO
No. CONTRATO DE INTERVENTORIA	NO TENGO INFORMACION	28 de Julio 2026

3. TIPO DE PQRS

PETICIÓN		**QUEJA**	X	**RECLAMO**		**SOLICITUD**	

4. AREA

SOCIAL		**TÉCNICA**		**OTRA**	

NOMBRE DE LA PERSONA QUE REALIZA EL PQRS	**JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BATEAS**	NÚMERO DE C.C **900182256-3**

DESCRIPCION:

Se presenta una queja con respecto a la construcción de una de las alcantarillas en la vereda Bateas. En este punto existe un flujo permanente de agua proveniente de una pequeña quebrada, por lo que la comunidad manifiesta su inconformidad con la construcción del descole de la estructura.Asimismo, se evidencia que fue necesario intervenir la obra mediante la demolición de una parte de la estructura para corregir la ejecución, lo que podría indicar una falta de revisión técnica durante el proceso constructivoAunque actualmente el caudal es bajo debido a la temporada seca, en época de lluvias este aumenta considerablemente, por lo que la obra podría no garantizar un adecuado manejo del flujo de agua. Adicionalmente, la comunidad considera que el cabezote y las aletas debieron construirse con una transición más amplia y alineada con el cauce natural, tal como se encontraba la estructura anterior, para asegurar un mejor funcionamiento hidráulico.

REGISTRO FOTOGRAFICO





MEDIO DE RECEPCIÓN	ESCRITO		WhatsApp	x	VERBAL	
FIRMA DEL PETICIONARIO	**Luisa Fernanda Ibarra Celemin** **Presidente JAC Batea**		¿SE ADJUNTAN ANEXOS?	SI x	NO	
			¿CUÁL? REGISTRO FOTOGRAFICO			

ANEXO 2:

SUBPROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Reunión

Inicio de obra

Invitamos a la comunidad y lideres a participar en la reunión extraordinaria en la cual se darán a conocer los tramos a intervenir por parte del proyecto:

"Intervención de las vías que conformarán el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse, en el departamento de Cundinamarca".

Contrato ICCU No.140-2025

En este espacio se presentarán información general sobre las actividades a desarrollar, alcance del proyecto, los tramos a intervenir y los canales de atención a la ciudadanía.

Para mayor información comunicarse a lo siguientes canales de atención:

Correo electrónico: atnciudadania.cto140@gmail.com

Línea de atención con WhatsApp **314 730 1734**

Lunes
27 de julio
4: 00 p.m.

Lugar: **IED Nacionalizado de Jerusalén sede la Victoria**

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA



Volante: 60 Reunión extraordinaria Fecha: 22/07/2026 Provincia Alto Magdalena / Jerusalén

ICCU	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	3 de julio de 2026	**ACTA No.**		
HORA DE INICIO:	8:00am	**HORA FINALIZACIÓN:** 9:30am		
LUGAR DE REUNIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA - DESPACHO			
DEPENDENCIA:	Consorcio VICGER 2021 - Gestión Social			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Atención a solicitud de la interventoría, para acompañar reunión de revisión de alternativa de diseño a implementar en el municipio de Anolaima en Cundinamarca.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza acompañamiento al espacio informativo con representantes del ICCU, administración municipal, interventoría y contratista, en donde se definirá la alternativa de diseño a implementar en el segmento vial a intervenir.

Por parte del ICCU, la ingeniera Daniela Nieto informa que teniendo en cuenta las características del contrato, el contratista debe garantizar dos años de estabilidad, sin embargo, se esta analizando que esas propuestas duren hasta ocho años. Esta estabilización a realizar podría funcionar, eventualmente haciendo un poco más de intervención a la alternativa anterior que era un kilómetro en placa huella.

El ingeniero Juan Sebastián Sánchez, supervisor del ICCU, indica que anteriormente, el ICCU realizó socialización con la comunidad, quienes están muy inclinados hacia la placa huella. Por temas de tiempo, ya que la placa huella es más artesanal y el cierre es total y la alternativa que se presenta esta proyectada a ocho años y esta compuesta de un micro pavimento de ocho centímetros, que puede dar un alcance de mil seiscientos metros, extendiéndose trescientos metros más aproximadamente la meta, dándole un mayor alcance a los recursos públicos, que son escasos.

La ingeniera Daniela nieto pregunta al señor alcalde que había pensado al respecto.

El señor Alcalde Carlos González, da la bienvenida a los presentes al municipio e indica en principio que debe manifestar que siempre ha sido defensor de la placa huella, ya que Anolaima es un municipio bastante quebrado, por la topografía del mismo, las subidas y bajadas son bastante bastas, y en la parte rural les funciona muy bien el tema de placa huella, como en otros municipios con la misma topografía. Hizo el comentario al ingeniero Juan Sebastián que, en su momento, la socialización que se hizo con la comunidad de Mesitas del Caballero, se logro que se inclinaran por la placa huella, por el tema de durabilidad, porque hablando en materia, en el tema de nuevas tecnologías, porque sienten preocupación, porque la vía va a requerir hacer mantenimientos por parte de la administración con esa metodología de mejoramiento. Expreso a los ingenieros Nieto y Sánchez del ICCU que como administración, espera terminar su mandato bien, realizando los procesos que se deban realizar y que el día de mañana, no surjan inconvenientes a los cuales vaya a tener que hacer frente, porque, primero, sí inicialmente se hablo de una placa huella, van a decir que no se hizo el mantenimiento o porque se dejó hacer la obra de otra manera o que se "robaron la plata" y segundo, porque tienen experiencia con placa huellas de más de 30 años, que están en servicio, entonces es la preocupación de la durabilidad. Se habló con el ingeniero Sánchez de dos años y hablan ahora de ocho años, pues, es un factor a tener en cuenta.

Lo que quiere es tener tranquilidad no solo por el costo político, sino por la comunidad, porque es un sector que tiene una alta transitabilidad, comunica con Quipile y es un tema de producción, de ganadería extensiva, es una zona productivamente alta y que cuenta con dos granjas avícolas; se informó que los estudios están proyectados sobre la carga existentes. Se ha comentado la preocupación ya que no es el ejecutor directo, sino que corresponde a una adjudicación de la gobernación y que el día de mañana pueda tener alguna dificultad con eso, sin querer ser obstáculo y agradece tener el espacio antes, para no llegar ante la comunidad sin claridad. Agradece a la ingeniera Daniela que salgan con una sola línea, un solo concepto y no verse fragmentados, amparados en la decisión técnica tomada y tener en cuenta el resto del mantenimiento del resto de la vía.

La molestia inicial de la comunidad no es el método de mantenimiento a realizar, sino que se habló inicialmente de 10,5 kilómetros que daban hasta el límite con Quipile, lo que tenía a la gente feliz, después de tantos años y se llevan la sorpresa al explicar, en la medida en que se pudo socializar el contrato, los costos y todos los ítems, pero la gente no entiende eso y se dice que el alcalde se dejo robar el dinero, no hizo nada o la gobernación y simplemente por el proceso el contrato salió así. Solicita a la ingeniera Daniela Nieto, la posibilidad de poder agendar el mantenimiento con un combo de maquinaria para informar a la comunidad y va a tener buena acogida.

La ingeniera Nieto indica que se tiene una estrategia como departamento, sabiendo que con los recursos que tienen no alcanzan a intervenir todo el corredor, de la manera que se tenia pensado con estos estabilizantes y el año anterior durante las subastas inversas se adquirieron equipos propios, con los que se pensó entrar directamente a intervenir los corredores, de la misma manera que se esta haciendo con la unidad de mantenimiento vial, instalando asfalto directamente desde el ICCU. Esta propuesta también se le va a llevar a la comunidad. El tema social esta en volver a retomar las socializaciones y contarles que paso, hacer la introducción y resaltar que de 96 o 98 municipios a los cuales se fue a hacer la socialización, para ver cuales corredores se escogían, solo 44 quedaron priorizados, entre ellos Anolaima, y son cosas de resaltarle a la comunidad. Los profesionales están prestos a escuchar a la administración y a la comunidad y también atender un derecho de petición que llegó de 72 personas solicitando información de la intervención del corredor, del alcance, tipo de intervención, y por esa razón se realizo contacto con la administración municipal para reunir a la comunidad, escucharlos y contarles el trabajo que se ha hecho desde el contratista y la interventoría, para que vean que las exploraciones dieron resultados hasta febrero, contarles que ha pasado, las demoras que se han tenido y que sepan que el recurso continua disponible y salvaguardado y comentar que con el otro tipo de intervención se podría hacer más, reduciendo el espesor de la estabilización a 11 centímetros e instalando una capa de asfalto, demarcándolo extendiéndolo a 1.6 kilómetros

El ingeniero Sánchez indica que es un proceso industrial y se haría empalme con una vía que viene en asfalto, quedando estéticamente mucho mejor que el empalme a placa huella.

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	3 de julio de 2026	**ACTA No.**		
HORA DE INICIO:	8:00am	**HORA FINALIZACIÓN:** 9:30am		
LUGAR DE REUNIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA - DESPACHO			
DEPENDENCIA:	Consorcio VICGER 2021 - Gestión Social			

El señor alcalde indica a todos los asistentes que de parte de la administración no quieren ser obstáculo ni detener los procesos, de hecho en la fecha se va a hacer presencia con el equipo de gabinete, precisamente, para que la comunidad sienta esa importancia, de parte del ICCU y de parte de la administración, piensa que más que darles la palabra inicialmente a ellos, explicarles nuevamente, pensando en el derecho de petición, que le parece desafortunado, habiendo anunciado con bastante antelación la socialización, porque no estuvieron presentes y tuvieron que esperar a los 8 o 15 días enviar un derecho de petición preguntando lo mismo que se hablo en la reunión

La ingeniera Nieto indica que la intervención de la comunidad irá después de la intervención de la administración, la gobernación y el contratista; se les escucha y se les explica. Lo importante, de entrada es hablarles de las dos alternativas de estabilización y del tema del asfalto

El secretario de Planeación Rodrigo Barreto, indica que a la fecha se han realizado tres reuniones con la comunidad, en la última reunión, se levanto la mano y se eligió la placa huella. Hoy se habla de 1,6 y ese día se habló de 1.3 kilómetros, y dijeron que así faltaran 800 metros para llegar al empedrado, querían placa huella. Las 70 personas de abajo, están en cabeza de una persona que genera bastante discrepancia. también esta lo de las dos alcantarillas que se querían allí y que se quería con la misma tecnología. El día de la reunión se les comentó que el terreno hasta la Mesita es más plano y es más dinámico para trabajar cualquiera de las dos alternativas. De la Mesita para abajo es totalmente irregular y hay zonas de fallos y remisión en masa difíciles de trabajar con este material. Ese día se trato de compensar a la comunidad, mirando la posibilidad de traer un kit de maquinaria para arreglar la vía de ahí para abajo, pero la solicitante esta insistente en obra, porque dentro del kilometraje hay dos alcantarillas, una en zona totalmente inestable y con ella misma se concertó eliminarla porque están seguidas y la otra que prácticamente se desempato y se construyó. Seguramente, posteriormente, se reunieron abarcando Monte Blanco y San Gerónimo, generando la mala información, y le firmaron a ella para hacer el radicado que tiene el ICCU y hay dos personas que están pendientes de estar haciendo presión. Esa socialización se hizo hace mes y medio en la piscina del mono.

El señor alcalde indica que la preocupación es un poco porque la gente pregunta porqué otra socialización? A lo que se responde que es con el fin de mantener la información al día, los temas claros y que no se preste a confusiones, por eso la convocatoria incluye al personal del ICCU, para darles la importancia y atender a las inquietudes, explicar porque se habló 1.3 kilómetros de placa huella, sin embargo, aclarar qué, el ICCU en aras de optimizar los recursos y tener un mayor alcance, presenta la opción de realizar un asfalto demarcado, aclarando que es una nueva opción con otros beneficios.

Siendo las 9:30 am se finaliza la actividad en el despacho del alcalde y se realiza desplazamiento a la vereda Mesitas del Caballero para atender a la convocatoria realizada por parte de la administración municipal.

Siendo las 10:15 am, se da inicio a la actividad con comunidad convocada. Durante la reunión de socialización del proyecto vial en el municipio de Anolaima, representantes del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), la interventoría, el contratista y la administración municipal expusieron a la comunidad los alcances técnicos de la intervención y las modificaciones realizadas al diseño inicial. Se informó que el proyecto contempla la ejecución aproximada de 1,6 km de pavimento asfáltico, conformado por una carpeta asfáltica de 8 cm sobre una base granular de 15 cm, alternativa que permitirá optimizar los recursos, reducir los tiempos de ejecución a cerca de un mes y minimizar las afectaciones a la movilidad mediante cierres parciales de la vía.

Durante la jornada se socializaron los beneficios técnicos de la nueva metodología constructiva, entre ellos la mayor cobertura del corredor, la continuidad de la circulación vehicular mediante un Plan de Manejo de Tránsito (PMT), la construcción de cunetas, adecuación de accesos prediales, señalización horizontal y vertical, así como la implementación de actividades sociales relacionadas con actas de vecindad, atención ciudadana, participación comunitaria, vinculación laboral y talleres de seguridad vial, por provincia.

La comunidad manifestó inquietudes relacionadas con el cumplimiento de los cronogramas, el alcance de la intervención, la durabilidad del pavimento, la inversión destinada al proyecto y la necesidad de intervenir los tramos restantes del corredor. En respuesta, el ICCU reiteró su compromiso con el inicio oportuno de las obras, explicó los aspectos técnicos y presupuestales que sustentan la modificación del diseño, informó sobre las acciones de seguimiento contractual adelantadas al contratista y ratificó la intención de gestionar futuras intervenciones para mejorar los restantes 10,5 km del corredor mediante maquinaria y recursos institucionales.

Como parte del componente de participación ciudadana, la administración promovió la conformación de la veeduría ciudadana con el acompañamiento de la Personería Municipal, resaltando la importancia del control social durante la ejecución del proyecto. Finalmente, se reiteró el compromiso de mantener una comunicación permanente con la comunidad, garantizando el seguimiento técnico, social y contractual de las actividades hasta la culminación de la obra.

Siendo la 1:30 pm se finaliza la actividad y se da cierre al acta de la reunión.

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	3 de julio de 2026	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	8:00am	**HORA FINALIZACIÓN:**	9:30am
LUGAR DE REUNIÓN:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ANOLAIMA - DESPACHO		
DEPENDENCIA:	Consorcio VICGER 2021 - Gestión Social		

REGISTRO FOTOGRÁFICO









CONCLUSIONES

Se atiende compromiso convocado por la interventoría con profesionales del ICCU y administración municipal para definir metodología de mejoramiento a implementar en el segmento vial priorizado en el municipio y se realiza acompañamiento a la administración municipal a socialización convocada.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se solicita realizar acompañamiento a reunión con comunidad, convocada por la administración municipal en la vereda Mesitas del Caballero, en la fecha, para atender inquietudes de la comunidad y aclarar la intervención por	En la fecha
El contratista se compromete a realizar levantamiento de actas de vecindad sobre el corredor vial como parte de las actividades preliminares a la ejecución de obras programadas.	A programar

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
LAURA DANIELA NIETO	laura.nieto@cundinamarca.gov.co	
LUZ ANGELA SANABRIA	luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co	
JUAN SEBAASTIAN SÁNCHEZ	juan.sanchezestrada@cundinamarca.gov.co	
GUSTAVO CROSBY L	inter.iccu218@euroconsult.com.co	
ELBER OLIVARES	inter.iccu218@euroconsult.com.co	
JAVIER AMAYA	inter.iccu218@euroconsult.com.co	
MARIA FERNANDA QUITIAN	inter.iccu218@euroconsult.com.co	
LIZETH DÍAZ	consorcioviger@gmail.com	
DIANA ESPERANZA BOJACA I.	atnciudadania.cto140@gmail.com	

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	3 de julio de 2026	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	8:00am	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:30am
LUGAR DE REUNIÓN:	Corredor Mesitas del Caballero - Via Anolaima a Quipile.		
DEPENDENCIA:	Consorcio VICGER 2021 - Gestión Social		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Atención a solicitud de la Entidad, Comunidad e interventoría, para acompañar reunión de revisión de alternativa de diseño a implementar en el municipio de Anolaima en Cundinamarca, enmarcada en el programa Caminos Vecinales, Caminos Para Quedarse - CTO. ICCU 140 - 2025.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizo la socialización en la vereda Mesitas del Caballero para atender a la convocatoria realizada por parte de la comunidad del corredor via Anolaima - Quipile y la administración municipal. Se adelanta la reunión con acompañamiento por parte del ICCU, desde la dirección de infraestructura la ingeniera Laura Daniela Nieto, la subdirectora de Caminos Vecinales Luz Angela Sanabria y el gestor del contrato 140 - 2025 el ingeniero Juan Sebastián Sanchez, representantes de la alcaldía municipal, el alcalde Carlos González, Director de interventoría ingeniero Gustavo Crosby (ECG Ingenieria), representantes de la empresa contratista Consorcio VICGER 2021, asistentes de la comunidad de la zona de intervención, presidentes de las diferentes Juntas de Accion Comunal - JAC y la presencia del señor Juan Camilo Parra Personero (E) Municipal. Dicha reunión se adelanta con el propósito de desarrollar un espacio informativo en donde se comunican las características del contrato, estado actual y proyecciones para su ejecución.

Esta socialización inicio con actos protocolarios, como la entonación de los himnos de la Republica, Departamento de Cundinamarca y Municipio de Anolaima, paso seguido, se el señor alcalde Carlos Gonzalez dio sus palabras manifestando la importancia que es este proyecto para el municipio y resaltando las diferentes necesidades que cuenta la comunidad del sector Mesitas Del Caballero y sus veredas circundantes; asi mismo, las palabras de agradecimiento con el ICCU, por lograr el desarrollo de los diferentes proyectos que la Gobernación de Cundinamarca ha desarrollado en la región y municipio de Anolaima. Desde la alcaldía municipal se manifiesta el interés en el desarrollo de una alternativa que garantice la transitabilidad adecuada para el mejoramiento de las condiciones de tráfico del sector y que presente a su vez una alta durabilidad, dada la importancia que supone el corredor ya que comunica el municipio de Anolaima con Quipile.

Acto seguido, La ingeniera Laura Daniela Nieto, Directora de la dirección de Infraestructura del ICCU, dio sus palabras con las que contextualizo el programa Caminos Vecinales, Caminos Para Quedarse, manifestando que este programa hace parte del Plan de Desarrollo de la Gobernación 2023 - 2027, y que embandera el desarrollo de corredores terciarios en el departamento, haciendo incapie que se basa en el desarrollo de nuevas tecnologiasde estabilización con el fin de reducir gastos de suministro, transporte e instalación de grandes cantidades de materiales petreos los cuales se han vuelto excasos en las regiones debido a la constante afectación ambiental fruto de la explotación del recurso suelo.

Asi mismo, se aclaro la cifra relacionada con el recurso asignado al municipio por parte de la Gobernación mediante el Fondo de Caminos Vecinales, el cual corresponde a aproximadamente a DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL SEISCIENTOS DIECISEIS PESOS ($ 2.566.100.616) el cual incluye costos de interventoria, Fase I, Fase II, Fase III, PAGA y PMT. Con el fin de dar claridad al alcance de intervención del corredor se realizo la explicación correspondiente a la alternativa de intervención No. 5, la cual se basa en la conformación del material existente en la subrasante, seguido del suministro de 11 cm de subbase y finalizando con una carpeta asfaltica de 8 cm, con el fin de tener un buen acabado y aporte estructural para mejorar la durabilidad del corredor vial., lo anterior considerando los resultados de la caracterización de la Fase II del contrato de obra publica ICCU 140 - 2025 y aprobación de los especialistas geotecnicos y de pavimentos de la interventoria ECG INGENIERIA S.A.S.

Como parte adicional suministrada por la Dirección del ICCU, se manifesto los tiempos de cobertura de las polizas de garantías que tiene el contrato, comunicando que la estabilidad de obra corresponde a 2 años, a partir del acta de terminación y/o liquidación del contratos, sin embargo, se busca ofrecer a la comunidad una alternativa con una durabilidad mucho mayor que corresponde a 8 años de acuerdo a diseño presentado por el contratista CONSORCIO VICGER 2021 .

Continuando con el orden del día, se presento el ingeniero Gestor Juan Sebastián Sánchez, donde contextualizo la situación real del contrato en el corredor, amplio la información técnica relacionada con las intervenciones y logistica que ha conyevado este contrato de obra, asi como sus alcances, los cuales corresponden a la construccion de 2 alcantarillas de 36" cada una, cunetas en ambos costados de la vía y un alcance de intervención aproximado de 1.6km; esto con el fin de continuar las condiciones técnicas que el inicio del corredor maniene, permitiendo hacer empalme con la vía conformada en asfalto que conecta el casco urbano, generando a demás de funcionalidad un mejor resultado estético. Asi mismo se comunico el proceso de adquisición de recursos, la distribución del proyecto a nivel departamental en donde al final se seleccionaron 44 municipios para realizar la intervención de estabilización con productos químicos, dentro de esto quedó incluido el municipio de Anolaima.

La socialización fue motivada con el fin de aclarar las multiples duda, inquietudes y preoupaciones de la población del corredor junto con los diferentes derechos de petición manifestando estas mismas inquietudes. El objetivo de esta mesa de socialización es con el fin de dar parte de tranquilidad a la comunidad de que el recurso para la ejecución está disponible y salvaguardado y a su vez, el recurso asignado sera intervenido en su totalidad en el municipio cumpliendo lo estipulado en los estudios previos y anexo tecnico del contrato de oba e interventoria.

Durante la socialización a traves del componente técnico se reliza las diferentes aclaraciónes en cuanto a la alternativa de construcción de placa huella, manifestando las diferencias en las metodologías constructivas, puesto que este tipo se considera de manera artesanal lo cual genera un mayor tiempo de ejecución y a su vez tendra una mayor costo por kilomentro de intervención lo que equivale a una menor meta fisica para el corredor. Asi mismo, menionando las ventajas que conyeva este proceso innovador, puesto que se basa en un desarrollo industrializado que mejora los rendimiento de ejecución y un alcance superior de meta fisica. Durante la jornada se socializaron los demás beneficios técnicos de la Alternativa No. 5 dentro de las que se encuentran la mayor cobertura del corredor, la continuidad de la circulación vehicular mediante un Plan de Manejo de Tránsito (PMT), la construcción de cunetas, adecuación de accesos prediales, señalización vertical, así como la implementación de actividades sociales relacionadas con mejorar las conductas de los usuarios o actores viales por el aumento de velocidades en el corredor, atención ciudadana, participación comunitaria, vinculación laboral y talleres de seguridad vial, por provincia.

Finalizando el componente técnico, por parte de la entidad se presento a los diferentes profesionales pertenecientes a los equipos de trabajo de obra como de interventoria, asi mismo los residentes y equipo social, los cuales estarán con mayor permanencia en el corredor cuando se de inicio a las intervenciones, las cuales fueron pactadas de la siguiente forma: El componente social iniciara actividades de recolección de actas de vecindad del corredor a partir del martes 7 de julio de 2026, y paso seguido en la primera semana del mes de agosto se dara inicio a las intervenciones civiles por parte del CONSORCIO VICGER 2021, esto una vez completado el proceso de modificación e inclusión de items no previstos, generados a partir de la alternativa No. 5 del contrato ICCU 140 - 2025.

Acto seguido de la esboce del componente técnico, como parte del componente de participación ciudadana, la administración promovió la conformación de la veeduría ciudadana con el acompañamiento de la Personería Municipal, resaltando la importancia del control social durante la ejecución del proyecto; por parte de los lideres de las comunidades que acompañaron el comite, se realizo la escogencia del personal que hará parte de la veeduria ciudadana, con el fin de hacer parte del control y supervisión de las actividades y el cumplimiento de las metas planteadas en este programa para el municipio de Anolaima en el correodor Anolaima, La Trampa, Quipile.

Se hizo claridad que la entidad ha dado respuesta a las peticiones presentadas, no obstante, la comunidad por medio de la veeduría que se conformará se enviará la petición de suministro de actas de reunión. Finalmente, se reiteró el compromiso de mantener una comunicación permanente con la comunidad, garantizando el seguimiento técnico, social y contractual de las actividades hasta la culminación de la obra.

Para finalizar, por parte de la comunidad del municipio de Anolaima, se realizaron las diferentes preguntas, dudas inquietudes y peticiones en marcado en el proyecto de Caminos Vecinales, donde por parte de los actores del proyecto ya sea desde la Entidad, componente técnico (obra e interventoria), administración local se respondieron con el fin de generar claridad y transparencia en cada una de las etapas que se han surtido en el desarrollo del contrato ICCU 140 - 2025. Ha raiz de estas respuestas también se generaron compromisos en cuanto a tiempos de intervención, apoyo a las JAC mediante el CONVITEICCUMUNAL con el fin de hacer trabajos colectivo entre el ICCU, la Alcaldía, y Juntas de Acción Comunal.

No habiendo más temas por tratar, se dio por finalizada la mesa de socialización realizada en el municipio de Anolaima, dejando

REGISTRO FOTOGRÁFICO











CONCLUSIONES

Como conclusión de la mesa de socialización realizada en el municipio de Anolaima, en el marco del Programa Caminos Vecinales, se destaca el desarrollo de un espacio de diálogo participativo y constructivo entre la comunidad, las autoridades locales y los actores involucrados en el proyecto. Durante la jornada se socializaron los objetivos, alcances y componentes técnicos de la intervención, brindando claridad sobre las actividades contempladas, los criterios de ejecución, los tiempos estimados y las responsabilidades de cada una de las partes.

Asimismo, se atendieron y resolvieron las inquietudes planteadas por los asistentes, permitiendo fortalecer el conocimiento del proyecto y generar mayor comprensión respecto a los beneficios esperados para la comunidad. Este ejercicio contribuyó a consolidar un ambiente de confianza, transparencia y participación ciudadana, favoreciendo el adecuado desarrollo de las etapas posteriores del proyecto y reafirmando el compromiso de las entidades participantes con la ejecución de las obras en beneficio de

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Se solicita realizar acompañamiento a reunión con comunidad, convocada por la administración municipal en la vereda Mesitas del Caballero, en la fecha, para atender inquietudes de la comunidad y aclarar la intervención por parte del ICCU.	En la fecha
El contratista se compromete a realizar levantamiento de actas de vecindad sobre el corredor vial como parte de las actividades preliminares a la ejecución de obras programadas.	A partir del 07 de julio de 2026
El suministro de tuberia para alcantarilla en el corredor, mediante el CONVITEICCUMUNAL	24de julio de 2026
Inicio del proceso constructivo por parte del contratista de obra CONSORCIO VICGER 2021 e interventoria ECG INGENIERIA S.A.S.	Primera semana del mes de agosto.
Remisión del acta de comité levantado el día 03 de julio de 2026 por parte del ICCU	En desarrollo.

.

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
Se anexa listado de asistencia de los participantes al comité y mesa de socialización realizado el día 03 de julio de 2025.		

Municipio de Anolaima

SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FORMATO LISTA DE ASISTENTES A REUNIONES - SPOSP

Hoja: ___ de ___

TEMAS TRATADOS:

FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Ing. Oscar Rodrigo Barrero Orjuela

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

LUGAR REUNION:

FECHA: HORA:

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CEDULA	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Fredy Lozano	93.369.198	Particular	San Jerónimo 3			
2	Jaime Mario Rubiano	1094811958	Limonal				Danilo R.
3	Hector Martinez	1[illegible]899	Limonal				X
4	Josa Maria Leon	80[illegible]	Limonal				
5	Leidy Ruiz	1068928359	Limonal				
6	William Jimenez	80156585	Limonal				William J.
7	Dixie Jimenez	2953742	El limonal				alinajimenez
8	Abdiel Bupuche B	2957432	El Limonal				Abdiel
9	Dario Rubiano R.	1068929707	San Jerónimo				
10	Heber Lemos M.	2955614	Hospitales				
11	Leidy Arevalo	51685363	San Jeronimo				
12	Ricardo Sierra	19281.906	San Jeronimo				
13	Yolima Cerquera P.	1080933503	San Jeronimo				Yolima C.P.
14	Carmen Rosa Suarez	41565299	sanjeronimo				Carmenrosa
15	Jesus Antonio Nieto	17[illegible]4951	Sanjeronimo				

COMPROMISOS:

REUNIONES

Powered by CamScanner

Municipio de Anolaima

Secretaría de Planeación, Obras y Servicios Públicos

SECRETARIA DE PLANEACION, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

FORMATO LISTA DE ASISTENTES A REUNIONES - SPOSP

Hoja: ___ de ___

TEMAS TRATADOS:

FUNCIONARIO RESPONSABLE REUNION: Ing. Oscar Rodrigo Barrero Orjuela

DOCUMENTOS ENTREGADOS:

LUGAR REUNION:

FECHA: HORA:

	NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CEDULA	ORGANIZACIÓN/ENTIDAD	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
1	Gladys Campos	51791466	San Jeronimo				
2	Gladys B. Borjas.	28947582	San Jeronimo				Gladys B
3	Luz Maria Bolaños	28 944 346	San Jeronimo				Luz Maria B
4	Maria Bertilda Franco P.	41'677.320	San Jeronimo				
5	Martha Zapata	35'331.086	San Jeronimo				
6	Ana Felicia Gutierrez	41'782077	San Jeronimo				
7	Felix Triana	79324212	San Geronimo				
8	Alvaro Alba	79231471	San Jeronimo				
9	Juan Lamus	2984150	San Jeronimo				
10	Angela Gonzalez	51740473	San Jerónimo				Angela Gonzalez
11	Luis Vicente Pedraza	2984106	EL SALTO				
12	Jaime Padilla	19340919	San Jeronimo				
13	Blanca Gomez	20795846	San Jeronimo				
14	Yovana Gonzalez Vergel	20370741	San Jeronimo				
15	Juan Carlos Cuello Hoyos	1018436405	San Jeronimo				Juan Cuello

COMPROMISOS:

REUNIONES

Powered by CamScanner

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN:	22 de julio de 2026	**ACTA No.**		Pag de
HORA DE INICIO:	2:15pm	**HORA FINALIZACIÓN:**		3:30pm
LUGAR DE REUNIÓN:	Polideportivo Alto del Trigo			
DEPENDENCIA:	Consorcio VICGER 2021 - Gestión Social			

OBJETO DE LA REUNIÓN

Realizar acompañamiento al espacio informativo establecido en conjunto con la alcaldía municipal de Jerusalén, para la socialización del PMT y atención de inquietudes en la vereda Alto del Trigo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realiza acompañamiento al espacio informativo con la comunidad de la vereda, en atención al compromiso adquirido con la administración municipal, sobre la socialización de actividades y manejo de PMT para el municipio.

La profesional social del Consorcio VICGER 2021, da inicio a la presentación agradeciendo a los asistentes por su tiempo y asistencia, e inicia la presentación de las diapositivas indicando que corresponden a la socialización del Plan de manejo de tránsito a implementar en el municipio de Jerusalén. Se realizan las recomendaciones básicas de manejo para agilizar la reunión, indicando especialmente el dejar las preguntas para el final de la presentación y solicitando mantener en silencio los celulares.

La profesional continúa indicando las generalidades del contrato en cuanto a número de contrato fecha de inicio y fecha de terminación incluida la prórroga 1, valor del contrato y fases del mismo. A continuación, se presenta el personal de la entidad, interventoría y contratista vinculado al contrato, presentando a los profesionales que se encuentran en el lugar.

Se presenta el alcance del proyecto, indicando a los asistentes que se tiene proyectada intervención en los municipios de Anapoima, Anolaima, El Colegio, Viotá, Nilo, Nariño, Jerusalén, Cabrera, Pandi y Tibacuy ubicados en las provincias de Tequendama, Alto Magdalena y Sumapaz, dentro del departamento de Cundinamarca.

A continuación, la profesional social del contratista, presenta el plano de ubicación de los tramos a intervenir en el municipio de Jerusalén, señalando a los asistentes la ubicación de los segmentos a intervenir en las veredas de La Libertad, San José, La Victoria, Alto del Roble y alto del trigo con un total de 7,5 kilómetros de intervención y con un presupuesto aproximado de $5´160.947.395.

Componente técnico. Se explican a los asistentes las actividades de obra a realizar y la sección tipo de estructura a manejar para el mejoramiento a realizar en los segmentos viales. El mejoramiento a realizar inicia con la conformación de la vía o raspado con la motoniveladora, posteriormente se realiza el proceso de estabilización con un producto químico llamado PRODEC 100, el cual lleva más de 20 años en el mercado y el ICCU está implementando para este tipo de estabilización. Este producto aumenta la capacidad de soporte y reduce la contaminación; reduciendo la expansión de las arcillas, cambiando su composición química, evitando la absorción de agua e impermeabilizando la vía, creando una capa protectora que evita el ingreso de agua a la estructura, que se proyecta de 25 centímetros en total. se inicia con la escarificación de la vía, se aplica cemento en polvo en una proporción de 72 kilos y un litro de químico por metro cuadrado. una vez se tiene la humedad optima se inicia el proceso de compactación y posteriormente se realiza la instalación del material flexible que corresponde a un doble riego que corresponde a dos capas, la primera emulsión asfáltica y una capa de granular o piedra de 3/4, y en la segunda se coloca una nueva capa de emulsión y un sellado con una capa de granulado de 1/2 pulgada y se compacta para un total de 25 centímetros finales. Este producto se instalará con el equipo adecuado llamado finisher, dando el acabado final a las vías en intervención.

PMT: La profesional social indica a los asistentes que teniendo en cuenta que en los procesos constructivos se genera molestia en ambas partes, en los habitantes por su libre tránsito y acceso y en el contratista por la actividad a desarrollar en el segmento vial, se hace necesario atender una serie de recomendaciones para el manejo de tránsito en la vía, proyectando la señalización a implementar e indicando el manejo de horarios y cierres previstos para actividades puntuales como la instalación de tubería para alcantarillas o actividades de compactación y de doble riego para terminación de estructura prevista; Aclarando que, eventualmente y de acuerdo a la indicación que se dé por parte del residente de obra a los auxiliares de tránsito, habrá paso de motocicletas, sin embargo, se reitera la solicitud de atención a las indicaciones y recomendaciones que se realicen por parte de los auxiliares de tránsito y de la misma manera, se aclara que en el caso de los vehículos de emergencia y de la ruta escolar, se habilitará el paso.

Componente de seguridad y salud en el trabajo - SST: Se presentan las actividades generales del área, aclarando que están directamente relacionadas con el bienestar y manejo de todo el personal en obra, durante el proceso de mejoramiento a realizar. Se tiene en cuenta el tema de exámenes de ingreso, capacitación del personal y afiliaciones al sistema de seguridad social, entrega y uso de dotación y elementos de protección individual, identificación de riesgos, inspección de maquinaria y equipos, señalización y demarcación, brigadas botiquines y PMT.

Componente Ambiental: Se presentan las actividades generales y programas a implementar por parte del área con el propósito de prevenir afectaciones sobre el entorno. Se manejan brigadas de orden y aseo, manejo adecuado de materiales de construcción, prevención de derrames, kit de derrames y protección de fauna de la zona tanto silvestre como domésticos.

Componente social: Se indica el objeto del componente y los programas que se implementan para atender a las comunidades. El subprograma de atención la comunidad se presentan los canales de atención presenciales y virtuales previstos para la atención de las comunidades que se impactan con el proyecto. El subprograma de información y divulgación se encuentran todas las reuniones, volantes informativos que se generan las comunidades.

El subprograma de infraestructura y manejo de servicios públicos que está relacionado con las actas de vecindad, que son un documento privado entre el propietario, arrendatario o responsable de cada predio y el contratista. Se indica que una vez se finaliza el proceso, se entrega una copia de este documento, actividad que se realiza en el momento y en el caso de quienes no se encontraron, se hace entrega a los líderes comunales. Al finalizar el proceso de obra, se realiza nuevamente recorrido para realizar el cierre del proceso.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el subprograma de cultura vial y participación comunitaria se comenta sobre los talleres desarrollados por provincia sobre seguridad vial y auto cuidado con menores de instituciones educativas y sobre la conformación del COPACO, en donde se atienden a través de los miembros inscritos, las solicitudes, quejas y sugerencias que se puedan reunir de la comunidad, se recuerdan los canales de atención virtuales y se presenta el buzón de sugerencias, quejas, reclamos y felicitaciones, que se instaló en la alcaldía municipal en la oficina de Planeación. Finalmente, el subprograma de vinculación laboral extiende invitación a vincularse laboralmente al contrato indicando la vinculación de seis personas como ayudantes de obra y dos damas como auxiliares de tránsito. En la labor de ayudante de obra las labores son de rocería, carga y descarga por las piedras o el cemento que se manejaran. Finalmente se reitera la invitación a participar en el comité de participación comunitaria COPACO.

A continuación, se presenta el registro fotográfico de ejemplo constructivo de ejecución de actividades realizadas dentro del mismo contrato en el municipio de Cabrera, explicando a los asistentes en que consiste la actividad que representa cada fotografía. Se indica adicionalmente a los asistentes sobre la instalación

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN:	22 de julio de 2026	**ACTA No.**		Pag de
HORA DE INICIO:	2:15pm	**HORA FINALIZACIÓN:**		3:30pm
LUGAR DE REUNIÓN:	Polideportivo Alto del Trigo			
DEPENDENCIA:	Consorcio VICGER 2021 - Gestión Social			

de las alcantarillas, en donde se requerirá un cierre total de la vía ya que su excavación será del ancho total de la vía para la instalación de la tubería y toda la adecuación correspondiente y de la misma manera el cierre total de la vía durante la instalación del doble riego para la capa final de la estructura.
A partir de este punto se da la palabra a los asistentes para resolver sus dudas o inquietudes sobre la presentación y sobre la intervención a realizar.
Un asistente pregunta cuando van a hacer los cierres
Se indica a los asistentes que el trabajo esta programado para labor de 7 am a 5pm, sin embargo, es posible que se trabaje de manera continua de 7:00 am a 3:00 pm, con el compromiso de informar a través de los líderes comunales y la administración municipal sobre los cierres programados, resaltando que especialmente durante el proceso de compactación no habrá paso.
Otro asistente pregunta cómo se van a surtir del agua para el carro tanque.
Se informa a los asistentes que el Consorcio VICGER 2021 comprará el agua al acueducto veredal del Alto del Trigo. El carrotanque tiene un rendimiento de 200 o 250 metros, que son al menos 5 o 6 metros cúbicos de agua
Un asistente indica que cuando estén en la Victoria, pueden abastecerse de la quebrada La Quipile.
Un asistente pregunta que tramos se van a intervenir en la vereda
Se indica que, desde el carro parqueado, unos 900 metros hasta adelante del sector de la ye, por la parte de abajo de la placa huella, es la única intervención en la vereda.
Un asistente pregunta si la vía va a quedar, así como se ve
Se indica que una vez se finalice la estabilización, se realizará la instalación de la asfaltita, que se realiza en frío.
Otra asistente pregunta si el mejoramiento es solo para los sectores donde hay bastante comunidad o donde indica la alcaldía
Se explica que hubo una convocatoria en donde las alcaldías llevan lo priorizado por las veredas, luego se prioriza por necesidad, donde aplique la metodología de mejoramiento porque hay terrenos en donde hay fallas, inclinaciones o por transporte no es posible implementarla.
También se aclara que la necesidad del municipio correspondía a una mayor cantidad de kilómetros, sin embargo, el contratista trabaja con una metodología de mejoramiento que se basa en unas características especiales del suelo para su implementación, como no exceder el 6% de inclinación, buscando especialmente terrenos planos. Cuando se realizó la sectorización entre el ICCU y la administración municipal, se tuvo en cuenta la caracterización mencionada para realizar la asignación de los segmentos viales a intervenir.
Un asistente pregunta cuál va a ser el ancho de la vía
Se indica que el ancho existente hasta un máximo de 4 metros será el ancho a manejar.
La secretaria de la JAC del Alto del trigo, Yamile Nasayo, indica que cuando se presentó el proyecto, se dijo que era todo, pero se redujo según el estudio del que habla el contratista.
Se explica que en las inclinaciones de más de seis grados se corre el riesgo de que el químico se escurra y no haga el efecto que se requiere. La reducción de la meta física obedece a muchos factores adicionales. En territorio, por ejemplo, hay terrenos en donde no puedo escarificar o en donde no hay material remanente y necesito traer de fuera para acondicionar, y eso es un costo adicional que se viene evaluando en la medida en que aparece. Cuando se encuentran piedras muy grandes en la vía, que no permiten la actividad con la motoniveladora, generando un mayor costo por daño en el equipo, se revisa por parte de los profesionales de ICCU, interventoría y contratista la autorización de traer material. Por el momento, se esta realizando la actividad de ripeado o conformación del segmento.
Otra asistente pregunta si las labores de mantenimiento las hace el consorcio o la administración municipal, porque es un problema y que tanto peso soporta porque aquí no es mucho el tránsito.
El consorcio realiza el mejoramiento de los segmentos asignados, de acuerdo con la metodología indicada. El mantenimiento posterior tendría que ser de manejo de la administración municipal
La señora Nasayo indica que la comunidad es quien realiza el mantenimiento a nivel de rocería y están mirando con los vecinos el tema del gas, porque un vehículo paso y arrancó una caja, porque las pusieron en la vía, pero eso es un tema de cultura ciudadana que se puede gestionar directamente con la alcaldía. También las mangueras del agua, porque algunas están a solo 10 centímetros y la máquina al arreglar las deja descubiertas, entonces eso es conciencia de nosotros mismos. Aprovechar a profundizar, con eso cuando pase la vía no tienen que volver a romper. Hay unos predios que hacen falta por el tema de acometida de gas, entonces es que las juntas del Roble y Alto del trigo se pongan de acuerdo y hablen con esas personas para que agilicen la instalación de las mangueras. El problema del gas es que hoy están aquí y mañana en otro lado y no terminan
Otra asistente pregunta cuantos quilómetros de San José y La victoria se tienen.
Es reitera la información inicial sobre una intervención de 7,5 kilómetros, de los cuales de acuerdo a lo que se encuentre en territorio se ira ajustando. En San José la meta física disminuyó por las características del terreno, sin embargo, en la libertad el posible que se pueda extender un poco más. Las metas físicas varían también por la necesidad de acondicionar con otros materiales, la dificultad en la compra de agua para el proceso.
Un asistente indica que cuando se hizo la reunión, se dijo que La Libertad iba desde la olla hasta la quebrada. El Roble resulta con dos tramos y ni siquiera fue a la socialización y nosotros pensamos que nos quedamos por fuera cuando ustedes llegaron. ¿Por qué?
Se reitera que el contrato inicio el 2 de abril de 2025, con la revisión del requerimiento de diez municipios, en los cuales se desarrollaron las fases 1 y 2 de topografía, diagnósticos, laboratorios, caracterizaciones y finalmente se entregaron unas alternativas que el ICCU y la interventoría revisaron para que posteriormente se realizara la sectorización que nos fue entregada para ejecución con el mejoramiento proyectad. Hay partes donde puede funcionar mucho mejor una placa huella, pero eso sería para un nuevo proceso.
Las administraciones municipales y las comunidades siempre tienen la posibilidad de hacer una nueva gestión ante el ICCU para nuevos mejoramientos. En la página del ICCU hay información sobre diferentes programas a los que se puede acceder, adicionalmente el ICCU realizó la compra de una maquinaria con miras a hacer intervenciones directas, reduciendo costos y poyando lugares de difícil acceso y movilidad, pero esto es de la mano de la entidad, con las gestiones que se coordinen
La alcaldesa hace intervención comentando que la ejecución de los tramos de La Libertad y San José quedo muy bien y requiere hacer un recorrido de verificación de los demás tramos a intervenir en La victoria y Alto del Roble. Indica que le preocupa el tema del agua, porque es un elemento de difícil acceso para esa comunidad, sin embargo, si ya están en contacto con la persona responsable del acueducto vereda no tiene otra observación. Solicita realizar las reuniones con las veredas de Alto del Roble y La Victoria para el lunes de la siguiente semana a las 2 pm y 4 pm comando con su asistencia.

	FORMATO		CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN		FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN:	22 de julio de 2026	**ACTA No.**		Pag de
HORA DE INICIO:	2:15pm	**HORA FINALIZACIÓN:**		3:30pm
LUGAR DE REUNIÓN:	Polideportivo Alto del Trigo			
DEPENDENCIA:	Consorcio VICGER 2021 - Gestión Social			

Siendo las 3:30 pm se da por terminada la reunión y se cierra el acta

REGISTRO FOTOGRÁFICO





CONCLUSIONES

Se da cumplimiento al compromiso adquirido con la administración municipal y la comunidad de la vereda Alto del Trigo, ubicada en el segmento vial a intervenir. Se da respuesta a las inquietudes planteadas por parte de la comunidad y se programan nuevas socializaciones en atención a solicitud de la alcaldesa.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1. Revisar abscisado con la administración municipal para verificación de tramos de intervención.	En la fecha
2. Programar reuniones con veredas La Victoria y Alto del Roble alto y bajo	Lunes 27 de julio 2 y 4 pm
3. Atender COPACO con administración municipal	A programar
4. Comunicarse con empresa responsable de la gasificación para atender conexiones que crucen la vía	En la fecha

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
INGRI MARCELA VILLALBA C	alcaldia@jerusalen-cundinamarca.gov.co	
LIBIA MORENO	libiamoreno139@gmail.com	
MARIA FERNANDA QUITIAN ROVIRA	fernanda.quitian@euroconsultsc.co	
CRISTIAN CAMILO HENAO PALACIOS	consorcioviger@gmail.com	
ESTHER TUÑON PÉREZ	atnciudadania.cto140@gmail.com	
DIANA ESPERANZA BOJACA IZQUIERDO	atnciudadania.cto140@gmail.com	

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	23/07/2026	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	3:00 p. m.	**HORA**	5:00 p.m.
LUGAR DE REUNIÓN:	Salón Comunal Vereda Bateas		
DEPENDENCIA:	Plan de gestión social		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socializar con la comunidad el alcance, avance y aspectos técnicos del proyecto, atendiendo las inquietudes de los asistentes y fortaleciendo los mecanismos de participación ciudadana.

Siendo las 3:00 pm, se dio inicio a la reunión extraordinaria de socialización de actividades de obra con la participación de representantes de la Administración Municipal de Tibacuy, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU, la interventoría, el contratista de obra, el equipo social, la Veeduría Ciudadana, líderes comunitarios y habitantes del área de influencia del proyecto. Seguidamente, el señor Alcalde Municipal dirigió unas palabras a los asistentes, destacando la importancia del proyecto para el mejoramiento de la infraestructura vial del municipio y agradeciendo a la Gobernación de Cundinamarca y al Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU por la inversión realizada a través del programa "Caminos Vecinales – Caminos para Quedarse". Durante su intervención explicó que el municipio fue priorizado dentro del programa departamental para la ejecución de obras de mejoramiento sobre la red vial terciaria; sin embargo, precisó que el alcance del contrato está condicionado por la disponibilidad de los recursos asignados, razón por la cual únicamente fue posible intervenir los tramos priorizados durante la etapa de estructuración del proyecto. Asimismo, indicó que la selección de los sectores objeto de intervención obedeció a criterios técnicos establecidos durante la elaboración de los estudios y diseños, considerando aspectos como el estado de la vía, las condiciones topográficas, la conectividad, el beneficio para la población y la optimización de los recursos públicos disponibles. En este sentido, aclaró que algunos sectores no fueron incluidos debido a que cuentan con proyectos independientes o porque la disponibilidad presupuestal no permite ampliar el alcance del contrato .

Posteriormente, El Ingeniero Juan Sebastián Supervisor del ICCU realizo la presentación técnica del proyecto, explicando que, previo al inicio de las obras, fue ejecutada una fase de caracterización integral del corredor vial, la cual comprendió levantamientos topográficos, estudios geotécnicos, reconocimiento de las obras de drenaje existentes, toma de muestras y ensayos de laboratorio para determinar las condiciones reales de los materiales presentes en cada uno de los tramos priorizados. Como resultado de esta caracterización se identificaron variaciones importantes en las condiciones del terreno, evidenciándose sectores con presencia de materiales orgánicos, cambios en la composición del suelo, variaciones granulométricas y condiciones geotécnicas diferentes a las previstas inicialmente. En consecuencia, fue necesario ajustar el diseño estructural del proyecto, implementando soluciones técnicas que permitieran garantizar la estabilidad de la vía, la adecuada capacidad estructural del pavimento y una mayor vida útil de las obras ejecutadas.

En este contexto, el ICCU explicó que dichos ajustes comprendieron modificaciones en los espesores de estabilización, la implementación de tratamiento superficial doble y la adecuación de obras de drenaje en los sectores donde las condiciones del terreno así lo requerían, precisando que estas decisiones obedecieron exclusivamente a criterios técnicos sustentados en los resultados de los estudios de campo y laboratorio, garantizando el adecuado uso de los recursos públicos y la calidad de la infraestructura a ejecutar. se continuo con la intervención del contratista el cual presentó el estado de avance del proyecto, describiendo las actividades ejecutadas en cada uno de los tramos intervenidos y los procedimientos constructivos implementados para el mejoramiento de la estructura vial. Se informó a la comunidad sobre las labores de conformación de la vía, estabilización de la subrasante, incorporación de materiales, aplicación de tratamientos superficiales y construcción de obras complementarias de drenaje, resaltando que cada actividad se desarrolla de conformidad con las especificaciones técnicas aprobadas por el ICCU y bajo el seguimiento permanente de la interventoría.

Igualmente, el contratista explicó la programación de las actividades pendientes, indicando que durante la ejecución de determinadas labores será necesario implementar cierres parciales y temporales de la vía, los cuales serán informados oportunamente a la comunidad mediante los canales oficiales de comunicación y conforme a lo establecido en el Plan de Manejo de Tránsito, con el propósito de garantizar la seguridad de los usuarios y del personal que ejecuta las obras. A continuación, el equipo social presentó las actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan de Gestión Social del contrato, informando sobre las jornadas de socialización realizadas con la comunidad, la atención permanente a las inquietudes ciudadanas, el acompañamiento durante las actividades constructivas, la divulgación de información relacionada con el proyecto y las acciones adelantadas para fortalecer los canales de comunicación entre la comunidad y las entidades participantes. Finalizadas las intervenciones institucionales, se dio apertura al espacio de participación ciudadana, durante el cual los asistentes formularon diversas preguntas relacionadas con el alcance del proyecto, los criterios técnicos utilizados para la selección de los tramos intervenidos, las modificaciones efectuadas al diseño inicial, las condiciones de movilidad durante la ejecución de las obras, la construcción de obras de drenaje, la seguridad vial, la programación de actividades y la posibilidad de gestionar nuevas intervenciones sobre los sectores que no hacen parte del alcance contractual.

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	23/07/2026	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	3:00 p. m.	**HORA**	5:00 p.m.
LUGAR DE REUNIÓN:	Salón Comunal Vereda Bateas		
DEPENDENCIA:	Plan de gestión social		

Se continua con el espacio de preguntas y respuestas técnicas (Comunidad vs Entidades)

1: Sobre la construcción de cunetas, ¿se realizarán en toda la vía o solo en puntos específicos?
Respuesta (Interventoría/Contratista): Se realizarán 2.000 metros lineales de cunetas en concreto priorizadas en los puntos más críticos a nivel hidráulico para asegurar el drenaje. Originalmente no estaban contempladas en concreto, pero se modificaron para evitar que el tráfico pesado las destruya al orillarse.

2: ¿Existirá restricción vehicular tras la aplicación del tratamiento asfáltico?
Respuesta (Contratista): No habrá restricciones prolongadas. Con las nuevas máquinas gravilla doras y compactadores de llantas, los vehículos podrán transitar inmediatamente después de que se cubra el producto asfáltico, evitando largos cierres.

3: ¿Por qué la comunidad no fue consultada para elegir los tramos exactos y por qué se dejaron partes sin intervenir?
Respuesta (Alcalde): Los tramos fueron definidos bajo criterios técnicos y de diseño, buscando conectar tramos previos (como placas huellas existentes) para dejar corredores funcionales continuos. El presupuesto fijo no alcanzó para toda la longitud proyectada.

4: ¿Qué medidas se tomarán ante la pérdida/robo de materiales de obra (ej. 200 bultos de cemento)?
Respuesta (Alcalde): Se solicitó apoyo a la comunidad para evitar estos actos y denunciar formalmente con pruebas. Es imposible tener vigilancia policial las 24 horas y estos incidentes afectan directamente los recursos públicos de la región

5:La vereda 'La Cajita' aparece en la valla del proyecto pero no fue intervenida. ¿Por qué?
Respuesta (Alcalde/ICU): La Cajita cuenta con estudios y diseños para otro proyecto de pavimentación definitiva (Cumaca - Alto Palestino). Intervenirla con estabilización temporal incurriría en un detrimento patrimonial al tener que romper en el corto plazo para la pavimentación final.

6:¿Cómo se solucionará el flujo de agua al final de los tramos intervenidos para que no dañe la carretera destapada adyacente?
Respuesta (Técnicos): Se contempló la construcción de filtros y alcantarillas en los puntos de transición. Sin embargo, se recalcó que la comunidad tapona las cunetas al hacer entradas improvisadas a sus viviendas, lo cual desborda el agua sobre la vía.

7: Las pendientes superiores al 6% superan el límite técnico normal de la estabilización (ej. San Francisco). ¿Qué pasará allí?
Respuesta (Técnicos): Para las pendientes pronunciadas se ajustó la intervención. En esos tramos se utilizará asfalto en caliente en vez de emulsión, ya que ofrece mayor resistencia al desprendimiento provocado por la aceleración de los vehículos y será la única que tendrá cunetas a ambos lados.

8: ¿Por qué se redujeron los kilómetros de la obra y qué durabilidad tiene el proyecto?
Respuesta (Interventoría/ICCU): La reducción en longitud ocurrió porque los estudios indicaron que el suelo local no servía para la mezcla química, requiriendo añadir material externo con cargo al mismo presupuesto fijo. El proyecto cuenta con pólizas de estabilidad de 2 años, pero su diseño técnico y vida útil estimada ronda entre 8 y 10 años, condicionado al correcto mantenimiento de cunetas.

Una vez atendidas la totalidad de las preguntas e inquietudes formuladas por la comunidad y brindadas las respectivas aclaraciones, El presidente de la Veeduría Ciudadana agradeció la asistencia y disposición de los representantes de las entidades participantes, destacando la importancia de estos espacios de diálogo para fortalecer la comunicación entre la comunidad y las entidades responsables del proyecto. Asimismo, agradeció las explicaciones técnicas suministradas durante la reunión, las cuales permitieron aclarar las inquietudes relacionadas con el alcance de las obras, los criterios de intervención, las soluciones constructivas adoptadas y la ejecución del proyecto.





CONCLUSIONES

De atendió convocatoria de la administración municipal y el IDCU, dando espacio a la atención de inquietudes, destacando una amplia asistencia de comunidades no solo de la vereda Bateas, sino de otros sectores del municipio

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No quedan comprometidos.	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Gabriel Fernando Gaitan M.	gafegaitan@gmail.com	Presidente Veeduria
Luisa Isabella Celemin	apt.luisafernanda@gmail.com	
Edwin Jaime Suarez O.	[illegible]	
Juan Sebastian Sanchez Estrada	juansanchezestrada@outlook.com	
Luz Angela Sanabria IDCU	Subdirectora Caminos U.	
Guillermo Peña P.	Consorciovivgar@gmail.com	
Manuel Alberto Moreno R.	manuel.moreno@arquiconsultor.co	
Ethel Tatiana Perez S.	atnciudadana.sda@gmail.com	
Diana Bolaños.	atnciudadania.sda@gmail.com	
Maria Fernanda Quitian Rivera	Fernando.quitian@euroconsultsc.com	

ICCU	FORMATO		ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	REGISTRO DE ASISTENCIA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Componente Social

TEMÁTICA: Reunión Extraordinaria - Actividades de Obra Tibacuy

FECHA DE REUNIÓN: 23/07/2024 LUGAR: Salón Comunal - Vereda Bateas HORA INICIO: HORA FINAL:

	ASISTENTE	CARGO	AREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	Elsa Rincón Rodríguez	Tesorera JAC Piedranchita	Piedranchita - Tibacuy	—	3125658623	Elsa Rincon
2	Gerardo Riveros B.	Presidente	Jac Vereda Piedra Ancha	saripoge@gmail.com	3115530765	
3	Nicol Rincón	Vice Pte JAC	VEREDA PIEDRANCHA	—	3196928466	
4	HENRY BARRERO	PENSIONADO	PIEDRA ANCHA	REPEHENRYBARRERO@gmail.	3188314029	
5	Jorge Tomas Garcia Panqueva	Presidente	Piedranchita	jorgegarcia@gmail.com	3133349927	Jorge Garcia
6	Martha Liliana Ruiz	Presidente	Piedranchita	Martha Ruiz	3157730019	
7	Juan I. Barbosa G.	Comunidad	Bateas	—	3112036088	
8	Irma Salvador	comunidad	Bateas	—	3142325390	Irma Salvador
9	Ana Julia Raigoza	usuaria	Bateas Tibacuy	—	3125440591	Ana J R
10	Gildardo Quintero	Vice Pte	El Mango	—	3007335907	
11	Gloria Ferro	—	Bateas	—	3104259	
12	Maria Lugo	—	Bateas	—	—	
13	Wilmer Lozano	—	Mango	—	3118011000	
14	Abdon Moreno		Bateas		11323424	

OBSERVACIONES: T3222853180

ICCU	FORMATO		E6-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	REGISTRO DE ASISTENCIA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Comercio VICCFE 2021 - Gestión Social

TEMÁTICA: Reunión Extraordinaria - Actividades de obra Tibacuy

FECHA DE REUNIÓN: 23 Jul 26 LUGAR: Comunal Bateas HORA INICIO: HORA FINAL:

	ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
11	Adriana Tuvero	I.E.D Bateas docente	Bateas	ied_bateasOhotmail.com	3114705926	Adriana Tuvero
12	Edson Beltran	Comunidad	Bateas	edison.bb0918@gmail.com	3162901076	
13	V. Hugo Gzleano	JAC El Mango	El Mango	—	3006949113	
14	Cristian Camilo	Conductor	Bateas	+ —	3203972895	
15	Clara Inés Rincon S	Apoyo Secretaría Planeación	Bateas	sec.planeacion@tibacuy-cundinamarca.gov.co	3157345620	
16	DAVY ALEXANDER MAR	comunal	Albarracin	—	312-3117052	
17	Gabriel Guzeín	Presidente Vicepresidencia	La Vuelta / Ocobo	gafegamer@gmail.com	3504160761	
18	MAGNOLIA GONZALEZ	Vocal	LA CASITA	—	3143222677	
19	Geraldin Castancho	Concejala	Bateas	teristancho11-01-@gmail.com	3003588142	
20	Luisa Daniela Celemín	Presidenta JAC	Vda Bateas	apt.luisafernanda@gmail.com	3196276365	
21	Marlon Duvel Delgado	Vicepresidente	Vda Bateas	marlondelgado0@gmail.com	3213241813	
22	Oscar Rey	Comunidad	Bateas - Tibacuy	oirey@ut.edu.co	3106250560	
23	Sandra Jiménez	Tesorera JAC Bateas	Bateas - Tibacuy	sandra6823@hotmail.com	3117011823	

OBSERVACIONES:

ICCU	FORMATO		ES-MC-FR-02
	GESTION DE LA MEJORA CONTINUA		1
	REGISTRO DE ASISTENCIA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Comercio VIGGER 2021 - Gestión Social					
TEMÁTICA:	Reunión Extraordinaria - Actividades de obra Tibacuy					
FECHA DE REUNIÓN:	23jul26	LUGAR:	Salón Comunal	HORA INICIO:		HORA FINAL:

	ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
28	Rosendo Ruiz		Piedrancha Tibacuy	—	3163348594	Rosendo Ruiz
29	Gloria Evelyn López	Hogar	piedrancha tibacuy	gloriabdlito@hotmail.com	3202101960	Gloria López
30	José J. Díaz		piedrancha Tibacuy	—	3028341375	
31	Ramón Cadus		Bateas Tibacuy	—	3192759948	
32	ANARDELLY		Bateas Tibacuy	—	3142946138	ANARDELLY MOSQUERA
33	Sara Abelardo		Bateas Tibacuy	—	3203475792	Sara Abelardo
34	Julio Armando		Bateas Tibacuy	—	3142234510	Julio Armando
35	Ros Adelaida	Avitante	Piedra Ancha	—	3154997591	Ros Adelaida
36	Gabriel Vargas	Avitante	Piedra Ancha	—	1705789	Gabriel Vargas
37	Silvana Mosquera	Avitante	Bateas	—	3107524579	
38	[illegible]	Comunidad	BATEAS	—	3133437668	
39	[illegible]	comunidad	Bateas	—	3115155803	
40	[illegible]	Avitante	ELIGIO	—	3138069855	

OBSERVACIONES:

ICCU	FORMATO		ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	REGISTRO DE ASISTENCIA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Convenio YICGEE 2021 - Gestión Social

TEMÁTICA: Reunión Ciudadanía - Actividades de obra Tesalia

FECHA DE REUNIÓN: 23/01/26 LUGAR: B.C. Boteas HORA INICIO: HORA FINAL:

	ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
41	Floy Imelda Rey	hogar	Dorotario	—	3214158243	Floy Rey
42	Luis Triana		IU 209 U09	—	—	
43	Gladys Acosta	hogar	Piedra ancha	—	3106787738	
44	Hiryam Sanchez	Comunidad	Boteas	—	3132129859	
45	Oliva M. Cañizon		Boteas Tibacuy	—	3213717153	Oliva M
46	Ana Rosa Rodriguez	hogar	Boteas Tibacuy	—	3132419688	Ana Rosa Rodriguez
47	Luis Jaime Hernandez	Comunidad	Pedrancha	—	3108034152	
48	Ubaldina Lucia	Com. Trabajo	Piedra Ancha	—	3107556	
49	Gloria Edith	Tesorera	Vereda El Tranvia	—	3107335190	
50	Elisabeth Pelemin	hogar	Vereda Boteas	—	3022117653	Elizabeth Pelemin
51	Julian David Alvarado Castillo	Presidente JAC	Vereda San Luis y Chiyaya	jac.sanluischiyaya@gmail.com	3196208123	
52	Adrian Perez	ASOMADS	Vereda Boteas	—	3212095621	Adrian Perez

OBSERVACIONES:

ICCU	FORMATO		ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	REGISTRO DE ASISTENCIA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Consorcio VIGGR 2021 - Gestión Social

TEMÁTICA: Reunión Extraordinaria - Actividades de obra Tibacuy

FECHA DE REUNIÓN: 23 Jul 25 **LUGAR:** B. Comunal Bolívar **HORA INICIO:** **HORA FINAL:**

	ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
53	Manuel Moreno	ING RESIDENTE	TIBACUY	manuel.moreno@consorcioviggr.co	3128931004	
54	Guillermo Muñoz	PD6 Residente	Tibacuy	gmollw0006@gmail.com	3124664432	
55	Luz Angela Sarabia	Sub. ICCO	Tibacuy / ICCO		3108783224	
56	Juan Sanchez Estrada	Asesor	ICCU.	Juan.Sanchez@iccu.gov.co		
57	Angie Cortes Roa	Fac. Precios	Tibacuy / Adita		3123568179	
58	Edgar Javier Suarez C.	Alcalde	Tibacuy		3103265420	
59	Guillermo Müller M.	Concejal	Tibacuy.	gmollw0006@gmail.com	3124664432	
60	Diana Rojas	P SOC.	Consorcio VIGGR	atencionalciudadano.dol1406@	3147301934	

OBSERVACIONES:

	FORMATO		**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN		**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	27/07/2026	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	2:00 p. m.	**HORA**	3:30 p.m.
LUGAR DE REUNIÓN:	Polideportivo de la Institución Educativa Departamental de Jerusalén Sede el Roble		
DEPENDENCIA:	Plan de gestión social		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socializar con la comunidad el alcance técnico, constructivo, operativo y social del proyecto de mejoramiento vial, proporcionando información clara sobre las actividades de estabilización de la vía, obras de drenaje, construcción de cunetas, localización de los tramos a intervenir, diseño estructural, Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Se da inicio a la reunión de socialización de actividades de obra y PMT en el polideportivo de la institución educativa de la vereda el roble alto con la participación de la alcaldía , interventoría , contratista de obra y miembros de la comunidad. El residente de interventoría explico el proceso contractivo que será implementado para la ejecución del proyecto del mejoramiento vial, explicando de manera detallada cada una de las actividades contempladas en el alcance contractual. se informo que la intervención iniciara con el proceso de estabilización del suelo existente, mediante el escarificado del terreno natural hasta una profundidad aproximada de 17 centímetros, utilizando una moto niveladora equipada con sistema Ripper.Posteriormente,sobre la capa intervenida se aplicara una dosificación equivalente al 4% de cemento completada con estabilizador químico especializado seleccionado previamente de acuerdo con los resultados obtenidos en los estudios geotécnicos y y de laboratorio realizados sobre los diferentes tipos de suelo identificados en el corredor vial.

El ingeniería explicó que la función principal del estabilizador químico consiste en modificar las propiedades físico-químicas de los suelos arcillosos y limosos, reduciendo su capacidad de absorción de agua, incrementando su impermeabilidad y mejorando significativamente su capacidad portante y comportamiento estructural frente a las condiciones climáticas de la zona. Una vez finalizada la estabilización de la subrasante, se ejecutará la colocación de una capa de protección superficial mediante asfáltica en frío, cuya función estructural será preservar la capa estabilizada, aumentar la durabilidad del mejoramiento vial y proporcionar condiciones adecuadas de transpirabilidad. Adicionalmente, se presentó el alcance correspondiente a las obras de drenaje, las cuales contemplan la construcción de alcantarillas mediante excavación, instalación de tubería de polietileno de 36 pulgadas de diámetro, conformación de rellenos estructurales compactados por capas de aproximadamente 20 centímetros, con los respectivos controles de densidad, y la construcción de cabezales y estructuras de concreto para el adecuado manejo y conducción de las aguas superficiales.

Se informó que el proyecto contempla la construcción de aproximadamente 800 metros lineales de cunetas en concreto reforzado, cuya ubicación será definida mediante un recorrido técnico con la Alcaldesa para identificar los puntos críticos. La ubicación definitiva estará sujeta a la aprobación del especialista del proyecto. Durante la socialización se indicó que la meta física definitiva del proyecto corresponde a la intervención de 7,5 kilómetros de vía, distribuidos en diez (10) tramos estratégicamente seleccionados para garantizar la conectividad entre sectores previamente intervenidos mediante placa huella, favoreciendo así la continuidad del corredor vial. Así mismo, el equipo técnico presentó la localización de cada uno de los tramos a intervenir, especificando sus abscisas, longitudes y veredas beneficiadas, entre ellas La Libertad, San José, La Victoria, El Roble y El Trigo, información que permitirá a la comunidad identificar con precisión las zonas donde se desarrollarán las actividades constructivas.

Respecto a la capacidad estructural del pavimento, se explicó que el diseño fue realizado conforme a los criterios establecidos para vías terciarias, considerando el análisis del tránsito mediante el cálculo de ejes equivalentes de 8,2 toneladas, con un período de diseño aproximado de 15 años. Igualmente, se aclaró que el contrato contempla una garantía de estabilidad de dos (2) años, periodo durante el cual podrán identificarse oportunamente posibles comportamientos anómalos de la estructura vial. Se invita a la comunidad a realizar acompañamiento permanente durante la ejecución de las obras, verificando la correcta incorporación de los materiales especificados en el diseño, así como el cumplimiento de los procedimientos constructivos establecidos. Posteriormente, la Administración Municipal destacó la importancia del proyecto para el desarrollo del municipio, resaltando que Jerusalén fue uno de los municipios con mayor número de tramos aprobados dentro del programa de mejoramiento de vías terciarias financiado con recursos departamentales. En este sentido, se hizo un llamado a la comunidad para contribuir activamente con la conservación de las obras una vez finalizada su ejecución, mediante el mantenimiento periódico de cunetas, alcantarillas y demás obras de drenaje, evitando acciones que puedan afectar la vida útil de la infraestructura. En relación con la movilidad durante la construcción, se presentó el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), mediante el cual se informó que, con el fin de minimizar las afectaciones a la comunidad, se implementarán cierres parciales y controlados de la vía, priorizando la continuidad de la movilidad local durante el desarrollo de las actividades constructivas.

Finalmente, el componente social expuso los programas que hacen parte de la Gestión Social del proyecto, entre los cuales se encuentran: Información y Divulgación a la Comunidad, Actas de Vecindad, Vinculación de Mano de Obra Local, Atención a la Ciudadanía y Participación Comunitaria. Se explicó el alcance de cada uno de estos programas, los mecanismos de atención a la comunidad, los canales oficiales para la recepción de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSD), así como la implementación de jornadas de atención presencial y la realización de las actas de vecindad como mecanismo preventivo para registrar el estado inicial de las viviendas ubicadas en el área de influencia del proyecto.





CONCLUSIONES

Se atiende la solicitud de la administración municipal y se socializan las actividades de obra y PMT a la comunidad de la vereda Alto del roble.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No se adquieren compromisos	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Leidy Johana Riaño M.	Leidy.riano72@gmail.com	Leidy Riaño
Ingri Yd. Villalba C.	gestiondamunicipal@yopal-casanare.gov.co	Ingri Yd. V. C. Alcaldesa
Esther Tarazona Parra	atencionciudadania.cto.140@gmail.com.	Esther Tarazona Parra
Javier Arroyo Rolido.	javier.arroyo@aaraconsult.com.co.	
Hara Fernanda Quitian R.	Fernanda.quitian@euroconsult.co	Fernanda Q.

ICCU	FORMATO		EG-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	REGISTRO DE ASISTENCIA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Componente Social

TEMÁTICA: Socialización de actividades de Obra y PMT Vereda el Roble.

FECHA DE REUNIÓN: 24/07/2024 LUGAR: Polideportivo Institución Educativa HORA INICIO: 2:00 PM HORA FINAL: 3:00 PM

	ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
1	Andrea Cruz	Comunidad	Alto del Roble.	Andreacruzmoralez16@gmail.	3116047487	Andrea Cruz
2	Martha Ariza	deportes fs	Alto del Roble	Ariza santamaria martha@gmi	3102474900	
3	Monica Rodriguez	Comunidad	Alto del roble	— o — o —	3227326838	Monica Rodriguez S
4	Jose vidal Cardos	comunidad	Alto del Roble	— o — o —	3186639243	
5	JUAN DAVID	Comunidad	Alto del Roble	— o — o —	3227809332	JUAN DAVID
6	Rosalba Avendaño	Comunidad	Alto del Roble	— o — o —	3214040528	Rosalba Avendaño
7	Ismenia Mendoza Bautista	Comunidad	Alto del Roble	— — — —		Ismenia Mendoza
8	Johana Arenas Galindo	Comunidad	Alto del roble	— — —	321 2596279	
9	Alvaro Fonseca	comunidad	Alto del Roble	— o — o —	79.061206	Alvaro Fonseca
10	Luis Avila	comunidad	alto de Roble	Luis Avila	7997640	LUIS AZ
11	Pedro Alejo Melo casallas	Comunidad	Alto del Roble	— o — o —	3222756193	Pedro Alejo Melo casallas
12	Tibaldo Melo T.	Comunidad	Alto del Roble	— o — o —	322.732.4361	Tibaldo Melo T.
13	José Aurelio Torres	Comunidad.	Alto del Roble.	— o — o — o	3209978741	José Aurelio Torres

OBSERVACIONES:

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA REGISTRO DE ASISTENCIA		ES-MC-FR-02 1 2/11/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Componente Social
TEMÁTICA:	Socialización de actividades de obra y PMT vereda el Roble
FECHA DE REUNIÓN:	LUGAR: Polideportivo - Inst. Educativa HORA INICIO: 2:00 PM HORA FINAL: 5:30 PM

	ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
14	Rosaura Torres	Comunidad	Alto del Roble.	—	3104429130	RosauraTorres
15	Alfonso Mendoza.	Comunidad.	Alto del Roble.	—	3187708711	Alfonso Mendoza
16	Edgar Valero.	Comunidad	Alto del Roble.	—	3142766184.	Edgar Valero
17	Maria Santos Gomez	Comunidad.	Alto del Roble.	—	3203107961	María Santos Gomez
18	Maria Nel Prieto	Comunidad	Alto del Roble.	—	3124922510	Maria P.
19	Jane Gomez.	Comunidad	Alto del Roble.	—	3125925313	Jane G.
20	Ofelina Sarria	Comunidad	Alto del Roble.	—	3114573725	OfelinaS
21	Maria Rosario Veloza	Comunidad	Alto del Roble.	—	3159922287.	M. Rosario Veloza
22	Hector Fonseca.	Comunidad	Alto del Roble.	—	3159922287	Hector Fonseca
23	Leonidas Fandiño	Comunidad	Alto del Roble.	—	3102740637	LeonidasFandiño
24	Ilda Daza Castiblanco	Comunidad	Alto del Roble.	—	3202078850	IldaDaza
25	Javier Amaya.	Residen Inter	Alto del Roble	Javier.amaya@arcosit.com	3186575225	
26	Maria Fernanda Q.	INT.	Alto del Roble.	Fernanda.quitian@arcosit.sc.		Fernanda Quitian
27	Esther Tuñon Perez	Contratista	Alto del Roble	atnciudadania.cto1420@gmail.com	3137172664	Esther Tuñon Perez

OBSERVACIONES:

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA REGISTRO DE ASISTENCIA		ES-MC-FR-02 1 2/11/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:	Componente Social
TEMÁTICA:	Socialización de actividad obra - 9741 - Alto del Roble.
FECHA DE REUNIÓN: 27/07/2025	LUGAR: Salón Comunal Alto del Roble HORA INICIO: 2:00 pm HORA FINAL: 3:30 pm

	ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
28	Alexander Casallas	Comunidad	Alto del Roble	Alexandercasallas57@gmail	3108568719	Alexander casallas
29	Aldemar Fandiño	Comunidad	Alto del Roble.	—	3203354258	Aldemar Fandiño
30	Gilberto Mendoza	Veeduría	Alto del Roble.	—	3106606036	Gilberto Mendoza
31	Jose Humberto Mancipe	Vice Fiscal JAC.	Alto del Roble.	—	3212881618	J H Mancipe.
32	Francisco Diaz.	Comunidad	Alto del Roble.	—	3519863558	Francisco Diaz
33	Jose Abel Murcia G.	Comunidad.	Alto del Roble.	—	—	NO Firma.
34	Leonel Fandiño	independiente	Alto del Roble	—	3213101089	Leonel Fandiño
35	Rodrigo -	Rio	Alto del Roble	—	3227612537	Rodrigo
36	Daniel fandiño	independiente	Alto del Roble	3172259161	3172259161	[illegible]
37	J Humberto Mancipe	vice Fiscal	Alto del Roble	—	3212837618	J H Mancipe.
38	Jacinto Avendaño	independiente	Alto del Roble	—	3107636483	Jacinto Avendaño
39	Hector Dober Sanchez	tesorero	Alto del Roble	duberssanc79@gimail	3733870892	Hector Dober Sanchez
40	Rosalbina T.	Comunidad	Alto del Roble	—	3202253204	Rosalbina C.
41	Blanca Lucila Galindo	Comunidad	Alto del Roble	—	3138571833	Lucila Galindo
42	Johana Avendaño Galindo	Comunidad	Alto del Roble	avendanojohana@gmail.com	321 259 6279	[illegible]
43	Jose Abelardo Garcia	Fiscal	Alto Roble	OBSERVACIONES:	3134365232	Jose Abelardo Garcia

ICCU	FORMATO		ES-MC-FR-02
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		1
	REGISTRO DE ASISTENCIA		11/02/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Componente Social

TEMÁTICA: Socialización de actividades de obra y PMT Vereda el Roble

FECHA DE REUNIÓN: | LUGAR: | HORA INICIO: | HORA FINAL:

	ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
45	José Homero de Castellanos	Comunidad	Alto del Roble.	—o—o—o—o—	3188135306	Armando C9

OBSERVACIONES:

	FORMATO		**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA		**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE REUNIÓN		**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	27/07/2026	**ACTA No.**	
HORA DE INICIO:	4:00 p. m.	**HORA**	5:00 p.m.
LUGAR DE REUNIÓN:	Institución Educativa Departamental de Jerusalén Sede la Victoria		
DEPENDENCIA:	Plan de gestión social		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socializar con la comunidad el alcance técnico, constructivo, operativo y social del proyecto de mejoramiento vial, proporcionando información clara sobre las actividades de estabilización de la vía, obras de drenaje, construcción de cunetas, localización de los tramos a intervenir, diseño estructural, Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

La reunión dio inicio con el saludo de bienvenida a los asistentes y la presentación del equipo técnico y social responsable de la ejecución del proyecto. Se informó que el proyecto "Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse" es una iniciativa liderada por la Gobernación de Cundinamarca, a través del Instituto de caminos y construcciones de Cundinamarca (ICCU), con el acompañamiento de la interventoría y del Consorcio VICGER 2021 como contratista encargado de la ejecución de las obras. con el acompañamiento de la interventoría y del Consorcio VICGER 2021 como contratista encargado de la ejecución de las obras. Durante la socialización se presentó el alcance general del Contrato No. 140 de 2025, indicando que este hace parte de una estrategia de mejoramiento de la infraestructura vial rural en diez municipios pertenecientes a las provincias de Alto Magdalena, Sumapaz y Tequendama. Asimismo, se informó que el presupuesto global asignado para la ejecución del proyecto en las tres provincias asciende aproximadamente a $32.246.753.780 y que el municipio de Jerusalén cuenta con un alcance de intervención cercano a los 7,5 kilómetros, con una inversión aproximada de $5.160 millones.

Posteriormente, el equipo técnico explicó de manera detallada el proceso constructivo que será implementado para la ejecución del proyecto de mejoramiento vial. Se indicó que las obras iniciarán con la estabilización química del suelo existente, proceso que comprende el escarificado de la vía mediante motoniveladora equipada con sistema Ripper hasta una profundidad aproximada de 17 centímetros. Sobre el material intervenido se aplicará un aditivo químico estabilizante y cemento, los cuales serán mezclados y homogeneizados con el suelo existente conforme a los diseños obtenidos durante la etapa de estudios y caracterización geotécnica. Se explicó que, una vez finalizada la homogenización de los materiales, se realizarán controles de humedad y ensayos de calidad para garantizar que el material alcance las condiciones óptimas de compactación. Posteriormente, se ejecutará el proceso de conformación y compactación de la capa estabilizada y, finalmente, se instalará una carpeta de asfalto en frío con un espesor aproximado de 8 centímetros, obteniendo una estructura total de pavimento cercana a los 25 centímetros.

Durante la explicación técnica se resaltó que el diseño estructural de la vía fue elaborado con fundamento en los resultados de los estudios de tránsito, topografía y caracterización de suelos ejecutados durante las fases previas del proyecto, permitiendo establecer las especificaciones técnicas requeridas para garantizar el adecuado desempeño de la estructura vial durante su periodo de diseño. Igualmente, se informó que el proyecto contempla la construcción de seis alcantarillas nuevas, cuyas actividades incluyen excavación, conformación de cama de apoyo en material granular, instalación de tubería de polietileno de alta densidad de 36 pulgadas, rellenos controlados por capas compactadas, construcción de cabezotes, aletas y obras de protección en concreto reforzado con resistencia de 3.000 psi, así como la instalación del correspondiente acero de refuerzo. Se explicó que todas estas actividades estarán sujetas a controles permanentes de calidad mediante ensayos de laboratorio y supervisión de la interventoría.

De igual manera, se informó que el contrato contempla la construcción de cunetas en concreto reforzado con malla electrosoldada en los sectores considerados prioritarios para el adecuado manejo de las aguas superficiales, especialmente en las zonas donde serán construidas las alcantarillas. Se indicó que, debido a las limitaciones presupuestales, estas estructuras se ejecutarán únicamente en los puntos críticos previamente identificados mediante recorridos conjuntos entre la administración municipal, los líderes comunitarios y el equipo técnico del proyecto. Posteriormente, se socializó la distribución de los tramos objeto de intervención, indicando la ubicación de cada uno de ellos mediante su respectiva abscisa inicial y final, explicando que la selección de los sectores obedeció a criterios técnicos derivados de los estudios y diseños desarrollados durante las etapas iniciales del contrato y procurando beneficiar equitativamente a las diferentes veredas incluidas dentro del corredor vial. El residente de interventoría informó que las obras cuentan con una garantía contractual de dos (2) años posteriores a su entrega y precisó que la vida útil proyectada de la estructura del pavimento, de acuerdo con los diseños elaborados, oscila entre diez (10) y quince (15) años, siempre que se realicen las actividades de mantenimiento correspondientes.

Durante el espacio de participación ciudadana se atendieron y resolvieron las inquietudes presentadas por la comunidad, relacionadas con la ausencia de señalización vial dentro del alcance contractual, la capacidad estructural de la vía para soportar el tránsito de vehículos de carga, el ancho proyectado de la calzada, los posibles cierres viales durante la ejecución de las obras, el cronograma de intervención, las actividades de limpieza de las alcantarillas existentes, la profundidad del proceso de estabilización del suelo y las recomendaciones para la instalación de futuras acometidas domiciliarias de servicios públicos antes de la ejecución de la carpeta asfáltica. En relación con las actas de vecindad, cuatro residentes manifestaron que en sus predios no se realizó el correspondiente levantamiento. Frente a esta situación, se informó que se programará un recorrido de verificación conjunto entre los componentes técnico y social, con el propósito de validar si dichos predios se encuentran dentro del área de influencia directa del proyecto. En caso de confirmarse su inclusión y de ser procedente, se realizará de manera inmediata el levantamiento de las respectivas actas de vecindad, conforme a los procedimientos establecidos para la ejecución del contrato.

Finalmente, el equipo social reiteró a la comunidad la disponibilidad de los canales oficiales de atención para atender inquietudes, solicitudes, peticiones o requerimientos relacionados con la ejecución del contrato, invitando a los asistentes a mantener una comunicación permanente con el contratista y la interventoría, así como a participar activamente en el seguimiento y acompañamiento del desarrollo del proyecto.

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	SS-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2023

FECHA DE REUNIÓN:	27/09/2024	ACTA No.	
HORA DE INICIO:	4:00 PM	HORA FINALIZACIÓN:	5:00 PM.
LUGAR DE REUNIÓN:	Institución Educativa departamental Sede la Victoria		
DEPENDENCIA:	Plan de Gestión Social		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Socializar con la Comunidad el alcance tecnico constructivo, operativo y social del proyecto de mejoramiento vial, proporcionado información clara sobre las actividades de estabilización de la vía, Obras de drenaje, Construcción de cunetas, Localización de los tramos a intervenir, diseño estructural, y PMT.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN





CONCLUSIONES

Se atendio la Solicitud de la administración Municipal y Previo a inicio de actividades de obra se realiza reunión extraordinaria en la Vereda La Victoria y se informa a la Comunidad el proceso de estabilización con las nuevas tecnologías y el PMT que se implementara durante la Intervención

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
No se adquirieron Compromisos durante este Espacio de reunión.	

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELECTRONICO	FIRMA
Ing. M. Villabac.	alcaldia@presidentecundinamarca.gov.co	Alcaldesa.
Javier Arroyo	javier.arroyo@eurovialcol.com	
Hana Fernanda Quitian	fernanda.quitian@eurovialcol.com	Fernanda.
Esther Toñon Perez	atencionciudadana.ctol1@gmail.com	Esther Toñon P.
Marco Antonio Huertas Cruz	marcoantonio@huertascruz.com.co	

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA REGISTRO DE ASISTENCIA		ES-MC-FR-02 1 2/11/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Componente Social

TEMÁTICA: Socialización de actividades de obras y PMT - Vereda la Victoria

FECHA DE REUNIÓN: 27/07/2025 LUGAR: Institución Educativa La Victoria HORA INICIO: 4:00PM HORA FINAL: 5:00 pm

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
Cajas S.A.S	ADRITOR	LA BITORIA	—	3172958	
Leydi Martinez	Hogar	Victoria	—	3109604136	
Sandra Yanneth Cortes	Hogar	la victoria	—	3106184085	
Blanca Edith Lopez	fiscal JAC	la victoria	—	3116966707	
Miguel Angel Sanchez	Estudiante	la victoria	—	3202384692	
Evangelista Abril	concejal	La victoria	—	3202384692	
Carolina Vargas	Hogar	la Victoria.	—	3138328817	
Rosario Suarez	Hogar	La Victoria	Vice Presidente	3124125013	
Ana Lucia Martinez	Agricultora	la victoria	fiscal	3197334269	
FABIO SANCHEZ B	AGRICULTOR	LA VICTORIA	—	3108758460	
[illegible]	[illegible]	LA VICTORIA	—	3102258	
Maria elena Gaia		La victoria.	—	3108872357	
María Rachel García	—	La victoria	—	3273260725	
Ignacio Mancipe	—	La Victoria	—	3106493622	
Alivio Bocanegra	agricultor	la Victoria	—	2086808 6	

OBSERVACIONES:

ICCU	FORMATO GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA REGISTRO DE ASISTENCIA		ES-MC-FR-02 1 2/11/2025

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD: Componente Social

TEMÁTICA: Socialización de actividades de Obra y PMT. Vereda La Victoria

FECHA DE REUNIÓN: 21/07/2025 LUGAR: Institución Educativa La Victoria HORA INICIO: 4:00 pm HORA FINAL: 5:00 pm

ASISTENTE	CARGO	ÁREA/MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO TELEFÓNICO	FIRMA
Marco A. Ortiz	Porcicultor	Jerusalén	— o — o —	3214462549	Marco A Ortiz
David Alejandro Suarez Suaza	Agricultor	Jerusalén	— o — o — o	3134585645	David Alejandro Suarez Suaza
Alfonso Sánchez	agricultor	Jerusalen	— o — o — o	3143417652	Alfonso Sánchez
Ing. M. Villalba	Alcaldesa	Jerusalén	— o — o — o	3165856499	Ing. M.V.C.
Maria Fernanda Quitian	SO. INT	la victoria.	Fernanda.quitian@Eucaris.T.	3125865571	Fernanda Quitian.

OBSERVACIONES:

Información Tequendama

Iniciamos actividades de obra en la vía del Municipio de Anolaima Km 0+00 a K1+600 aproximadamente

Volante: 56 Actas de vecindad Fecha: 3/07/2026 Provincia Tequendama/Anolaima

Señores
Propietarios y/o Arrendatarios
Ref.: Levantamiento de Acta de Vecindad – Primera visita

Previo al inicio de las actividades de mejoramiento, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU - a través del contratista encargado de esta obra Consorcio Vicger 2021 y la firma Interventora ECG Ingeniería S.A.S, realizarán el **Levantamiento de Acta de Vecindad en los predios ubicados en el área de influencia del proyecto.**

Esta actividad consiste en una evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica; las condiciones actuales de los mismos antes del inicio de las obras y una vez finalizadas las mismas.

El Acta de Vecindad le servirá al propietario como soporte técnico en caso que exista alguna afectación en los predios durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del contratista. Para adelantar la actividad se requiere la presencia de los propietarios, arrendatarios y/o encargados de los predios, así como su acompañamiento y autorización de ingreso al inmueble al momento de levantar el acta.

Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere la entrega de documentos del predio. De no poderse realizar, se programará una nueva visita al predio. Una vez cumplida la programación, y de no poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.



Entre el 9 de julio y el 17 de julio de 2026
De Lunes a viernes

Profesionales que realizarán la actividad	
Personal Técnico	**Personal Social**
Ingeniero Civil / Sebastián Ovalle	Trabajadora Social: Esther Tuñón



9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Para mayor información sobre el Contrato ICCU 140 de 2025:

Comunicarse mediante el Correo electrónico atnciudadania.cto140@gmail.com o móvil y WhatsApp 3147301734

Gobernación de Cundinamarca | ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

CONTRATO No.:	FORMATO PLANILLA DE ENTREGA DE VOLANTES	ICCU
Hoja ___ de ___		
FECHA	GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA	
04 09 25		
DD MM AA		

CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTES

PROYECTO

"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUE CRECE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

TIPO DE PIEZA

Volante 56 Actos de Vecindad - Mesitas del Caballero - Anolaima

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN Y/O PREDIO	MUNICIPIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Jose Lecio Bolivar	Mesitas del Caballero	Anolaima	3132498649		
2	Jose Manuel Borges	Mesita del Caballero	Anolaima	3133844837		
3	Maria Leonor	Mesitas del Caballero	Anolaima	516543704		
4	Miguel Suarez	Mesitas	Anolaima	3123633204		
5	Alexander Diaz Posada	Mesitas del Caballero	Anolaima	3148558338		
6	Hector Samora	Mesitas del Caballero	Anolaima	3108896708		
7	Jose Salvador	Mesitas del Caballero	Anolaima	3125247889		
8	Angel Nolasco	Mesitas del Caballero	Anolaima	3118421956		
9	Maria Elsa Mesitas	Mesitas del Caballero	Anolaima	3112466582		
10	Hugo Iago Martinez	mesitas del caballero	Anolaima	3123458440		
11	Jose Patricio Sandoval	Mesitas del Caballero	Anolaima	5152804547		
12	Elsa Velasco	Mesitas del Caballero	Anolaima	3108021648		
13						
14						
15						
16						

ELABORÓ: Diana Esperanza Bojacá L.
Profesional Trabajadora Social UMC (Nombre)
MP. 08119 5212

APROBÓ: _____

3 jul

Powered by CamScanner

Información Tequendama

Iniciamos actividades de obra en la vía del municipio de El Colegio vereda el Paraíso entre los Km 0+000 al Km 1+100

Volante: 57/Actas de vecindad Fecha: 14/07/2026 Provincia Tequendama/ El Colegio

Señores
Propietarios y/o Arrendatarios
Ref.: Levantamiento de Acta de Vecindad de inicio – Primera visita

Previo al inicio de las actividades de mejoramiento, el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca – ICCU - a través del contratista encargado de esta obra Consorcio Vicger 2021 y la firma Interventora ECG Ingeniería S.A.S, realizarán el **Levantamiento de Acta de Vecindad en los predios ubicados en el área de influencia del proyecto.**

Realizaremos una segunda visita para la evaluación externa e interna del estado de los inmuebles registrando de manera escrita, fotográfica y fílmicas sus condiciones actuales, antes del inicio de las actividades de obra, teniendo encuentra que no se localizo a nadie en el predio durante las primeras visitas

Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias y/o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización de ingreso.
En caso de haberse realizado dos visitas sin encontrar a la persona responsable del predio, se procederá a solicitar el acompañamiento del presidente de la Junta de Acción Comunal, la Personería, miembros del comité de participación ciudadana, u otra entidad pertinente, para el levantamiento del acta de vecindad de fachada. En el formato del acta se deberá indicar que, a pesar de haberse efectuado dos visitas, no fue posible ubicar a la persona propietaria, razón por la cual no se pudo verificar el estado estructural del predio .

Este procedimiento también aplica en los casos en que las personas propietarias se nieguen a permitir el ingreso al predio o la elaboración del acta de vecindad, dejando constancia de que no se autorizó el acceso y, en consecuencia, no fue posible corroborar el estado físico y estructural inicial del predio, por lo que únicamente se levantará acta de fachada.

Entre el 17 al 29 de Julio de 2026
De Lunes a viernes

9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Profesionales que realizarán la actividad	
Personal Técnico	**Personal Social**
Cuadrilla 1 Ingeniero Civil / María Rocha	Trabajadora Social Esther Tuñón
Cuadrilla 2 Ingeniero Civil / Juan Ovalle	Trabajadora Social/ Diana Bojacá

Para mayor información sobre el Contrato ICCU 140 de 2025:

Comunicarse mediante el Correo electrónico atnciudadania.cto140@gmail.com o móvil y WhatsApp 3147301734

Gobernación de Cundinamarca | ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Reunión

Inicio de obra

Invitamos a la comunidad y lideres a participar en la reunión extraordinaria en la cual se darán a conocer los tramos a intervenir por parte del proyecto:

"Intervención de las vías que conformarán el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse, en el departamento de Cundinamarca".

Contrato ICCU No.140-2025

En este espacio se presentarán información general sobre las actividades a desarrollar, alcance del proyecto, los tramos a intervenir y los canales de atención a la ciudadanía.

Para mayor información comunicarse a lo siguientes canales de atención:

Correo electrónico: atnciudadania.cto140@gmail.com

Línea de atención con WhatsApp **314 730 1734**

Lunes
27 de julio
2: 00 p.m.

Lugar: **IED Nacionalizado de Jerusalén sede El Roble**

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA



Volante: 58 Reunión extraordinaria Fecha: 22/07/2026 Provincia Alto Magdalena / Jerusalén

CONTRATO No.:	FORMATO PLANILLA DE ENTREGA DE VOLANTES	ICCU
Hoja ___ de ___		
FECHA: 27 Julio 2026 (DD MM AA)	GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA	

CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTES

PROYECTO

"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

TIPO DE PIEZA

Volante 38 - Convocatoria Socialización PMT.

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN Y/O PREDIO	MUNICIPIO	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Leidy Johana Riaño M	Alto del Ado	Fusagasuga	3143763766	Leidy Riaño	
2	Andrea Cruz	Alto del Roble	Jerusalen	3115047487	Andrea Cruz	
3	Martha Ariza	Alto del Roble	Jerusalen	3102474900		
4	Luz Marina Vaca Moreno	Alto del Roble	Jerusalen	3203074458		
5	Cristian esteban Riano	Alto del Roble	Jerusalen	3103448725		
6	Orfelina Sarria	Alto del Roble	Jerusalen	3114673726		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ELABORÓ:
(Firma) Esther Fonón
(Nombre) Esther Fonón

APROBÓ:
(Firma)
(Nombre)

Powered by CamScanner

Reunión

Extraordinaria

Invitamos a la comunidad y lideres a participar en la reunión extraordinaria con los profesionales del ICCU, en la cual se atenderán las inquietudes de la comunidad frente al proyecto:

“Intervención de las vías que conformarán el programa de caminos vecinales, caminos para quedarse, en el departamento de Cundinamarca”.

Contrato ICCU No.140-2025

Esperamos contar con su asistencia

Para mayor información comunicarse a lo siguientes canales de atención:

Correo electrónico: atnciudadania.cto140@gmail.com

Línea de atención con WhatsApp **314 730 1734**

Jueves
23 de julio
2: 00 p.m.

Lugar: **Salón comunal Vereda Bateas.**

Gobernación de Cundinamarca

ICCU
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA



Volante: 59 Reunión extraordinaria Fecha: 17/07/2026 Provincia Sumapaz / Tibacuy

ANEXO 3:

SUBPROGRAMA DE MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025

FECHA (Día / Mes / Año): 4-01-26

Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento:** Cundinamarca	**Municipio:** Jerusalén	**Vereda:** Alto del trigo	**PR:** Km 23+500	
Dirección:	Virgen en la "Y" Km 23+500		**Teléfonos:**	3227798 41	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yamile Nasayo Cuchabe			**CC No.**	1032788478
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				NA
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				**CC No.**	
Edad de la construcción	NA	No. de Apartamentos	NA	No. de pisos	NA
No. de Hogares	NA	No. total residentes	NA	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				Ondulado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cuál? NA

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Seguridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro Cuál? NA	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [ ] NO [X]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Cristian Henao	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: CC 1018 [illegible] 287	Matrícula profesional No.:
		Testigo: Yamile Nasayo C.
		C.C. O NIT: Yamile Nasayo Cuchabe 1032788478

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MAGPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐	
2. Vigas corridas	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Caissons	☐	
5. Concreto ciclópeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☐	
8. No identificada	☐	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cual? N/A		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cual? N/A	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cual? N/A	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual? N/A	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual? N/A	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cual? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Vivienda rectangular apoyada en una pared de Concreto vigas metalica, Cubierta en teja de eternit sin afectacion en buen estado. Cuenta una Obra de drenaje pluvial

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO ☐		REGULAR ☐		MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Colaborativo VICODER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MIGEPS-MN-IN-SAPP-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARTE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	(Día / Mes / Año) 21 04 26
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento / Cierre	

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se pueden insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo de líderes de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el espacio previsto en el formato Acta de Vecindad.

Consorcio VIOGEN 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

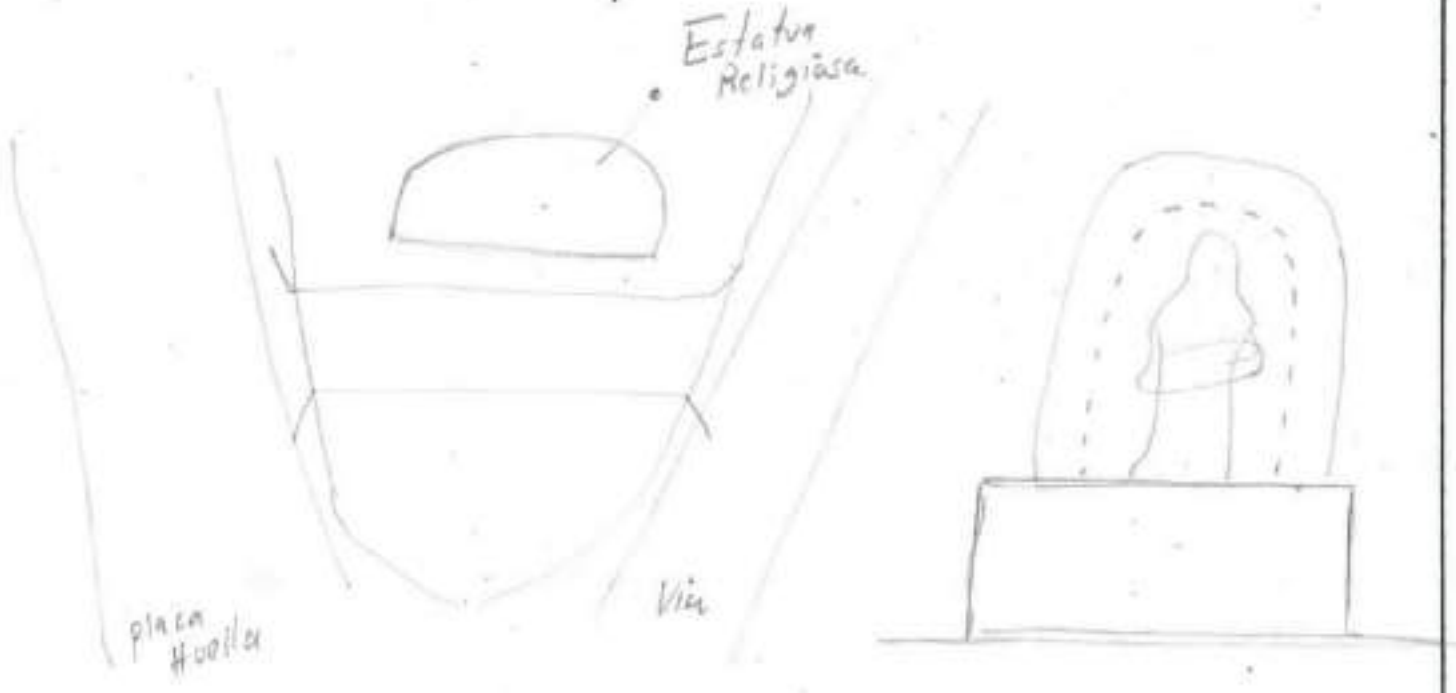

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: CC 1018508217	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: Yamile Nasayo Cadavid CC 1023960478

Consorcio VICDER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 21 07 26
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Jerusalén	Vereda: Alto del Trigo	PR
Dirección	Vía 23+650 lado derecho		Teléfonos	3606096755
Nombre de la persona que atiende la visita: Juan Francisco Rodriguez Ospina			CC No.	1076621506
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No.	1076621506

Edad de la construcción	NA	No. de Apartamentos	NA	No. de pisos	NA
No. de Hogares	NA	No. total residentes	NA	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No	NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	Ondulado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje

SI ☒ NO ☐

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Cristian Henao	Nombre:	Nombre: Juan Francisco Rodriguez
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 1010250284	Matrícula profesional No. 15 202 1569	C.C. O NIT: 1076621506.

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? N/A		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? N/A		5. Otro. Cuál? N/A		17. Otro. Cuál? N/A		7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones: Solo se nota terminado del area externa de la fachada

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Esta vivienda predio de 2 viviendas / Fondo en mampostería Pañete y pintura, una de las viviendas tiene perfilería metálica y teja en madera, se evidencia una habitación en mampostería con ladrillo a la vista en cuanto a presencia de grietas y fisuras

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso en terreno natural / no se evidencian Andenes

ESTADO DE CERRAMIENTOS: N/A								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Consorcio VCGBR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL, Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MSSPS-MIL-ILS-FR-1
		VERSION	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2023	Contrato de Interventoría No. 218 / 2023	Acta de Vecindad de Seguimiento: — 8	(Día / Mes / Año) 21 / 7 / 26

REGISTRO FOTOGRAFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página anterior, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional técnico, no fueron tenidas en cuenta en el recuadro propuesto del formato Acta de Vecindad.

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

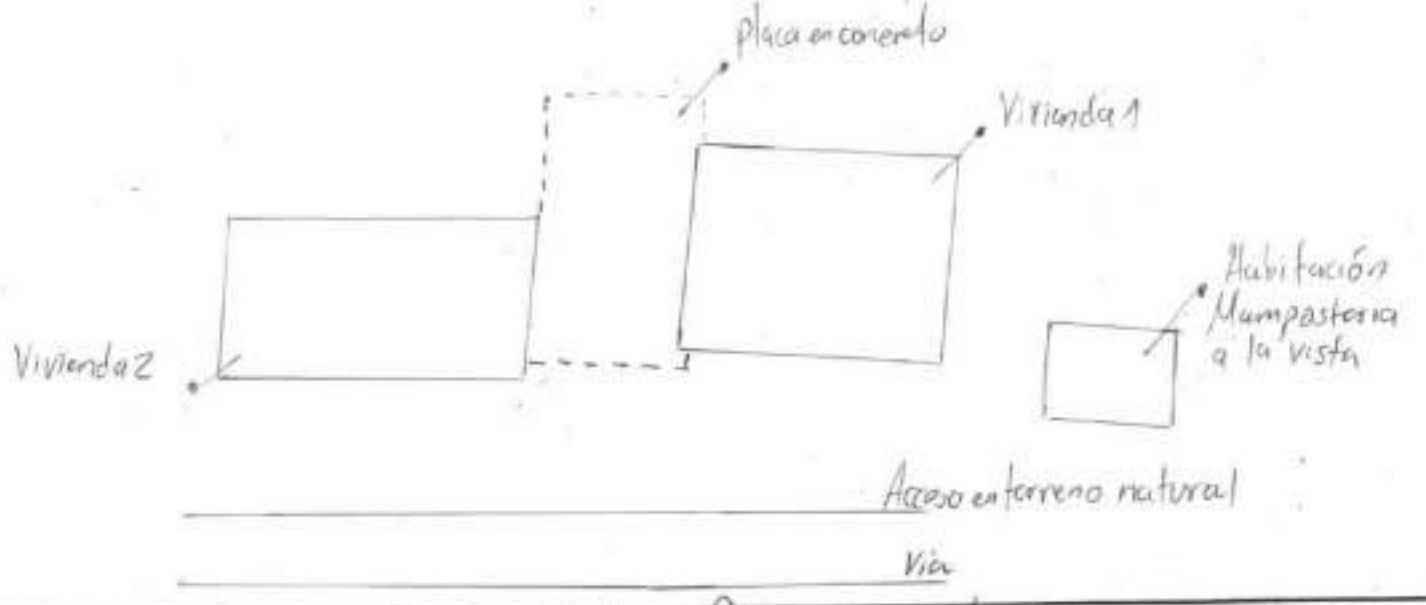

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. CC 1018505228	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. 25252-[illegible]	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	Juan Francisco Rodriguez 1076621506	

Consorcio VICCER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 21 07 25
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Tena	Vereda: Alto del Trigo		PR
Dirección:	KM23+650 Lado izquierdo		Teléfonos:	3227719841	
Nombre de la persona que atiende la visita: Yamile Nasayo Cuchabe				CC No. 1033788478	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				NA
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	
Edad de la construcción	NA	No. de Apartamentos	NA	No. de pisos	NA
No. de Hogares	NA	No. total residentes	NA	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	ondulado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Cristian Herrera	Nombre:	Nombre: Yamile Nasayo C.
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No: 1010250287	Matrícula profesional No: 15.202.16.1869	C.C. O NIT: 1033788478

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-PI-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	2

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? N/A		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paredes en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? N/A		6. Otro. Cuál? N/A		17. Otro. Cuál? N/A		7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones: Sob. se tuvo levantamiento del area de la fachada.

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fachada en prefabricado, teja termica y ventaneria en malestado

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se evidencian andenes, Acceso en terreno natural, se evidencia un poste de luz sin cable.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☒
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en alambre de pua y posteria en madera en mal estado

Transcribe VRCSAM 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL CUSTODIA AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS ANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES EL CAMBIO ESTÁN CAPTURAR EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	FECHA	
Contrato de Obra No. [illegible]	Contrato de Interventoría No. [illegible]	Acta de Vecindad de Seguimiento	Hoja 3 de 4

REGISTRO FOTOGRAFICO










Notas:

Convenio VICIER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-MI-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

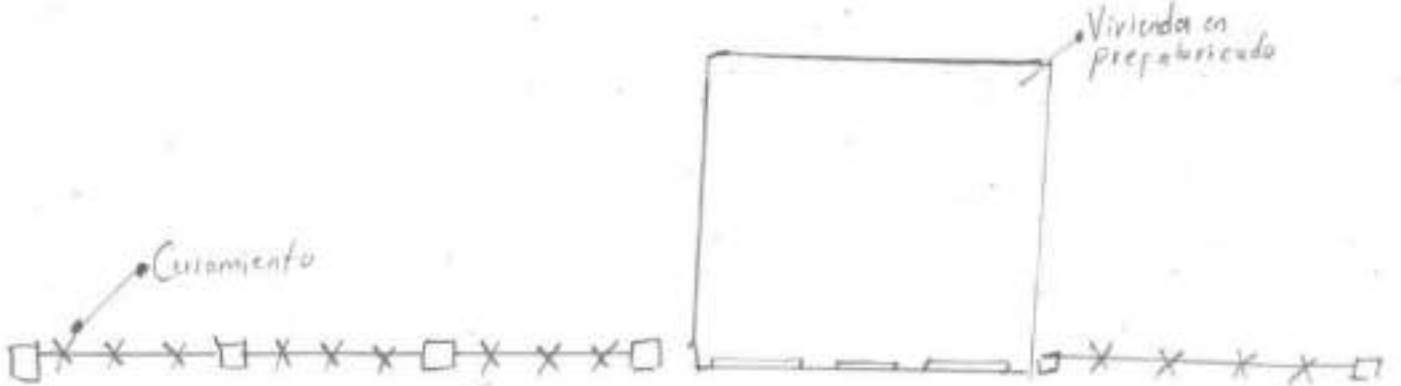

Acceso en terreno Natural

Vía

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Cristian Henao Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: [illegible]	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: [illegible]	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	Camile Nasayo C. Camile Nasayo Cedula de Ciudadanía No. 39 788478	

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025
Acta de Vecindad de	**Inicio** ☒ **Seguimiento** ☐
FECHA (Día / Mes / Año)	17 07 26

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**	
	Cundinamarca	Arbeláez	Alto del Trigo		
Dirección	KM23+700 Lado derecho		**Teléfonos**	3125507917	
Nombre de la persona que atiende la visita:	María Rosalba Sánchez López			**CC No.**	20662780
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				Propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	José Alvarez			**CC No.**	
Edad de la construcción	2 años	**No. de Apartamentos**	1	**No. de pisos**	1
No. de Hogares	NA	**No. total residentes**	NA	**Mujeres jefes de hogar**	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	**Adultos mayores (más de 60 años)**	NA	**Personas en situación de discapacidad**	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				ondulado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	Si ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Cristhian Henao	Nombre	Nombre
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: CCI0252125424	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	2

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐	
2. Vigas corridas	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Carsons	☐	
5. Concreto ciclópeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☐	
8. No identificada	☐	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cuál? N/A		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paneles en madera	☐
11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Madu	☐
17. Otro. Cuál? N/A	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia Casa en Mampostería Sin Pañete, teja termica y estructura en perfileria metalica, Ventanas con vidrios especialmente en buen estado

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Mampostería a la vista

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso no se evidencia andenes, Acceso en terreno natural y Placa en concreto

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Postes en madera y lineas de alambre Puas en mal estado

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

PROYECTO REGIONAL CENTRO AMBIENTAL, SOCIAL, PRODAL Y DE FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS MENORES DE INFRAESTRUCTURA VIAL PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO: [illegible]

VERSIÓN: 1

PÁGINA: 3

OBJETO DEL PROYECTO: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VEREDALES, CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE SABANETA, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

FECHA:

Contrato de Obra No. ICCU-181-2020

Contrato de Interventoría No. 212-2020

Acta de Vecindad de Terminación: Inicio

2020-11-26

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. El número de registros debe estar ordenado consecutivamente de acuerdo a la cantidad de fotografías tomadas.

2. El Acta de Vecindad es un documento técnico que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y de la Interventoría, con el apoyo administrativo de la entidad territorial.

3. Si fuere necesario, se podrá anexar una página extra de observaciones, que a juicio del profesional idóneo, no fueron incluidas en alguno de los campos propuestos del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICGIR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

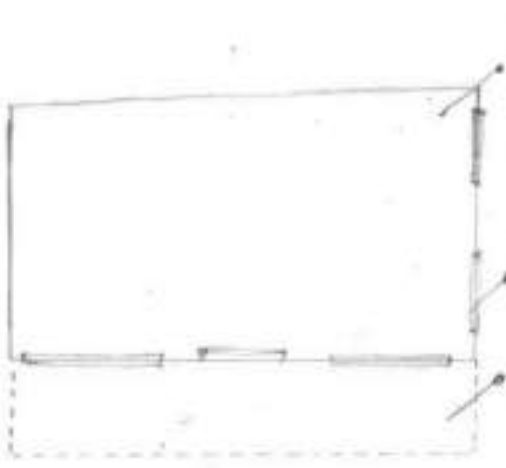

FIRMAS

Firma
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: CC 1018501278

Firma
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 15 102 569

Firma
Nombre Testigo: Maia Rosalba Sánchez Pinzón
C.C. O NIT: 20.662.780

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025

FECHA (Día / Mes / Año): 21 07 25

Acta de Vecindad de — **Inicio** [X] **Seguimiento** [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento:** Cundinamarca	**Municipio:** Pandi	**Vereda:** Alto del Trigo	**PR:**	
Dirección	KM 26+700		**Teléfonos**	3125507912	
Nombre de la persona que atiende la visita: María Rosalba Sánchez López.			**CC No.**	20.662.280	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción: María Rosalba Sánchez López.			**CC No.**	20.662.280.	
Edad de la construcción	40 años	**No. de Apartamentos**	1	**No. de pisos**	1
No. de Hogares	1	**No. total residentes**	3	**Mujeres jefes de hogar**	1
Niños (menos de 14 años)	0	**Adultos mayores (más de 60 años)**	1	**Personas en situación de discapacidad**	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			Rural	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			Terminada	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No			Si	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			Ondulado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [X] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Cristian Henao
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 2520185257

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 15.422.[illegible]

Firma
Nombre: María Rosalba Sánchez López
Testigo
C.C. O NIT: 20.662.280

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-SI-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados eh concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mamposteria confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mamposteria reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mamposteria no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? N/A		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No aplica	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? N/A		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paredes en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? N/A		8. Otro. Cuál? N/A		17. Otro. Cuál? N/A		7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: fachadas en mamposteria, pared, teja teminica apoyada en perfileria metalica, se evidencia tejas en buen estado, ventaneria en buen estado con vidrios, se evidencian unas estuchas rellenas pisos en concreto presenta de fisuras.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Apoyadas en Mamposteria con pared. Se evidencia una ventana con marco metalico, fisura vertical por la zona de la ventana, fachada lateral derecha, el vidrio de la ventana se encuentra en buen estado fachada lateral izquierda en iguales condiciones que la derecha.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se evidencia andenes, acceso en terreno natural en buen estado y en dos direcciones de salida para la casa

ESTADO DE CERRAMENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	X	MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en cerca viva

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS NIVEL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO

VERSIÓN 1

Página 3

OBJETO DEL PROYECTO

FECHA

Contrato de Obra No. [illegible] - 2025

Contrato de Interventoría No. [illegible] - 2025

Acta de Vecindad de Seguimiento

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:


1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página relacionada, se deben relacionar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y Interventoría con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. Si fuera necesario, se podrá incluir una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional idóneo, no hacen parte integral de este Acta de Vecindad.

Convenio VICOMER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	4

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

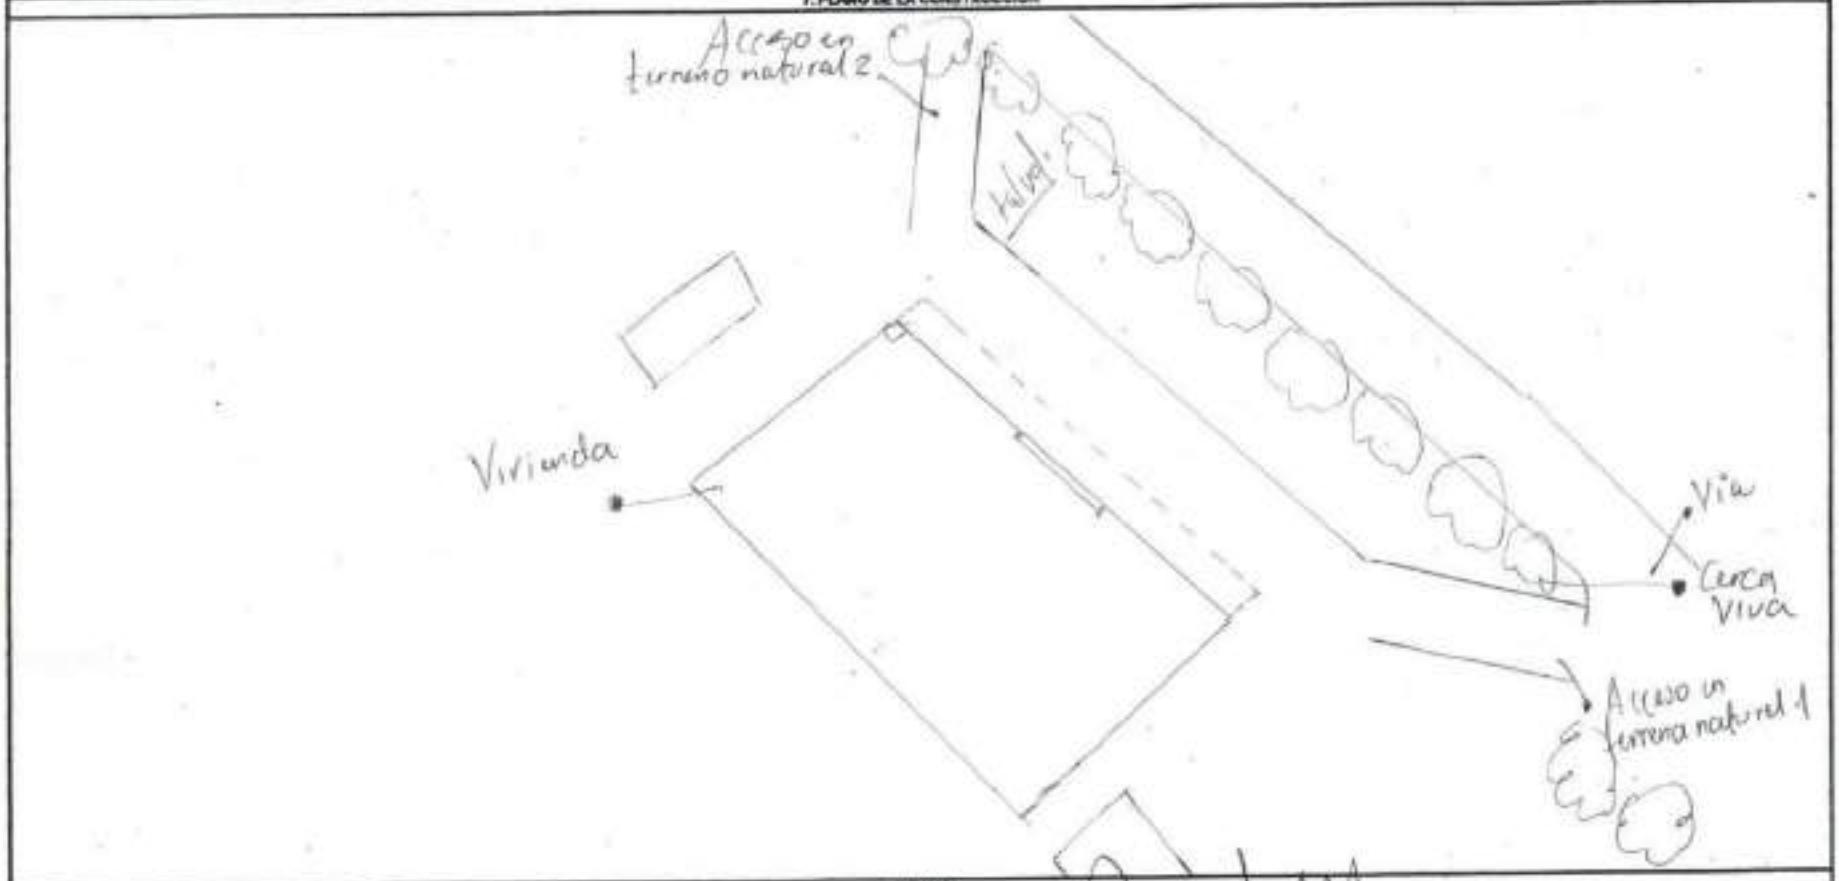

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: CC 1018505287	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 25202-261589	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: 70.662.280

Consorcio VICBER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA (Día / Mes / Año)	24 of 26

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	**Acta de Vecindad de** Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento**	**Municipio**	**Vereda**	**PR**	
	Cundinamarca	Pandi	Alto del Trigo		
Dirección	KM 23+750 Lado derecho		**Teléfonos**	322779641	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yamile Nasayo Achabe			**CC No.**	1023788478
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				**CC No.**	
Edad de la construcción	NA	No. de Apartamentos	NA	No. de pisos	NA
No. de Hogares	NA	No. total residentes	NA	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			Rural	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No			NO	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			ondulado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☒	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Cristian Honcad	Nombre:	Nombre Testigo: Yamile Nasayo C.
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Yamile Nasayo Achabe
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: CC 1018505784	Matrícula profesional No.: 15202413649	C.C. O NIT: 1023788478.

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PAGINA	2

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:

1. Zapatas	☐		
2. Vigas corridas	☐		
3. Sistema mixto	☐		
4. Cassions	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐		
6. Pilotes	☐		
7. Placa de cimentación	☐		
8. No identificada	☐		
9. No existe	☐		
10. Otro. Cuál?	N.A.		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál? N.A.	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
8. Otro. Cuál? N.A.	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paredes en madera	☐
11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐
12. Muros en baharaque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál? N.A.	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál? N.A.	

Observaciones: Solo se hizo levantamiento del area estimada de la fachada

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Teja en, zinc, puertería en madera en mal estado, se evidencia columnas en concreto reforzado y Puertería en madera.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso en terreno natural, no se evidencia andenes

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento madera en mal estado

Consorcio VICOBR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO REGIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MAIPG-MN-INT-FR-4
		VERSION	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA SOLIDARSE EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	
Contrato de Obra No. XCC-141-2023	Contrato de Interventoría No. 216-2023	Acta de Vecindad de Registrando	(Día / Mes / Año) 09 04 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del profesional técnico, no fueron tenidas en cuenta en el siguiente procedimiento del formato Acta de Vecindad.

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

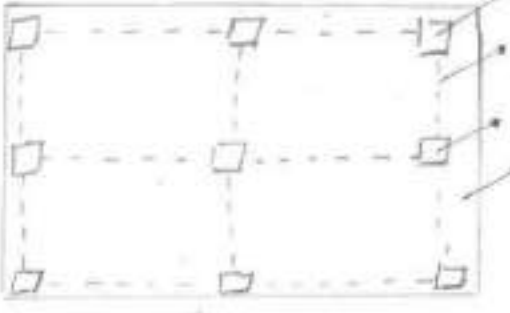

Acceso Natural xxx

Via

FIRMAS

Firma: Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma: Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 1110185227	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15 02 [illegible]	Firma: Nombre: Yamile Nasayo C. Testigo: Yamile Nasayo Cachimbo C.C. O NIT: 1023780478

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025
Acta de Vecindad de	**Inicio** ☒ **Seguimiento** ☐
FECHA (Día / Mes / Año)	4 09 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento** Cundinamarca	**Municipio** Jerusalén	**Vereda** Alto del trigo	**PR**	
Dirección	KM 24+325	lado derecho	**Teléfonos**	3103241646	
Nombre de la persona que atiende la visita: Rodrigo Medrano				**CC No.** 11.315.780	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Rodrigo Medrano				**CC No.**	
Edad de la construcción	1 año	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	NA	No. total residentes	NA	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			Rural	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No			NO	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			ondulado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Gustavo Arenas	Nombre:	Nombre Testigo
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	C.C. O NIT: 11.315.780.
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 2010250284	Matrícula profesional No. 3-769-74156	

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MAGPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Canchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cual? N/A		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No sobre	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual? N/A		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paredes en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual? N/A		6. Otro. Cual? N/A		17. Otro. Cual? N/A		7. Otro. Cual? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☑ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Muros con Paiete, Ventanería con Vidrios y Marco metalico en buen estado
Cubierta en eternit, se observa un kiosco con cubierta en teja termica y perfileria metalica.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☑ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: Mamposterías con Paiete y Ventanería en buen estado

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso en terreno natural (Piedras)

ESTADO DE CERRAMIENTOS: N/A BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Gobierno de Cundinamarca	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO GERENCIAL, GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VIARIAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MADPS-MN-IN-5-FR-4
		VERSIÓN	1
		Página	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAMPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. [illegible]	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Seguimiento: —	Día / Mes / Año: 21 04 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. En caso necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del consultor de obra(s), no fueron tenidas en cuenta en el siguiente preámbulo del formato Acta de Vecindad.

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

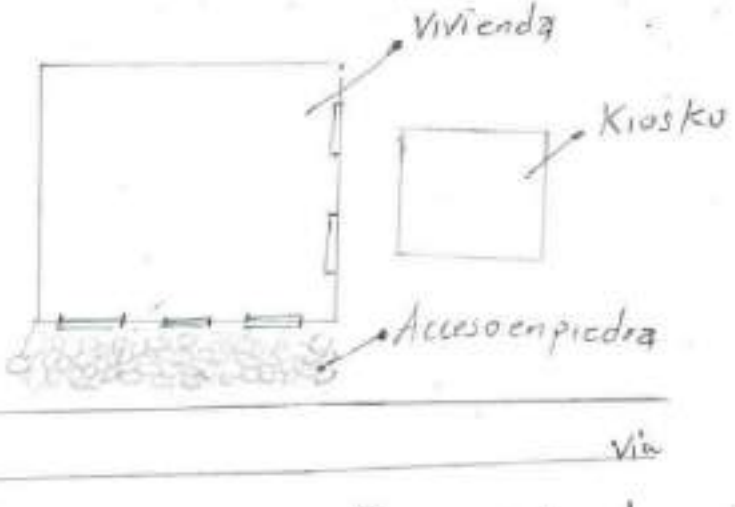

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:		Firma Nombre: Cristian Horiao Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 2201852284		Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15 602 26 1569	Firma nombre Testigo C.C. O NIT:

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA (Día / Mes / Año)	4 oct 25

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | **Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento** Cundinamarca	**Municipio** Venecia	**Vereda** Alto del trigo		**PR**
Dirección	KM 24+335 Derecho		**Teléfonos**	3103241646.	
Nombre de la persona que atiende la visita: Eudaldo Patiño				**CC No.** 11315780	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Adriana Patiño				**CC No.**	
Edad de la construcción	9 años	**No. de Apartamentos**	1	**No. de pisos**	1
No. de Hogares	NA	**No. total residentes**	NA	**Mujeres jefes de hogar**	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	**Adultos mayores (más de 60 años)**	NA	**Personas en situación de discapacidad**	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			CUAL?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [ ] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Cristian Henao	Nombre:
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: C1070805287	Matrícula profesional No.: 13202 76. 1569

Firma	
Nombre	Eudaldo Patiño
Testigo	
C.C O NIT:	11315780

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-MI-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:			SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐		1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐		2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐		3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐		4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐		5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐		6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐		7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐		8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐				9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál?			REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
			1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA			2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐		4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridi	☐
3. Estructura metálica y teja	☐				15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐				16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? N/A			6. Otro. Cuál? N/A		17. Otro. Cuál? N/A		7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Manposteria con Pañete y Pintura Cubierta en Teja Termica con Perfileria metalica, se observan Ventanales en buen estado, sin embolduzados

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: En cerca viva

Convenio VIC-UDES 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

PROCESO NACIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	
VERSIÓN	1
PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES: CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	

Contrato de Obra No. 1430 / 2023	Contrato de Interventoría No. 2151 / 2023	Acta de Vecindad de Seguimiento: final ☐	(Día / Mes / Año) 21 07 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diligenciada, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del consignante técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

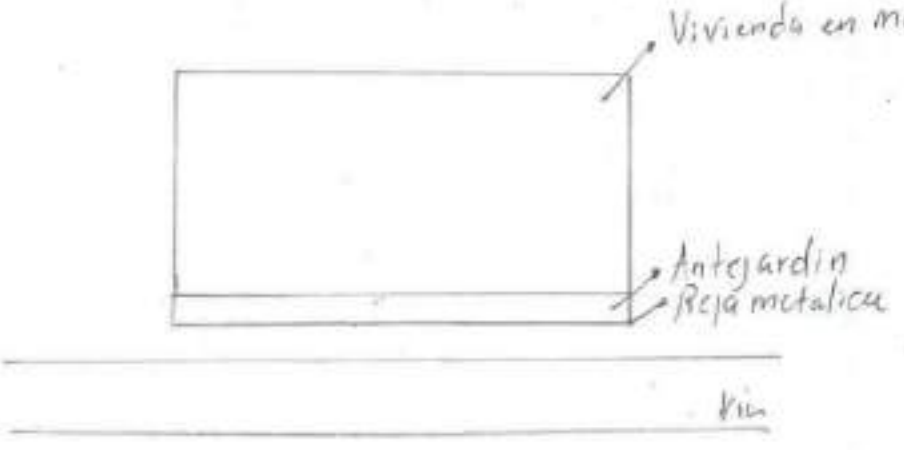

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Cristian Hercio Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: CC 1018506284	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15-202-44-95609

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: 1131190

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-SI-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 21 07 26
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Fusagasugá	Vereda: Alto del Trigo	PR:	
Dirección:	Km 24+340 lado derecho		Teléfonos:	3103241646	
Nombre de la persona que atiende la visita: Rodrigo Ramos				CC No. 11.315.780	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Rodrigo Ramos				CC No. 11.315.780	
Edad de la construcción	4 años	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	NA	No. total residentes	NA	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				ondulado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [ ] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: Rodrigo Ramos	Nombre: Cristian Rivera	Nombre:	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 11.315.780	Matrícula profesional No.: 25101850284	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Convenio VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	X	
2. Vigas corridas		
3. Sistema mixto		
4. Caissons		
5. Concreto ciclópeo		
6. Pilotes		
7. Placa de cimentación		
8. No identificada		
9. No existe		
10. Otro. Cuál?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	
2. Placa en Steel deck	
3. Estructura metálica y teja	X
4. Estructura de madera y teja	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	
2. Placa aligerada de concreto	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	
4. Vigas metálicas	
5. Cerchas metálicas	
6. Entramado en madera	
7. No aplica	
8. Otro. Cuál? N/A	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	X
2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema combinado en concreto	
4. Prefabricados en concreto	
5. Mampostería confinada	
6. Mampostería reforzada	
7. Mampostería no reforzada	
8. Pórticos en acero	
9. Pórtico arriostrado en acero	
10. Pórticos y paneles en madera	
11. Pórticos y paneles en otros materiales	
12. Muros en balaneque	
13. Muros en tapia pisada	
14. Muros en adobe	
15. Construcción improvisada	
16. Mixto	
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	X

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	X

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	
2. Edificaciones reforzadas	
3. Mampostería reforzada	
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	
5. Estructuras ligeras	
6. Construcciones simples	X
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Mampostería Parrete y pintura; ventanería en buen estado, rejas metalicas, pisos en cerchape y teja Termica

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso en terreno natural; no se evidencia andenes, Ok jardin en piso enchapado y rejas metalicas en buen estado.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: N/A BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

8. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Sala (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO [X]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Ventanería en buen estado, pisos enchapados, cubierta en cielo raso tipo PBC, se evidencia Cocina en buen estado, 2 muros con ladrillo prensado. Muros manifestaría parete y pintura.

ESTADO DE: Habitación 1 y 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO [X]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos enchapados, Teja en cubierta en PBC, Ventanería buen estado, muros con manifestación parete y pintura.

ESTADO DE: Baño (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO [X]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Enchapados y manifestación parete y pintura, Cielo raso con PBC - ventanería en buen estado

ESTADO DE: Zona de lavado (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO [X]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Pisos enchapados, muros manifestación parete y pintura, cubierta en teja termica perfilería metálica. Se observa ventanería en buen estado sin vidrios.

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO [ ]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso)								BUENO [ ]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma
Nombre: Rosalba Medrano
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 11.35.780.

Firma
Nombre: Cristian Alonso
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: CC 1070205287

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 152 02 26-569

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Contrato VIC-GER-2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MANUAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MAGPS-MN-05-3-FR-4
		VERSION	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA LA GENTE EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	
Contrato de Obra No. [illegible] 2021	Contrato de Interventoría No. 216 / 2021	Acta de Vecindad de Seguimiento: ---	Día / Mes / Año 21 07 24

REGISTRO FOTOGRAFICO










Nota: 1. En caso de requerir incluir otros registros fotográficos a los consignados en la página anterior, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales idóneos de Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. En caso necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, se hallen. Tenidas en cuenta en la esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

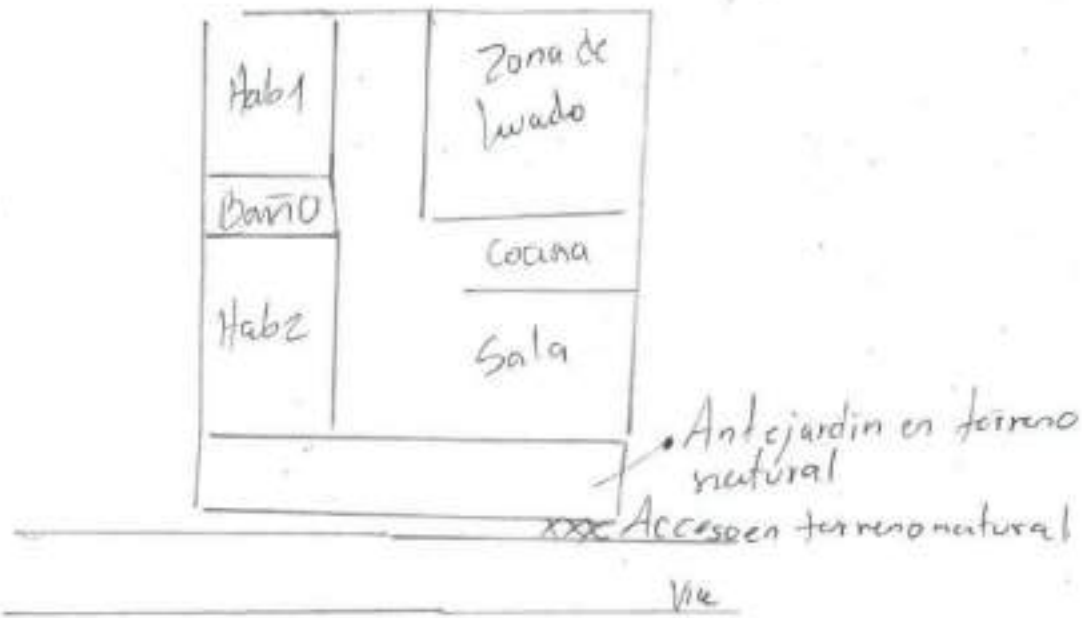

FIRMAS

Firma Nombre: [illegible] Pacheco Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 11.315.780	Firma Nombre: Cristobal Hercio Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 1CM8005287	Firma Nombre: 1520236156 Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: [illegible]

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025
Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]
FECHA	(Día / Mes / Año) 21 07 26

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento:** Cundinamarca	**Municipio:** Jerusalén	**Vereda:** Alto del Trigo		**PR**
Dirección	KM 24+340 lado izquierdo		**Teléfonos**	310 324 16 46	
Nombre de la persona que atiende la visita: Claudia Pedraza				**CC No.** 1131S780	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				propio
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Claudia Pedraza Fonseca				**CC No.**	
Edad de la construcción	60 años	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	N/A	No. total residentes	N/A	Mujeres jefes de hogar	N/A
Niños (menos de 14 años)	N/A	Adultos mayores (más de 60 años)	N/A	Personas en situación de discapacidad	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			Rural	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			Terminado	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No			NO	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			ondulado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje
SI [ ] NO [ ]
Uso del garaje:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Cristian Herrera	Nombre:
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 2210235287	Matrícula profesional No.:
		Testigo
		Nombre: Rodrigo Pedraza
		C.C. O NIT: 1131S780

Notas: 1. Se firma en consonancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? N/A		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? N/A		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? N/A		6. Otro. Cuál? N/A		17. Otro. Cuál? N/A		7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cubierta en teja termica, con perfileria metalica y Madera. Muro en mamposteria con pañete y pintura, se observa vivienda en buen estado sin ventanas, pisos en concreto con piso

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso rampa de Concreto en mal estado, se evidencia Muro en acceso. En mampostería ante jardin con muro.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: N/A BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Consorcio VIAS GDR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MANUAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MGPS-dic-fo-14-Fo-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	(Día / Mes / Año) 21 01 26.
Contrato de Obra No. IDCC-141 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Seguimiento	X

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página anterior, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. O bien necesario, se podrá agregar una página anexo de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Canarado VIGILER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

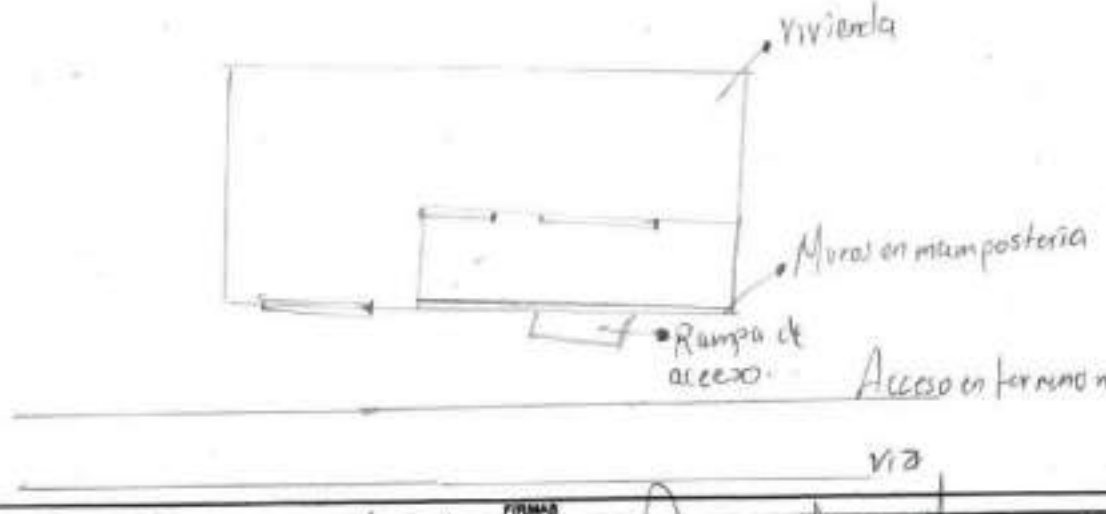

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Cristian Henao Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 1010485037	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: 1131957480

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA (Día / Mes / Año)	27 07 26

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | **Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento** Cundinamarca	**Municipio** Jerusalén	**Vereda** Alto del trigo	**PR**	
Dirección	KM 24+400 lado izquierdo		**Teléfonos**	3103241646	
Nombre de la persona que atiende la visita: Cristian Moreno				**CC No.** 1131578O	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			propia	
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Reinaldo Moreno Moreno				**CC No.**	
Edad de la construcción	9 años	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	2
No. de Hogares	NA	No. total residentes	NA	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			Rural	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			Terminada	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No			NO	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			ondulado	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11.Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Cristian Moreno	Nombre:
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 1101950287	Matrícula profesional No.: 13 2016-1909
		Testigo
		C.C. O NIT: 1131578O.

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:			SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐		1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐		2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐		3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐		4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐		5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐		6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐		7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐		8. Otro. Cuál? N/A		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐				9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? N/A			REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
			1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA			2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐		3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐		4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐				15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐				16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? N/A			5. Otro. Cuál? N/A		17. Otro. Cuál? N/A		7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: 2 Pisos en mampostería y cielo raso, ventanería en buen estado, se observa muy poca teja termica y metalica la cubierta del predio es en teja termica con perfileria metalica se observa mejor se evidencia estructura para el gas natural y se evidencia un poste de energia frente al predio se evidencia una escalera en estructura metalica

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCION A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso para garaje en terreno natural, acceso frente la vivienda en placa de concreto

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se evidencia Cerramiento.

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE MATERIALES BASE DE PROYECTOS MANUAL DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPSAMS-SUSP-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA OLVIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	
Contrato de Obra No. (CO) 140 (2023)	Contrato de Interventoría No. 214 (2023)	Acta de Vecindad de Seguimiento	(Día / Mes / Año) 21 07 23

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el espacio propuesto del formato acta de Vecindad.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	4

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

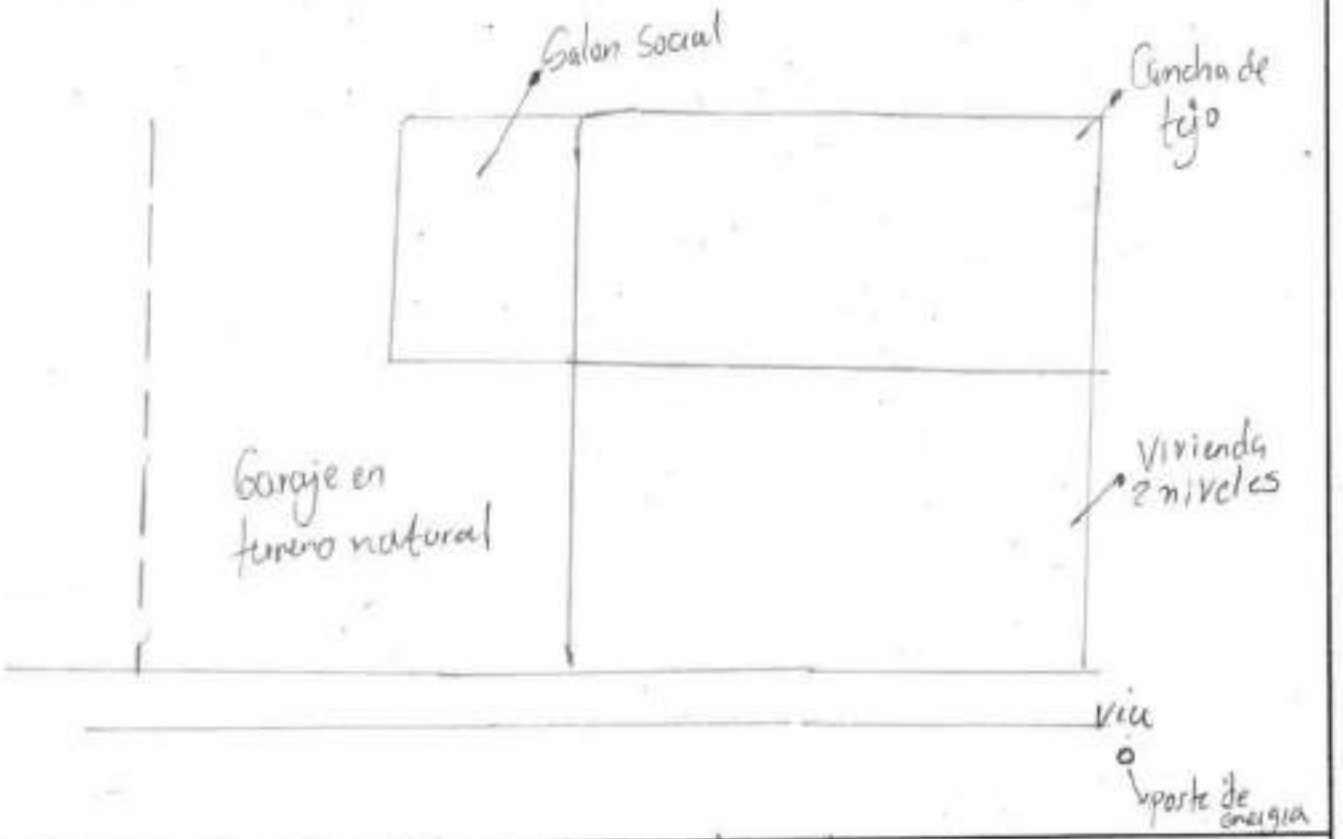

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Cristian Tercero Ing. Residente Contratista Matricula profesional No.: 25202185287	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matricula profesional No.: 25202-1369
Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	Rodrigo Pedroza 79.315.780	

Consorcio VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025
Acta de Vecindad de	**Inicio** ☒ **Seguimiento** ☐
FECHA (Día / Mes / Año)	21 07 25

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento** Cundinamarca	**Municipio** Arbeláez	**Vereda** Alto del trigo		**PR**
Dirección	Km 24+458 lado derecho		**Teléfonos**	3227719841	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yamile Nasayo Cardozo			**CC No.**	1033788478
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				N/A
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				**CC No.**	

Edad de la construcción	N/A	No. de Apartamentos	N/A	No. de pisos	N/A
No. de Hogares	N/A	No. total residentes	N/A	Mujeres jefes de hogar	N/A
Niños (menos de 14 años)	N/A	Adultos mayores (más de 60 años)	N/A	Personas en situación de discapacidad	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	Ondulado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cuál? N/A

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☐	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro Lado Vivienda	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje
SI ☐ NO ☐
Uso del garaje:

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Cristhian Heraso	Nombre:	Nombre Yamile Nasayo C.
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoría**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 1101885287	Matrícula profesional No.: 15.202.26.1569	C.C. O NIT: 1033788478

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Convenio VIC-DER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mamposteria confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mamposteria reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mamposteria no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? N/A		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐	REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? N/A		1. Reformas (si / no)		10. Pórticos y paneles en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mamposteria reforzada	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
5. Otro. Cuál? N/A		8. Otro. Cuál? N/A		16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
				17. Otro. Cuál? N/A		7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones: Casa Abandonada

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS	✓	FISURAS	✓	HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: fachada en bloques de concreto Cubierta en Placa de concreto

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso en forma natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se evidencia cerramiento

Contrato VIC-GER-2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MAGPS-MA-N-3-PR-4
		VERSION	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARME, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. (COV 140 / 2021	Contrato de Interventoria No. 218 / 2021	Acta de Vecindad de Seguimiento: — 8	(Dia / Mes / Año) 21 07 22

REGISTRO FOTOGRAFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir mas registros fotograficos a los consignados en la página anterior, se podran insertar mas páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. Si Fuera necesario se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, se tuenen tenidas en cuenta en el escenario posterior del formato Acta de Vecindad.

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

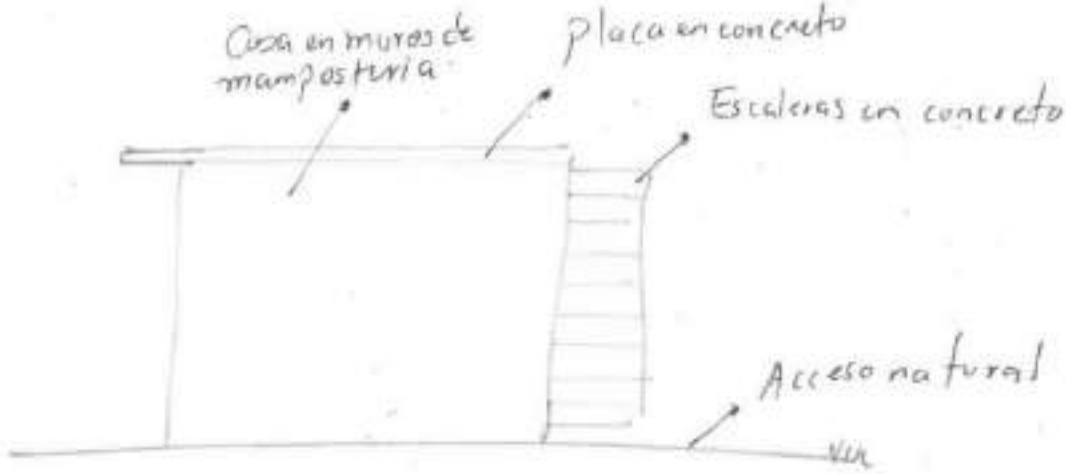

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 1000185078	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.:	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:	Yamile Nasayó C. Yamile Nasayó Cachaya C.C. 39.[illegible].78.84.78	

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA (Día / Mes / Año)	24 07 26

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Fosca	Vereda: Alto del trigo	PR:	
Dirección:	KM 24+450 lado izquierdo		Teléfonos:	3227719641	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yamile Nasayo Cachabe			CC No.	1033788478
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				NA
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	

Edad de la construcción	NA	No. de Apartamentos	NA	No. de pisos	NA
No. de Hogares	NA	No. total residentes	NA	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No	NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	Ondulado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☐ NO ☒
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma:		Firma:		Firma:	Firma:
Nombre:		Nombre:		Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:		Matrícula profesional No.: 25101850277		Matrícula profesional No.: 13 407 261569	C.C. O NIT: 1033788478

Yamile Nasayo C.

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGURALIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclopeo	☐	5. Canchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	**IRREGURALIDAD EN ALTURA**	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cuál? N/A		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? N/A		**REFORMAS EN LA ESTRUCTURA**		10. Pórticos y paneles en madera	☐	**TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN**	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y paneles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? N/A		8. Otro. Cuál? N/A		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones: Vivienda comercial por ende se hace levantamiento de la fachada.

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Paredes en concreto Planeta y Pintura, Piso de acceso en concreto con fisuras Cubierta con perfilería en madera Teja en Zinc, se evidencian algunas Plantas en el acceso se evidencian 2 puertas y 2 ventanas.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso en terreno natural y escaleras en concreto en mal estado

ESTADO DE CERRAMIENTOS: N/A BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se evidencia cerramiento

Gobernación de Cundinamarca VICIUDER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MADPS-MN-0x3-FO-x
		VERSION	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. IDCM 190-2020	Contrato de Interventoría No. 218 / 2020	Acta de Vecindad de Seguimiento	(DIA / MES / AÑO) 21 07 24

REGISTRO FOTOGRAFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio de compromete técnico, no fueron tenidas en cuenta en el siguiente propósito del formato Acta de Vecindad.

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

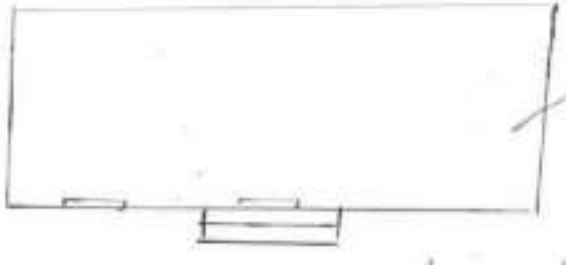

FIRMAS

Firma
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Cristian Henao
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 5208528287

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 13702 CE 13641

Firma
Nombre Yamile Nasaja C.
Testigo Yamile Nasaja Cachabe
C.C. O NIT: 1073 70 84 78

Consorcio VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 22 07 25
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	**Acta de Vecindad de** Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	**Departamento** Cundinamarca	**Municipio** Jerusalén	**Vereda** Alto del Trigo		**PR**
Dirección	KM 24+480 lado derecho		**Teléfonos**	3214448610	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Yeimy Paola Fonseca Moreno			**CC No.**	1072431087
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				Propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Yeimy Paola Fonseca Moreno			**CC No.**	1072431087
Edad de la construcción	5 años	**No. de Apartamentos**	1	**No. de pisos**	1
No. de Hogares	1	**No. total residentes**	2	**Mujeres jefes de hogar**	1
Niños (menos de 14 años)	1	**Adultos mayores (más de 60 años)**	0	**Personas en situación de discapacidad**	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				ondulado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
6. Internet			
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [X] NO [ ]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11.Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma	Firma	Firma
Nombre: Yeimy Paola Fonseca Moreno	Nombre: Cristian Henao	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 1072431087	Matrícula profesional No.: CC1098502[illegible]	Matrícula profesional No.: 25[illegible]-1069
		Testigo
		C.C. O NIT:

Notas:
1. Se firma en correlencia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Caissons	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál? N/A	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paredes en madera	☐
11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Modo	☐
17. Otro. Cuál? N/A	

IRREGURALIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones: Solo se autorizó hacer el levantamiento de acta en la fachada.

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: fachada en mampostería con pañete y pintura; cubierta con teja en zinc con perfilería metálica se observa 1 ventana y puerta con marco metálico, piso en concreto con fisuramiento se evidencia canaletas y postes de luz, la portería metálica está tipo cercha.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: No se evidencian andenes, acceso en concreto

ESTADO DE CERRAMIENTOS: N/A

								BUENO ☐		REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Gobernación de Cundinamarca VICTORIA 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MAGPS-Mn-N-3-FT5-4
		VERSION	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENTORÍA DE LAS VÍAS QUE COMPRENDEN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUBIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. 1CCU 140 / 2020	Contrato de Interventoría No. 219 / 2020	Acta de Vecindad de Seguimiento: —	Día / Mes / Año: 21 07 21

REGISTRO FOTOGRAFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos de Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuere necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto de formato Acta de Vecindad.

Consorcio VIOGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

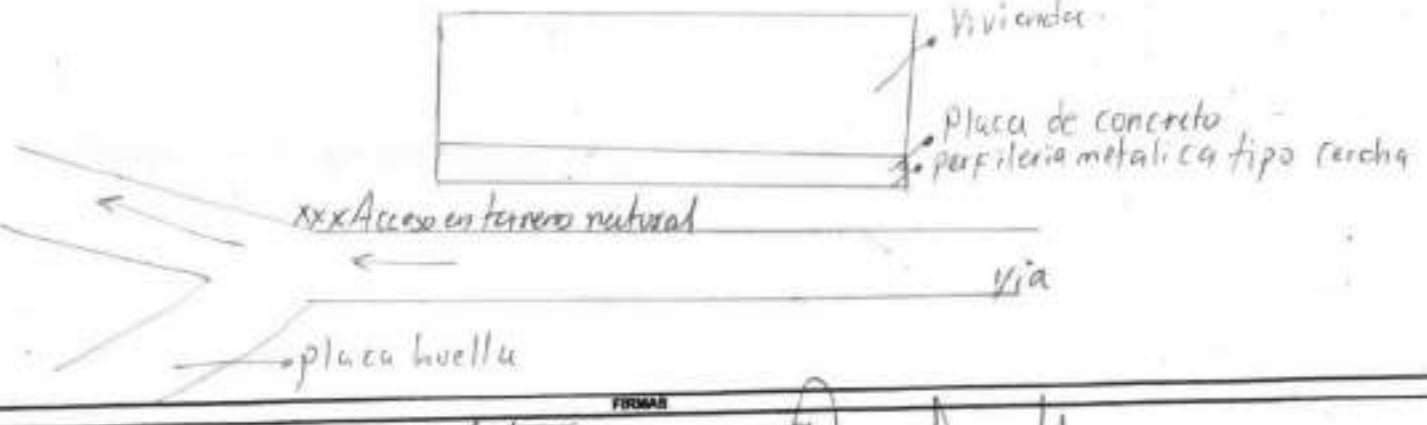

FIRMAS

Firma Nombre: Yelliny Dicko Fonseca Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1072490087	Firma Nombre: Cristian Alvarado Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: CE 1018502345	Firma Nombre: Jaime Arroyo Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15202-261569	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Consorcio VICGER 2021


INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MN-043-FR-4
VERSIÓN	1
PAGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE: SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	7 Julio 2026 (Dia / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IDCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 213 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio	☒
			Seguimiento	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA

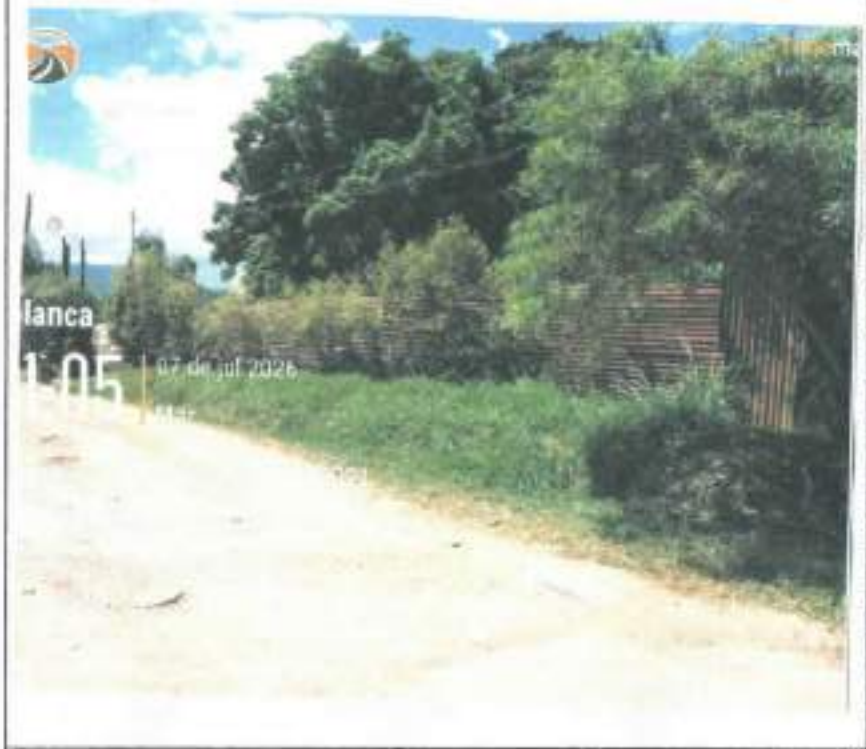

2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Resguardo Bajo		PR
Dirección	La Palmera KM 8+165		Teléfonos	311 219 7325	
Nombre de la persona que atiende la visita: Luz May Calderon Valenzuela				Cédula: 20 368 974	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Luz May Valenzuela Bolaños y otros				CC 368 974	
Edad de la construcción	30	No. de Apartamentos	2	No. de pisos	1
No. de Hogares	2	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	2
Niños (menos de 14 años)	2	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	—

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plana; 2. Ondulada; 3. Empinada	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
8. Internet			
7. Otros			Cuál?

DESTINACION ECONOMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuaria	☐	11 Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐

Uso del garaje: cerrado

FIRMAS

Firma	Firma	Firma
Nombre: Luz May Calderon Valenzuela	Nombre: Sebastian Ovalle Amaya	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 20 368 974	Matrícula profesional No.: 091037 - 0618230	Matrícula profesional No.: 13702-26 1569

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Firma
Nombre
Vecino Testigo
C.C. O NIT

Caminos VICGER 2025

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	[illegible]
VERSION	1
PAGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	3 Julio 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 146 / 2025	Contrato de Interventoría No. 214 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza en concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificada	☐	8. Otro. Cual? N A		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual? N A		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y porteles en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y porteles en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros de hormigón	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de área ocupada a la vía		13. Muros de tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐			14. Muros de adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras flotantes	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	4. En profundidad: metros de fondo perpendicular a la vía		15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual? N A		5. Otro. Cual? N A		17. Otro. Cual? N A		7. Otro. Cual? N A	

Observaciones: Seguimiento acta de fachada sin acceso sin propietario.

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento en teja de zinc y bomby acceso sin portón. columna con medidor de energía

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
No aplican

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GRAVEDAD AFECTACIÓN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Sin anden, acceso en terreno natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☒
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento en teja de zinc pintada y otro en bambu.

Consorcio VICOPER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VIGGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MA-SPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	7 Julio 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 190 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

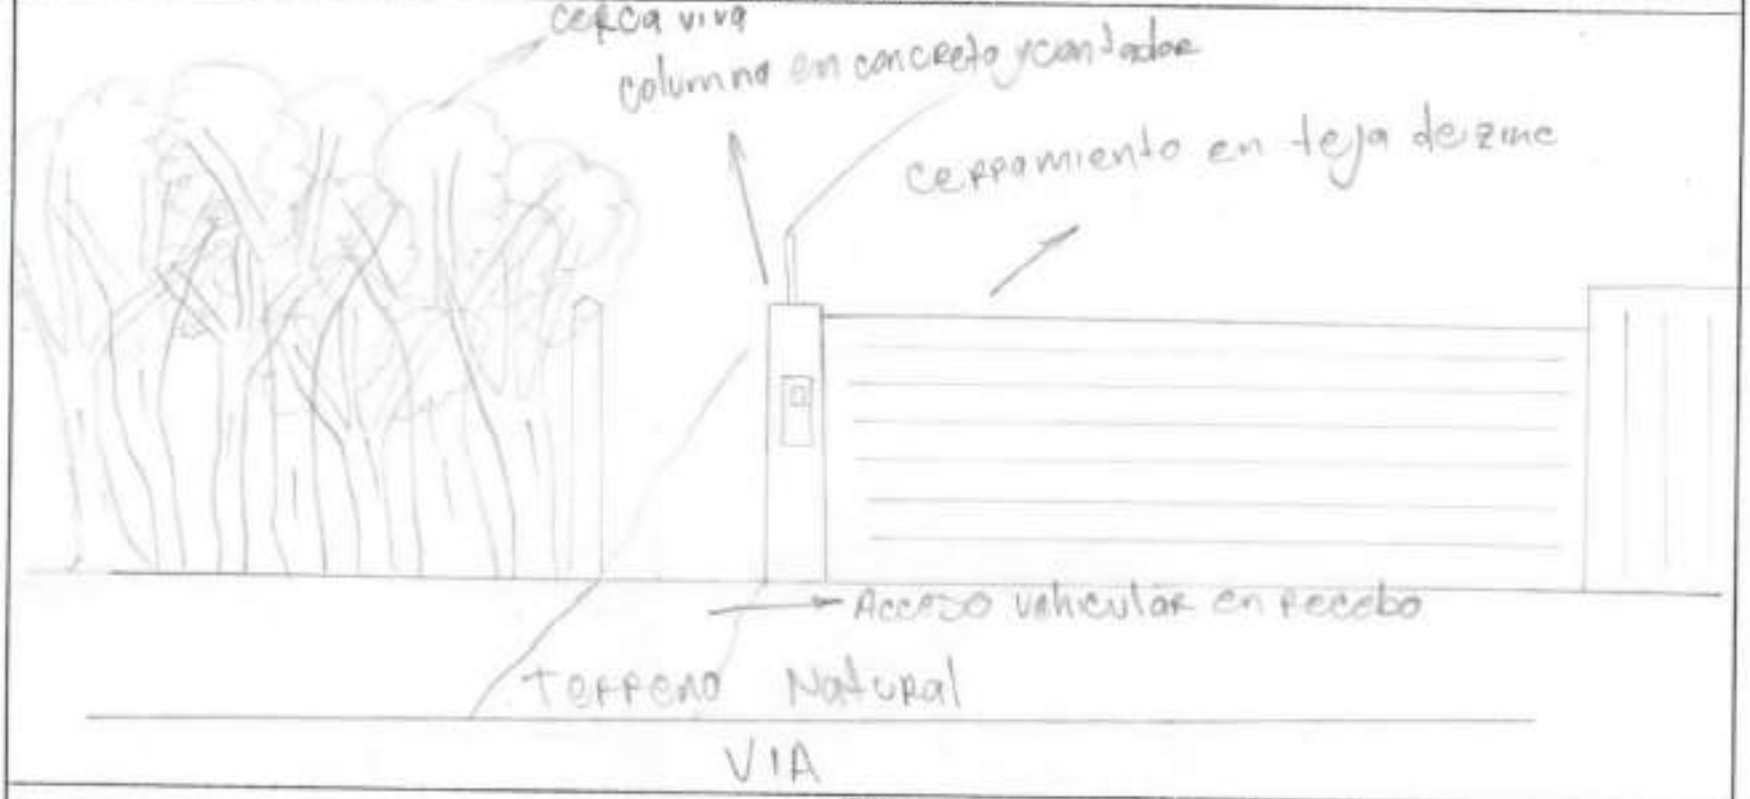

FIRMAS

Firma
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT: 20368974

Firma
Nombre: Sebastian Castro Arango
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 091037-0618230

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 15 202-261369

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT

Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Gobernación VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-04-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	7 Julio 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anapoima	Vereda: Hatico		PR
Dirección:	Vía Laura KM 58+135 D		Teléfonos:	321 471 7045	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Liliana Gutierrez Gutierrez			CC No. 52.314.524	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Liliana Gutierrez Gutierrez			CC No.	
Edad de la construcción	2	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	1
No. de Hogares	1	No. total residentes	6	Mujeres jefes de hogar	2
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	2	Personas en situación de discapacidad	1
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado				2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI , 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado				2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo		ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial		8. Salubridad		Garaje	
3. Industrial		9. Cultural		SI X	NO
4. Minero		10. Religioso		Uso del garaje:	
5. Agropecuario		11. Institucional		arcen	
6. Recreacional		12. Otro			

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Sebastian Cortes Arango	Nombre:
C.C. O NIT: 1.023.144.124	Ing. Residente Contratista	Testigo
Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.	Matrícula profesional No. 091037-061823	C.C. O NIT:
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.	Nombre profesional:	

CAMINOS VECINALES 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IFS-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	7 Julio 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. (CCU-140-) 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio X Seguimiento

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas			
2. Vigas corridas			
3. Sistema mixto			
4. Cassons			
5. Concreto ciclópeo			
6. Pilotes			
7. Placa de cimentación			
8. No identificada			
9. No aplica			
10. Otro. Cuál?	N/A		

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto			
2. Placa aligerada de concreto			
3. Lámina colaborante (Steel deck)			
4. Vigas metálicas			
5. Cerchas metálicas			
6. Entramado en madera			
7. No aplica			
8. Otro. Cuál?	N/A		

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado			
2. Muros estructurales en concreto			
3. Sistema combinado en concreto			
4. Prefabricados en concreto			
5. Mampostería confinada			
6. Mampostería reforzada			
7. Mampostería no reforzada			
8. Pórticos en acero			
9. Pórtico arriostrado en acero			
10. Pórticos y parales en madera			
11. Pórticos y parales en otros materiales			
12. Muros en bahareque			
13. Muros en tapia pisada			
14. Muros en adobe			
15. Construcción improvisada			
16. Mixta			
17. Otra. Cuál?	N/A		

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta			
2. Irregularidad media			
3. Irregularidad baja o inexistente			

IRREGURALIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta			
2. Irregularidad media			
3. Irregularidad baja o inexistente			

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial			
2. Edificaciones reforzadas			
3. Mampostería reforzada			
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras rígidas			
5. Estructuras ligeras			
6. Construcciones simples			
7. Otra. Cuál?	N/A		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto			
2. Placa en Steel deck			
3. Estructura metálica y teja			
4. Estructura de madera y teja			
5. Otro. Cuál?	N/A		

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (S / No)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	N/A

Observaciones: Desconocimiento de predio con propietario

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
postes de madera y malla ongeo con 5 hileras de alambre de púas. Portón de 2 hojas anclado en estructura metálica con cubierta en teja termo acustica

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		ANCHO DE ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Sin anden, acceso en terreno natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento en postes de madera y malla de ongeo, portón de acceso metalico con cubierta al costado derecho medidor de agua y en columna medidor de energía

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.


6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Construcción VIGENTE 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MM-SPS-SIN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	1 Julio 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU-140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

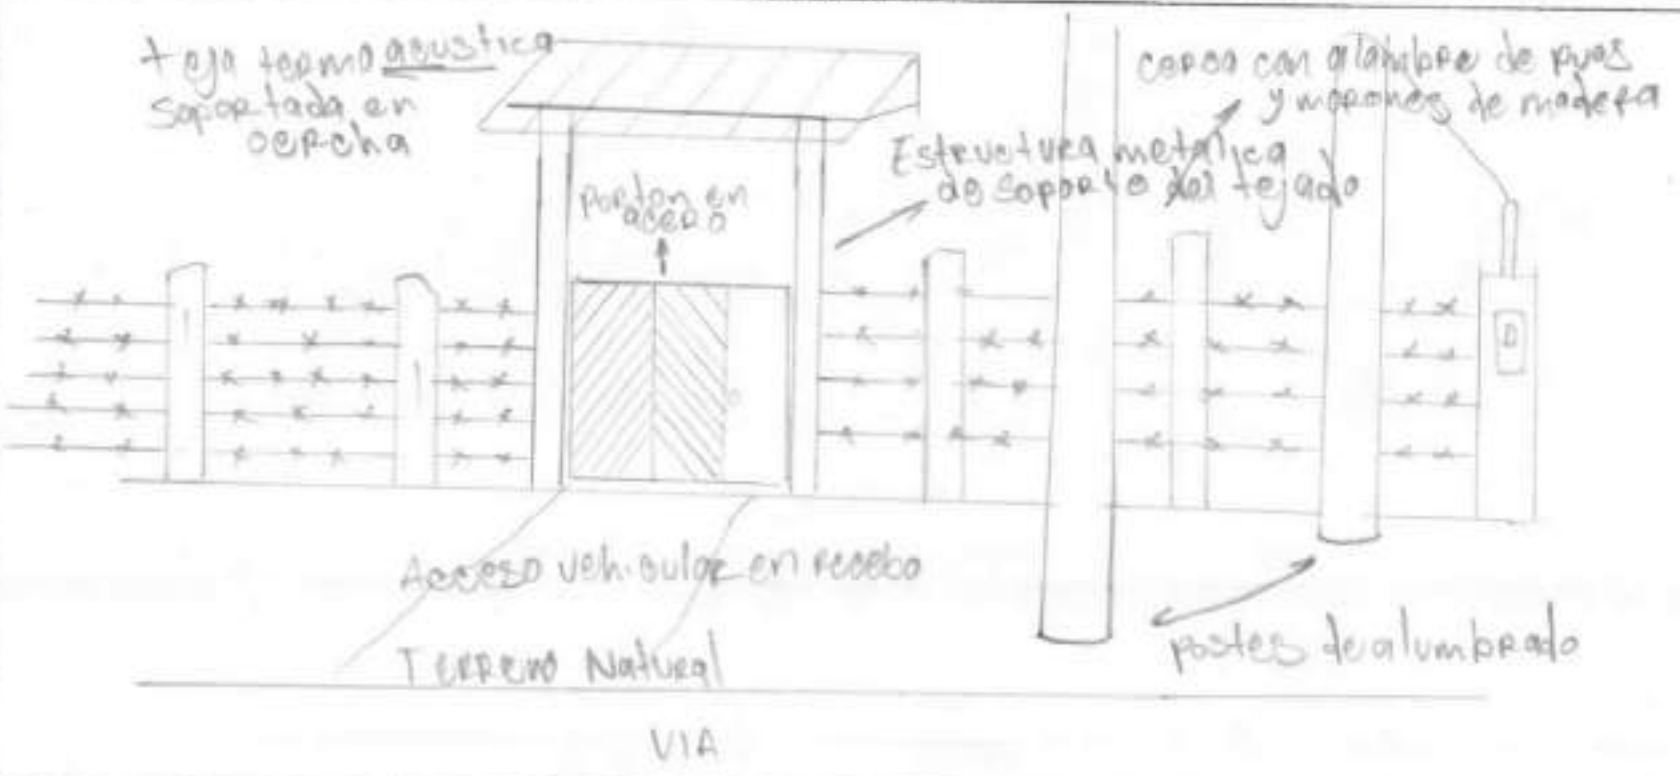

FIRMAS

Firma Nombre **Responsable Unidad Social** C.C. O NIT: 52 310 524.	Firma Nombre: Sebastian Ortiz Arroyo **Ing. Residente Contratista** Matrícula profesional No.: 091037-0618230	Firma Nombre **Ing. Residente Interventoría** Matrícula profesional No.:	Firma Nombre **Testigo** C.C. O NIT:

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-INS-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA GUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	7 Julio 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 146 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☑ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anapoima	Vereda: Hospital de C	PR	
Dirección:	K18+120 Derecho		Tel/Movil:	312 592 5925	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Carlos Suarez López		CC No.:	6.359.875 Tunja	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			—	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:			CC No.:		
Estrato de la construcción	2	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	2
No. de Hogares	—	No. total residentes	—	Mujeres jefes de hogar	—
Niños (menos de 14 años)	—	Adultos mayores (más de 60 años)	—	Personas en situación de discapacidad	—
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural			2	
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			2	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. NO			2	
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado			2	

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	Cerca: SI ☒ NO ☐	
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del predio:	
4. Minero	☐	10. Religioso	☐		
5. Agropecuaria	☐	11. Institucional	☐		
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐		

FIRMAS

Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma: [signature]	Firma:
Nombre: Carlos Suarez	Nombre: Sebastian Ortiz Arango	Nombre: Jaider Acosta	Nombre:
Responsable Unidad Social:	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 6759885	Matrícula profesional No.: 091037-0619230	Matrícula profesional No.: 15 762 261369	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Contrato VICGER 3021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MIN-01-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
Contrato de Obra No. ICCU 1917 /2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025
Acta de Vecindad de	Inicio ☑ Seguimiento ☐
FECHA	9 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Cassons	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	N A

SISTEMA DE CUBIERTA:

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	N A

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada en concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Canales metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	N A

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	N A

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórticos arriostrados en acero	☐
10. Pórticos y pantalla en madera	☐
11. Pórticos y pantalla en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	N A

IRREGULARIDAD EN PLANTA:

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA:

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN:

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Edificaciones con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	☐
5. Estructuras livianas	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	N A

Observaciones: Se realiza levantamiento de colindo con vecino contratar en obra

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Columna concreto y cerramiento con postes de concreto y 5 hilos de alambre de pua, muro inconcluso en concreto, portón metálico apoyado en columnas de concreto.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin anden

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: postes de concreto y alambre de pua, portón metálico con columnas en concreto y puerta de acceso

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.


6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Contrato VICOFR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MA1FS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	7 de Julio 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. SCCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

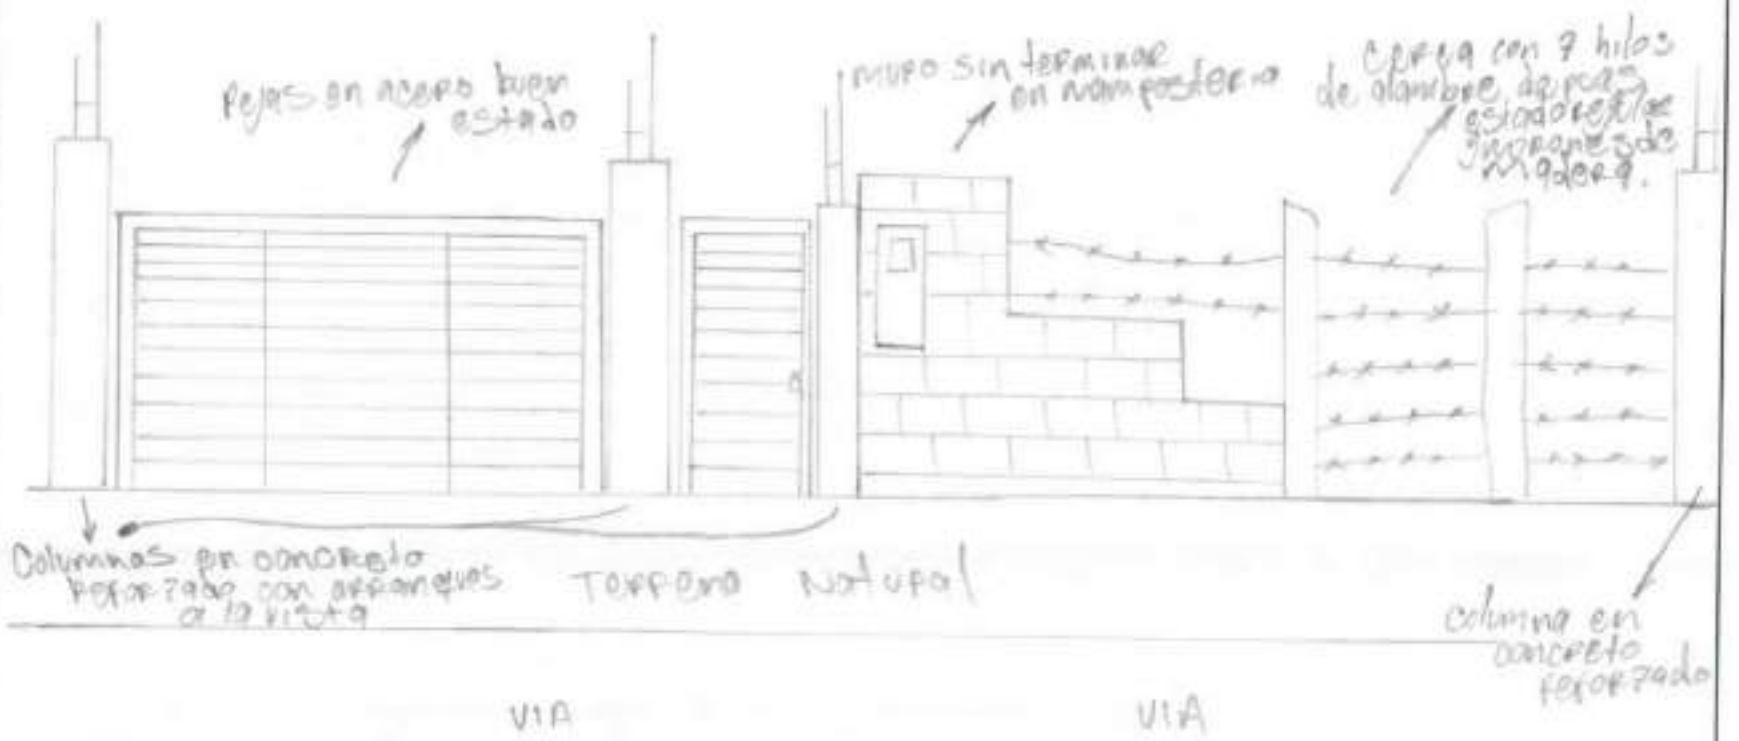

FIRMAS

Firma Nombre: Carlos Suspes Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1.674.935 Cargo: Contratista Copia: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)	Firma Nombre: Sebastián Ovalle Arrieta Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 091037-0618320	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15 362 261269	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT

Consorcio VICSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL: GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MA-SPS-Ver #-3-FO-4
VERSION	1
PAGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	2 - Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 110 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Tibacuy	Vereda: Tibacuy del C		PR
Dirección:	KM 8+100 Derecha		Teléfonos:	310 294 0022	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Blanca Cecilia Castro (Blanca)			CC No. 28 368 195	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia, 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Blanca Cecilia Castro Yate			CC No. 28 368 195	
Edad de la construcción:	50.	No. de Apartamentos:	1	No. de pisos:	1
No. de Hogares:	1	No. total residentes:	3	Mujeres jefes de hogar:	1
Niños (menos de 14 años):		Adultos mayores (más de 60 años):	2	Personas en situación de discapacidad:	1
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado				2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[X]	7. Vulnerables	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]
Uso del garaje: acceso -

FIRMAS

Firma: -
Nombre: Blanca cecilia castro
C.C. o NIT: 28 368 195

Firma:
Nombre: Sebastian Ortiz Arango
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 091037-061823O

Firma:
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 13 262-26 1569

Firma
Nombre
Testigo
C.C. o NIT

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FT1-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 7 Nov 2025 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IDCU-140-I-2025 | Contrato de Interventoría No. 218-I-2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas		
2. Vigas corridas		
3. Sistema mixto		
4. Cabezote		
5. Concreto ciclópeo		
6. Pilotes		
7. Placa de cimentación		
8. No identificado		
9. No aplica		
10. Otro. Cuál?	N/A	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	
2. Placa en Steel deck	
3. Estructura metálica y teja	
4. Estructura de madera y teja	
5. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto	
2. Placa aligerada de concreto	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	
4. Vigas metálicas	
5. Correas metálicas	
6. Entramado en madera	
7. No aplica	
8. Otro. Cuál?	N/A

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Refuerzos (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	
2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema combinado en concreto	
4. Prefabricados en concreto	
5. Mampostería confinada	
6. Mampostería reforzada	
7. Mampostería no reforzada	
8. Pórticos en acero	
9. Pórtico arriostrado en acero	
10. Pórticos y porrales en madera	
11. Pórticos y porrales en otros materiales	
12. Muros en tuluvisyor	
13. Muros en lapa pisada	
14. Muros en adobe	
15. Construcción improvisada	
16. Mixto	
17. Otro. Cuál?	N/A

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	
2. Edificaciones reforzadas	
3. Mampostería reforzada	
4. Pórticos con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	
5. Estructuras ligeras	
6. Construcciones simples	
7. Otro. Cuál?	N/A

Observaciones: Desconocimiento de acta de vecindad con propietarios

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

								BUENO		REGULAR	X	MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento postes de madera y 4 hilos de alambre de puas Broche parte del cerramiento tubo de conducion de aguas lluvias

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (m)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin anden, arreo en terreno natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS

								BUENO		REGULAR	X	MALO	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en postes de madera y alambre de puas a la intemperie

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.


6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Contraloría VIGILE Y ADMINISTRA	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-86-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	7 Julio 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

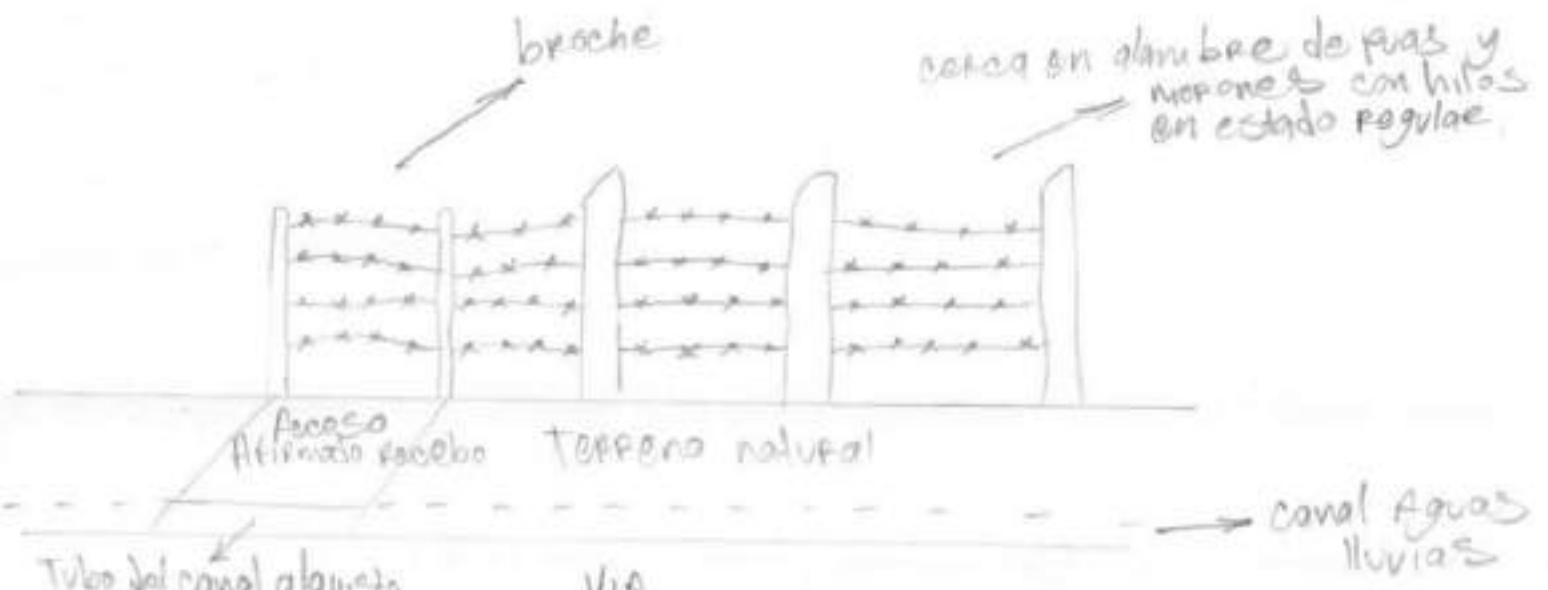

FIRMAS

Firma Nombre Responsable Unidad Social C.C. O NIT Original: Contratista Copia: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)	Blanca Cecilia Castro 2036819 5	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 091037-061830	Sebastian Ovalle Anaya
Firma Nombre Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.	Oscar Ovalle Anaya	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT.	

Consorcio VICGE R 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	IMSPGAM-MA-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	(Día/Mes / Año) 07-07-24

Contrato de Obra No. IDCU 1497 2020	Contrato de Interventoría No. 218 / 2020	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Mesitas de C.	PR:
Dirección:	KM 77685 Lado izquierdo.		Teléfono:	
Nombre de la persona que atiende la visita: Elva Beatriz Rincón			CC No:	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Elva Beatriz Rincón			CC No:	

Edad de la construcción	2 años	No. de Apartamentos	3	No. de pisos	2
No. de Hogares	1	No. total residentes	2	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	0	Adultos mayores (más de 59 años)	0	Personas en situación de discapacidad	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	D
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	obra gris
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	SI
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	ondulado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto	X	
2. Alcantarillado		X
3. Energía	X	
4. Gas		X
5. Teléfono		X
6. Televisión cable		X
7. Internet		X
8. Otros		

Observaciones del estado de las redes:

CUNT

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Seguridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje
SI ☒ NO ☐
Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Elva Beatriz Rincón	Nombre: Sebastián Castillo Arroyo	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 28768831	Matrícula profesional No.: 0910237-05182130	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT:

Notas: 1. Su firma es constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Gobierno VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MN-IN-FR-x
VERSION	1
PAGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIARE, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA (Día / Mes / Año): 07-07-25

Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento: X

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	
2. Vigas corridas	
3. Sistema mixto	
4. Cabezas	
5. Concreto ciclópeo	
6. Pilotes	
7. Placa de cimentación	
8. No identificada	
9. No aplica	
10. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	
2. Placa en Steel deck	
3. Estructura metálica y teja	
4. Estructura de madera y teja	
5. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	
2. Placa aligerada de concreto	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	
4. Viguetas metálicas	
5. Cerchas metálicas	
6. Entramado en madera	
7. No aplica	
8. Otro. Cuál?	N/A

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Refuerzos (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	
2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema combinado en concreto	
4. Prefabricados en concreto	
5. Mampostería confinada	
6. Mampostería reforzada	
7. Mampostería no reforzada	
8. Pórticos en acero	
9. Pórtico arriostrado en acero	
10. Pórticos y pantalla en madera	
11. Pórticos y pantalla en otros materiales	
12. Muros en balso-repis	
13. Muros en tapia pisada	
14. Muros en adobe	
15. Construcción enmonolitada	
16. Mixto	
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones sin reforzamiento especial	
2. Edificaciones reforzadas	
3. Mamposterías reforzadas	
4. Edificios con confinamiento deficiente y estructuras flexibles	
5. Estructuras ligeras	
6. Construcciones simples	
7. Otro. Cuál?	N/A

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPES		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso en Placa de concreto estampado, no se evidencian Andenes
Cubierta en t/u de Aluminio Sin techumbre en Cercha metálica, perfiles en buenos en alambre de púa.
Se evidencia caja del contador (Acueducto)

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS			

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento con Muro en mampostería en Concreto. Muros en regular estado
Se evidencia cerca viva, se evidencian columnas de Concreto, alambre Puas
de acero.

Consorcio VIC&ER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MAGPS-MN-IS-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	
Contrato de Obra No. VCCU 140 / 2021	Contrato de Interventoría No. 318 / 2020	Acta de Vecindad de Registro No.	(Día / Mes / Año) 04 07 21

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diseñada, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico con datos ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. En caso necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no hacer, tenerse en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Contenido VIGGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MA-GPS-MN-N-3-FR-4
		VERSION	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 04-07-25
Contrato de Obra No. ICCU-1417-2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

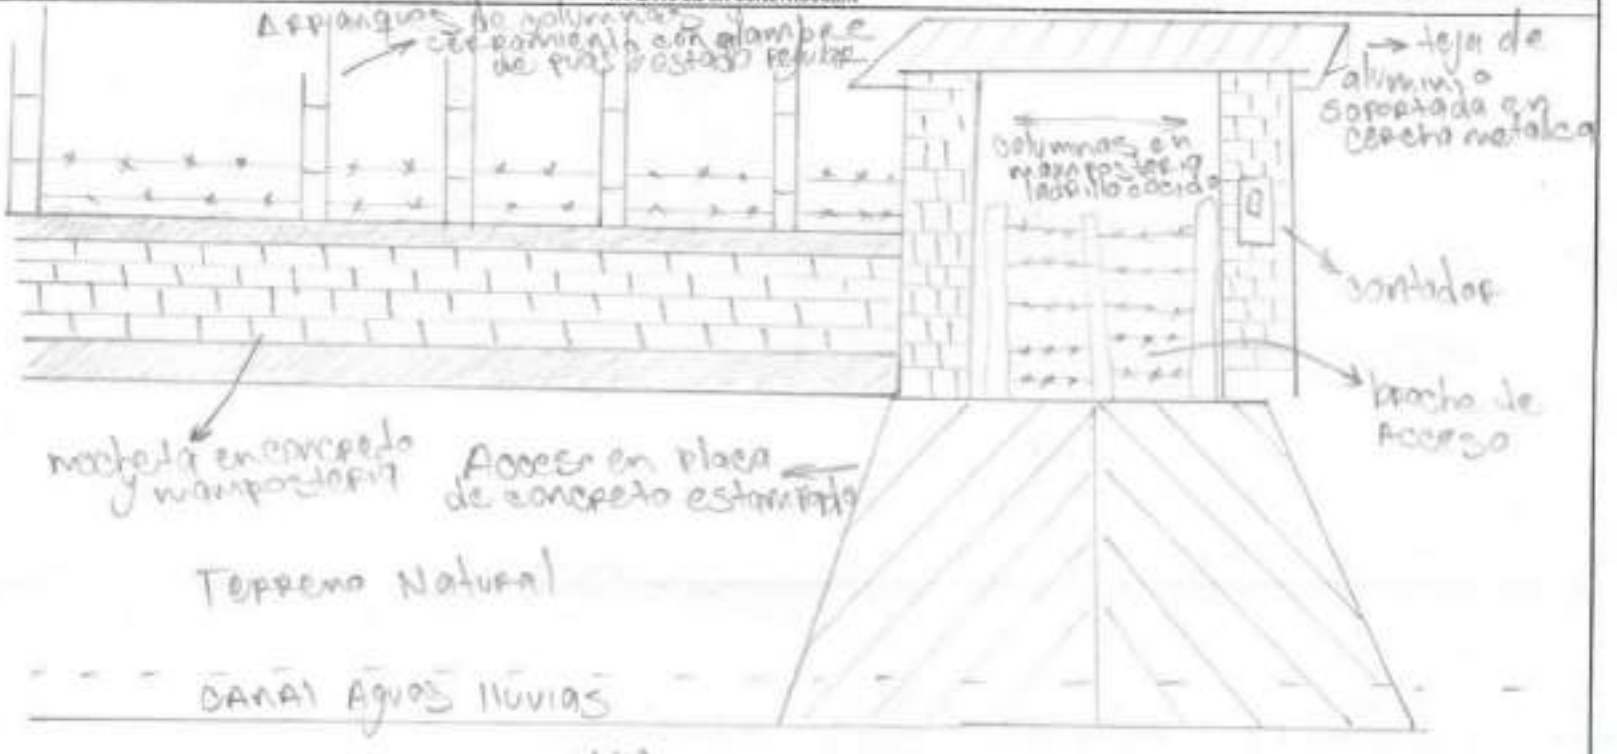

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 28108831	Firma Nombre: Sebastian Ortiz Arango Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 891037-061823D	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.
		Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Original: Contratista
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Contrato VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 7 - 07 - 26
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 215 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Mesitas del C.		PR
Dirección	Km 7+665 lado izquierdo		Teléfonos	3115647819	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Omar Cesar Franco Rodriguez			CC No.	2954014
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	
Edad de la construcción	N/A	No. de Apartamentos	N/A	No. de pisos	
No. de Hogares	N/A	No. total residentes	N/A	Mujeres jefes de hogar	
Niños (menos de 14 años)	N/A	Adultos mayores (más de 60 años)	N/A	Personas en situación de discapacidad	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				sin edificar
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				ondulado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cual? N/A

DESTINACION ECONOMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro? Cuál?	☐	

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma	Firma
Nombre:	Nombre: Silvia Juliana Ortiz Amaya	Nombre:	Nombre: Omar Cesar Franco Rodriguez
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 091037-06TB230	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 2954014

15.ago.26 1509.

Notas: 1. Su firma es constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario dejando copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Gobernación CUNDINAMARCA	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MM-01.3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENTORÍA DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 02 07 26
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Cassons	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificado	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	N/A

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Adiciones (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paredes en madera	☐
11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	N/A

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento superior	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con reforzamiento deficiente y estructuras flexibles	☐
5. Estructuras livianas	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	N/A

Observaciones: Solo se hizo levantamiento del Cerramiento del predio.

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Pese evidencia Andenes y Cerramientos en terreno muestra presencia de vegetación en la entrada y pruebas de cemento.

ESTADO DE CERRAMIENTOS

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en postes de madera y alambre pas. tres líneas, regular estado el predio en un frente sin edificaciones se le cubren vegetal

Consorcio VIC-GER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	GADPS-GEN-Se-3-FR-4
		VERSION	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	
Contrato de Obra No. XXXX-1461-2025	Contrato de Interventoría No. 218 - 2025	Acta de Vecindad de Seguimiento No.	8	(Día / Mes / Año) 01 04 26.

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos en los consiguientes en la página destinada se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. En caso necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del consorcio técnico, no fueron tenidas en cuenta en el espacio propuesto del formato Acta de Vecindad.

Contrato VCGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPGAPA-M-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	
Contrato de Obra No. VCGU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento	Día / Mes / Año 01 07 25

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

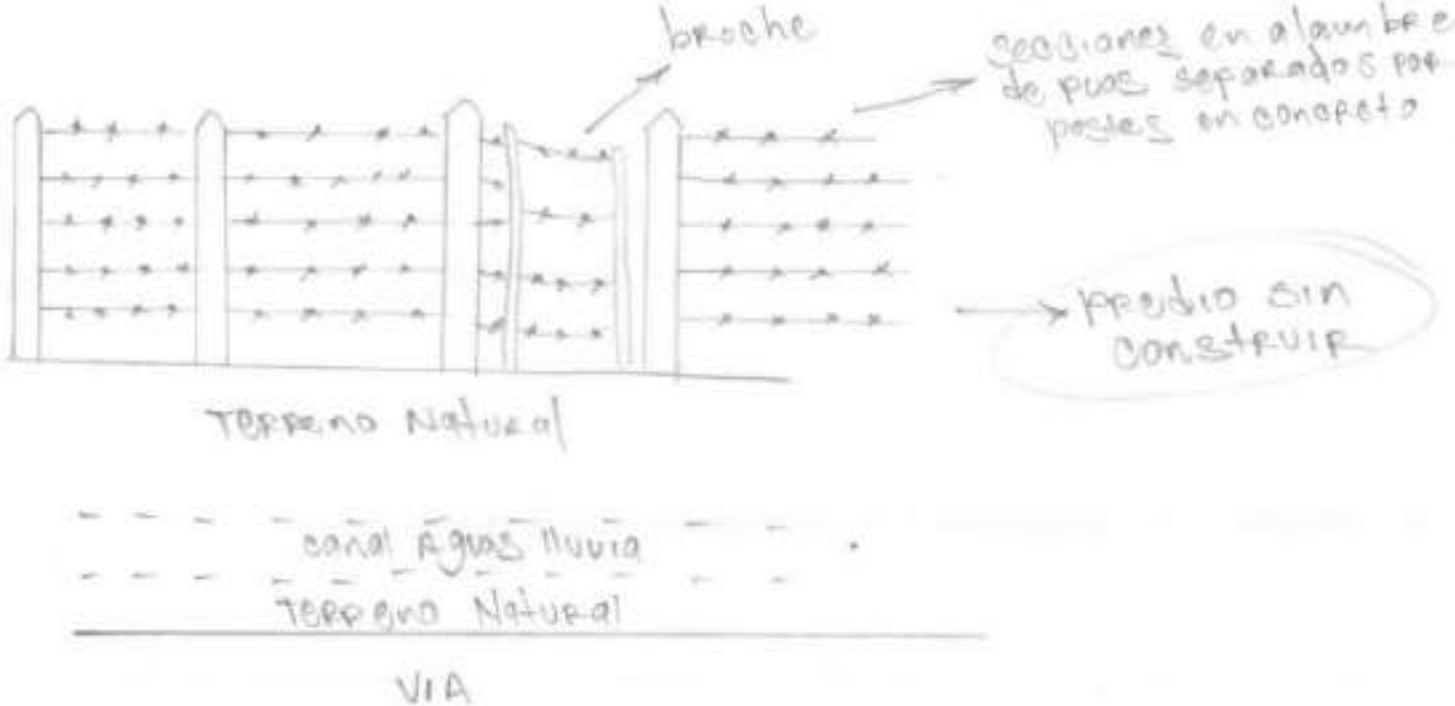

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Sebastián Ospina Rivera Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 091037 - 061823O	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15 202 1547	Firma Nombre Testigo: Omar Hernando Rodriguez Rodriguez C.C. O NIT: 2954014

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-M43-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA DUPLARSE, EN LAS PROVINCIAS DE: SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA (Día / Mes / Año) 07 07 26

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento	Municipio	Vereda	PR
				KM 7+640

Dirección	José Ramón León Ballares	Teléfono	3136498649
Nombre de la persona que atiende la visita: José Ramón León Ballares		CC No.	79943641
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.	

Edad de la construcción	4 años	No. de Apartamentos	1	No. de pisos	2
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	0	Personas en situación de discapacidad	0

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado	Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	Si
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	Ondulado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Solidaridad	[ ]	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: José Ramón León Ballares	Nombre: Sebastian Ortiz Amaya	Nombre: [illegible]	Nombre
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 79943641	Matrícula profesional No.: 076037-0618230	Matrícula profesional No.: [illegible]	C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Convenio VICIDAR 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-05-3-Fr-x
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	(Día / Mes / Año) 27 07 25
Contrato de Obra No. ICDU 1484 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Cabezales	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Cimiento ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificado	☐	8. Otro. Cuál? N/A		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? N/A		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y pantallas en concreto	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reforzadas (si / no)		11. Pórticos y pantallas en otros materiales	☐	1. Edificaciones con aislamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En alturas No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión metros de anclo (paralelo a la vía)		13. Muros en baja pizarra	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción en provisional	☐	5. Estructuras flotantes	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixta	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? N/A		5. Otro. Cuál? N/A		17. Otro. Cuál? N/A		7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Se evidencia cuneta frente del Predio con tubería con 32 metros de largo, acceso en terreno natural! Hay (2 casas) de inspección frente del predio Fecha del acceso en madera Zuparo buen estado; cubierta en perfiles metálicos en buen estado en teja de PBC impuesta.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en empañetado en mampostería; Tubos galvanizados con malla Eslabonada de 6 cm en la parte inferior de las columnas

Consorcio VIDEAM 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROYECTO MISIONAL, GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"ESTRUCTURACIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES PARA GOBERNAR EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALMEIDAS Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	
Contrato de Obra No. [illegible]	Contrato de Interventoría No. [illegible]	Acta de Vecindad de Seguimiento	Nro	3	07-11-25

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diligenciada, use nuevas hojas adicionales.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo técnico de personal social del proyecto.
3. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones que amplíe el diligenciamiento de esta. Se firma, anexa y cuenta en el documento propuesto del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MAGPS-MN-M-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA OPRIMIR, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día | Mes | Año) 12-07-25
Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 210 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

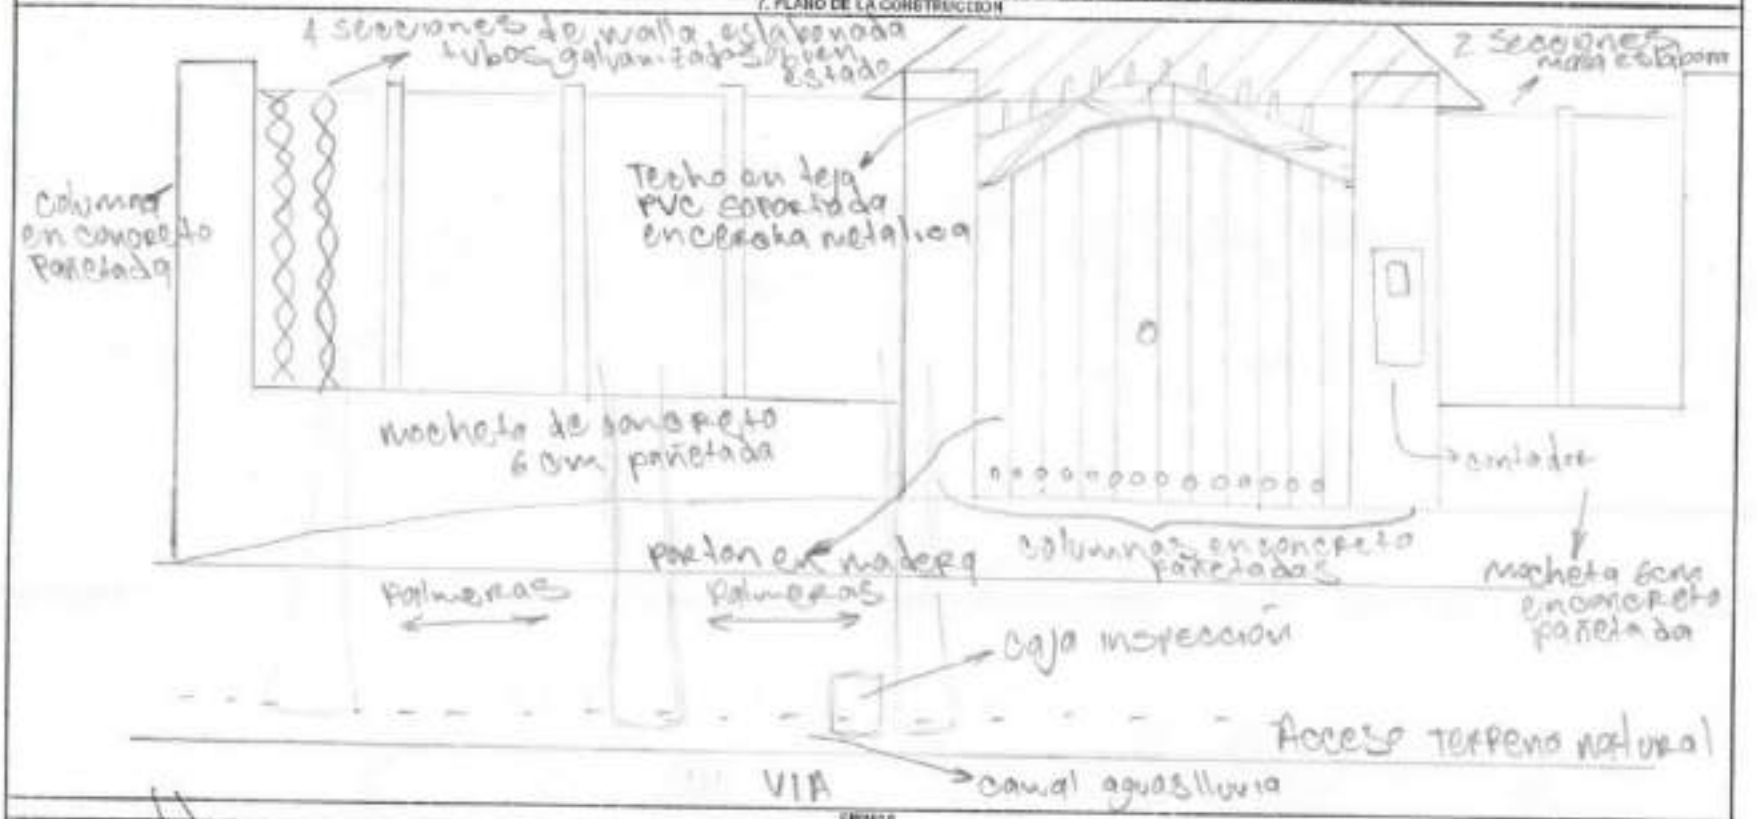

FIRMAS

Firma Nombre: Representante Unidad Social C.C. O NIT: Cargo: Contratista Cuotas: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Auditor de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)	Firma Nombre: Sebastian Ovalle Araya Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 991037-0618230	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
Convenio VICOSER 2021		VERSION	1
		HOJA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUE CRECER, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 07 07 24
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Medias del Cielo		PR
Dirección:	KM 79610. Lado izquierdo		Teléfonos:	3102958580	
Nombre de la persona que atiende la visita: Elva Belasco				CC No: 29168831	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción: José Vicente Contreras Navarrete				CC No: 19282762 Bog.	
Edad de la construcción: 2 años		No. de Apartamentos:		No. de pisos:	
No. de Hogares:		No. total residentes:		Mujeres jefes de hogar:	
Niños (menos de 14 años):		Adultos mayores (más de 60 años):		Personas en situación de discapacidad:	
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado			Obra fría	
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No				
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [X] NO [ ]
3. Industrial		9. Cultural		Area del garaje
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuaria		11.Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma		Firma		Firma	
Nombre		Nombre: Sebastian Ovalle Amaya		Nombre	Elva
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Testigo	28168831
C.C. O NIT		Matrícula profesional No.: 091037-061230		C.C. O NIT	

Nota: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Cundinamarca VICTORIOSA 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPSAMPEIO-FR-04
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 07 07 25
Contrato de Obra No. (CCU) 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN:

1. Zapatas		
2. Vigas corridas		
3. Sistema mixto		
4. Caissons		
5. Concreto ciclópeo		
6. Pilotes		
7. Placa de cimentación		
8. No identificada		
9. No aplica		
10. Otro. Cuál?	N/A	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	
2. Placa en Steel deck	
3. Estructura metálica y teja	
4. Estructura de madera y teja	
5. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza en concreto	
2. Placa aligerada de concreto	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	
4. Vigas metálicas	
5. Canchas metálicas	
6. Entramado en madera	
7. No aplica	
8. Otro. Cuál? N/A	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Adiciones (s/ / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionados	
3. En extensión: metros de ancho (perpendicular a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	
2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema combinado en concreto	
4. Prefabricados en concreto	
5. Mampostería confinada	
6. Mampostería reforzada	
7. Mampostería no reforzada	
8. Pórticos en acero	
9. Pórtico arriostrado en acero	
10. Pórticos y pantalla en madera	
11. Pórticos y pantalla en otros materiales	
12. Muros en bahareque	
13. Muros en tapia pisada	
14. Muros en adobe	
15. Construcción improvisada	
16. Mixta	
17. Otro. Cuál? N/A	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	
2. Edificaciones reforzadas	
3. Mampostería reforzada	
4. Estructurales con confinamiento deficiente y estructura histórica	
5. Estructurales ligeras	
6. Construcciones sencillas	
7. Otra. Cuál? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso en terreno natural, se evidencia paso de agua

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramientos en postes de concreto con alambre pua se evidencia maleza con contadores) Cerramientos en buen estado.

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS BIANUAL DE MANTENIMIENTO VIAL Y OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO QUE COMPRENDAN EL PROGRAMA DE CAMBIOS SPOBAN PTS, CAMBIOS PARA CUNETAS DE TIPO ALTAS PENDIENTES DE SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN MANUAL EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA	FECHA	
Contrato de Obra No. [illegible]	Contrato de Interventoría No. [illegible]	Acta de Vecindad de Referencia:	04-02-26

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:

Constancia VTCQSR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES S. CAMINOS PARA QUEDARSE", EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	4 (Día / Mes / Año) 07 07 26
Contrato de Obra No. IDCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

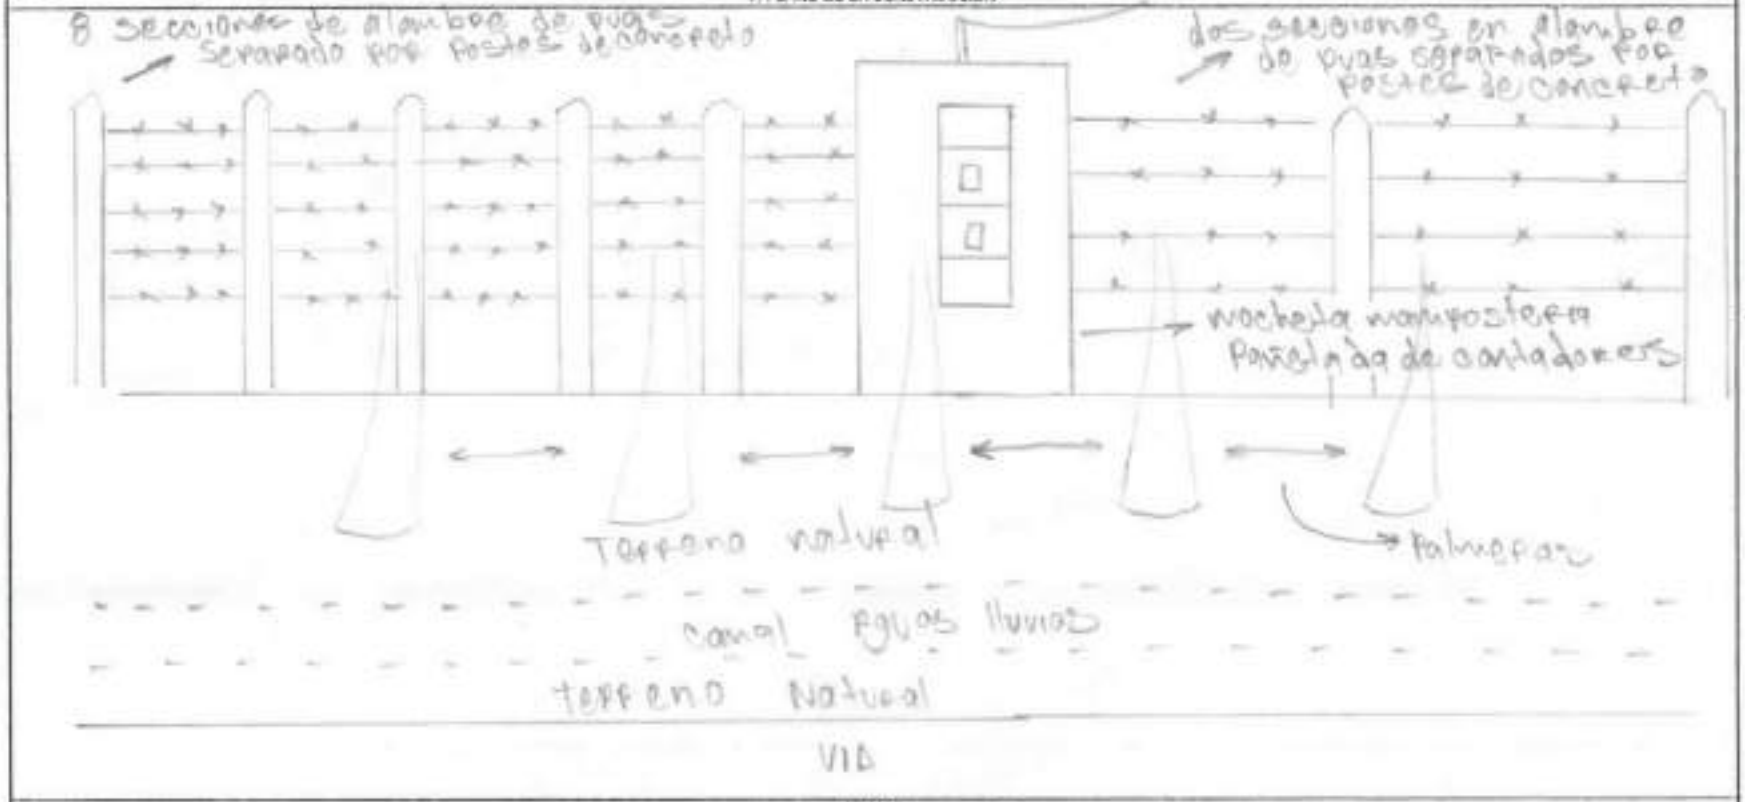

FIRMAS

Firma	Firma	Firma		Firma	
Nombre:	Nombre: Sebastian Ovalle Angel	Nombre:		Nombre	
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría		Testigo	
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 0910237 - 061823	Matrícula profesional No.:	13 206 26 1369	C.C. O NIT:	28 168 831

Original: Carpeta
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Convenio VTCQS R 2023

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 7 Julio 2025 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU-140-2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Hacienda dalia		
Dirección:	K 7 + 655 Derecho		Teléfono:	311 564 7817	
Nombre de la persona que atiende la visita: Omar Franco				CC No. 2453014	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Hermanos Morales				CC No. 2453014	
Edad de la construcción:	—	No. de Apartamentos:	—	No. de pisos:	2
No. de Hogares:	1	No. total residentes:	—	Mujeres jefes de hogar:	—
Niños (menos de 14 años):	—	Adultos mayores (más de 60 años):	—	Personas en situación de discapacidad:	—
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☑	7. Educativo	☐	
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☑	11. Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☑ NO ☐

Uso del garaje: acceso.

FIRMAS

Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:		Nombre: Sebastian Ovalle Arango		Nombre:	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:		Matrícula profesional No.: 091037-061830		Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 2954014

Notas: 1. En firme en concordancia, con lo consignado en la presente Acta de Vecindad correspondiente a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Contenido VIGENTE 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MAGPS-MN-06.3-Fr-x
		VERSION	1
		PAGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUERERSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	7 Julio 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:		SISTEMA DE ENTREPISO:		SISTEMA ESTRUCTURAL:		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Cabezales	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Contratrabes	☐	5. Cajetes metálicos	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de aproximación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificado	☐	8. Otro. Cuál? N/A		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No aplica	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? N/A		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y pantallas en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y pantallas en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros de mampostería	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros de tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros de adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras flotantes	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	5. Otro. Cuál? N/A		15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? N/A				17. Otro. Cuál? N/A		7. Otra. Cuál? N/A	

Observaciones:
Levantamiento de requerimientos de fachada arquitectos

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Predio en mortado con cerca en piedra en mal estado, brecha de acceso en madera y alambre de puas. área con acceso columnas en ladrillo sin puertas y área de invernaderos

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Sin anden, acceso en terreno natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento en piedra en mal estado, algun con alambre de puas, columnas en ladrillo sin puertas y brecha en madera y alambre de puas

Consorcio VICDER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-N-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.

6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Gobierno VIGENTE 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MA-GPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4.

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	7 Julio 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION



FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Sebastian Ovalle Arroyo	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 091037 - 061B230	Matrícula profesional No.: 15722261569	C.C. O NIT: 2954014.

Original: Contratista.
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Contrato VICGES 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MI-M3-FR-4
VERSIÓN	1
PAGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 7 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU-149-2025 | Contrato de Interventoría No. 218-2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Viotá	Vereda: Viotá Pie C		PR
Dirección:	K7+640 Derecho		Teléfonos:	3208021648	
Nombre de la persona que atiende la visita: Elva Vaboco				C.C. No.: 29.068.831	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Jose Enrique Zapata Vaboco				C.C. No.: 19.060.782	
Edad de la construcción	—	No. de Apartamentos	—	No. de pisos	3
No. de Hogares	—	No. total residentes	—	Mujeres jefes de hogar	—
Niños (menos de 14 años)	—	Adultos mayores (más de 60 años)	—	Personas en situación de discapacidad	—
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		Sin información
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	Garaje SI ☒ NO ☐	
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:	
4. Minero	☐	10. Religioso	☐		
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐		
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐		

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:		
Nombre:	Nombre: Sebastian Avila	Nombre:	Nombre: Elva Vaboco		
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo		
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 0910237-05230	Matrícula profesional No.: 15202613169	C.C. O NIT: 29068831		

Notas: 1. Su firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Cundinamarca VICTORIOSA 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IF-SAP-FR-4
		VERSION	1
		PAGINA	2.

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	7 julio 2025 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU-1401 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	☐		
2. Viga corridas	☐		
3. Sistema mixto	☐		
4. Cabezales	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐		
6. Pilotes	☐		
7. Placa de cimentación	☐		
8. No identificada	☐		
9. No existe	☐		
10. Otro. Cuál?	N A		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐		
2. Placa en Steel deck	☐		
3. Estructura metálica y teja	☐		
4. Estructura de madera y teja	☐		
5. Otro. Cuál?	N A		

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐		
2. Placa aligerada de concreto	☐		
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐		
4. Vigas metálicas	☐		
5. Cerchas metálicas	☐		
6. Entramado en madera	☐		
7. No aplica	☐		
8. Otro. Cuál?	N A		

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (S / No)	
2. En altura: No. de pisos adicionados	
3. En extensión: metros de anclaje (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de hundimiento (paralelo a la vía)	
5. Otro. Cuál? N A	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐		
2. Muros estructurales en concreto	☐		
3. Sistema combinado en concreto	☐		
4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Mampostería confinada	☐		
6. Mampostería reforzada	☐		
7. Mampostería no reforzada	☐		
8. Pórticos en acero	☐		
9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Pórticos y porales en madera	☐		
11. Pórticos y porales en otros materiales	☐		
12. Muros en balaustres	☐		
13. Muros en tapia pisada	☐		
14. Muros en adobe	☐		
15. Construcción en provisada	☐		
16. Mixto	☐		
17. Otro. Cuál? N A			

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐		
2. Irregularidad media	☐		
3. Irregularidad baja o inexistente	☐		

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐		
2. Irregularidad media	☐		
3. Irregularidad baja o inexistente	☐		

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐		
2. Edificaciones reforzadas	☐		
3. Mampostería reforzada	☐		
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	☐		
5. Estructuras ligeras	☐		
6. Construcciones simples	☐		
7. Otro. Cuál? N A			

Observaciones: Levantamiento de acta de vecindad con vecino responsable del predio

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☒	REGULAR ☐	MALO ☐	
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento en postes de concreto y alambre de puas. Acceso en concreto fisurado con tubería de conducción de aguas lluvias. Portón metálico con apoyo en columnas enchapadas y area interna con placa en concreto y ladrillo

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☒	
								DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Sin anden, acceso placa en concreto agrietada, con tubería de conducción de aguas lluvias

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO	X	POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐	
								MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento en postes en concreto y alambre de puas en regular estado, a la intemperie

Cumpliendo VIGOR 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MAGPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.


6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Gobernación de CUNDINAMARCA 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MMSPS-MN-M-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA OLVIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	9 JULIO 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU-149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

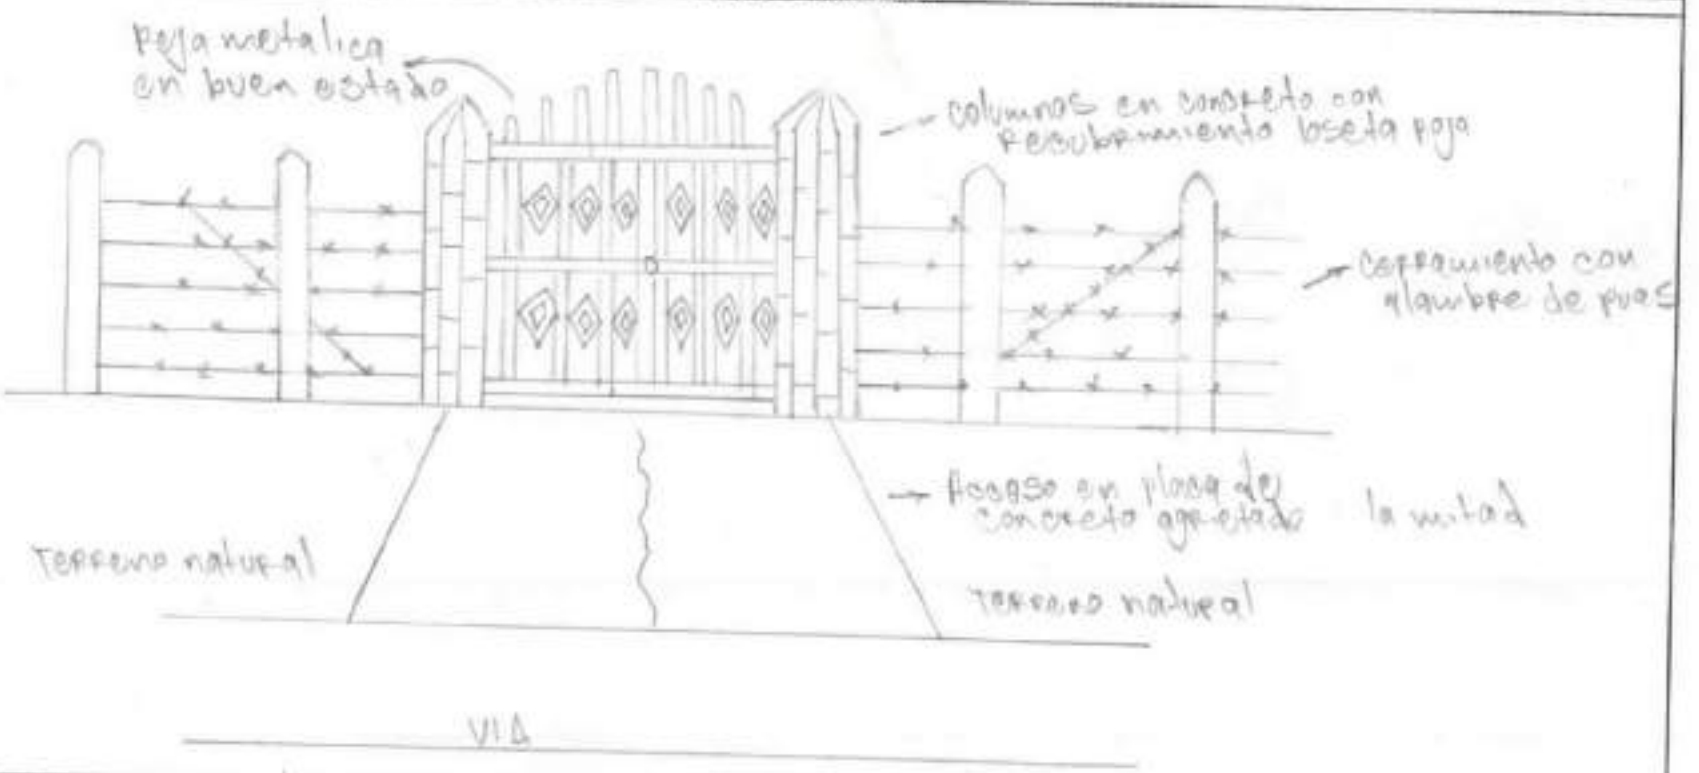

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: Cargo: Contratista Dirección: Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)	Firma Nombre: Salomón Ocampo Acosta Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 880137-0618230	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15-162-26-9569	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT	Edwar Ortiz 29168831	

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MI-IN-S-FR-4
VERSIÓN	1
HOJA No.	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	7 Julio 2025 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | **Acta de Vecindad de** Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Mesitas del C.		PR
Dirección	K7 + 550 Derecho		**Teléfono**	311 564 7817	
Nombre de la persona que atiende la visita: Omar Franco				**CC No.** 2.954 014	
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				L
Nombre del responsable / propietario de la construcción: —				**CC No.** —	
Edad de la construcción	—	No. de Apartamentos	—	No. de pisos	L
No. de Hogares	—	No. total residentes	—	Mujeres jefes de hogar	—
Niños menores (0-14 años)	—	Adultos mayores (más de 60 años)	—	Personas en situación de discapacidad	—
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarillado		
3. Energía		
4. Gas		
5. Teléfono		
6. Televisión cable		
7. Internet		
8. Otros		

Observaciones del estado de las redes: Sin información

Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐

Uso del garaje: garaje

FIRMAS

Firma
Nombre
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma
Nombre: Jacobo Mauricio Avella Amaya
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 091037-86182230

Firma
Nombre: Edgar Amaya
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 15-202262569

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT: 1144040644

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Contraloría VIGILER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MIN-IN3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUECARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	7 Julio 2026 (Día | Mes | Año)

Contrato de Obra No. ICCU 110 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Cassons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificado	☐	8. Otro. Cual? N/A		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. Ninguno	☐			9. Pórticos arriostrados en acero	☐		
10. Otro. Cual? N/A		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y porales en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (Si / no)		11. Pórticos y porales en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento sismoresistente	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en ladrillo macizo	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras frágiles	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura en madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual? N/A		6. Otro. Cual? N/A		17. Otro. Cual? N/A		7. Otro. Cual? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS — BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Portón metálico anclados en columnas en concreto, rampa izquierda doble, columna con fila faltan para instalación de energía. Cubierta en estructura metálica y teja termoacustica a la interperie. Falta de dumbado y media tapión

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No Aplica.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GRADOS ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin anden, acceso en terreno natural tubería de aguas lluvias en acceso vehicular tapanado

ESTADO DE CERRAMIENTOS — BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Postes de concreto 5 hilos de alambre de pua a la interperie.

Contratista VICCIER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MAGPS-MIN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

8. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.


Consorcio VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPGSPA-M-3-F14
VERSIÓN	1
PÁGINA	9

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		FECHA: 7 Julio 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

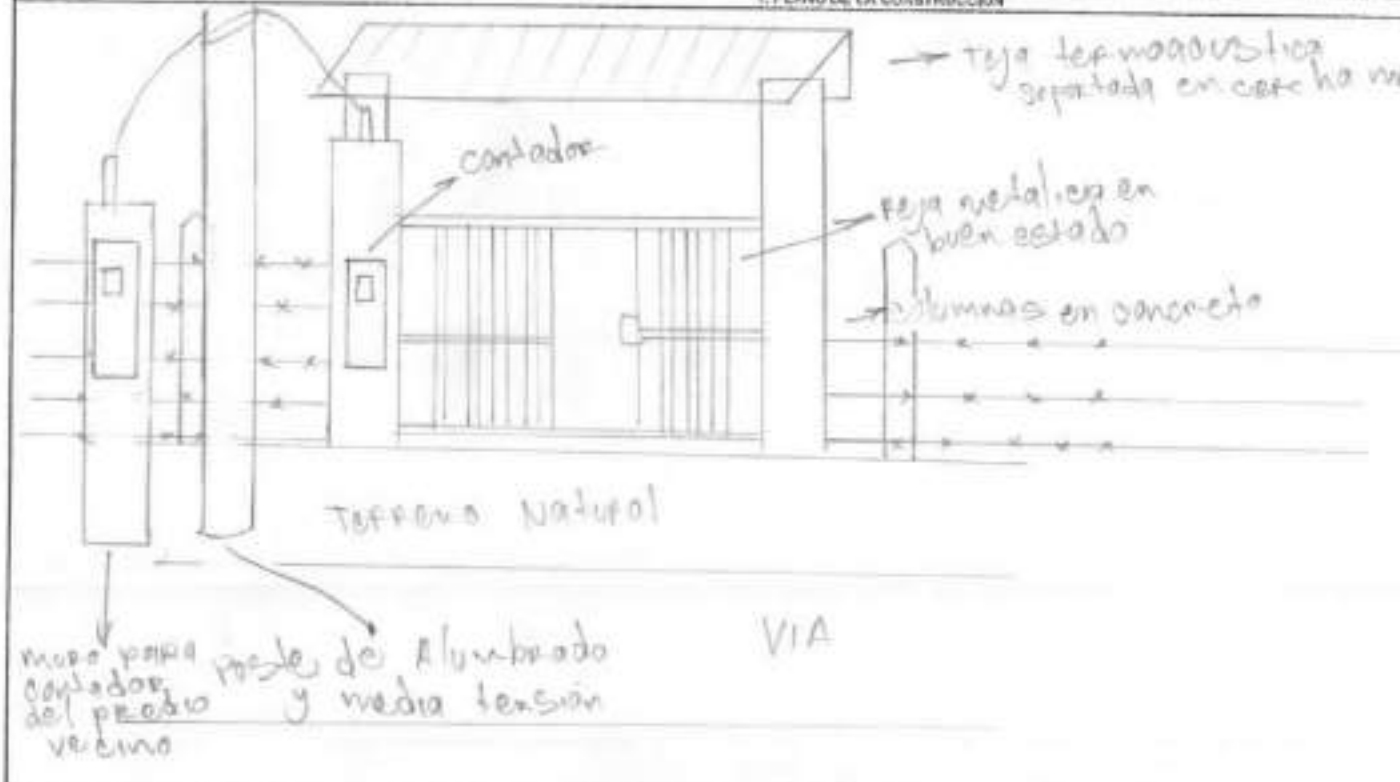

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Sebastian Ovalle Arango	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 091037-061230	Matrícula profesional No.:
Original: Contratista.		
Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).		

Firma:	
Nombre:	
Testigo	
C.C. O NIT:	2989 0114

Cundinamarca VICTORIOSA 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MN-IN3-FR-4
VERSION	1
PAGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE BUMPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	(Dia / Mes / Año) 07 07 26

Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Acacías	Vereda: Hogar del Caballero		PR
Dirección:	KM 7+535 lado izquierdo		Teléfono:	3115477877	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Omar Orlando Franco Rodríguez			CC No.	2954014
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				NA
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	

Edad de la construcción:	NA	No. de Apartamentos:	NA	No. de pisos:	NA
No. de Hogares:	NA	No. total residentes:	NA	Mujeres jefes de hogar:	NA
Niños (menos de 14 años):	NA	Adultos mayores (más de 60 años):	NA	Personas en situación de discapacidad:	NA

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No	NO
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	ondulado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas	X		
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Call7

DESTINACIÓN ECONOMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje
SI ☒ NO ☐
Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 8910237 - 0618250	Matrícula profesional No.: C.C. O NIT:
		Nombre y Testigo: Omar Orlando Franco Rodríguez
		C.C. O NIT: 2954014

Notas: 1. Se firma en conformidad, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Contraloría VIGILA 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MA-SPA-PAI-M-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 17 03 24
Contrato de Obra No. ICCU-140 / 2023	Contrato de Interventoría No. 218 / 2023	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas riostras	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Láminas colaborantes (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Caissons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificado	☐	8. Otro. Cuál? N/A		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No aplica	☐			9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cuál? N/A		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y puentes en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (s / no)		11. Pórticos y puentes en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros de balaustres	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros de áreas (paralelo a la vía)		13. Muros de tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros de adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras flotantes	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	5. Otro. Cuál? N/A		15. Construcción industrializada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cuál? N/A				17. Otro. Cuál? N/A		7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑO EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Andén en tramos mal tomado, no se identifican daños, Presencia de vegetación, Rampa de acceso en predial con presencia de oxidación, cubierta con maleza en mal estado en estado de deterioro, Tejas en eternit mal estado notas se evidencia columnas de concreto en regular estado.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramientos en predial y cerca viva en mal estado, se evidencia Dos Unos Incompletos notas si se evidencia falta de columnas sin vigas

	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS VIALES, DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		HOJA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS DEL CORREGIMIENTO EL PEDREGAL DEL CARMEN EL CARMEN DE APICALÁ, MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DEL CORREGIMIENTO EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE APULO, CUNDINAMARCA"	FECHA	
Contrato de Obra No. [illegible]	Contrato de Interventoría No. [illegible]	Acta de Vecindad de: [illegible] Beneficiarios:	67

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página anterior, se deberá insertar esta página.
2. El Acta de vecindad es un documento técnico que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el objeto de garantizar la viabilidad del proyecto.
3. Si existe información que no pueda incluirse en los campos anteriores, por espacio insuficiente, se podrá anexar una página adicional de observaciones, que deberá ser debidamente firmada, identificada y numerada en el encabezado, siguiendo el formato Acta de Vecindad.

Consorcio VIAGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IM-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. ICCU 146 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐
			Día / Mes / Año 07 07 25

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

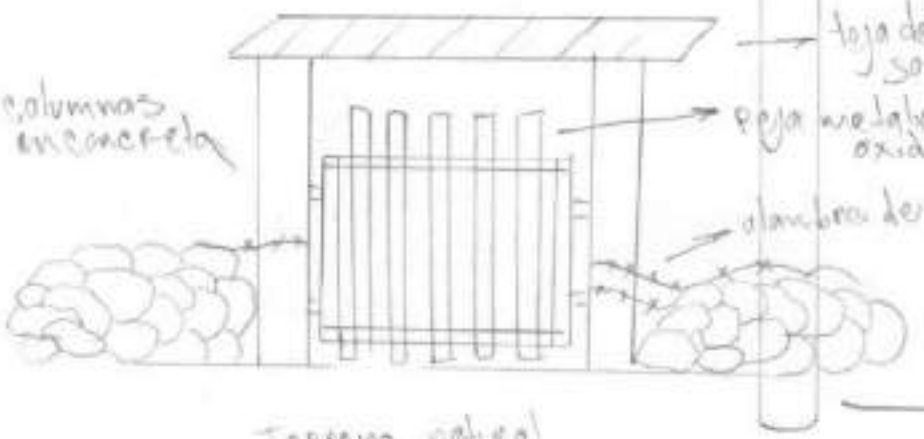

Teja de zinc en mal estado soportada en cercha metalica

Reja metalica con presencia de oxidacion en la parte inferior

alambre de pua en mal estado

muros de ladrillo de cerramiento

Poste de Alumbrado en desuso

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: Oficina Consultora	Firma Nombre: Sebastian Ovalle Amaya Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 091037-06182SCund	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. 25-226-[illegible]
Copia: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)		C.C. O NIT:

Firma
Nombre
Gestion Resp. SAS Nombre del Caballero
C.C. O NIT: 79.540.14

Consorcio VIGIAS 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-01-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 143 / 2025	Contrato de Interventoría No. 213 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]	1

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Monte del Gallinero		PR:
Dirección:	KB + 993		Teléfonos:	311 569 7517	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Omar Franco			CC No.:	2954019
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.:	
Edad de la construcción:	N/A	No. de Apartamentos:	N/A	No. de pisos:	N/A
No. de Hogares:	N/A	No. total residentes:	N/A	Mujeres jefes de hogar:	N/A
Niños menores de 11 años:	N/A	Adultos mayores (más de 60 años):	N/A	Personas en situación de discapacidad:	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificio 2. Casa de lote 3. Terreno				1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano 2. Ondulado 3. Escarpado				1

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Gas		X	
5. Telefono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros			Cuál?

ESTRATIFICACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial		7. Educativo		Garaje
2. Comercial		8. Institucional		SI [ ] NO [X]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agroindustrial		11.Institucional		
6. Gubernamental		12. Otro		

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 08202-087575	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 2954019

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada e conformidad, se entregará al propietario responsable copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Convenio VICUER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MIISPS-MN-84-2-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CURDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/07/2018 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]	1. Placa maciza de concreto	[ ]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa aligerada en concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[X]
3. Subzona rocosa	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4. Cascotes	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[ ]	5. Mampostería confinada	[ ]	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de compactación	[ ]	7. No aplica	[X]	7. Mampostería no reforzada	[ ]	2. Irregularidad media	[X]
8. No identificada	[ ]	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9. No visible	[X]			9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y pantes en madera	[ ]	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)	N/A	11. Pórticos y pantes en otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento incremental	[ ]
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionados	N/A	12. Muros en tapia pisada	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con sistema sismo-resistente diferente y estructuras híbridas	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]	8. Otro. Cuál?		15. Construcción improvisada	[ ]	5. Construcciones antiguas	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			16. Mixto	[ ]	6. Construcciones antiguas	[ ]
5. Otro. Cuál? N/A				17. Otro. Cuál? N/A		7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	BUENO [ ]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	BUENO [ ]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
								DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	BUENO [ ]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
								DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA	N/A	GRADO DE ANDEN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		BUENO [ ]	REGULAR [ ]	MALO [ ]
								MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Cerramiento en postes de madera y alambre de puas

Consorcio VICIDER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MADPS-MN-N-GPS-4
		VERSION	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES: CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. IDCU 149 / 2020	Contrato de Interventoría No. 216 / 2020	Acta de Vecindad de Registrante	---	(Día / Mes / año) 15-7-26

REGISTRO FOTOGRAFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diecinueve, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el espacio propuesto del formato Acta de Vecindad.

Cobertura VIGENTE 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MACPS-MN-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 15 07 24
Contrato de Obra No. (CCU 140 / 2024)	Contrato de Interventoria No. 219 / 2024	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

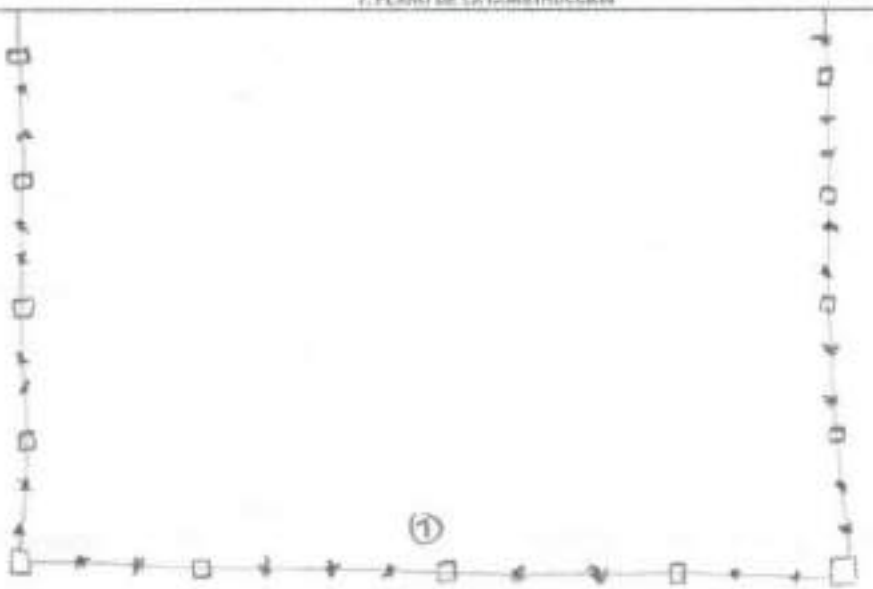

1. Cerramiento sin acceso

K8+998

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Maria J. Acosta Ing., Residente Contratista Matrícula profesional No.: 091033-076846	Firma Nombre Ing. Residente Interventoria Matrícula profesional No.: 15 202 26 15 69	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: 2954014

Original: Contratista
Copias: Interventoria, Coordinación de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contratista (cuando aplique), Archivo Central

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-R-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 15 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Vecindad [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación	1. Departamento: Cundinamarca	2. Municipio: Fundación	Vereda: Hoyitos del C.		Plt:
Dirección:	KB+295		Teléfono:	311 569 7817	
Nombre de la persona que atiende la visita: Omar Franco				CC No. 2954014	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. Sin arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				—
Nombre del responsable / propietario de la construcción: —				CC No: —	

Edad de la construcción:	—	No. de Apartamentos:	—	No. de pisos:	—
No. de Hogares:	—	No. total residentes:	—	Mujeres jefes de hogar:	—
Niños menos de 14 años:	—	Adultos mayores (más de 60 años):	—	Personas en situación de discapacidad:	—

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificación; 2.Obra Gris; 3. Terminado	1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
8. Internet			
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[X]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Tiene: SI [X] NO [ ]

Uso del predio: —

FIRMAS

Firma: —
Nombre: —
Responsable Unidad Social
C.C. ORIT:

Firma:
Nombre: Edwin Andres Ovalle Arciniega
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No. 091037-0618230

Firma:
Nombre: Victor Moya
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No. 15-202261569

Firma:
Nombre:
Testigo
C.C. ORIT:

Firma:
Nombre: Omar Franco
2954014

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a lo realizado.
2. Una vez firmada y conformidad, se entregará el original del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Gobernación VICHADA 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROGRAMA MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MHOPS-MN-01-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2.

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 15 Julio 2025 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐
2. Viga corrida	☐
3. Pedestal metálico	☐
4. Cabezote	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	N A

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Viga metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	N A

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórticos arriostrados en acero	☐
10. Pórticos y porlés en madera	☐
11. Pórticos y pórtales en otros materiales	☐
12. Muros de tabiquería	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción industrializada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	N A

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Edificaciones con reforzamiento deficiente y estructuras flexibles	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones precarias	☐
7. Otro. Cuál?	N A

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura en madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	N A

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Numerales (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionados	
3. En extensión: metros cuadrados ocupados a la vía	
4. En profundidad: metros no fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	N A

Observaciones: Se recibe levantamiento de fachada con testigo (Celulares)

2. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Algunos de ladrillo con postes prefabricados y malla eslabonada con cerca viva en regular estado, columnas reforzadas en ladrillo soportan portal metálico con madera en regular condición alcantarilla tapada

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		OBSTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		DIMENSIÓN ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Anden no existe, acceso en terreno natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: antepecho 4 Lineas de Ladrillo, postes prefabricados, malla eslabonada y cerca viva.

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Gobernación HIGSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROFESIONAL GESTOR AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIAS OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MAGPS-MN-IN-0-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/Julio/2026 Día / Mes / Año
Contrato de Obra No. (OCU) 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

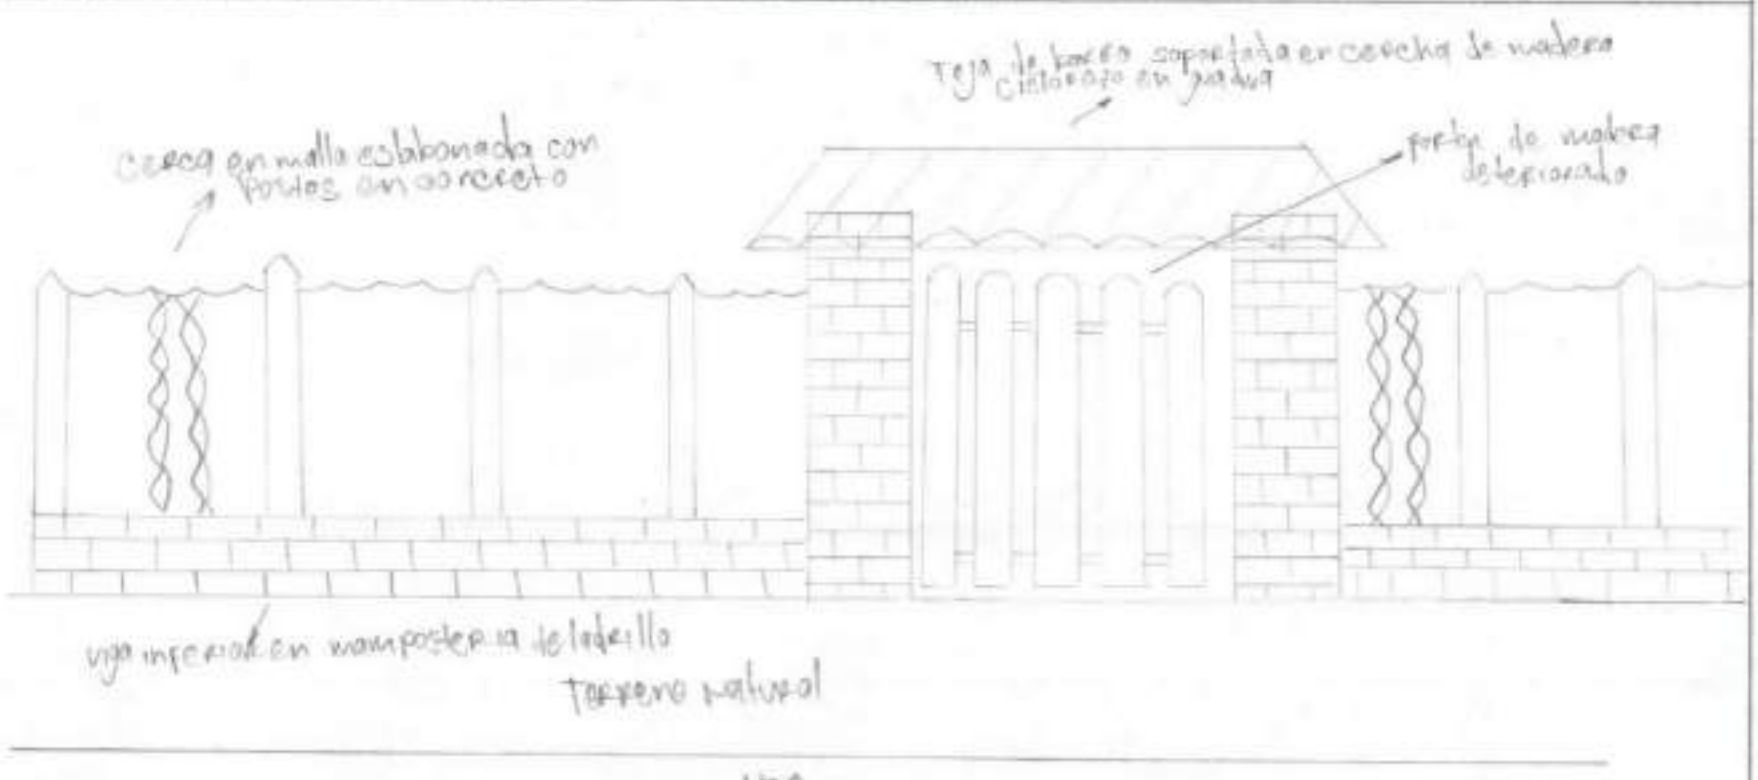

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: Original: Contratista Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa y F)	Firma Nombre: Sebastián Calle Arango Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 091037-052230	Firma Nombre Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 13 Tol 26 1769	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: 2954024

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL: GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MJGPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: (Día / Mes / Año) 13 07 24

Contrato de Obra No. ICCU 548 / 2023 | Contrato de Interventoría No. 318 / 2023 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Hoyo Caballero		PR:
Georeferenciación	VHB1963 lado izquierdo		Teléfonos:		
Nombre de la persona que atiende la visita: Omar Cesar Franco Rodriguez				CC No.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				NA
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	
Clase de la construcción	NA	No. de Apartamentos	NA	No. de pisos	NA
No. de Hogares	NA	No. total residentes	NA	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar; 2. Alta Ocu; 3. Terminado				Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				No
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				ondulado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de los redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Informal		X	
7. Otros		X	Cual?

DESTINACIÓN ECONOMICA

1. Residencial	X	7. Educativo		ACCESOS VEHICULARES
2. Comercial		8. Salubridad		Garage: SI [X] NO [ ]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garage:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11. Institucional		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 252023431272 CND	Matrícula profesional No. 15202-26-1969	C.C. O NIT: 29540147

Notas: 1. Su firma en constancia, que lo consignado en el presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado e contramedad, se entregará el propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Contrato VIC 0808 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-247-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA (Día / Mes / Año): 15 09 25

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐	
2. Viga corrida	☐	
3. Dovela rígida	☐	
4. Cassons	☐	
5. Carrasto (bolillo)	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de distribución	☐	
8. No identificada	☐	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cuál?	N/A	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steeldeck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Viga metálica	☐
5. Cielos metálicos	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	N/A

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Ninguna (si / no)	
2. En altura (No. de pisos adicionales)	
3. En extensión: (estimado ancho (cantidad a la vía)	
4. En profundidad: (metros de Tunda (excavación a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórticos arriostrados en acero	☐
10. Pórticos y pareles en madera	☐
11. Pórticos y pareles en otros materiales	☐
12. Muros de bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Otro	☐
17. Otro. Cuál?	N/A

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con sobrecimiento deficiente y estructuras livianas	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	N/A

Observaciones:

4. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DESTRUCCIÓN DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		DESNIVELAMIENTO APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso Peatonal en madera en medianas condiciones, Andenes presentan descascaramiento Cubierta en Teja eternit una de las Tejas presenta fisura. y estructura metalica

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		PUNTOS DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en mamposteria Terminado y Pintado en regular estado, presenta humedad y Manchas de hongos. Por el agua en la Cabeza de muro, fisura Vertical entre Muro y Columna

Consorcio VCOER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	GASPS-MN-01-5-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROYECTO DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEHACER, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. 1CCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de Seguimiento No.	Día / Mes / Año 15 / 7 / 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página anterior, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Convenio VIGGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS FORMATO DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MUMAFR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUEDAMILES, EN LAS PROVINCIAS DE RIONEGRO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2020	Contrato de Interventoría No. 218 / 2020	Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento / Final	(Día / Mes / Año) 15 07 21

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

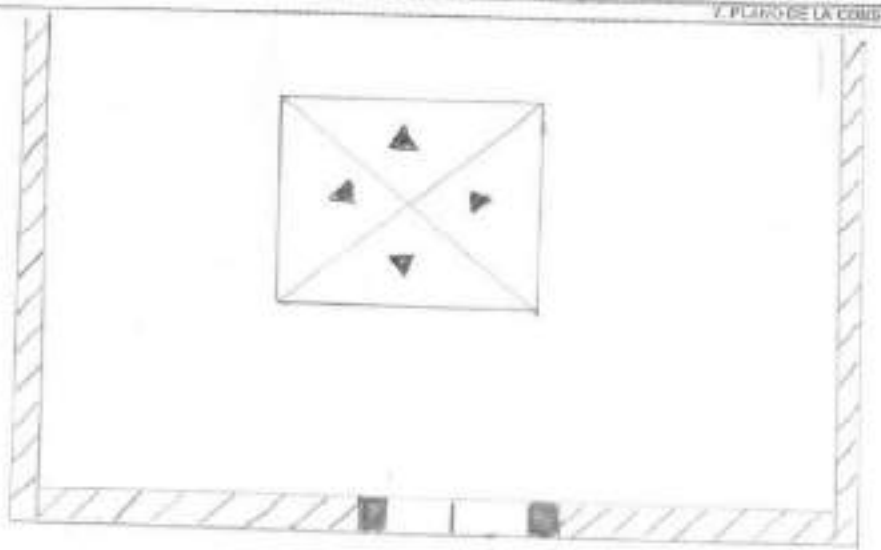

CUADRO DETALLES

PUERTA MADERA	
MAMPOSTERIA BLOQUE	
VIA INTERVENIR	

FIRMAS

Firma Nombre: Representante Entidad Social C.C. O NIT:	Firma Nombre: Andres Cordoba Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 25202-264960 CND	Firma Nombre: Ing. Residente de Interventoría Matrícula profesional No. 25202-261609	Firma Nombre: Testigo C.C. O NIT: 2954044

Copia: Contratista
Copia: Interventor, Subdirección Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Coordinación Administrativa)

Consorcio VCOEB 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-04-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 15 07 26

Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Mesitas Caballero	PR:
Dirección:	KM 84+965 Lado Derecho		Teléfono:	3115647817
Nombre de la persona que atiende la visita:	Omar Franco			CC No.: 2954014
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva			NA
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.:

Edad de la construcción:	NA	No. de Apartamentos:	NA	No. de pisos:	NA
No. de Hogares:	NA	No. total residentes:	NA	Mujeres jefes de hogar:	NA
Niños (menos de 14 años):	NA	Adultos mayores (más de 60 años):	NA	Personas en situación de discapacidad:	NA

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural	Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar, 2. Obra Gris, 3. Terminado	Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. Sí, 2. No	Sí
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado	Ondulado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Industrial	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuaria	[ ]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Vía: SI [X] NO [ ]
Uso del predio:

FIRMAS

Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:		Nombre: Virginia J. Rocha		Nombre:	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría	
C.C. O NIT:		Matrícula profesional No. 0117-076934C		Matrícula profesional No. 15202613049	C.C. O NIT: 2954014.

Notas: 1. Sin firma en cumplimiento, aquí no son validas en la presente Acta de Vecindad, salvaguardando a la veracidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad quedando entre las partes.

Gobernación VCSER 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROGRAMA REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MI-FR-5-FR-4
		VERSIÓN	1
		HOJA No.	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza en concreto	☐	1. Porticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas cuerdas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☒
3. Sistema mixto	☐	3. Lamina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Cassons	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclopeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☒	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☒
8. No identificada	☐	8. Otro. Cual?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórticos en concreto en acero	☐		
10. Otro. Cual?	N/A	REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y pantallas en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Antiguedad (# / año)	N/A	11. Pórticos y pantallas en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionados	N/A	12. Muros en tapia pisada	☐	2. Edificaciones intermedias	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En entrepiso: ancho de vacios (paralelo a la via)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: nuevo eje fondo (perpendicular a la via)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento disfrazado y estructuras Mixtas	☐
3. Estructura metálica y teja	☒			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras tipicas	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Mixto	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual?		5. Otro. Cual?	N/A	17. Otro. Cual?	N/A	7. Otro. Cual?	N/A

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA	N/A	GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO	X	POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO	X	OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Cerramiento con malla eslabonada, postes de concreto desgastado, el portón son rejas metálicas que se encuentran en buen estado.

Consorcio VIOBBT 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MANPROMIN-INTV-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARME, EN LA PROVINCIA DE GUAVIO Y SUS MUNICIPIOS DE GUASCA, GUATAVITA, GACHETÁ, LA CALERA, UBAQUE, CHOCONTÁ, SUESCA, TAUSA, SOPÓ, TOCANCIPÁ, GACHANCIPÁ Y VILLAPINZÓN, ALTO MAGDALENA E IV EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. IDCC 11-1-2020	Contrato de Interventoría No. 214 - 2020	Acta de Vecindad de: Inicio Finalización	(Día / Mes / Año) 6 9 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diligenciada se podrán insertar tantas páginas como sean necesarias.


2. El Acta de Vecindad es un documento técnico - jurídico que debe ser diligenciado por los ingenieros residentes del Contratista y la Interventoría con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

3. De ser necesario, se podrá adjuntar una página nueva de observaciones, que a juicio del profesional del componente social sea necesaria para complementar la información consignada en el presente Acta de Vecindad.

Codensa VIGENTE 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-M-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU-143 / 2025	Contrato de Interventoría No. 213 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☒

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

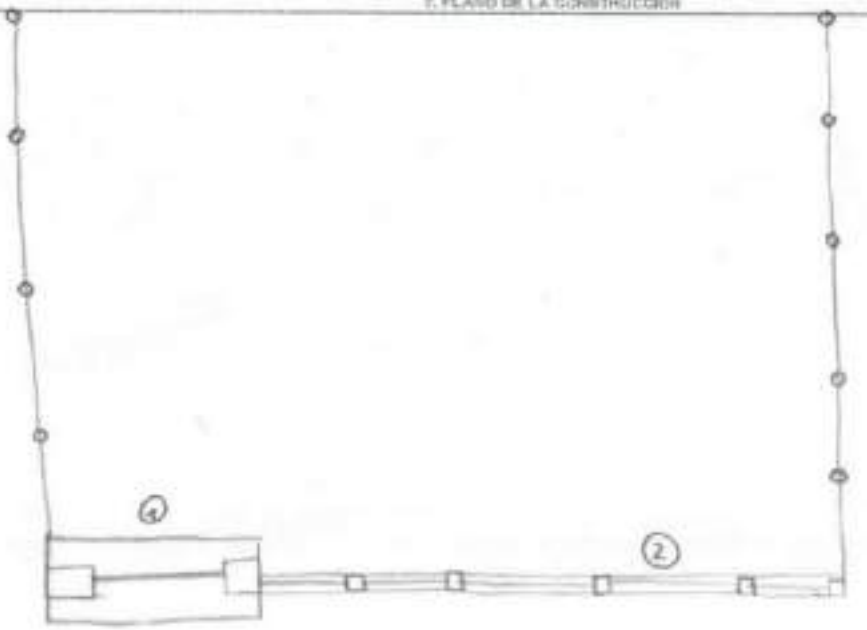

1. Entrada al predio
2. Cerramiento

K8+965

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Huella
Nombre:	Nombre: María J. Rocha	Nombre:	
Responsable Unidad Social	Ing. Residente/Contratista	Ing. Residente/Interventoría	
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 0M1037-0864396	Matrícula profesional No.: 15-20[illegible]1589	C.C. O NIT: 20369653
Original: Carpeta de Predio.			
Copia: Interventoría, Supervisión o Fiscalización. Archivo de Gestión del Contratista (Subdirección Administrativa).			

mariaeugeniacorrea

Contenido VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-INFR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAMPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	25/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No.: ICCU 143 / 2025	Contrato de Interventoría No.: 214 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Martinez del C.	PR:
Dirección:	KB 1 960	Teléfono:	3115697817	
Nombre de la persona que atiende la visita: Omar Franco			CC No.: 2954014	

Uso de tenencia de la vivienda:	1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.

Edad de la construcción:	N/A	No. de Apartamentos:	N/A	No. de pisos:	N/A
No. de Hogares:	N/A	No. Habitantes:	N/A	Mujeres jefas de hogar:	N/A
Niños menos de 11 años:	N/A	Adultos mayores (más de 60 años):	N/A	Personas en situación de discapacidad:	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificación 2.Obra Gris, 3. Terminado	1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado	1

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	Garaje: SI [X] NO [ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	Uso del garaje: -
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Residente Unidad Social	Nombre: Luis Lopez	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 091239-066336	Matrícula profesional No.: 25202211509	C.C. O NIT: 2954014

Notas: 1. Se firma en constancia, con lo consignado en la presente Acta de Vecindad correspondiente a la realidad.
2. Una vez firmada y conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Gerencia VICTORIA 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
VICEPRESIDENCIA MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-INT-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/03/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	[X]
2. Vigas cuerdas	[ ]
3. Balsa o losa	[ ]
4. Cascarón	[ ]
5. Concreto ciclopeo	[ ]
6. Pilotes	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]
8. No identificado	[ ]
9. No existe	[ ]
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto	[ ]
2. Placa aligerada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Correas metálicas	[ ]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No aplica	[X]
8. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Porticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería confinada	[ ]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórticos arriostrados en acero	[ ]
10. Pórticos y pontés en madera	[ ]
11. Pórticos y pontés en otros materiales	[ ]
12. Muros en tapia pisada	[ ]
13. Muros en bajareque	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción Hacinamiento	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál? N/A	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[X]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]
5. Otro. Cuál? N/A	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	N/A
2. En altura: No. de pisos adicionales	N/A
3. En extensión: metros de anche (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál? N/A	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras flexible	[ ]
5. Estructuras rígidas	[ ]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

DIRECTAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

DAÑOS EN ESPEJILLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

DIRECTAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

DAÑOS EN ESPEJILLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

DIRECTAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA	N/A	ORDENAR ANDEN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	

BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

MURO	C	OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Cerramiento con malla eslabonada, muro en mampostera y postes metálicos

Consorcio VIOGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROGRAMA REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MANPS-MN-04-3-FR-04
		VERSIÓN	1
		Página	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Seguimiento: —	DÍA / Mes / Año 15 07 26.

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. En caso de requerir more mas registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidos en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Gobernación de CUNDINAMARCA 2024-2027	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL: GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	9

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☐ Seguimiento ☐

2. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

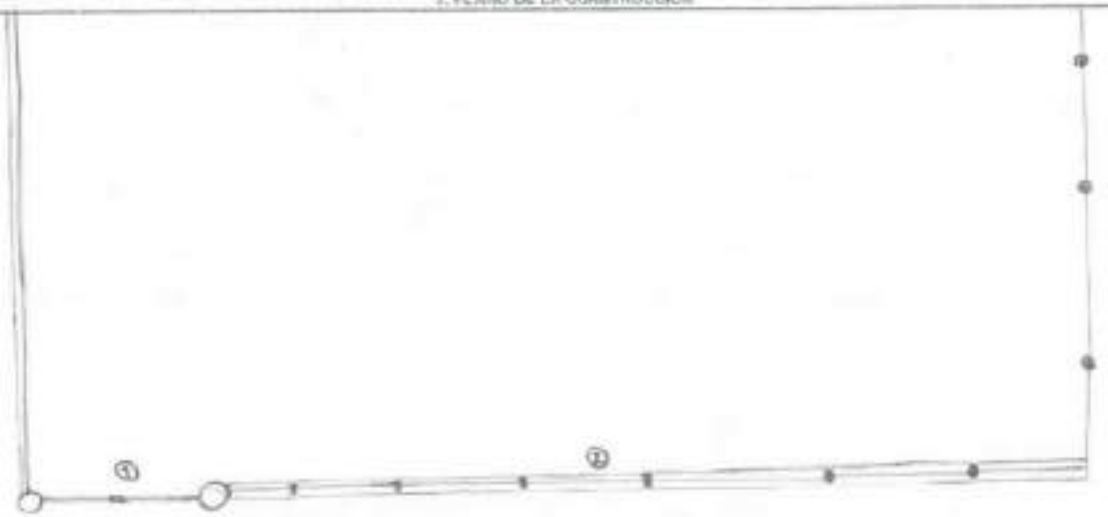

K8+960

1. Entrada al Predio
2. Cerramiento
-

FIRMAS

Firma:	Firma: Luis Iovi Lopez E	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Luis Iovi Lopez E	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría		Testigo	
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 0910237 - 0683269	Matrícula profesional No.:		C.C. O NIT:	C.C. O NIT: 29540114

Original: Contratista
Copias: Interventoría, Fiscalización o Supervisión, Archivo de Gestión del Contratista Subdirección Administrativa.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MISPS-MN-M3-FT-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 15 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 210 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca.	Municipio: Anolaima	Vereda: Monteredondo		PR:
Dirección:	K8+950.		Teléfonos:	310 778 2169.	
Nombre de la persona que atendió la visita:	Maria Eugenia Correa.			CC No. 20 369 653.	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del representante / propietario de la construcción:	Maria Eugenia Correa.			CC No. 20 369 653	
Estrato de la construcción:	1	No. de Apartamentos:	1	No. de pisos:	2.
No. de Hogares:	1	No. total ocupantes:	2.	Mujeres jefes de hogar:	1
Niños (menos de 11 años):	1	Adultos mayores (más de 60 años):	1	Personas en situación de discapacidad:	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural				2.
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar, 2. En construcción, 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. Si, 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Montañoso				2.

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Institucional	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]
Uno del garaje:

FIRMAS

Firma: *Maria Eugenia Correa P.
Nombre: Maria Eugenia Correa Pa
Propietario Unidad Social C.C. o NIT: 20369 653

Firma:
Nombre: Sebastian Ortiz Arango
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 091023-0618230

Firma:
Nombre: Jorge Chaya
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 25 202 26859

Firma:
Nombre:
Testigo
C.C. o NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada y conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta en vecindad suscrita entre las partes.

Continuidad VICGOBR 2024

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MGSPS-MINT-04-F-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

FECHA: 15 Junio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. (CCU-140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 318 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐		
2. Vigas corridas	☐		
3. Sistema mixto	☐		
4. Cajones	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐		
6. Pilotes	☐		
7. Placa de cimentación	☐		
8. No identificada	☐		
9. No existe	☐		
10. Otro. Cuál?	N A		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐		
2. Placa en Steel deck	☐		
3. Estructura metálica y teja	☐		
4. Estructura de madera y teja	☐		
5. Otro. Cuál?	N A		

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto	☐		
2. Placa aligerada de concreto	☐		
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐		
4. Vigas metálicas	☐		
5. Cerchas metálicas	☐		
6. Ornamental en madera	☐		
7. No aplica	☐		
8. Otro. Cuál?	N A		

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reforzada (si / no)	
2. En altura. No. de pisos adicionados	
3. En extensión. Metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad. Metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	N A

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐		
2. Muros estructurales en concreto	☐		
3. Sistema combinado en concreto	☐		
4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Mampostería confinada	☐		
6. Mampostería reforzada	☐		
7. Mampostería no reforzada	☐		
8. Pórticos en acero	☐		
9. Pórticos arriostrados en acero	☐		
10. Pórticos y pórticos en madera	☐		
11. Pórticos y pórticos en otros materiales	☐		
12. Muros en bahareque	☐		
13. Muros en tapia pisonte	☐		
14. Muros en adobe	☐		
15. Construcción improvisada	☐		
16. Mixto	☐		
17. Otro. Cuál?	N A		

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐		
2. Irregularidad media	☐		
3. Irregularidad baja o inexistente	☐		

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐		
2. Irregularidad media	☐		
3. Irregularidad baja o inexistente	☐		

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento sísmico	☐		
2. Edificaciones reforzadas	☐		
3. Mampostería reforzada	☐		
4. Estructuras con confinamiento dúctil y estructuras híbridas	☐		
5. Estructuras ligeras	☐		
6. Construcciones simples	☐		
7. Otro. Cuál?	N A		

Observaciones: Levantamiento de fachada con propietario sin acceso

4. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en malla eslabonada y tubo galvanizado puerta peatón en madera con estructura metálica, canal de conducción de aguas lluvias en tubo novafort

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GRADOS ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin anden, acceso en terreno natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐


MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Malla eslabonada con postes en tubo galvanizado

Concordia VECINOS 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MA-GPS-MN-IN-GPS-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIARE, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15 Julio 2026 Día / Mes / Año
Contrato de Obra No. ICCU-148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 2-9 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

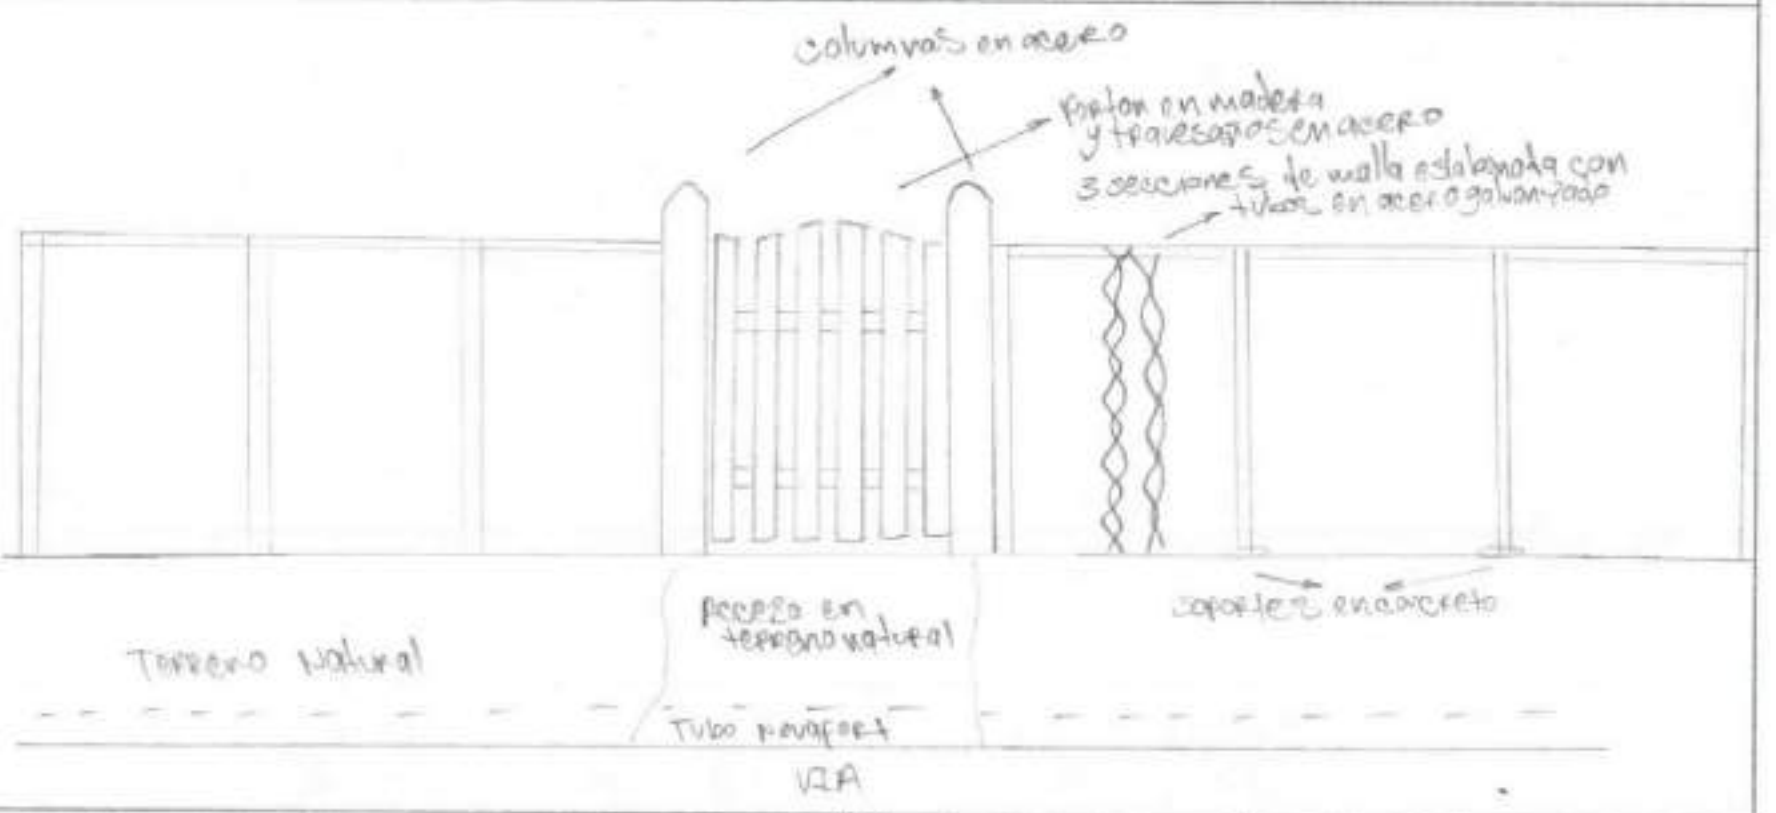

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: Origen: Contratista	María Eugenia Correa R. 20369 653	Firma Nombre: Sebastian Ovalle Amaya Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 090237-061823D		Firma Nombre Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. 15 702 46569	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Consorcio VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y EDIFICACIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MAPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 15 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 213 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Arbeláez	Vereda: Hoya del C		PR
Dirección:	KB+920		Teléfonos:	311 669 7817	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Omar Franco			CC No.	2959014
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva				—
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	—			CC No.	—
Estrato de la construcción:		No. de Apartamentos:	—	No. de pisos:	2
No. de Hogares:	—	No. total ocupantes:	—	Mujeres jefes de hogar:	—
Niños (menores de 14 años):	—	Adultos mayores (más de 60 años):	—	Personas en situación de discapacidad:	—
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar, 2. Obra Gris, 3. Terminado				2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado				2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto			Sin información
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cual?

DE ESTIMACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	ACCESOS VEHICULARES	
2. Comercial	[ ]	8. Industrial	[ ]	Garaje	
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	SI [X]	NO [ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	Uso del garaje:	
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]		
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]		

FIRMAS

Firma: _____
Nombre: Propietario
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma: [signature]
Nombre: Sebastian Ovalle Amaya
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 25202-0618230

Firma: [signature]
Nombre: Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 25202 [illegible] 26. 1969

Firma: [signature]
Nombre: Omar Franco R
Testigo
C.C. O NIT: 2954014

Notas:
1. Se firma en conformidad, que lo consignado en el presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez Finalizada cada actividad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Contenido VIGIA® N. 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPS-MN-N-5-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

FECHA: 15 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐		
2. Vigas cantilever	☐		
3. Riostras mixta	☐		
4. Cassonte	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐		
6. Pilotes	☐		
7. Placa de cimentación	☐		
8. No identificada	☐		
9. No existe	☐		
10. Otro. Cuál? N A			

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐		
2. Placa en Steek cook	☐		
3. Estructura metálica y teja	☐		
4. Estructura de madera y teja	☐		
5. Otro. Cuál? N A			

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto	☐		
2. Placa aligerada de concreto	☐		
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐		
4. Vigas metálicas	☐		
5. Cerchas metálicas	☐		
6. Entramado en madera	☐		
7. No aplica	☐		
8. Otro. Cuál? N A			

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de oriente (occidente a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál? N A	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐		
2. Muros estructurales en concreto	☐		
3. Sistema combinado en concreto	☐		
4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Mampostería confinada	☐		
6. Mampostería reforzada	☐		
7. Mampostería no reforzada	☐		
8. Pórticos en acero	☐		
9. Pórtico arriostrado en acero	☐		
10. Pórticos y paredes en madera	☐		
11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐		
12. Muros de tierra pisada	☐		
13. Muros en tapia pisada	☐		
14. Muros en adobe	☐		
15. Construcción improvisada	☐		
16. Mixta	☐		
17. Otro. Cuál? N A			

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐		
2. Irregularidad media	☐		
3. Irregularidad baja o inexistente	☐		

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐		
2. Irregularidad media	☐		
3. Irregularidad baja o inexistente	☐		

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐		
2. Edificaciones reforzadas	☐		
3. Mampostería reforzada	☐		
4. Estructuras con antigüedad diferente y estructuras Mixtas	☐		
5. Estructuras ligeras	☐		
6. Construcciones simples	☐		
7. Otro. Cuál? N A			

Observaciones: Se realiza formato de acta de amanuciento de entrega. Vecino no firma

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☑ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: antepecho en mampostería con deterioro, en otra parte con enchape en regular estado en cerco apenas tuvo galvanizado y malla eslabonada, portón metálico de 2 hojas en mal estado apoyado en columnas en concreto en la interpone.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CORTAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		CRUCE AUDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin anden acceso en terreno natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Antepecho en mampostería con deterioro en costado derecha y enchape en costado izquierdo muros con deterioro por humedad y estado a la interpone, malla eslabonada con postes en todo a la interpone. portones con huella de oxidación

6. REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.


6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Cundinamarca VIGENTE 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MA-SPS-MN-IN-01-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARME, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		FECHA	15/Jul/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 548 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]		

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

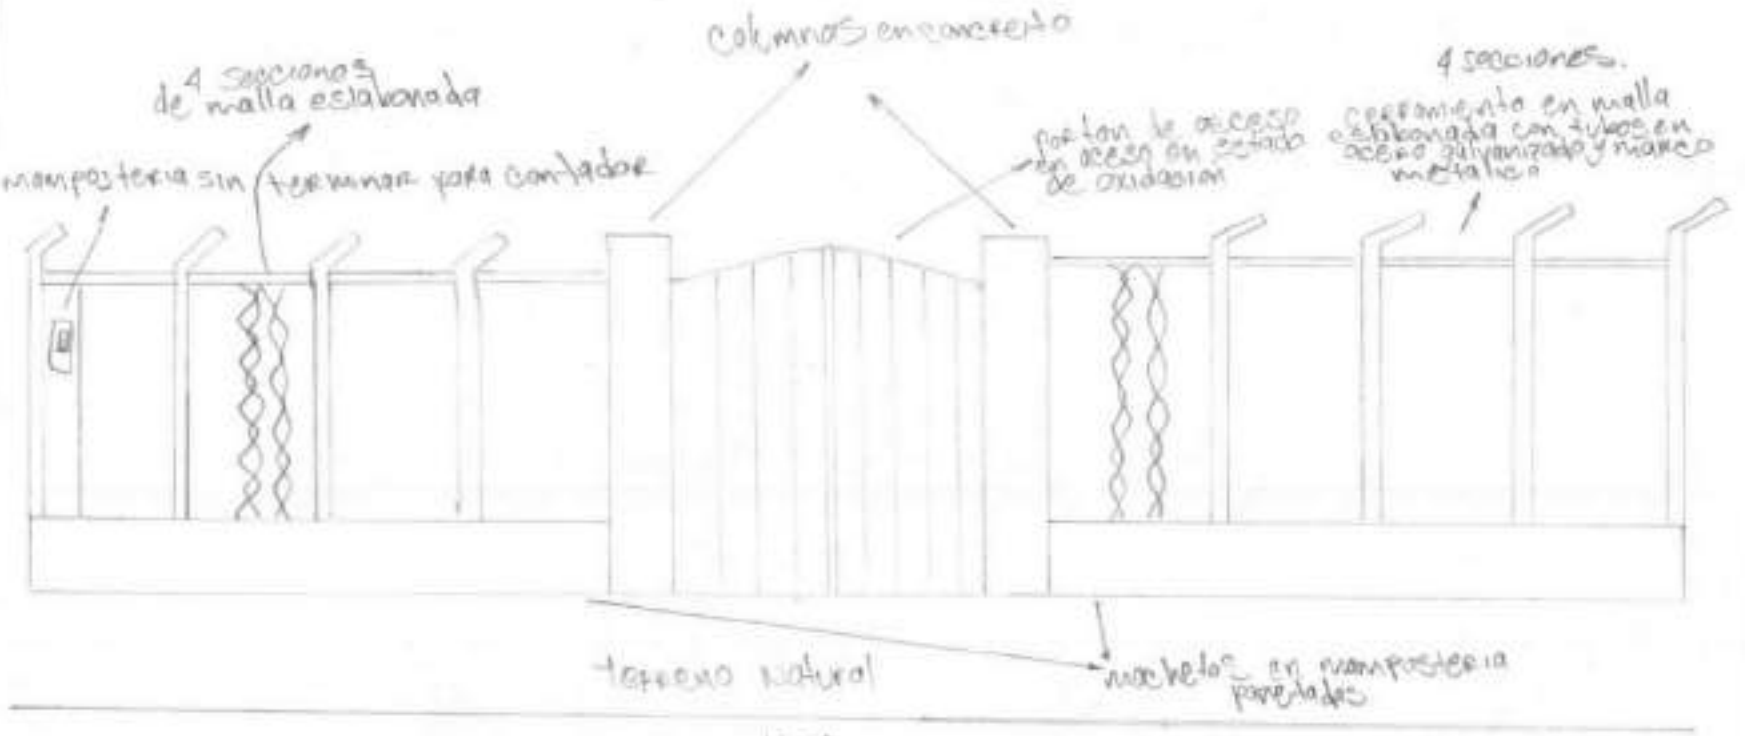

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Sebastian Ardila Amaya	Nombre:	Nombre: Jorge Maya	Nombre:	Nombre: Omar Franco
Responsable Unidad Social	Rol: Residente Contratista	Rol: Residente Interventoría		Rol:	
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 091037-0218750	Matrícula profesional No.	C.C. 13.302.26.15 M	C.C. O NIT:	C.C. 2954014

Original: Contratista
Copia: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contratista (Subdirección Administrativa y...)

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPS-MI-99-1-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE ALMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 15 julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación	1. Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Hoyo del C.		PR
Dirección	KB 2915 Predio En Venta		Teléfono	311 564 7817	
Nombre de la persona que atiende la visita: Omar Franco				CC No. 2954014	
Título de tenencia de la vivienda	1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva				—
Nombre del responsable / propietario de la construcción	—			CC No. —	
Edad de la construcción	60	No. de Apartamentos	—	No. de pisos	1
No. de Hogares	—	No. total residentes	—	Mujeres jefes de hogar	—
Niños (menos de 14 años)	—	Adultos mayores (más de 60 años)	—	Personas en situación de discapacidad	—

CLASIFICACIÓN CATASTRAL	1. Urbano 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO	1. En edificar 2.Obra Gris 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano 2. Ondulado 3. Escarpado	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	ACCESOS VEHICULARES
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐	Garage: SI ☒ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma: —
Nombre: Responsable Unidad Social
C.C. D.M.T.

Firma: [signature]
Nombre: Sebastian Ocaña Arango
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 091057-051B230

Firma: [signature]
Nombre: Angel Moya
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 13 202 41.3169

Firma testigo: [signature]
Nombre testigo: Omar Franco R
C.C. D.M.T.: 2954014

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en el presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada el contenido, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Diciembre/2020	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IC-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN ES. PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15 junio 2006 (día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2020	Contrato de Interventoría No. 318 / 2020	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Pórticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada en concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Sistema mixto	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Alzaprima combinada en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Cimiento	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Cerchas metálicas	☐	5. Mampostería confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampostería reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☒	7. Mampostería no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificado	☒	8. Otro. Cuál?		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Pórticos estructurales en acero	☐		
10. Otro. Cuál?		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y porches en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (si / no)	NO	11. Pórticos y porches en otros materiales	☐	1. Edificaciones sin reforzamiento estructural	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros de mampostería	☒	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En extensión: metros en ancho (paralelo a la vía)		13. Muros de tapia pisada	☐	3. Mampostería reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros de adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☒			16. Mixto	☒	6. Construcciones simples	☒
5. Otro. Cuál?		5. Otro. Cuál?		17. Otro. Cuál?		7. Otro. Cuál?	

OTRAS OBSERVACIONES: Levantamiento de fachada, predio en venta y cerramiento

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☒

GRIETAS	X	FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	X	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Predio en bareque con agrietamientos en muros y vertices de vanos, corredor en concreto agrietado cubierto en zinc. Predio desocupado en venta

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		DESNIVEL ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Sin anden, acceso en terreno natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Sin cerramiento frente a construcción, lateral en postes de madera y alambre de pua

8. REGISTRO FOTOGRAFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Gobierno Regional CAJAMARCA 2023-2026	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MI.GPS-MN-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA GUIARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUNAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	15 / JULIO / 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2026	Contrato de Interventoría No. 210 / 2026	Acta de Vecindad de:	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

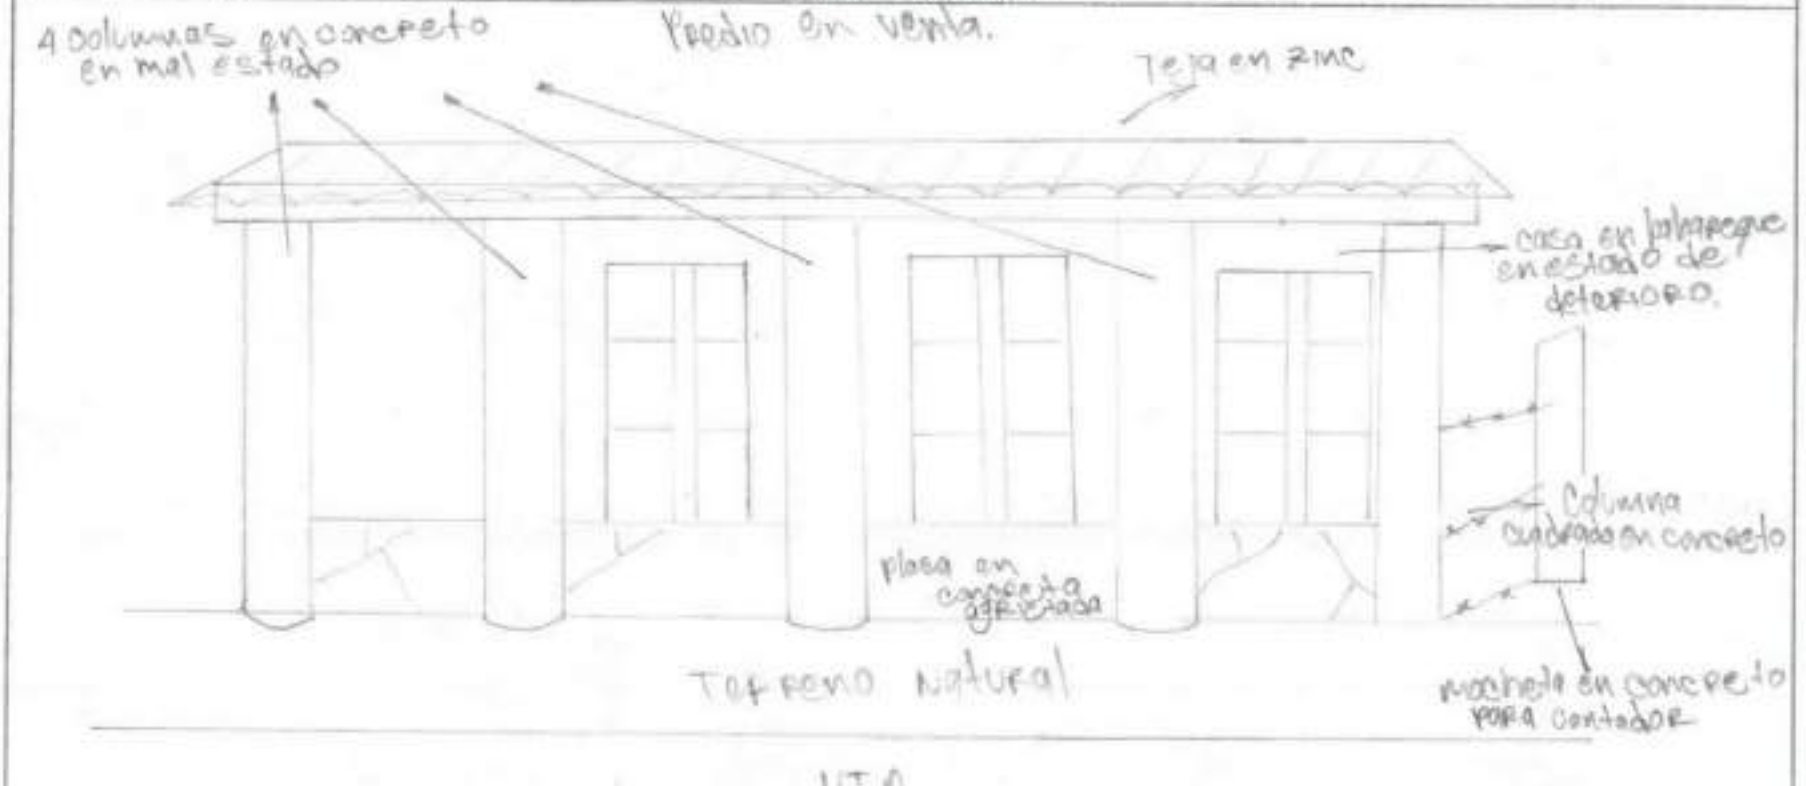

FIRMAS

Firma: Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: Original: Contratista Copias: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión los Contratos, Subdirección Administrativa	Firma: Nombre: Sebastian Ovalle Arteaga Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 091037-061B730	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15 161 26 1269	Firma: Nombre: Testigo C.C. O NIT:	Firma: Nombre: Omar Pacheco R Testigo C.C. O NIT: 2954014	

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSION	1
PAGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA (Dia / Mes / Año): 15 07 26

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoria No. 218 / 2025 | **Acta de Vecindad de:** Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Alto Caballero		PR
Dirección	Isla 81895 lado derecho		Teléfonos	3115647817	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Omar Cesar Franco Rodriguez			CC No.	2954014
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				NA
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	
Estad de la construcción	NA	No. de Apartamentos	NA	No. de pisos	NA
No. de Hogares	NA	No. total residentes	NA	Mujeres jefes de hogar	NA
Niños (menos de 14 años)	NA	Adultos mayores (más de 60 años)	NA	Personas en situación de discapacidad	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No				SI
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				ondulado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
7. Otros		X	Cual?

DESTINACION ECONOMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [X] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Andres Carlos	Nombre:	Nombre: Omar Franco R
Responsable Unidad Social	**Ing. Residente Contratista**	**Ing. Residente Interventoria**	**Testigo**
C.C. O NIT:	Matricula profesional No: 9520726231 CND	Matricula profesional No: 15-202126-1569	C.C. O NIT: 2954014

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Gobernación de CUNDINAMARCA 2024-2027

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPE-MN-003-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	(Día / Mes / Año) 15 07 26

Contrato de Obra No. ICCU-140-2025 | Contrato de Interventoría No. 218-2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas		
2. Vigas corridas		
3. Sistema mixto		
4. Caissons		
5. Cimiento ciclópeo		
6. Pilotes		
7. Placa de cimentación		
8. No identificada		
9. No existe		
10. Otro. Cuál? N/A		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	
2. Placa en Steel deck	
3. Estructura metálica y teja	
4. Estructura en madera y teja	
5. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	
2. Placa aligerada de concreto	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	
4. Vigas metálicas	
5. Cerchas metálicas	
6. Entramado en madera	
7. No aplica	
8. Otro. Cuál? N/A	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (sí / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	
2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema combinado en concreto	
4. Prefabricados en concreto	
5. Mampostería confinada	
6. Mampostería reforzada	
7. Mampostería no reforzada	
8. Pórticos en acero	
9. Pórtico arriostrado en acero	
10. Pórticos y paneles en madera	
11. Pórticos y paneles en otros materiales	
12. Muros en bahareque	
13. Muros en tapia pisada	
14. Muros en adobe	
15. Construcción improvisada	
16. Mixto	
17. Otro. Cuál? N/A	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	
2. Edificaciones reforzadas	
3. Mampostería reforzada	
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras irregular	
5. Estructuras ligeras	
6. Construcciones simples	
7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD	X	DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Humedad en viga aereo, tanto en portón y puerta

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		CROQUIZACIÓN APROXIMADO (m²)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: ANDEN EN CERAMICA EN BUENAS CONDICIONES

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: El Portón y las rejas metalicos presenta muestra de agua y polvo, tiene un portón, una puerta, y los muros de bloque estan en buenas condiciones.

Contrato VIC-DEP-2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MADPS-MN-AI-SPR-4
		VERSION	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES: CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE BUMPAZ TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. [illegible]	Contrato de Interventoría No. 214 / 2021	Acta de Vecindad de Registro No.	(Día / Mes / Año) 15 09 21

REGISTRO FOTOGRAFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página precedente, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. El hacer necesario, se podrá adjuntar una página anexa de otras versiones, que a juicio del componente técnico, no hayan tenido en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VIGSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MAOPS-MN-N-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUE CRECER, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 8 07 26
Contrato de Obra No. IDCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio / Seguimiento

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

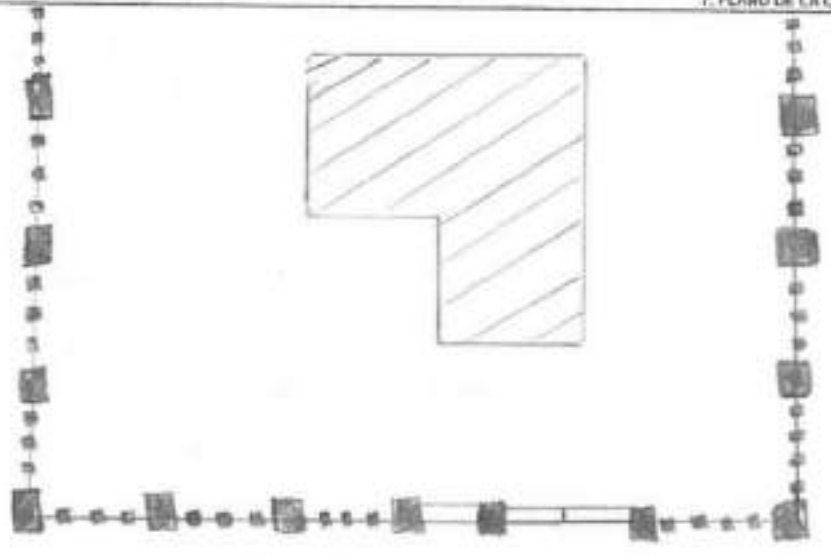

CUADRO DETALLES	
PLACA CUBIERTA	
VIA INTERVENIR.	
PORTON PUERTA.	
CERRAMIENTO REJA	

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: Objeto: Contratista Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Comité (Subdirección Administrativa).	Firma Nombre: Angie Carolyn Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 25202-363412 CND	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: TS 201 2015-69	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: 2954914

Consorcio V1GBR 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-INT-F14
VERSIÓN	1
PAGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. (CCU- 140 / 2025)	Contrato de Interventoría No. (213 / 2025)	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Arbeláez	Vereda: Montes Caballero	PR
Dirección	KB + 85a		Teléfono:	3102227673

Nombre de la persona que atiende la visita:	Guillermo León	CC No.	4096233
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva		
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Guillermo León	CC No.	4096233

Edad de la construcción	N/A	No. de Apartamentos	N/A	No. de pisos	N/A
No. de hogares	N/A	No. total residentes	N/A	Mujeres jefes de hogar	N/A
Niños (menos de 14 años)	N/A	Adultos mayores (más de 65 años)	N/A	Personas en situación de discapacidad	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; X. No	1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	7. Estatales	☐	Garaje: SI ☒ NO ☐
2. Comercial	☐	8. Solidarios	☐	Uso del garaje:
3. Industrial	☐	9. Culturales	☐	
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐	
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Luis Javier López C.	Nombre: Guillermo León
C.C. O NIT:	Ing. Residente Contratista	Testigo
	Matrícula profesional No: 091037 - 066369	C.C. 4096233

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en el presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada e conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Contrato VC-VEN 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MAPP-AIN-84-2-FR-4
VERSION	1
PAGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CRECER, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 210 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☑ Seguimiento ☐	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas sardas	☒
3. Sistema mixto	☐
4. Concreto	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza en concreto	☐
2. Placa aligerada en concreto	☐
3. Lamina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Guaduas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☒
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórticos arriostrados en acero	☐
10. Pórticos y cerchas en madera	☐
11. Pórticos y cerchas en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál? N/A	

IRREGULARIDAD EN PLANTA:

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☒
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA:

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN:

1. Edificaciones con refuerzo horizontal especial	☐
2. Edificaciones aporticadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras mixtas	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA DE CUBIERTA:

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☒
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:

1. Ninguna (si / no)	N/A
2. Sin afectar No. de pisos edificados	N/A
3. En cobertura: mencionar cuales (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	N/A	GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO	X	OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento en muro de mampostería, despinte en pintura y la hoja cuenta con empr vegetal

Consorcio VIAS IDEP 2021	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA** PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS BIANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MADPS-MN-N-1-FT-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES: CAMINOS PARA SUBSANARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	15 07 21 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. (CO) 149 / 2021	Contrato de Interventoría No. 215 / 2021	**Acta de Vecindad de Seguimiento** ---- ☒	

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diligenciada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social de proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del consignante técnico no fueron tenidas en cuenta en el siguiente proyecto del formato Acta de Vecindad.

Convenio VECINOS 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA VÍA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MAEPS-MN-IN-I-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 15 04 26
Contrato de Obra No. (CCU-140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 211 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☑ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

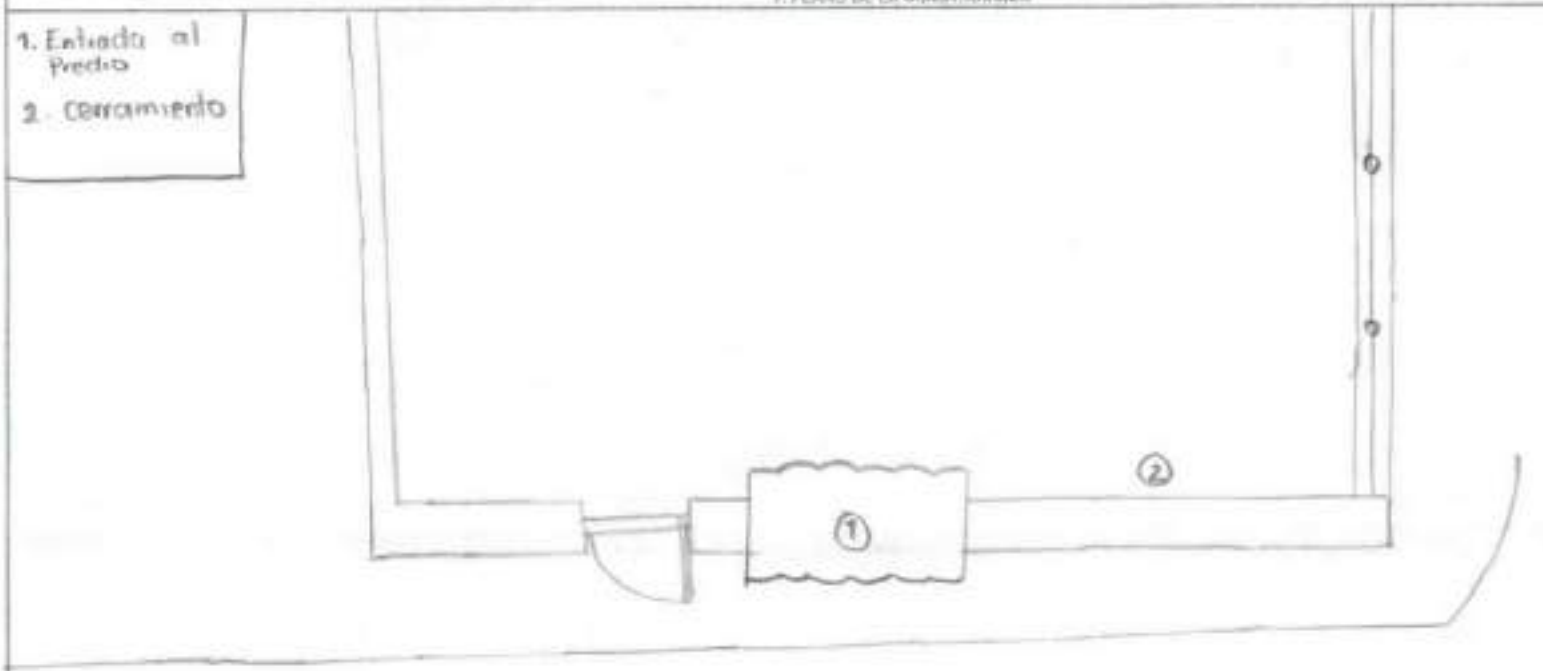

FIRMAS

Firma:	Firma: Luis López	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Luis López Ing. Residente Contratista	Nombre:	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre:	Nombre:
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 0910138-CUNDI	Matrícula profesional No.:	Matrícula profesional No.: 15 202 76569	Testigo	C.C. O NIT: 4096233
Original: Contratista					
Copia: Interventoría, Fortalecimiento de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato, Gobernación Administrativo					

Consorcio VIOGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-01-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 215 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Menistros del Caballero	PR:
Dirección:	KG 1 830		Teléfonos:	3115649819
Nombre de la persona que atiende la visita:	Omar Franco			CC No.: 2959019
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Poseedor; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.

Edad de la construcción:	N/A	No. de Apartamentos:	N/A	No. de pisos:	N/A
No. de Hogares:	N/A	No. Habitantes:	N/A	Mujeres jefes de Hogar:	N/A
Niños menos de 11 años:	N/A	Adultos mayores (más de 60 años):	N/A	Personas en situación de discapacidad:	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificio; 2. Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. Si; 2. No	1
RESIDENTE DEL TERRENO:	1. Propio; 2. Cedido; 3. Ocupado	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de los redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable	X		
7. Internet	X		
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Institucional	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: -

PRUEBAS:

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Representante Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 07102 - 066265	Matrícula profesional No.: 15 202 266 69	C.C. O NIT: 2959019

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará el propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Gobernación CUNDINAMARCA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-M-FT-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		FECHA: 12/02/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]
4. Cimiento	[ ]
5. Concreto ciclópeo	[ ]
6. Pilotes	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]
8. No identificada	[X]
9. No existe	[ ]
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]
2. Placa aligerada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Cerchas metálicas	[ ]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No aplica	[X]
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería confinada	[ ]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórticos en madera en acero	[ ]
10. Pórticos y paredes en madera	[ ]
11. Pórticos y paredes en otros materiales	[ ]
12. Muros en tapia pisada	[ ]
13. Muros en bahareque	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál?	N/A

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[X]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento diafragma y estructuras híbridas	[ ]
5. Estructuras ligeras	[ ]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[X]
4. Estructura de madera y teja	[ ]
5. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no):	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	N/A
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

Observaciones: N/A

4. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO [ ]	REGULAR [ ]	MALO [ ]	
GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO [ ]	REGULAR [ ]	MALO [ ]	
GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO [ ]	REGULAR [ ]	MALO [ ]	
GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	N/A	GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO [ ]	REGULAR [X]	MALO [ ]	
MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO	X	POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO	X	OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento con postes de concreto y metálicos, compuestos de malla eslabonada, los postes se encuentran oxidados y existe desprendimiento de material en algunos postes del muro en mampostería

Contenido VIC GBP 2021	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA** **PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE VECINDAD**	CÓDIGO	MADPS-SIN-XX-3-PR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA GUBIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	
Contrato de Obra No. VCOU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Reconocimiento	(Día / Mes / Año) 13 07 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Contenido MIGUEL 2014	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUMARAL, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 15 07 26
Contrato de Obra No. IDCU-140 / 2026	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

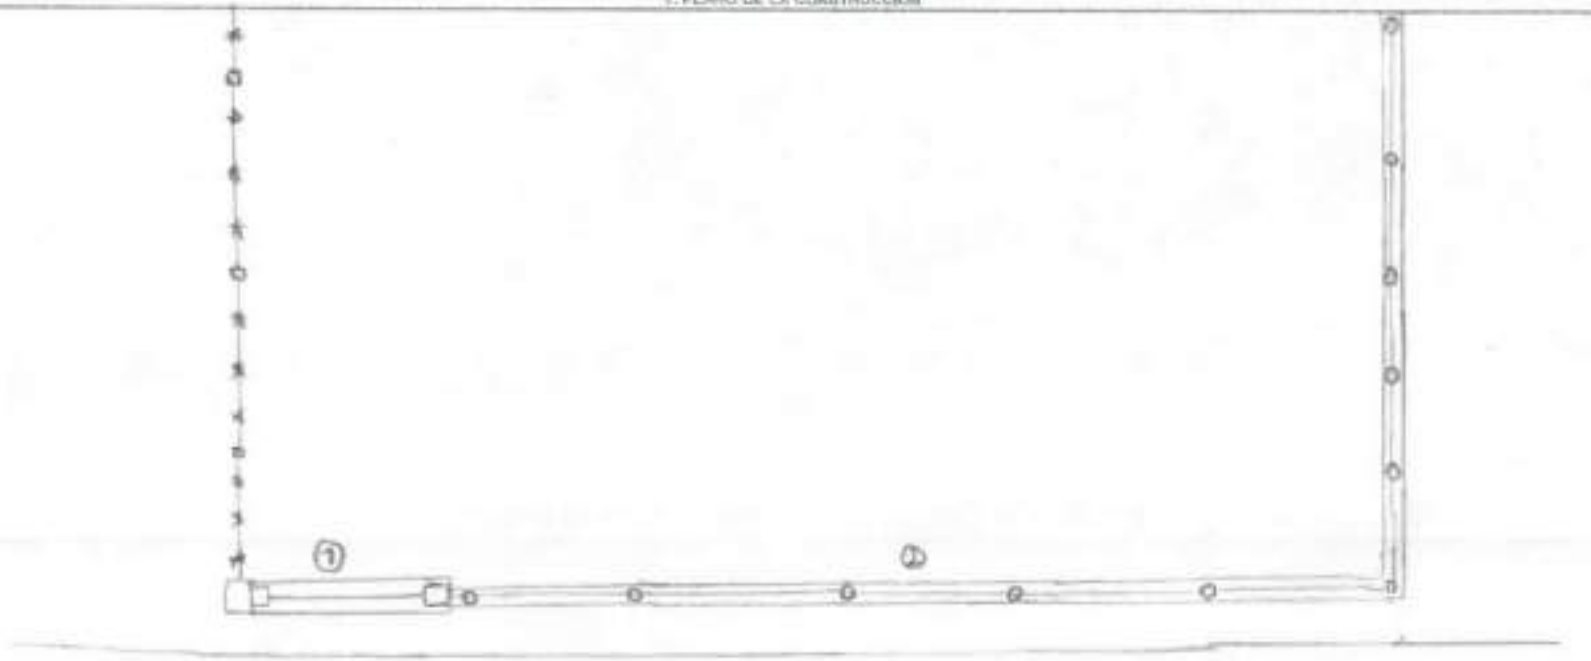

FIRMAS

Firma: Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: Empresa Contratista:	Firma: Luis López Nombre: Luis Jair López E Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No: 095233-066369	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No: 15-242-26-1569	Firma: Nombre Supervisor Técnico C.C. O NIT: 2954014

Copia: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Consorcio VIGGEN 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
GUÍA DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	GUISPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
HOJA No.	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAMAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	15 Junio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IDCU 146 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Montezuela	PR	
Dirección:	Km 8+945 Campo Negro		Teléfono:	313 811 9866	
Nombre de la persona que atiende la visita: Sandra Reyes				20 370 247	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Fructuoso Pinzon Pinzon.				CC No. —	
Edad de la construcción:	30	No. de Apartamentos:	1	No. de pisos:	1
No. de Hogares:	1	No. total residentes:	3	Mujeres jefes de hogar:	1
Niños (menos de 14 años):	0	Adultos mayores (más de 60 años):	0	Personas en situación de discapacidad:	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural				2.
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar, 2. Obra Gris, 3. Terminado				3.
CON LICENCIA DE CONSTRUCCION	1. SI, 2. No				2.
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado				2.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Telefono			
6. Telefonía celular			
7. Internet			
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	7. Educativo		Pavimentado	
2. Comercial		8. Salubridad		SI [X] NO [ ]	
3. Industrial		9. Cultural		Uso del predio:	
4. Minero		10. Religioso			
5. Agropecuario		11. Institucional			
6. Recreacional		12. Otro			

FIRMAS

Firma: Sandra Reyes
Nombre: Sandra Reyes
Propietario / Usuario / Tenedor
C.C. O NIT: 20370247

Firma:
Nombre: Sebastian Ovalle Anaya
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No. 09037-0618230

Firma:
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No. 15 tarjeta 319

Firma:
Nombre:
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en el presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada y conformidad, se entregará un ejemplar del predio objeto del acta de vecindad a cada una de las partes.

Construyendo TRIUNFAR 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MANPE-ADM-SO-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 15 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025

Contrato de Interventoría No. 218 / 2025

Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Riostra mixto	☐
4. Cabezales	☐
5. Cabezales aislados	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	N A

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructural metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	N A

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Láminas colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	N A

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (Si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros en ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	N A

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórticos arriostrados en acero	☐
10. Pórticos y pantallas en madera	☐
11. Pórticos y pantallas en otros materiales	☐
12. Muros en tapia pisada	☐
13. Muros en bahareque	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	N A

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con refuerzo sismo resistente especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras infiltradas	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones precarias	☐
7. Otro. Cuál?	N A

Observaciones: El contratista es responsable de predio de fachada

2. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

							BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en postes de madera 5 hilos de alambre de pua y cerca viva, columnas en piedra con portón metálico de doble hoja acceso en concreto fisurado y terreno natural con sistema de canalización pluvial Cubierta estructura metálica con empalme de arena y teja eternit

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No aplica.

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

							BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GRADO APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin orden, acceso en concreto fisurado y terreno natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

							BUENO ☐	REGULAR ☒	MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: postes de madera 5 hilos de alambre de pua y cerca viva y portón de acceso metálico

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Cundinamarca VICTORIA 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA / OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MUPS-MN-IN-2-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/JULIO/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDOU-140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 214 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

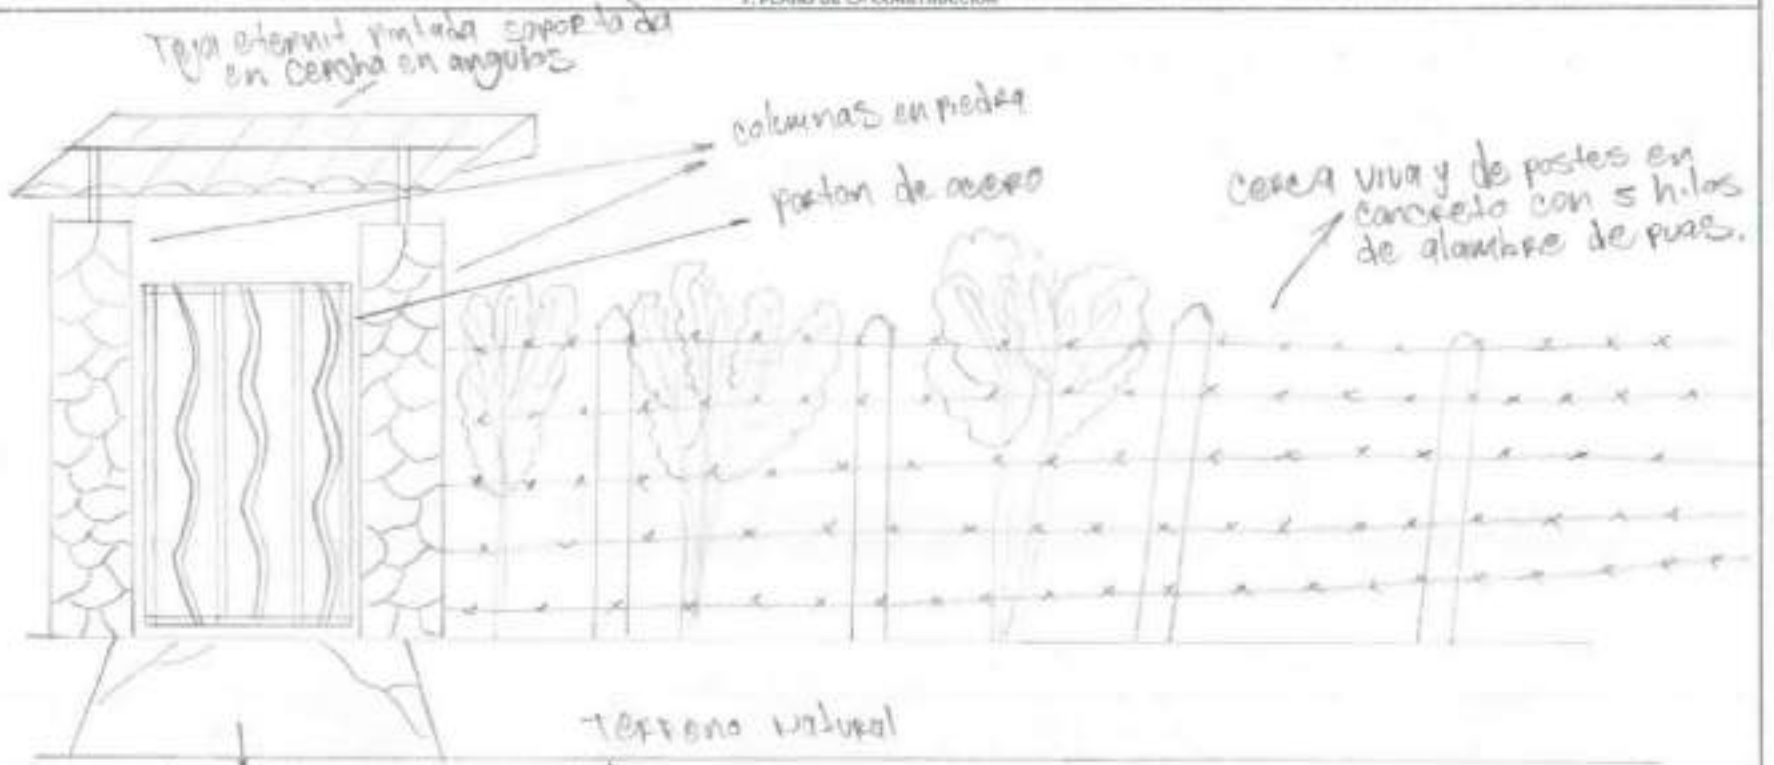

FIRMAS

Firma Nombre: Sandro Reyes Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 2037 0247	Firma Nombre: Sebastián Ovalle Arteaga Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 091037-0619230	Firma Nombre: Jaime Ovalle Arteaga Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15-202-46-1369	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Original: Contratista
Copias: Interventoría, Supervisión de Sostenibilidad Social, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MN-IN-FR-4
VERSION	1
PAGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA OBEDECERSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, RIO UBERNAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 13 07 26
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Mat. Caballero	PR	
Dirección:	KM 8+745 lado izquierdo		Teléfonos:	3014490532	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Arnulfo Cala Orjuela			CC No.	1098408160
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				NA
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	1098408160
Edad de la construcción:	30 años	No. de Apartamentos:	NA	No. de pisos:	NA
No. de Hogares:	NA	No. total residentes:	NA	Mujeres jefes de hogar:	NA
Niños (menos de 14 años):	NA	Adultos mayores (más de 60 años):	NA	Personas en situación de discapacidad:	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No				2
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				Ondulado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros			Cual?

DESTINACION ECONOMICA

1. Residencial	☐	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☒	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Frente: SI ☒ NO ☐
Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: XArnulfo cala
Nombre: 1098408160
Responsable Unidad Social
C.C. O NIT:

Firma:
Nombre: Andres Camilo O
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 2520236342 CND

Firma:
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 1376226159

Firma
Nombre
Testigo
C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Cundinamarca VIVE EL 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MAGPS-MN-IF3-FR-4
VERSION	1
PAGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año) 15 07 26

Contrato de Obra No. 1CCU-140-2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Inicio	Seguimiento	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas		
2. Vigas rientas		
3. Sistema mixto		
4. Cabezote		
5. Concreto ciclópeo		
6. Pilotes		
7. Placa de cimentación		
8. No identificada		
9. No existe		
10. Otro. Cuál?	N/A	

SISTEMA DE CUBIERTA:

1. Placa en concreto	
2. Placa en Steel deck	
3. Estructura metálica y teja	
4. Estructura de madera y teja	
5. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	
2. Placa aligerada de concreto	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	
4. Vigas metálicas	
5. Cerchas metálicas	
6. Entramado en madera	
7. No aplica	
8. Otro. Cuál?	N/A

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:

1. Reformas (Si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1. Pórticos en concreto reforzado	
2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema combinado en concreto	
4. Prefabricados en concreto	
5. Mampostería confinada	
6. Mampostería reforzada	
7. Mampostería no reforzada	
8. Pórticos en acero	
9. Pórtico arriostrado en acero	
10. Pórticos y parales en madera	
11. Pórticos y parales en otros materiales	
12. Muros en bahareque	
13. Muros en tapia pisada	
14. Muros en adobe	
15. Construcción improvisada	
16. Mixto	
17. Otro. Cuál?	N/A

IRREGULARIDAD EN PLANTA:

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA:

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN:

1. Edificaciones con reforzamiento especial	
2. Edificaciones reforzadas	
3. Mampostería reforzada	
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbrida	
5. Estructuras típicas	
6. Construcciones simples	
7. Otro. Cuál?	N/A

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Fisuras en concreto. Cubierta en teja. Asbesto Cemento y Estructura metálica color gris y portón y puertas metálicas presentan oxidaciones columnas en piedra.

ESTADO DE CERRAMIENTO(S):

								BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en malla eslabonada y tubo metalico en regular estado, Desgaste por salvo

Catastro VICIGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MAGPS-MN-A-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. (CCU- 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Seguimiento	Día / Mes / Año 15 04 26

REGISTRO FOTOGRAFICO







Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página delantera, se podrán insertar más páginas.


6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del consignante técnico, no hayan sido tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VIGGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	(Día / Mes / Año) 13 07 26
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 210 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

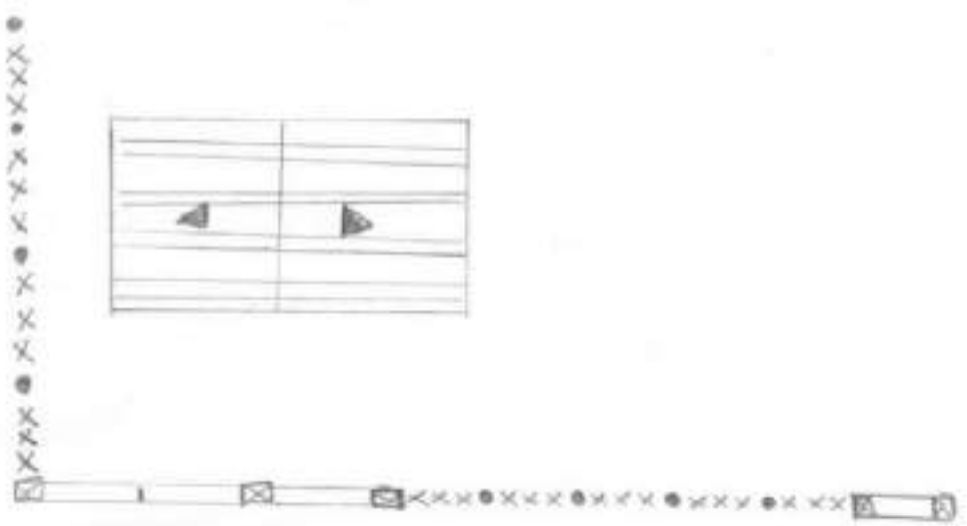

FIRMAS

Firma Nombre: Arnulfo Cano Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1098408160 Original: Contratista	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 25202-365972CND	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. 13202-26-1569	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT

Copia: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Unidad del Contrato (Subdirección Administrativa)

Consorcio VIGIEN 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MISPS-MN-INT-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINO 1 PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICDU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de:	Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda		PR
Dirección	KE 1 770		Teléfono:	3115647917	
Nombre de la persona que atiende la visita: Omar Franco				CC No: 2959014	
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	

Edad de la construcción	N/A	No. de Apartamentos	N/A	No. de pisos	N/A
No. de Hogares	N/A	No. total residentes	N/A	Ningún año de luego	N/A
Niños (menor de 14 años)	N/A	Adultos mayores (más de 65 años)	N/A	Personas en situación de discapacidad	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural: 2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado: 1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No: 2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado: 3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☐	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Institucional	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☒

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☐ NO ☒

Área del garaje: -

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: María I. Rocha	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente/Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 08105I-0254746	Matrícula profesional No. 5-162-161569
		Testigo
		C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada e conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta en mención suscrita entre las partes.

Cundinamarca MODERNA 2020	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MANPS-MN-Pr-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"		FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. (COU 149 - 2025	Contrato de Interventoría No. 212 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐		

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Porticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Placa aligerada de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☒
3. Riostras mixtas	☐	3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Cimientos	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Concreto ciclópeo	☐	5. Canchas metálicas	☐	5. Mampuesto confinado	☐	IRREGURALIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampuesto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☒	7. Mampuesto no reforzado	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No identificado	☐	8. Otro. Cual?		8. Portería en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No aplica	☒			9. Porticos combinados en acero	☐		
10. Otro. Cual?	N/A	REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Porticos y canales en madera	☐	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
		1. Adiciones (S/ No)		11. Porticos y canales en otros materiales	☐	1. Edificaciones con refuerzo sismico especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros en bahareque	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En ocupación: metros de fecha (cercano a la vía		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampuesto reforzado	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructura mixta	☐
3. Estructura metálica y teja	☐			15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Otro	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual?	N/A	6. Otro. Cual?	N/A	17. Otro. Cual	N/A	7. Otro. Cual?	N/A

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA	N/A	DIFICULTAD ANDEN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐


MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO	X	POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento con postes de concreto y alambre de pua, los postes en concreto se encuentran con desgaste.

Calzada VICOBA 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MISPS/MNUN-I-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUECARGE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."			FECHA: 15/01/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU-140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 211 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento	X	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

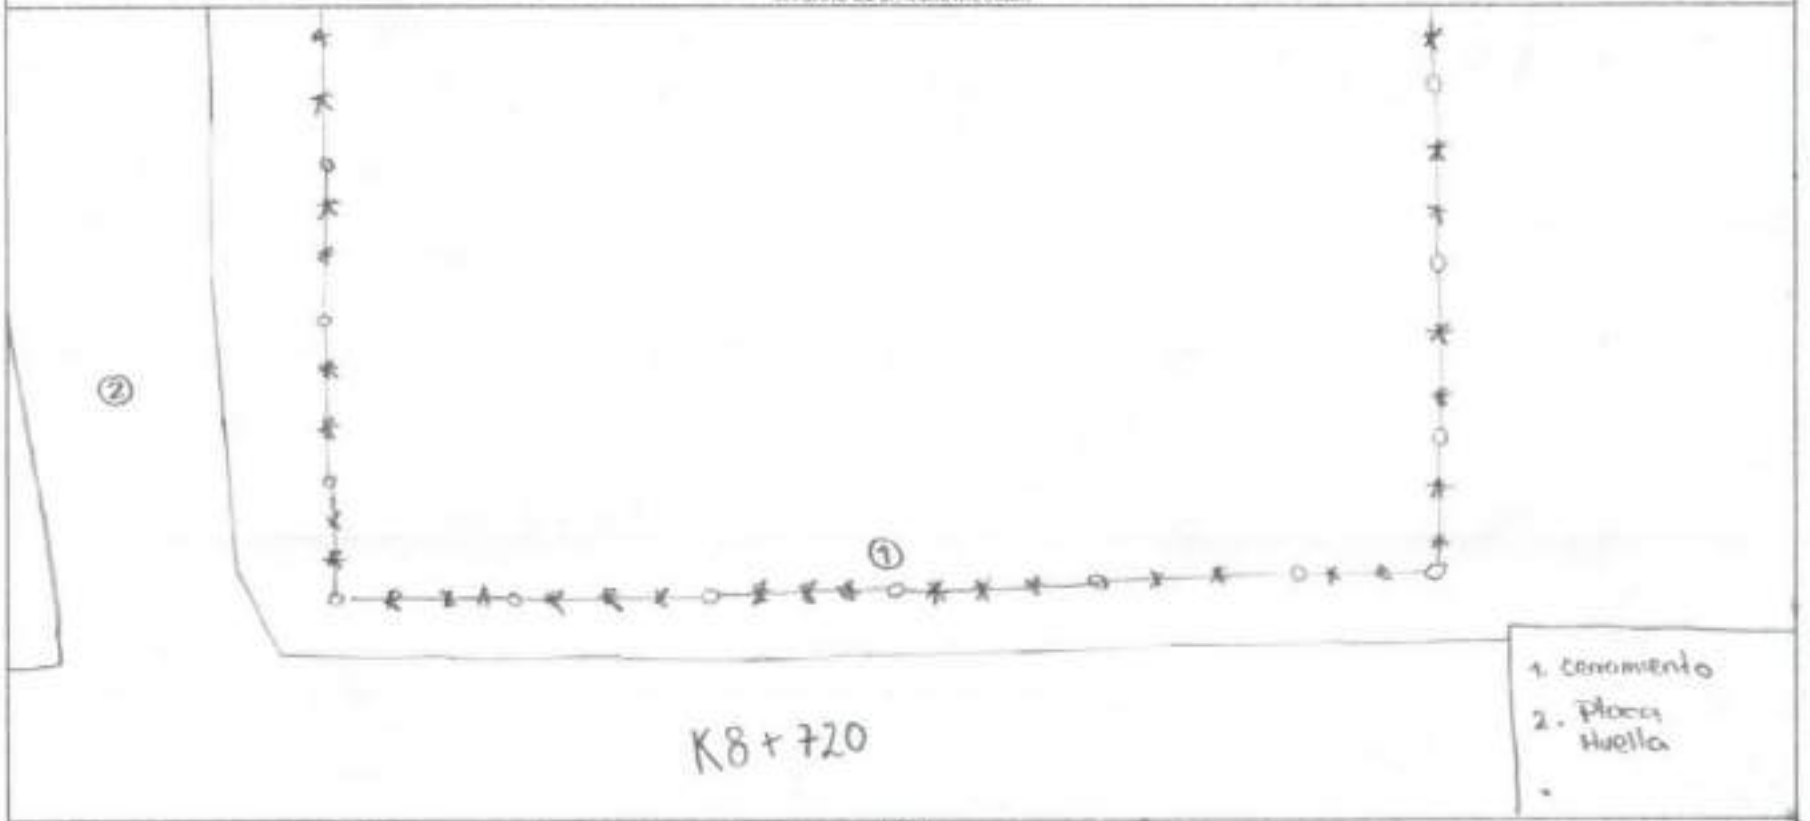

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: María J. Rocha	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Topógrafo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. CM1037-036346	Matrícula profesional No. 25202-158569	C.C. O NIT:

Original: Carpeta.
Copias: Interesado, Fiscalización de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Administrativo).

Ordenanza VIGENTE 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	SIASFS-MN-86-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIARE, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15 Julio 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 146 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación	Departamento: Guaviare	Municipio: San José	Vereda: Hospital	FR:	
Dirección	KM 560 El Barcino		Teléfono	311 564 7817	
Nombre de la persona que atiende la visita: Omar Franco.				CC No. 2954014	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva				—
Nombre del responsable / propietario de la construcción: —				CC No. —	
Estado de la construcción	—	No. de Apartamentos	—	No. de pisos	—
No. de Hogares	—	No. total residentes	—	Mujeres jefes de hogar	—
Niños (menos de 14 años)	—	Adultos mayores (más de 60 años)	—	Personas en situación de discapacidad	—
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar, 2. Obra Gris, 3. Terminado				L
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI, 2. No				2
PERIMETRO DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado				2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto			sin información
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
9. Internet			
7. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[X]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: .

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 25237-0618230	Matrícula profesional No. 15 22 26 1569	C.C. O NIT: 2954014.

Notas: 1. Se firma en constancia que lo consignado en el presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada y conformidad, se entregará el propietario del predio según de acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VIC&FR 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
FORMATO MODIFICADO GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	FM-EPS-ADN-IN-3-FT-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 15 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra Pro. ICCU. 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 318 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐	
2. Vigas corridas	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Cassonte	☐	
5. Concreto ciclópeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☐	
8. No identificada	☐	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cuál? N/A		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál? N/A	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (Si / No)	
2. En altura: No. de pisos adicionados	
3. En extensión: metros de anclaje (pegado a la vía)	
4. En profundidad: metros de pilote (empotrado a la vía)	
5. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Porticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórticos arriostrados en acero	☐
10. Pórticos y cerchas en madera	☐
11. Pórticos y cerchas en otros materiales	☐
12. Muros de contención	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál? N/A	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con sistema sismo resistente	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones: Levantamiento de fachada con Tentico

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Predio con cerramiento en postes de concreto y malla eslabonada en regular, mal estado, dos accesos vehiculares con columnas en concreto y pintura, portones metalicos doble hoja y cubierta en estructura ~~madera~~ teja y eternit. en madera.

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		DESNIVEL ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Sin anden, acceso en concreto en regular estado y zona en terreno natural

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO	X	POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Postes en concreto y malla eslabonada en regular estado

Contrato VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MI-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:
5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexo de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Contrato VIGENTE 2025	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MAGPS-MN-IN-O-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		FECHA	13/julio/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐		

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

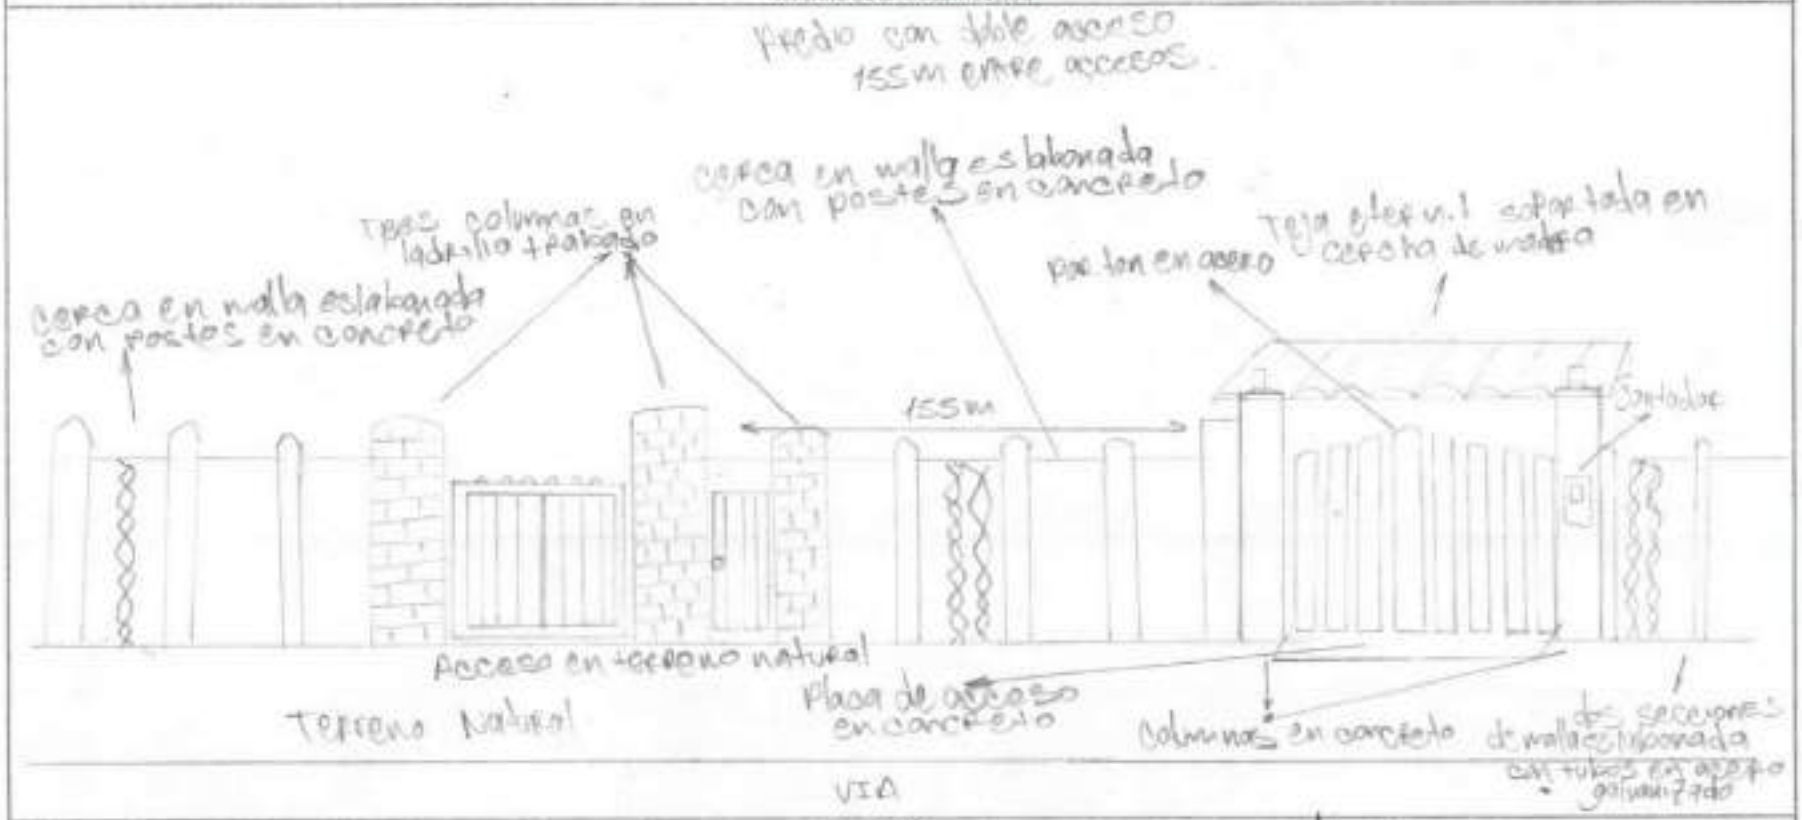

FIRMAS

Firma:		Firma:		Firma:		Firma:	
Nombre:		Nombre: Sebastian Cuervo Anaya		Nombre:		Nombre:	
Responsable Unidad Social		Ing. Residente Contratista		Ing. Residente Interventoría		Testigo	
C.C. O NIT:		Matrícula profesional No. 091037-0618230		Matrícula profesional No.		C.C. O NIT:	

Original: Contratista.
Copias: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato, Supervisión, Administrativa (s).

Contraloría VIGIER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA (Día / Mes / Año): 15 04 26

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 216 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Alto Caballero		PR
Dirección	KM 87550 lado derecho		Teléfonos	3132804547	
Nombre de la persona que atiende la visita: Eufemio Hernandez				CC No. 186702	
Tipo de tenencia de la vivienda	1. Propia, 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva				Propio
Nombre del propietario / propietaria de la construcción: Eufemio Hernandez				CC No. 186702	
Estado de la construcción	Bueno	No. de Apartamentos	N/A	No. de pisos	N/A
No. de Hogares	1	No. total residentes	3	Mujeres jefes de hogar	1
Niños (menos de 14 años)	1	Adultos mayores (más de 60 años)	1	Personas en situación de discapacidad	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificación, 2. Obra Gris, 3. Terminado				Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI, 2. No				NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado				Ondulada

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros			CUAL?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	X	7. Institucional	☐	Garaje	
2. Comercial	☐	8. Industrial	☐	SI ☒ NO ☐	
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:	
4. Mixto	☐	10. Religioso	☐		
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐		
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐		

FIRMAS

Firma:		Firma:	Firma:
Nombre: Eufemio Hernandez	Nombre: Andres Cadavid	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: 186702	Matrícula profesional No.: 25202-252412 CND	Matrícula profesional No.: 15 04 26-1569	C.C. O NIT

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada el contrato, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Convenio VICOBER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPSAMGSN-04FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	Día / Mes / Año 15 02 24

Contrato de Obra No. 4000-140-2023	Contrato de Interventoría No. 218-2023	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN:

1. Zapatas	☐	
2. Vigas canales	☐	
3. Sistema mixto	☐	
4. Caissons	☐	
5. Concreto ciclopeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☐	
8. No identificado	☒	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cual?		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steeldeck	☐
3. Estructura metálica y teja	☒
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☒
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lamina colaborante (steeldeck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cual?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionados	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y pórtales en madera	☐
11. Pórticos y pórtales en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☒
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☒
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☒
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras frontla	☐
5. Estructuras livianas	☐
6. Construcciones simples	☒
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: fachada con teja de tine, con puntos en madera, presentan oxidación las teja

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: fachada laboral en teja de tine, presta oxidación, con tubo cuadrado metalico; fachada posterior en tablas en regular estado y puesta en madera

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GRADO DE ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Andén en suelo natural.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en malla eslabonada en tubo metalico puesto metalico, cubierto en Teja de eternit y tiene un Caballete suelto

Convenio VICOBER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MGSPSMH-M-3414
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 15 of 4
Contrato de Obra No. (CCO) 140 / 2023	Contrato de Interventoría No. 318 / 2023	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐	

II. ESTADO DEL INTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE: Vivienda (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en concreto presenta fisuras y grietas, muros electricos a la vista internos en tubo PVC. el tubo metalico presentan oxidacion

ESTADO DE: Habitacion 2 (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Piso en concreto con grietas y fisuras, Muros en madera y pisos en madera las teja en zinc Presentan oxidacion. la tuberia electrica esta a la intemperie y sueltas

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE: (Incluye pisos, paredes, techos y/o cielo raso) — BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Huella:
Nombre: Residente Unidad Ejecutora	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
C.C. ó NIT 1066703	Matrícula profesional No. 25202-363412 CUN	Matrícula profesional No. 163	C.C. ó NIT 26 1269

Notas: 3. En el espacio "ESTADO DE", debe identificarse el espacio interior del predio que se va a recoger (Habitación, sala, baño, Habitación 1, Habitación 2, entre otros).
4. Si en el predio se identifican más espacios internos de los establecidos en el formato, estos deben anexarse en una hoja adicional o varias hojas complementarias con igual encabezado y pie de página.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	GMOPG-MN-04-FR-4
		VERSION	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CRECER, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. IDCU 141 / 2025	Contrato de Interventoria No. 215 / 2025	Acta de Vecindad de Seguimiento	(Dia / Mes / Año) 15 07 26

REGISTRO FOTOGRAFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir mas registros fotograficos a los consignados en la página diecinueve se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales idoneos del Contratista y la Interventoria, con el apoyo de equipo de gestion social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del consultante técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Caminos VICDER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MAIPS-MN-05-04FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		FECHA	Día / Mes / Año 15 07 26
Contrato de Obra No. (CO) 145 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

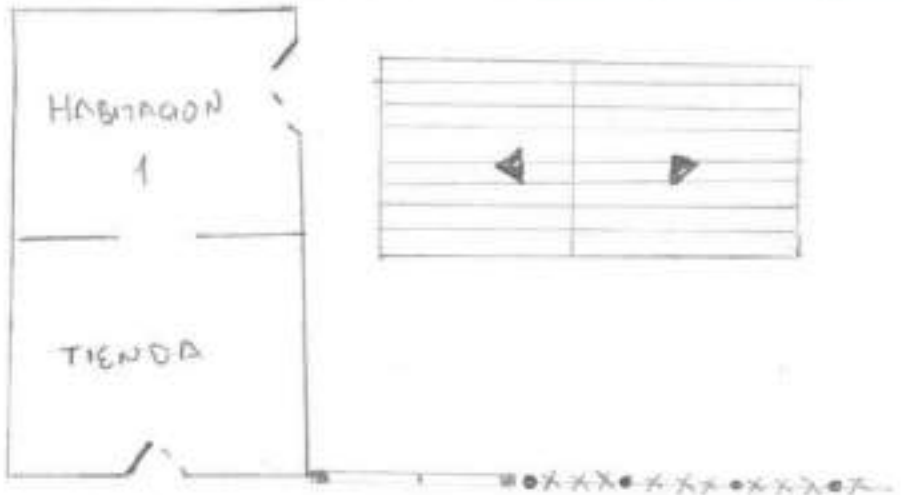

VIA INTERVENIR	
PORTON METALICO	
CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA	

FIRMAS

Firma Nombre Responsable Predial y Social C.C. O NIT Cargo: Contratista	Firma Nombre Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 25202-363412 CND	Firma Nombre Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. 25202-261576 CND	Firma Nombre Testigo CC. O NIT

Consorcio VIGIAS 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD EN PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MGSPS-MN-01.3.FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUITARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 143 / 2025	Contrato de Interventoría No. 213 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento:	Municipio	Vereda:	PR:	
Dirección	K3 + 598		Teléfono	311 569 7817	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Omar Tirado			CC No.	295 40 14
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	
Edad de la construcción	N/A	No. de Apartamentos	N/A	No. de pisos	N/A
No. de Pisos	N/A	No. residentes	N/A	Mujeres jefes de hogar	N/A
Niños (menos de 11 años)	N/A	Adultos mayores (más de 60 años)	N/A	Personas en situación de discapacidad	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO	1. En edificac; 2. Obra Gris; 3. Terminado	1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No	2
RESIDENTE DEL TERRENO	1. Pleno; 2. Ocasional; 3. Escampado	3

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros		X	Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]	Garaje	
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]	SI [ ]	NO [X]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:	
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]		
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]		
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[X]		

FIRMAS

Firma Nombre Residente/a Unidad Social C.C. O NIT	Firma Nombre: Maria J. Rojas Ing. Residente Constructor Matrícula profesional No. 252520-278756	Firma Nombre Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT: 295406

Notas: 1. De firma en contención, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a satisfacción, se entregará al propietario/a copia del acta en señal de la cual se firma.

Consorcio VECGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEBRARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 15/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2026 | Contrato de Interventoría No. 318 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐
2. Vigas corridas	☐
3. Balsa/ mixta	☐
4. Cilindros	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de almohadillado	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☒
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál? N/A	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Casillas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☒
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En ampliación: retroceso mínimo (posible a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y paredes en madera	☐
11. Pórticos y paredes en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál? N/A	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☒
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☒
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones ordinarias	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructura con confinamiento deficiente y estructuras Mixtas	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál? N/A	

Observaciones:

2. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	N/A	GRADOR ANDEN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento en postes de madera y alambre de puas, los postes se encuentran inclinados y algunos desgastados

Consorcio VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBIDO	CÓDIGO	MADPS-000-04-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		FOLIOS	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES: CAMINOS PARA QUEDARSE EN LAS PROVINCIAS DE GUAMAL, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. ICCU 147 / 2023	Contrato de Interventoría No. 216 / 2023	Acta de Veracidad de Seguimiento No.	8	(Día / Mes / Año) 16 - 04 - 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página anterior, se podrán insertar más páginas.
6. El acta de Veracidad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del analista de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a pesar del consecutivo técnico, no tienen tenidas en cuenta en el siguiente proyecto del formato Acta de Veracidad.

Cundinamarca VIVE EL DEPORTE 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MISPS-MN-04-14FR-4
		VERSION	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."			FECHA 15/07/2025 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU-148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐	

1. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

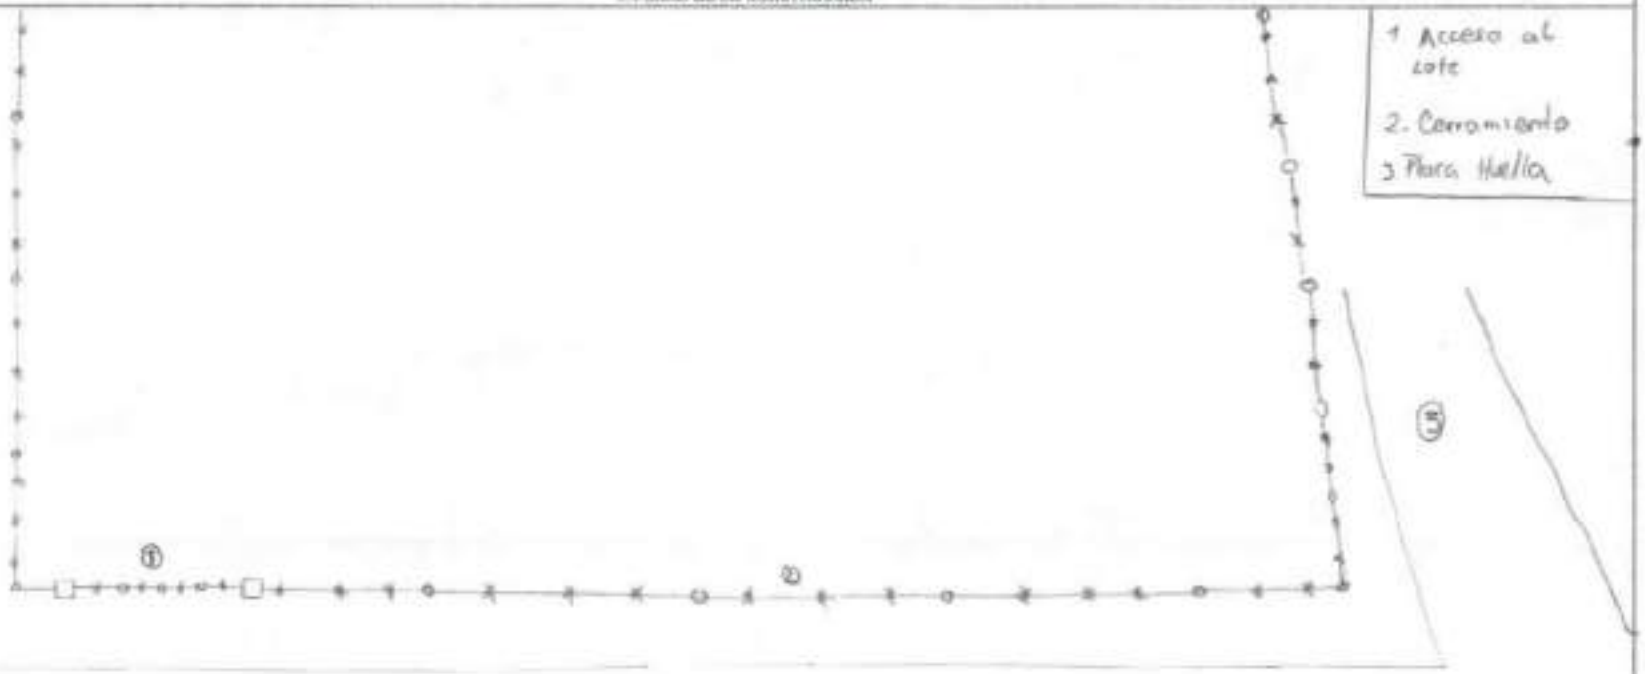

FIRMAS

Firma: Nombre: Representante Unidad Ejecutora C.C. O NIT:	Firma: Nombre: Maria L. Rocha Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 091037-0764546	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. 13 202 26 1569	Firma: Nombre: Testigo C.C. O NIT: 80 234 014

Original: Contratista
Copias: Interventoría, Subdirección de Mantenimiento, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Gobernación de CUNDINAMARCA	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MUSPS-MN-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IDCU 540 / 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Alrededores del Cementerio	PR:
Dirección:	K9 + 328 El Refugio		Teléfonos:	3017972108

Nombre de la persona que atiende la visita: Rafael León — CC No.: 1a299738

Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva — Rapid

Nombre del responsable / propietario de la construcción: — CC No.:

Edad de la construcción:	N/A	No. de Apartamentos:	N/A	No. de pisos:	N/A
No. de Hogares:	N/A	No. total residentes:	N/A	Mujeres jefes de hogar:	N/A
Niños (menos de 11 años):	N/A	Adultos mayores (más de 60 años):	N/A	Personas en situación de discapacidad:	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si ; 2. No	1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje — SI [X] NO [ ]

Uso del garaje: -

FIRMAS

Firma:	Firma: Luis León	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Luis León Lizarazo	Nombre:	Nombre: RAFAEL LEON URIAÑA
C.C. O NIT:	Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 0991037-063369	Firma:	Testigo C.C. O NIT: 19299738

Notas: 1. Sin firma en conformidad, que la consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada y conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Gobernación CUNDINAMARCA	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-5-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMBAOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/09/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio	X
			Seguimiento	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	
2. Vigas corridas	
3. Sistema mixto	
4. Cimientos	
5. Concreto ciclopeo	
6. Pilotes	
7. Placa de cimentación	
8. No identificado	
9. No existe	
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	
2. Placa en Steeldeck	
3. Estructura metálica y teja	X
4. Estructura de madera y teja	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa/ nervios de concreto	
2. Placa alligerada de concreto	
3. Láminas colaborante (Steel deck)	
4. Vigas metálicas	
5. Canches metálicos	
6. Entramado en madera	
7. No aplica	X
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionados	N/A
3. En retrocesos: ampliación sentido (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: nuevos ejes fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	
2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema combinado en concreto	
4. Prefabricados en concreto	
5. Mampostería confinada	
6. Mampostería reforzada	
7. Mampostería no reforzada	
8. Porticos en acero	
9. Pórticos arriostrados en acero	
10. Pórticos y pasillos en madera	
11. Pórticos y pasillos en otros materiales	
12. Muros de tablestacas	
13. Muros de cajas planas	
14. Muros de suelo	
15. Construcción especializada	
16. Mixto	
17. Otro. Cuál?	N/A

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	X
3. Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	
2. Edificaciones reforzadas	
3. Mampostería reforzada	
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras flotadas	
5. Estructuras ligeras	
6. Construcciones simples	
7. Otro. Cuál?	N/A

Observaciones:

4. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	N/A	DESCONFIANDRE APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MUROS	X	OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Cerramiento en malla eslabonada, postes metálicos oxidados, el muro en mampostería presenta algunas fisuras superficiales en el enchape. Las tejas se encuentran desgastadas.

Consorcio VIC GEF 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MADPS-GSS-FO-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA GUARDARSE EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Seguimiento	(Día / Mes / Año) 15 07 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página anterior, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el siguiente cuadro del formato Acta de Vecindad.

Gobernación VITAL@R 2021


INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-GPR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUECARDE, EN LAS PROVINCIAS DE GUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	15 of 06 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. (CCU 148 / 2021 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2021 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☒

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

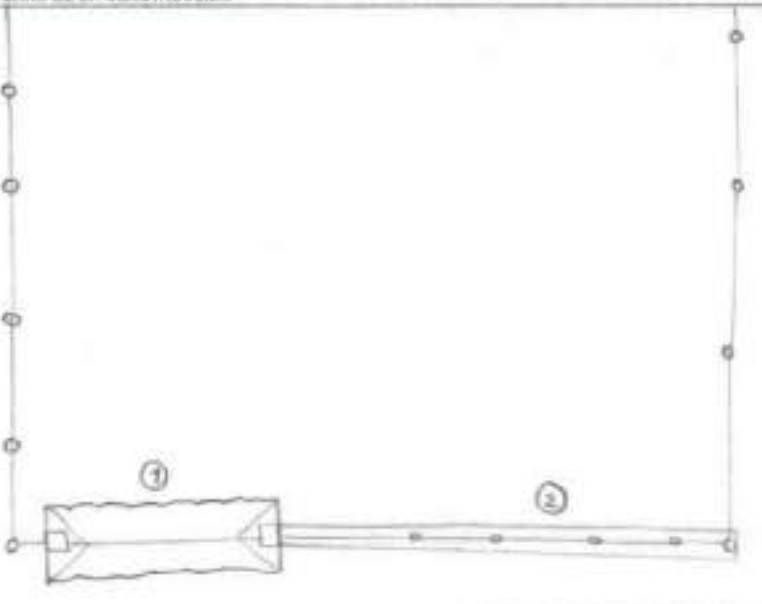

1. Entrada al Predio
2. Cerramiento

K 8+525

FIRMAS

Firma:	Firma: Luis López	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Luis Omar López E	Nombre:	Nombre: RAFAEL LEON UMAÑA
C.C. O NIT:	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
Original: Contratista	Matrícula profesional No. 091033-662369	Matrícula profesional No. 15 202 26.581	C.C. O NIT: 19244738

Copias: Interventor, Coordinador de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contratista (Administrativo)

Gobierno VICGER 2024

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MI-MI-3-FR-4
VERSION	1
PAGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA (Día / Mes / Año) 15 07 25

Contrato de Obra No. IDCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Alto Caballero	PR	
Dirección:	KM 81+510 lado derecho		Teléfonos:	3115647817	
Nombre de la persona que atiende la visita: Carmen Beltran				CC No. 20367164	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				Propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción: Carmen Beltran				CC No. 20367164	
Edad de la construcción:	30 años	No. de Apartamentos:	NA	No. de pisos:	NA
No. de Hogares:	NA	No. total residentes:	NA	Mujeres jefes de hogar:	NA
Niños (menos de 14 años):	NA	Adultos mayores (más de 60 años):	NA	Personas en situación de discapacidad:	NA
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				NO
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				ondulado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
7. Otros			Cuál?

DESTINACION ECONOMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI [X] NO [ ]

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre Testigo:
Responsable Unidad Social	Matrícula profesional No.: 252OL-362478CND	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 2954014
C.C. O NIT:			

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICDER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO REGIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MANPGAMN-INT-FR-4
VERSION	1
PAGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA OLVIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 05 07 26

Contrato de Obra No. ICCU 1497 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN:

1. Zapatas	[ ]	
2. Vigas corridas	[ ]	
3. Losa en mixto	[ ]	
4. Cabezales	[ ]	
5. Concreto ciclópeo	[ ]	
6. Pilotes	[ ]	
7. Pozos de cimentación	[ ]	
8. No identificada	[ ]	
9. No existe	[ ]	
10. Otro. Cuál?	NA	

SISTEMA DE CUBIERTA:

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]
5. Otro. Cuál?	NA

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	[ ]
2. Placa aligerada de concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Canchas metálicas	[ ]
6. Entramado en madera	[ ]
7. No aplica	[ ]
8. Otro. Cuál?	NA

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA:

1. Reformas (cuántas)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	NA

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería reforzada	[ ]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y parales en madera	[ ]
11. Pórticos y parales en otros materiales	[ ]
12. Muros en bahareque	[ ]
13. Muros en tapia pisada	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál?	NA

IRREGULARIDAD EN PLANTA:

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGULARIDAD EN ALTURA:

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN:

1. Edificaciones con reforzamiento superior	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	[ ]
5. Estructuras ligeras	[ ]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cuál?	NA

Observaciones: Levantamiento de estado del cerramiento.

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR [ ]	MALO [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO [ ] DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	REGULAR [ ]	MALO [ ] DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		BUENO [ ] DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	REGULAR [ ]	MALO [ ] GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Andén en sello actual, Puerta en regular condiciones en malla eslaborada y tubo metalico en regular estado con oxidacion

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		BUENO [ ] MURO	REGULAR [ ]	MALO [ ] OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en malla eslabona caida en su totalidad en malas condiciones y cerca viva.

Consorcio VIGUER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MANUAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MADPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		Página	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CRECER, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TROPICUNDIA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. IDCC-140-2025	Contrato de Interventoría No. 216-2025	Acta de Vecindad de Seguimiento: —	Día / Mes / Año 15 - 02 - 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista o la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no hemos tenidos en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Gobernación VICTORIA 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-063-FR-4
		VERSIÓN	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 6 07 26
Contrato de Obra No. IDCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 318/2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN





VIA A INCLEVENIA

CUADRO DE DETALLES	
VIA ACCESO	
CERCA VIVA	
PUERTA MALLA ESLABONADA	
CUBIERTA METALICA	

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. DNIT: Cargo: Contratista Copia: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Dob/Archivo Administrativo)	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 25202-363471 CND	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: [illegible]	Firma Nombre Testigo C.C. DNIT 29504

Gobernación CUNDINAMARCA 2024

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CONVIVIR, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	15/07/2025 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. (CCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Bojacá	Vereda: Monte del cubarro		PR
Dirección:	KB 1 490		Teléfono:	312 395 3890	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Olga Medina			CC No.:	20370148
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Olga Medina			CC No.:	20370148
Edad de la construcción:	N/A	No. de Apartamentos:	N/A	No. de pisos:	N/A
No. de Hogares:	N/A	No. total residentes:	N/A	N mujeres jefes de hogar:	N/A
Niños (menos de 14 años):	N/A	Adultos mayores (más de 60 años):	N/A	Personas sin educación (no alfabetizadas):	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificación; 2. Obra Gris; 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. Sí ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono	X		
6. Telefonía celular	X		
7. Internet	X		
8. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Institucional	[ ]	SI [X] NO [ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma:	Firma: Luis López	Firma:	Firma: Olga Medina
Nombre:	Nombre: Luis José López C.	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 0910533 - 0667369	Matrícula profesional No.:	C.C. O NIT: 20370148

Notas: 1. Se firma en consonancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada y conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VIAS ER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MISPS-MN-IN-3-FR-4
VERSION	1
PAGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES CAMINOS PARA CUIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 15/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ / Seguimiento ☐

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐
2. Viga corrida	☒
3. Muro de relleno	☐
4. Cajones	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Pilotaje desconocido	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en fibra cemento	☐
3. Estructura metálica y teja	☒
4. Estructura en madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada en concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☒
8. Otro. Cuál?	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	ND
2. En altura. No. de pisos adicionados	N/A
3. En ocupación. Indicar si fue hecha (cuanto a la vía)	
4. En profundidad. Indicar si fue (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Porticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mamposteria confinada	☐
6. Mamposteria reforzada	☐
7. Mamposteria no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórticos arriostrado en acero	☐
10. Porticos y porales en madera	☐
11. Pórticos y porales en otros materiales	☐
12. Sistema de entramado	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál? N/A	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☒
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mamposteria reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras frágiles	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones rurales	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

2. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS
N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

GRIETAS	FISURAS	HUMEDAD	DESPLAZAMIENTO	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA	GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)
N/A	N/A	N/A	N/A	BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ N/A	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

MALLA ESLABONADA	POSTES DE CONCRETO	POSTES DE MADERA	CERCA VIVA	MURO	OTROS
X				BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐ X	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

El cerramiento cuenta con postes metálicos y malla eslabonada con desgaste, en sectores con oxidación superficial en los postes. El acceso frontal cuenta con una cuneta de drenaje hasta la entrada del predio, el predio muestra signos de oxidación superficial.

Cundinamarca VICTORIA 2021	**INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA** PROVEEDURIA VIAL, GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL, Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA **ACTA DE VECINDAD**	CODIGO	GI-GPS-MN-IN-3-PR-4
		VERSIÓN	1
		FOLIO N.	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CUIDARTE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA:	
Contrato de Obra No. IDCU-140-2025	Contrato de Interventoría No. 216-2025	**Acta de Vecindad de Seguimiento** ---	(Día / Mes / Año) 8 07 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diecinueve, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. Si hace necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no hayan sido en cuenta en el siguiente (espacio del formato Acta de Vecindad.

Cinsonar VIGENTE 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-INT-14
		VERSIÓN	1
		PAGINA	9

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	13/01/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio / Seguimiento

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

1. Acceso al predio
2. Cerramiento

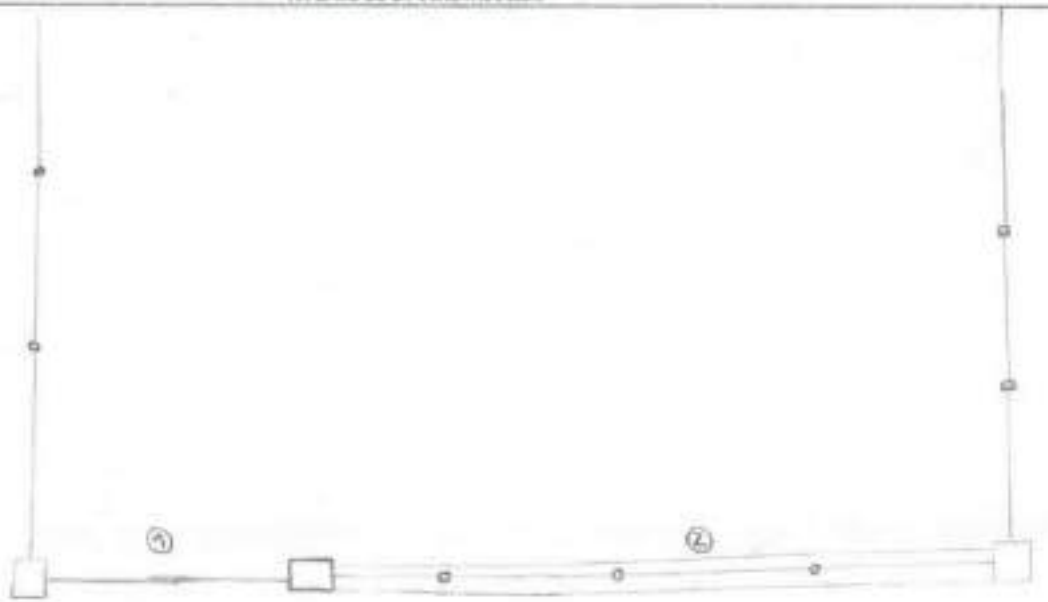

K8 + 490

FIRMAS

Firma:	Firma:	Luis Jose Lopez E	Firma:	Firma:	olga Martinez
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Luis Jose Lopez E Ing. Residente Contratista		Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: olga	
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 0910221-66736		Matrícula profesional No.	Testigo	
Cargo: Contratista				C.C. o NIT:	20370148

Cláusulas Impuestas: Sostenibilidad, Análisis de Gestión del Contrato (Administrativo)

Consorcio VICMER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROGRAMA MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-EN-SFR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE RIONEGRO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

FECHA: 10 JULIO 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 211 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Vesitas		PR
Dirección	K8+165		Teléfono	311 564 9817	
Nombre de la persona que atiende la visita: Omar Franco				CC No. 2954014	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Prestada; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				—
Nombre del responsable / propietario de la construcción: —				CC No: —	
Edad de la construcción: —		No. de Apartamentos: —		No. de pisos:	1
No. de Hogares: —		No. total residentes: —		Mujeres jefas de hogar: —	
Niños (menos de 14 años): —		Adultos mayores (más de 60 años): —		Personas en situación de desplazamiento: —	

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No	2
EMPLAZAMIENTO DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto			sin información
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐

Uso del garaje: -

FIRMAS

Firma: —	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: —	Nombre: Sebastian Cuellar Ayala	Nombre:	Nombre: Omar Franco
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría	Testigo
C.C. O NIT: —	Matrícula profesional No.: 094032 - 05182230	Matrícula profesional No.: 15 202-261569	C.C. O NIT: 2954014

Notas: 1. Se firma en constancia, que la consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada e conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Gobernación CUNDINAMARCA

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MISPS-MN-No 14 FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 10 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. (CCU- 140) 2025 | Contrato de Interventoría No. 219) 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐	
2. Viga de cimentación	☐	
3. Losa de cimentación	☐	
4. Cimentación profunda	☐	
5. Concreto ciclópeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de entrepiso	☐	
8. No identificada	☐	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cuál?	N A	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en lámina cinc	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	N A

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza en concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	N A

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho ocupado a la vía	
4. En profundidad: metros de fondo (sobreexcavar a la vía)	
5. Otro. Cuál?	N A

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no diseñada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórticos arriostrados en acero	☐
10. Pórticos y pórticos en madera	☐
11. Pórticos y pórticos en otros materiales	☐
12. Muros en tapia pisada	☐
13. Muros en bahareque	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Madera	☐
17. Otro. Cuál?	N A

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con sistema primario flexible y estructuras híbrida	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	N A

Observaciones: Levantamiento de fachada con testigo, sin acceso

2. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPES		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en postes de madera y malla eslabonada con 5 hilos de alambre de puas portan metálico apoyado en columnas de concreto reforzadas en ladrillo una gireda

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES: No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

GRIETAS	X	FISURAS	X	HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GRADOS ANDEN ANDENADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Sin andenes, acceso en concreto fracturado y fisurado con áreas verdes sentidos a la vía

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☒ MALO ☐

MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO		OTROS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Viga en mampostería de ladrillo en regular estado con postes en madera y malla eslabonada, 5 hilos de alambre de puas en regular estado y portan metálicos de doble hoja.

Consorcio VICGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Compromiso SIGDER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MGUPS-MN-SI-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"		FECHA	15/ Nov / 2016 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 149 / 2016	Contrato de Interventoría No. 2-9 / 2020	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐		

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

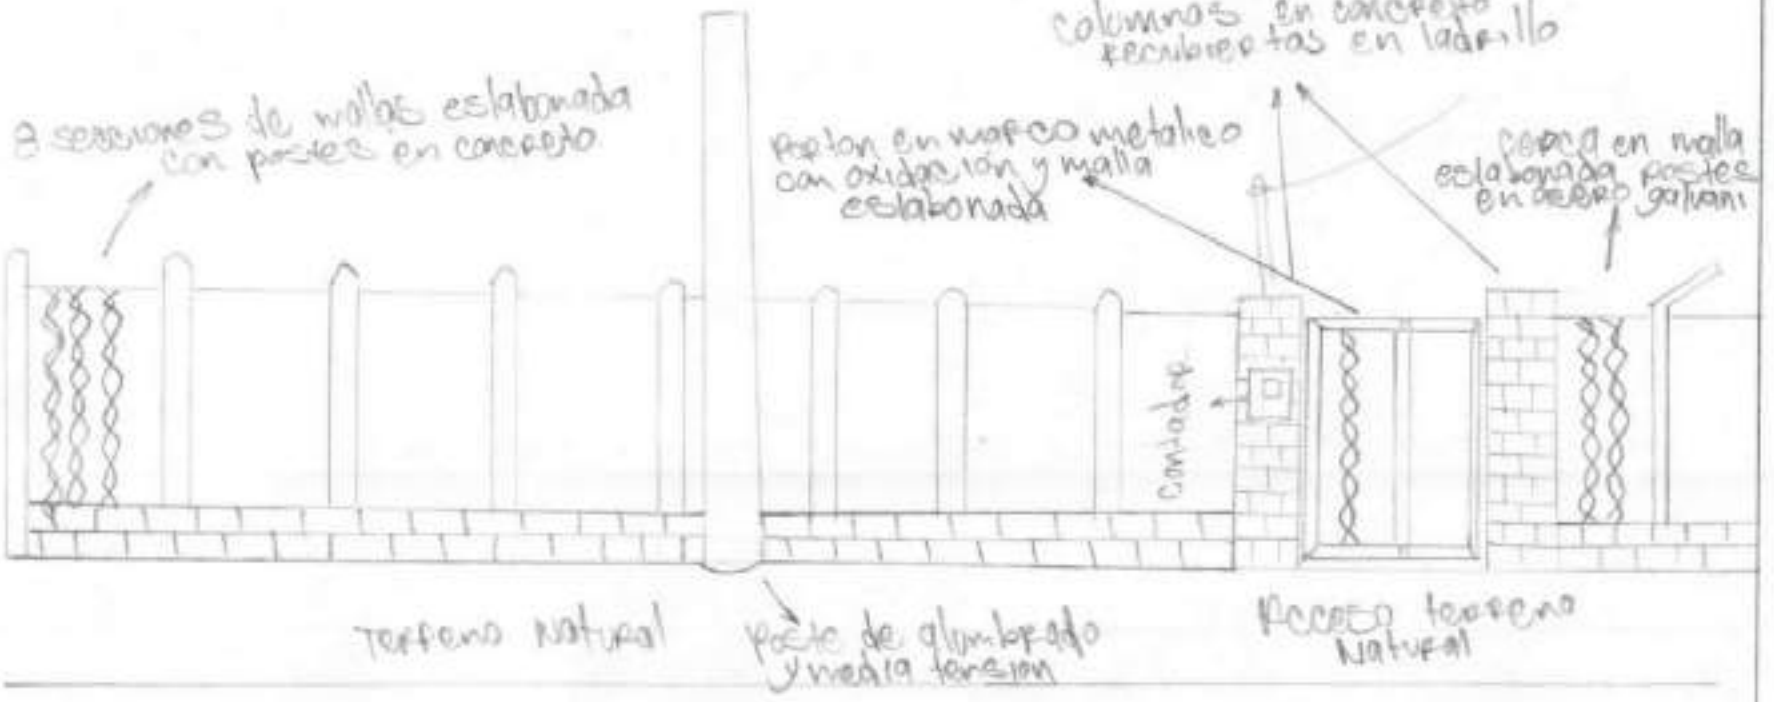

FIRMAS

Firma: Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma: Nombre: Sebastian Nuñez Arteaga Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 080 53 - 068250	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. 15202266569	Firma: Nombre: Testigo C.C. O NIT:	Omar Forero 2954604

Original: Contratista.
Copias: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Centro de Documentación Administrativa.

Consorcio VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPS-MN-IN3-FT-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	15 Julio 2025 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 214 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anapoima	Vereda: Mesitas		PR
Dirección:	KB+540 Entrada		Teléfono:	311 564 78 17	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Oscar Franco			CC No.	2954014
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	—			CC No.	—
Estrato de la construcción	—	No. de Apartamentos	—	No. de pisos	—
No. de Hogares	—	No. total residentes	—	Mujeres jefes de hogar	—
Niños (menores de 11 años)	—	Adultos mayores (más de 60 años)	—	Personas en situación de discapacidad	—
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar, 2. Obra Gris, 3. Terminado				2
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI ; 2. No				No
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado				2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto			
2. Alcantarillado			
3. Energía			
4. Gas			
5. Teléfono			Sin servicios evidentes
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:
Nombre:
Responsable Unidad Social
C.C. o NIT:

Firma
Nombre: Sebastian Ocello Pareja
Ing. Residente Contratista
Matrícula profesional No.: 0910252-061820

Firma
Nombre:
Ing. Residente Interventoría
Matrícula profesional No.: 15 202 24/7569

Firma
Nombre
Testigo
C.C. o NIT: 2954014

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada y suscrita, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Cundinamarca Sí Late Así	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-R-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL "PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES: CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15 julio 2026 (Día / Mes / Año)
Orden de Obra No. (COU 140 - 2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	☐	1. Placa maciza de concreto	☐	1. Porticos en concreto reforzado	☐	1. Irregularidad alta	☐
2. Vigas corridas	☐	2. Viguetas alguacil de concreto	☐	2. Muros estructurales en concreto	☐	2. Irregularidad media	☐
3. Silletas mixtas	☐	3. Láminas colaborante (Steel deck)	☐	3. Sistema combinado en concreto	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
4. Cassions	☐	4. Vigas metálicas	☐	4. Prefabricados en concreto	☐		
5. Caissons colapso	☐	5. Combas metálicas	☐	5. Mampuestos confinada	☐	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	☐	6. Entramado en madera	☐	6. Mampuestos reforzada	☐	1. Irregularidad alta	☐
7. Placa de cimentación	☐	7. No aplica	☐	7. Mampuestos no reforzada	☐	2. Irregularidad media	☐
8. No Verificada	☐	8. Otro. Cual? N A		8. Pórticos en acero	☐	3. Irregularidad baja o inexistente	☐
9. No existe	☐			9. Porticos arriostrado en acero	☐		
10. Otro. Cual? N A		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y canales en madera	☐	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reformas (Si / no)		11. Porticos y canales en otros materiales	☐	1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En caso de Si, de que año		12. Muros en tapia pisada	☐	2. Edificaciones reforzadas	☐
1. Placa en concreto	☐	3. En estado de: (marca de noche) (pendiente a la vía)		13. Muros en tapia pisada	☐	3. Mampuestos reforzada	☐
2. Placa en Steel deck	☐	4. En posición: (centro de fondo) (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	☐	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras aisladas	☐
3. Estructura metálica y teja	☐	5. Otro. Cual? N A		15. Construcción improvisada	☐	5. Estructuras ligeras	☐
4. Estructura de madera y teja	☐			16. Bahareque	☐	6. Construcciones simples	☐
5. Otro. Cual? N A				17. Otro. Cual? N A		7. Otro. Cual? N A	

Observaciones: Levantamiento de acta de fachada con fotografías (Predio en obra)

4. ESTADO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Deplomada en fachada, predio en construcción columnas sin fundir

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		DIMENSIÓN ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Sin andén acceso en terreno natural.

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Polisombra, predio en construcción

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Gobierno VICHEN 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MAIPS-MN-04-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUERCARE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/Julio/2026 (DIA / MES / AÑO)
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoria No. 2-8 / 2025	Acta de Vecindad de: Brisio Seguridad	8

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

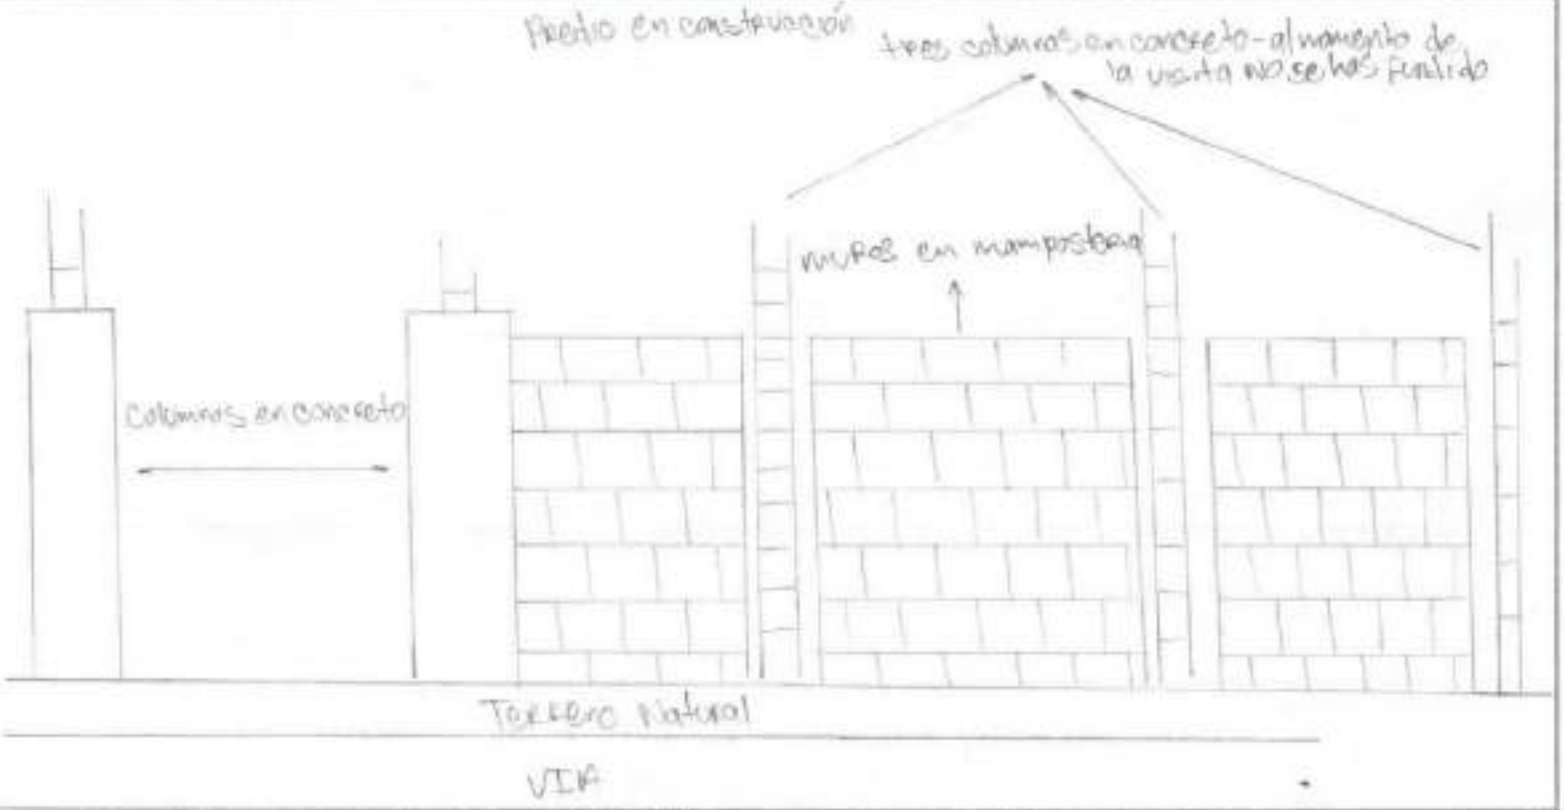

FIRMAS

Firma: Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma: Nombre: Sebastian Cadiz Arroyo Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 091037-061823D	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15202-A-1569	Firma: Nombre: Tecnico C.C. O NIT: 2931014

Original: Contratista.
Copias: Interventoría, Subdirección de Responsabilidad, Archivo de Gestión del Contratista (Administrativo).

Consorcio VIGGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MADPS-MN-61-3-FR-4
VERSION	1
PAGINA	7

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINO PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/02/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No: ICCU 1401 / 2025	Contrato de Interventoría No. 371 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Alrededores del cubarral	PR:
Dirección:	KB 1 917		Teléfonos:	3156497017
Nombre de la persona que atiende la visita:	Denis Franco			CC No: 2954014
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva			
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.

Edad de la construcción:	N/A	No. de Apartamentos:	N/A	No. sin piso:	N/A
No. de Hogares:	N/A	No. total habitantes:	N/A	Mujeres jefes de hogar:	N/A
Niños menores de 14 años:	N/A	Adultos mayores (edad de 60 años):	N/A	Personas en situación de discapacidad:	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado	3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No	1
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas	—	X	
5. Teléfono	—	X	
6. Televisión cable	—	X	
7. Internet	—	X	
8. Otros	—		Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Salubridad	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje
SI [X] NO [ ]
Uso del garaje: *

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Representante Unidad Social	Nombre: Luis Javier López C.	Nombre:
C.C. O NIT:	Ing. Residente Constructor	Testigo
	Matrícula profesional No. 091033-066536 9	C.C. O NIT: 2954014

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en el presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad, suscrita entre las partes.

Contratos VIGENTE 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MANTS-MN-04-FR-04
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/03/2026 (Día / Mes / Año)

Convenio de Obra No. (CO) 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas		
2. Vigas corridas		
3. Sistema mixto		
4. Cajones		
5. Concreto ciclópeo		
6. Pilotes		
7. Placa de cimentación		
8. No identificada		
9. No existe	X	
10. Otro. Cuál?		

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto		
2. Placa aligerada de concreto		
3. Lámina colaborante (Steal deck)		
4. Vigas metálicas		
5. Canchas metálicas		
6. Entramado en madera		
7. No aplica	X	
8. Otro. Cuál?		

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En años: No. de pisos adicionados	N/A
3. En entrepiso: marca de techo (contesto a la vía)	
4. En profundidad: marca de fondo (antepuesto a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto		
2. Placa en fibra cem		
3. Estructura metálica y teja		
4. Estructura de madera y teja		
5. Otro. Cuál?		

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado		
2. Muros estructurales en concreto		
3. Estanes confinada en concreto		
4. Prefabricados en concreto		
5. Mampostería confinada		
6. Mampostería reforzada		
7. Mampostería no reforzada		
8. Pórticos en acero		
9. Pórticos arriostrados en acero		
10. Pórticos y cerchas en madera		
11. Pórticos y cerchas en otros materiales		
12. Muros en bahareque		
13. Muros en tapia pisada		
14. Muros en adobe		
15. Construcción improvisada		
16. Mixto		
17. Otro. Cuál?	N/A	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	X
3. Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	
2. Edificaciones reforzadas	
3. Mampostería reforzada	
4. Estructuras con confinamiento (aislante y estructura híbrida)	
5. Estructuras ligeras	
6. Construcciones simples	X
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	N/A	GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
El cerramiento se encuentra en mampostería y malla eslabonada, la cual se encuentra desgastada y existen desprendimientos en parte del muro. Los postes metálicos se encuentran con corrosión

Corporación UT GIBER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MIUIPS-GAI-FO-3-PR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	(Día / Mes / Año) 13 de 26 -
Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de Seguimiento	

REGISTRO FOTOGRAFICO









Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diligenciada se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada con profesionales técnicos de Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.


Cobertura VIGILADA	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO REGIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-IN-1-FR-4
		VERSION	1
		INFORME	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	15/09/2024 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. (CCU 149 / 2025)	Contrato de Interventoría No. 215 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

1 Cerramiento

2 Entrada de acceso al Predio.

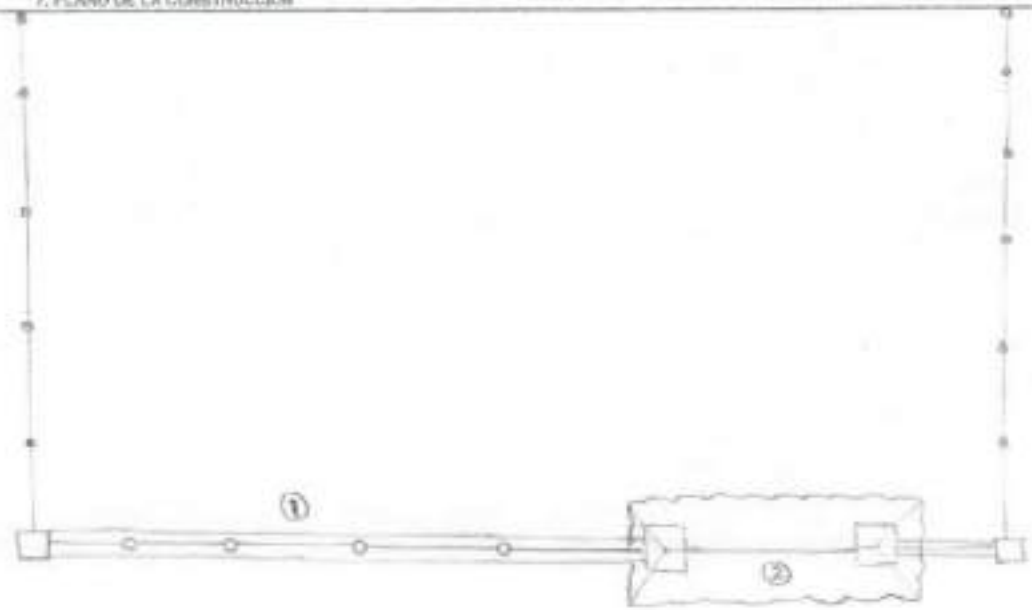

KB + 417

FIRMAS

Firma:	Firma: Luis Javier López G	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Luis Javier López G	Nombre:	Nombre:	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría		Trabajo Social	
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 09 1837 - 0663269	Matrícula profesional No.: 15.202.26/1969		C.C. O NIT:	29540LH

Original: Contratista
Copias: Interventoría, Fundación de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato, Subdirección Administrativa

Gobernación VICUBRK 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
SUBMUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MAGPS-MN-SI-FT-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES: CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IDCU 146 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Hatos	PR:
Dirección:	KB+415 Izq/derecho		Teléfonos:	311 561 7817
Nombre de la persona con quien atiende la visita: Omar Franco				CC No. 2954014

Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia 2. En arriendo 3. Poseedor 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva	—
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No. —

Edad de la construcción	—	No. de Apartamentos	—	No. de pisos	—
No. de Hogares	—	No. total habitantes	—	Hogares jefes de hogar	—
Niños (menores de 14 años)	—	Adultos mayores (más de 60 años)	—	Personas en situación de discapacidad	—

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin anfocar, 2. Obra Gris, 3. Terminado	1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. SI, 2. NO	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarillado		
3. Energía		
4. Gas		
5. Teléfono		
6. Televisión cable		
7. Internet		
8. Otros		

Observaciones del estado de los redes: Sin información

Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA			
1. Residencial	☐	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	
6. Recreacional	☐	12. Otro	X

ACCESOS VEHICULARES

Garaje
SI ☐ NO ☐
Uso del garaje: -

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
C.C. O NIT:	C.C. O NIT: 891037 - 001230	Matrícula profesional No.	C.C. O NIT: 2954014

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada e ejecutoriada, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Gobierno Nacional 2020-2024

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MN-Rv-FT-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAMPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	17 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACION		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]	1. Placa maciza en concreto	[ ]	1. Porticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa aligerada en concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Láminas colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4. Cassone	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Cerchas metálicas	[ ]	5. Mampostería confinada	[ ]	IRREGULIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]	7. No aplica	[ ]	7. Mampostería no reforzada	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
8. No identificada	[ ]	8. Otro. Cual? NA		8. Pórtico en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9. No visible	[ ]			9. Porticos arriostrados en acero	[ ]		
10. Otro. Cual? NA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y pantallas en madera	[ ]	TIPOLOGIA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACION	
		1. Reformas (si / no)		11. Pórticos y pantallas en otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento inicial	[ ]
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En altura: No. de pisos adicionales		12. Muros de mampostería	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros de tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros de adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructura rotulada	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]			15. Construcción improvisada	[ ]	5. Estructuras ligeras	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			16. Mixto	[ ]	6. Construcciones civiles	[ ]
5. Otro. Cual? NA		5. Otro. Cual? NA		17. Otro. Cual? NA		7. Otro. Cual? NA	

Observaciones: levantamiento de cerramiento con testigo

4. ESTADO DEL ENTORNO DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO [ ]	REGULAR [ ]	MALO [ ]	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

No aplica

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO [ ]	REGULAR [ ]	MALO [ ]	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

No aplica

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO [ ]	REGULAR [ ]	MALO [ ]	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS:

No aplica

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

								BUENO [ ]	REGULAR [X]	MALO [ ]	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Cerramiento con postes rectos de madera, junto con 6 hilos de alambre de puas

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas:

5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.

Consorcio VIGIDEPAZ 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL, Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MJGPS-MN-IN-3-FT-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUE SIRVAN, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		FECHA	15/Julio/2026. (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento / Cierre		

7. PLAGO DE LA CONSTRUCCIÓN

Cerca en postes de madera e hilos de alambre.

TERRENO NATURAL

VIA

FIRMAS

Firma: Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: Original/ Contratista	Firma: Nombre: Sebastian Ortiz Rugeles Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 911057-061250	Firma: Nombre: Emilio Ruiz Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. 15 202 6.1549	Firma: Nombre: Testigo C.C. O NIT:	Firma: Nombre: Ana Franco Testigo 29540 14

Copias: Interesado, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).

Convenio VICCOR 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-SFR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 15 07 26
Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento / Retiro	X

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Montes del Cabrito		Nit:
Dirección:	KM 8+415 Lado Derecho		Teléfono:	3112466582	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Luis Alberto Gonzales Cruz			CC No.	19312757
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				Propio
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Luis Alberto Gonzales Cruz			CC No.	19312757
Edad de la construcción:	12 años	No. de Apartamentos:	4	No. de pisos:	1
No. de Hogares:	1	No. total residentes:	2	Mujeres jefes de hogar:	1
Niños (menos de 14 años):	0	Adultos mayores (más de 60 años):	2	Personas en situación de discapacidad:	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No				SI
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				Ondulado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
8. Internet		X	
7. Otros		X	CUMT

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	
2. Comercial		8. Solidaridad	
3. Industrial		9. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuaria		11. Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje
SI: X NO:
Vías de garaje:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Luis Alberto Gonzales Cruz	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría
Responsable Unidad Social	Matrícula profesional No. 2520234212CUN	Matrícula profesional No. 15 Jul 26 5507
C.C. O NIT: 19312757		C.C. O NIT: Técnico

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en el presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmado a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Cartilla VICOP 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
VERSION	1
PAGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA (Día / Mes / Año): 15 07 26

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Reglamento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN:

1. Zapatas	
2. Vigas centrales	
3. Sistema mixto	
4. Caissons	
5. Concreto ciclópeo	
6. Pilotes	
7. Placa de cimentación	
8. No identificado	
9. No aplica	
10. Otro. Cuál? NA	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	
2. Placa en Steel deck	
3. Estructura metálica y teja	
4. Estructura en madera y teja	
5. Otro. Cuál? NA	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	
2. Placa aligerada de concreto	
3. Lámina colaborante (Steel deck)	
4. Vigas metálicas	
5. Cerchas metálicas	
6. Entramado en madera	
7. No aplica	
8. Otro. Cuál? NA	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (Si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál? NA	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	
2. Muros estructurales en concreto	
3. Sistema combinado en concreto	
4. Prefabricados en concreto	
5. Mampostería confinada	
6. Mampostería reforzada	
7. Mampostería no reforzada	
8. Pórticos en acero	
9. Pórtico arriostrado en acero	
10. Pórticos y paredes en madera	
11. Pórticos y paredes en otros materiales	
12. Muros en bahareque	
13. Muros en tapia pisada	
14. Muros en adobe	
15. Construcción improvisada	
16. Mixta	
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	
2. Irregularidad media	
3. Irregularidad baja o inexistente	

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	
2. Edificaciones reforzadas	
3. Mampostería reforzada	
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	
5. Estructuras ligeras	
6. Construcciones simples	
7. Otro. Cuál? NA	

Observaciones: Solo se hizo levantamiento de acta de comunidad externo

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerca de tomde en madera

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

								BUENO		REGULAR		MALO	
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Acceso en algunas adoptan en partes metalica en buenas condiciones Viden en adecuar, Presenta Hundimiento

ESTADO DE CERRAMIENTO:

								BUENO		REGULAR		MALO	
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en malla eslabonada con tubo metalicos, rotura con

Contrato VIC108R 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	GHSPS-ofic-lc-3-PR-1
		VERSION	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. IC132-147-2025	Contrato de Interventoria No. 218-7-2025	Acta de Vecindad de Seguimiento No.	(Dia / Mes / Año) 15 07 26

REGISTRO FOTOGRAFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página electrónica, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. Si fuese necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del compromiso técnico, deberán tenerse en cuenta en el siguiente procesito del formato Acta de Vecindad.

Caminos VEREDALES 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MA-IP-S-MN-IN-3-FR-4
		VERSION	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMPOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 15 07 25
Contrato de Obra No. ICCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

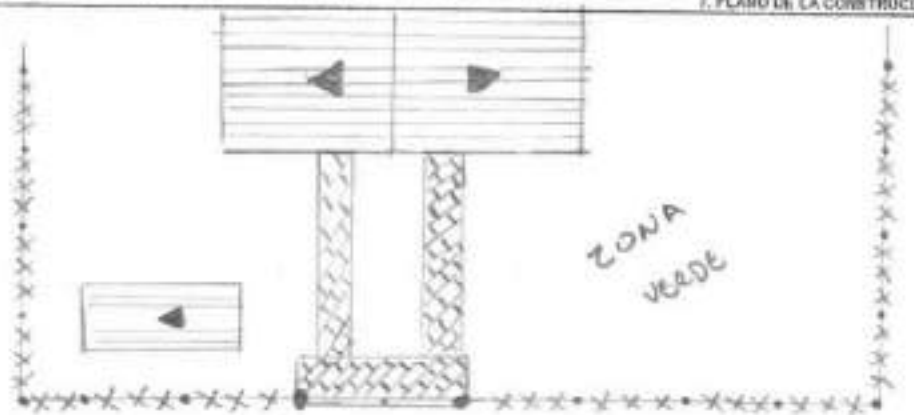

VIA A INTERVENIR.

CUADRO DETALLES.	
VIA INTERVENIR.	
CUBIERTA METALICA.	
ASFALTO	
MALLA ESLABONADA TUBO METALICO	

FIRMAS

Firma Nombre: Luis Alberto Gonzalez Cruz Responsabilidad Social Socio C.C. O NIT: 19.312.757 Cargo: Contratista, Dentro: Interventoría, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Coordinación Administrativa)	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 25202-263412 CND	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. 15 202 16 469	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT

Gobernación Cundinamarca 2024-2027	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MI-GPS-MN-01-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE: ALMANAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 215 / 2025	Acta de Vecindad de:	Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Mesitas del Caballero		PR:
Dirección	KB 4 395		Teléfono:	3203837734	
Nombre de la persona que atiende la visita: Oscar Susa				CC No.: 2957439	
Tipo de tenencia de la vivienda: 1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva					1
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.:	
Edad de la construcción: N/A		No. de Apartamentos: N/A		No. de pisos:	N/A
No. de Hogares: N/A		No. total habitantes: N/A		Mujeres jefes de hogar:	N/A
Niños (menos de 14 años): N/A		Adultos mayores (más de 60 años): N/A		Personas en situación de discapacidad:	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:		1. Urbano, 2. Rural			2
ESTADO DEL PREDIO:		1. Sin edificar, 2. Obra gris, 3. Terminado			3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:		1. Si, 2. No			1
PENDIENTE DEL TERRENO:		1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado			2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable	X		
7. Internet	X		
8. Otros			Cuál?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	☒	7. Educativo	☐	Garaje
2. Comercial	☐	8. Institucional	☐	SI ☐ NO ☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐	Uso del garaje:
4. Minero	☐	10. Religioso	☐	
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐	
6. Plantacional	☐	12. Otro	☐	

FIRMAS

Firma: Residente Responsable Unidad Social C.C. O NIT:	Firma: Nombre: Luis Javier López E. Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 091034 - 066 3569	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15-202-126569	Firma: Nombre: Oscar Susa Oscar Javier Susa Martínez Testigo C.C. O NIT: 2957439

Notas: 1. Se firma en consistencia, que lo consignado en el presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada e conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Contratos VICSER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MADPS-GIN-MI-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	11/07/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐	

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CUBIERTA:

1. Tejavana	☐
2. Vigas cuerdas	☐
3. Sistema mixto	☐
4. Cascarón	☐
5. Concreto celulares	☐
6. Platos	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificado	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa sin revestido	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza en concreto	☐
2. Placa aligerada en concreto	☐
3. Losetas colaborantes (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Correas metálicas	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál? N/A	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En altura: No. de pisos adicionales	N/A
3. En extensión: metros de anchor (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL:

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y puentes en madera	☐
11. Pórticos y puentes en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☒
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras mixtas	☐
5. Estructuras ligeras	☒
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTAS Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	N/A	DISTANCIA ANDEN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO	✓	OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento en mampostería de piedra con pequeñas fisuras, el portón metálico y en madera no presenta deformaciones. Sin embargo, se presenta desgaste. El acceso no presenta desprendimientos, solo desgaste natural.

Consorcio VICSER 021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	GASSPS-MM-01-UFR-4
		VERSION	1
		Página	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	
Contrato de Obra No. ICCU 140-1-2023	Contrato de Interventoría No. 219-1-2023	Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento	(Día / Mes / Año) 15 07 24

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los reseñados en la página anterior, se podrán insertar más páginas.
2. El acta de vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo de todos los gestores sociales del proyecto.
3. En caso necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a pesar del componente técnico, no tienen detalles en cuenta en el espacio propuesto del formato Acta de Vecindad.

Gobernación de CUNDINAMARCA
2020-2024

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD


CÓDIGO	MASPS-ABN-IN-3-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	9

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 146 / 2025	Contrato de Interventoría No. 213 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

1. Acceso Vehicular
2. Entrada al Predio
3. Cerramiento

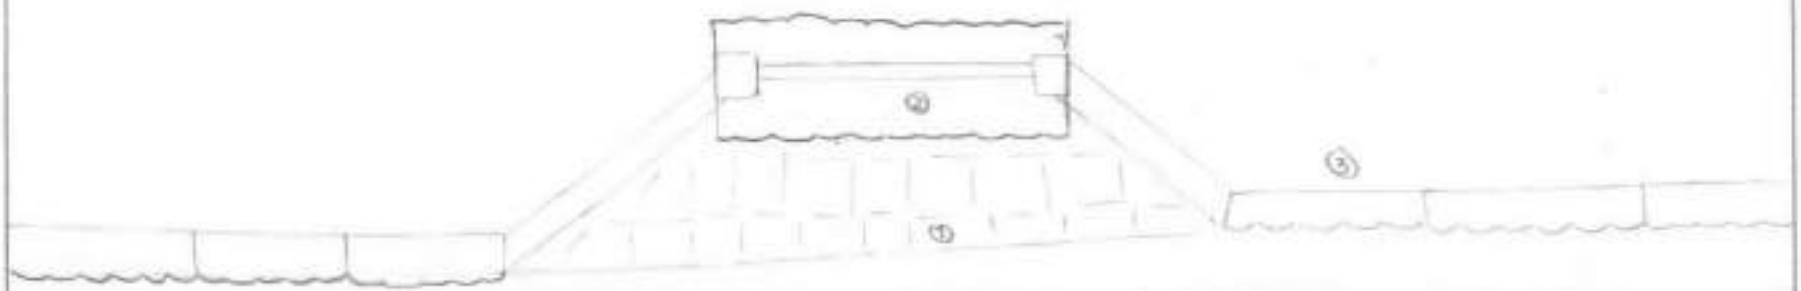

K 8+345

FIRMAS

Firma:	Nora Luz López C	Firma:	Oscar Susa
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre: Ing. Residente Interventoría	Nombre: Oscar Javier Susa Martínez
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 09102A-0643264	Matrícula profesional No.	C.C. O NIT: 2957439

Original: Contratista
Copias: Interventoría, Fiscalización de Sostenibilidad, Archivo de Gestión Documental (Administración, Interventoría)

Consorcio VICSER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MI-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA (Día / Mes / Año): 15 07 26

Contrato de Obra No. ICCU-149 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 219 / 2025 | **Acta de Vecindad de:** Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Pasca	Vereda: Mesitas de C	PR	
Dirección:	Km 81+300 lado derecho		Teléfonos:	3164843973	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Crecencio Maria Rubio Rodriguez			CC No. 17120839	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				Propia
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	Crecencio Maria Rubio Rodriguez			CC No. 17120839	
Edad de la construcción:	30 años	No. de Apartamentos:	3	No. de pisos:	1
No. de Hogares:	1	No. total residentes:	2	Mujeres jefes de hogar:	1
Niños (menos de 14 años):	0	Adultos mayores (más de 60 años):	2	Personas en situación de discapacidad:	0
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar; 2.Obra Gris; 3. Terminado				Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No				SI
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				Ondulado

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Agua ducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros		X	CUAL?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	X	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Salubridad	☐
3. Industrial	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11.Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐

Uso del garaje:

FIRMAS

Firma: X	Firma:	Firma:
Nombre: Crecencio Maria Rubio	Nombre:	Nombre:
Responsable Unidad Social	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 17120839	Matrícula profesional No.: 25202-56272 CND	Matrícula profesional No.: AS-102-26-13592
		Firma:
		Nombre:
		Testigo
		C.C. O NIT:

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada a conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Contrato VICDUR 0021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-VN-FR-3-PS-4
VERSION	1
PAGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA (Día / Mes / Año): 15 07 26

Contrato de Obra No. IDCU-140-2023 | Contrato de Interventoría No. 218-2023 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN		SISTEMA DE ENTREPISO		SISTEMA ESTRUCTURAL		IRREGULARIDAD EN PLANTA	
1. Zapatas	[ ]	1. Placa maciza de concreto	[ ]	1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]	2. Placa aligerada de concreto	[ ]	2. Muros estructurales en concreto	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
3. Sistema mixto	[ ]	3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]	3. Sistema combinado en concreto	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
4. Caissons	[ ]	4. Vigas metálicas	[ ]	4. Prefabricados en concreto	[ ]		
5. Concreto ciclópeo	[ ]	5. Canales metálicas	[ ]	5. Mampostería confinada	[ ]	IRREGULARIDAD EN ALTURA	
6. Pilotes	[ ]	6. Entramado en madera	[ ]	6. Mampostería reforzada	[ ]	1. Irregularidad alta	[ ]
7. Pilotaje de cimentación	[ ]	7. No aplica	[ ]	7. Mampostería no reforzada	[ ]	2. Irregularidad media	[ ]
8. No identificada	[ ]	8. Otro. Cuál? NA		8. Pórticos en acero	[ ]	3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]
9. No visto	[ ]			9. Pórticos arriostrados en acero	[ ]		
10. Otro. Cuál? NA		REFORMAS EN LA ESTRUCTURA		10. Pórticos y paredes en madera	[ ]	TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN	
		1. Reforzos (SI / NO)		11. Pórticos y paredes en otros materiales	[ ]	1. Edificaciones con reforzamiento especial	[ ]
SISTEMA DE CUBIERTA		2. En otros No. de pisos adicionales		12. Muros en tapiarías	[ ]	2. Edificaciones reforzadas	[ ]
1. Placa en concreto	[ ]	3. En extensión: metros de ancho (paralelo a la vía)		13. Muros en tapia pisada	[ ]	3. Mampostería reforzada	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]	4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)		14. Muros en adobe	[ ]	4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras híbridas	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]	5. Otro. Cuál? NA		15. Construcción en madera	[ ]	5. Estructuras tapias	[ ]
4. Estructura de madera y teja	[ ]			16. Mixto	[ ]	6. Construcciones simples	[ ]
5. Otro. Cuál? NA				17. Otro. Cuál? NA		7. Otro. Cuál? NA	

Observaciones: Solo se hizo levantamiento en Cerramiento

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [X]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		EROSIÓN ANDÉN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Andenes en concreto presentan fisuras inclinamiento y humedad, Porton de acceso tiene Columna en concreto Cadillo pensada Porton de Policia; Hay una cubierta con problema metalica tecnica teja eternit

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [ ] REGULAR [X] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: Cerramiento en la Zapata Comido en los postes de concreto y falta por Placa malla eslabonada; Humedad en la Zapata Comido en los postes de concreto y falta por Placa malla

Contratos VIC-UER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MADPS-MN-N-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA OLVIDARSE EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	(Día / Mes / Año) 15 - 09 - 24
Contrato de Obra No. 4232-140-7-2025	Contrato de Interventoría No. 2167-2025	Acta de Vecindad de Regularización	X

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuere necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no hayan tenido en cuenta en el siguiente propuesto de formato Acta de Vecindad.

Comercio VIGENTE 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MA-IPS-SIM-IN-3-FT-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	(Día / Mes / Año) 15 of 10
Contrato de Obra No. ICCU 149 / 2025	Contrato de Interventoría No. 215 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

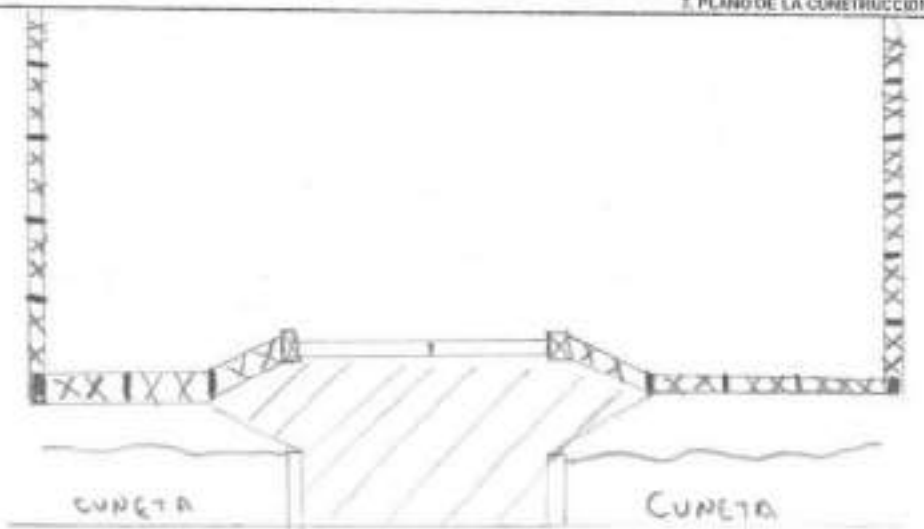

VIA A INTERVENIR.

CUADRO DETALLE

VIA INTERVENIR	
PORTON METALICO	[N] [I] [X]
ANDEN CONCRETO.	
MALLA Y POSTE CONCRETO	[XX] [XX]

FIRMAS

Firma Nombre: Cristian Mauricio Pulido Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 1.070.839 Original: Contratista Copias: Interventor, Subdirección de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa).	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 25202-36142 CND. Andres Cadena	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No.: 15202-261569	Firma Nombre Testigo C.C. O NIT

Gobernación de CUNDINAMARCA 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-1-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VITORALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/01/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. ICCU 143 / 2025	Contrato de Interventoría No. 211 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Morelia del Cabo Alto		PR
Dirección	KB + 72		Teléfonos	3502953595	
Nombre de la persona que atiende la visita: Ingrid Cabillos				CC No. 91462829	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva				
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.	
Edad de la construcción:	N/A	No. de Apartamentos:	N/A	No. de pisos:	N/A
No. de Pisos:	N/A	No. total residentes:	N/A	Mujeres jefes de hogar:	N/A
Niños (menor de 14 años):	N/A	Victima mayores (edad de 18 años):	N/A	Personas en situación de discapacidad:	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificación 2.Obra Gris 3. Terminado				3
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano 2. Ondulado 3. Escarpado				2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Gas	X		
5. Teléfono	X		
6. Televisión cable	X		
7. Internet	X		
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	X	7. Educativo		Cerraje
2. Comercial		8. Salubridad		SI [X] NO [ ]
3. Industrial		9. Cultural		Uso del garaje:
4. Minero		10. Religioso		
5. Agropecuario		11.Asistencial		
6. Recreacional		12. Otro		

FIRMAS

Firma:		Firma:		Firma:	Ingrid Cabillos
Nombre: Responsable Unidad Social		Nombre: Luis Jair López C		Nombre: Ingrid Cabillos	
C.C. O NIT:		Ing. Residente Contratista		Testigo	
Nota: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Ficha de Vecindad corresponde a la realidad. 2. Una vez firmado a conformidad, se entregara al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.		Matrícula profesional No.: 091023-0663269		C.C. O NIT:	1146782920

15/01/2026

Consorcio VIGGEN 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPC-MN-04-FT-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 15 / 07 / 2024 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. SCGJ 140 / 2024 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2024 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN:

1. Zapatas	☐
2. Vigas sardas	X
3. Sistema mixto	☐
4. Columnas	☐
5. Concreto ciclópeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cual?	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	X
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cual?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lamina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cerchas metálicas	☐
6. Entramada en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cual? N/A	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	NO
2. En años: No. de años adicionales	N/A
3. En intensidad: metros de ejecto (incidencia a la vía)	181
4. En profundidad: metros de fondo (dependiendo a la vía)	
5. Otro. Cual?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Porticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Balcones cantilever en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	X
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Porticos en acero	☐
9. Porticos arriostrados en acero	☐
10. Porticos y pantallas en madera	☐
11. Porticos y pantallas en otros materiales	☐
12. Muros en tuluenguje	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción Industrializada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	X
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con nilo comercial especial	☐
2. Edificaciones aporticadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento inflexible y estructuras híbridas	☐
5. Estructuras ligeras	X
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cual?	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N/A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS	N/A	FISURAS	N/A	HUMEDAD	N/A	DESPLAZAMIENTO	N/A	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	N/A	GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	N/A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO	X	OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerramiento conformado por un muro bajo en mampostería sobre el cual se dispone una cerca mixta en malla eslabonada sostenida por postes metálicos. Se muestra desgaste superficial y suciedad. La malla eslabonada y los postes metálicos no presentan deformaciones significativas. El predio no presenta daños visibles.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO: MADPO-MN-01-FR-14
VERSIÓN: 1
PAGINA: 3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROYAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA CRECER, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA:	
Contrato de Obra No. ICCU- 148 / 2025	Contrato de Interventoria No. 218 / 2025	**Acta de Vecindad de Seguimiento** Inicio ☐	Día / Mes / Año: 15 07 26

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no hubiera tenidas en cuenta en el esquema propuesto de formato Acta de vecindad.

Gobernación VICOFER 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA VÍAS PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MNUN-14754
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIO, GUALIVÁ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/01/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. (OC) 146 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

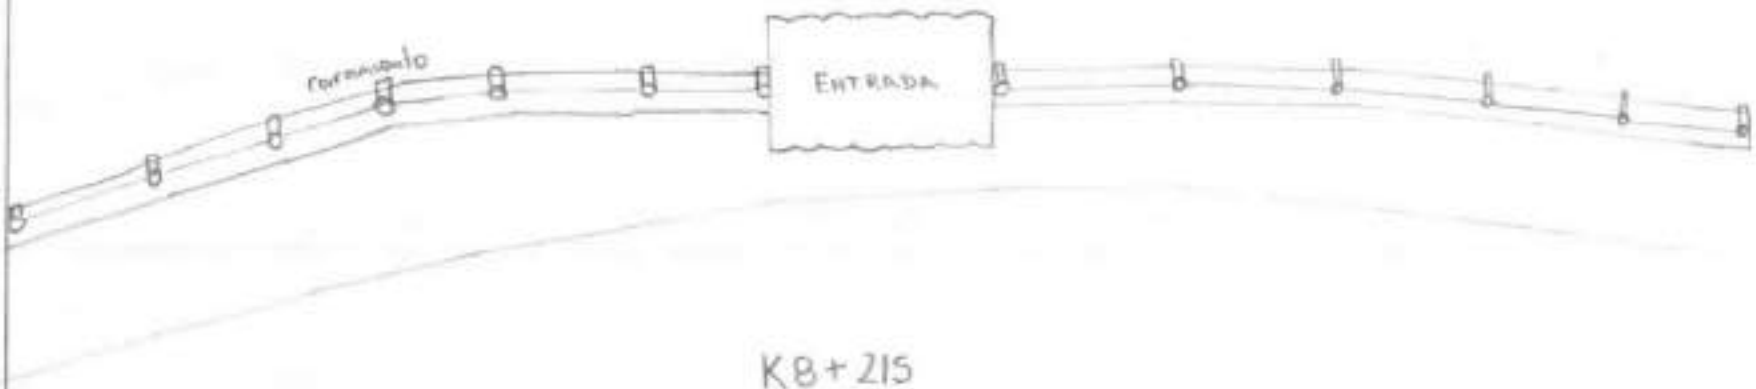

FIRMAS

Firma Nombre: Representante Unidad Ejecutora C.C. o NIT: Empresa Contratista: Cargo: Interventor, Fiscalización o Supervisión	Firma Nombre: Luis Javier López C Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No.: 0910837-0663369	Firma Nombre Ing. Residente [illegible] Matrícula profesional No.: 15262 BL 1569	Firma Nombre Testigo C.C. o NIT:	Gnelda Gnelda Cubillos 41462829

Cundinamarca VOLUEN 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MADPS-MN-86-3-FR-4
VERSION	1
PAGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 214 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio: X / Seguimiento:

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Mesitas	PR
Dirección:	K8+215		Teléfono:	311 564 7817
Nombre de la persona que atiende la visita: Omar Franco.			CC No.	2954074

Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia 2. En arriendo 3. Posesión 4. Usufructo 5. Propiedad colectiva	—
Nombre del responsable / propietario de la construcción:	—	CC No. —

Edad de la construcción: —	No. de Apartamentos: —	No. de pisos: —
No. de Hogares: —	No. total residentes: —	Mujeres jefes de hogar: —
Niños (menos de 14 años): —	Adultos mayores (más de 60 años): —	Personas en situación de discapacidad: —

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar 2.Obra Gris 3. Terminado	1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano 2. Ondulado 3. Escarpado	2

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO
1. Acueducto		
2. Alcantarillado		
3. Energía		
4. Gas		
5. Teléfono		
6. Televisión cable		
7. Internet		
8. Otros		

Observaciones del estado de las redes: Sin información

DESTINACIÓN ECONOMICA

1. Residencial		7. Educativa	
2. Comercial		8. Salubridad	
3. Industrial		5. Cultural	
4. Minero		10. Religioso	
5. Agropecuario		11.Institucional	
6. Recreacional		12. Otro	X

ACCESOS VEHICULARES

Cerca: SI [X] NO [ ]
Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ingeniero Residente Contratista	Nombre: Ingeniero Residente Interventoría
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 091037-061850	C.C. O NIT: 13.062.461.619

Nombre: Omar Franco R
C.C. O NIT: 2954074
Testigo

Notas:
1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada e codificada, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Contratista VIC CIÓN 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MIPE-AMA-FI-3719-4
VERSION	1
PAGINA	2.

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA: 15 / Nio / 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. (CCU-140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Reglamento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

ORIENTACIÓN

1. Zapatas	☐	
2. Vigas centrales	☐	
3. Columnas rectas	☐	
4. Columnas	☐	
5. Concreto ciclópeo	☐	
6. Pilotes	☐	
7. Placa de cimentación	☐	
8. No identificada	☐	
9. No existe	☐	
10. Otro. Cual?	NA	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en Steel deck	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura de madera y teja	☐
5. Otro. Cual?	NA

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto	☐	
2. Placa aligerada de concreto	☐	
3. Lamina colaborante (Steel deck)	☐	
4. Vigas metálicas	☐	
5. Cerchas metálicas	☐	
6. Entramado en madera	☐	
7. No aplica	☐	
8. Otro. Cual?	NA	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En ocantado: metros de ancho (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cual?	NA

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórticos arriostrados en acero	☐
10. Pórticos y canales en madera	☐
11. Pórticos y canales en otros materiales	☐
12. Muros en bahareque	☐
13. Muros en tapia pisada	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cual?	NA

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones estratégicas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento deficiente y estructuras mixtas	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cual?	NA

Observaciones: Levantamiento de cerca de fachada con testigo

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Cerramiento en postes de madera e hilos de alambre de puas, dos brechas parte del cerramiento con bordillos en concreto en acceso en tierra

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VIA	GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: Dos Muros en concreto estampado en buen estado pero con presencia de vegetación, debajo de los muros hay tubería en grees para canal aguas lluvia.

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO ☒ REGULAR ☐ MALO ☐

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		MURO	OTROS

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERIAS: postes en madera con 5 hilos de alambre, dos brechas nada predio en venta.

Convenio VICIGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el espacio propuesto del formato Acta de Vecindad.

Cundinamarca VIGENCIA 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MIASPGAMN-01-FT-4
		VERSION	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAMPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15 / Julio / 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Predio Siguiente

7. CLAVO DE LA CONSTRUCCIÓN

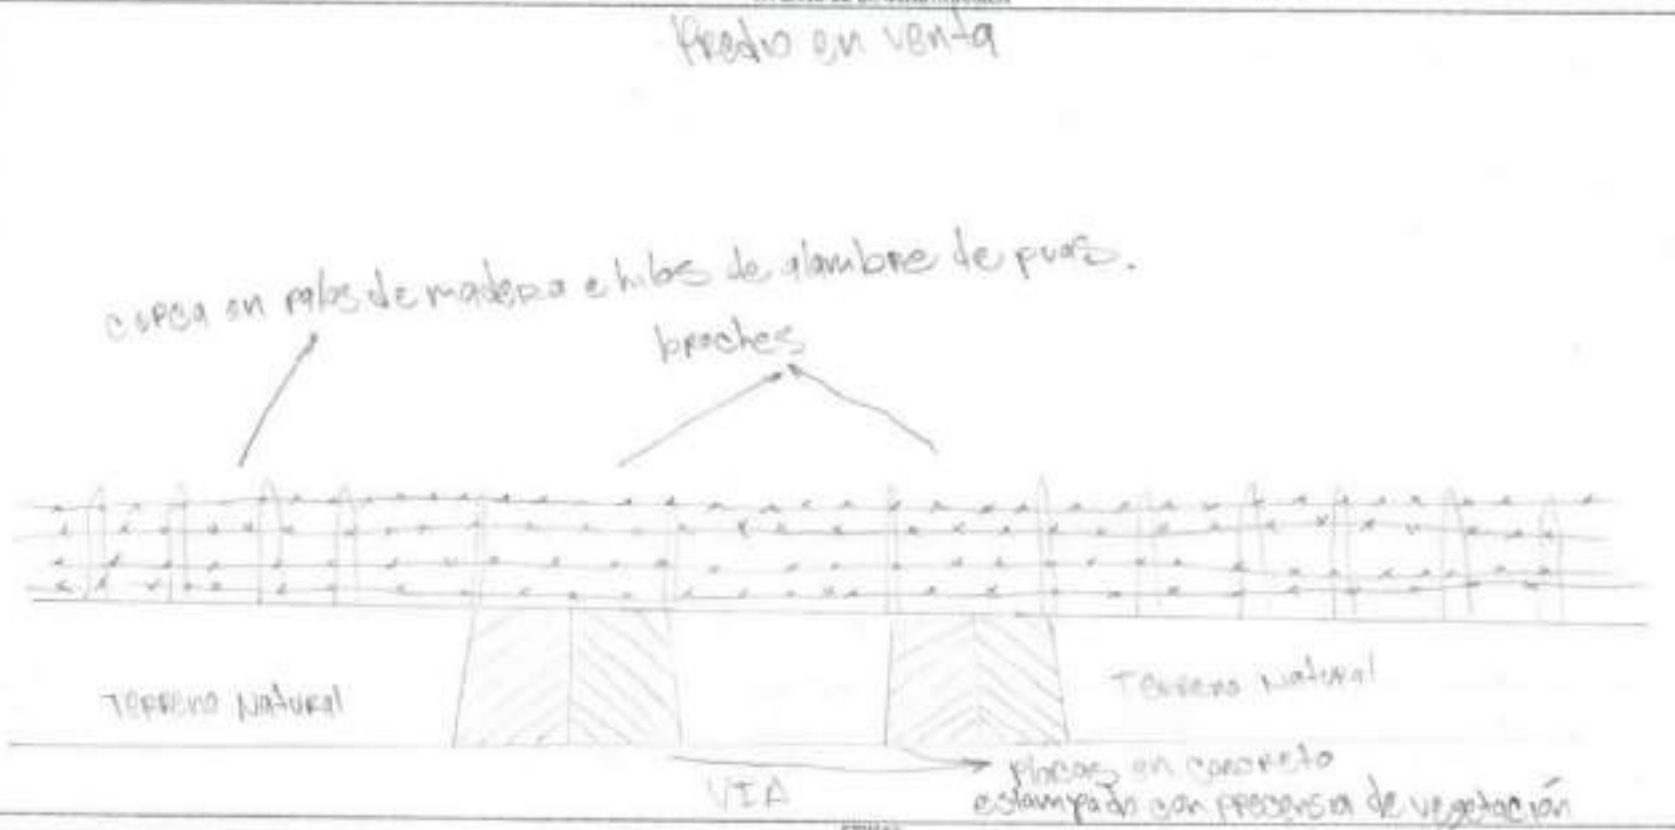

FIRMA

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	
Nombre:	Nombre: Sebastian Ortiz Arroyo	Nombre:	Nombre:	Nombre Testigo	
Responsable Vecindad	Ing. Residente Contratista	Ing. Residente Interventoría			
C.C. ó NIT:	Matrícula profesional No. 091037-91B230	Matrícula profesional No.	C.C. ó NIT:	C.C. ó NIT:	
Predio: Urbano					
Cargo: Propietario, Tenedor(a) o Poseedor(a) Arrimo de Cuerpo del Contrato (Administración Administrativa)					

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MADPS-MN-04-3-FR-4
VERSIÓN	1
FECHA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	15 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. (CCU 140 / 2025) | Contrato de Interventoría No. 214 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☒ Seguimiento ☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Hesitos		PR:
Dirección:	Villa Laura Maria K8+1050		Teléfono:	311 503 41 78.	
Nombre de la persona que atiende la visita:	Angel Maria Holguin			Cédula: 2.955 714 Anolaima	
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia 2. En arriendo, 3. Posesión, 4. Usufructo, 5. Propiedad colectiva				1
Nombre del propietario / propietario de la construcción:	Jose Nelson Holguin.			CC No: —	
Edad de la construcción:	17	No. de Apartamentos:	2.	No. de pisos:	1
No. de Hogares:	—	No. total residentes:	—	Mujeres jefes de hogar:	—
Niños (menos de 14 años):	—	Adultos mayores (más de 60 años):	—	Personas en situación de discapacidad:	—
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano, 2. Rural				2
ESTADO DEL PREDIO:	1. Sin edificar, 2.Obra Gris, 3. Terminado				2.
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si, 2. No				1
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano, 2. Ondulado, 3. Escarpado				2.

SERVICIOS PUBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de los redes
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado			
3. Energía	X		
4. Gas			
5. Teléfono			
6. Televisión cable			
7. Internet			
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	☒	7. Educativo	☐
2. Comercial	☐	8. Solidaridad	☐
3. Industria	☐	9. Cultural	☐
4. Minero	☐	10. Religioso	☐
5. Agropecuario	☐	11. Institucional	☐
6. Recreacional	☐	12. Otro	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje: SI ☒ NO ☐

Uso del garaje: -

FIRMAS

Firma: [signature] Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: 2955714

Firma: [signature] Nombre: Sebastian Ovalle Arroyo Inj. Residente Contratista Matrícula profesional No. 08037-061825O

Firma: [signature] Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional: 15 2016 159

Firma Nombre Testigo C.C. O NIT:

Notas: 1. Si firma en contravía, que lo manifestado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada e conformidad, se entregara al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Consorcio VICGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MAIPS-MIN-IN-3-FR-4
VERSION	1
PAGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEBRADAS, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."
FECHA	15 Julio 2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU- 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 218 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas			
2. Vigas corridas			
3. Baterias mixtas			
4. Concreto			
5. Concreto ciclopeo			
6. Pilotes			
7. Placa de cimentación			
8. No identificada			
9. No existe			
10. Otro. Cuál?	N A		

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza de concreto			
2. Placa aligerada de concreto			
3. Lamina colaborante (Steel deck)			
4. Vigas metálicas			
5. Cerchas metálicas			
6. Entramado en madera			
7. No aplica			
8. Otro. Cuál?	N A		

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Porticos en concreto reforzado			
2. Muros estructurales en concreto			
3. Baterias combinados en concreto			
4. Prefabricados en concreto			
5. Mampostería confinada			
6. Mampostería reforzada			
7. Mampostería no reforzada			
8. Pórticos en acero			
9. Pórticos arriostrados en acero			
10. Pórticos y pantallas en madera			
11. Pórticos y pantallas en otros materiales			
12. Muros en bahareque			
13. Muros en tapia pisada			
14. Muros en adobe			
15. Construcción improvisada			
16. Tapia			
17. Otro. Cuál?			

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta			
2. Irregularidad media			
3. Irregularidad baja o inexistente			

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta			
2. Irregularidad media			
3. Irregularidad baja o inexistente			

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (si / no)			
2. En altura: No. de pisos adicionados			
3. En planta/s: metros de ancho (paralelo a la vía)			
4. En profundad: metros de fondo (perpendicular a la vía)			
5. Otro. Cuál?	N A		

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial			
2. Edificaciones reforzadas			
3. Mampostería reforzada			
4. Estructuras con confinamiento (cubierto y estructuras livianas)			
5. Estructuras ligeras			
6. Construcciones sencillas			
7. Otro. Cuál?	N A		

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto			
2. Placa en Steel deck			
3. Estructura metálica y teja			
4. Estructura de madera y teja			
5. Otro. Cuál?	N A		

Observaciones: Mantenimiento de fachada, predio en construcción con encargado

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Cerraviga y falconbia, estuvimos en concreto forradas en ladrillo, rejas en reja metálica 2 hojas y cubierta en estructura metálica y teja eternit acorrada con teja de barro

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:
No aplica, aquiere de instalación de acueducto y acceso vehicular con placa en concreto con tubería de construcción rural

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS: BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR (M)(CM) APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Sin anden

ESTADO DE CERRAMIENTOS: BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA	X	POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA	X	MURO		OTROS	X

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:
Postes bajo interno con alambre de puas externo y malla eslabonada con ruptura de doble altura

Cartografía VIGGER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASP5-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO









Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página diseñada, se podrán insertar más páginas.

6. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciada por profesionales técnicos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.

7. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de Vecindad.


Control de VIGENCIA 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MIOPS-MN-IN-3.FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		FECHA: 15 / Julio / 2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. IDCU-140-2025	Contrato de Interventoría No. 219 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☒	

7. PLANO DE LA CONSTRUCCIÓN

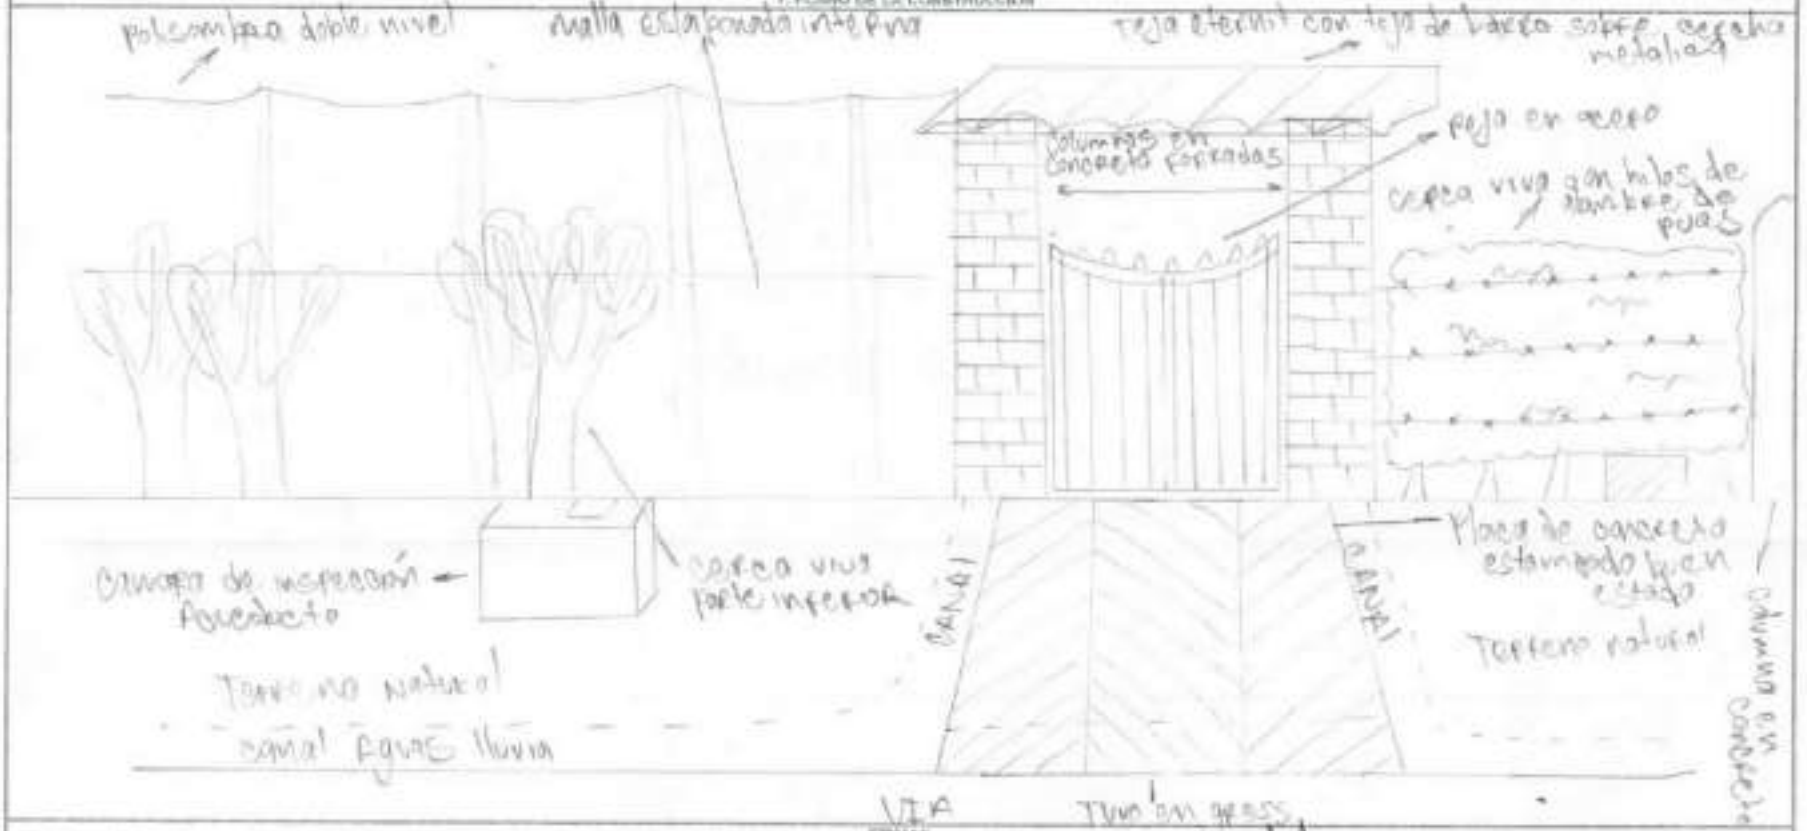

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:
Nombre:	Nombre: Sebastian Ocampo Buitrago	Nombre:
Cargo: Responsable Unidad Social	Cargo: Ing. Residente Contratista	Cargo: Ing. Residente Interventoría
C.C. O NIT: 2955714	Matrícula profesional No.: 091037-0518230	Matrícula profesional No.:
Empresa: Gobernación		

Empresa: Interventoría, Fortalecimiento y/o Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Administrativo)

Consorcio VORGER 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MUSPS-MN-IN-1-FR-4
VERSIÓN	1
PAGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINO PARA QUITARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."		FECHA (Día / Mes / Año) 15 07 26
Contrato de Obra No. ICCU 543 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de: Inicio [X] Seguimiento [ ]	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Mesitas del Caballero		PR
Dirección:	KM 8+020 lado derecho			Teléfonos:	3115647817
Nombre de la persona que atiende la visita:	Omar Cesar Toro			CC No.:	2954014
Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva				NA
Nombre del responsable / propietario de la construcción:				CC No.:	
Edad de la construcción:	N/A	No. de Apartamentos:	N/A	No. de pisos:	N/A
No. de Hogares:	N/A	No. total residentes:	N/A	Mujeres jefes de hogar:	N/A
Niños (menos de 11 años):	N/A	Adultos mayores (más de 60 años):	N/A	Personas en situación de discapacidad:	N/A
CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural				Rural
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificar; 2. Obra Gris; 3. Terminado				Terminado
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN:	1. SI ; 2. No				Si
PENDIENTE DEL TERRENO:	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado				ondulado

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes
1. Acueducto	X		
2. Alcantarillado		X	
3. Energía	X		
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros			Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA

1. Residencial	[X]	7. Educativo	[ ]
2. Comercial	[ ]	8. Institucional	[ ]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]

ACCESOS VEHICULARES

Garaje
SI [ ] NO [ ]
Uso del garaje:

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	
Nombre: Responsable Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Firmado: Ing. Residente Interventoría		Nombre: Testigo	
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No. 2520126341 CUN	Matrícula profesional No. 25202611769		C.C. O NIT:	2954014

Notas: 1. Se firma en constancia, que lo consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada y conformidad, se entregara al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Contrato VCC/FR-2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MASPS-MN-IN-7-FR-4
VERSION	1
PAGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA OLVIDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

FECHA (Día / Mes / Año): 15 07 26

Contrato de Obra No. ICCU 140 / 2025 | Contrato de Interventoría No. 210 / 2025 | Acta de Vecindad de: Inicio ☐ Seguimiento ☐

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	☐
2. Vigas cuerdas	☐
3. Solados rotos	☐
4. Concreto	☐
5. Concreto ciclopeo	☐
6. Pilotes	☐
7. Placa de cimentación	☐
8. No identificada	☐
9. No existe	☐
10. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	☐
2. Placa en fibrocemento	☐
3. Estructura metálica y teja	☐
4. Estructura en madera y teja	☐
5. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA DE ENTREPISO

1. Placa maciza de concreto	☐
2. Placa aligerada de concreto	☐
3. Lámina colaborante (Steel deck)	☐
4. Vigas metálicas	☐
5. Cubierta metálica	☐
6. Entramado en madera	☐
7. No aplica	☐
8. Otro. Cuál?	N/A

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Reformas (Si / no)	
2. En altura: No. de pisos adicionales	
3. En extensión: metros de frente (paralelo a la vía)	
4. En profundidad: metros de fondo (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál?	N/A

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Porticos en concreto reforzado	☐
2. Muros estructurales en concreto	☐
3. Sistema combinado en concreto	☐
4. Prefabricados en concreto	☐
5. Mampostería confinada	☐
6. Mampostería reforzada	☐
7. Mampostería no reforzada	☐
8. Pórticos en acero	☐
9. Pórtico arriostrado en acero	☐
10. Pórticos y cerchas en madera	☐
11. Pórticos y cerchas en otros materiales	☐
12. Muros en tapia pisada	☐
13. Muros en bahareque	☐
14. Muros en adobe	☐
15. Construcción improvisada	☐
16. Mixto	☐
17. Otro. Cuál?	N/A

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	☐
2. Irregularidad media	☐
3. Irregularidad baja o inexistente	☐

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con reforzamiento especial	☐
2. Edificaciones reforzadas	☐
3. Mampostería reforzada	☐
4. Estructuras con confinamiento (bahareque y estructuras híbridas)	☐
5. Estructuras ligeras	☐
6. Construcciones simples	☐
7. Otro. Cuál?	N/A

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS

							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS

							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE		DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS

							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
GRIETAS		FISURAS		HUMEDAD		DESPLAZAMIENTO		DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA		GROSOR ANDEN APROXIMADO (cm)	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: En frente no hay acceso Porton metalico en regular estado, presenta oxidacion en la parte inferior, andenes

ESTADO DE CERRAMIENTOS

							BUENO ☐	REGULAR ☐	MALO ☐
MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA		CERCA VIVA		MURO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS: de madera) panoramicos en malla eslabonada en regular estado presentan hongos y moho verde por humedad. estado en esta templada Postes

Consorcio VIGUER 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD EN PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPS-MN-N-1-PR-4
		VERSION	1
		PAGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA VIVIENDIR EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA	
Contrato de Obra No. (CO) 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 234 / 2025	Acta de Vecindad de Seguimiento: ***	(Día / Mes / Año) 15 07 25

REGISTRO FOTOGRAFICO










Notas: 5. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página anterior, se podrán insertar más páginas.
6. El Acta de vecindad es un documento técnico que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista o la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
7. Si fuere necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no hayan tenido en cuenta en el esquema propuesto en formato Acta de Vecindad.

Cundinamarca INVIERTE 2024	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CODIGO	MASPSASIN-3-FR-4
		VERSION	1
		PAGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA "	FECHA	(Dia / Mes / Año) 15 07 25
Contrato de Obra No. IDCU 148 / 2025	Contrato de Interventoria No. 219 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio Seguimiento

7. PLANO DE LA CONSTRUCCION

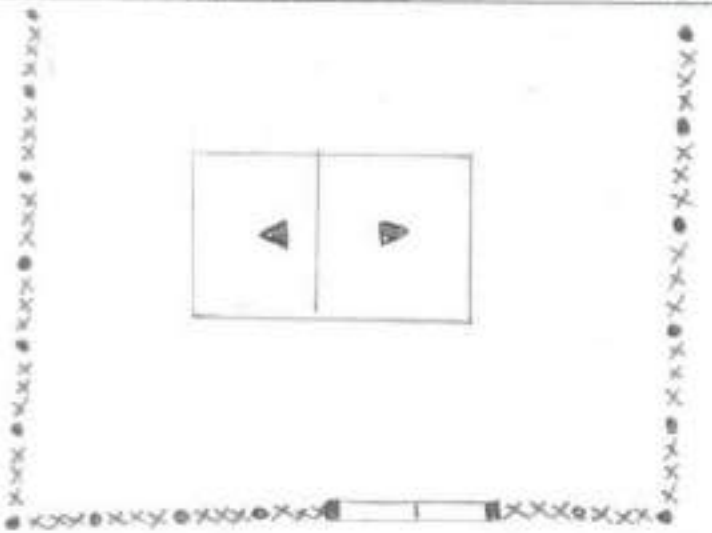

CUADRO DETALLES	
VIA INTERVENIA	
CERRAMIENTO ESLABONADO	
PUERTA METALICA	

VIA INTERVENIA

FIRMAS

Firma Nombre: Responsable Unidad Social C.C. O NIT: Empresa Contratista Cargo: Interventor, Fiscalizador o Supervisor del Contrato (Gobernación Administrativo)	Firma Nombre: Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 2116236342 CUN	Firma Nombre: Ing. Residente Interventoria Matrícula profesional No.	Firma Nombre: Vecino Tratigo C. C. O NIT: 2954014

Cundinamarca VOLVER A EST

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	MASPS-MN-01-1-FR-4
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE FUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. IDCU 140 / 2025	Contrato de Interventoría No. 213 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Ubicación:	Departamento: Cundinamarca	Municipio: Anolaima	Vereda: Mesitas Caballero	PR:
Dirección:	KM 1 000		Teléfonos:	3115698812
Nombre de la persona que atiende la visita:	Omar Muñoz		CC No:	2959014

Tipo de tenencia de la vivienda:	1. Propia; 2. En arriendo; 3. Posesión; 4. Usufructo; 5. Propiedad colectiva	
Nombre del responsable / propietario de la construcción:		CC No.

Edad de la construcción:	N/A	No. de Apartamentos:	N/A	No. de pisos:	N/A
No. de Hogares:	N/A	No. total habitantes:	N/A	No. personas de bajos ingresos:	N/A
Niños (menos de 11 años):	N/A	Adultos mayores (más de 60 años):	N/A	Personas en situación de discapacidad:	N/A

CLASIFICACIÓN CATASTRAL:	1. Urbano; 2. Rural	2
ESTADO DEL PREDIO:	1. En edificación; 2. Obra Gris; 3. Terminado	1
CON LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN	1. Si; 2. No	2
PENDIENTE DEL TERRENO	1. Plano; 2. Ondulado; 3. Escarpado	2

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	Observaciones del estado de las redes:
1. Acueducto		X	
2. Alcantarillado		X	
3. Energía		X	
4. Gas		X	
5. Teléfono		X	
6. Televisión cable		X	
7. Internet		X	
8. Otros		X	Cual?

DESTINACIÓN ECONÓMICA				ACCESOS VEHICULARES
1. Residencial	[ ]	7. Educativo	[ ]	Garaje
2. Comercial	[ ]	8. Institucional	[ ]	SI [ ] NO [X]
3. Industrial	[ ]	9. Cultural	[ ]	Uso del garaje:
4. Minero	[ ]	10. Religioso	[ ]	
5. Agropecuario	[ ]	11. Institucional	[ ]	
6. Recreacional	[ ]	12. Otro	[ ]	

FIRMAS

Firma:	Firma:	Firma	Firma
Nombre: Beneficiario Unidad Social	Nombre: Ing. Residente Contratista	Nombre/ Ing. Residente Interventoría	Nombre: Testigo
C.C. O NIT:	Matrícula profesional No.: 09631-0154345	Matrícula profesional No.: A.A.C. 26159	C.C. O NIT: 2959014

Notas: 1. Se firma en constancia, que la consignado en la presente Acta de Vecindad corresponde a la realidad.
2. Una vez firmada y conformidad, se entregará al propietario del predio copia del acta de vecindad suscrita entre las partes.

Convenio VICEPR 2021

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA
PROCESO MISIONAL GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE VECINDAD

CODIGO	MISPG-MN-Ib-14 R4
VERSION	1
PÁGINA	2

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES: CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)

Contrato de Obra No. ICCU 143 / 2025	Contrato de Interventoría No. 218 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio [X] Seguimiento [ ]

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ESTRUCTURAL

CIMENTACIÓN

1. Zapatas	[ ]
2. Vigas corridas	[ ]
3. Losa de piso	[ ]
4. Cabezales	[ ]
5. Concreto ciclópeo	[ ]
6. Pilotes	[ ]
7. Placa de cimentación	[ ]
8. No identificada	[ ]
9. No existe	[X]
10. Otro. Cuál?	

SISTEMA DE ENTREPISO:

1. Placa maciza en concreto	[ ]
2. Placa aligerada en concreto	[ ]
3. Lámina colaborante (Steel deck)	[ ]
4. Vigas metálicas	[ ]
5. Cerchas metálicas	[ ]
6. En madera en madera	[ ]
7. No aplica	[X]
8. Otro. Cuál?	

SISTEMA ESTRUCTURAL

1. Pórticos en concreto reforzado	[ ]
2. Muros estructurales en concreto	[ ]
3. Sistema combinado en concreto	[ ]
4. Prefabricados en concreto	[ ]
5. Mampostería confinada	[ ]
6. Mampostería reforzada	[ ]
7. Mampostería no reforzada	[ ]
8. Pórticos en acero	[ ]
9. Pórtico arriostrado en acero	[ ]
10. Pórticos y cerchas en madera	[ ]
11. Pórticos y cerchas en otros materiales	[ ]
12. Muros en tapia pisada	[ ]
13. Muros en bahareque	[ ]
14. Muros en adobe	[ ]
15. Construcción improvisada	[ ]
16. Mixto	[ ]
17. Otro. Cuál? N / A	

IRREGULARIDAD EN PLANTA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

IRREGULARIDAD EN ALTURA

1. Irregularidad alta	[ ]
2. Irregularidad media	[ ]
3. Irregularidad baja o inexistente	[ ]

TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL DE LA EDIFICACIÓN

1. Edificaciones con mantenimiento especial	[ ]
2. Edificaciones reforzadas	[ ]
3. Mampostería reforzada	[ ]
4. Estructuras con confinamiento deficiente y sin estribos fallida	[ ]
5. Estructuras ligeras	[ ]
6. Construcciones simples	[ ]
7. Otro. Cuál? N / A	

SISTEMA DE CUBIERTA

1. Placa en concreto	[ ]
2. Placa en Steel deck	[ ]
3. Estructura metálica y teja	[ ]
4. Estructura en madera y teja	[ ]
5. Otro. Cuál? N / A	

REFORMAS EN LA ESTRUCTURA

1. Adiciones (si / no)	NO
2. En altura. No. de pisos adicionales	N / A
3. En retroceso - metros en sacho (paralelo a la vía)	30 m
4. En profundidad - metros de sacho (perpendicular a la vía)	
5. Otro. Cuál? N / A	

Observaciones:

4. ESTADO DEL EXTERIOR DEL PREDIO

ESTADO DE LAS FACHADAS:

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	N / A	FISURAS	N / A	HUMEDAD	N / A	DESPLAZAMIENTO	N / A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N / A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N / A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE LAS FACHADAS LATERALES Y CONTRAFACHADAS:

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	N / A	FISURAS	N / A	HUMEDAD	N / A	DESPLAZAMIENTO	N / A	DAÑOS EN REPELLO, PINTURA Y/O ENCHAPE	N / A	DAÑOS EN PUERTA Y VENTANAS	N / A

DESCRIPCIÓN DE LAS AFECTACIONES:

ESTADO DE ANDENES Y ACCESOS:

BUENO [ ] REGULAR [ ] MALO [ ]

GRIETAS	N / A	FISURAS	N / A	HUMEDAD	N / A	DESPLAZAMIENTO	N / A	DISTANCIA DE CONSTRUCCIÓN A VÍA	N / A	GRADOS APROXIMADO (cm)	N / A

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

ESTADO DE CERRAMIENTOS:

BUENO [X] REGULAR [ ] MALO [ ]

MALLA ESLABONADA		POSTES DE CONCRETO		POSTES DE MADERA	X	CERCA VIVA		NUEVO		OTROS	

DESCRIPCIÓN DE LAS AVERÍAS:

Gobernación de Cundinamarca VICTORIA 2021	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO REGIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MASPS-MN-04-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE GUAVIARE, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"	FECHA
Contrato de Obra No. (CCU-140-) 2025	Contrato de Interventoría No. (218-) 2025	Acta de Vecindad de: Inicio / Seguimiento	(Día / Mes / Año) 17-07-26

REGISTRO FOTOGRÁFICO










Notas: 1. En caso de requerir incluir más registros fotográficos a los consignados en la página destinada, se podrán insertar más páginas.
2. El Acta de Vecindad es un documento técnico, que debe ser diligenciado por profesionales idóneos del Contratista y la Interventoría, con el apoyo del equipo de gestión social del proyecto.
3. Si fuera necesario, se podrá adjuntar una página anexa de observaciones, que a juicio del componente técnico, no fueron tenidas en cuenta en el esquema propuesto del formato Acta de vecindad.

Gobernación VICADER 2023	INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE VECINDAD	CÓDIGO	MA-GPS-MN-IN-3-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

OBJETO DEL PROYECTO	"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."	FECHA	15/07/2026 (Día / Mes / Año)
Contrato de Obra No. VCCU 148 / 2025	Contrato de Interventoría No. 216 / 2025	Acta de Vecindad de	Inicio ☒ Seguimiento ☐

7. CLAVO DE LA CONSTRUCCIÓN

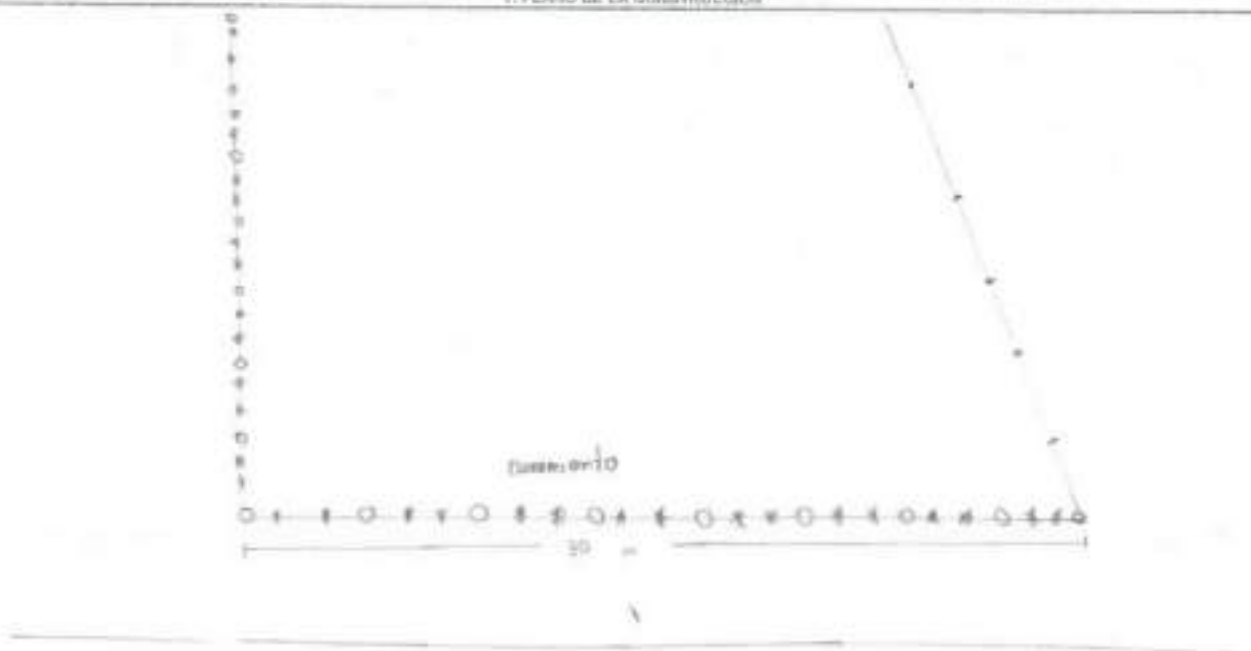

K 8+000

FIRMAS

Firma: Nombre: Responsable Vínculo Social C.C. O NIT: Original: Contratista Copias: Interventoría, Coordinación de Sostenibilidad, Archivo de Gestión del Contrato (Administración Administrativa)	Firma: Nombre: Maria I. Rocha Ing. Residente Contratista Matrícula profesional No. 0910M-0364946	Firma: Nombre: Ing. Residente Interventoría Matrícula profesional No. [illegible]	Firma: Nombre: Testigo C.C. O NIT: 29540414
