4.1 MS-GP-FR-034 INFORMES SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 19 de enero de 2026	**SEMANA No.**	**40**	DEL	**13-ene-26**	AL	**18-ene-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	CABRERA, CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
INTERVENTORIA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	304 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	304
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL CABRERA :**	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se da reinicio a las actividades de obra el dia 13 de enero del 2025 despues de dar suspension con acta de fecha 29 de diciembre del 2025.
El contratista realiza las siguientes actividades de obra en la Provincia del SUMAPAZ principalmente en el Municipio de Cabrera:
*Conformacion de calzada existente, incluye retiro de material organico entre las abscisas K11+920 al K12+092 Y K11+820 al K11+715.
* Transporte, extendida y compactacion de material de afirmado
* Instalacion de material de afirmado no incluye carrotanque entre las abscisas K11+920 al K12+092 Y K11+820 al K11+715

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13/01/2026	31-mar-26	77,00	13-ene-26		ejecución	0	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	0,00%	0,00%	0,00%
Durante el periodo	1,81%	8,68%	6,87%
Acumulado Actual	1,81%	8,68%	6,87%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	304,00	165,00	32,22

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ -	$ -	0,00%
Durante el periodo	$ 78.374.645	$ 375.734.311	479,41%
Acumulado Actual	$ 78.374.645	$ 375.734.311	479,41%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	297.359.665

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO
$ 8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 13 al 19 de enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-Teniendo en cuenta la reactivación del proyecto a partir del 13 de enero de 2026, la Interventoría solicita la implementación total del Paga en el frente de obra de Cabrera, de acuerdo a lo establecido. El Contratista atiende la solicitud y realiza la implementación de una carpa, acondiciona una zona para el almacenamiento temporal de sustancias químicas, respel y demás actividades referentes al Paga.
- Se evidencia la necesidad de realizar 2 alcantarillas adicionales en el tramo 1 de Cabrera, adicionales a las priorizadas y definidas entre la Interventoría y el Contratista. Por tanto, se revisará su definición en el frente de obra.
-Se remite al Contratista el comunicado 25C02_DTO_279 del 15 de enero de 2026 con las observaciones al informe mensual de octubre versión 2 recibido mediante oficio CVG-ICCU-OF-0292-2025.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido entre el 13 y el 18 de enero de 2026, se dio el reinicio de las actividades de los contratos de obra e interventoría, luego de la suspensión temporal de las mismas. Teniendo en cuenta lo anterior, desde el componente social se realizó un balance orientado a la atención de los compromisos requeridos.
Asimismo, la interventoría remitió a la entidad contratante, mediante el oficio 25C02_DTA_277, la solicitud de cambio en la metodología propuesta para la elaboración de actas de vecindad por el contratista de obra para la emisión del respectivo concepto o aval. De igual forma, mediante el oficio 25C02_DTO_280, se requirió al contratista la puesta en marcha del SAU y del Programa de Atención a la Ciudadanía.
Finalmente, se llevó a cabo una reunión entre el contratista, el ICCU y la interventoría, en la cual se acordó la agenda para la socialización el día 23 de enero de 2026 del alcance de la metafísica y la definición de los tramos a intervenir en el municipio de Cabrera . El resultado de esta gestión será documentado en el siguiente informe semanal.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido entre el 13 y el 18 de enero de 2026, se dio el reinicio de las actividades de los contratos de obra e interventoría, el contratista de obra realizo activacion docuemntal del personal profesional y mano de obra no calificada , las actividades ejecutadas estuvieron enfocadas en la instalacion de señalizacion contemplada para el PMT, cerramientos, instalacion de carpa y proceso de contratacion de personal nuevo. En este semana contamos en obra con 11 operativos y 6 profsionales activos de parte del contratista.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

* Se identifica como situacion problemática los cierres de via para la ejecucion del contrato de obra , esto teniendo en cuenta que la estabilizacion de los suelos con quimicos requiere de un tiempo de curado por lo que no se permite el flujo vehicular en la zona.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se realizo reprogramacion de obra para la ejecucion de la fase III del contrato de obra, para la presente semana el contratista en su programacion tenia contemplado realizar las siguientes actividades
*Transporte de Material proveniente de de explanaciones, canales,prestamos,sobreacarreos y derrumbes;Esta actividad si se desarrollo durante la semana.
*Roceria (Incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5KM); Esta actividad no se desarrollo durante la semana.
*Material de afirmado (no incluye carrotanque ni transporte). Esta actividad si se desarrollo durante la semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos economicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, topografo, Operador Motoniveladora, Operador vibrocompactador, Operador retroexcavadora, Conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, auxiliar de trafico.
*Se evidencia maquinaria y equipos (Motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactador, carrotanque, camionetas, herramienta menor).
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos quimicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecucion de obra en el municipio de cabrera cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos,presupuestados para la ejecucion de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $375.734.311 trecientos setenta y cinco millones setecientos treinta y cuatro mil trecientos once pesos que corresponden a un avance fisico del 8,68% ocho punto sesenta y ocho por ciento.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterizacion del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometria y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el periodo comprendido entre el 13 y el 18 de enero de 2026, se dio el reinicio de las actividades de los contratos de obra e interventoría, el contratista de obra realizo activacion docuemntal del personal profesional y mano de obra no calificada , las actividades ejecutadas estuvieron enfocadas en la instalacion de señalizacion contemplada para el PMT, cerramientos, instalacion de carpa y proceso de contratacion de personal nuevo. En este semana contamos en obra con 11 operativos y 6 profesionales activos de parte del contratista.
Las actividades realizadas fueron capacitaciones, e inspecciones a maquinaria utilizada.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
Programa de Inspecciones.
Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA PROGRAMADA**
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos quimicos.	Contratista	19 de enero 2026
Entrega de ensayos de caracterizacion del material de afirmado	Contratista	19 de enero 2026

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para la ejecucion del contrato de obra se realizo modificacion del mismo en la cual se implementaron los siguientes Item no previstos:
* CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%).
*TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36"
*CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se realizo revision del presupuesto de obra junto con sus memorias de calculo, en este se evidencia un alcance en meta fisica de 6.2Km de ejecucion de suelo estabilizado con productos quimicos con un ancho promedio de 4 m y un espesor de capa estabilizada de 25 cm, tambien se presupuesto una capa de rodadura de los tramos estabilizados con tratamiento superficial doble con emulsion CRR-2.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Transporte de material afirmado



Suministro y transporte de material de afirmado.



Extendido material afirmado



Compactacion material de afirmado



Estado actual tramo intervenido



Suministro de Material.



Punto Ecologico.



Señalizacion

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
ICCU	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	martes, 27 de enero de 2026	SEMANA No.	41	DEL	20-ene-26	AL	26-ene-26

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	

CONTRATO DE INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA PUBLICA	
CONTRATO No.:	218 de 2025	CONTRATO No.:	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	PLAZO INICIAL:	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
INTERVENTORIA:	ECG INGENIERIA SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	FECHA DE INICIACIÓN:	2 de abril de 2025
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 de diciembre del 2025	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	29 de diciembre del 2025
*FECHA DE REINICIACIÓN:	13 de enero del 2026	*FECHA DE REINICIACIÓN:	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	PLAZO ACTUALIZADO:	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	311 días	PLAZO TRANSCURRIDO:	311
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	VALOR INICIAL CABRERA :	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	VALOR ADICION:	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	VALOR ACTUALIZADO:	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	VALOR PAGADO:	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	VALOR POR PAGAR:	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	VALOR ANTICIPO:	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	SUPERVISOR:	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizan actividades de obra correspondientes a los siguientes Items.
* ITEM NP4: CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO entre las abscisas K11+710 al K12+708 tramo 1 de Cabrera, Cundinamarca.
* ITEM NP5 MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE) entre las abscisas K11+710 al K12+708 tramo 1 de Cabrera, Cundinamarca.
* ITEM 1,6 TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13/01/2026	31-mar-26	77,00	13-ene-26		ejecución	0	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado


Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	1,81%	8,68%	6,87%
Durante el periodo	2,26%	1,31%	-0,95%
Acumulado Actual	4,07%	9,99%	5,92%

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO


DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	311,00	158,00	27,75

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 78.374.645	$ 375.734.311	479,41%
Durante el periodo	$ 97.968.306	$ 56.710.309	57,89%
Acumulado Actual	$ 176.342.951	$ 432.444.620	245,23%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	256.101.669

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 20 al 26 de enero de 2026 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-Se remite el comunicado 25C02_DTO_281 del 20 de enero de 2026, solicitando al Contratista la aclaración sobre la instalación de USP en los frentes de obra.
-El 23 de enero de 2026 se remite el comunicado 25C02_DTO_284 remitiendo al Contratista las observaciones al informe mensual de noviembre versión 1 recibido mediante oficio CVG-ICCU-OF-0288-2025
-Se realiza un formato para el seguimiento del componente ambiental en obra, de acuerdo a los programas de gestión ambiental del Paga.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

De acuerdo con la programación compartida por la Supervisión Técnica del ICCU, se coordinó la visita técnica y de socialización para las provincias de Alto Magdalena y Sumapaz, con el objetivo de visitar los municipios de Nariño, Jerusalén, Cabrera y Tibacuy.
Las jornadas, lideradas por la Supervisión Técnica del ICCU y que contaron con el acompañamiento de la interventoría y el contratista de obra, tuvieron como propósito dar a conocer a la comunidad y a las administraciones municipales las reducciones realizadas en las metas físicas de cada uno de los municipios a intervenir. Estas modificaciones obedecen a aspectos técnicos propios del proceso constructivo asociado a las nuevas tecnologías a implementar, así como a los hallazgos obtenidos en las fases de estudios, diseños y caracterización. Una vez realizadas las respectivas precisiones y aclaraciones, se acordó la definición de los nuevos segmentos en los que se ejecutarán las actividades de obra.
Dicho lo anterior, las metas físicas acordadas en los municipios son las siguientes:
Nariño: 1,47 km. Sin embargo, está pendiente por parte del ICCU la definición de cuál de las dos alternativas propuestas se implementará en el sector.
Jerusalén: 7,5 km. Se acordó que las veredas de intervención en este municipio serán Alto del Trigo, Alto del Roble, La Victoria, San José y La Libertad, con el objetivo de impactar y beneficiar al mayor número de comunidades.
Cabrera: 6,2 km. En este municipio, el supervisor técnico de la entidad, con el acompañamiento del contratista y la interventoría, socializó con la comunidad los aspectos generales del proyecto, el valor del contrato, el proceso constructivo, los segmentos a intervenir y la reducción de la meta física. Del mismo modo, se agendó socialización del proyecto con la comunidad del área de influencia para el 28 de enero de 2026, el resultado de esta actividad será debidamente reportado en el siguiente informe mensual.
Tibacuy: 7 km. En este municipio, la Supervisión Social del ICCU informó a la comunidad que, debido al diseño de la estructura de pavimentos y con base en los resultados de los estudios y diseños, era necesario agregar material de préstamo (afirmado tipo INVIAS). Este requerimiento genera un sobrecosto, ya que no corresponde a un ítem contractual y su transporte acarrea gastos no contemplados dentro del alcance del proyecto. Por esta razón, se reduce la meta física. Asimismo, se acordará una visita técnica para la verificación y selección de los segmentos a intervenir en este municipio.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 1 de febrero de 2026, se continuan las actividades de obra , replante, ingreso de material se dio aprobacion a personal profesional y mano de obra no calificada , las actividades ejecutadas estuvieron enfocadas en la instalacion de señalizacion contemplada para el PMT, cerramientos, instalacion de carpa y proceso de contratacion de personal nuevo. En este semana contamos en obra con 16 operativos y 9 profesionales activos de parte del contratista. Las actividades realizadas fueron capacitaciones, e inspecciones a maquinaria utilizada.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

* Se presentan fuertes lluvias que impiden realizar las actividades de extendido, conformacion y compactacion de material de afirmado y a su vez realizar la estabilizacion del suelo con productos quimicos.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se realizo reprogramacion de obra para la ejecucion de la fase III del contrato de obra, para la presente semana 41 el contratista en su programacion tenia contemplado realizar las siguientes actividades*Roceria (Incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5KM); Esta actividad no se desarrollo durante la semana.*Transporte de Material proveniente de de explanaciones, canales,prestamos,sobreacarreos y derrumbes;Esta actividad si se desarrollo durante la semana.*Material de afirmado (no incluye carrotanque ni transporte), Esta actividad si se desarrollo durante la semana.* Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico.Esta actividad si se desarollo durante la semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos economicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, topografo, Operador Motoniveladora, Operador vibrocompactador, Operador retroexcavadora, Conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, auxiliar de trafico.
*Se evidencia maquinaria y equipos (Motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactador, carrotanque, camionetas, herramienta menor).
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos quimicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecucion de obra en el municipio de cabrera cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos,presupuestados para la ejecucion de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $432.444.620 cuatrocientos treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y cuatro mil seiscientos veinte pesos que corresponden a un avance fisico del 9.99% nueve punto noventa y nueve por ciento.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometria y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el periodo comprendido entre el 19 de enero y el 1 de febrero de 2026, se continuan las actividades de obra , replante, ingreso de material se dio aprobacion a personal profesional y mano de obra no calificada , las actividades ejecutadas estuvieron enfocadas en la instalacion de señalizacion contemplada para el PMT, cerramientos, instalacion de carpa y proceso de contratacion de personal nuevo. En este semana contamos en obra con 16 operativos y 9 profesionales activos de parte del contratista. Las actividades realizadas fueron capacitaciones, e inspecciones a maquinaria utilizada.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
Programa de Inspecciones.
Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos quimicos.	Contratista	19 de enero 2026
Entrega de ensayos de caracterizacion del material de afirmado	Contratista	19 de enero 2026

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR


12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




Transporte de material afirmado




Suministro y transporte de material de afirmado.

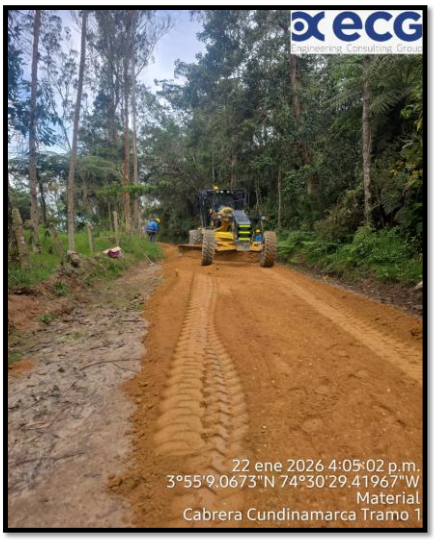


Extendido material afirmado

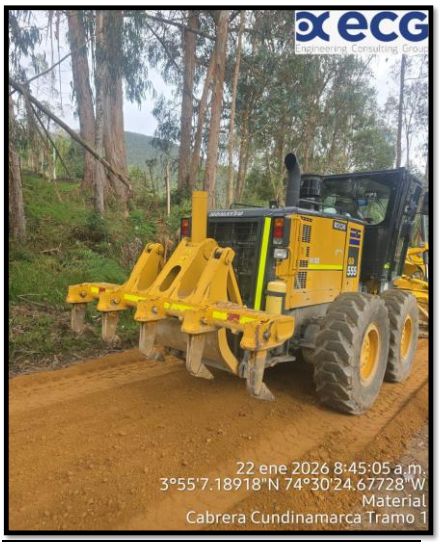


Extendido material afirmado

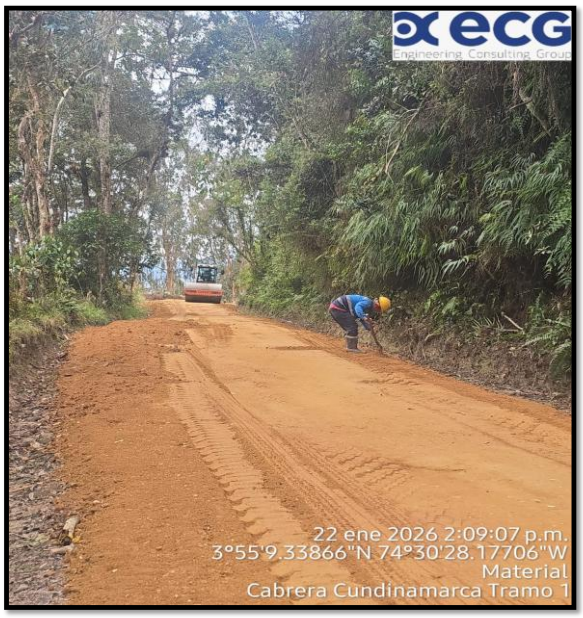

Compactacion Material Afirmado.

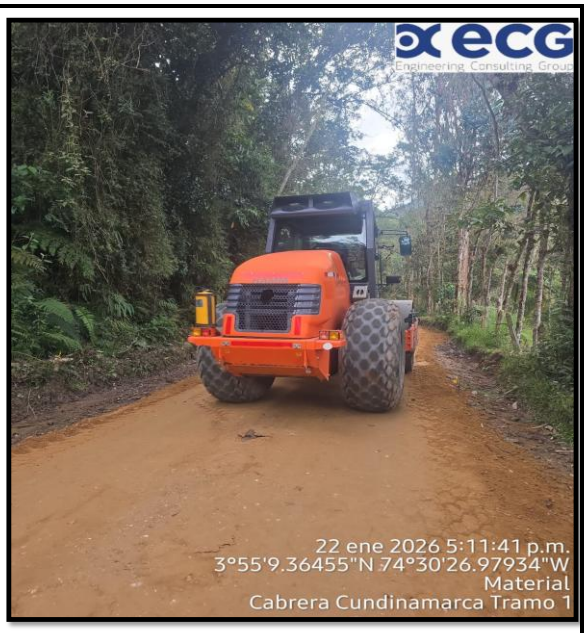

Compactacion Material Afirmado.

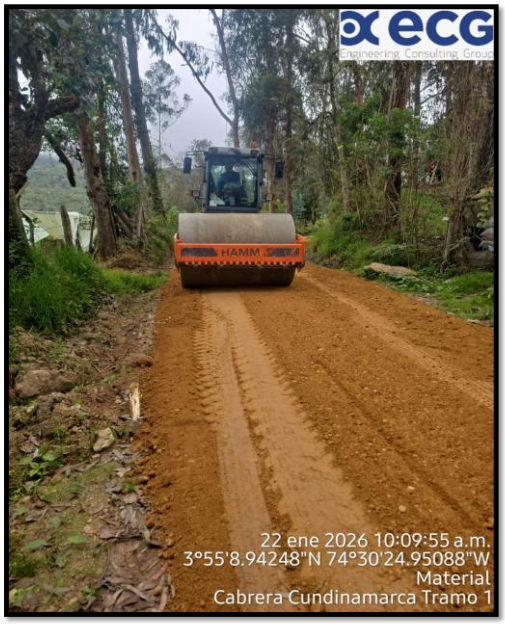

Compactacion Material Afirmado.



Dotacion personal obra

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
Nombre: Carlos Chaparro

ICCU	FORMATO	CÓDIGO	MS-GP-FR-34
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	VERSIÓN	0
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	FECHA	22/02/2023

PERIODO DE INFORME SEMANAL

ecg Engineering Consulting Group	ECG INGENIERIA SAS	**FECHA**	lunes, 2 de febrero de 2026	**SEMANA No.**	**42**	DEL	**26-ene-26**	AL	**1-feb-26**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
LOCALIZACIÓN PROYECTO	CABRERA CUNDINAMARCA

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA PUBLICA**	
CONTRATO No.:	218 de 2025	**CONTRATO No.:**	140 de 2025
PLAZO INICIAL:	Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025	**PLAZO INICIAL:**	Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025
INTERVENTORIA:	ECG INGENIERIA SAS	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO VICGER 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	2-abr-25	**FECHA DE INICIACIÓN:**	2 de abril de 2025
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	29 de diciembre del 2025
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	13 de enero del 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de julio 2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de julio del 2026
PLAZO ACTUALIZADO:	469 días	**PLAZO ACTUALIZADO:**	469
PLAZO TRANSCURRIDO:	318 días	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	318 días
VALOR INICIAL :	$ 3.903.576.140	**VALOR INICIAL CABRERA :**	$ 4.328.590.196
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 3.903.576.140	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 4.328.590.196
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 3.903.576.140	**VALOR POR PAGAR:**	$ 4.328.590.196
VALOR ANTICIPO:	$ 780.715.228	**VALOR ANTICIPO:**	$ -
SUPERVISOR:	ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA	**SUPERVISOR:**	INTERVENTORIA ECG

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realizan actividades de obra correspondientes a los siguientes Items.
* ITEM NP4: CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO entre las abscisas entre las abscisas K10+690 al K9+850 tramo 1 de Cabrera, Cundinamarca.
* ITEM NP5 MATERIAL DE AFIRMADO (NO INCLUYE CARROTANQUE NI TRANSPORTE) entre las abscisas K10+690 al K9+850 tramo 1 de Cabrera, Cundinamarca.
* ITEM 1,6 TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES.

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programada por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES	13/01/2026	31-mar-26	77,00	13-ene-26		ejecución	0	ejecución
2	CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%)	2-feb-26	21-abr-26	78,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2	10-abr-26	25-may-26	45,00			no iniciado	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 133 días

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	4,07%	9,99%	5,92%
Durante el periodo	2,26%	1,03%	-1,23%
Acumulado Actual	6,34%	11,02%	4,68%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRIDOS	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
469 días	311,00	158,00	21,96

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 176.342.951	$ 432.444.620	245,23%
Durante el periodo	$ 97.968.306	$ 44.532.833	45,46%
Acumulado Actual	$ 274.311.258	$ 476.977.453	173,88%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

$	202.666.196


GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO



AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO			
	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%
Durante el periodo	$ -	$ -	0%
Acumulado Actual	$ 9.233.265.295	$ 967.402.611	10%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO	
$	8.265.862.684

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En la semana evaluada del 27 de enero al 02 de febrero de 2026 se realizaron las siguientes actividades desde el componente ambiental:

-El 27 de enero de 2026 se realiza mesa de trabajo entre la Interventoría y el Contratista de manera virtual a partir de las 9:00 am, con el fin de revisar las observaciones al informe del mes de diciembre del Contratista y realizar los ajustes necesarios.
-El 28 de enero de 2026 se realiza el acompañamiento a la reunión de socialización del proyecto en el municipio de Cabrera Cundinamarca, en compañía de la comunidad, la Supervisión, la Interventoría y el Contratista de obra, donde se dio a conocer el alcance físico del proyecto. A continuación, se realizó recorrido de obra entre la Interventoría y la Supervisión en los tramos intervenidos del municipio de Cabrera.
-De acuerdo al recorrido realizado, desde el componente ambiental de Interventoría se realiza el seguimiento al Paga implementado, no obstante, se evidencian hallazgos para ser atendidos con premura, por lo tanto, se remite al Contratista el comunicado 25C02_DTO_290 del 29 de enero de 2026.
-Se da inicio a la revisión de la documentación remitida por el Contratista sobre 2 canteras más próximas a los tramos de intervención.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante esta semana, y con el objetivo de surtir el tramite y la logistica requerida para la reunion de socializacion, el equipo social del contratista de obra y la interventoria se reunieron para revisar, coordinar y dar trámite a los requerimientos necesarios. En este marco, el contratista remitió para revisión y aprobación de la interventoría y de la Supervisión Social los volantes N.° 18, correspondientes a la convocatoria a reunión extraordinaria en el municipio de Cabrera, y N.° 19, relacionados con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) de Cabrera, junto con la presentación de la reunión.
El equipo social también participó en la capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).
Durante la reunión de socialización realizada en la vereda Quebrada Negra, municipio de Cabrera, la cual contó con la participación del alcalde municipal, el ICCU, el contratista de obra y la interventoría, se atendió el requerimiento de la comunidad de socializar el alcance del proyecto. La reunión estuvo liderada por el supervisor técnico del ICCU, quien dio a conocer el alcance del proyecto, el proceso constructivo para el mejoramiento de suelos existentes mediante nuevas tecnologías (implementación de productos químicos), las fases del proyecto, el valor del contrato, los segmentos a intervenir y la meta física.
Es importante recalcar que la Supervisión Técnica del ICCU informó a la comunidad que, debido a los resultados de los estudios, diseños y caracterización, era necesario agregar material de préstamo (afirmado tipo INVIAS). Este requerimiento genera un sobrecosto, ya que no corresponde a un ítem contractual y su transporte acarrea gastos no contemplados dentro del alcance del proyecto. Por esta razón, la meta física se reduce a 6,2 km.
Posteriormente, la interventoría, el contratista, la entidad y el alcalde municipal resolvieron las inquietudes de la comunidad frente al proceso constructivo y a la reducción de la meta física, reiterando y aclarando el alcance de los 6,2 km.
Asimismo, se dispuso un espacio para la creación del Comité de Participación Ciudadana, concebido como un escenario de participación y un mecanismo de control social que permitirá a la ciudadanía mantenerse informada sobre los avances de la obra.
Finalmente, se socializó con la comunidad el PMT propuesto para Cabrera, informando además que el contratista de obra garantizará el tránsito de vehículos especiales y la ruta escolar, así como la seguridad de los peatones. La comunidad expresó, de manera atenta y respetuosa, la solicitud de estudiar la posibilidad de implementar ventanas de tiempo para el tránsito de motocicletas antes de la fase de estabilización y permitir su circulación previa a los cierres programados, sin afectar el desarrollo de las actividades de obra. Esta solicitud será evaluada por el contratista de obra.
Mediante oficio la interventoría 25C02_DTO_288, reiteró conforme al compromiso adquirido el pasado 22 de enero de 2026 durante la reunión de socialización realizada en el municipio de Jerusalén, en la cual se estableció la entrega del cronograma de actividades sociales para el día 28 de enero de 2026.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 8 de febrero de 2026, se continuan las actividades de obra , replante, ingreso de material se dio aprobacion a personal profesional y mano de obra no calificada , las actividades ejecutadas estuvieron enfocadas en la instalacion de señalizacion contemplada para el PMT, cerramientos, instalacion de carpa y proceso de contratacion de personal nuevo. En este semana contamos en obra con 16 operativos y 9 profesionales activos de parte del contratista. Las actividades realizadas fueron capacitaciones, e inspecciones a maquinaria utilizada.

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

*Se presentan fuertes lluvias durante la semana.
*Se presenta inestabilidad del terraplen sobre uno de los tramos a intervenir entre las abscisas Kx+xxx al kx+xxx
* Sobre este sector inestable esta proyectada ejecutar la construccion de una alcantarilla.

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Se realizo reprogramacion de obra para la ejecucion de la fase III del contrato de obra, para la presente semana 41 el contratista en su programacion tenia contemplado realizar las siguientes actividades
*Roceria (Incluye retiro de sobrantes a una distancia de 5KM); Esta actividad no se desarrollo durante la semana.
*Transporte de Material proveniente de de explanaciones, canales,prestamos,sobreacarreos y derrumbes;Esta actividad si se desarrollo durante la semana.
Material de afirmado (no incluye carrotanque ni transporte), Esta actividad si se desarrollo durante la semana. Conformacion de calzada existente incluye retiro de material organico.Esta actividad si se desarollo durante la semana.

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos economicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
* Se evidencia personal de obra (Residente, topografo, Operador Motoniveladora, Operador vibrocompactador, Operador retroexcavadora, Conductor carrotanque, oficial, 4 ayudantes, auxiliar de trafico.
*Se evidencia maquinaria y equipos (Motoniveladora, retroexcavadora, vibrocompactador, carrotanque, camionetas, herramienta menor).
*Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos quimicos).

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecucion de obra en el municipio de cabrera cundinamarca se informa que de los $4.328.590.196 Cuatro mil trecientos veintiocho millones, quinientos noventa mil, ciento noventa y seis pesos,presupuestados para la ejecucion de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $476,977,453 cuatrocientos setenta y seis millones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos cincueta y tres pesos que corresponden a un avance fisico del 11.02% once punto cero dos por ciento.

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometria y densidades tomados a los tramos estabilizados en el mes de diciembre del 2025.

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Durante el periodo comprendido entre el 2 de febrero al 8 de febrero de 2026, se continuan las actividades de obra , replante, ingreso de material se dio aprobacion a personal profesional y mano de obra no calificada , las actividades ejecutadas estuvieron enfocadas en la instalacion de señalizacion contemplada para el PMT, cerramientos, instalacion de carpa y proceso de contratacion de personal nuevo. En este semana contamos en obra con 16 operativos y 9 profesionales activos de parte del contratista. Las actividades realizadas fueron capacitaciones, e inspecciones a maquinaria utilizada.

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
Programa de Inspecciones.
Plan de Emergencias.

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACION PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos quimicos.	Contratista	19 de enero 2026
Entrega de ensayos de caracterizacion del material de afirmado	Contratista	19 de enero 2026

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

Para la presente semana no se evidencian actividades no previstas de obra.

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Transporte de material afirmado



Suministro y transporte de material de afirmado.



Extendido material afirmado



Extendido material afirmado



Compactacion Material Afirmado.



Compactacion Material Afirmado.



Compactacion Material Afirmado.



Dotacion personal obra

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: Carlos Chaparro
