8.4 BITACORA DE OBRA

BITÁCORA ANAPOIMA

Se abre el presente libro de bitacora el dia 4 de mayo del 2026, para el desarrollo de las actividades del contrato de obra No 140-2025 suscrito con la entidad contratante "INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU". Mediante licitacion publica se adjudico el contrato de obra 140-2025 a la firma "Consorcio Vigger 2021" con NIT 901.902.610 representado legalmente por GERMAN ANTONIO BALLESTAS BERDEJO y cuyo objeto del contrato es la "INTERVENCIÒN DE LAS VIÁS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LA PROVINCIA DEL SUMAPAZ, TEQUENDAMA, ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

Valor contrato de Obra: $ 32.246.753.687.

- Se registran los profesionales que realizan el seguimiento de la ejecucion de la obra:

JAVIER AMAYA.
RESIDENTE INTERVEN.

Gilberth Mateus
Residente Obra.

04 de mayo del 2026

* Actividades de obra: Se realiza implementación del PMT – Se realizan actividades de conformación del suelo existente desde las abscisas K0+060 al K1+060
* Personal de obra: Ingeniero residente. (1) operador de maquinaria (3), ayudantes (3) conductor de carrotanque (1)
* Equipos y Maquinaria: Motoniveladora, Vibro-compactador - Retrocargador, Carrotanque, camion
* Clima: Día Soleado.

Javier Arteaga
Interventoria.

Gilberth Mateus
R. Obra.

05 de mayo del 2026.

* Actividades de obra: implementación PMT- Estabilizacion de capa de acuerdo a Formula de trabajo con producto quimico no tradicional entre las abscisas K0+060 al K0+230. Total bultos de cemento = 350 und
* Personal de obras Ingeniero residente (2) Operador de maquinaria (3), ayudantes (3)

conductor de carrotanque (1)

* Equipos y maquinaria: Motoniveladora, Vibro-compactador, Retro cargador, carrotanque, camion.
* Clima: Se presenta dia soleado

Javier Arteaga
Interventoria

Gilberth Mateus
R. Obra.

06 de mayo del 2026.

* Actividades de Obra: Implementación PMT – Estabilización de capa de suelo existente de acuerdo a Formula de trabajo con producto quimico no tradicional y 4.5% de cemento. entre las abscisas K0 + 230 al K0+380, total de bultos de cemento 330 und.
* Personal de obra: Ingeniero residente (1), Residente social (1), Operadores maquinario (3), Ayudantes (6), Controladores viales (1), conductor carro tanque (1)
* Equipos y Maquinaria: Motoniveladora, Vibrocompactador Retro cargador, Carro tanque, Camion.
* Clima: Dia Soleado.

Javier Arteaga
Interventoria

Gilberth Mateus
R. obra.

07 de mayo del 2026.

Nota: Se realizo socialización a la comunidad de Anapoima en el corregimiento de San Antonio con la presencia de Interventoria, alcaldia y contratista.

07 de mayo del 2026

* Actividades de obra: Implementación PMT, Estabilización de capa de suelo existente con productos quimicos y cemento al 4.5% entre las abscisas Ko+380 al Ko+560, total de bultos de cemento 380 und. / Se realiza toma de humedades para compactación de capa estabilizada / Recogida de bolsas de cemento curado de tramos.
* Personal de obra: Ingeniero residente (1), residente social (1), operadores de maquinaria (3), ayudantes (6), controladoras viales (1), conductor de carrotanques (1).
* Equipos y Maquinaria: Motoniveladora - Vibrocompactador, retro cargador, carro tanque, camion
* Clima: Dia Soleado.

Javier Anaya
Residente int.

Gilberth Mokus
R. Obra.

08 de mayo del 2026.

* Actividades de obra: Estabilización de capa de suelo existente con productos quimicos no tradicionales y cemento al 4.5%. / Se realiza implementación al PMT / Las actividades de estabilización se realizo entre las abscisas Ko+560 al Ko+760 y se utilizo un total de 440 und de cemento y 240 litros de aditivo. / Se realizo toma de humedad de compactación de capa estabilizada / Recogida de bolsa de cemento / curado de capa estabilizada.
* Personal de obra: Ingeniero residente (1), profesional social (1), Operador de maquinaria (3), ayudantes (2), controladoras viales (2), conductor carro tanque (1)
* Equipos y maquinaria: Motoniveladora, vibrocompactador, Retrocargador - Carro tanque - Camion.
* Clima: Se presenta dia soleado.

Javier Anaya
Residente int.

Gilberth Mokus
R. Obra.

11 de mayo del 2026.

* Actividades de obra: Estabilización de capa

de suelo existente con productos quimicos no tradicionales y cemento al 4.5% entre las abscisas Km0+760 al Km0+820 con un porcentaje de cemento del 4.5% que equivale a 130 und. y 72 litros de aditivo/ toma de Humedad de suelo para compactación.

* Personal obra: Ingeniero residente (1), residente social (1), Operador maquinaria (3), ayudante (3) controladores viales (1), conductor carrotanque (1)
* Equipos y maquinaria: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retrocargador, Carro tanque, camion.
* Clima: Se presenta dia Soleado.

Javier Arroyo
Residente int.

Residente Obra.

12 de mayo del 2026.

* Actividades de obra: Estabilización de capa de suelo existente con productos quimicos no tradicionales y cemento al 4.5% entre las abscisas Kz+339 al Kz+~~384~~ 739 para un total de bultos de cemento.
* Personal de obra: Ingeniero residente (1), Residente Social (1), Operadores de maquinaria (3) ayudantes (4), Controladores viales (2), conductor de carrotanque (1)

* Maquinaria y equipos: Motoniveladora, Vibrocompactador, Retrocargador, Carro tanque, camion.
* Clima: Se presenta dia soleado.

Nota: Se realizo fue conformacion de terreno mas no estabilización.

Javier Arroyo
Interventoria

Residente Obra.

13 de mayo del 2026.

* Actividades de obra: Se realiza estabilización de capa de suelo existente con productos quimicos no tradicionales y cemento al 4.5% entre las abscisas Kz+339 a Kz+489 para un total de 330 bultos de cemento y 180 Lt de aditivo. / Se realiza implementación del PMT / Recogida de bolsas de cemento / curado de tramos.
* Personal de Obra: Ingeniero residente (1), residente Social (1), Operadores de maquinaria (3), Ayudantes (3), controladores viales (1) conductor carrotanque (1).

Equipos y Maquinaria: Motoniveladora - Vibro-compactador - Retro Cargador - Carro tanque camion.

Clima: Se presenta dia soleado

Javier Araya
Interventoria

Gilberth Nuñez
Residente Obra.

14 de mayo del 2026.

* Actividades de obra: Estabilizacion de capa existente con productos quimicos no tradicionales y cemento al 4.5% entre las abscisas Kz+489 al Kz+584. para un total de 209 bultos de cemento y 114 Lts de aditivo - Implementacion PMT / Recogida bolsas de concreto / curado del tramo.
* Personal de obra: Ingeniero residente, social, Operadores de maquinaria (3) - Ayudantes (3) controladoras viales (2), conductor carro tanque (1)
* Maquinaria y equipos: Motoniveladora - Vibrocompactador Retro cargador - carro tanque - camion
*

* Clima: Dia Soleado.

Javier Araya
Interventoria

Gilberth Nuñez
Residente Obra.

15 de mayo del 2026.

* Actividades de obra: Estabilizacion de capa existente con productos quimicos no tradicionales y cemento al 4.5% entre las abscisas Kz+649 al Kz+739. para un total de 198 bultos de cemento y 108 lts de aditivo / implementacion PMT / recogida de bolsas de cemento / curado tramo
* Personal de obras: ingeniero residente (1), Residente social (1), Operadores de maquinaria (3) Ayudantes (3), controladoras viales (2), conductor carro tanque (1).
* Equipos y Maquinaria: Motoniveladora - Camion Vibrocompactador - Retro cargador - carro tanque.
* Clima: Se presenta dia soleado.

Javier Araya
Interventoria

Gilberth Nuñez
Residente Obra

19 de mayo del 2026.

* Actividades de obra: El contratista no realiza actividades de obra.
* Personal de obra: Ing residente (1), Operador de maquinaria (3), Ayudantes (1), controladoras viales (2). conductor carro tanque (1).
* Maquinaria y Equipos: Motoniveladora - Vibro-Compactador - Retrocargador - Carro tanque Herramienta menor - Camion.
* Clima: Se presento dia soleado.

Javier Amaya
Residente interven.

Residente Obra
Gilberth Muñoz

20 de mayo del 2026.

* Actividades de obra: Se realiza transporte de material de afirmado, extendido y sello entre las abscisas Kz+584 a Kz+649 / Se realiza comite de obra con Ing Andres de la alcaldia de tocaima, interventoria y contratista informan el avance de obra y las actividades que se estan ejecutando. El contratista

informa de la necesidad de realizar una segunda alcantarilla en la abscisa Ko+ ,esto teniendo en cuenta que en temporadas de invierno y segun lo que manifiesta la comunidad se presenta inundaciones en esta zona, principalmente entre las abscisa Ko+ al Ko+ . Interventoria solicita al contratista realizar un balance de obra y de esta manera determinar si se cuenta con los recursos para la ejecucion de esta segunda alcantarilla teniendo en cuenta que solo esta presupuestado realizar una sola alcantarilla en el Kz+

Javier Amaya
Residente int-

Residente Obra
G. Gilberth Muñoz.

21 de mayo del 2026

Actividades de obra: Se continua con transporte, extendido y compactacion de material de afirmado entre las abscisas Kz+584 al Kz+649, tambien se realizan activida-

des de topografia | traslado de cota para topografia de terreno en el sector de
x ejecucion de alcantarilla en el Kz+

* Personal de obra: Ingeniero residente (2) operador de maquinaria (3), Ayudantes (4), controladoras viales (2). conductor carro tanque
* Maquinaria: Motoniveladora - Vibrocompactador - Retrocargador - Carro tanque - Herramienta menor. Furgon.
* Clima: Se presentan lluvias leves durante todo el dia.

Nota: Se reune el componente tecnico y el componente sst para programar las actividades en la ejecucion de la construccion de la alcantarilla del Kz+530. Interventoria solicita al contratista que para la ejecucion de esta actividad se debe dar cumplimiento al componente sst en el trabajo en espacios confinados esto teniendo en cuenta que se realizaran excavaciones con profundidades de mas de 3m, tambien se solicita

dar cumplimiento al PMT e informar el cierre total de la via por 2 dias para la ejecucion de esta actividad, por lo que se debe coordinar con la comunidad desde el componente social.

Javier Anaya
Residente int.

Residente contratista

NOTA: El contratista contestara contestara lo solicitado por interventoria mediante radicado formal.

Javier Anaya
Residente int.

Residente contratista

22 de mayo 2026.

Actividades de obra: El contratista informa de la construccion de una alcantarilla en el Kz+150 con actividades de excavacion mecanica, relleno para estructura e instalacion de tuberia de 36"

Nota: Interventoria informa que

esta alcantarilla no es contractual teniendo en cuenta que solo esta presupuestado realizar una alcantarilla en el KZ+ por lo que NO se autoriza realizar la ejecucion de actividades del capitulo de alcantarillas en el K0+150 y que quedo bajo la responsabilidad del contratista la construccion de la misma en los componentes tecnicos, sst y Social.

Javier Amaya
Residente int

Ing. Contratista
Andres Cantero

Residente SST int

Residente SST contra.

Nota: La profesional social de la interventoria que durante la jornada en el municipio de anapoima, la interventoria no autorizo temporalmente la ejecución de las actividades tecnicas programadas,

debido a que estas no fueron reportadas oportunamente en el cronograma Semanal del componente Social.
Adicionalmente, no se contaba con pieza informativa aprobada con pieza informativa ni con el proceso de socializacion y distribución previo a la comunidad.

El area social de Interventoria tuvo conocimiento de las actividades y cierres viales el 21 de mayo 2026 a traves de las areas tecnicas y SST de interventoria.
posteriormente, mediante el grupo de whatsapp, la profesional social del contratista, informo que no tenia conocimiento previo de dichas actividades y manifesto que la información fue socializada verbalmente con lideres comunales, quienes la difundieron via whatsapp. se reitera la importancia de realizar el proceso de volanteo y socialización con suficiente antelación para garantizar información obra y apertura a la comunidad

Fundmente, la interventora precisa que estas observaciones obedecen al proceso de seguimiento, control y verificación integral del proyecto, velando por el cumplimiento de los procedimientos sociales establecidos contractualmente. Así mismo, se deja constancia de que la profesional social del contratista no se encontraba en ampliamo realizado acompañamiento y no informo previamente a la interventoria para efectuar el respectivo seguimiento de la actividad.

Javier Ruiz
Residente ind

* Actividades de obra: Se realizan las siguientes actividades de obra para la construcción de alcantarilla en el K0+150
Item 2.9: Excavaciones varias sin clasificar
Item NP3: Instalación tubería Polietileno 36"
Item 4.23: Relleno para estructuras.

Personal de obra: Ingeniero residente (2), Operadores de maquinaria (3), Ayudantes (4), controladoras viales (2), conductor carro tanque (1)
* Maquinaria y Equipos: Carro tanque, motoniveladora, Vibrocompactador, retrocargador, Herramienta menor - Furgon.
* Clima: Se presenta dia soleado.
* NOTA: El contratista e interventoria chequean la cota de excde y descole de la alcantarilla

Javier Ruiz
Residente ind

Ing. residente contratista
Andrés Cardozo

23 de mayo del 2026.
Actividades de obra: Se realiza la siguiente actividades de obra para la construcción de alcantarillas en el K2+530
Item 2.9: Excavaciones varias sin clasificar.
Item NP3: Instalación tubería polietileno 36"
Item 4.23: Relleno para estructuras.
Se realiza implementación del PMT con cierre total durante todo el dia.
Se realizan actividades de topografia para verificación de volumenes de excavación

Personal de obra: Ingeniero residente (1) operador de maquinaria (3), ayudantes (2) controladoras viales (2), conductor carro tanque (1)

Maquinaria y equipos: Carrotanques, motoniveladora, vibrocompactador, retrocargador, Herramienta menor, Furgon.

Clima: Se presenta dia soleado

Nota: Con interventoria y contratista se revisan niveles de encole y descole de alcantarilla

Javier Anaya.
Residente int.

Ing. Residente Contratista
Andres Cardoso

25 de mayo del 2026.

* Actividades de obra: Se realizan actividades correspondientes al item NP1: Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos quimicos no tradicionales entre las abscisas Km2+584 al Km2+649. para un total de 65 m en los cuales se utilizaron 110 bultos de cemento y 70 litros de Quimico Prostecha.
* Personal de obra: Ingeniero residente, (1) operador de maquinaria (3). ayudantes (4)

controladoras viales (2), conductor carro tanque (1)

* Maquinaria Obra: Carrotanques, motoniveladora, vibrocompactador, retrocargador, Herramienta menor, Furgon.
* Clima = Se presenta dia soleado

Javier Anaya.
Residente int.

Ing. Residente Contratista
Andres Cardoso

26 de mayo del 2026.

* Actividades de obra: Se realizan actividades correspondientes al item NP1: Capa estabilizada de acuerdo a formula de trabajo con productos quimicos no tradicionales entre las abscisas Km0+860 al Km0+960 con una adicion de cemento del 4.5% para un total de 180 bultos y 1116 lts de quimico, se realiza control de Humedad del suelo inicial y Humedad del suelo para compactacion En el sector se presentan sobretamaños los cuales son retirados por el contratista

Personal: Ingeniero residente (1). operador de maquinaria (3), Ayudante (4) controladoras viales (2), conductor carro tanque.
Maquinaria y Equipos: Carrotanque motoniveladora, Vibrocompactador, retrocargador, Herramiento menor. Furgon.
Clima: Se presenta dia soleado

Javier Amaya
Residente ind.

Andres Cardoso
Residente de obra

27 de mayo. de 2026.

* Actividades de obra: El contratista realiza actividades de estabilizacion de relleno para alcantarillas en el Kz+530 con saco suelo, interventoria solicita al contratista que se deben construir de manera inmediata las obras de arte como son cabezales y aletas de alcantarillas y de esta manera garantizar la estabilidad del

terreno por lo que es responsabilidad del contratista si se presenta algun accidente o perdida de banca que genere un cierre de la via y problemas sociales.

* Personal: Ingeniero residente (1), operador de maquinaria (3), Ayudantes (4), controladoras viales (2), conductor carro tanque
* Maquinaria: Carrotanque, motoniveladora. vibrocompactador, retrocargador, Herramienta menor, Furgon.
* Clima: Se presenta dia soleado.

Javier amaya
Residente ind.

Andres Cardoso
Residente contratista.

28 de mayo de 2026.:

* Actividades de obra: Se realizan actividades correspondientes al item Npl: Capa estabilizada de acuerdo a la formula de trabajo con productos quimicos no tradicionales entre las abscisas Ko+960 al K1+060 para un total de 100m

en los cuales se utilizaron un total de 180 bultos de cemento y 116. Lts de producto quimico.

* Personal: Ingeniero residente (1), operador de maquinaria (3), ayudantes (4), controladoras viales (2), conductor carrotanque.
* Maquinaria: Carrotanque, motoniveladora, vibrocompactador, Retrocargador. Herramienta menor, Furgon.
* Clima: Se presenta dia soleado.

Javier Anaya
Interventoria.

Ing. Andres Cabso
Residente contratista

29 Mayo del 2026

* Actividades de obra: El contratista no realiza ninguna actividad de obra,
* No se evidencia personal de obra.
* No se evidencia maquinaria de obra
* Nota: Se solicita al contratista culminar con las actividades de obra. principalmente de los items de Concretos para alcantarillas el tratamiento superficial doble.

Javier Anaya Pulido.

Ing. Residente
Andres cabso.

NOTA ACLARATORIA CONTRATISTA DEL DIA 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO: Para Informar que se dos cargo un doble troque de arena dejando todo el material listo para iniciar actividades de concretos para alcantarillas de las abscisas K0+150, K2+530.

Ing. Residente
Andres cabso.

02 JUNIO DEL 2026.

* Actividades de obra: El contratista se lleva toda la maquinaria, ya que se termino la estabilizada, además se deja todo limpio y con su respectiva señalizacion, tanto en los materiales para las alcantarillas, como los mismos alcantarillas.

Ing. Residente
andres cabso.

BITÁCORA TIBACUY

para los tramos siguiente adicionar material granular de cantera que cumpla especificaciones invias
- Humectacion y Sello tramo realizado día anterior
- recoleccion bolsas de cemento
Equipo: 2 motoniveladoras, 2 vibrocompactadores Carrotanque, 2 camiones, 2 camionetas,
personal obra: 2 auxiliares de transito 6 ayudantes, 4 Operadores, 4 Conductores SST, Ambiental, Social, Ing. residente

Manuel Moreno
ING RESIDENTE INTERVENTORIA

Viequi.

5-26 Componente Ambiental
Se realiza lo siguiente Durante el tramo de ejecucion:
* Se realiza Charla e induccion al personal
* Se consolida la unidad sanitaria
* Se implementa el punto ecológico
* Se realiza Punto de Sustancias químicas
* Se realiza Jornada de orden y Aseo

Brayan Cossio
Residente Ambiental

04/05/2026 TRAMO 4
Estado del Tiempo: Seco
Actividades:
Estabilizacion Suelo cemento TRAMO 4 PK18+200a PK18+270. Longitud 70m, ancho 4m, Se utilizaron para la actividad 109 bultas de cemento y 90 litros de aditivo Quimico prosteech, para la estabilizacion Se adicionaron 30m³ de material B600. Se Observa que adicionando material, el grabado y la calidad de la Estabilizacion mejora significativamente.

- Humectacion Todo realizado el dia 30 de Abril
- Recoleccion Bolsas de cemento

Equipo: Motoniveladora, Vibrocompactador, Carrotanque, Camion, Camioneta, Retromezcladora

Personal: 2 auxiliares de transito; 8 Ayudantes, 3 operadores 2 conductores, Ambiental, Social, Ing Residente

Material Adicion

SOA 573 = 15m3

SO1807 = 15m3

TOTAL = 30m3

Vicgel

Manuel Moreno
ING RESIDENTE INTERVENTORIA

NOTA: SE LE REQUIERE AL CONTRATISTA ACTUALIZACION DE Y AJUSTE DEL PRESUPUESTO DE OBRA CON SUS MEMORIAS DE CALCULO Y PROGRAMA DE OBRA

05/05/2026

Estado del tiempo: Seco

Actividades

- Conteo y conformacion PR13+195.5 - PR14+000 L= 804.5m. a=5.0m
- Extendido y conformacion Subbase Granular del PR13+825 - PR14+000 L=175m a= 4.00 m, espesor 15cm Sueltos

Placa	VOL(S)	Recibo
1. SO1 807	15	15208
2. SKO 799	15	15207
3 TLH 810	15	15210
4 SOA 573	15	15205
5. SSX 048	15	15219
6. SO1 807	15	15216
7 SKO 799	15	15217

Agregados Fc Florest

Se observa una fasonte existente Contaminada con material organico (tierra negra)

Equipo: 2 Motoniveladora, 2 Vibrocompactador, Camion, Camioneta Carrotanque

Personal: 2 controladores Viales, 6 Ayudantes, 4 Operadores

Vicgel

Manuel Moreno
ING RESIDENTE INTERVENTORIA

06/05/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades
Extendido y Conformacion Subbase Granular del PR13+825
a PR13+600 L= 225 m. A= 9.0m espesor 15cm Suelta

	Placa	Vol.	Recibo.
1	JLM710	15	15223
2	SKO799	15	15225
3	SSX048	15	15226
4	SOI807	15	15228
5	SPK537	15	15227
6	SOA573	15	15229
7	TGN084	15	15230
8	WEL876	15	15244
9	VGT815	15	15243

Agregados lo Mismo

Se observo una Rasante Contaminada con material Organico. (Tiene negro)
Equipo: Motoniveladora, 2 Vibrocompactador, Camion Cisterna, Carrotanque.
Se recepciona un viaje de cemento 350 bultos
Personal. 2. Controladores Viales, 7 ayudantes 3 operadores, Ambiental, Ing. Residente Obra.
Se suspenden actividades, por errores en la definicion de los tramos en el acta de Socializacion.

Vicejo

MANUEL MORENO
ING RESIDENTE INTERVENTORIA

07/05/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades:
Se realiza recorrido con el Alcalde municipal, el director de interventoria, para definir el nuevo tramo, llegando a la conclusion que el tramo a intervenir Corresponde al Abscisado PR18+114 - PR17+060, en una longitud de 1054 mL, en este tramo se requiere adicionar material con un espesor de 25cm, acordado con el Sr. Alcalde y la interventoria.

Se realiza la Conformacion de la via del PR18+114 - PR17+060 L= 1054 en un ancho promedio de 5m.

- Se Extiende un viaje de material Granular del PR18+114 - PR18T099. L= 15m e= 0.25 a= 4.m.

Equipo/Personal/Motoniveladora, 2 Vibrocompactadores, 7 Ayudantes, 2 Controladores Vial, 3 Operadores, 2 Conductores, Volqueta

Volqueta TLM010 - SOT807 : Vol. 15

Recibo 15246.

Juliegu

Manuel Moreno
Ing Residente Interventoria

08/05/2026

Estado del tiempo: Seco

Lluvias 1:30 - 2:30 PM.

Actividades

Extendido y Conformacion de Subbase Granular del PR18+099 - PR17+900

Longitud 195m, Ancho 4. Espesor 0.25m

Espesor Suelto.

	Placa	Recibo
1.	SOI807	15271
2	SKO799	15273
3	VCM815	15282
4.	WEC876	15283
5	SSX048	15284
6	WEC868	15285
7	TGN084..	15286
8	SOI807	15252
9	SKO799	15291
10	SSX048	15259

Agregados la Floresta

11. WEL 868	15300	Agregados la floresta
12. TGN 084	15302	
13 SOI 807	15305	

EQUIPO: Motoniveladora 2 Vibrocompactadores, Camion, Camioneta, Cisternatanque.
personal: 2 Controladoras Viales, 2 ayudantes 2 Conductores, Ing. Residente obra.

Vicge.

MANUE MORENO
ING RESIDENTE

11/05/2026
Estado del Tiempo: Seco
Extendido y Conformacion material grueso de P217+904 - PR17+754. Longitud 150ML
Q= 4.0 m. e= 025m Suelto.

Placa	Recibo	
1. SOI 807	15323	Agregados la floresta
2. TLM 710	15336	
3. SKO 795	15339	
4 SSX 048	15341	
5. WEL 868	15342	
6. SOI 807	15345	
7. SKO 795	15348	
8. SSX 048	15349	
9. TLM 710	15350	
10. TGN 084	15352	

EQUIPO: 2 Motoniveladora, 2 Vibrocompactadores Camion, Camioneta, Cisternatanque, Herramienta menor
personal: 2 Controladoras Viales, 2 ayudantes, 2 Conductores, Ing Residente

Manuel Moreno
Vicge. ING RESIDENTE

12/05/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades.
Extendido y Conformacion material Granular del
PR 17+754 - PR 174+634 Long. 120m e=40m
PR 17+525 - PR 17+450 Long. 95m. e=40m

Placa	Recibo
1. TLM710	15364
2. TGN084	15365
3. SKO799	15367
4. SSX048	15368
5. SOI807	15369
6. SOA573	15366
7. EYY555	15370
8. TRK537	15371

Agregados la Floresta

PR17+525 - PR17+450

Placa	Recibo
9 TLM710	15373
10. SKO799	15374
11. SSX048	15375
12 SOI807	15376
13 EYY555	15377

Agregados la Floresta

EQUIPO: 2 Motoniveladoras, 2 Vibrocompactadores
1. Carrotanque, Camion, Camioneta, Herramienta menor
personal 2 Controladores de transito, 7 ayudantes
2 Conductores, 4 Operadores, Ing. Residente

Vicgel
Manuel Moreno
ING RESIDENTE

13/05/2026
Estado del Tiempo: Seco
Actividades
Extendido y Conformacion de material Granular
del PR17+634 - PR17+525 Long 109.00m e=40m

Placa	Recibo
1. TLH710	15382
2. SOI807	15383
3. EYY-559	15384
4. SKO799	15385
5 SSX04B	15386
6. WEL86B	15389
7. TLH710	15393

Agregados la Floresta

PR17+450 - PR17+360 Long. 90m a= 4.0m.

Placa	Recibo
8 SOI807	15394
9 TGN084	15399
10. WEL86B	15403
11. SKO799	15404
12. SSX04B	15405
13. EYY559	15406

Agregados la Floresta.

Nota: Se observa los Alcantarillos con los tubos Rotos en el centro de la Vía, al parecer porque la Tubería esta muy Superficial, lo que hace que sea Expuesta a las cargas del transito Directamente; en Consecuencia para hacer el reemplazo de la tubería Se requiere Subir la rasante, en Razon a que las Excavaciones no permiten profundizar más la tubería

Equipo.: 2 Motoniveladoras, 2 Vibrocompactadores, Carrotanque, Camion, Camioneta, herramienta menor Personal: 2 Controladores Viales + ayudantes, 2 Conductores, 4 Operadores, Ing. Residente.

Manuel Moreno
ING RESIDENTE

14/05/2026

Estado del tiempo: Seco

Actividades:

Suministro, Extendido y Conformación material Granular de PR17+360 - PR17+060 Long. 300m a= 4.0m.

	Placa	Recibo
1.	FZM710	15416
2.	SOI807	15419
3	WEL868	15420
4	SSX048	15422
5.	TBO103	15424
6.	SKO799	15425
7	SOA573	15426
8.	TRK537	15427
9.	TZM710	15430
10.	THV078	15432
11.	SQZ298	15433
12.	WEL868	15439
13	SSX048	15450
14.	SKO799	15451
15	SOA573	15452
16.	TBO103	15453
17	TZM710	15454
18	SQZ298	15455
19	THV078	15456
20.	TRK537	15457

Agregados la Floresta

Se termina de Adicionar material en el TRAMO 3 NUEVO.

EQUIPO: 2 Motoniveladoras, 2 Vibrocompactadores Carrotanque, Camion; Camioneta, Herramienta menor.

Personal. 2 Controladores de transito, 7 ayudantes 2 Conductores, 4 Operadores, Ing. Residente

Jorge.

MANUEL MORENO
ING RESIDENTE

15/05/2026 Frente 2

Estado del tiempo: Seco

Actividades:

- Suministro, Extendido y Conformacion material granular del PR11+520 - PR11+400

Long. 120m a= 4.0m

Se inicia la colocacion de material en el frente 2

	Placa	Recibo	
1.	EYY559	15418	Agregados la Floresta.
2.	TLH710	15459	
3.	WEL868	15461	
4	SKO799	15462	
5	SSX048	15463	
6	THV078	15465	
7	TBO103	15466	
8	SQZ298	15468	

PR11+355 – PR11+265 Long. 90m a=4.0m

9.	TLH710	15482	Agregados la floresta.
10	SQZ298	15483	
11	THV078	15484	
12	SSX048	15485	
13	SKO799	15486	
14	TRK587	15487	

EQUIPO: 2 motoniveladoras, 2 Vibrocompactadores Cisterna, 2 camiones, camioneta, herramienta menor

Personal. 2 Controladoras viales, 7 ayudantes, 2 conductores, 4 operadores, Ing. Residente

Vicepr.

MANUEL MORENO
ING RESIDENTE

18/05/2026 19/05/2026 2 días

Estado del tiempo: Seco

Actividad

Suministro, Extendido y Conformación material Granular PR11+400 – PR11+355 Long 45m a= 4.0m.

PR11+265 – PR11+085 Long. 180m a=4.0m

	Placa	Recibo
1.	SO1802	15436

	Placa	Recibo
2.	SQ2298	15509
3	THV078	15510
4.	SKO755	15511
5.	SOS623	15512
6.	TLM710	15514
7.	WEL468	15515
8.	SOI807	15526
9	SQZ298	15529
10.	THV078	15530
11.	SKO755	15533
12.	TLM710.	15535
13	TBO103	15537
14.	SWO191	15538
15.	SOS628	15540

Agregados la floresta.

Equipo; 2 motoniveladoras, 2 Vibrocompactadores Carrotanque, 2 Camiones Camioneta, herramienta menor, Retroexcavadora Personal; 2 auxiliares de transito y Ayudantes, 2 conductores 1 operadores, ing. residente Obra

Vicepr.

Manuel Moreno
ING RESIDENTE

20/05/2026 Tramo 2
Estado del tiempo: Seco
Actividades.
Suministro, extendido y conformacion material Grava B-400 PR1+085 - PR1+ Longitud. — Ancho 4m.

	placa	Recibo
1.	SOA573	15544

Placa	Recibo
2. SQZ298	15545
3. THV078	15546
4. SO1807	15547
5. TBO103	15554
6. SWO191	15555
7. SKO799	15558
8. TLM710	15559
9. SQS623	15560
10 WEL868	15562
11 TRK537	15563
12 SQZ298	15568
13 THV078	15569
14 SO1807	15570
15. TLM710	15571
16 SKO799	15572
17. SWO191	15593
18. TBO103	15594
19. WEL868	15596
20. SO1807	15582

Agregados la fotos

- Se realiza recorrido con la ingeniera de Planeacion del Municipio de Tibacuy. para definir los tramos a intervenir en TRAMO1, Acordando intervenir 4 puntos para Unir placas Huellas, en la parte baja de la VIA que conduce a la vereda San Francisco.

Longitud tramos San Francisco

Long	Placa Huella
200m	140
270m	30
180m	120
70m	
670ML,	290m ≃ 960 todo el tramo incluidos
670ML	290m los placa Huellas Interme.

dia

Por Solicitud de la Alcaldia de Tibacuy, representada por la Ingeniera de planeacion Se Suspende el Suministro de material Granular en el tramo 2, con el Objeto de reducir el riesgo en tramo 2 y poder Intervenir Tramo 1. (4 tramos) en la Via San Francisco.

EQUIPO: 2 Motoniveladoras, 2 Vibrocompactadores, Retroexcavadora, Carrotanque Agua, 2 camiones, Camioneta, herramienta menor

Personal 2 Contratistas Viales + ayudantes, 2 Conductores & Operadores, Ing. Residente Maestro de Obra + oficial + ayudante.

Se inicia la Excavacion y demolicion de las Alcantarillas del tramo 3 Nuevas

PR17+530
PR17+720 } Alcantarilla
PR17+830

Manuel Moreno
ING RESIDENTE


21/05/2026
Estado del tiempo. Seco
Actividades.
- Excavacion Descole Alcantarilla PR17+830 y PR17+720, PR17+520
- Demolicion Cabezote Alcantarilla PR18+210
- Limpieza Descole Alcantarilla PR18+210
- Recoleccion Material granular de las Cunetas en tramo 2 PR11+520- PR11+0
Equipo: Retroexcavadora + 2 Motoniveladoras + 2 Vibrocompactadores, Camion,

Campaneta, herramienta menor
- Traslado Elemento de PR18+270 - PR11+300
personal. 2 auxiliares de transito
2 Ayudantes
2 Conductores + 5 operadores, Ing.
Residente Obra.

Gliegli.

MANUEL MORENO
ING RESIDENTE

22/05/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades
- Estabilizacion Granular tramo2 PR11+520 - PR11+270 long 250 mL a= 9.00 Se extendieron 388 bultos de cemento; 250 litros de Aditivo Quimico Prodestech.
- Instalacion tuberia Alcantarillc PR17+530 long. 6.0m ; Incluye Excavaciones, demoliciones, Atraques, Soleados y rellenos con material Granular tipo B-400.
Se instalo una cama en grevilla con espesor de 0.15cm y Atraque con grevilla hasta medio tubo es decir 50cm, el resto de los llenos se realizaron con material B-400 Agregados de la Floresta, la Compactacion de los Atraques se realizo con Canguro y finalmente con Vibrocompactador (Solo Sello).

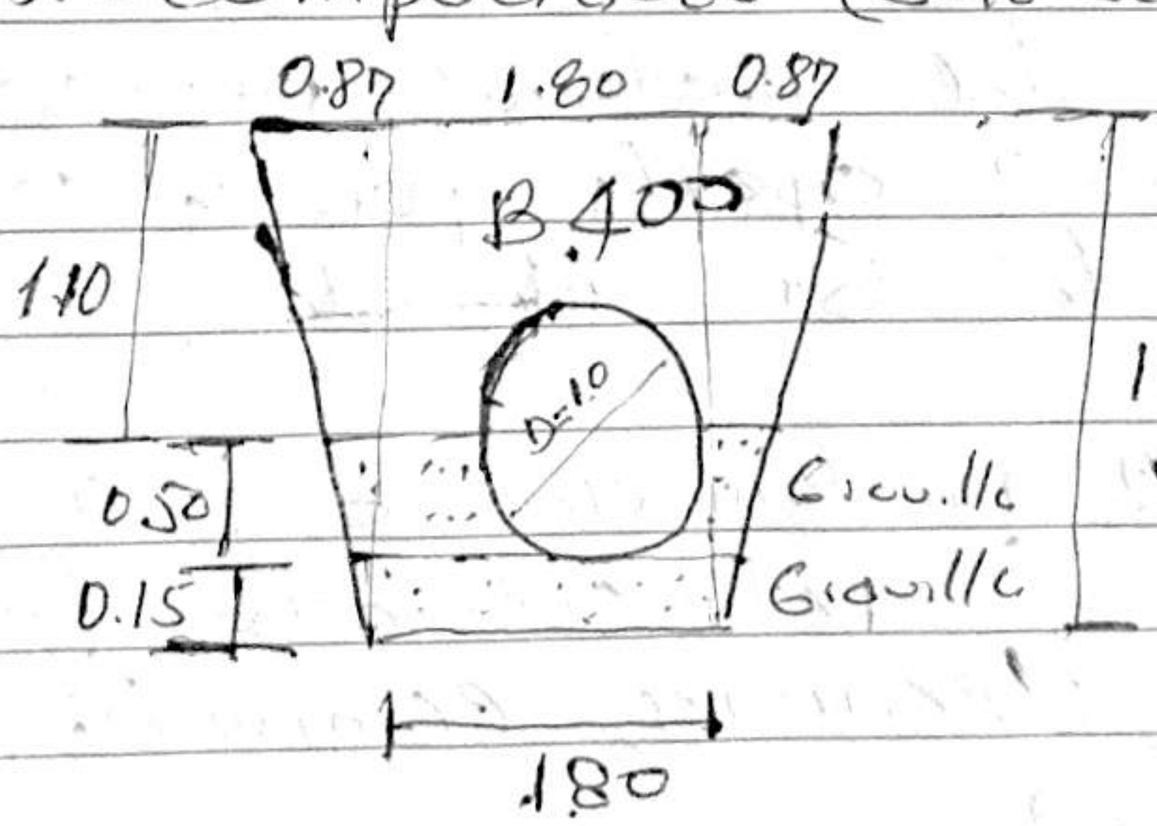

Retiro de material de Excavación a Volqueta Sencilla

EQUIPO. 2 motoniveladoras, 2 Vibro Compactadores, Retroexcavadora, Volqueta Sencilla, Cargotanque, 2 Camiones, Camioneta, herramienta menor,
Personal 2 controladores de transito 7 ayudantes, 2 conductores 5 Operadores, Maestro de Obra + oficial, Ing. Residente

Vº Bº
Ing. Residente: MANUEL MORENO
ING. RESIDENTE

23/05/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades:
- Estabilizacion granular tramo 2 PR11+270 - PR11+040 long 230m a: 4.0m., Se utilizaron 357 bultos de cemento, 230 litros de aditivo Quimico proestech, 11 m3 de Agua.
- Se realiza la toma de densidades de los tramos 6, 5 y 4 Con densimetro nuclear, cada 150 ml, Dando resultados Satisfactorios
- Se realiza el arreglo de la cerca y paisajismo del material Depositado En el tramo 2 aparte para la entrada propiedad del Sr. Alejandro.

EQUIPO: 2 motoniveladoras, 2 vibro Compactadores, retroexcavadora, Cargotanque Agua, 2 camiones, camioneta, herramienta menor

Personal Obra: 2 auxiliares de transito
+ ayudantes + Maestro de obra
+ Oficial + Pobolactonista.

Vieges.

MANUEL MORENO
ING RESIDENTE

25/05/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades.
- Estabilizacion Granular Tramo 2. PR11+040 - PR10+785. Long. 255ml, se utilizaron 356 bultos de cemento, 255 litros de Aditivo Quimico proestech., 12m3 de Agua.
- Excavacion, instalacion de tuberia, Demoliciones Estructuras de entrado y Salida Alcantarilla PR18+200, Cama y atraque con Gravilla, hasta medio tubo. Cama 15cm, llenos con material Granular B-400 Construccion Confinamiento con Capas llenos de material granular, Compactacion por Capas del Relleno.
- Recepcion bultos de cemento 8/10.
- EQUIPO: 2 motoniveladoras, 2 vibrocompactadores, retroexcavadora, Carrotanque, 2 Camiones, Camionetas, herramienta menor + Volqueta Sencilla.
- Personal. 2 auxiliares de transito, 2 ayudantes, maestro de obra + Oficial

Vieges

MANUEL MORENO
ING RESIDENTE

26/05/2026
Estado del tiempo: Seco
Actividades:
- Se inicia el Suministro, Extendido y Compactacion material granular Tramo 1 Calandria Primer Subtramo de PR17+124 - PR17+064
PR17+124

Placa	Recibo
SK0799	15650
JLM710	15692
SW0191	15694
SQ5623	15696

} B-400 Agregados La Horesta.

- Excavacion, instalacion tubería, Solido y Apoyo, llenos con material Granular Alcantarilla PR17+830.
- Se construye el confinamiento a los lados de la tubería con tonos llenos de material Granular
- Retiro de material de excavacion a Sitio Autorizado con Volqueta Sencilla.
- Recepcion de cemento BUON

EQUIPO: 2 motoniveladoras 2 Vibro-Compactadores, Retroexcavadora, Volqueta Sencilla + 2 camiones + camioneta, herramienta menor

personal: 2 Controladores de transito + ayudante + Maestro de Obra + Oficial

Volqueta Recibo

Manuel Moreno
ING RESIDENTE

27/05/2026

Estado del tiempo: Seco

Actividades

TRAMO 1A: PR17064- PR0+944 Adicion

material Granular	B-400
placa	Recibo
1. JLM710	15713
2. SQ2298	15715
3. TEK537	15721

4. SWO 191	15722	B-400 Agregados la Floresta
5. THV078	15720	
6. SKO799	15729	
7. WEL868	15730	
8. TLM710	15731	

- Excavacion, instalacion tubería, Soldas y Atraques con gravilla, llenos con material Granular la Calandaima PR17+720
- Se Construyen los Confinamientos a lado y lado de la tubería Con costales llenos de material Granular
- Retiro de material de excavacion en volqueta a sitio Autorizado

EQUIPO: 2 motoniveladoras, 2 vibrocompactadores, Retroexcavadora Volqueta Sencilla, 2 camionetas Camioneta, herramienta menor.

Personal: 2 auxiliares de transito, 1 oyedantes Maestro y oficial

NOTA. En el tramo Calandaima, Se presentan dificultades para el ingreso de material, por el mal estado Vias. de la via y los altos pendientes.

MANUEL MORENO
ING RESIDENTE

28/05/2026

Estado del tiempo: Seco

Actividades

TRAMO 1A: PR0+554 - PR0+914. Adicion Material B400, Calandaima.

Volqueta	Recibo	
1. SWO 191	15743	Agregados la floresta
2. SQ2298	15745.	

TRAMO 1B. PR1+264 - PR1+369. Adicion de Material Granular Calandaima

Placa	Recibo	
1. THV078	15750	Agregados la floresta B400
2. SKO759	15754	
3. WEL868	15762	

4.	SQZ 298	15765	B400 Agregados y Floretas.
5.	THV078	15766	
6.	SLO799	15771	
7	SWO191	15772	

- Construccion Contramiento a lado de la Rebera Alcantarillado PR17+530.
- Perfilado Excavacions de los Entrados y Salidas de la Alcantarilla PR17+530.

Equipo: 2 Motoniveladoras 2 vibrocompactadores pedoexcavadora, 2 camiones, camioneta, herramienta menor

Herramienta: Equipo pequeno, Cangura.

PERSONAL: 2 Auxiliares de Transito y Ayudantes, maestro y operador

Manuel Moreno
ING. RESIDENTE

Vicar
29/05/2026

Estado del tiempo: Seco

Actividades

TRAMO 1B. Colindancia. PR17369 - PR17534

Adicion material B400.

Volqueta Recibo

1.	WEL86B	15777	B-400 Agregados y Floreta
2.	SQZ29B	15781	
3.	THV07B	15782	
4.	SWO191	15802	
5.	SKO799	15804	
6.	TLM710	15807	
7.	SSX04B	15810	
8.	SQZ29B	15819	
9.	THV07B	15820	
10	WEL86B	15822	
11.	SWO191	15825	

Tramo 1C PR17554 - PR17584 Calandama

Placa	Recibo	
1. TRK537	15821	3. TLH710 - 15838
2. TBO103	15830	4. TLH710 - 15840 Rigidos, Fc. Proctor B-400
		5. TLH710 - 15873

- Aguada Acero Alcantarilla PR17530.

EQUIPO: 2 motoniveladoras, 2 vibrocompactadores liso + retroexcavadora + 2 camiones Camioneta + cisterna, herramienta menor

PERSONAL: 2 auxiliares de transito, 7 oyudantes Maestro + oficial

- Estabilizacion Granular Tramo 3. PR18+114 - PR17+884, longitud 230m, Se utilizaron 357 bultos de cemento, 230 litros de Aditivo Quimico proestech, 13m3 de Agua
- Recepcion de cemento Arion.
- Se empieza acopio Grava Alcantarilla y material Granular para la construccion Alcantarilla en tramo 6.

Viego

01/06/2026

Manuel Moreno
ING. RESIDENTE

Estado del tiempo: Seco

Actividades -

- Implementacion PMT
- Acopio material tramo 1C Calandama

Volqueta	Recibo		
WE286	15832	15832	B-400
SO1807	15853		
THV078	15854		

- Acopio Material tramo 1D Calandama

BITÁCORA NARIÑO

Lunes

04/05/2026 INICIO DE ACTIVIDADES

Día: soleado

Hora de inicio: 7:00 a.m.

Trabajadores: 1 maestro, 1 ayudante.

* Actividades Realizadas: se reúne con el maestro el recorrido de los tramos donde se va a realizar las 2 alcantarillas el cual quedan en los Km 0+470 y Km 0+743. Y se inicia toda la logística para que llegue el material en sitio, ya que es una zona de alta pendiente es muy difícil traer el material en bulto el tracto nada toca en camiones y volqueta sencillo.

Hora de salida: 5:00 p.m.

Ing. Residente
contratista

NOTA Se retoman las actividades, ya que en este de interventoría y supervisión ICCA, aprueban la escritura como material de estabilización para que zona.

Ing. David Alvarez.
Residente Interventoría

Ing. residente contratista

MARTES

05-05-2026 INICIO DE ACTIVIDADES

DIA: SOLEADO.

Hora de inicio 7:00 a.m.

Trabajadores: 1 maestro, 1 ayudante

* Actividades realizadas: llego al cemento, la varilla y toda la madera para hacer la dentada el cual se guarda en las viviendas cercanas ya se va a realizar los alcantarillas

Hora de salida: 3:00 p.m. jornada continua.

Ing. residente contratista

Ing. David Alvarez.
Residente Interventoría

Powered by CamScanner

08-05-2026 INICIO DE ACTIVIDADES MIERCOLES 0

Día: soleado

Hora de inicio: 7:00 a.m

* Actividades realizadas: se realiza (la) el vaciado de las alcantarillas, y se recibe toda la herramienta y equipo para hacer la alcantarilla, como el conguro, el vibrador de concreto, la mezcladora.

Hora de salida: 3:00 P.m, jornada laboral

Ing. residente contratista.

Ing. Daniel Alvarez

07-05-2026 INICIO DE ACTIVIDADES JUEVES

Día: soleado

Hora de inicio: 7.00 a.m.

Trabajadores 1 maestro, 2 ayudantes.

* Actividades realizadas: se inicia la siguiente de hierro de la primera alcantarilla, mañana se va dejar instalada la alcantarilla de la abscisa K.06+430 llega un viaje de triturado, Un viaje de arena.

Hora de salida: 5:00 p.m jornada normal

Ing residente contratista.

Ing. Daniel Alvarez.
Residente Interventor

08-05-2026 INICIO DE ACTIVIDADES VIERNES

Día: soleado

Hora de inicio: 7:00 a.m.

Trabajadores 1 maestro, 2 ayudantes.

Maquinaria y equipo: 1 retro excavadora, 1 vibrador, conguro.

* Actividades realizadas: se implementa todo el pnt para hacer el cierre temporal de 4 horas para la instalación de tubo TPC de 36" en la abscisa K.06+432

- Cantidades de obra:

Tubería TPC = 6 ml

Excavación = 20,39 m^3.

Relleno para estructura: 12,10 m^3.

Hora de salida: 5:00 PM

Ing. residente contratista

Ing. Daniel Alvarez

08-05-2026 INICIO DE ACTIVIDADES SABADO

- DIA: SOLEADO.
- TRABAJADORES: (1) maestro de obra, (2) ayudantes, (1) ing. residente.
- MAQUINARIA Y EQUIPO: Apisonador, canguro
- ACTIVIDADES REALIZADAS:
- Se realizo la perfilacion manual de la excavacion de la poceta del encole, donde se realizo su respectiva compactacion
- Concreto para solado de 2000 PSI: 0,22 m^3.
- Hora de salida: 12:00 p.m

Ing. David Alvarez. Residente Interventoria

Ing. residente contratista

11-05-2026 INICIO DE ACTIVIDADES LUNES.

- DIA: SOLEADO
- TRABAJADORES: (1) maestro, (2) ayudantes, (1) ing. residente
- MAQUINARIA Y EQUIPO: N.A.
- ACTIVIDADES REALIZADAS:
- Se realizo el figurado del primer empamillado para la placa y muro de la poceta "encole"
- CANTIDADES: 180 Kg.
- Hora de salida: 5:00 p.m.

Ing. David Alvarez.

Ing. residente contratista.

12-05-2026 INICIO DE ACTIVIDADES MARTES.

- DIA: SOLEADO
- TRABAJADORES: (1) maestro, (2) ayudantes, (1) ing. residente
- MAQUINARIA Y EQUIPO: N.A.
- ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se continuo con la figura de la placa para la poceta, el cual se figuro 89,3 kg.

- Hora de salida: 5:00 p.m

Ing. David Alvarez.

Ing. Residente Contratista

INICIO DE ACTIVIDADES MIERCOLES.

- Dia: soleado.
- Trabajadores: (1) maestro, (2) ayudantes
- Maquinaria y Equipo: (1) Retroexcavadora, (1) apisonador canguro.
- Actividades Realizadas: se implementa todo el PMT para hacer cierre temporal de 4 horas, para la instalación de tubería TPC de 36" en la abscisa K 0+24+63.
- Cantidades de obra:

Tubería TPC 36" : 5,5 ML

Relleno con estructura : 12,10 m^3

Excavación = 20,39 m^3.

Hora de salida: 5:00 p.m.

Ing. David Alvarez
Residente. Interventoría

Ing. residente contratista

14-05-2026 INICIO DE ACTIVIDADES JUEVES.

- Dia: soleado
- Trabajadores: (1) maestro (2) ayudantes
- Maquinaria y Equipo: (1) Mezcladora de concreto, (1) vibrador de concreto.
- Actividades Realizadas

Se funde placa de concreto 3000 PS: para bases de la pocata, se funde: 0,66 m^3

- Hora de salida: 5:00 p.m

Ing. David Alvarez
Residente Interventoría

Ing. residente contratista

15-05-2026 INICIO DE ACTIVIDADES VIERNES

- Dia: Soleado.
- Trabajadores (1) maestro, (2) ayudantes.
- Maquinaria y Equipo: (1) mezcladora de concreto, (1) vibrador de concreto.
- Actividades realizadas: se termina el figurado de 300 Kg. de acero para el descole, el cual se funde placa con concreto de 3000 PS: 1 m^3
- Hora de salida: 5:00 p.m

Ing. residente contratista

Ing. David Alvarez

16-05-2026 * INICIO DE ACTIVIDADES SABADO
- DIA soleado.
- Trabajadores: (1) maestro, (1) ayudante.
- Maquinaria y Equipo: N.A.
* Actividades Realizadas: Se continua con el encofrado de madera para la poceta
- Hora de salida: 12:00 p.m

Ing. David Alvarez.

Ing residente contratista

19-05-2026 * INICIO DE ACTIVIDADES MARTES
- DIA: Soleado
- Trabajadores: (1) maestro, (1) ayudante.
- Maquinaria y Equipo: N.A:
* Actividades Realizados: Se termino todo el encofrado y zimbrado de madera para poceta de alcantarillo de la abscisa K0+467.
- Hora de salida: 5:00 p.m.

Ing. David Alvarez.

Ing. residente contratista.

20-05-2026. * INICIO DE ACTIVIDADES MIERCOLES
- DIA: Soleado.
- Trabajadores: (1) maestro, (2) ayudante.
- Maquinaria y equipo: (N.A) vibrador de concreto, (1) mezclodora de concreto.
* ACTIVIDADES REALIZADAS: se funde concreto elevado de 3000 psi para (Excel Poceta del encole
- Hora de salida: 5:00 p.m

Ing. David Residente Interventoria.

Ing. residente contratista.

21-05-2026 * INICIO DE ACTIVIDADES JUEVES
- DIA: Soleado
- Trabajadores: (1) maestro, (2) ayudante.
- Maquinaria y Equipo: N.A.
- Actividades realizadas: se desencofra poce y se encofra bordillo de poceta y aletas

Powered by CamScanner

del descole, para fundir el día de mañana

• Hora de salida: 5:00 p.m.

Ing. Daud Alvarez.

Ing. residente contratista.

[illegible]-05-2026 * INICIO DE ACTIVIDADES VIERNES.

• Día: soleado

• Trabajadores: (1) maestro (2) ayudantes

• Maquinaria y Equipo: Mezcladora de concreto y vibrador de concreto

* Actividades Realizadas: se funde concreto de 3000 PSI: elevado para aleta de descole y bordillo de poceta.

• Cantidades de obra: 4 m3 de concreto 3000 PSI: Elevado.

• Hora de salida: 5:00 p.m.

Ing. Daud Alvarez.

[illegible]-05-2026 * INICIO DE ACTIVIDADES SABADO.

• Día: soleado

• Trabajadores (1) maestro (1) ayudante

• Maquinaria y Equipo: N.A.

* Actividades de obra: Desencofrado: muros de aletas del descole, y se completa bordillo del descole.

• Hora de salida: Sobre 12:00 p.m.

Ing. residente contratista.

Ing. Daud Alvarez
Residente Interventoria.

25-05-2026 * INICIO DE ACTIVIDADES LUNES.

• Día soleado.

• Trabajadores: (1) maestro, (1) ayudante.

• Maquinaria y EQUIPO: N.A.

* Actividades de obra: se funde bordillo del descole, además se realiza su respectivo relleno al rededor del perímetro de la poceta

• Hora de salida: 5:00 p.m.

Ing. Residente contratista.

Ing. Daud Alvarez.

26-05-2026 INICIO DE ACTIVIDADES MARTES.

• Día soleado

Powered by CamScanner

- Trabajadores: (1) maestro, (1) ayudante.
- Maquinaria y equipo: N.A.
* Actividades realizadas: se realiza la perforación de manera manual de la pacota de la alcantarilla K 02+463.
- Hora de salida: 5:00 p.m.

Ing. residente contratista

Ing. David Alvarez

27-05-2025. * INICIO ACTIVIDADES MIERCOLES
- Día: soleado
- Trabajadores: (1) maestro, (1) ayudante.
- Maquinaria y equipo: N.A.
- Actividades realizadas: se realizo el figurado de 250 Kg de acero para pacota.
- Hora de salida: 5:00 p.m.

Ing. residente contratista

Ing. David Alvarez

28-05-2025 * INICIO ACTIVIDADES JUEVES.
- Día: soleado.
- Trabajadores: (1) maestro, (1) ayudante.
- Maquinaria y equipo: N.A.
- Actividades realizadas: se realizo el figurado de 200 Kg de acero para los aletas del dascole de la alcantarilla
- Hora de salida: 5:00 p.m.

Ing. residente contratista.

Ing. David Alvarez

29-05-2025 * INICIO DE ACTIVIDADES VIERNES.
- Día soleado.
- Trabajadores: (1) maestro, (1) ayudante.
- Maquinaria y equipo: Aspersor Lagro.
- Actividades realizadas: se realiza perforado del dascole y socavación de la misma.
- Hora de salida: 3:00 p.m.

Ing. residente contratista

Ing. David A.
Residente Interventoría

Powered by CamScanner

30-05-2025 * INICIO DE ACTIVIDADES SABADO.

• Dia: Fuertes lluvia desde la 7:30 a.m hasta las 11:10 a.m, Hoy no se realizaron actividades.

Ing. Residente contratista.

Ing. David A.
Residente Interventoria.

Powered by CamScanner
