# 4.1 MS-GP-FR-034 INFORMES SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA

# ANAPOIMA

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecg Engineering Consulting Group | ECG INGENIERIA SAS | FECHA | lunes, 11 de mayo de 2026 | SEMANA No. | 56 | DEL | 4-may-26 | AL | 10-may-26 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| LOCALIZACIÓN PROYECTO | ANAPOIMA, CUNDIAMARCA |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA | | CONTRATO DE OBRA PUBLICA | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO No.: | 218 de 2025 | CONTRATO No.: | 140 de 2025 |
| PLAZO INICIAL: | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | PLAZO INICIAL: | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| CONTRATISTA: | ECG INGENIERIA SAS | CONTRATISTA: | CONSORCIO VICGER 2021 |
| FECHA DE INICIACIÓN: | 2-abr-25 | FECHA DE INICIACIÓN: | 2 de abril de 2025 |
| *FECHA DE SUSPENSIÓN: | 29 de diciembre del 2025 | *FECHA DE SUSPENSIÓN: | 29 de diciembre del 2025 |
| *FECHA DE REINICIACIÓN: | 13 de enero del 2026 | *FECHA DE REINICIACIÓN: | 13 de enero del 2026 |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 de julio 2026 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 15 de julio del 2026 |
| PLAZO ACTUALIZADO: | 469 días | PLAZO ACTUALIZADO: | 469 |
| PLAZO TRANSCURRIDO: | 409 | PLAZO TRANSCURRIDO: | 409 |
| VALOR INICIAL : | $ 3.903.576.140 | VALOR INICIAL ANAPOIMA : | $ 897.497.664 |
| VALOR ADICION: | $ - | VALOR ADICION: | $ - |
| VALOR ACTUALIZADO: | $ 3.903.576.140 | VALOR ACTUALIZADO: | $ 897.497.664 |
| VALOR PAGADO: | $ - | VALOR PAGADO: | $ - |
| VALOR POR PAGAR: | $ 3.903.576.140 | VALOR POR PAGAR: | $ 897.497.664 |
| VALOR ANTICIPO: | $ 780.715.228 | VALOR ANTICIPO: | $ - |
| SUPERVISOR: | ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA | SUPERVISOR: | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 4 de mayo al 10 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Anapoima, Cundinamarca.
* 1. NP1 CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%). Entre las abscisas K0+000 al K0+700
2. Por parte de la interventoría se realiza control de calidad con actividades de topografía, toma de muestra de humedad óptima de compactación y densidades con cono de arena .

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 30-abr-26 | 13-may-26 | 13,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 2 | CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) | 4-may-26 | 20-may-26 | 16,00 | 5-may-26 | | ejecución | -1 | ejecución |
| 3 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2 | 21-may-26 | 4-jun-26 | 14,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | | | | | | | | | |


**Plazo del proyecto:** 36 días

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 11,53% | 0,00% | -11,53% |
| Durante el periodo | 21,93% | 25,16% | 3,23% |
| Acumulado Actual | 33,46% | 25,16% | -8,30% |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**


| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 469 días | 409,00 | 60,00 | -38,92 |

### 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 103.446.803 | $ - | 0,00% |
| Durante el periodo | $ 196.836.681 | $ 225.809.744 | 114,72% |
| Acumulado Actual | $ 300.283.484 | $ 225.809.744 | 75,20% |

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**





**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-$ 74.473.740,01

| AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
| Acumulado anterior | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |

| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO |
|---|
| $ 8.265.862.684 |

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Entre el 4 y el 10 de mayo de 2026 se dio inicio a las actividades de obra en el municipio de Anapoima. En este contexto, mediante correo electrónico del 6 de mayo de 2026 se solicitó al contratista la definición de los gestores y proveedores que acompañarán la ejecución de las actividades, así como la implementación oportuna de las medidas de manejo ambiental establecidas en el PAGA, entre ellas: adecuación de acopios de residuos sólidos, zonas de almacenamiento de sustancias químicas, instalación de carpa temporal y definición y contratación de unidades sanitarias fijas, entre otras. En respuesta, el contratista remitió el comunicado CVG–ICCU–AM-005-2026 del 7 de mayo de 2026, mediante el cual presentó la relación de proveedores de materiales pétreos, cemento y tubería, así como la relación de gestores de residuos, quedando pendiente confirmación acerca de la unidad sanitaria que estara en servicio.

En la semana se adelantan actividades de adecuación de campamento y sitios de acopio para el desarrollo de las labores proyectadas. Asimismo, en este frente de obra el contratista implementó actividades de recolección de empaques de cemento al cierre de cada jornada, en atención a las observaciones previamente realizadas por la interventoría respecto al manejo de residuos sólidos. Se evidencian avances en el manejo de estos residuos; sin embargo, la interventoría continuará realizando seguimiento permanente para garantizar el cumplimiento de las medidas ambientales establecidas y prevenir afectaciones a la comunidad y al entorno, se realizará seguimiento respecto al acopio que se disponga en este municipio y la gestión que se realice con estos residuos.

La interventoría continuará verificando el estricto cumplimiento de las actividades conforme a lo establecido en el PAGA

En cuanto a la gestión documental, se encuentran pendientes los soportes documentales que corroboren los permisos para el uso de unidades sanitarias en los frentes de obra del municipio de Anapoima.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 04 y el 10 de mayo de 2026 se dio inicio formal a las actividades del componente social del Contrato ICCU-140-2025, orientadas a la estructuración, articulación institucional y planificación de las acciones a desarrollar en territorio, así como al acompañamiento social y administrativo de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra.

***Lunes 04 de mayo del 2026***
Actividades de campo:
•El contratista no ejecutó actividades en campo durante este día.
Actividades administrativas:
•Elaboración y cargue del informe semanal en la plataforma SharePoint.
•Envío del comunicado: 260504_25C02_DTO_411_Observaciones Valla Fija.

***Martes 05 de mayo de 2026***
Actividades de campo:
•Reunión extraordinaria en el municipio de Anapoima, en la cual se socializaron los aspectos generales del proyecto, el proceso constructivo y el presupuesto destinado al municipio. Asimismo, se abordaron temas relacionados con los cierres y horarios de tránsito, socializando los horarios de cierre evidenciados en obra, teniendo en cuenta que a la fecha no se cuenta con un PMT aprobado. La reunión contó con la participación, por parte de la interventoría, del ingeniero Carlos Chaparro, el ingeniero Javier Amaya y la profesional social María Fernanda Quitian. Por parte del contratista de obra participaron el ingeniero residente Gilberth Mateus y la profesional social Esther Tuñón. Asimismo, asistió el director de Obras Públicas de la alcaldía municipal y la comunidad.
La jornada inició a las 2:30 p. m. y finalizó a las 3:15 p. m., desarrollándose de manera satisfactoria. La comunidad se mostró receptiva y amable con el personal asistente, sin presentarse PQRS ni inquietudes adicionales durante el desarrollo de la reunión.

Actividades administrativas:
•Avance en la elaboración del informe mensual N°13.
•Se emite aprobación del volante N°44 reunión extraordinaria en Anapoima, por parte de interventoría y el ICCU.
•Envío del oficio 260506_25C02_DTO_414 – Requerimiento de Cumplimiento de Compromisos.
•Se informa a la supervisora social del ICCU, que el contratista remitió la presentación a las 12:51 del medio, día por ende la interventoría no alcanza a revisar ya que la reunión estaba programada para las 2:00 pm por tal razón se envía un oficio 25C02_DTO_415- INFORMACIÓN REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO- ANAPOIMA al contratista con copia a la entidad, notificando la situación.
•Participación virtual en reunión jurídica programada a las 4:00 p.m.

***Miércoles 06 de mayo de 2026***
Actividades de campo:
•·El contratista no ejecutó actividades en campo durante este día.

Actividades administrativas:
•Continuación de la elaboración del informe mensual N°13.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Para la presente semana del 4 de mayo al 10 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Anapoima, Cundinamarca.
* 1. NP1 CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%). Entre las abscisas K0+000 al K0+700
2. Por parte de la interventoría se realiza control de calidad con actividades de topografía, toma de muestra de humedad óptima de compactación y densidades con cono de arena .
Durante la presente semana se adelantaron actividades orientadas a la conformación, adecuación y mejoramiento de la calzada existente mediante la ejecución de capa estabilizada, conforme a las especificaciones técnicas contractuales establecidas para el proyecto.
Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia diaria del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la supervisión del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.
Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, un (1) profesional social, un (1) profesional ambiental, seis (6) auxiliares operativos, dos (2) auxiliar de trafico y cuadro (3) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.
La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por uno (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retroexcavadora, una (1) turbos, un (1) carro tanque, equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado."

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante la ejecución de las actividades de obra principalmente en la estabilización del suelo existente con productos químicos se evidencia la presencia de un porcentaje alto de sobre tamaños que han generado que el terminado de la capa una vez se compacte quede irregular.

### 8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:

1. Transporte de material: Se tenia programado iniciar con esta actividad el 30 de abril y a la fecha no se ha dado inicio.
2. Demolición Concreto Estructural: Se tenia programado iniciar esta actividad el 7 de mayo y a la fecha el contratista no dio inicio.
3. Remoción de alcantarillas: Se tenia programado iniciar esta actividad el 7 de mayo y a la fecha el contratista no dio inicio.
4. Rocería: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio.
5, Limpieza de alcantarillas: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio.
6. Conformación de calzada existente: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio.
7. Material de afirmado: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio.
8. Capa estabilizada con productos químicos: El contratista dio inicio a esta actividad de obra y se esta ejecutando.

* Se presenta un atraso físico del 8,30% ocho punto treinta por ciento con respecto al porcentaje de programación para la presente semana.

### 8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista no cuenta con el personal de obra suficiente para las actividades.

### 8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de Anapoima Cundinamarca se informa que de los $ 897,497,664 ochocientos noventa y siete millones cuatrocientos noventa site mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $225,809,744 doscientos veinticinco millones ochocientos nueve mil setecientos cuarenta y cuatro pesos. que corresponden a un avance físico del 25,16 % veinte cinco punto dieciséis por ciento del valor total designado al municipio de Anapoima.

### 8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

*El contratista no ha realizado entrega de ensayos de caracterización del material granular "afirmado".
*El contratista no a realizado la entrega de los resultados correspondientes a los ensayos de deflectometría y densidades tomados a los tramos estabilizados.

### 8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

En el frente de obra del municipio de Anapoima aún se encuentran en proceso las actividades de adecuación de campamento y sitios de acopio, por lo que algunas medidas ambientales no se encuentran completamente implementadas; en este sentido, se solicita al contratista la implementación oportuna de las medidas establecidas en el PAGA en los diferentes frentes de obra, con el fin de evitar incumplimientos frente a las obligaciones en materia ambiental.
Por otra parte, persisten pendientes documentales relacionados con la entrega de soportes que corroboren los permisos para el uso de unidades sanitarias en los frentes de obra, así como la presentación de paz y salvos una vez se realice el retiro de los sitios utilizados, en los que conste que no existen obligaciones pendientes, evitando de esta manera posibles requerimientos por parte de la comunidad relacionados con este aspecto.

### 8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista no contaba con Plan de Manejo de Tránsito (PMT), presentó ausencia de la documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para el desarrollo seguro de las actividades, no dispuso de la presencia permanente del profesional SST en campo y, adicionalmente, se identificó que el personal ejecutor no presentó certificados vigentes para trabajo en alturas, no se evidenció procedimiento seguro de trabajo para actividades de alto riesgo y no se garantizó la dotación ni el uso obligatorio de equipos de protección contra caídas, específicamente arnés de seguridad. De igual forma, el personal relacionado para la ejecución de actividades no fue aprobado, toda vez que no se aportó de manera completa la documentación obligatoria para su validación, incluyendo exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificados de afiliación vigentes a ARL, EPS y fondo de pensiones, situación que constituye incumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencia

### 8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

## 9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos. | Contratista | Inmediato |
| Control de calidad obra (Laboratorios, topografia) | Contratista | Inmediato |
| Iniciar con actividades según programación de obra | Contratista | Inmediato |
| | | |
| | | |

## 10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

## 11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*El contratista no realiza actividades de control de calidad ( humedades de compactacion, topografia, densidades).


**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**




Estabilizacion de suelo con productos quimicos.




Estabilizacion de suelo con productos quimicos.

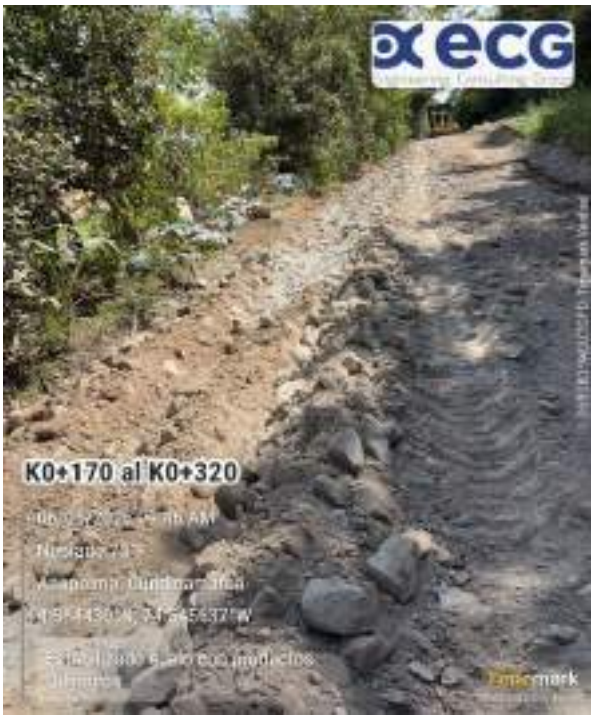


Estabilizacion de suelo con productos quimicos.




Estabilizacion de suelo con productos quimicos.




Estabilizacion de suelo con productos quimicos.




Estabilizacion de suelo con productos quimicos.




Control de calidad interventoría ( humedad de compactacion)




Control de calidad interventoría ( Densidades cono de arena)

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Nombre: Carlos Chaparro

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| ecg | ECG INGENIERIA SAS | FECHA | lunes, 18 de mayo de 2026 | SEMANA No. | 57 | DEL | 11-may-26 | AL | 17-may-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | **ANAPOIMA, CUNDIAMARCA** |

| CONTRATO DE INTERVENTORIA | | CONTRATO DE OBRA PUBLICA | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 218 de 2025 | **CONTRATO No.:** | 140 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | ECG INGENIERIA SAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICGER 2021 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2-abr-25 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio del 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 416 | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 416 |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.903.576.140 | **VALOR INICIAL ANAPOIMA :** | $ 897.497.664 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 897.497.664 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 897.497.664 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 780.715.228 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| **SUPERVISOR:** | ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA | **SUPERVISOR:** | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 4 de mayo al 10 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de anapoima, Cundinamarca.
* 1. NP1 CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%). Entre las abscisas K0+700 al K0+760 del K2+339 al K2+584 y del K2+649 al K2+739
2. Por parte de la interventoría se realiza control de calidad con actividades de topografía y toma de muestra de humedad óptima de compactación.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 30-abr-26 | 13-may-26 | 13,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 2 | CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) | 4-may-26 | 20-may-26 | 16,00 | 5-may-26 | | ejecución | -1 | ejecución |
| 3 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2 | 21-may-26 | 4-jun-26 | 14,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | | | | | | | | | |


**Plazo del proyecto:** 36 días

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 33,46% | 25,16% | -8,30% |
| Durante el periodo | 23,38% | 13,97% | -9,40% |
| Acumulado Actual | 56,83% | 39,13% | -17,70% |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**


| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 469 días | 416,00 | 53,00 | -83,03 |

### 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 300.283.484 | $ 225.809.744 | 75,20% |
| Durante el periodo | $ 209.799.640 | $ 125.391.071 | 59,77% |
| Acumulado Actual | $ 510.083.123 | $ 351.200.815 | 68,85% |

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**





**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

| | |
|---|---|
| -$ | 158.882.308,34 |

| AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
| Acumulado anterior | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |

| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO | |
|---|---|
| $ | 8.265.862.684 |

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

e realiza la gestión ambiental del frente de obra, verificando el cumplimiento de las medidas establecidas en el PAGA, incluyendo actividades asociadas al manejo adecuado de residuos sólidos, seguimiento a las condiciones de orden y aseo, almacenamiento temporal de materiales, señalización y funcionamiento del punto ecológico. El contratista cuenta con espacios en un predio ubicado en cercanía al frente de obra, el cual es utilizado como campamento. Asimismo, se dispone de permiso para el uso de unidad sanitaria y áreas adecuadas para zonas de acopio.

Considerando que para los tramos a intervenir en este frente de obra se requiere el suministro de material pétreo debido a la insuficiencia de material disponible, el contratista informó el día 18 de mayo de 2026 que se proyecta realizar el suministro a través del proveedor “Agregados Bendición”, ubicado en el municipio de Tocaima. En este sentido, se encuentra pendiente la entrega de la documentación y/o soportes que permitan validar la legalidad del proveedor, incluyendo título minero y licencia ambiental, los cuales, según lo indicado por el contratista, serán suministrados únicamente después de realizada la primera compra, conforme a las políticas del proveedor. No obstante, se solicita la remisión de certificación y/o cualquier soporte que permita corroborar la legalidad del proveedor y habilitar la realización del suministro correspondiente.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 11 y el 17 de mayo de 2026 se dio inicio formal a las actividades del componente social del Contrato ICCU-140-2025, orientadas a la estructuración, articulación institucional y planificación de las acciones a desarrollar en territorio, así como al acompañamiento social y administrativo de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra.

***Lunes 11 de mayo del 2026***
Actividades de campo:
•El contratista realizo actas de vecindad de inicio en el municipio de Anapoima para un total de (7) actas.
Actividades administrativas:
•Elaboración y cargue del informe semanal en la plataforma SharePoint.
•Revisión del cronograma de actividades que reporta el contratista.
•Envió de volante actas de vecindad N°45 Viotá.

***Martes 12 de mayo del 2026***
Actividades de campo:
•El contratista no ejecutó actividades en campo durante este día.
Actividades administrativas:
•Comité social N°14 participa contratista, interventoría y la entidad ICCU.
•Elaboración del acta comité social N°14
•Revisión del SharePoint archivos sociales
•Elaboración de informe ejecutivo del área social para entrega del cargo de la profesional social Fernanda Quitian.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Para la presente semana del 4 de mayo al 10 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de anapoima, Cundinamarca.
* 1. NP1 CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%). Entre las abscisas K0+700 al K0+760 del K2+339 al K2+584 y del K2+649 al K2+739
2. Por parte de la interventoría se realiza control de calidad con actividades de topografía y toma de muestra de humedad óptima de compactación.
Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia diaria del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la supervisión del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.
Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, un (1) profesional social, un (1) profesional ambiental, cuatro (4) auxiliares operativos, dos (2) auxiliares de trafico y tres (3) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.
La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por una (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retroexcavadora, una (1) turbos equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Se presenta tuberia de acueducto existente sobre el ancho de calzada y a poca profundidad con respecto al nivel de la rasante existente, por lo que es necesario realizar el traslado de esta tuberia hacia un costado de la via.

### 8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:

1. Transporte de material: Se tenia programado iniciar con esta actividad el 30 de abril y a la fecha no se ha dado inicio y según programación esta actividad ya debió haber terminado.
2. Demolición Concreto Estructural: Se tenia programado iniciar esta actividad el 7 de mayo y a la fecha el contratista no dio inicio.
3. Remoción de alcantarillas: Se tenia programado iniciar esta actividad el 7 de mayo y a la fecha el contratista no dio inicio.
4. Rocería: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio y según programación ya se debió haber terminado con esta actividad.
5, Limpieza de alcantarillas: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio y según programación ya se debió haber terminado con esta actividad. .
6. Conformación de calzada existente: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio.
7. Material de afirmado: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio.
8. Capa estabilizada con productos químicos: El contratista dio inicio a esta actividad de obra y se esta ejecutando, según programación esta actividad ya se debió haber culminado.
9, Tubería de polietileno: Se tenia programada iniciar el día 30 de abril, a la fecha el contratista no ha iniciado con esta actividad.
* Se presenta un atraso físico del 17,70% diecisiete punto setenta por ciento con respecto al porcentaje de programación para la presente semana.

### 8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

El contratista no cuenta con el personal de obra suficiente para las actividades.

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Para la ejecución de obra en el municipio de Anapoima Cundinamarca se informa que de los $ 897,497,664 ochocientos noventa y siete millones cuatrocientos noventa site mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $351.200.815 trecientos cincuenta y un millones docientos mil ochocientos quince pesos. que corresponden a un avance físico del 39,13 % treinta y nueve punto trece por ciento del valor total designado al municipio de Anapoima.

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

* El contratista no ha realizado ningun control de calidad de los tramos estabilizados con productos quimicos intervenidos.

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

Durante la semana no se reportan situaciones de especial relevancia. No obstante, se encuentra pendiente la entrega de documentación asociada al proveedor de material pétreo, con el fin de validar su legalidad y viabilidad para el suministro requerido. Asimismo, se espera la remisión de los soportes de contratación correspondientes al uso de unidades sanitarias.

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista no contaba con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado e implementado, presentó ausencia de la documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para la ejecución segura de las actividades y no garantizó la presencia permanente del profesional SST en campo para el seguimiento, control y supervisión de las condiciones de seguridad durante el desarrollo de la obra. Asimismo, se evidenció que el personal presente en obra no se encontraba aprobado por la interventoría, debido a que no se había presentado la documentación requerida para su validación e ingreso. De igual manera, se identificó la ejecución de actividades en alturas sin contar con la documentación exigida para este tipo de labores, tales como certificados del curso de trabajo en alturas, formatos de permisos de trabajo, procedimientos seguros y designación del coordinador de alturas, pese a que en campo se evidenciaba la implementación de medidas de seguridad para el desarrollo de dichas actividades.

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

No se reportan para este periodo.

**9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos. | Contratista | Inmediato |
| Control de calidad obra (Laboratorios, topografia) | Contratista | Inmediato |
| Iniciar con actividades según programación de obra | Contratista | Inmediato |
| | | |
| | | |

**10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

**11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*El contratista no realiza actividades de control de calidad ( humedades de compactacion, topografia, densidades).

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**




Control de calidad interventoría. LWD




Control de calidad interventoría. LWD




Control de calidad interventoría. LWD




Control de calidad interventoría. LWD




Control de calidad interventoría. LWD




Control de calidad interventoría. LWD




Control de calidad interventoría. LWD




Control de calidad interventoría. LWD

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Nombre: Carlos Chaparro

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
| | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecg Engineering Consulting Group | ECG INGENIERIA SAS | **FECHA** | lunes, 25 de mayo de 2026 | **SEMANA No.** | **58** | DEL | **18-may-26** | AL | **24-may-26** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | **ANAPOIMA, CUNDIAMARCA** |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 218 de 2025 | **CONTRATO No.:** | 140 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | ECG INGENIERIA SAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICGER 2021 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2-abr-25 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio del 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 416 | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 416 |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.903.576.140 | **VALOR INICIAL ANAPOIMA :** | $ 897.497.664 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 897.497.664 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 897.497.664 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 780.715.228 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| **SUPERVISOR:** | ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA | **SUPERVISOR:** | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 18 de mayo al 24 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Anapoima, Cundinamarca.
* TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES: Se realiza transporte de material de afirmado para el tramo correspondiente a las abscisas K2+584 al K2+649 que corresponden a 65m con espesor promedio de 25 cm y ancho de 4.5m
* Se realiza instalacion , extendido y compactacion de material de AFIRMADO entre las abscisas K2+584 al K2+649.
* Se realiza EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) para construccion de alcantarillas en los K0+150 y K2+530.
* Se realiza instalacion de TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE ( SN4 - 900 mm ) 36" en las abscisas K0+150 y K2+530
* se realiza actividad de RELLENO PARA ESTRUCTURAS de alcantarillas como son pisos y atraques en las abscisas K0+150 y K2+530.
* NP4 CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. Se ha venido realizando conformacion de via para la ejecucion de la actividad de estabilizacion de suelo entre las abscisas K0+060 al K0+820 y del K2+339 al K2+739
2. Por parte de la interventoría se realiza control de calidad con actividades de topografía para construccion de alcantarillas en las abscisas K0+150 y K2+530.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 30-abr-26 | 12-may-26 | 12,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| 2 | CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) | 4-may-26 | 20-may-26 | 16,00 | 5-may-26 | | ejecución | -1 | ejecución |
| 3 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2 | 21-may-26 | 4-jun-26 | 14,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |


**Plazo del proyecto:** 36 días

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 56,83% | 40,00% | -16,83% |
| Durante el periodo | 14,03% | 3,66% | -10,38% |
| Acumulado Actual | 70,86% | 43,66% | -27,21% |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**


| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 469 días | 423,00 | 46,00 | -127,60 |

### 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 510.083.123 | $ 359.012.081 | 70,38% |
| Durante el periodo | $ 125.926.728 | $ 32.809.410 | 26,05% |
| Acumulado Actual | $ 636.009.851 | $ 391.821.491 | 61,61% |

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**





**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-$ 244.188.359,49

| AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
| Acumulado anterior | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |

| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO |
|---|
| $ 8.265.862.684 |

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se realiza seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista, entre ellas el seguimiento y validación de proveedores para el suministro del material requerido en el municipio de Anapoima. Como se manifestó en la semana anterior, se validó la documentación del proveedor “Agregados Bendición”, el cual cuenta con permisos mineros y ambientales vigentes validados en aplicativo de la ANM, certificado de la ANM y Resolución ambiental, por lo que se encuentra habilitado para efectuar el suministro del material, no obstante, se solicitó al contratista la entrega de documentación complementaria y titulo minero, con el fin de que esta quede como soporte documental del proyecto.
Durante la semana reportada, el contratista continuó con la implementación del PAGA en el frente de obra, incluyendo actividades relacionadas con punto ecológico, gestión de residuos, kit de derrames, señalización, manejo de sustancias químicas y manejo de RCD, entre otros. La Interventoría realizó el seguimiento correspondiente para garantizar el cumplimiento de dichas actividades, de acuerdo con las labores ejecutadas en obra.
Adicionalmente, durante la semana se recibió una solicitud por parte del ICCU, relacionada con la entrega de un informe de seguimiento al PAGA. Dicho informe se encuentra en proceso de elaboración y complementación, teniendo en cuenta que aún existen pendientes asociados a los soportes anexos de los informes mensuales presentados por el contratista, los cuales actualmente se encuentran en proceso de ajuste y revisión.
Cabe señalar que los informes correspondientes a febrero y marzo de 2026 fueron remitidos de manera informal por parte del contratista; no obstante, persisten requerimientos pendientes, entre ellos la entrega de certificados de materiales, previamente solicitados mediante correos electrónicos y comunicados de observaciones emitidos por la Interventoría, de igual manera, se remitieron observaciones al informe mensual de abril de 2026. Con el propósito de avanzar en la revisión técnica y documental de los informes, identificar y subsanar oportunamente las observaciones y oportunidades de mejora evidenciadas, se proyecta la realización de una mesa de trabajo programada para la semana siguiente, orientada a la consolidación y cierre de los pendientes asociados a informes y PAGA.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 19 y el 24 de mayo de 2026 se dio inicio formal a las actividades del componente social del Contrato ICCU-140-2025, orientadas a la estructuración, articulación institucional y planificación de las acciones a desarrollar en territorio, así como al acompañamiento social y administrativo de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra.

***Lunes 18 de mayo del 2026***
•No se realizan actividades por ser día festivo.

***Martes 19 de mayo del 2026***
Actividades de campo:
•No Se realiza actividades de campo por parte del contratista
Actividades administrativas:
•Elaboración y cargue del informe semanal N°57, del municipio de Anapoima en la plataforma SharePoint.
•Organización del diario de campo digital del componente social.

***Miércoles 20 de mayo del 2026***
Actividades de campo:
•No se realiza actividades de campo por parte del contratista.

Actividades administrativas:
•Se devuelve con observaciones por parte de la interventoría los volante N°45 actas de vecindad de inicio.

***jueves 21 de mayo del 2026***
Actividades de campo:
•No se realiza actividades de campo por parte del contratista.
Actividades administrativas:
•Reunión en Anolaima con la comunidad para definir el tema de los kilómetros a intervenir, la cual inicia de manera presencial a las 10:00 am y cuenta con el acompañamiento de la entidad ICCU, interventoría y contratista área social no realiza acompañamiento.

***Viernes 22 de mayo del 2026***
Actividades de campo:
•El área técnica del contratista reporta actividades de cierre en la vía de Anapoima para ejecutar actividades técnicas, sin informar previamente a la comunidad, la profesional social Diana Bojaca refiere que se entregó de manera verbal la información a los lideres comunitarios para que replicaran la información vía WhatsApp, el 21 de mayo del 2026, la actividad no conto con acompañamiento social y con la aprobación y distribución previa del volante, por lo que desde el área social de interventoría se deja la anotación en bitácora.
A la fecha tampoco se encuentra aprobado el PMT.
NOTA: Se deja una anotación en bitácora de lo sucedido por parte del área social, sin embargo, el resiente de obra de interventoría informa que por parte del contratista aun nadie ha firmado la bitácora.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Para la presente semana del 18 de mayo al 24 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Anapoima, Cundinamarca.
* TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES: Se realiza transporte de material de afirmado para el tramo correspondiente a las abscisas K2+584 al K2+649 que corresponden a 65m con espesor promedio de 25 cm y ancho de 4.5m
* Se realiza instalacion , extendido y compactacion de material de AFIRMADO entre las abscisas K2+584 al K2+649.
* Se realiza EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) para construccion de alcantarillas en los K0+150 y K2+530.
* Se realiza instalacion de TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE ( SN4 - 900 mm ) 36" en las abscisas K0+150 y K2+530
* se realiza actividad de RELLENO PARA ESTRUCTURAS de alcantarillas como son pisos y atraques en las abscisas K0+150 y K2+530.
* NP4 CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. Se ha venido realizando conformacion de via para la ejecucion de la actividad de estabilizacion de suelo entre las abscisas K0+060 al K0+820 y del K2+339 al K2+739
2. Por parte de la interventoría se realiza control de calidad con actividades de topografía para construccion de alcantarillas en las abscisas K0+150 y K2+530.
Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia diaria del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la supervisión del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Los habitantes del sector que viven en el tramo 1 entre las abscisas K0+100 al K0+500 nos informan que en temporadas de lluvias entre las abscisas K0+100 al K0+340 se forma un rio de agua y que la alcantarilla que captaba estas aguas de escorrentia fue tapada por la construccion de una urbanizacion. Por tal razon se ve la necesidad de realizar la construccion de una segunda alcantarilla que capte estas aguas de escorrentia y las descole hacia la quebrada.

**8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:

1. Transporte de material: Se tenia programado iniciar con esta actividad el 30 de abril: El contratista dio inicio a esta actividad de obra en la presente semana
2. Demolición Concreto Estructural: Se tenia programado iniciar esta actividad el 7 de mayo y a la fecha el contratista no dio inicio.
3. Remoción de alcantarillas: Se tenia programado iniciar esta actividad el 7 de mayo y a la fecha el contratista no dio inicio.
4. Rocería: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio y según programación ya se debió haber terminado con esta actividad.
5, Limpieza de alcantarillas: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio y según programación ya se debió haber terminado con esta actividad. .
6. Conformación de calzada existente: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio.
7. Material de afirmado: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril: El contratista dio inicio a esta actividad la presente semana
8. Capa estabilizada con productos químicos: El contratista dio inicio a esta actividad de obra y se esta ejecutando, según programación esta actividad ya se debió haber culminado.
9, Tubería de polietileno: Se tenia programada iniciar el día 30 de abril: El contratista realizo la instalacion de tuberia la presente semana.
* Se presenta un atraso físico del 27,21% veintisiete punto veintiuno por ciento con respecto al porcentaje de programación para la presente semana.

**8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Se evidencian recursos para la ejecucion de obra como son materiales, maquinaria y personal.

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Para la ejecución de obra en el Municipio de Anapoima Cundinamarca se informa que de los $ 897,497,664 ochocientos noventa y siete millones cuatrocientos noventa site mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $391.821.491 trecientos noventa y un millones ochocientos veintiun mil cuatrocientos noventa y un pesos. que corresponden a un avance físico del 43,66 % cuarenta y tres punto sesenta y seis pesos del total designado al Municipio de Anapoima.

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

* El contratista no ha realizado ningun control de calidad de los tramos estabilizados con productos quimicos intervenidos.

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

Dado que se tienen pendientes documentales y solicitudes de ajustes en los informes mensuales de febrero a abril de 2026, pese a entregas informales, se adelantara una mesa de trabajo la semana siguiente y así lograr un cierre a informes y contar con los soportes documentales pendientes.

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista no contaba con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado e implementado, presentó ausencia de la documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para la ejecución segura de las actividades y no garantizó la presencia permanente del profesional SST en campo para el seguimiento, control y supervisión de las condiciones de seguridad durante el desarrollo de la obra. Asimismo, se evidenció que el personal presente en obra no se encontraba aprobado por la interventoría, debido a que no se había presentado la documentación requerida para su validación e ingreso. De igual manera, se identificó la ejecución de actividades en alturas sin contar con la documentación exigida para este tipo de labores, tales como certificados del curso de trabajo en alturas, formatos de permisos de trabajo, procedimientos seguros y designación del coordinador de alturas, pese a que en campo se evidenciaba la implementación de medidas de seguridad para el desarrollo de dichas actividades.

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

El área técnica del contratista reporta actividades de cierre en la vía de Anapoima para ejecutar actividades técnicas, sin informar previamente a la comunidad, la profesional social Diana Bojaca refiere que se entregó de manera verbal la información a los lideres comunitarios para que replicaran la información vía WhatsApp, el 21 de mayo del 2026, la actividad no conto con acompañamiento social y con la aprobación y distribución previa del volante, por lo que desde el área social de interventoría se deja la anotación en bitácora.
A la fecha tampoco se encuentra aprobado el PMT.
NOTA: Se deja una anotación en bitácora de lo sucedido por parte del área social, sin embargo, el resiente de obra de interventoría informa que por parte del contratista aun nadie ha firmado la bitácora.

**9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos. | Contratista | Inmediato |
| Control de calidad obra (Laboratorios, topografia) | Contratista | Inmediato |
| Iniciar con actividades según programación de obra | Contratista | Inmediato |
| Ejecutar obras de arte de las alcantarillas para garantizar la estabilizacion del terreno principalmente en la abscisa K2+530 | Contratista | Inmediato |
| | | |

**10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

Ejecucion de una segunda alcantarilla K0+150

**11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*El contratista no realiza actividades de control de calidad ( humedades de compactacion, topografia, densidades).

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**




Transporte material Afirmado







Extendido y Compactacion material afirmado









Excavaciones Varias




Tuberia de Polietileno 36"




Relleno para estructuras.




Relleno para estructuras.




Topografia Interventoria




Control de calidad

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Nombre: GUSTAVO ADOLFO CROSBY

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
| | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecg Engineering Consulting Group | ECG INGENIERIA SAS | **FECHA** | lunes, 1 de junio de 2026 | **SEMANA No.** | **59** | DEL | **25-may-26** | AL | **31-may-26** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | **ANAPOIMA, CUNDIAMARCA** |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 218 de 2025 | **CONTRATO No.:** | 140 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | ECG INGENIERIA SAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICGER 2021 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2-abr-25 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio del 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 430 | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 430 |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.903.576.140 | **VALOR INICIAL ANAPOIMA :** | $ 897.497.664 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 897.497.664 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 897.497.664 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 780.715.228 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| **SUPERVISOR:** | ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA | **SUPERVISOR:** | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 25 de mayo al 31 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Anapoima, Cundinamarca.
* CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) entre las abscisas K0+960 al K1+060
* Se realiza estabilización del Talud correspondiente a la construcción de alcantarilla en la abscisa K2+530

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 30-abr-26 | 12-may-26 | 12,00 | 20-may-26 | 22-may-26 | 3 | -20 | -10 |
| 2 | CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) | 4-may-26 | 20-may-26 | 16,00 | 5-may-26 | | ejecución | -1 | ejecución |
| 3 | TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON EMULSIÓN CRR-2 | 21-may-26 | 4-jun-26 | 14,00 | | | no iniciado | no iniciado | no iniciado |
| | | | | | | | | | |

**Plazo del proyecto:** 36 días

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 70,86% | 43,93% | -26,93% |
| Durante el periodo | 9,96% | 11,23% | 1,28% |
| Acumulado Actual | 80,82% | 55,17% | -25,66% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 469 días | 430,00 | 39,00 | -120,33 |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




### 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 636.009.851 | $ 394.296.158 | 62,00% |
| Durante el periodo | $ 89.365.366 | $ 100.813.340 | 112,81% |
| Acumulado Actual | $ 725.375.217 | $ 495.109.498 | 68,26% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-$ 230.265.719,51


**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**



| AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
| Acumulado anterior | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |

| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO | |
|---|---|
| $ | 8.265.862.684 |

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se efectuó seguimiento a la implementación del PAGA en obra, evidenciando que el contratista dispone de un área destinada al acopio de materiales, una unidad sanitaria fija en calidad de préstamo para uso del personal, kit para atención de derrames, punto ecológico y demás elementos requeridos para la adecuada gestión ambiental del proyecto.
Asimismo, se verificó que el contratista realiza el suministro de materiales provenientes de la fuente "Agregados Bendición", la cual cuenta con los respectivos permisos minero-ambientales vigentes y se encuentra legalmente constituida. No obstante, se solicitó al contratista información complementaria que permita garantizar la trazabilidad de la licencia ambiental asociada a la fuente de materiales, particularmente en lo relacionado con las cesiones, modificaciones y/o actualizaciones efectuadas respecto del titular de los derechos mineros y ambientales.
Se evidenció además que el material es dispuesto directamente en el área de intervención y utilizado durante la misma jornada de suministro o, a más tardar, en la jornada siguiente, minimizando así la necesidad de almacenamiento temporal en obra.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana reportada entre el 25 y el 31 de mayo de 2026, del Contrato ICCU-140-2025, no se evidenció la ejecución de actividades de campo o administrativas correspondientes al componente social por parte del contratista. En consecuencia, no se realizaron jornadas de socialización, acompañamiento comunitario, levantamiento de actas, atención a la comunidad ni demás actividades asociadas a la gestión social del proyecto durante el periodo evaluado.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Para la presente semana del 25 de mayo al 31 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Anapoima, Cundinamarca.
* CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) entre las abscisas K0+960 al K1+060
* Se realiza estabilización del Talud correspondiente a la construcción de alcantarilla en la abscisa K2+530
Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia diaria del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la supervisión del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.
Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, un (1) profesional social, un (1) profesional ambiental, cuatro (4) auxiliares operativos, dos (2) auxiliares de trafico y tres (3) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.
La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por una (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retroexcavadora, una (1) turbos equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la excavación de la construcción de las alcantarillas principalmente en la del K2+530 se identifica tubería de agua potable de 1" que se encuentra sobre el ancho de calzada.

### 8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Para la presente semana según reprogramación de obra se tenia contemplado lo siguiente:

1. Transporte de material: Se tenia programado iniciar con esta actividad el 30 de abril: El contratista dio inicio a esta actividad de obra en la presente semana
2. Demolición Concreto Estructural: Se tenia programado iniciar esta actividad el 7 de mayo y a la fecha el contratista no dio inicio.
3. Remoción de alcantarillas: Se tenia programado iniciar esta actividad el 7 de mayo y a la fecha el contratista no dio inicio.
4. Rocería: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio y según programación ya se debió haber terminado con esta actividad.
5, Limpieza de alcantarillas: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril, a la fecha el contratista no ha dado inicio y según programación ya se debió haber terminado con esta actividad. .
6. Conformación de calzada existente: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril: El contratista realizo esta actividad de conformación de terreno en los dos tramos intervenidos.
7. Material de afirmado: Se tenia programado iniciar esta actividad el 30 de abril: El contratista finalizo con estas actividades de obra.
8. Capa estabilizada con productos químicos: El contratista finalizo con esta actividad de obra.
9, Tubería de polietileno: Se tenia programada iniciar el día 30 de abril: El contratista finalizo con esta actividad de obra.
* Se presenta un atraso físico del 25,66% veinticinco punto sesenta y seis por ciento con respecto al porcentaje de programación para la presente semana.

**8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Se evidencian recursos para la ejecución de obra como son materiales, maquinaria y personal.

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Para la ejecución de obra en el Municipio de Anapoima Cundinamarca se informa que de los $ 897,497,664 ochocientos noventa y siete millones cuatrocientos noventa site mil seiscientos sesenta y cuatro pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de $495,109,498 cuatrocientos noventa y cinco millones ciento nueve mil cuatrocientos noventa y ocho pesos. que corresponden a un avance físico del 55,17 % cincuenta y cinco punto diecisiete por ciento del total designado al Municipio de Anapoima.

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

* El contratista no ha realizado ningún control de calidad de los tramos estabilizados con productos químicos intervenidos.

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

No se reportan para el periodo ejecutado.

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista no contaba con el Plan de Manejo de Tránsito (PMT) aprobado e implementado, presentó ausencia de la documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para la ejecución segura de las actividades y no garantizó la presencia permanente del profesional SST en campo para el seguimiento, control y supervisión de las condiciones de seguridad durante el desarrollo de la obra. Asimismo, se evidenció que el personal presente en obra no se encontraba aprobado por la interventoría, debido a que no se había presentado la documentación requerida para su validación e ingreso. De igual manera, se identificó la ejecución de actividades en alturas sin contar con la documentación exigida para este tipo de labores, tales como certificados del curso de trabajo en alturas, formatos de permisos de trabajo, procedimientos seguros y designación del coordinador de alturas, pese a que en campo se evidenciaba la implementación de medidas de seguridad para el desarrollo de dichas actividades

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencias.
*Procedimiento de trabajo de alturas

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

No se reportan para el periodo ejecutado.

**9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos. | Contratista | Inmediato |
| Control de calidad obra (Laboratorios, topografía) | Contratista | Inmediato |
| Iniciar con actividades según programación de obra | Contratista | Inmediato |
| Ejecutar obras de arte de las alcantarillas para garantizar la estabilización del terreno principalmente en la abscisa K2+530 | Contratista | Inmediato |
| | | |

**10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

Ejecución de una segunda alcantarilla K0+150

**11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

*Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
*El contratista no realiza actividades de control de calidad ( humedades de compactación, topografía, densidades).

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**














Estabilizacionn talud alcantarilla K2+530

Estabilizacionn talud alcantarilla K2+530




CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES.

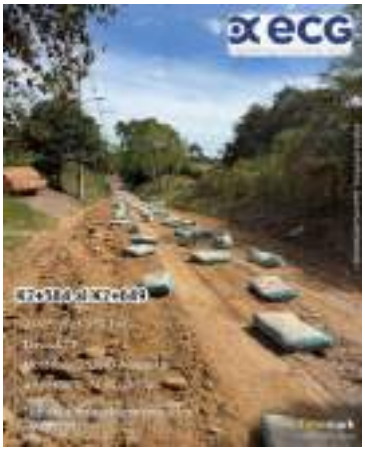


CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES.




CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES.







CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES.




CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES.







CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES.

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Nombre: Gustavo Crosby

# TIBACUY

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU | **FORMATO** | **CÓDIGO** | MS-GP-FR-34 |
| | **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA** | **VERSIÓN** | 0 |
| | **INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA** | **FECHA** | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecg Engineering Consulting Group | ECG INGENIERIA SAS | **FECHA** | lunes, 11 de mayo de 2026 | **SEMANA No.** | **56** | DEL | **4-may-26** | AL | **10-may-26** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | **TIBACUY, CUNDIAMARCA** |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 218 de 2025 | **CONTRATO No.:** | 140 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | ECG INGENIERIA SAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICGER 2021 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2-abr-25 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio del 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 409 | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 409 |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.903.576.140 | **VALOR INICIAL ANAPOIMA :** | $ 5.213.128.194 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 5.213.128.194 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 5.213.128.194 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 780.715.228 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| **SUPERVISOR:** | ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA | **SUPERVISOR:** | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 04 al 10 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.
1. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR)
(Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) :
- Tramo 4
- Tramo 3
2. transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobre acarreos y derrumbes
- Tramo 3
3. conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico
- Tramo 3
4. instalación de material de préstamo
- Tramo 3
5. Abscisado de los tramos 3, 4, 5 y 6 con el topógrafo de la interventoría.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 30-abr-26 | 30-abr-26 | 0,00 | 4-may-26 | | ejecución | -4 | ejecución |
| 2 | CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) | 30-mar-26 | 28-may-26 | 59,00 | 16-abr-26 | | ejecución | -17 | ejecución |
| 3 | CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO | 30-abr-26 | 10-abr-26 | -20,00 | 7-abr-26 | | ejecución | 23 | ejecución |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Plazo del proyecto:** - 19 días

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 25,47% | 19,91% | -5,56% |
| Durante el periodo | 5,46% | 1,74% | -3,72% |
| Acumulado Actual | 30,93% | 21,65% | -9,28% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 70 días | 35,00 | 35,00 | -6,50 |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

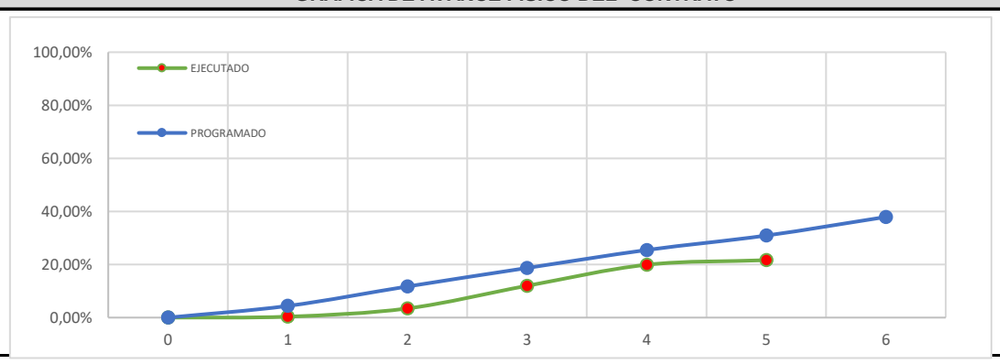

## 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


### AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 1.327.793.872 | $ 1.037.858.815 | 78,16% |
| Durante el periodo | $ 284.442.718 | $ 90.552.684 | 31,84% |
| Acumulado Actual | $ 1.612.236.590 | $ 1.128.411.499 | 69,99% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-$ 483.825.091,40

### GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

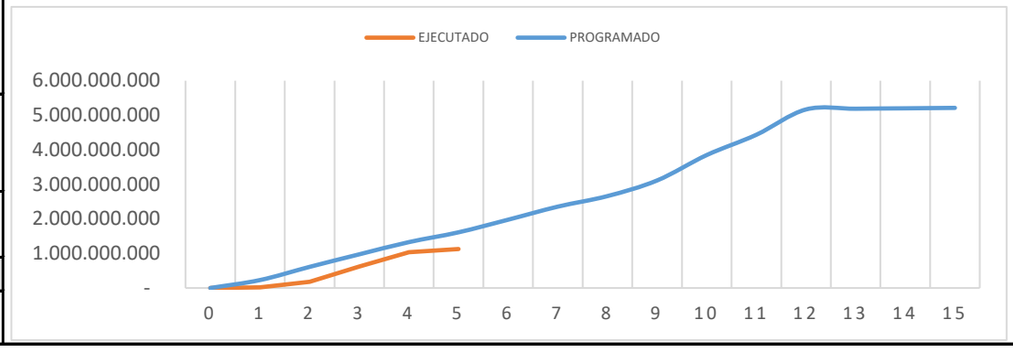



### AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

$ 8.265.862.684

### GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

En el municipio de Tibacuy se continuó con el desarrollo de las actividades de obra. Para este frente se cuenta con permiso para el uso de un espacio destinado a campamento y utilización de unidad sanitaria en una vivienda del sector. En dicho espacio se dispone de punto ecológico, área para acopio de sustancias químicas debidamente acondicionada y kit para atención de derrames.

Adicionalmente, durante los recorridos efectuados en semanas anteriores se realizaron llamados de atención orientados a mejorar el manejo de residuos, especialmente en lo relacionado con la recolección y acopio de empaques de cemento. En atención a ello, el contratista continúa ejecutando la recolección de dichos residuos al cierre de cada jornada, evidenciándose mejoras sustanciales en su manejo. No obstante, este aspecto continúa siendo objeto de seguimiento por parte de la interventoría, con el fin de prevenir requerimientos de la comunidad y garantizar un manejo ambientalmente adecuado de los residuos generados durante la ejecución de las actividades.

La interventoría continuará verificando el estricto cumplimiento de las actividades conforme a lo establecido en el PAGA.
En cuanto a la gestión documental, se informa que el 7 de mayo de 2026 se recibió el informe mensual ambiental del contratista correspondiente al mes de abril de 2026, el cual será objeto de revisión por parte de la interventoría para la emisión del respectivo concepto. Adicionalmente, se encuentran pendientes soportes documentales que corroboren los permisos para el uso de unidades sanitarias en los frentes de obra.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 04 y el 10 de mayo de 2026 se dio inicio formal a las actividades del componente social del Contrato ICCU-140-2025, orientadas a la estructuración, articulación institucional y planificación de las acciones a desarrollar en territorio, así como al acompañamiento social y administrativo de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra.
Lunes 04 de mayo del 2026
Actividades de campo:
• En el tramo 6 del municipio de La Victoria se realizó el levantamiento de 2 actas de vecindad.
• En el tramo 5 del municipio de La Victoria se realizó el levantamiento de 5 actas de vecindad.
Actividades administrativas:
• Elaboración y cargue del informe semanal en la plataforma SharePoint.
• Envío de los comunicados:
260504_25C02_DTO_410_Notificación Servicios Públicos Tibacuy.
260504_25C02_DTO_411_Observaciones Valla Fija.
• El ICCU emitió aprobación del volante N°43 correspondiente a actas de vecindad en el municipio de Tibacuy, provincia de Sumapaz.
Martes 05 de mayo del 2026
Actividades administrativas:
• Avance en la elaboración del informe mensual N°13.
• Envío del oficio 260506-25C02-DTO-414. Requerimiento de Cumplimiento de Compromisos.
• Participación virtual en reunión jurídica programada a las 4:00 p.m.

Miércoles 06 de mayo del 2026
Actividades administrativas:
• Continuación de la elaboración del informe mensual N°13.
• Envío al contratista del oficio 25C02-DTO-414. Requerimiento de Cumplimiento de Compromisos Acta de Socialización Tramos a Intervenir.
• Información a la supervisora social del ICCU sobre la remisión tardía de la presentación por parte del contratista (12:51 p.m.), lo que impidió su revisión previa a la reunión programada para las 2:00 p.m.

Jueves 07 de mayo del 2026
Actividades administrativas:
• Reunión virtual entre las profesionales sociales de la interventoría para revisión del informe mensual N°13.
• Elaboración y cargue del informe mensual N°13 en la plataforma SharePoint.
• Se deja constancia de que, a la fecha de entrega del informe, el contratista no había remitido el informe mensual ni sus respectivos anexos.
Viernes 08 de mayo de 2026
Actividades administrativas:
• Participación presencial en el Comité Integral N°40, realizado a las 8:00 a.m. en las instalaciones del ICCU, con asistencia del contratista, la interventoría y el ICCU.
Durante el comité, el componente social del contratista adquirió los siguientes compromisos:
• Realizar el comité integral todos los jueves a las 8:00 a.m.
• Garantizar la asistencia del área social del contratista a las reuniones programadas.
Adicionalmente se desarrolló las siguientes actividades:
• Organización de la información correspondiente al diario de campo.
• Consolidación y adjunto del registro fotográfico de las actividades ejecutadas durante la semana.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Para la presente semana del 27 de abril al 03 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.
1. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO  CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) :
 - Continuacion Tramo 6
 - Tramo 5
Durante la presente semana se adelantaron actividades orientadas a la conformación, adecuación y mejoramiento de la calzada existente mediante la ejecución de capa estabilizada, conforme a las especificaciones técnicas contractuales establecidas para el proyecto.
Desde el componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia diaria del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la supervisión del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.
Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, un (1) profesional social, un (1) profesional ambiental, siete (7) auxiliares operativos, dos (2) auxiliar de trafico y cuadro (3) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.
La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por uno (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retroexcavadora, una (1) turbos, un (1) carro tanque, equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado."

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana el contratista mantiene esta maquinaria: motoniveladora, vibrocompactador y carrotanque, personal de obra, para el avance de las actividades. Se le solicito al contratista vervalmnte la modificacion del presupuesto de obra con sus memorias de calculo y el projec aujstado

### 8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
8. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista se encuentra realizando actividades en tramo 4.
9. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE ( SN4 - 900 mm ) 36": donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.

### 8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

"Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:

• Se evidencia personal de obra (Residente de Obra, Profesional Social, Profesional ambiental, inspectora SST, 2 Operadores vibro compactador, 2 Operadores de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 8 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico,.
• Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 1 camionetas, 1 furgones, herramienta menor).
• Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos)."

### 8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de Tibacuy Cundinamarca se informa que de los ($ 5.193.248.079), Cinco mil ciento noventa y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil setenta y nueve con ochocientos setenta y cinco pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de ($1.128.411.498,7) Mil ciento veintiocho millones cuatrocientos once mil cuatrocientos noventa y ocho con siete, con un porcentae del (21.65%) veintiuno punto sesenta y cindo porciento. y el valor ejecutado de la semana por ($90.552.684) Noventa millones quinientos cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y cuatro pesos y el porcentae eecutado de la semana del (1.74%) uno punto setanta y cuatro porciento.

### 8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista no ha realizados los respectivos ensayos del material existente de tramo 6 de caracterización de materiales
El contratista no ha realizados las tomas con el hodómetro para la verificación de humedades durante la ejecución.
“En diversos sectores del tramo intervenido se evidencian fallas durante la fase de ejecución, las cuales inciden negativamente en la calidad de la conformación, generando inconsistencias una vez se produce el secado del material.”

### 8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Persisten pendientes documentales relacionados con la entrega de soportes que corroboren los permisos para el uso de unidades sanitarias en los frentes de obra, así como la presentación de paz y salvos una vez se realice el retiro de los sitios utilizados, en los que conste que no existen obligaciones pendientes, evitando de esta manera posibles requerimientos por parte de la comunidad relacionados con este aspecto.

### 8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista no contaba con Plan de Manejo de Tránsito (PMT), presentó ausencia de la documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para el desarrollo seguro de las actividades, no dispuso de la presencia permanente del profesional SST en campo y, adicionalmente, se identificó que el personal ejecutor no presentó certificados vigentes para trabajo en alturas, no se evidenció procedimiento seguro de trabajo para actividades de alto riesgo y no se garantizó la dotación ni el uso obligatorio de equipos de protección contra caídas, específicamente arnés de seguridad. De igual forma, el personal relacionado para la ejecución de actividades no fue aprobado, toda vez que no se aportó de manera completa la documentación obligatoria para su validación, incluyendo exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificados de afiliación vigentes a ARL, EPS y fondo de pensiones, situación que constituye incumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencia

### 8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No aplica pa esta semana reportada.

| 9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA PROGRAMADA** |
| Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos. | Contratista | Inmediato |
| Control de calidad obra (Laboratorios, topografia) | Contratista | Inmediato |
| Iniciar con actividades según programación de obra | Contratista | Inmediato |
| | | |
| | | |

**10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

**11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
Se realzo supervisión para la CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO  CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR
se instalo material de prestamo subbase

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**




260504_FR_FG_charla_K18+270




260504_FR_FG_conformacion_de_material_subbase_cemento_para_estabilizado_K18+270




260507_FR_FG_reubicacion_de_tramo_con_alcaldia_contratista_e_interventoria_K17+060_al_k18+114




20260508_accisado_de_tramo_N_5_K19+530




20260508_accisado_de_tramo_N_6_K24+840




20260508_reubicacion_de_alcantarillas_en_tramo_N_6

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Nombre: gustavo adolfo crosby

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

## PERIODO DE INFORME SEMANAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecg Engineering Consulting Group | ECG INGENIERIA SAS | **FECHA** | lunes, 18 de mayo de 2026 | **SEMANA No.** | **57** | DEL | **11-may-26** | AL | **17-may-26** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | **TIBACUY, CUNDIAMARCA** |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 218 de 2025 | **CONTRATO No.:** | 140 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | ECG INGENIERIA SAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICGER 2021 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2-abr-25 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio del 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 409 | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 409 |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.903.576.140 | **VALOR INICIAL ANAPOIMA :** | $ 5.213.128.194 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 5.213.128.194 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 5.213.128.194 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 780.715.228 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| **SUPERVISOR:** | ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA | **SUPERVISOR:** | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 11 al 17 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.
1. transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobre acarreos y derrumbes
- Tramo 3 K17+060 al K18+114
2. conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico
- Tramo 3 K17+060 al K18+114
3. instalación de material de préstamo
- Tramo 2 K10+200 al K11+520
4.levantamiento topografico de tramo 6 con la topógrafia de la interventoría.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 30-abr-26 | 30-abr-26 | 0,00 | 4-may-26 | | ejecución | -4 | ejecución |
| 2 | CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) | 30-mar-26 | 28-may-26 | 59,00 | 16-abr-26 | | ejecución | -17 | ejecución |
| 3 | CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO | 30-abr-26 | 10-abr-26 | -20,00 | 7-abr-26 | | ejecución | 23 | ejecución |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Plazo del proyecto:** - 19 días

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 30,93% | 21,65% | -9,28% |
| Durante el periodo | 7,00% | 1,78% | -5,22% |
| Acumulado Actual | 37,93% | 23,43% | -14,50% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 469 días | 416,00 | 53,00 | -68,03 |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

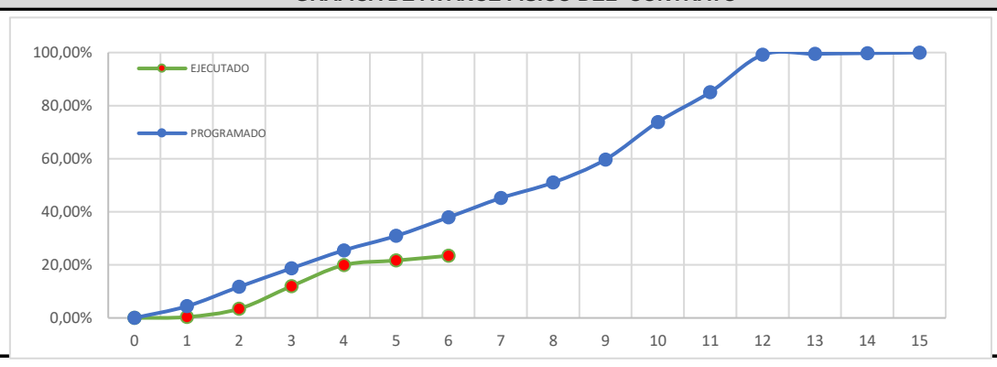

## 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


### AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 1.612.236.590 | $ 1.128.411.499 | 69,99% |
| Durante el periodo | $ 365.086.555 | $ 92.776.636 | 25,41% |
| Acumulado Actual | $ 1.977.323.145 | $ 1.221.188.135 | 61,76% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-$ 756.135.009,70

### GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

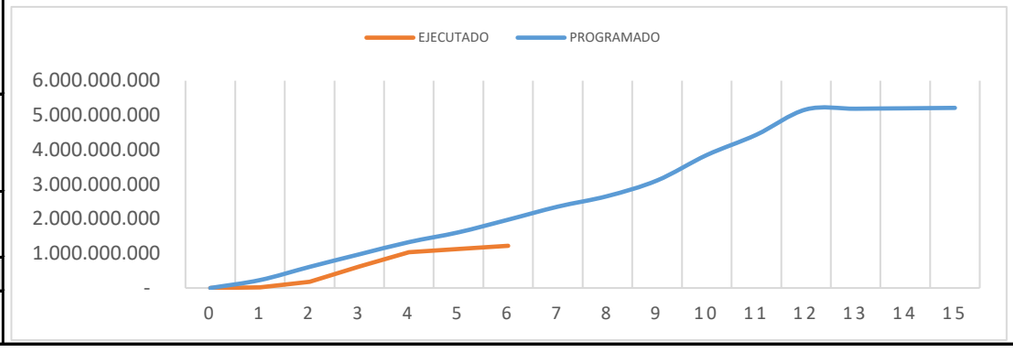


### AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

$ 8.265.862.684

### GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se realiza la gestión ambiental del frente de obra, verificando el cumplimiento de las medidas establecidas en el PAGA, incluyendo actividades asociadas al manejo adecuado de residuos sólidos, seguimiento a las condiciones de orden y aseo, almacenamiento temporal de materiales, señalización preventiva y ambiental, así como la correcta instalación y funcionamiento del punto ecológico. El contratista cuenta con espacios en un predio ubicado en cercanía al frente de obra, el cual es utilizado como campamento. Asimismo, se dispone de permiso para el uso de unidad sanitaria y de áreas adecuadas como zonas de acopio de materiales y equipos.
Actualmente, se encuentra pendiente la entrega por parte del contratista de los ajustes solicitados a los informes mensuales correspondientes a febrero y marzo de 2026, así como la remisión de soportes asociados a contratos para uso de unidades sanitarias y la presentación de los respectivos paz y salvo. De igual manera, se lleva a cabo la revisión del informe mensual correspondiente a abril de 2026.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 11 y el 17 de mayo de 2026 se dio inicio formal a las actividades del componente social del Contrato ICCU-140-2025, orientadas a la estructuración, articulación institucional y planificación de las acciones a desarrollar en territorio, así como al acompañamiento social y administrativo de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra.

***Lunes 11 de mayo del 2026***
Actividades de campo:
•El contratista no ejecutó actividades en campo durante este día.
Actividades administrativas:
•Elaboración y cargue del informe semanal en la plataforma SharePoint.
•Revisión del cronograma de actividades que reporta el contratista.

***Martes 12 de mayo del 202*** **6**
Actividades de campo:
•El contratista no ejecutó actividades en campo durante este día.
Actividades administrativas:
•Comité social N°14 participa contratista, interventoría y la entidad ICCU.
•Elaboración del acta comité social N°14
•Revisión del SharePoint archivos sociales
•Elaboración de informe ejecutivo del área social para entrega del cargo de la profesional social Fernanda Quitian.

***Miércoles 13 de mayo del 2026***
Actividades de campo:
•El contratista no ejecutó actividades en campo durante este día.
Actividades administrativas:
•Elaboración de la certificación ambiental y social anexo del informe mensual
•Envió de cronograma al contratista solicitando la modificación de las actividades en este.

***Jueves 14 de mayo del 2026***
Actividades de campo:
•El contratista no ejecutó actividades en campo durante este día.
Actividades administrativas:
•Comité integral N°41
•Envió de cronograma al contratista solicitando la modificación de las actividades en
este.
•Envió de correo a la profesional Fernanda Quitian el cual contiene el adjunto de (5) actas para revisión, aprobación, firma y diligenciamiento de la información en la plataforma SharePoint, ya que corresponden al periodo elaborado.

***Viernes 15 de mayo del 2026***
Actividades de campo:
•El contratista no ejecutó actividades en campo durante este día.
Actividades administrativas:
•Envió de volantes actas de vecindad N°45 y N°46 al área técnica de Interventoría, ya que se realizaron ajustes.
•Se recibe el cronograma de actividades del componente social correspondiente a la semana N°58 el cual va del 19 al domingo 24 de abril del 2026.

***Sábado 16 de mayo de 2026***
•Se continua en actividades administrativas y documentales.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Para la presente semana del 11 de mayo al 17 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy, Cundinamarca.
1.transporte de materiales prov. de explanación, canales, prestamos, sobre acarreos y derrumbes
- Tramo 3
2. conformación de calzada existente incluye retiro de material orgánico
- Tramo 3
3. instalación de material de préstamo
- Tramo 2
4.levantamiento topografico de tramo 6 con la topógrafia de la interventoría.
Durante la presente semana se adelantaron actividades del componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control de asistencia diaria del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS), así como la supervisión del uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el fin de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.
Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra,  siete (7) auxiliares operativos, dos (2) auxiliar de trafico y cuadro (3) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.
La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por uno (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retrocargador, una (1) turbos, un (1) carro tanque,  equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado."

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana el contratista mantiene esta maquinaria: motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, camioenta 4x4, turbo y carrotanque, personal de obra, para el avance de las actividades. Se le solicito al contratista vervalmnte la modificacion del presupuesto de obra con sus memorias de calculo y el projec aujstado

### 8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
8. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista no se encuentra realizando actividades.
9. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE ( SN4 - 900 mm ) 36": donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.

### 8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

"Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:

• Se evidencia personal de obra (Residente de Obra, Profesional Social, Profesional ambiental, sin inspectora sst, 2 Operadores vibro compactador, 2 Operadores de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 7 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico.
• Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 1 camionetas, 1 furgones, herramienta menor).
• Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos)."

### 8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de Tibacuy Cundinamarca se informa que de los ($ 5.193.248.079), Cinco mil ciento noventa y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil setenta y nueve con ochocientos setenta y cinco pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de ($ 1221188135,1) Mil doscientos veintiún millones ciento ochenta y ocho mil ciento treinta y cinco pesos con un centavo, y el porcentaje de ejecucion del veintitres punto cuarenta y tres porciento. unvalor ejecutado de la semana de ($92776636) Noventa y dos millones setecientos setenta y seis mil seiscientos treinta y seis pesos y suporcentae eecutado de la semana es del (1.7%) uno punto siete porciento.

### 8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista no ha realizados los respectivos ensayos del material existente de tramo 6 de caracterización de materiales
El contratista no ha realizados las tomas con el hodómetro para la verificación de humedades durante la ejecución.
“En diversos sectores del tramo intervenido se evidencian fallas durante la fase de ejecución, las cuales inciden negativamente en la calidad de la conformación, generando inconsistencias una vez se produce el secado del material.”

### 8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Se mantienen pendientes respecto al tema documental, asociados a informes mensuales y soportes de unidades sanitarias, se evalua desarrollar mesas de trabajo con el fin de subsanar a la mayor brevedad los pendientes documentales

### 8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista tiene falencias en la implementacion del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), presentó ausencia de la documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para el desarrollo seguro de las actividades, no dispuso de la presencia permanente del profesional SST en campo y, adicionalmente, no se evidenció procedimiento seguro de trabajo para actividades de alto riesgo y no se garantizó la dotación ni el uso obligatorio de equipos de protección contra caídas, específicamente arnés de seguridad. De igual forma, el personal relacionado para la ejecución de actividades no fue aprobado, toda vez que no se aportó de manera completa la documentación obligatoria para su validación, incluyendo exámenes médicos ocupacionales de ingreso, certificados de afiliación vigentes a ARL, EPS y fondo de pensiones, situación que constituye incumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

### 8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencia

### 8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

No aplica pa esta semana reportada.

| 9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA | | |
|---|---|---|
| **ACTIVIDAD** | **RESPONSABLE** | **FECHA PROGRAMADA** |
| Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos. | Contratista | Inmediato |
| Control de calidad obra (Laboratorios, topografia) | Contratista | Inmediato |
| Iniciar con actividades según programación de obra | Contratista | Inmediato |
| | | |
| | | |

**10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

**11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

Se debe dar cumplimiento a la programación de obra.
Se realzo supervisión para la CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO  CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR
se instalo material de prestamo subbase

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**




260514_FR_FG_confomado_material_subbase_K17+350




260512_FR_FG_instalación_de_material_subbase_K17+520




260513_FR_FG_instalacion_material_subbase_K17+400




20260515_ensayo_deflectometria_K25+060




20260515_accisado_de_tramo_N_6_K24+840




20260515_accisado_en_tramo_2_K11+400

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Nombre: Gustavo Adolfo Crosby

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecg Engineering Consulting Group | ECG INGENIERIA SAS | **FECHA** | lunes, 25 de mayo de 2026 | **SEMANA No.** | **58** | DEL | **18-may-26** | AL | **24-may-26** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | **TIBACUY, CUNDIAMARCA** |

| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** | | **CONTRATO DE OBRA PÚBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 218 de 2025 | **CONTRATO No.:** | 140 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | ECG INGENIERIA SAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICGER 2021 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2-abr-25 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio del 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 409 | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 409 |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.903.576.140 | **VALOR INICIAL ANAPOIMA :** | $ 5.213.128.194 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 5.213.128.194 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 5.213.128.194 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 780.715.228 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| **SUPERVISOR:** | ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA | **SUPERVISOR:** | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 18 de mayo al 24 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy Cundinamarca.
• TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES: Se realiza transporte de material de afirmado para el tramo correspondiente a las abscisas k11+350 al k10+857 que corresponden a 493m con espesor promedio de 20 cm y ancho de 4.0m
• Instalación, extendido y compactación de material de AFIRMADO entre las abscisas k11+350 al k10+857.
• EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) para construcción de alcantarillas en los K17+530.
• Instalación de TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36" en las abscisas K17+530.
• Se realiza actividad de RELLENO PARA ESTRUCTURAS para las alcantarillas en las abscisas K17+530.
• CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. Se ha realizado conformación de vía para la ejecución de la actividad de estabilización de suelo entre las abscisas K17+530.
• DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): K17+530

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 30-abr-26 | 30-abr-26 | 0,00 | 4-may-26 | | ejecución | -4 | ejecución |
| 2 | CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) | 30-mar-26 | 28-may-26 | 59,00 | 16-abr-26 | | ejecución | -17 | ejecución |
| 3 | CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO | 30-abr-26 | 10-abr-26 | -20,00 | 7-abr-26 | | ejecución | 23 | ejecución |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

**Plazo del proyecto:** - 19 días

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 37,93% | 23,43% | -14,50% |
| Durante el periodo | 7,24% | 2,47% | -4,77% |
| Acumulado Actual | 45,17% | 25,90% | -19,28% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 469 días | 423,00 | 46,00 | -90,41 |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

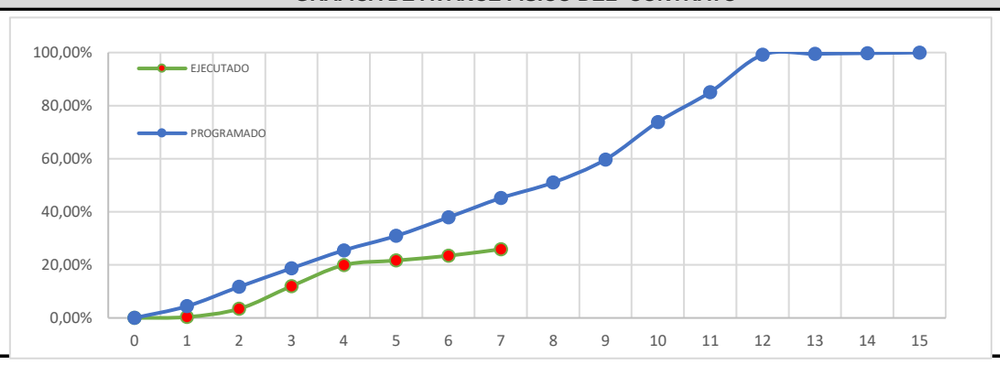

## 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


### AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 1.977.323.145 | $ 1.221.188.135 | 61,76% |
| Durante el periodo | $ 377.582.069 | $ 128.771.515 | 34,10% |
| Acumulado Actual | $ 2.354.905.214 | $ 1.349.959.650 | 57,33% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

-$ 1.004.945.563,89

### GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO

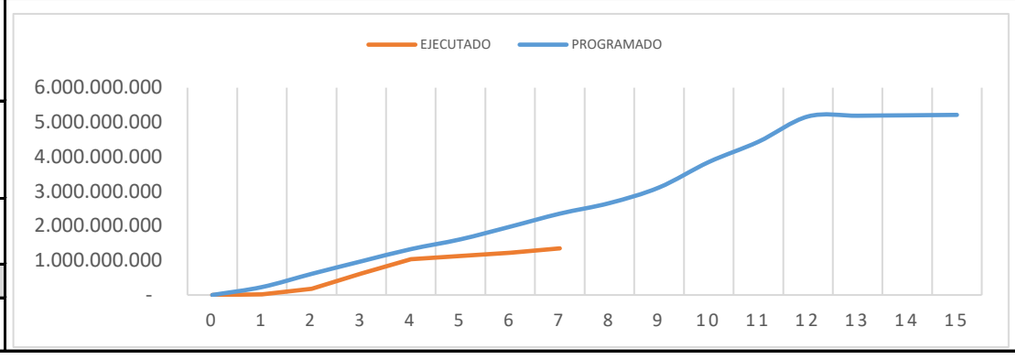



### AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

$ 8.265.862.684

### GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se efectúa seguimiento a la implementación del PAGA en la obra. Se evidencia que el contratista cuenta con área de acopio para materiales, unidad sanitaria fija en calidad de préstamo para uso del personal, kit de derrames, punto ecológico, entre otros elementos requeridos para la gestión ambiental del proyecto.
Asimismo, el contratista continúa suministrando materiales provenientes de la fuente "La Floresta", la cual se encuentra legalmente constituida y cuenta con los permisos minero-ambientales vigentes.
Por otra parte, el contratista adelanta los ajustes correspondientes a los informes mensuales de febrero y marzo de 2026. Si bien se evidencian avances en su consolidación y corrección, aún se identifican aspectos que requieren ajuste. Entre ellos, se solicita la inclusión de los certificados de materiales, toda vez que los documentos presentados evidencian inconsistencias en las sumatorias y las cantidades reportadas no coinciden con aquellas validadas mediante las respectivas remisiones.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 19 y el 24 de mayo de 2026 se dio inicio formal a las actividades del componente social del Contrato ICCU-140-2025, orientadas a la estructuración, articulación institucional y planificación de las acciones a desarrollar en territorio, así como al acompañamiento social y administrativo de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra.

***Lunes 18 de mayo del 2026***

•No se realizan actividades por ser día festivo.

***Martes 19 de mayo del 2026***

Actividades de campo:

•Se realizaron actas de vecindad de inicio en el municipio de Tibacuy, correspondientes al tramo 3, para un total de cuatro (4) actas: tres (3) viviendas y un (1) cerramiento. En cuanto al tramo 1, se encuentra pendiente la definición sobre su intervención, con el fin de determinar la elaboración de las respectivas actas de vecindad. Acompaña el residente general de interventoría Manuel Moreno.

Actividades administrativas:

•Elaboración y cargue del informe semanal N°57, del municipio de Tibacuy en la plataforma SharePoint.

•Organización del diario de campo digital del componente social.

***Miércoles 20 de mayo del 2026***

Actividades de campo:

•El área técnica del contratista reportó cierre vial en Tibacuy para la ejecución de actividades técnicas; sin embargo, no se evidenció socialización previa y formal con la comunidad. La profesional social Sther Tuñol indicó que la información fue comunicada verbalmente a líderes comunitarios el 19 de mayo de 2026 para su difusión vía WhatsApp, pese a que las actividades iniciaban el 20 de mayo de 2026.

La actividad no contó con acompañamiento social ya que no se encontraba reportada en el cronograma enviado por el contratista, ni con aprobación y distribución previa de la pieza informativa, por lo que las áreas sociales, técnica y SST de la interventoría elaboran comunicado conjunto al contratista, requiriendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la socialización de actividades y cierres viales.

Actividades administrativas:

•Se devuelve con observaciones por parte de la interventoría el volante N°47 relacionado con la notificación de cierres viales para la construcción de alcantarillas en el tramo 3 de la vereda Bateas, municipio de Tibacuy,

***jueves 21 de mayo del 2026***

Actividades de campo:

•El área técnica del contratista reportó cierre vial en Tibacuy para la ejecución de actividades técnicas; sin embargo, no se evidenció socialización previa y formal con la comunidad. La profesional social Sther Tuñol indicó que la información fue comunicada verbalmente a líderes comunitarios el 19 de mayo de 2026 para su difusión vía WhatsApp, pese a que las actividades iniciaban el 20 de mayo de 2026.

La actividad no contó con acompañamiento social ya que no se encontraba reportada en el cronograma enviado por el contratista, ni con aprobación y distribución previa de la pieza informativa, por lo que las áreas sociales, técnica y SST de la interventoría elaboran comunicado conjunto al contratista, requiriendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la socialización de actividades y cierres viales.

Actividades administrativas:

•Se da respuesta al correo enviado por el área social del contratista donde la interventoría tanto área técnica y social manifiesta no estar de acuerdo con las actividades que el contratista quiere realizar en Tibacuy a partir de la fecha ya que no informaron oportunamente ni a la interventoría ni a la comunida

***Viernes 22 de mayo del 2026***

Actividades de campo:

•El área técnica del contratista reportó cierre vial en Tibacuy para la ejecución de actividades técnicas; sin embargo, no se evidenció socialización previa y formal con la comunidad. La profesional social Sther Tuñol indicó que la información fue comunicada verbalmente a líderes comunitarios el 19 de mayo de 2026 para su difusión vía WhatsApp, pese a que las actividades iniciaban el 20 de mayo de 2026.

La actividad no contó con acompañamiento social ya que no se encontraba reportada en el cronograma enviado por el contratista, ni con aprobación y distribución previa de la pieza informativa, por lo que las áreas sociales, técnica y SST de la interventoría elaboran comunicado conjunto al contratista, requiriendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la socialización de actividades y cierres viales.

Actividades administrativas:

•Se adjunta desde el componente social el informe ejecutivo requerido por parte del director de obra el ingeniero Gustavo Crosby mencionando los temas sociales que presentan atrasos e incumplimientos por parte del contratista.

***Sábado 23 de mayo de 2026***

•Se continua en actividades administrativas y documentales.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 18 y el 24 de mayo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades de obra en el marco del contrato de obra desarrollado en el municipio de Tibacuy. Asimismo, durante este periodo se adelantaron actividades correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), La interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control diario de asistencia del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, así como la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS). De igual manera, se supervisó el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el propósito de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.

Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, siete (7) auxiliares operativos, dos (2) auxiliares de tráfico y tres (3) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.

La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por una (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retrocargador, una (1) turbo, un (1) carro tanque y una camioneta, equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana del 18 de mayo al 24 de mayo del 2026 el contratista mantiene esta maquinaria: motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, camioenta 4x4, turbo y carrotanque, personal de obra, para el avance de las actividades. Se le solicito al contratista vervalmnte la modificacion del presupuesto de obra con sus memorias de calculo y el projec aujstado

### 8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. RELLENO PARA ESTRUCTURAS: donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
8. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
9. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista no se encuentra realizando actividades.
10. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36": donde el contratista iniciado la respectiva actividad.

### 8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

"Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:

• Se evidencia personal de obra (Residente de Obra, Profesional Social, Profesional ambiental, sin inspectora sst, 2 Operadores vibro compactador, 2 Operadores de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 7 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico,.
• Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 1 camionetas, 1 furgones, herramienta menor).
• Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos)."

### 8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de Tibacuy Cundinamarca se informa que de los ($5.193.248.079), Cinco mil ciento noventa y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil setenta y nueve con ochocientos setenta y cinco pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de ($1.349.959.650,196) Mil trescientos cuarenta y nueve millones novecientos cincuenta y nueve mil seiscientos cincuenta con ciento noventa y seis centavos con un porcenta de ejecucion total del (25.90%) veinticinco punto noventa porciento, un valor eecutado de obra en la semana del ($128.771.515,10) Ciento veintiocho millones setecientos setenta y un mil quinientos quince pesos con diez centavos y un porcentae de ejecucion semanal del (2.47%) dos punto cuarenta y siete porciento.

### 8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

El contratista no ha realizado ningun control de calidad de los tramos estabilizados con productos quimicos intervenidos.

### 8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Durante la semana no se presentaron novedades para referenciar. En cuanto al tema documental, se continúan adelantando los ajustes necesarios con el fin de subsanar los pendientes identificados.

### 8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista presenta falencias en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), debido a que las señales de aproximación no se instalan de manera completa. Asimismo, se identificó la ausencia de formatos y de documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para el desarrollo seguro de las actividades.
De igual manera, el contratista presenta deficiencias en la entrega oportuna de los elementos de protección personal (EPP), tales como guantes y protectores auditivos tipo copa e inserción.
Adicionalmente, para la construcción de las alcantarillas, el contratista no presentó la documentación de ingreso del personal subcontratista vinculado a esta actividad.

Esta situación constituye un incumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

### 8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencia

### 8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

El área técnica del contratista reportó cierre vial en Tibacuy para la ejecución de actividades técnicas; sin embargo, no se evidenció socialización previa y formal con la comunidad. La profesional social Sther Tuñol indicó que la información fue comunicada verbalmente a líderes comunitarios el 19 de mayo de 2026 para su difusión vía WhatsApp, pese a que las actividades iniciaban el 20 de mayo de 2026.
La actividad no contó con acompañamiento social ya que no se encontraba reportada en el cronograma enviado por el contratista, ni con aprobación y distribución previa de la pieza informativa, por lo que las áreas sociales, técnica y SST de la interventoría elaboran comunicado conjunto al contratista, requiriendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales relacionadas con la socialización de actividades y cierres viales.

## 9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos. | Contratista | Inmediato |
| Control de calidad obra (Laboratorios, topografia) | Contratista | Inmediato |
| Iniciar con actividades según programación de obra | Contratista | Inmediato |
| | | |
| | | |

## 10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

## 11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación establecida para la ejecución de obra.
Se efectuó la instalación de material de préstamo para el afirmado del terreno.
Se dio inicio a las actividades de demolición de encoles y descoles, así como a la excavación para la instalación de tubería de polietileno HDPE (SN4 – 900 mm / 36”).
En el tramo 4 se intervino una (1) alcantarilla, y en el tramo 3 se realizó la intervención de una (1) alcantarilla.

## 12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA




260519_FR_FG_confomado_de_via_K10+800




260519_FR_FG_instalación_de_material_subbase_K11+430




260520_FR_FG_instalacion_material_subbase_K10+980




20260520_instalacion_material_subbase_K11+400




20260520_FR_FG_instalacion_material_subbase_K10+980




20260522_estabilizado_con_cemento_y_quimico_K11+480




20260522_FR_FG_excavacion_para_instalacion_TUBERIA_DE_POLIETILENO_HDPE_(SN4-900mm)_36"_K17+828




20260522_FR_FG_excavacion_para_instalacion_TUBERIA_DE_POLIETILENO_HDPE_(SN4-900mm)_36"_K17+828

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Nombre: GUSTAVO ADOLFO CROSBY

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| ecg | ECG INGENIERIA SAS | FECHA | lunes, 1 de junio de 2026 | SEMANA No. | 59 | DEL | 25-may-26 | AL | 31-may-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | **TIBACUY, CUNDIAMARCA** |

| CONTRATO DE INTERVENTORÍA | | CONTRATO DE OBRA PÚBLICA | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 218 de 2025 | **CONTRATO No.:** | 140 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | ECG INGENIERIA SAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICGER 2021 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2-abr-25 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio del 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 409 | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 409 |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.903.576.140 | **VALOR INICIAL ANAPOIMA :** | $ 5.213.128.194 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 5.213.128.194 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 5.213.128.194 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 780.715.228 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| **SUPERVISOR:** | ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA | **SUPERVISOR:** | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 25 de mayo al 31 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Tibacuy Cundinamarca.
- TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES: tramo 1 = 354,20 m con espesor promedio de 25 cm y ancho de 4.0m
- CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO. Tramo 2 K10+857 al K09+800.
- EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): instalación de tubería del tramo 3 en K17+720 y K17+828 y tramo 4 en K18+200
- DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM):
- continuación verificación de anchos de tramos 6 y tramo 2 por parte del topógrafo de la interventoría
- supervisión Sst
- inspecciones técnicas en campo

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 30-abr-26 | 30-abr-26 | 0,00 | 4-may-26 | | ejecución | -4 | ejecución |
| 2 | CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) | 30-mar-26 | 28-may-26 | 59,00 | 16-abr-26 | | ejecución | -17 | ejecución |
| 3 | CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO | 30-abr-26 | 10-abr-26 | -20,00 | 7-abr-26 | | ejecución | 23 | ejecución |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


**Plazo del proyecto:** - 19 días

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 45,17% | 25,90% | -19,28% |
| Durante el periodo | 5,86% | 1,55% | -4,31% |
| Acumulado Actual | 51,03% | 27,45% | -23,58% |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

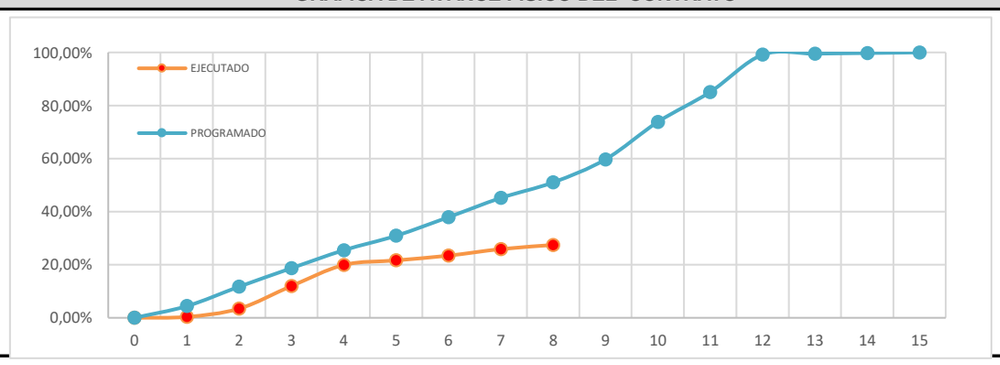


**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**


| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 469 días | 430,00 | 39,00 | -110,61 |

### 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 2.354.905.214 | $ 1.349.959.650 | 57,33% |
| Durante el periodo | $ 305.502.489 | $ 80.978.663 | 26,51% |
| Acumulado Actual | $ 2.660.407.703 | $ 1.430.938.313 | 53,79% |

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**

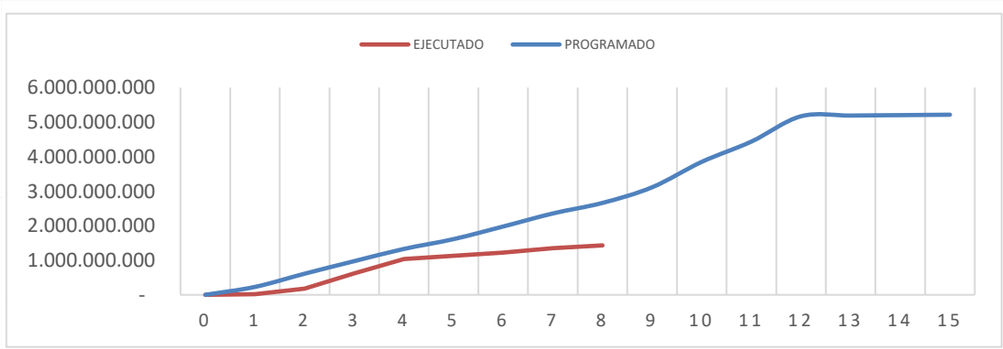



**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

| | |
|---|---|
| -$ | 1.229.469.390,15 |

| AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
| Acumulado anterior | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |

| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO | |
|---|---|
| $ | 8.265.862.684 |

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**

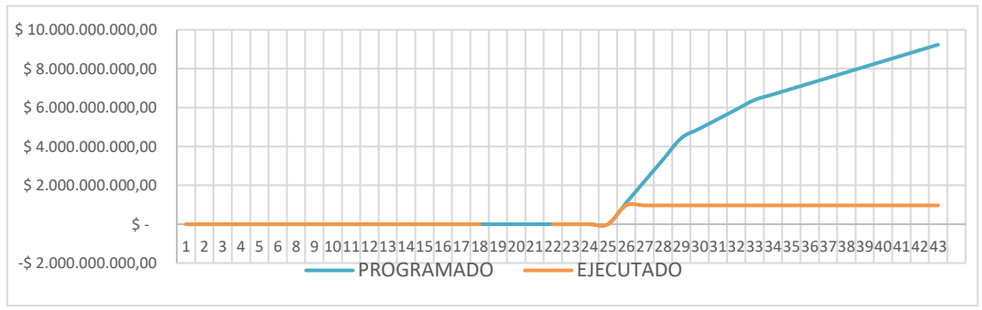


## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se efectuó seguimiento a la implementación del PAGA en obra, evidenciando que el contratista dispone de un área de acopio para materiales, unidad sanitaria fija en calidad de préstamo para uso del personal, kit de atención de derrames, punto ecológico y demás elementos requeridos para la gestión ambiental del proyecto.
Asimismo, se verificó que el contratista continúa realizando el suministro de materiales provenientes de la fuente "La Floresta", la cual cuenta con los respectivos permisos minero-ambientales vigentes y se encuentra legalmente constituida.
Considerando que actualmente se adelantan actividades relacionadas con la construcción de alcantarillado, se ha generado material clasificado como RCD, el cual será donado a un predio aledaño a la vía. Dicha entrega quedará debidamente soportada mediante registro fotográfico y acta de donación suscrita por las partes.
Durante el recorrido efectuado el día 25 de mayo, se solicitó al contratista la ejecución de actividades de orden y aseo en el área de acopio de cemento. Esta observación fue atendida oportunamente, realizándose las labores correspondientes.
En relación con el componente documental, se llevó a cabo una mesa de trabajo para la revisión de los informes mensuales correspondientes a los meses de febrero y marzo. Al cierre de la semana, el contratista remitió de manera preliminar los ajustes acordados durante dicha reunión.
Adicionalmente, se encuentra en evaluación la actualización del PAGA, para lo cual se ha programado una nueva mesa de trabajo durante la próxima semana.
Se espera que, con la entrega realizada por el contratista, sea posible incorporar los soportes requeridos en el informe de cumplimiento del PAGA y proceder con la entrega formal del documento durante la siguiente semana.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 25 y el 31 de mayo de 2026 se dio inicio formal a las actividades del componente social del Contrato ICCU-140-2025, orientadas a la estructuración, articulación institucional y planificación de las acciones a desarrollar en territorio, así como al acompañamiento social y administrativo de las actividades ejecutadas en los diferentes frentes de obra.

***Lunes 25 de mayo del 2026***

Actividades de campo:
•El contratista no realizó el envío del cronograma correspondiente al viernes 22 de mayo de 2026, en el cual debía reportar las actividades de campo programadas. Dicho cronograma fue remitido únicamente hasta el lunes 25 de mayo de 2026 al mediodía, evidenciándose además que no se reportaron actividades de campo para la semana N°59.
Actividades administrativas:
•La interventoría da respuesta al correo enviado por el contratista con el asunto: programación de actividades sociales semana 59 y justificación de modificación actividades semana 58
•Se envía Oficio: Asunto: 25C02_DTO_432 REITERACIÓN Y CONSTANCIA DE INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL POR LA NO ENTREGA DEL CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL.
•El contratista envía el acta del comité N°14 con la respectiva firma de las sociales por ende la interventoría procede a remitir a la entidad ICCU para firmas.

***Martes 26 de mayo del 2026***

Actividades de campo:
•El contratista no ejecutó actividades de campo durante el periodo reportado.
Actividades administrativas:
•Se envía Oficio: Asunto: 25C02_DTO_434 REQUERIMIENTO PLAN DE CONTIGENCIA - PENDIENTES DE OBRA A LA FECHA.
•Se envía Oficio: Asunto: 25C02_DTO_435 INFORMACIÓN FALTANTE PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE ACTIVIDADES EN OBRA DE LOS FRENTES DE TIBACUY Y NARIÑO. TECNICO, SST Y SOCIAL.
•Se envió correo electrónico al contratista con la verificación y actualización del personal de interventoría, conforme a la solicitud realizada.
•Se cargó en la plataforma SharePoint el Informe Semanal N°58, correspondiente a los frentes de obra de Tibacuy.

***Miércoles 27 de mayo del 2026***

Actividades de campo:
•El contratista no ejecuta actividades de campo para el periodo reportado.
Actividades administrativas:
•Se envió la invitación del comité N°42 al área social del contratista para participación virtual.
•Se remite el directorio de contactos por municipio que actualmente reposa en los archivos de la interventoría, con el fin de que sea revisado y utilizado como base de apoyo para el desarrollo de las actividades del proyecto.

***Jueves 28 de mayo del 2026***

Actividades de campo:
•El contratista no ejecuta actividades de campo para el periodo reportado.
Actividades administrativas:
•Se participa de manera virtual en comité integral N°42 que inició las 8:30 am de manera hibrida.
•Mediante correo electrónico se adjunta el Acta N°14 del Comité Social, debidamente diligenciada y firmada por todos los asistentes, para los fines de control, seguimiento y trámites pertinentes.

***Viernes 29 de mayo del 2026***

Actividades de campo:
•El contratista no ejecuta actividades de campo para el periodo reportado.
Actividades administrativas:
•Se envía correo electrónico a los residentes del municipio de Tibacuy y Magdalena con actas correspondientes a reuniones realizadas previamente en los municipios.
Las mismas son remitidas hasta la fecha debido a que la anterior profesional social, Fernanda Quitián, las dejó pendientes de revisión y aprobación. Es importante precisar que, para la fecha en que se desarrollaron dichas reuniones, yo no hacía parte del contrato ni participé en los espacios mencionados, por lo cual desconozco si la información y los compromisos consignados por el contratista en las actas corresponden de manera exacta a lo tratado durante las reuniones.
•Se envía al director de obra de interventoría y residente de la Provincia Alto Magdalena mediante correo electrónico el cronograma de actividades correspondiente a la semana del 01 al 09 de junio, para su conocimiento, seguimiento y gestión co

***ábado 30 de mayo de 2026***

•Se continua en actividades administrativas y documentales.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 25 y el 31 de mayo de 2026, se ejecutaron las siguientes actividades de obra en el marco del contrato de obra desarrollado en el municipio de Tibacuy.
Asimismo, durante este periodo se adelantaron actividades correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), La interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control diario de asistencia del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, así como la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS). De igual manera, se supervisó el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el propósito de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.

Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, siete (6) auxiliares operativos, dos (2) auxiliares de tráfico y tres (5) operarios de maquinaria, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.

La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por una (1) motoniveladora, un (1) vibrocompactador, una (1) retrocargador, una (1) turbo, un (1) carro tanque y una camioneta, equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana del 25 de mayo al 31 de mayo del 2026 el contratista mantiene esta maquinaria: motoniveladora, vibrocompactador, retroexcavadora, camioenta 4x4, turbo y carrotanque, personal de obra, para el avance de las actividades. Se le solicito al contratista vervalmnte la modificacion del presupuesto de obra con sus memorias de calculo y el projec aujstado

**8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)**

1. DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
2. REMOCION DE ALCANTARILLAS: donde el contratista iniciado la respectiva actividad.
3. EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
4. EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM): donde el contratista continua con la respectiva actividad.
5. CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
6. SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
7. RELLENO PARA ESTRUCTURAS: donde el contratista continua con la respectiva actividad de lleno para la tuberia instalada.
8. LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES, Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM: donde el contratista no ha iniciado la respectiva actividad.
9. CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento: el contratista no se encuentra realizando actividades.
10. TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36": elcontratista continua con la respectiva actividad.

**8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

"Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:

• Se evidencia personal de obra (Residente de Obra, Profesional Social, Profesional ambiental, sin inspectora sst, 2 Operadores vibro compactador, 2 Operadores de motoniveladora, 1 operador de retroexcavadora, 7 ayudantes, 2 auxiliares de tráfico,.
• Se evidencia maquinaria y equipos (2 Motoniveladoras, 1 retroexcavadora, 2 vibro compactadores, 1 camionetas, 1 furgones, herramienta menor).
• Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, productos químicos)."

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Para la ejecución de obra en el municipio de Tibacuy Cundinamarca se informa que de los ($5.193.248.079), Cinco mil ciento noventa y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil setenta y nueve con ochocientos setenta y cinco pesos, presupuestados para la ejecución de obra, la ejecución de la semana es de ($80.978.663) ochenta millones novecientos setenta y ocho mil seiscientos sesenta y tres pesos y un porcentaje ejecutado de la semana fue de (27.45%) veintisiete punto cuarenta y cinco porciento, y el valor acumulado ejecutado total de ($1.430.938.312,796) Mil cuatrocientos treinta millones novecientos treinta y ocho mil trescientos doce pesos con setecientos noventa y seis centavos.

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

El contratista no ha realizado ningun control de calidad de los tramos estabilizados con productos quimicos intervenidos, se les ha notificado de la actualizacion del presupuesto de obra, programa de obra.

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

Durante la semana se solicitaron acciones de mejora en acopios de materiales, las mismas fueron atendida oportunamente por el contratista, se continuara en seguimiento para verificar el desarrollo de las actividades de manejo ambiental en este frente de obra. En cuanto al tema documental, se continúan adelantando los ajustes necesarios con el fin de subsanar los pendientes identificados.

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista presenta falencias en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), debido a que las señales de aproximación no se instalan de manera completa. Asimismo, se identificó la ausencia de formatos y de documentación técnica, operativa y de seguridad requerida para el desarrollo seguro de las actividades.
De igual manera, el contratista presenta deficiencias en la entrega oportuna de los elementos de protección personal (EPP), tales como guantes y protectores auditivos tipo copa e inserción.
Adicionalmente, para la construcción de las alcantarillas, el contratista no presentó la documentación de ingreso del personal subcontratista vinculado a esta actividad.

Esta situación constituye un incumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normativos aplicables en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencia

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

- Se envía Oficio: Asunto: 25C02_DTO_434 REQUERIMIENTO PLAN DE CONTIGENCIA - PENDIENTES DE OBRA A LA FECHA.
- Se envía Oficio: Asunto: 25C02_DTO_435 INFORMACIÓN FALTANTE PARA LA EJECUCIÓN CORRECTA DE ACTIVIDADES EN OBRA DE LOS FRENTES DE TIBACUY Y NARIÑO. TECNICO, SST Y SOCIAL.

## 9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos. | Contratista | Inmediato |
| Control de calidad obra (Laboratorios, topografia) | Contratista | Inmediato |
| Iniciar con actividades según programación de obra | Contratista | Inmediato |
| | | |
| | | |

## 10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

## 11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

Se debe dar cumplimiento a la programación establecida para la ejecución de obra.
Se efectuó la instalación de material de préstamo para el afirmado del terreno.
Se dio inicio a las actividades de demolición de encoles y descoles, así como a la excavación para la instalación de tubería de polietileno HDPE (SN4 – 900 mm / 36”).
En el tramo 4 se intervino una (1) alcantarilla, y en el tramo 3 se realizó la intervención de una (1) alcantarilla.

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**




260525_FR_FG_compactacion_de_material_para_tuberia_K18+200




260525_FR_FG_lleno_con_material_para_tuberia_K18+200




260526_FR_FG_excavacion_para_instalacion_tuberia_36"_K17+828




20260526_excavacion_para_instalacion_tuberia_36"_K17+828




20260527_FR_FG_compactacion_de_material_para_tuberia_K17+720




20260527_compactacion_de_material_para_tuberia_K17+720

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Nombre: GUSTAVO ADOLFO CROSBY

# NARIÑO

| | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
|---|---|---|---|
| ICCU | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 22/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| ECG Engineering Consulting Group | ECG INGENIERIA SAS | FECHA | lunes, 25 de mayo de 2026 | SEMANA No. | 58 | DEL | 18-may-26 | AL | 24-may-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | **NARIÑO, CUNDIAMARCA** |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 218 de 2025 | **CONTRATO No.:** | 140 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | ECG INGENIERIA SAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICGER 2021 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2-abr-25 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio del 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 409 | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 409 |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.903.576.140 | **VALOR INICIAL ANAPOIMA :** | $ 1.279.573.734 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 1.279.573.734 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 1.279.573.734 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 780.715.228 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| **SUPERVISOR:** | ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA | **SUPERVISOR:** | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Para la presente semana del 18 de mayo al 24 de mayo del 2026 se realizaron las siguientes actividades de obra para la ejecución del contrato de obra en el Municipio de Nariño Cundinamarca.

- EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) para construcción de alcantarillas en los K02+463 y K06+470.
- CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) para construcción de alcantarillas en los K06+470
- CONCRETO CLASE F, 2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES para construcción de alcantarillas en los K06+470
- SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI para construcción de alcantarillas en los K06+470
- RELLENO PARA ESTRUCTURAS para construcción de alcantarillas en los K02+463 y K06+470
- TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE ( SN4 - 900 mm ) 36" para construcción de alcantarillas en los K02+463 y K06+470.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRITICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 10-mar-26 | 9-abr-26 | 30,00 | 4-may-26 | | ejecución | -55 | ejecución |
| 2 | CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) | 1-abr-26 | 21-abr-26 | 20,00 | 16-abr-26 | | ejecución | -15 | ejecución |
| 3 | CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO | 9-mar-26 | 30-mar-26 | 21,00 | 26-feb-26 | 27-feb-26 | 2 | 11 | 31 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |


**Plazo del proyecto:** 21 días

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 4,77% | 0,77% | -4,00% |
| Durante el periodo | 7,13% | 2,14% | -4,99% |
| Acumulado Actual | 11,90% | 2,91% | -8,99% |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**




**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 469 días | 423,00 | 46,00 | -42,16 |

### 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

**AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 61.031.090 | $ 9.894.088 | 16,21% |
| Durante el periodo | $ 91.272.370 | $ 27.389.425 | 30,01% |
| Acumulado Actual | $ 152.303.460 | $ 37.283.513 | 24,48% |

**GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO**





**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO**

| | |
|---|---|
| -$ | 115.019.947,05 |

| AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
| Acumulado anterior | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | $ 9.233.265.295 | $ 967.402.611 | 10% |

| AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO |
|---|
| $ 8.265.862.684 |

**GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO**




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se evidencia la ejecución de actividades constructivas relacionadas con la intervención de alcantarillas, se ha verificado por parte del componente hidráulico que las alcantarillas objeto de intervención no requieren permiso de ocupación de cauce, de acuerdo con las condiciones técnicas evaluadas para cada estructura.
Durante el desarrollo de estas labores, se realiza seguimiento a la generación y gestión de los RCD, estimándose que la mayor parte del material generado será aprovechada en las mismas estructuras intervenidas. En caso de contemplarse la donación de material, esta se llevará a cabo conforme al protocolo establecido y aplicado en los demás municipios.
Es importante resaltar que, para este frente de trabajo, el contratista deberá garantizar la disponibilidad de servicios sanitarios para el personal vinculado a las actividades ejecutadas.
A la fecha, las actividades desarrolladas en este frente se encuentran orientadas exclusivamente al manejo de acopios y gestión de residuos.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

Durante la semana reportada, no se evidenció la ejecución de actividades de campo o administrativas correspondientes al componente social por parte del contratista. En consecuencia, no se realizaron jornadas de socialización, acompañamiento comunitario, levantamiento de actas, atención a la comunidad ni demás actividades asociadas a la gestión social del proyecto durante el periodo evaluado.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 18 y el 24 de mayo de 2026, se ejecutaron actividades de construcción de alcantarillas, incluyendo excavación, instalación de tubería, armado de acero y fundida de concreto. Asimismo, durante este periodo se adelantaron actividades correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

La interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista. No obstante, se evidenciaron diversas falencias en el municipio de Nariño, principalmente relacionadas con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, la entrega de la documentación de ingreso del personal vinculado a la construcción de alcantarillas, la dotación de elementos de protección personal y el diligenciamiento de formatos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, un (1) auxiliar operativo y un (1) maestro de obra, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

En la presente semana del 18 de mayo al 24 de mayo del 2026 el contratista no cuenta con maquinaria en obra, se encuentra personal de obra, para el avance de las actividades de instalación de TUBERÍA DE POLIETILENO HDPE (SN4 - 900 mm) 36", también cuenta con herramienta menor y una mezcladora de concreto. Se le solicito al contratista verbalmente la modificación del presupuesto de obra con sus memorias de cálculo y el Project ajustado

### 8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

* ALCANTARILLAS
CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones) El contratista inicio con actividades en obra.
RELLENO PARA ESTRUCTURAS El contratista inicio con actividades en obra.
CUNETA EN GEOMEMBRANA DE POLIETILENO HDPE 0.75MM El contratista inicio con la instalación de la tubería en los tramos en obra.
* IÍTEMS NO PREVISTOS
LIMPIEZA A MANO DE CUNETAS EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM) e contratista no ha iniciado con la respectiva actividad

### 8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

"Se evidencia disponibilidad y aplicación de recursos económicos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que:
• Se evidencia personal de obra (Residente de Obra, 1 maestro y 1 ayudantes.
• Se evidencia una mezcladora de concreto y herramienta menor).
• Se evidencia insumos de materiales de obra (cemento, granulares, formaletas, acero de refuerzo)."

### 8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la ejecución de obra en el municipio de Tibacuy Cundinamarca se informa que de los ($5.193.248.079), Cinco mil ciento noventa y tres millones doscientos cuarenta y ocho mil setenta y nueve con ochocientos setenta y cinco pesos, presupuestados para la ejecución de obra, se ha ejecutado un valor acumulado de ($37.283.513 ) Treinta y siete millones doscientos ochenta y tres mil quinientos trece pesos con un porcentaje ejecutado de la semana (2.14%) del dos punto catorce por ciento.

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

El contratista no ha realizado ningún control de calidad para obtener la resistencia del concreto se le sugirió sacar muestras de concreto para la alcantarilla del tramo 1 K02+463 o realizar otro tipo de ensayo para saber la resistencia del concreto.

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

No se reportan para este periodo.

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

La interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista. donde evidencio problemáticas general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenciaron diversas falencias en el municipio de Nariño, principalmente relacionadas con la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, la entrega de la documentación de ingreso del personal vinculado a la construcción de alcantarillas, la dotación de elementos de protección personal y el diligenciamiento de formatos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencia

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

No se reportan para este periodo.

**9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| Ensayos de laboratorio de los tramos estabilizados con productos químicos. | Contratista | Inmediato |
| Control de calidad obra (Laboratorios, topografia) | Contratista | Inmediato |
| Iniciar con actividades según programación de obra | Contratista | Inmediato |
| | | |
| | | |

**10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

**11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

Se debe dar cumplimiento a la programación establecida para la ejecución de obra.
Se efectuó la instalación de material de préstamo para el afirmado del terreno.
Se dio inicio a las actividades de demolición de encoles y descoles, así como a la excavación para la instalación de tubería de polietileno HDPE (SN4 – 900 mm / 36").
En el tramo 4 se intervino una (1) alcantarilla, y en el tramo 3 se realizó la intervención de una (1) alcantarilla.

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**



260522_FR_FG_desencofrado_de_aletas_ MI_K06+520



26052_FR_FG_supervision_acabados_encole_ MD_K06+520



260522_FR_FG_desencofrado_de_aletas_ MI_K06+520



20260522_desencofrado_de_encole_ MD_K06+520

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**
Nombre: GUSTAVO ADOLFO CROSBY

| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU | FORMATO | CÓDIGO | MS-GP-FR-34 |
| | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA | FECHA | 8/02/2023 |

**PERIODO DE INFORME SEMANAL**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ecg Engineering Consulting Group | ECG INGENIERIA SAS | **FECHA** | lunes, 1 de junio de 2026 | **SEMANA No.** | **59** | DEL | **25-may-26** | AL | **31-may-26** |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |
| **LOCALIZACIÓN PROYECTO** | **NARIÑO, CUNDINAMARCA** |

| **CONTRATO DE INTERVENTORIA** | | **CONTRATO DE OBRA PUBLICA** | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 218 de 2025 | **CONTRATO No.:** | 140 de 2025 |
| **PLAZO INICIAL:** | Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025 | **PLAZO INICIAL:** | Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025 |
| **CONTRATISTA:** | ECG INGENIERIA SAS | **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VICGER 2021 |
| **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2-abr-25 | **FECHA DE INICIACIÓN:** | 2 de abril de 2025 |
| ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 | ***FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 29 de diciembre del 2025 |
| ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 | ***FECHA DE REINICIACIÓN:** | 13 de enero del 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio 2026 | **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 de julio del 2026 |
| **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 días | **PLAZO ACTUALIZADO:** | 469 |
| **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 409 | **PLAZO TRANSCURRIDO:** | 409 |
| **VALOR INICIAL :** | $ 3.903.576.140 | **VALOR INICIAL ANAPOIMA :** | $ 1.279.573.734 |
| **VALOR ADICION:** | $ - | **VALOR ADICION:** | $ - |
| **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR ACTUALIZADO:** | $ 1.279.573.734 |
| **VALOR PAGADO:** | $ - | **VALOR PAGADO:** | $ - |
| **VALOR POR PAGAR:** | $ 3.903.576.140 | **VALOR POR PAGAR:** | $ 1.279.573.734 |
| **VALOR ANTICIPO:** | $ 780.715.228 | **VALOR ANTICIPO:** | $ - |
| **SUPERVISOR:** | ARQ. LUZ ANGELA SANABRIA | **SUPERVISOR:** | INTERVENTORIA ECG |

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante la semana comprendida entre el 25 y el 30 de mayo de 2026 se realizó seguimiento técnico a las actividades constructivas ejecutadas en el municipio de Nariño, Cundinamarca, verificando el avance de las obras correspondientes a estructuras hidráulicas y actividades complementarias asociadas al proyecto. En desarrollo de las visitas de campo efectuadas durante el periodo reportado, se supervisaron actividades relacionadas con la construcción de alcantarillas, conformación de elementos estructurales, excavaciones, perfilación de terreno, vaciado de concreto y manejo de materiales, garantizando el seguimiento al cumplimiento de las especificaciones técnicas y procedimientos constructivos establecidos para la ejecución de las obras.

•**CONCRETOS CLASE D, f'c = 3000 psi (elevaciones),** Seguimiento al vaciado de concreto para la construcción de las aletas de descole de la alcantarilla K6+470, verificando la correcta ejecución y conformación de los elementos estructurales en concreto.
•**EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM),** Seguimiento a las actividades de excavación manual para la conformación de las estructuras de encole y descole de la alcantarilla ubicada en la abscisa K2+463, verificando las condiciones generales de ejecución de la actividad.
•Se efectuó el desencofrado de elementos estructurales previamente fundidos, realizando revisión visual de su estado, acabado y condiciones posteriores al retiro de formaletas. ALCANTARILLA (K6+470)
•Se realizó la perfilación y adecuación del terreno en los sectores donde se ejecutan elementos estructurales, con el fin de garantizar las condiciones necesarias para la continuidad de las actividades constructivas. ALCANTARILLA (K2+463)
•Se ejecutaron labores de trasiego y movimiento interno de material en los diferentes frentes de trabajo para apoyar el desarrollo de las actividades programadas.

## 3. CONTROL DE EJECUCIÓN

### 3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

| No. | Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica) | Programado | | | Real Ejecutado | | | Días desfase al inicio de la actividad | Días desfase al final de la actividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha Inicial programada por actividad | Fecha Final programada por actividad | Días | **Fecha Inicial por actividad | **Fecha Final por actividad | Días | | |
| 1 | TRANSPORTE DE MATERIALES PROV. DE EXLANACIÓN, CANALES, PRESTAMOS, SOBREACARREOS Y DERRUMBES | 10-mar-26 | 9-abr-26 | 30,00 | 4-may-26 | | ejecución | -55 | ejecución |
| 2 | CAPA ESTABILIZADA DE ACUERDO A FORMULA DE TRABAJO CON PRODUCTOS QUÍMICOS NO TRADICIONALES (INCLUYE EL SUMINISTRO DEL PRODUCTO ESTABILIZADOR) (Analizada para producto químico del TIPO 5 – aceites sulfonados - sales orgánicas y suelo in situ incluye cemento al 4%) | 1-abr-26 | 21-abr-26 | 20,00 | 16-abr-26 | | ejecución | -15 | ejecución |
| | CONFOMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE INCLUYE RETIRO DE MATERIAL ORGANICO | 9-mar-26 | 30-mar-26 | 21,00 | 26-feb-26 | 27-feb-26 | 2 | 11 | 31 |

**Plazo del proyecto:** **21**

### 3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


**AVANCE FISICO DEL CONTRATO**

| | % PROGRAMADO A LA FECHA | % EJECUTADO HASTA LA FECHA | DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 42,03% | 2,78% | -39,24% |
| Durante el periodo | 24,48% | 0,10% | -24,39% |
| Acumulado Actual | 66,51% | 2,88% | -63,63% |

**AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO**

| DURACIÓN (DÍAS) | DIAS TRANSCURRIDOS. | DIAS QUE FALTAN | DIFERENCIA EN DIAS |
|---|---|---|---|
| 23 días | | 23,00 | -14,63 |

**GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO**



## 3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


### AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | $ 537.747.812 | $ 35.625.587 | 6,62% |
| Durante el periodo | $ 313.281.772 | $ 1.222.635 | 0,39% |
| Acumulado Actual | $ 851.029.584 | $ 36.848.222 | 4,33% |

### AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

| | |
|---|---|
| -$ | 814.181.361,81 |

### GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO





### AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

| | ACUMULADO PROGRAMADO ( $ ) MILLONES | ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES | INDICADOR ( % ) |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | #¡REF! | #¡REF! | 0% |
| Durante el periodo | $ - | $ - | 0% |
| Acumulado Actual | #¡REF! | #¡REF! | 0% |

### AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

| |
|---|
| #¡REF! |

### GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO




## 4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

Se reporta el desarrollo de actividades constructivas asociadas a alcantarillado. En este frente de obra se realiza seguimiento a la generación y aprovechamiento de los RCD. Se proyecta que la mayor parte de los RCD generados sea aprovechada en las mismas estructuras de alcantarillado; en caso de requerirse su donación, esta se gestionará de conformidad con el protocolo implementado en los demás municipios.
Asimismo, es importante señalar que el contratista deberá garantizar la disponibilidad de servicios sanitarios para los colaboradores
A la fecha, las actividades desarrolladas en este frente se encuentran orientadas exclusivamente al manejo de acopios y gestión de residuos.

## 5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

• Se realizó la revisión detallada de los volantes informativos No. 48, 49, 50 y 51, verificando la correcta inclusión de la información relacionada con las actividades programadas, la claridad de los mensajes, la coherencia del contenido, el cumplimiento de los lineamientos de comunicación del proyecto y la adecuada identificación institucional. Como resultado de esta revisión, se emitieron observaciones y recomendaciones al contratista para la realización de los ajustes pertinentes antes de su aprobación y posterior divulgación a la comunidad.

• De igual manera, se efectuó la revisión técnica y metodológica de las presentaciones elaboradas para las jornadas de socialización del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y para las reuniones extraordinarias programadas en los municipios de Nariño y Jerusalén. Esta actividad incluyó la verificación de la información a socializar, la pertinencia de los contenidos, la incorporación de los impactos, medidas de manejo, rutas de atención y canales de comunicación con la comunidad, así como la formulación de observaciones y recomendaciones orientadas a garantizar una adecuada divulgación del proyecto y una efectiva participación de los diferentes actores involucrados.

## 6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

Durante la semana comprendida entre el 25 y el 30 de mayo de 2026 se realizó seguimiento técnico a las actividades constructivas ejecutadas en el municipio de Nariño, Cundinamarca, verificando el avance de las obras correspondientes a estructuras hidráulicas y actividades complementarias asociadas al proyecto. Asimismo, durante este periodo se adelantaron actividades correspondientes al componente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), La interventoría realizó seguimiento y verificación al cumplimiento de las medidas de prevención y control implementadas por el contratista, incluyendo la revisión del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), el control diario de asistencia del personal, la ejecución de charlas de seguridad de cinco minutos, la verificación de formatos preoperacionales de maquinaria y equipos, así como la elaboración e implementación del Análisis de Trabajo Seguro (ATS). De igual manera, se supervisó el uso adecuado de los Elementos de Protección Personal (EPP), con el propósito de garantizar condiciones seguras durante la ejecución de las actividades programadas en campo.

Para el desarrollo de las labores, el contratista dispuso del siguiente personal en obra: un (1) residente de obra, un (1) maestro de obra, dos (2) auxiliares operativo, quienes participaron en la ejecución de las actividades correspondientes al tramo intervenido durante la semana.

La maquinaria empleada para la ejecución de las actividades estuvo conformada por un (1) retrocargador, una (1) turbo, un (1) Trompo, un (1) carro tanque y una camioneta, equipos necesarios para garantizar el adecuado desarrollo de las labores de intervención, conformación y estabilización de la vía en el sector programado

## 7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

## 8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Durante el desarrollo de las actividades constructivas se ha identificado como principal situación problemática la limitada disponibilidad de agua en la zona de intervención, recurso indispensable para la adecuada ejecución de diferentes actividades de obra. Adicionalmente, se evidencia que el contratista no cuenta de manera permanente con un vehículo o equipo destinado al transporte y suministro de agua en el frente de trabajo, lo que dificulta la realización de trasiegos continuos y oportunos.

Esta situación puede generar afectaciones en actividades que requieren humedad y control permanente de las condiciones de los materiales, tales como procesos de compactación, conformación de capas granulares, preparación de concretos, curado de elementos estructurales y demás actividades asociadas a la ejecución de la obra, impactando potencialmente los rendimientos y la calidad de los trabajos ejecutados.

### 8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Con respecto a la programación establecida para el frente de obra del municipio de Nariño, se evidencia un desfase en la ejecución de las actividades programadas, teniendo en cuenta que a la fecha aún se encuentran en desarrollo actividades correspondientes a la instalación de tubería y construcción de alcantarillas, las cuales debieron ejecutarse en etapas anteriores del cronograma.

Lo anterior ha generado un atraso en el avance general del proyecto, impactando la ejecución de actividades posteriores que dependen de la culminación de las obras de drenaje. En consecuencia, se recomienda al contratista fortalecer la planeación, disponibilidad de recursos y frentes de trabajo, con el fin de recuperar los tiempos de ejecución y dar cumplimiento a la programación contractual establecida.

**8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL**

Durante la presente semana se evidenció una disponibilidad limitada de recursos para la ejecución de las actividades en el frente de obra del municipio de Nariño, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Se cuenta únicamente con dos (2) obreros para la ejecución de las actividades relacionadas con la construcción de alcantarillas y obras de drenaje.
No se evidenció la presencia permanente de maquinaria amarilla ni equipos de compactación en el frente de trabajo durante las actividades verificadas.
No se cuenta con vehículos destinados al transporte de materiales, agua u otros insumos requeridos para la ejecución de las actividades, situación que puede afectar los rendimientos y la continuidad de la obra.
Se observó disponibilidad parcial de materiales para la construcción de las alcantarillas; sin embargo, la limitada asignación de personal y equipos puede incidir en el cumplimiento de la programación establecida para el proyecto.

**8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO**

Para la ejecución de las actividades en el municipio de Nariño, Cundinamarca, se vienen desarrollando las labores correspondientes a la construcción de obras de drenaje, incluyendo la instalación de tubería para alcantarillas y la ejecución de estructuras de encole y descole, en cumplimiento del objeto contractual.

Para este municipio se cuenta con un presupuesto asignado por valor de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1.279.573.733,99), el cual será ejecutado y reconocido conforme al avance y desarrollo de las actividades programadas.

A la fecha, se ha ejecutado un valor de $9.852.717,75, lo que representa un avance del 0,77% del valor total del contrato para este frente de obra.

**8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS**

**8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)**

No se reportan para el periodo ejecutado.

**8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)**

Como problemática general en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), se evidenció que el contratista presenta falencias en la implementación del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), debido a que las señales de aproximación no se instalan de manera completa. Asimismo, se identificó la ausencia de formatos.

**8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)**

*Programa de capacitaciones implementado por el contratista.
*Programa de Inspecciones.
*Plan de Emergencia

**8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)**

No se reportan para el periodo ejecutado.

**9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA**

| ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA PROGRAMADA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES**

**11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR**

En el marco de las labores de seguimiento y control realizadas al frente de obra del municipio de Nariño, esta interventoría evidenció que la ejecución de las actividades presenta un avance inferior al programado, teniendo en cuenta que actualmente se desarrollan actividades correspondientes a la instalación de tubería y construcción de alcantarillas, las cuales debieron encontrarse en una etapa más avanzada conforme al cronograma contractual.

Durante las visitas efectuadas se observó una limitada disponibilidad de recursos en obra, evidenciada por la presencia de únicamente dos (2) obreros para la ejecución de las actividades, así como la ausencia permanente de maquinaria, equipos de compactación y vehículos de apoyo para el transporte de materiales y suministro de agua, situación que puede afectar los rendimientos y la calidad de los trabajos ejecutados.

De igual manera, se identificaron observaciones técnicas relacionadas con los procesos constructivos de algunas estructuras hidráulicas, especialmente en actividades asociadas a la conformación de fundaciones y elementos estructurales de alcantarillas, las cuales fueron comunicadas oportunamente al contratista para su respectiva atención y corrección.

Adicionalmente, se continúa evidenciando la necesidad de fortalecer la disponibilidad de recursos y la planificación de las actividades, con el fin de garantizar el cumplimiento de la programación establecida, la calidad de las obras ejecutadas y el adecuado desarrollo del proyecto.

Por lo anterior, se recomienda al contratista implementar las acciones correctivas necesarias que permitan optimizar los recursos disponibles, atender las observaciones técnicas formuladas por la interventoría y recuperar el avance requerido para el cumplimiento de las metas programadas.

**12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA**



EXCAVACION PARA ENCOLE DE ALCANTARILLA



PERFILACION PARA CAJA DE ENCOLE DE ALCANTARILLA



CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA DESCOLE ALCANTARILLA



CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA ENCOLE ALCANTARILLA



ALCANTARILLA EJECUTADA K6+470



ALCANTARILLA EJECUTADA K6+470

**DIRECTOR DE INTERVENTORIA**

Nombre: GUSTAVO CROSBY
