FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **1,01**


CAPITULO 1 UNIDAD DE MEDIDA M2

DESCRIPCIÓN DEL ITEM Demolición de piso existente

Este ítem se refiere la demolición y retiro del actual piso en las distintas zonas que se requieran retirar como consecuencia de los trabajos a realizar para efectos de que la apariencia del espacio mejore.

LOCALIZACION	AREA	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
POSETA		1,14		3,50	3,99
AREA CERCA A ASCENSORES		1,90		9,65	18,34
Nota: se paga en el acta 1 el 90% y se deja en el acta 2, queda el 10% restante					2,95
			TOTAL ACTA 2	M2	25,28
			TOTAL ESTA ACTA 2	90%	22,75

Observaciones: **El valor total en el acta 1 se dejo, al 90%, ya que aún faltaba por retirar del edificio una parte de escombro, por lo que, ya se retiro el escombro quedando el valor total al 10%, del acta 1 faltante. Se deja tambien al 90% dejando faltante el 10% pendiete por el escombro faltante por desalojar, quedando en la entidad, actividad ejecutada nueva en el acta 2, dejando el total el acta 1 + acta 2**











ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA: HYD SAS

INTERVENTORÍA: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **1,12**


CAPITULO 1 UNIDAD DE MEDIDA M2

DESCRIPCIÓN DEL ITEM: Demolición de cieloraso en láminas o listones de madera, perfiles y demás accesorios que lo constituyen

Este ítem se refiere al retiro del aglomerado existente en toda la superficie del techo, ubicado por encima del cielorraso previamente desmontado, con el fin de permitir la ejecución de las obras contempladas en el proyecto.

LOCALIZACION	AREA	DIMENSIONES			AREA/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
AREA 1		8,57		15,03	128,80
AREA 2		7,77		13,99	108,70
AREA 3		9,32		12,75	118,83
			TOTAL	**M2**	**356,33**
			TOTAL ACTA 1	**95%**	**338,51**
			TOTAL ESTA ACTA 2	**5%**	**17,82**

Observaciones: **El valor total desmontado se pago en el acta 1, al 95%, ya que aún faltaba por retirar del edificio una parte de cielo raso desmontado, por lo que, ya se retiro el escombro quedando el valor total al 5%, en el acta 2.**

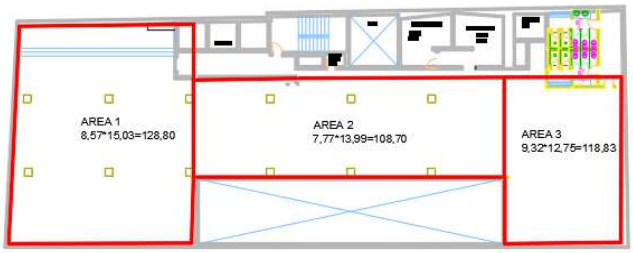





ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Carlos Hernández

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **1,17**

CAPITULO 1 UNIDAD DE MEDIDA M2

DESCRIPCIÓN DEL ITEM Demolición de mampostería

Este ítem se refiere a la demolición manual o mecánica de muros y elementos en mampostería existentes en las áreas de intervención, incluyendo el retiro y desalojo del material producto de la demolición hasta los sitios de acopio o botadero autorizados, garantizando la estabilidad de las estructuras adyacentes.

LOCALIZACION	AREA	DIMENSIONES			AREA/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
MURO POSETA, PISO 8		1,11	2,11		2,34
MURO CERCA AL ASCENSOR		1,16	2,04		2,37
			TOTAL	M2	**4,71**
			TOTAL ESTA ACTA 2	90%	**4,24**

Observaciones: **El valor total desmontado se está dejando al 90% para esta acta parcial, ya que aún falta por retirar del edificio una parte de escombro.**















ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **1,21**


CAPITULO 1 UNIDAD DE MEDIDA M2

DESCRIPCIÓN DEL ITEM Demolición de placa en concreto

Este ítem se refiere al retiro del aglomerado existente en toda la superficie del techo, ubicado por encima del cielorraso previamente desmontado, con el fin de permitir la ejecución de las obras contempladas en el proyecto.

LOCALIZACION	AREA	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
POSETA		0,5		0,85	0,43
Nota: se paga en el acta 1 el 95% y se deja en el acta 2, queda el 5% restante					0,23
			TOTAL ACTA 2, EJECUTADO	**M2**	**0,66**
			TOTAL ACTA 2 EJECUTADO	**90%**	**0,59**

Observaciones: **El valor total en el acta 1 se dejo, al 95%, ya que aún faltaba por retirar del edificio una parte de escombro, por lo que, ya se retiro el escombro quedando el valor total al 5%, del acta 1 faltante. Se deja tambien al 90%, dejando faltante el 10% pendiete por el escombro faltante por desalojar, quedando en la entidad, actividad ejecutada nueva en el acta 2, dejando el total el acta 1 + acta 2**







ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Carlos Hernández

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **1,54**


CAPITULO 1 UNIDAD DE MEDIDA ML

DESCRIPCIÓN DEL ITEM Desmonte de tubería en hierro, HF, galvanizada, pvc, y/o cobre, incluye retiro de sobrantes


Este ítem se refiere al desmonte y retiro de redes de tubería existentes en materiales como hierro, hierro fundido (HF), galvanizado, PVC o cobre, incluyendo el desacople de accesorios, soportes y elementos de fijación, así como el desalojo del material resultante hacia los sitios de acopio o disposición final autorizados.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
TUBERIA EN PVC ELECTRICO, EN PLACA SUPERIOR				42,70	42,70
			TOTAL	**ML**	**42,70**
			TOTAL ACTA 1	**90%**	**38,43**
			TOTAL ESTA ACTA 2	**10%**	**4,27**

Observaciones: **El valor total desmontado se pago en el acta 1, al 90%, ya que aún faltaba por retirar del edificio una parte de tubos electricos en pvc, por lo que, ya se retiro del edificio quedando el valor total al 10%, en el acta 2.**





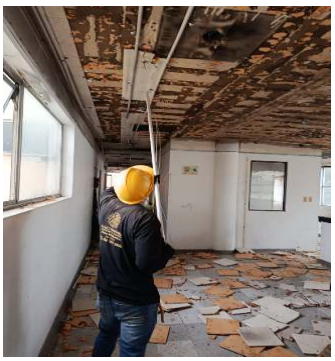

ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Carlos Hernández

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8


CONTRATO N°	FGN-RCE-0017-2026
OBJETO	"Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"


CONTRATISTA	HYD SAS		**ITEM**
INTERVENTORÍA	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S		**1,58**
CAPITULO	1	UNIDAD DE MEDIDA	M2
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Demolición de enchape de pared, incluye retiro de escombros de proyecto		


Este ítem se refiere a la demolición y retiro del enchape existente en muros, incluyendo el retiro, cargue y disposición de los escombros generados durante la actividad, en las áreas de intervención del proyecto.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
BAÑO HOMBRES			2,14	15,03	32,16
BAÑO MUJERES			2,14	12,07	25,83
CAFETERIA			2,14	4,49	9,61
VENTANA BAÑOS HOMBRES			-3,50	-0,10	-0,35
					0,00
			TOTAL	**M2**	**67,25**
			TOTAL ESTA ACTA 2	**10%**	**6,73**

Observaciones: **El valor total desmontado se pago en el acta 1, al 90%, ya que aún faltaba por retirar del edificio una parte de escombros, por lo que, ya se retiro del edificio quedando el valor total al 10%, en el acta 2.**



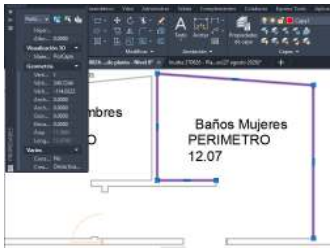









ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Carlos Hernández

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

CAPITULO 3 UNIDAD DE MEDIDA M2


ITEM **3,02**

DESCRIPCIÓN DEL ITEM Elaboración de muro en bloque No. 4

Este ítem se refiere al suministro y construccion de muro en mamposteria con bloque numero 4, de acuerdo con las dimenciones, ubicacion, y especificaciones indicados en los planos

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
MURO POSETA		0,44	2,44		1,07
HUECO POSETA		0,65	0,64		0,42
					0,00
			TOTAL	M2	1,49
			TOTAL ESTA ACTA 2	100%	1,49

Observaciones:

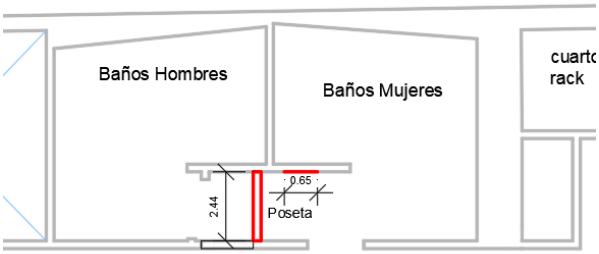





ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Carlos Hernández

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **4,01**


CAPITULO 4 UNIDAD DE MEDIDA ML

DESCRIPCIÓN DEL ITEM Pañete 1:4 , incluye filos y dilataciones lineales

Este ítem se refiere al suministro y aplicacion de pañete en mortero de cemento y arena en docificacion 1:4, sobre supuerficies en ML, previamente preparada, incluyendo humedecimiento de la superficie peparacion y colocacion del mortero, nivelacion, y plomeo hasta optener un acabado uniforme y apto para recibir acabados posteriores.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
MURO POSETA, 1 FILO				2,11	2,11
MURO POSETA, 2 FILO				1,11	1,11
MURO FRENTE ASCENSOR, 1 FILO				1,16	1,16
MURO FRENTE ASCENSOR, 2 FILO				2,04	2,04
MURO FRENTE ASCENSOR, 3 FILO				2,04	2,04
					0,00
			TOTAL	**ML**	**8,46**
			TOTAL ESTA ACTA 2	**100%**	**8,46**

Observaciones:













ELABORÓ

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

CAPITULO 4 UNIDAD DE MEDIDA M2


ITEM **4,02**


DESCRIPCIÓN DEL ITEM Pañete 1:4 , incluye filos y dilataciones lineales


Este ítem se refiere al suministro y aplicacion de pañete en mortero de cemento y arena en docificacion 1:4, sobre supuerficies en ML, previamente preparada, incluyendo humedecimiento de la superficie peparacion y colocacion del mortero, nivelacion, y plomeo hasta optener un acabado uniforme y apto para recibir acabados posteriores.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
BAÑO HOMBRES		15,03	2,10		31,56
BAÑO MUJERES		12,07	2,00		24,14
CAFETERIA		4,49	2,04		9,16
VENTANA BAÑOS HOMBRES		-3,50	-0,10		0,35
MURO POSETA	2,00	0,44	2,04		1,80
HUECO POSETA		0,65	0,64		0,42
VENTANA POSETA		-0,86	-0,56		0,48
					0,00
			TOTAL	**M2**	**67,91**
			TOTAL ESTA ACTA 2	**90%**	**61,12**

Observaciones: **El valor total se deja en, al 90%, ya que aún falta por pañetar una parte de los baños de hombres, baños mujeres y cafeteria.**















ELABORÓ

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **5,07**

CAPITULO 5 UNIDAD DE MEDIDA M2


DESCRIPCIÓN DEL ITEM Cerámica muro de 30 x 60 cm, rectificado

Este ítem se refiere al suministro e instalacion, necesarios para la correcta instalación y fraguado de revestimiento cerámico de formato 30 x 60 cm con bordes rectificados sobre muros interiores o exteriores (según diseño arquitectónico). El precio unitario de este ítem incluye la preparación de la superficie, la aplicación del pegante idóneo, la colocación precisa de las piezas cerámicas garantizando la alineación, el nivel y el correcto tratamiento de juntas (boquilla), dejando la superficie completamente limpia y terminada a satisfacción.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
BAÑO MUJERES			2,02	12,07	24,38
BAÑO HOMBRES			2,02	15,03	30,36
VENTANA BAÑOS HOMBRES			-3,50	-0,10	-0,35
					0,00
			TOTAL	**M2**	**54,39**
			TOTAL ESTA ACTA 2	**20%**	**10,88**

Observaciones: **El valor total se deja en, al 20%, ya que aún falta por enchapar de los baños de hombres y baños de mujeres .**



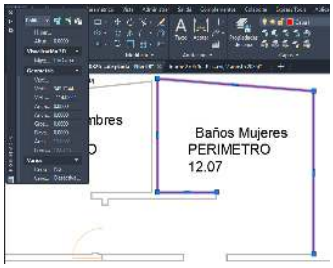





ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Carlos Hernández

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **7,08**


CAPITULO 7 UNIDAD DE MEDIDA M2

DESCRIPCIÓN DEL ITEM Suministro e instalación de cielo raso en dry-wall o PVC plano

Este ítem se refiere al suministro e instalacion, de cielo raso plano, en sistema drywall, o pvc, segun las especificaciones tecnicas del proyecto, incluye suministro de materiales, estructura de materiales, estructura de soportes devidamente nivelado y fijado, perfiles metalicos galvanizados, para sistema de drywall, o estructura de soporte, instalacion de placas de yeso, tornilleria, elementos de fijacion, accesorios, cortes, ajustes, remates perimetrales, y demas elementos nesesarios, para garantizar una superficie uniforme, estable nivelada y con acabado final adecuado.

LOCALIZACION	M2	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
AREA TOTAL	590,85				590,85
			TOTAL	M2	**590,85**
			TOTAL ESTA ACTA 2	**25%**	**147,71**

Observaciones: El valor total se deja en, al 25%, ya que aún falta por la instalacion,











ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Carlos Hernández.

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **7,12**


CAPITULO 7 UNIDAD DE MEDIDA M2

DESCRIPCIÓN DEL ITEM Suministro e instalacion de muro en dry wall doble cara de 0,12 (insonorizado con frescasa), incluye cinta papel, masilla y dos manos de pintura en vinilo Tipo 1, filos, dilataciones, e instalación de tapas contra las ventanas, o filos.

acabado arquitectónico de un muro divisorio interior en sistema liviano (drywall) con un espesor final de 0,12 metros. El sistema debe garantizar un óptimo aislamiento acústico mediante la inclusión de colchoneta de fibra de vidrio interna. El precio unitario de este ítem incluye de forma integral el tratamiento de juntas, la instalación de perfiles esquinero para filos, perfiles de dilatación, y la conformación de tapas de cierre, entregando el muro completamente terminado con pintura de primera calidad.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
AUDITORIO			2,42	6,05	14,64
					0,00
			TOTAL	M2	**14,64**
			TOTAL ESTA ACTA 2	25%	**3,66**

Observaciones: **El valor total se deja en, al 25%, ya que aún falta por la terminacion total de los muros,**

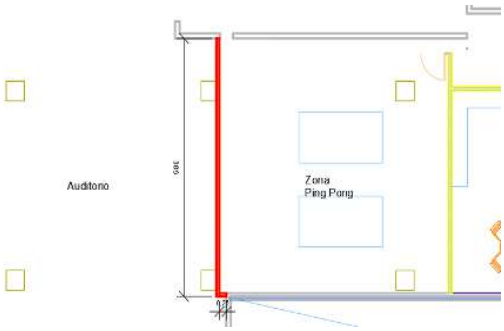



ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Carlos Hernández

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8


CONTRATO N°	FGN-RCE-0017-2026
OBJETO	"Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA	HYD SAS			**ITEM**
INTERVENTORÍA	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			**7,31**
CAPITULO	7	UNIDAD DE MEDIDA	M2	
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Suministro e instalacion de muro en drywall doble cara de 0.12 incluye instalacion de estructura metalica galvanizada cal. 26, cinta papel, masilla y dos manos de pintura en vinilo Tipo 1, filos, dilataciones, e instalación de tapas contra las ventanas, o filos.			

Este ítem se refiere al suministro e instalacion, necesarios para la correcta construcción, armado estructural y acabado arquitectónico de un muro divisorio interior en sistema liviano (drywall) con un espesor final de 0,12 metros. El precio unitario de este ítem incluye de manera integral la instalación de la estructura metálica galvanizada, el emplacado por ambas caras, el tratamiento de juntas con cinta de papel y masilla, la instalación de perfiles para filos y dilataciones, la conformación de tapas de cierre contra ventanas, y el acabado final de pintura en vinilo Tipo 1.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
CAFETERIA			2,42	17,80	43,08
ENFERMERIA			2,42	15,82	38,28
					0,00
			TOTAL	M2	81,36
			TOTAL ESTA ACTA 2	25%	20,34

Observaciones: **El valor total se deja en, al 25%, ya que aún falta por la terminacion total de los muros,**

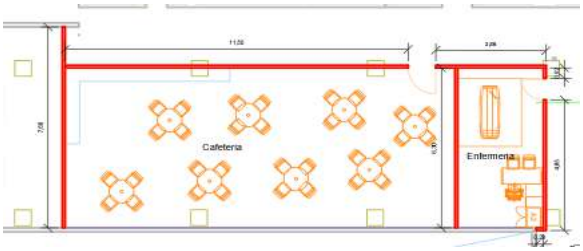









ELABORÓ	REVISÓ
Paola Andrea Ostos P.	Carlos Hernandez
Arq. Paola Andrea Ostos	**Arq. Carlos Hernández Leal**
Residente de Obra	Director de Obra
	Adriana Burgos G.
	Ing. Adriana Burgos
	Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **9,05**

CAPITULO 9 UNIDAD DE MEDIDA ML


DESCRIPCIÓN DEL ITEM Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 4"

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC de 4 pulgadas, incluyendo el transporte, los cortes, la limpieza, la aplicación de soldadura líquida, accesorios de unión, los soportes de fijación y las pruebas de estanqueidad necesarias para garantizar el correcto funcionamiento y la pendiente adecuada de la red de evacuación de aguas residuales.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
PLACA SUPERIOR				36,50	36,50
PLACA SUPERIOR CUBIERTA SIN TANQUE				9,38	9,38
PLACA SUPERIOR CUBIERTA CON TANQUE				1,64	1,64
			TOTAL	ML	47,52
			TOTAL ESTA ACTA 2	100%	47,52

Observaciones:

























REVISÓ

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N°	FGN-RCE-0017-2026
OBJETO	"Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA: HYD SAS

INTERVENTORÍA: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **9,09**

CAPITULO 9 UNIDAD DE MEDIDA UND

DESCRIPCIÓN DEL ITEM: Suministro e instalación de yee sanitaria pvc 4"

Este ítem se refiere al suministro e instalación de un accesorio yee sanitaria en PVC de 4 pulgadas, incluyendo el transporte, los cortes necesarios en la tubería, la limpieza, la aplicación de soldadura líquida y las uniones requeridas para garantizar la hermeticidad, el correcto empalme y la dirección adecuada del flujo en la red de evacuación de aguas residuales.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
PLACA SUPERIOR	13,00				13,00
			TOTAL	UND	13,00
			TOTAL ESTA ACTA 2	100%	13,00

Observaciones:











ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **9,31**


CAPITULO 9 UNIDAD DE MEDIDA UND

DESCRIPCIÓN DEL ITEM Registro de 1"

Este ítem se refiere al suministro e instalación de registro de 1" para red sanitaria, incluyendo registro metalico, accesorios de coneccion, adaptadores, man de obra herramientas y demas necesarios para su correcta instalacion.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
BAÑOS HOMBRES	3,00				3,00
BAÑOS MUJERES	2,00				2,00
POSETA	1,00				1,00
			TOTAL	**UND**	**6,00**
			TOTAL ESTA ACTA 2	**100%**	**6,00**

Observaciones:







ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Carlos Hernández

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **9,39**


CAPITULO 9 UNIDAD DE MEDIDA UND

DESCRIPCIÓN DEL ITEM Registro hidráulico de 1/2", incluye tapa

Este ítem se refiere al suministro e instalación de registro de 1/2" para red sanitaria, incluyendo registro metalico, accesorios de coneccion, adaptadores, man de obra herramientas y demas necesarios para su correcta instalacion.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
CAFETERIA	1,00				1,00
			TOTAL	UND	1,00
			TOTAL ESTA ACTA 2	100%	1,00

Observaciones:





ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Carlos Hernández

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N°	FGN-RCE-0017-2026
OBJETO	"Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA	HYD SAS		**ITEM**
INTERVENTORÍA	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S		**9,42**
CAPITULO	9	UNIDAD DE MEDIDA	UND
DESCRIPCIÓN DEL ITEM	Punto sanitario de desague de 2" hasta 3ml, incluye accesorios		

Este ítem se refiere al suministro e instalación de un punto sanitario de desagüe en tubería PVC de 2 pulgadas hasta una longitud máxima de 3 metros lineales, incluyendo los accesorios necesarios (codos, yees o ramales), soportes de fijación, la aplicación de soldadura líquida, las pendientes reglamentarias y las pruebas de estanqueidad para garantizar la correcta evacuación de aguas residuales sin filtraciones.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
POSETA	1,00				1,00
			TOTAL	UND	1,00
			TOTAL ESTA ACTA	100%	1,00

Observaciones:







ELABORÓ	REVISÓ
Arq. Paola Andrea Ostos	**Arq. Carlos Hernández Leal**
Residente de Obra	Director de Obra
	Adriana Burgos G.
	Ing. Adriana Burgos
	Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA HYD SAS

INTERVENTORÍA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **10,38**

CAPITULO 10 UNIDAD DE MEDIDA UND

DESCRIPCIÓN DEL ITEM: Suministro e instalación de salida para iluminación. Incluye tomacorriente doble Normal, caja metálica galvanizada, cableado 3x12 AWG libre de Halogenos, en tubería EMT de 1/2, en promedio la salida es de 3 ml, conectores de resorte, elementos de fijación y marquillas naranja en tuberia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

Este ítem se refiere al suministro e instalacion de salida electrica para iluminacion de acuerdo con los planos y especificaciones electricas del prpoyecto incluye caja electrica tuberia, conductores electricos EMT, conectores y accesorios de fijacion nesesarias para la coneccion de la luminaria incluye mano de obra, herramenta menor, y todos los elementos requeridos para su correcta instalacion y puesta de servicio.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
TOTALIDAD DEL PISO, SEGÚN DISEÑO ELÉCTRICO	70,00				70,00
Nota: Se pago en el acta 1 el 50% de la actividad					
			TOTAL	UND	70,00
			TOTAL ESTA ACTA 2	45%	31,50

Observaciones: Esta actividad se paga al 45% hasta que se termine completamente.







ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Carlos Hernández

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría

FORMATO MEMORIA DE CALCULO CANTIDADES DE OBRA
FISCALIA SEDE INURBE - PISO 8

CONTRATO N° FGN-RCE-0017-2026

OBJETO "Contratar la adecuación, reparación y mantenimiento de las sedes adscritas a esta subdirección ubicadas en la ciudad de Bogotá y municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama - Boyacá, y municipios de Girardot y Soacha - Cundinamarca con precios unitarios fijos"

CONTRATISTA: HYD SAS

INTERVENTORÍA: GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

ITEM **10,41**

CAPITULO 10 UNIDAD DE MEDIDA UND

DESCRIPCIÓN DEL ITEM: Suministro e instalación de salida para interruptor sencillo. Incluye interruptor sencillo , incluye caja metálica galvanizada, cableado 3x12 AWG libre de halogenos, en tubería EMT de 1/2",en promedio la salida es de 3 ml, resanes, conectores Y todos los elementos para su correcto

Este ítem se refiere al suministro e instalacion de salida electrica para interruptor sencillo, de acuerdo con los planos y especificaciones electricas del proyecto, incluye caja electrica, tuberia y conductores electricos del calibre EMT, conectores y accesorios de fijacion, incluye mano de obra, herramienta menor, y todos los elementos para su correcta instalacion y puesta en servicio.

LOCALIZACION	CANTIDAD	DIMENSIONES			CANT/MEDIDA TOTAL
		ANCHO	ALTO	LONGITUD	
AUDITORIO	2,00				2,00
SALA DE PIN PONG	1,00				1,00
CAFETERIA	1,00				1,00
ENFERMERIA	1,00				1,00
FUERA ENFRENTE ENFERMERIA	1,00				1,00
CAFETERIA	1,00				1,00
POSETA	1,00				1,00
CUARTO DE RACK	1,00				1,00
			TOTAL	**UND**	**9,00**
			TOTAL ESTA ACTA 2	**95%**	**8,55**

Observaciones: Esta actividad se paga al 95% hasta que se termine completamente.









ELABORÓ

Paola Andrea Ostos P.

Arq. Paola Andrea Ostos
Residente de Obra

REVISÓ

Carlos Hernández

Arq. Carlos Hernández Leal
Director de Obra

Adriana Burgos G.

Ing. Adriana Burgos
Residente de Interventoría
