INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA (ICCU)



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 220 DE 2025

CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA No. 139 DE 2025

INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL No. 05

01 AL 31 AGOSTO 2025

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050
N.I.T. 901.915.452-1

INGENIERÍA

BOGOTÁ D.C. 12 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL

El informe mensual inicia con el siguiente Indice o Contenido que hace las veces de Lista de Chequeo y corresponde a la página uno (1) del informe:

Contrato de Obra No.	**139**	**Contratista:**	**CONSORCIO YVY**
Contrato de Interventoría No.	**220**	**Interventoría:**	**CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050**

Objeto Contrato de Obra: INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

INFORME MENSUAL No.	**5**	**MES O PERIODO:**	AGOSTO 2025

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Índice Informe Mensual de Interventoría		
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto		
1	Introducción		
2	Descripción del proyecto		
2.1	Localización	MS-GP-FR-010 ACTA_DE_LOCALIZACION	
2.2	Conectividad, área de influencia y beneficios		
2.3	Estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	Información Contrato de Obra		
3.1	Información general contrato de obra		
3.2	Actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Gestión Ambiental		
3.4	Gestión Social		

3.5	Salud y Seguridad para el trabajo SST		
3.6	Gestión Predial		
3.7	Gestión Sostenibilidad		
3.8	Sectorización del proyecto y modificaciones		
3.9	Socialización del proyecto		
3.10	Seguimiento a Ítems no previstos		
4	Reportes ejecución mensual contrato de obra		
4.1	Informes semanal	MS-GP-FR-034 INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	
4.2	Maquinaria y equipo contrato de obra		
4.3	Personal, control Aporte Legales y seguridad social contrato de obra	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	
4.4	Control de aportes legales y seguridad social		
4.5	Informe financiero y presupuestal contrato de obra		
4.6	Estado General del tiempo		
4.7	Aclaración y Evidencias para la protección del instituto		
4.8	Resumen Ensayos de Laboratorio		
4.9	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	
4.10	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra		
4.11	Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)		
4.12	Otros documentos seguimiento mensual		
4.12.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		
4.12.2	Seguimiento Programa de Inversión		
4.12.3	Seguimiento Programa de Obra		
4.13	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría		

5	Información contrato de interventoría		
5.1	Información general del contrato de interventoría		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas		
5.4	Informe a la inversión del anticipo interventoría		
5.5	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.6	Información de otros programas de Obra e Interventoría		
6	Reportes ejecución mensual contrato de interventoría		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría		
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-013 HERRAMIENTA BASE REVISION CALCULO DE SEGUIRDAD SOCIAL	
6.3	Informe financiero y Presupuestal		
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MS-GC-FR-06_ACTA_APROBACION_DE_POLIZAS	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría		
6.5.1	Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría		
6.6	Otros Documentos seguimiento mensual		
6.6.1	Seguimiento a la inversión del Anticipo		
6.6.2	Seguimiento Programa de Inversión		
6.6.3	Actas de Comité de Obra	ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION	
7	Conclusiones y recomendaciones		
7.1	Correspondencia		
7.2	Registro fotográfico de las actividades de obras		




7.3	Registro fotográfico de las actividades sociales		
7.4	Bitácora del mes correspondiente		
7.5	Acta de costos de interventoría	MS-GP-FR-033 FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	




Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:
Nombre: Ing. Edgar Mauricio Beltrán Cárdenas
DIRECTOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Tarjeta Profesional: 25502-44755 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Expediente Contractual ICCU.
Copias: Interventor, Dirección de Caminos / Supervisor/ Gestor del Proyecto / Apoyo a la supervisión

Elaboró:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
COMPONENTE SOCIAL		
 Paola Hernández Profesional Social Provincia de Ubaté		
 Diana Chavarrio Profesional Social Provincia de Almeidas		
 Tania Escobar Profesional Social Provincia de Rionegro		
COMPONENTE AMBIENTAL		
 Carlos Arturo Chaparro Sánchez Profesional Ambiental		
COMPONENTE SST		
 **Yessica Paola Mora Torres** Profesional SST		
COMPONENTE PAVIMENTOS		

 Alvaro Neira Especialista en Pavimentos		
 Adriana Mediorreal Especialista en Pavimentos		
COMPONENTE GEOTECNIA		
 Giovanny Alejandro Borráez Especialista en Geotecnia		
 Diego Fernando Camcho Suarez Especialista en Geotecnia		
Residente de interventoría		
 Carolina Peña Residente 1 Interventoria		

 Edwin Vargas Residente 1 Interventoria		

1 Introducción

El presente informe tiene como objetivo Informar las actividades realizadas durante el presente mes en el marco del proyecto correspondiente al contrato de **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS DEL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, "CAMINOS PARA QUEDARSE", EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍO NEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**. Este proyecto, que cuenta con el contrato número 139 de 2025 suscrito con el consorcio YVY, y la interventoría asignada bajo el contrato número 220 de 2025, dio inicio con la firma del acta de inicio del proyecto el pasado 1 de abril de 2025. Además, se evaluaron diversas alternativas para la intervención de las vías en las mencionadas provincias, con el fin de definir las mejores estrategias para su intervención, garantizando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato.

2 Descripción del proyecto

2.1 Localización

Este proyecto se llevará a cabo en corredores viales distribuidos a lo largo del departamento de Cundinamarca, que para el caso del Lote 2, comprende las siguientes vías:

Tabla 1. Localización de obra

LOTE	PROVINCIA	MUNICIPIO	PROYECTO	KM
2	ALMEIDAS	CHOCONTA	CHOCONTA - HATO FIERO - LENGUAZAQUE	8.64
2	ALMEIDAS	SESQUILE	VIA SESQUILE GUATAVIA - EL HATO - RANCHERIA - EL UVAL - EL HATO	17.44
2	ALMEIDAS	MANTA	MANTA (LAS PUERTAS) - SAN JERÓNIMO - Y DE CUBIA - CAPADOCIA - SALGADO - MINAS - GUAYATA	8.98
2	RIO NEGRO	LA PALMA	LA PALMA - ÚTICA (LA CAÑADA - ZUMBE)	20.5
2	RIO NEGRO	VILLAGOMEZ	VARIANTE BUENAVISTA: CRUCE ESCUELA VIEJA - PUENTE TABLA (LÍMITE CON PACHO)	2.51
2	RIO NEGRO	TOPAIPI	PUENTE IBAMA - SURAZ - SAN ANTONIO	23.2

2	RIO NEGRO	YACOPI	GALÁPAGOS - THERAN - LLANO MATEO - YACOPI - NARANJAL	20.15
2	UBATÉ	SIMIJACA	VÍA NACIONAL - VEREDA EL PANTANO	5.72
2	UBATÉ	SUSA	VÍA SUSA – CARMEN DE CAUPA – LAS VUELTAS (*)	6.71
2	UBATÉ	TAUSA	FLORIDA - PALOGRUESO - SANABRIA - PIEDRA MOLINO	6.71
2	UBATÉ	UBATÉ	LAS FAVORITAS - SANTA HELENITA - ALTA MIRA Y TAUSAVITA	7.8

(*) Vía con cambio por solicitud de la Alcaldía y aprobación del ICCU.

Ver Anexo 1. FORMATO MS-GP-FR-010 ACTA DE LOCALIZACIÓN

2.1 Conectividad, área de influencia y beneficios

Las vías que conectan los municipios de Cundinamarca son esenciales para garantizar la movilidad, el desarrollo económico y social de la región. Estas rutas no solo facilitan la comunicación entre áreas ricas en recursos naturales y claves para la producción agrícola y forestal, sino que también integran las zonas rurales a los mercados regionales. La mejora de la infraestructura vial impulsa el crecimiento de los municipios, fortalece la interconexión regional, facilita el acceso a servicios y promueve el desarrollo turístico.

La ejecución de estos proyectos trae consigo múltiples beneficios: fomenta el desarrollo económico, mejora la accesibilidad, potencia el turismo, incrementa la seguridad vial, genera empleo y consolida la conectividad nacional. Además, no solo son vitales para el crecimiento económico de Cundinamarca, sino también para la integración social y la sostenibilidad de la región. Una conectividad eficiente permitirá el flujo adecuado de bienes, servicios y personas, fortaleciendo el tejido social y económico de los municipios involucrados.

2.2 Estado inicial de la vía

Las principales vías de las provincias de Río Negro, Ubaté y Almeidas, que conectan varios municipios de Cundinamarca, presentan un estado de infraestructura deficiente. Las rutas se caracterizan por afirmado deteriorado, infraestructura precaria y un drenaje vial insuficiente en muchas áreas. A pesar de algunas intervenciones previas, es evidente la necesidad de una mejora sustancial para asegurar una conectividad vial adecuada y segura en la región.

-Provincia de Rionegro (Vías Municipios de La Palma, Villagómez, Topaipí y Yacopí)

Las vías en la provincia de Rionegro, para nuestro caso los municipios de La Palma, Villagómez, Topaipí y Yacopí, se encuentran en condiciones de deterioro. La mayor parte de la carretera está conformada por un afirmado en malas condiciones, con una infraestructura precaria que dificulta el tránsito seguro y fluido. Si bien en algunos tramos se observan placas huellas, las cuales están ubicadas en el archivo KMZ. Anexo N° 13, delimitando las zonas que no serán intervenidas, con el objetivo de priorizar otros tramos de mayor deterioro.

-**Provincia de Ubaté (Vías Municipios de Simijaca, Susa, Tausa y Ubate)** Al igual que en la provincia de Rionegro, las vías en los Municipios de Ubaté, Simijaca, Susa y Tausa presentan un estado similar. La mayoría de los tramos cuentan con afirmado en malas condiciones y una infraestructura vial deficiente. En algunos sectores, el drenaje vial es insuficiente, lo que contribuye al deterioro acelerado de la vía estos sectores se están caracterizando en el inventario. Los cuales se pretenden finalizar para el mes de junio según el cronograma del contratista.

-**Provincia de Almeidas (Vías Municipios de Chocontá, Sesquilé y Manta)** Las vías de la provincia de Almeidas, específicamente en los municipios de Chocontá, Sesquilé y Manta, presentan condiciones similares a las de otras provincias. En algunos tramos se observan canales de drenaje, mientras que en otros el drenaje vial es insuficiente. La infraestructura es precaria, con secciones de afirmado en mal estado y una necesidad urgente de intervención. Aunque ocasionalmente se evidencian trabajos de mantenimiento realizados por los municipios, la carretera requiere de mejoras significativas para garantizar una circulación segura y fluida.

Fotografía 1. Provincia de Ubaté







Ubaté, Coordenadas 5.296600N – 73.801300W
Susa, Coordenadas 5.451500N – 73.846500W
Tausa, Coordenadas 5.162200N – 73.907800W

Fotografía 2. Provincia de Rionegro





La Palma, 5.276023N – 74.439862W
Topaipí, 5.182300N – 74.135700W
Villagomez, 5.131400N – 74.112700W

Fotografía 3. Provincia de Almeidas



Manta, Coordenadas 4.986300N – 73.528700W

2.3 Características técnicas del proyecto

Las vías a intervenir corresponden a caminos vecinales cuya conservación está a cargo de cada uno de los municipios. Estas vías conectan los cascos urbanos con otros centros poblados o veredas, siendo de vital importancia para el desarrollo regional.

Se trata de vías veredales con un ancho promedio de entre 5 y 6 metros, construidas en material afirmado, con cunetas en tierra y obras de drenaje como alcantarillas.

Algunas de estas vías ya han sido intervenidas previamente mediante la construcción de placas huella en sectores críticos, así como la implementación de obras de drenaje y contención. Su mantenimiento continúa siendo responsabilidad de cada alcaldía municipal.

2.4 Parámetros técnicos, Geométricos, sección típica, estructura de pavimento, descripción de suelos.

Durante el mes de agosto de 2025, el componente de pavimentos continuó con el acompañamiento técnico al contratista en el desarrollo de las actividades de caracterización geotécnica, insumo fundamental para la formulación de los diseños de estabilización de los corredores viales priorizados en las provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro. Sin embargo, pese a que la etapa de caracterización debió concluir el 30 de junio de 2025, conforme al plazo contractual, a la fecha no se han finalizado las actividades correspondientes a la Fase I y Fase II, particularmente la presentación de la fórmula de trabajo y de los diseños de estabilización definitivos.

Si bien se han evidenciado algunos avances, estos han sido objeto de observaciones por parte de la interventoría en el marco de mesas de trabajo y comités de obra, documentados en las Actas N° 36, 37, 38, 39, 40 y 41, las cuales se anexan en el **Anexo N° 11. Actas de Reunión**. Esta situación constituye un retraso crítico y configura un presunto incumplimiento a las obligaciones contractuales. En consecuencia, actualmente se adelanta un proceso administrativo sancionatorio en contra del contratista, gestionado por la entidad con el acompañamiento de la interventoría.

De otra parte, se verificó que los avances en campo han sido parciales y de alcance limitado. El contratista ha remitido información preliminar de los resultados obtenidos en los apiques ejecutados en municipios como Susa, Manta, Ubaté, Chocontá, Tausa y Topaipí (Lote 2); no obstante, persisten inconsistencias técnicas que dificultan la consolidación de la fórmula de trabajo y los diseños de estabilización. Entre las principales deficiencias identificadas se encuentran:

- Profundidades de apiques insuficientes la mayoría de los sondeos efectuados alcanzan únicamente entre 20 y 35 cm, valores significativamente inferiores al rango establecido en el Anexo Técnico (0,80 m a 1,50 m). Esta limitación impide obtener una caracterización representativa del perfil del suelo y evaluar de manera confiable su capacidad portante. Como medida correctiva, el contratista dispuso de su equipo de laboratorio en campo para ejecutar perforaciones adicionales que permitan complementar la exploración inicial, la cual resultó insuficiente para sustentar el diseño de la rasante.
- Pese a las observaciones realizadas el mes anterior, persiste la entrega fragmentada de documentación, sin integración técnica ni estructura clara. A la fecha, el contratista no ha presentado un informe consolidado de caracterización geotécnica que incluya la ecuación para estimar el CBR a partir del PDC, el análisis del potencial de expansión (ensayo Lambe), ni parámetros esenciales como

contenido de materia orgánica, límites de Atterberg y densidad in situ. Esta reiteración evidencia la ausencia de avances sustanciales en la superación de las deficiencias señaladas.

Ver Anexo 4. Pavimentos.

3 Información Contrato de Obra

3.1 Información general contrato de obra

El contrato de obra No. **ICCU-139 de 2025**, identificado en el SECOP con el ID **CO1.PCCNTR.7191450** y proceso de selección **(No. ICCU-LP-031 DE 2024).**, fue suscrito para la **intervención de vías del programa Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse (ICCU)**, en las provincias de **Ubaté, Almeidas y Rionegro**, en el departamento de **Cundinamarca**. Su **fecha de inicio** fue el **1 de abril de 2025**, con un **plazo inicial de 274 días**, hasta el **31 de diciembre de 2025**.

El **valor inicial del contrato** es de **$34.436.321.680**, sin adiciones presupuestales a la fecha. Actualmente el ICCU realizó el desembolso del anticipo, por un valor de **$10.330.896.504,** el cual al cierre del presente informe el contratista ha remitido usos de anticipo los cuales se encuentran en revisión por esta interventoría.

El contratista es el Consorcio YVY, integrado por las siguientes empresas:

- Vigavi Zomac S.A.S. – NIT 901.677.384-7 (70%)
- Jaime Amadeo Sánchez Giraldo – CC 72.125.268 (10%)
- Grupo Grava S.A.S. – NIT 900782855-1 (10%)
- Obras Interventoría y Suministros S.A.S.- NIT 900.974.081-0 (10%)

Domicilio: Riohacha, La Guajira

Contrato de Interventoría No. ICCU-220 de 2025

El contrato de interventoría No. **ICCU-220 de 2025**, identificado en el SECOP con el ID **CO1.PCCNTR.7439044**, Y Razón Social del Consorcio:

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050–NIT (901.915.452-1)

Representante Legal del Consorcio: Claudia Liliana Ramírez Gaitán. Dirección: Calle 98 # 21 – 50, Piso 3, Bogotá D.C., Colombia.

- **Fecha de inicio:** 1 de abril de 2025
- **Plazo:** 274 días (hasta el 31 de diciembre de 2025)
- **Valor inicial.:** $3.865.474.025

- **Anticipo:** $773.094.805 (En trámite)
- **Valor pagado: $0** (Pendiente aprobación acta 1 y 2)
- **Valor por pagar:** $3.865.474.025

Integrantes del Consorcio:

TPF Getinsa Euroestudios Colombia S.A.S. NIT 900797235-9 – (90%)

Composición Accionaria:

- 98.19% – TPF S.A. (NIT: 435170803)
- 0.75% – Gregorio López Vallejo (C.C. 13121078-S)
- 0.76% – Jonathan Morgan (ID: Y3822504-X)
- 0.07% – Ahmed El Khadri (ID: 5424268-V)
- 0.23% – José Manuel Ballesteros (C.C. 50832957-J)

Euroestudios Ingenieros de Consulta S.A.S. NIT 900753174-9 (10%)

Composición Accionaria:

- **100% propiedad de: TPF Getinsa Euroestudios S.L.**

La ingeniera LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ, Es directora de caminos vecinales. Y como supervisor del contrato el Ing. Wilson Santander. A la fecha, no se han registrado modificaciones, suspensiones, aclaraciones ni cesiones contractuales.

3.2 Actividades ejecutadas en el mes

Durante el periodo reportado, y de acuerdo con el cronograma presentado por el contratista mediante la carta YVY-173-25 del 29 de julio de 2025, el proyecto continúa en etapa de ejecución. Sin embargo, es importante señalar que, pese a que la etapa de caracterización concluyó contractualmente el 30 de junio de 2025, aún permanecen pendientes varias actividades asociadas a los componentes de **"Caracterización"** y **"Diseño de estabilización y tramos de prueba"**, que hacen parte integral de dicha etapa.

Con el fin de dejar constancia de su estado, avances y compromisos, estas actividades se desarrollan en el presente informe. Según el cronograma presentado, la etapa de caracterización contempla las siguientes actividades:

- Actividades preliminares
- Caracterización
- Diseño de estabilización y tramos de prueba

De acuerdo con el Anexo Técnico, la fase de caracterización comprende la **Fase I** y la **Fase II**, que incluyen la caracterización de los suelos y la presentación de las propuestas de diseño. En este sentido, el ICCU solicitó al contratista la entrega de la información consolidada de ambas fases, teniendo en cuenta que el plazo contractual venció el 30 de junio de 2025. Como plazo extemporáneo, la entidad fijó el 28 de agosto de 2025 para el cumplimiento de esta obligación.

- Durante el periodo, la interventoría ha realizado seguimiento permanente a las actividades en ejecución tanto para la etapa de Caracterización como para la Etapa de Ejecución, promoviendo mesas de trabajo e instando al contratista a dar cumplimiento con las obligaciones contractuales para poder culminar la etapa de Caracterización y dar continuidad a las actividades propias de la Etapa de Ejecución. No obstante, ante los presuntos incumplimientos, se remitió la actualización del informe del proceso sancionatorio en curso mediante el comunicado ICCU-S-207-2025 del 28 de agosto de 2025, y de manera paralela, a través del comunicado ICCU-S-206-2025 de la misma fecha, se informó al contratista el estado actual de las entregas y la situación de presunto incumplimiento.

3.2.1 Caracterización

Actividades pendientes por ejecutar en esta etapa a la fecha:

- Apiques

Si bien las actividades de ejecución de apiques fueron desarrolladas, estas se hicieron sin cumplir con la Normatividad vigente, pese a que la interventoría siempre manifestó que se debía cumplir con la correspondiente normatividad. Por lo anterior aún está pendiente el cumplimiento de este requerimiento solicitado por los especialistas de la interventoría, tendiente a garantizar la profundidad de los apiques conforme a lo establecido en el Manual de Diseño de Pavimentos Asfálticos para Vías con Bajos Volúmenes de Tránsito del INVIAS.

Esta exigencia fue señalada desde la presentación de la metodología de ejecución de apiques en campo, mediante el comunicado ICCU-S-076-2025 del 6 de junio de 2025, y ha sido reiterada en múltiples oportunidades a través de oficios, actas y observaciones asociadas a las entregas por municipio. **Ver Anexo 9. Correspondencia.**

Tabla 2. Comunicado Interventoría y Actas de Interventoría

COMUNICADO INTERVENTORIA	FECHA
ICCU-S-116-2025	3 de julio 2025
ICCU-S-133-2025	15 de julio 2025
ICCU-S-136-2025	16 de julio 2025
ICCU-S-149-2025	22 de julio 2025
ICCU-S-150-2025	23 de julio 2025
ICCU-S-156-2025	28 de julio 2025
ICCU-S-170-2025	01 de agosto 2025
ACTAS INTERVENTORIA	FECHA
ACTA 28	04 de julio 2025
ACTA 29	08 de julio 2025
ACTA 36	05 de agosto 2025
ACTA 37	13 de agosto 2025
ACTA 38	14 de agosto 2025

Ante las reiteradas solicitudes el contratista se comprometió a iniciará dichas actividades de profundización de los apiques en el mes de septiembre 2025, este tema fue incluido en la actualización del informe presentado al ICCU como actualización del informe de presunto incumplimiento por parte del contratista respecto al proceso administrativo sancionatorio que cursa actualmente. Comunicado remitido ICCU-S-207-2025 del 28 de agosto 2025.

- Resumen apiques realizados por el contratista a la fecha

Tabla 3. Inventario de Apiques realizados

LOTE 2		
PROVINCIA	MEJORAMIENTO VIAL	APIQUES REALIZADOS
RIO NEGRO	Topaipí	63
	Villagómez	8
	La Palma	59
	Yacopí	65
ALMEIDAS	Chocontá	22
	Sesquilé	45
	Manta	25
UBATE	Ubaté	17
	Simijaca	13
	Susa	23
	Tausa	19
		359

- Estratigrafías y diagnostico sitios críticos

En el periodo se recibió por parte del contratista:

Tabla 4. Subsanación a observaciones

NUM	CONSECUTIVO	FECHA	OBJETO
10	YVY-195-25	11-08-25	Subsanación observaciones planos estratigráficos ICCU-S-133-2025, ICCU-S-136-2025, ICCU-S-149-2025, ICCU-S-156-2025, ICCU-S-168-2025
11	YVY-218-25	27-08-25	Entrega de informe de visitas

Al respecto de la información recibida está ha sido revisada por la Interventoría así mismo se tiene reunión programada para el 1 de septiembre 2025 con los especialistas de contratista e Interventoría para una mesa de trabajo conjunta y poder así dar aprobación a estos productos entregados.

3.2.2 Ensayos de laboratorio

- En el periodo respecto a los ensayos de laboratorio, se tiene un 5.14% por ejecutar. En el periodo se remitieron los siguientes resultados de ensayos:

- Caracterización de los materiales: En el periodo se remitieron resultados de caracterización de los siguientes municipios, hay que aclarar que algunos de los resultados remitidos son preliminares como se discrimina a continuación.

Tabla 5. Recopilación de informes remitidos por el contratista

CONSECUTIVO	FECHA RECIBO	OBJETO
YVY-178-25	1-ago-25	Resultados apiques Villagómez Preliminares caracterización
YVY-186-25	8-ago-25	Entrega de Resultados Preliminares y Resultados de Comprensiones Tausa y Susa y preliminares caracterización Yacopí y la palma.
YVY-192-25	11-ago-25	Entrega de resultados de laboratorio Municipio de La Palma (preliminares caracterización) y Yacopí (preliminares caracterización)
YVY-217-25	27-ago-25	Entrega resultados de laboratorio. Tausa - Chocontá Villagómez - compilados definitivos caracterización

Ensayos de compresión: En el periodo se inició con la remisión de resultados de compresiones de los siguientes municipios:

Tabla 6. Resumen de informes de ensayo de compresión

CONSECUTIVO	FECHA RECIBO	OBJETO
YVY-179-25	1-ago-25	Remisión de resultados compresión encofinada 7 y 14 días municipio de Ubaté.

YVY-186-25	8-ago-25	Entrega de Resultados Preliminares y Resultados de Comprensiones Tausa y Susa y preliminares Yacopí y la palma.
YVY-188-25	8-ago-25	Entrega resultados Simijaca - Compresión encofinada 7 días
YVY-191-25	11-ago-25	Remisión de resultados compresión encofinada 7 días municipios de Chocontá y Sesquilé.
YVY-194-25	11-ago-25	Remisión de resultados compresión encofinada 7 días municipio de Villagómez
YVY-198-25	12-ago-25	Remisión de resultados compresión encofinada 7 días municipios de Manta y Topaipí
YVY-204-25	20-ago-25	Entrega resultados fallas de probetas - municipio de la palma - compresión encofinada químicos - 7 días
YVY-205-25	20-ago-25	Entrega resultados fallas de probetas - municipio de Yacopí - compresión encofinada químicos - 7 días
YVY-209-25	21-ago-25	Remisión de resultados compresión 7 días químicos GEOSSIL. La Palma Yacopí -dice 150g de cemento.
YVY-220-25	29-ago-25	Entrega resultados - municipio de Tausa - compilado 7, 14 y 28 días.
YVY-225-25	29-ago-25	Entrega resultados de laboratorio compresión 7, 14 y 28 días Sesquilé y Simijaca.

Al respecto se remitieron observaciones y comentarios por parte de la Interventoría mediante el comunicado ICCU-S-186-2025 del 12 de agosto 2025, para lo cual las principales observaciones o comentarios realizados por parte de los especialistas son:

- Los resultados, deben estar acompañados de un respectivo análisis técnico.
- En relación con los resultados a los ensayos de compresión recibidos, se evidencia que los mismos no cuentan con un documento soporte que permita verificar los criterios en la definición del producto y la dosificación de los estabilizantes químicos, así mismo no se cuenta con el análisis técnico de los resultados obtenidos.

- Se recomendó evaluar la Nota 31 emitida por el Transport Research Laboratory (TRL), con el propósito de que sea analizada en el marco del estudio de diseño correspondiente a las tres alternativas requeridas contractualmente. En caso contrario se debe emitir un concepto y un plan alternativo de trabajo para la estabilización del suelo de la rasante, consistente con los lineamientos dados en el Anexo técnico numeral 4.2.5.7. del documento contractual.

Teniendo en cuenta las observaciones y comentarios remitidos se realizaron mesas de trabajo conjuntas las cuales se mencionan a continuación:

Tabla 7. Actas de seguimiento

N° DE ACTA	FECHA	ASUNTO
36	5-ago-25	Seguimientos entregables de Pavimentos - Contrato de obra ICCU-139 de 2025
37	13-ago-25	Seguimientos entregables de Pavimentos - Contrato de obra ICCU-139 de 2025
39	20-ago-25	Seguimiento entregables Pavimentos - Diseños
41	27-ago-25	Seguimiento entregables Pavimentos - Diseños

- Visitas de Laboratorio por parte de la interventoría.

Visita 04 de agosto 2025

Se realiza seguimiento por parte de la Interventoría a las actividades de ejecución de ensayos por parte del contratista en el laboratorio. Se evidencia probetas del tramo Susa compuestas por 2% cemento – estabilizante Stepway.

Fotografía 4. Visita Laboratorio Terratest





En el día se tiene previsto fallar 20 muestras al momento de la visita se fallaron las primeras 5 con suelo + 2% cemento + Stepway. Posteriormente se van a fallar otras 5 con suelo + 3% cemento + Stepway, y posteriormente 5 con suelo natural y 5 con suelo + 3% cemento + Proroad.

Visita 26 de agosto de 2025:

Se evidencio que se están haciendo ensayo a la compresión de muestras a los 14 días en probetas realizadas con materiales tomados en apiques de La Palma y Yacopí, con los productos Proroad y Stepway, así como mezcla de Stepway + 2 y 3% de cemento.

Fotografía 5. Visita Laboratorio Terratest



Se evidencia ensayo a compresión de probetas sector La Palma – 14 días. Muestra Inconfinada Stepway + 3% cemento.

Fotografía 6. Visita Laboratorio Terratest



3.2.3 Diseños de estabilización y tramos de prueba

Durante el periodo reportado se llevaron a cabo mesas de trabajo conjuntas entre las interventorías y el ICCU, con el propósito de socializar los resultados obtenidos a partir de los ensayos de laboratorio presentados por el contratista. Como resultado de estas reuniones, el ICCU emitió el comunicado ICCU-226-2025 del 21 de agosto de 2025, en el cual se estableció que, conforme a lo acordado en la mesa de trabajo del 13 de agosto de 2025, debe tomarse como referencia una resistencia mínima a la compresión encofinada de 1 MPa en condiciones saturadas.

En este mismo contexto, se consideró pertinente que el interventor y el contratista amplíen la gama de ensayos de laboratorio, incluyendo pruebas de estabilización de la subrasante exclusivamente con adición de cemento, sin incorporar aditivos o estabilizantes químicos. Esta medida busca complementar los análisis de comportamiento del material y contrastar los resultados previamente obtenidos, con el fin de contar con una muestra comparativa más amplia que permita evaluar la relación costo–beneficio frente a la metodología actualmente utilizada, enmarcada en la Norma INVIAS 237-22.

Para el caso de los tramos correspondientes al Lote 2, los sectores en los que, de acuerdo con los ensayos remitidos por el contratista, se cumple con la resistencia mínima definida son:

- Susa
- Simijaca
- Manta

Se anexa al presente informe la tabla resumen de los resultados entregados, disponible en el Anexo – Resultados de Laboratorio de Caracterización. El contratista presentó los diseños correspondientes a estos tres (3) los municipios donde se cumple con la condición de resistencia, mediante comunicación YVY-221-25 de fecha 29 de agosto de 2025, los cuales están en proceso de revisión por parte de la interventoría con lo cual de cumplir con los requerimientos exigidos en el contrato se espera que el contratista de agilidad al inicio de la ejecución de las actividades de mantenimiento de rasante en dichos tramos, en atención a las observaciones que pueda realizar la interventoría.

Por otra parte, en lo que corresponde a la entrega del informe Fase II de las otras vías, la interventoría mediante el comunicado ICCU-S-206-2025 del 28 de agosto de 2025, dejó constancia de la información entregada a esta fecha y la que está pendiente por entregar, otorgando un plazo de dos (2) días hábiles para la entrega. El seguimiento a este requerimiento y su eventual cumplimiento será reportado en el próximo periodo.

3.2.4 Etapa de ejecución

Durante el periodo reportado, el contratista avanzó en las labores de limpieza y mantenimiento de alcantarillas en diferentes tramos de los municipios de Manta, Ubaté y Susa.

No obstante, según el cronograma preliminar remitido con el comunicado YVY-138-2025 de fecha 10 de julio de 2025, entregado por el contratista, se tenía previsto las siguientes fechas de inicio de la actividad.

Tabla 8. Mantenimiento de Alcantarillas

LOTE 2			
PROVINCIA	Mejoramiento vial	Mant. alcantarillas	Fecha finalizados
RIO NEGRO	Topaipí		
	Villagómez		
	La Palma		
	Yacopí		
ALMEIDAS	Chocontá		
	Sesquilé		
	Manta	42	
UBATE	Ubaté	10	15-Jul-25
	Simijaca		
	Susa	31.5	
	Tausa		
		83.5	

*Fuente: Interventoria

En el periodo se realizó recomendaciones al contratista en cuanto a disposición de los materiales extraídos por la limpieza de las alcantarillas en el tramo de Manta, comunicado ICCU-S-195-2025 del 20 de agosto 2025.

Tabla 9. Limpieza de Alcantarillas

	Cronograma Ejecución YVY-173-25	
PROGRAMACION	LIMPIEZA ALCANTARILLAS	ESTADO ACTUAL
UBATÉ	15-jul-25	Inició el 15 de julio
SUSA	15-jul-25	Inició 16 jul 2025 - no se ha registrado actividad desde 1 ago 2025. - Informan que terminan las 2 alcantarillas que faltan.
TAUSA	17-sep-25	
SIMIJACA	29-oct-25	Se informa que las 2 estructuras hidraulicas que aparecen son 2 compuertas por lo que no se intervienen para limpieza y mantenimiento.
CHOCONTA	30-jul-25	No ha iniciado
SESQUILE	30-sep-25	
MANTA	15-jul-25	Inició 22 jul 2025 - En ejecución-
VILLAGOMEZ	14-ago-25	No ha iniciado
LA PALMA	5-ago-25	No ha iniciado
TOPAIPI	4-ago-25	No ha iniciado
YACOPI	27-ago-25	No ha iniciado

Igualmente, en el periodo se realizó mesa de trabajo el día 5 de agosto 2025 (Acta de reunión 35), con el contratista ya que se debe presentar propuesta de su parte para el mantenimiento y construcción de alcantarillas, según lo identificado en los inventarios, toda vez que se supera la cantidad contractual establecida para ejecución. Por otra parte, se ha solicitado celeridad en la priorización de alcantarillas a intervenir y contar con la logística para el inicio de construcción de estas, solicitud que ha sido reiterativa, tanto por el ICCU como por la Interventoría como consta en el acta de reunión 40 de fecha 22 de agosto 2025.

Tabla 10. Comparativo por provincia

	COMPARATIVO POR PROVINCIA					
	UBATÉ		ALMEIDAS		RIONEGRO	
TIPO DE INTERVENCIÓN	CONTRACT.	INVENT.	CONTRACT.	INVENT.	CONTRACT.	INVENT.
Construir alcantarilla	12,00	7,00	16,00	28,00	45,00	78,00
Construir encole		5,00		2,00		10,00
Construir descole		1,00		6,00		33,00
Construir encole y descole		13,00		32,00		18,00
Construir Box culvert		1,00		1,00		0,00
Mantenimiento y limpieza	12,00	54,00	13,00	98,00	46,00	303,00
Total general	**24,00**	**81,00**	**29,00**	**167,00**	**91,00**	**442,00**

Por lo anterior el contratista acorde a compromiso adquirido, iniciará visitas de verificación en campo con el fin de pasar la propuesta de priorización de alcantarillas para remplazo o construcción de nuevas estructuras. Por lo anterior el contratista remitió el análisis del estado de alcantarillas y propuesta de intervención Tramo La Palma el 29 de agosto 2025 con comunicado YVY-222-25 el cual se encuentra en revisión de la Interventoría.

3.2.5 Topografía

Se ha solicitado en las diferentes reuniones de seguimiento al contratista por parte del ICCU y de la Interventoría, el inicio de actividades de topografía y en general las actividades de ejecución en campo. Lo anterior consta en el Acta de reunión 34 del 1 de agosto.

3.3 Gestión ambiental

El presente documento contiene los diferentes subprogramas de gestión ambiental a desarrollar durante la ejecución del contrato, teniendo en cuenta el plan de adaptación de la guía ambiental PAGA.

El plan de adaptación de la guía ambiental PAGA en la ejecución del contrato de obra N° 319 de 2025 cuyo objeto es "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", describe las acciones de control que realizó el Contratista para llevar a cabo las actividades de gestión ambiental durante la ejecución de obra en el periodo 1 al 31 de agosto de 2025, las cuales se enfocan en minimizar los impactos ambientales negativos en los diferentes componentes aire, tierra ,agua, que se puedan presentar a causa de las actividades constructivas del contrato objeto del presente informe.

3.3.1 Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA

Durante el periodo en evaluación (1 a 31 de agosto de 2025), se adelantaron actividades relacionadas con la actualización del documento PAGA Versión número 6.

Los días 14, 15 y 22 de agosto de 2025 en conjunto las áreas ambientales del ICCU, Interventoría y Contratista realizaron mesas de trabajo virtuales, por medio de las cuales se atendieron las solicitudes y efectuaron los correspondientes ajustes al documento PAGA, dichas observaciones se adelantaron durante el mes de agosto y se tiene previsto en el mes de septiembre presentar la versión No 6 del documento PAGA ya ajustado y con revisión previa, así mismo se resalta que el día 28 de agosto de 2025 la interventoría envió correo electrónico al componente social y ambiental del ICCU solicitando como proceder con el contenido del componente social del PAGA, teniendo en cuenta que el

documento PAGA cuenta con la aprobación del componente social de la interventoría la cual se había dado con el comunicado ICCU-S-126-2025 con fecha, 10 de julio de 2025 y sobre el cual el profesional ambiental del ICCU realizó observaciones.

En el Anexo No 1 del presente informe se presentan las actas de los comités virtuales realizados los días 14, 15 y 22 de agosto de 2025, así como el correo electrónico enviado el día 28 de agosto de 2025.

3.3.2 Implementación de los principales programas del PAGA durante el periodo en evaluación para las provincias de Rionegro – Almeidas – Ubaté.

Conformación del Grupo de Gestión Ambiental y Social – SM-DAGA-1.1-01. Provincias de Rio Negro, Almeidas y Ubate.

3.3.3 Personal Ambiental de la Interventoría

Durante el mes en evaluación (1 a 31 de agosto de 2025) La Interventoría conto con el personal ambiental aprobado por el ICCU que se relaciona a continuación:

Tabla 11. Personal Ambiental Interventoría

Profesional	Contacto	Fecha de Vinculación	Fecha de retiro
Carlos Arturo Chaparro Sánchez	Ambiental1.intervial050@gmail.com Celular. 3005608030	24 de Julio de 2025	N.A

3.3.4 Personal Ambiental del Contratista

Durante el periodo en evaluación (1 a 31 de agosto de 2025) se contó con la profesional ambiental aprobada por el ICCU que se relaciona a continuación.

Tabla 12. Personal Ambiental Contratista

Profesional	Contacto	Fecha de Vinculación	Fecha de retiro
María Fernanda Armesto	ing.mariafarmesto@gmail.com Celular. 3024436847	01 de agosto de 2025	N.A

3.3.5 Capacitación y Concienciación del Personal de Obra SM-DAGA-1.2-02. Provincias de Rio Negro, Almeidas y Ubate.

Durante el periodo en evaluación (agosto 2025) se realizó capacitación al personal en obra consistente en la inducción que se realiza a todo el personal al momento de su ingreso al contrato.

3.3.6 Cumplimiento de requerimientos legales SM-DAGA-1.3-03. Provincias de Rio Negro, Almeidas y Ubate.

El Proyecto NO requiere el trámite de permisos ambientales para su ejecución, toda vez que la intervención consiste en actividades de mantenimiento sobre el corredor vial existente, sin embargo, lo que se verificará en este subprograma corresponde a la verificación de los permisos ambientales que se requiera para garantizar la legalidad de proveedores de materiales, suministro de agua en bloque y empresas de manejo de residuos. Durante el mes en evaluación NO se generó suministro de materiales de cantera, agua en bloque ni se retiró material de excavación o RCD de ningún frente de obra. Se continuó con el proceso de actualizar la matriz legal establecida en el documento PAGA Versión No 6.

3.3.7 Manejo integral de materiales de construcción SM-PAC—2.1-04

Durante el periodo en evaluación (1 a 31 de agosto de 2025) este subprograma no aplica. No se utilizaron materiales de construcción durante el mes de agosto de 2025.

3.3.8 Señalización para el manejo ambiental en frentes de obra y sitios temporales SM-PAC-2.3-06

Durante el periodo en evaluación las actividades ejecutadas correspondieron a limpieza de alcantarillas, los trabajos No contaron con señalización, pero se resalta que las actividades se realizaron fuera de la vía, a los costados y dentro de las alcantarillas.

3.3.9 Seguimiento y control al manejo integral de materiales de construcción. SM-PAC-2.4-07.

Durante el periodo en evaluación No Aplica el presente sub programa, toda vez que no se ha realizado manejo de materiales de construcción en los frentes de obra.

3.3.10 Manejo integral de residuos sólidos convencionales y especiales. SM-PAC-2.5-08

Durante el mes en evaluación (agosto de 2025) no se generaron residuos sólidos convencionales ni especiales dentro de los frentes de obra. Los residuos convencionales se generaron en oficinas y fueron dispuestos por medio de la empresa de aseo Municipal de cada municipio.

3.3.11 Manejo de aguas superficiales SM-PGH-3.1-10.

Durante el periodo en evaluación (agosto 2025) no se generó la compra de agua en bloque. No se presenta afectación a cuerpos de agua, no se hace captación de agua de fuentes de agua superficiales subterráneas o lluvia.

3.3.12 Manejo de residuos líquidos, domésticos e industriales. SM-PGH-3.2-11

Los residuos líquidos o aguas residuales en frentes de obra corresponden al uso de baños de oficinas puntos sociales y casas de los trabajadores, los cuales son dispuestos en las redes de alcantarillado de las diferentes provincias.

3.3.13 Protección de la fauna en vías SM-PBSE-4.5-16.

Durante el periodo en evaluación (agosto 2025) No aplica el presente subprograma. No se generaron actividades que puedan afectar la fauna presente en el en ninguna de las provincias.

3.3.14 Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio SM-PMIT-5.1-18.

Durante el mes de agosto de 2025 No aplica el subprograma para ninguna de las provincias Rio Negro, Almeidas, Ubaté.

3.3.15 Manejo de maquinaria, equipos y vehículos. SM-PMIT-5.3-20

Durante el mes de agosto de 2025 No se contó con maquinaria en los frentes de trabajo en ninguna de las provincias. Los vehículos – camionetas utilizadas para realizar los recorridos de obra contaron con los respectivos certificados de revisión técnico mecánica cuando su modelo lo requiere, así mismo se respetaron los límites de velocidad permitidos en los frentes de trabajo.

3.4 Gestión social

El presente informe mensual correspondiente al mes de agosto. detalla las actividades, avances y resultados del Programa de Gestión Social del Proyecto INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. Este documento es una herramienta clave para el seguimiento y control que garantiza la transparencia y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades. En los siguientes programas, se presenta un resumen detallado de las acciones realizadas con la comunidad, el manejo de las PQRSD, y el avance en el Plan de Gestión social que contribuyen a mitigar los impactos generados durante la ejecución de las obras y que garanticen el bienestar y la calidad de vida de la comunidad que se encuentra en las áreas de influencia.

3.4.1 Alcance del informe

Para el presente informe se reportan las actividades del Programa de Gestión social, realizadas en el periodo del 1 al 31 de agosto de 2025, dando a conocer las acciones adelantadas por cada uno de los subprogramas que fueron establecidos en el Plan de Adaptación de la Guía Ambiental PAGA.

1. Atención a la Comunidad
2. Información y Divulgación
3. Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos
4. Cultura Vial y Participación Comunitaria
5. Contratación de Mano de Obra

3.4.2 Metodología de seguimiento:

En este periodo la Interventoría realizó las revisiones a los informes mensuales de No. 1 del mes de abril V.2, el informe No. 3 del mes de junio V.2, y el informe No. 4 del mes de julio, a continuación, se da a conocer la trazabilidad realizada por esta interventoría:

Tabla 13. Trazabilidad Informes Mensuales

No. INF	Fecha	Comunicado	Trazabilidad	Estado
1	04-08-2025	Mesa de trabajo Correo electrónico	Se realiza mesa de trabajo entre Profesionales Sociales del Contratista YVY y Profesionales Sociales de la Interventoría para revisar y aclarar las observaciones al informe. Posteriormente el Contratista envía por correo electrónico informe con observaciones subsanadas.	En ajustes por parte del Contratista YVY
	11-08-2025	ICCU-S-184-2025	Mediante el comunicado ICCU-S-184-2025 se da respuesta al oficio YVY-164-25 con la aprobación al informe mensual No. 1 de abril.	Aprobado
3	08-08-2025	YVY-185-25	Contratista remite respuesta al comunicado ICCU-S-157-2025 de	En revisión por parte del Consorcio

			atención de observaciones al informe mensual No. 3 de junio V.2	Intervial ICCU-050
	25-08-2025	Correo Electrónico	Se envía mediante correo electrónico al Contratista YVY las observaciones al informe mensual No. 3 de junio V.2	En ajustes por parte del Contratista YVY
4	11-08-2025	YVY-190-25	Contratista radica el informe mensual No. 4 de julio	En revisión por parte del Consorcio Intervial ICCU-050
	25-08-2025	Correo Electrónico	Se envía mediante correo electrónico al Contratista YVY las observaciones al informe mensual No. 4 de julio	En ajustes por parte del Contratista YVY

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

3.4.3 Gestión de Informes de Interventoría

El Consorcio Intervial ICCU-050 remite informes semanales al ICCU que dan cuenta de la gestión y trazabilidad realizada al contratista en el periodo de agosto del presente año.

Tabla 14. Trámite de Informes Semanales de Interventoría

No. De Informe	Descripción	Soporte
18	06-08-25 Interventoría remite informe	ICCU-S-179-2025
19	12-08-25 Interventoría remite informe	ICCU-S-187-2025
20	20-08-25 Interventoría remite informe	ICCU-S-194-2025
21	26-08-25 Interventoría remite informe	ICCU-S-203-2025

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Ver Anexo 6. Informe social.

3.4.4 Comités Sociales

La interventoría lideró los Comités Sociales de seguimiento, programados para realizar un adecuado seguimiento al contrato de obra. En el presente periodo se realizaron dos (2) Comités Sociales.

Tabla 15. Comités Sociales

N.º	Comités Sociales	Participantes
7	11-08-2025	Director de Interventoría, director de Obra del Contratista, Coordinadora del Área Social del Contratista, Profesional Social ICCU, Ingeniero de Apoyo Administrativo de Interventoría y profesionales sociales de Interventoría y Contratista de las 3 Provincias.
8	25-08-2025	Director de Interventoría, director de Obra del Contratista, Coordinadora del Área Social del Contratista, Profesional Social ICCU, Ingeniero de Apoyo Administrativo de Interventoría y profesionales sociales de Interventoría y Contratista de las 3 Provincias.

3.4.5 Mesas de trabajo

La interventoría llevó a cabo mesas de trabajo y Comités Internos del componente Social, con el objeto de conocer el estado actual del desarrollo de los diferentes programas sociales, para la ejecución del proyecto en las Provincias de Rionegro, Ubaté y Almeidas, así como el estado de la documentación pendiente por revisar y/o aprobar. En el presente periodo se realizaron dos (2) mesas de trabajo y tres (3) Comités Internos.

Tabla 16. Mesas de trabajo

Fecha	Mesas de Trabajo	Actividad	Registro Fotográfico

04-08-2025	**Mesa de trabajo entre Profesionales Sociales del Contratista YVY y Profesionales Sociales del Consorcio Intervial ICCU-050.**	• **Revisión de observaciones del informe de abril V.4.** • **Revisión de observaciones del informe de junio V.2.** • **Revisión de observaciones de propuesta de encuesta dirigida a la comunidad.**	
11-08-2025	**Reunión Social Interna entre Profesionales Sociales y director del Consorcio Intervial ICCU-050-**	• **Se exponen los documentos pendientes por revisión y de respuesta en tiempos contractuales.** • **Se reciben indicaciones en tiempos de entrega de las actas de los Comités Sociales y entrega de informes.** • **Delegación de tareas para dar respuesta.** • **Socialización de situaciones presentadas en**	

		cada una de las Provincias.	
19-08-2025	**Mesa de trabajo entre Profesionales Sociales del Contratista YVY y Profesionales Sociales del Consorcio Intervial ICCU-050.**	• **Se le solicita al Contratista unificar los documentos piezas comunicativas y procedimientos, en cuanto formato y orden de éstos, ya que no son los mismos que están enviados a las otras Provincias. (Rionegro y Almeidas).** • **No están enviado la información en las mismas fechas a las demás Provincias.** • **Se socializaron las observaciones generales al informe social del mes de julio.**	
26-08-2025	**Mesa de trabajo entre Profesionales Sociales del Consorcio Intervial ICCU-050 de las Provincias**	• **Revisión de la vacante laboral de ayudante de obra a la cual se le realizan observaciones.**	

	de Rionegro, Almeidas y Ubaté.		
28-08-2025	**Mesa de trabajo entre Profesionales Sociales del Consorcio Intervial ICCU-050 de las Provincias de Rionegro, Almeidas y Ubaté.**	• **Revisión piezas comunicativas de inicio de actas de vecindad, las cuales se les realizan observaciones.** • **Revisión de la Metodología de actas de vecindad y actas de entorno, a la cual se le realiza observaciones.**	

3.4.6 Resumen ejecutivo por provincia

PROVINCIA DE RIONEGRO

- **Subprograma de Atención a la Comunidad**

El Contratista realizó la apertura a la oficina de Atención a la Comunidad el 15 de agosto de 2025, la cual se encuentra ubicada en el Casco Urbano del Municipio de La Palma en la Calle 3 # 3-75, Barrio Galerías, en la cual se realizará atención los martes y jueves en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m., en aras de brindar información clara y eficaz a la comunidad de la Provincia de Rionegro sobre el cumplimiento de acciones sociales y ejecución de trabajos de obra. De igual manera se realiza revisión al contrato de la oficina firmado entre el Consorcio YVY y la Propietaria la Señora Adriana Maritza González.

De igual manera instalo el afiche informativo con información relacionada con los medios de comunicación del área social de la Provincia, se evidencia que durante el mes de agosto estuvo habilitado el correo electrónico socialconsorcioyvyrionegro@gmail.com y la línea telefónica 3105695272.

Es importante mencionar que durante el mes de agosto en la Provincia de Rionegro no hubo recepción de PQRSD, sin embargo, la Profesional Social del Contratista en

articulación con interventoría brindo información sobre el proyecto a la comunidad del área de influencia del Municipio de Yacopí y La Palma, vía telefónica y presencial.

Tabla 17. Punto de atención a la comunidad

Provincia	Municipio	Dirección	Horario de atención	Canales de Comunicación	Registro fotográfico
Rionegro	La Palma	Calle 3 # 3-75 Barrio Galerías	Martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.	socialconsorcioyvyrionegro@gmail.com 3105695272	

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Anexo 1. Contrato oficina Atención a la comunidad Rionegro

Anexo 2. Registro fotográfico Oficina Rionegro

- **Reunión de Inicio**

En el presente periodo, no se realizó teniendo en cuenta que fue realizada el día 19 de mayo de 2025.

- **Reunión de Avance**

En el presente periodo, no se realizó teniendo en cuenta que dicha reunión se realiza al cumplir el 50% de ejecución de la obra.

- **Reunión de Finalización**

En el presente periodo, no se realizó teniendo en cuenta que dicha reunión se realiza al cumplir el 100% de ejecución de la obra.

- **Reuniones Extraordinarias**

En el presente periodo, no se realizó.

- **Volantes Informativos**

Se realiza revisión, envió de observaciones y aprobación por parte de la profesional social de Interventoría de la Provincia de Rionegro a los siguientes volantes:

Tabla 18. Información de Volantes

Tipo de pieza	Asunto	Fecha de recibido	Fecha de Envió de Observaciones	Fecha de Envió de subsanado	Fecha de Aprobación
Volante	Vacante Profesional Social Provincia de Rionegro	13/08/2025	14/08/2025	14/08/2025	14/08/2025
Volante	Vacante de Ayudante de Obra	26/08/2025	26/08/2025	No se ha subsanado	En espera de observaciones subsanadas por parte del contratista
Volante	Limpieza de Alcantarillas-Municipio La Palma	27/08/2025	27/08/2025	No ha sido subsanado	En espera de observaciones subsanadas por parte del contratista

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Ver Anexo. 6 Infome social - Rionegro

- **Volante de vacante de Profesional Social Rionegro**
- **Volante de vacante de ayudante de obra**
- **Volante de limpieza de Alcantarillas La Palma**

- **Afiches Informativos**

Se realiza revisión, envió de observaciones y aprobación por parte de la profesional social de Interventoría de la Provincia de Rionegro al siguiente afiche:

Tabla 19. Información Afiche

Tipo de pieza	Asunto	Fecha de recibido	Fecha de Envió de Observaciones	Fecha de Envió de subsanado	Fecha de Aprobación
Afiche	Información de la oficina, dirección y horarios de atención a la comunidad.	22/08/2025	25/08/2025	25/08/2025	25/08/2025

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Ver Anexo. 6 informe social – Rionegro

- **Afiche informativo oficina Rionegro**
- **Puntos Satélite de Información (PSI)**

Se realiza acompañamiento a recorrido al Municipio de Yacopí, en el cual se hace actualización de los 3 PSI instalados: Sector la Y, Vereda La Tigra e Inspección de Terán, se instala volantes de vacantes y folleto de información general del Proyecto.

Tabla 20. Información Puntos Satélite de Información

No	Nombre del Establecimiento	Ubicación	Municipio	Contacto	Registro Fotográfico y fecha de actualización
1					Durante el mes de agosto no se realizó

	Tienda Doña Alcira	Vereda Buenavista	Villagómez	Ana Alcira Rodríguez 3124313454	actualización, debido a que no se generó piezas informativas para el Municipio
2	Tienda Casallas	Vereda Buenavista	Villagómez	Anderson Casallas 3229060475	Durante el mes de agosto no se realizó actualización, debido a que no se generó piezas informativas para el Municipio
3	Tienda María	Vereda El Hato	La Palma	Edith Tovar 3144381970	Durante el mes de agosto no se realizó actualización, debido a que no se generó piezas informativas para el Municipio
4	Tienda Zumbe	Vereda Zumbe	La Palma	Samuel Triana 3159376311	Durante el mes de agosto no se realizó actualización, debido a que no se generó piezas informativas para el Municipio
5	Tienda de Carmenza		La Palma	Carmen Espinosa	Durante el mes de agosto no se realizó actualización, debido a

		Vereda Minipí de Quijano		3228645101	que no se generó piezas informativas para el Municipio
6	Tienda – Cancha de tejo	Vereda Suarez	Topaipí	Nelcy Daniela Chacón 3225636060	Durante el mes de agosto no se realizó actualización, debido a que no se generó piezas informativas para el Municipio
7	Oficina Agencia de Buses	Inspección San Antonio de Aguilera	Topaipí	Nacianceno Moreno 3125560333	Durante el mes de agosto no se realizó actualización, debido a que no se generó piezas informativas para el Municipio
8	Tienda Doña Barbara	Vereda Mata de Ramo	Topaipí	Barbara Moreno 3146967452	Durante el mes de agosto no se realizó actualización, debido a que no se generó piezas informativas para el Municipio
9	Supermercado Terán	Inspección Terán	Yacopí	Isaac Álvarez 3136359588	21 de agosto de 2025

10	Tienda - Gallera	Vereda La Tigra	Yacopí	Hernán Galindo 3152894890	21 de agosto de 2025
11	Tienda – Casa Familiar, Sector la Y	Vereda Llano Mateo	Yacopí	Elvira Prieto 3114671165	21 de agosto de 2025

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Ver Anexo. 6 Informe Social – Rionegro

- **Registro fotográfico actualización PSI Yacopí - Inspección Terán**
- **Registro fotográfico actualización PSI Yacopí – La Tigra**
- **Registro fotográfico actualización PSI Yacopí – Sector La Y**
- **Subprograma Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos Rio Negro**

Se realiza acompañamiento a la Profesional social del Contratista de la Provincia de Rionegro y área técnica a recorrido de levantamiento de inventario de predios en el Municipio de Yacopí para proceder a realizar las actas de vecindad y entorno antes de iniciar la intervención de la vía en aras de dar cumplimiento a las actividades contractuales del proyecto. En total se evidencio y tomo datos de 54 predios para levantamiento de actas de vecindad y entorno en los 3 tramos priorizados para el mejoramiento de la vía.

- Se realiza revisión y envió de observaciones al documento de Metodología para el levantamiento de actas de vecindad y entorno de la Provincia de Rionegro:

Tabla 21. Información Metodología Actas de Vecindad y Entorno Rio negro

Tipo de pieza	Asunto	Fecha de recibido	Fecha de Envió de Observaciones	Fecha de Envió de subsanado	Fecha de Aprobación
Documento PDF	Metodología para actas de vecindad y entorno	27/08/2025	28/08/2025	No se ha subsanado	En espera de observaciones subsanadas por parte del contratista

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Ver Anexo. 6 informe Social – Rionegro

Documento PDF Metodología de Actas de vecindad y entorno con observaciones

- **Contratación Mano de Obra Rionegro**

Se realiza verificación con la Profesional Social de la Provincia de Rionegro del contratista frente a las convocatorias realizadas para la contratación pertinente de mano de obra calificada y no calificada de acuerdo con los lineamientos del contrato. Durante este periodo se evidencia que el contratista realizó convocatoria para contratación de mano de obra no calificada con el Perfil de ayudantes de obra para la Provincia de Rionegro de la siguiente manera:

- Municipio de Yacopí: 5 Ayudantes de Obra
- Municipio de La Palma: 5 Ayudantes de Obra
- Municipio de Topaipí: 5 Ayudantes de Obra
- Municipio de Villagómez: 5 Ayudantes de Obra

De igual manera realiza convocatoria para contratación de mano de obra calificada para el Perfil de Gestor Social para la Provincia de Rionegro.

El contratista realizo la siguiente contratación en el mes de agosto para la Provincia de Rionegro:

Tabla 22. Contratación Rionegro

Mano de Obra	Cargo	Nombre	Fecha de ingreso
Calificada	Topógrafo	Omar Ardila	18 de agosto de 2025

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

- **Síntesis de las actividades sociales más relevantes del mes Rionegro**

Durante el mes de agosto de 2025, el Consorcio YVY llevó a cabo diversas actividades sociales articuladas con la Profesional Social de Interventoría en la Provincia de

Rionegro, dichas actividades fueron centradas en la atención a la comunidad, información y divulgación, y gestión de mano de obra. La principal iniciativa fue la apertura de una oficina de **Atención a la Comunidad** en el municipio de La Palma, ubicada en la Calle 3 # 3-75, Barrio Galerías. La oficina atiende al público los martes y jueves, con el fin de proporcionar información clara sobre el avance de las obras y las acciones sociales. Además, se mantuvieron canales de comunicación activos, como el correo electrónico socialconsorcioyvyrionegro@gmail.com y la línea telefónica 3105695272, aunque no se registraron solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias (PQRSD) durante este periodo. A pesar de esto, el personal social del contratista brindó información directa a los habitantes de Yacopí y La Palma.

En el subprograma de **Información y Divulgación**, se gestionó la aprobación de material informativo como volantes y afiches. Se aprobaron volantes para vacantes de profesional social y ayudante de obra, y un afiche sobre la oficina de atención. También se realizó un recorrido por el municipio de Yacopí para actualizar los Puntos Satélite de Información (PSI) con volantes informativos y folletos del proyecto.

Finalmente, en el **Subprograma de Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos**, se realizó un levantamiento de inventario de 54 predios en Yacopí para la preparación de actas de vecindad y entorno, un paso crucial antes de iniciar las obras como garantía para el contratista y los propietarios de los predios. La **Contratación de Mano de Obra** fue otra actividad destacada, con convocatorias para ayudantes de obra en los municipios de Yacopí, La Palma, Topaipí y Villagómez y gestor social para la Provincia de Rionegro, cabe resaltar que se realizó la contratación de mano de obra calificada con el perfil de topógrafo. Estos esfuerzos reflejan un enfoque integral en la participación comunitaria y el desarrollo de las áreas de influenza.

Hallazgos principales Rionegro.

- **Apertura de Oficina:** El contratista abrió la oficina de Atención a la Comunidad en La Palma el 15 de agosto de 2025, ubicada en la Calle 3 # 3-75, Barrio Galerías. El horario de atención es martes y jueves, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
- **Canales de Comunicación:** El contratista tuvo habilitado un correo electrónico (socialconsorcioyvyrionegro@gmail.com) y una línea telefónica (3105695272) para la comunidad.
- **PQRSD:** Durante el mes de agosto, **no se recibieron PQRSD** (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias). Sin embargo, el equipo profesional brindó información sobre el proyecto a las comunidades de Yacopí y La Palma.

- **Reuniones:** No se realizaron reuniones de inicio, avance, finalización ni extraordinarias en este período. La reunión de inicio se hizo en mayo, y las demás dependen del progreso de la obra.
- **Volantes y Afiches:** Se aprobaron y revisaron varias piezas informativas, incluyendo volantes para vacantes de personal y un afiche con información de la oficina.
- **Puntos de Información Satélite (PSI):** Se actualizaron 3 PSI en el Municipio de Yacopí (Inspección de Terán, Vereda La Tigra, y Vereda Llano Mateo) con información de vacantes y del proyecto Caminos Vecinales. Los PSI los Municipios (Villagómez, La Palma, Topaipí) no fueron actualizados debido a que no se hizo necesario de acuerdo con la dinámica de Proyecto.
- **Inventario de Predios:** Se realizó inventario de 54 predios en el Municipio de Yacopí para la elaboración de actas de vecindad y entorno, actividad que debe realizarse previo al inicio de las obras de mejoramiento de la vía.
- **Metodología de Actas:** Se realizo revisión y envió de observaciones a la Metodología para el levantamiento de las actas. A la fecha de elaboración del informe, este documento aún se encuentra en espera de ser subsanado por el contratista.
- **Convocatoria de Personal:** El contratista realizo convocatorias para la contratación de mano de obra no calificada de (20 ayudantes de obra, 5 por cada Municipio: Yacopí, La Palma, Topaipí y Villagómez) y mano de obra calificada (gestor social).
- **Contratación Realizada:** El contratista contrato una persona de mano de obra calificada con el perfil de Topografía. No se evidencia la contratación de ayudantes de obra durante este periodo.

PROVINCIA DE UBATÉ

- **Síntesis de las actividades sociales más relevantes del mes:**

Para el presente informe se describen las actividades de gestión social ejecutadas en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2025: EL Contratista realizó la apertura a la oficina de Atención a la Comunidad el 15 de agosto del presente año, la cual se encuentra ubicada en la Calle 7 N.º. 4-120 del casco urbano del Municipio de Ubaté Cundinamarca, bajo la modalidad de Coworking, allí se presta su atención dependiendo las actividades de campo a desarrollar, con el objeto de prestar una atención oportuna y veraz, la

Profesional Social del Contratista YVY a cargo es Sandra Morato, quien comunica mediante WhatsApp los días y horarios de atención a la comunidad. Así las cosas, el Contratista envió para su correspondiente revisión por parte del Consorcio Intervial ICCU-050, diversas piezas de comunicación (propuesta de encuesta aplicada a la comunidad, pieza comunicativa de inicio de actas de vecindad, afiche informativo del proyecto y pieza comunicativa de vacante laboral de ayudante de obra para los Municipios de Ubaté, Susa y Tausa). De igual manera se realizó el mantenimiento y actualización de los Puntos Satélites de Información-PSI, localizados en los establecimientos con mayor tránsito de comunidad. (Tienda la Caseta Roja del Municipio de Simijaca, Tienda Rana y Pola del Municipio de Susa, Tienda Donde Angela del Municipio de Ubaté y Tienda Tres Esquinas del Municipio de Tausa).

Por otro lado, el Contratista la realiza la radicación ante la oficina de Gestión del Riesgo del Municipio de Simijaca el reporte del estado del puente vehicular localizado en la vía el Pantano y el estado de la construcción (casa), de igual manera realizó la verificación del desmonte de la estructura de madera, localizada encima de la alcantarilla en el tramo de intervención del Municipio de Susa, de igual manera el Contratista remite ante la Interventoría la metodología de la elaboración de las actas de vecindad de inicio y las actas de vecindad de entorno de inicio para su revisión, la cual no se encuentra aprobada. El contratista durante el presente mes realizó la actualización del directorio telefónico con los diferentes actores sociales con los cuales se interactuó.

Finalmente, el Contratista realizó la convocatoria de la vacante laboral de ayudante de obra solicitando 8 ayudantes para el Municipio de Susa, 4 ayudantes para el Municipio de Ubaté y 2 ayudantes para el Municipio de Tausa, con la salvedad de que no requieren ayudantes para el Municipio de Simijaca.

Hallazgos principales Ubate

A nivel general la estrategia utilizada por el Contratista YVY de la modalidad de la oficina de Atención a la Comunidad para la Provincia de Ubaté ha sido de bastante acogida ya que su ubicación ha permitido que la comunidad de los Municipios de Susa, Simijaca, Tausa y Ubaté puedan trasladarse con facilidad, además es de resaltar que la estrategia de comunicación que ha venido utilizando la Profesional Social de la correspondiente Provincia (grupo de WhatsApp) con los líderes comunitarios y demás actores sociales, ha permitido que la comunidad pueda tener información de manera oportuna, sin embargo, es de aclarar que se evidencia que hay poca comunicación interdisciplinar entre las diferentes áreas del Contratista YVY, ya que no le transmiten a la Profesional

Social los avances del proyecto y/o programaciones de actividades a desarrollar; situaciones que se ven reflejadas en la premura de la entrega de la información, como en la entrega de piezas comunicativas sobre el tiempo, e incluso divulgando e instalando información en los Puntos Satélites de Información-PSI sin ser radicados, ni aprobados por la Interventoría.

Seguidamente es muy importante hacer mención que el Contratista no cuenta con número telefónico de Atención al Usuario, dispuesto para la correspondiente Provincia, en donde la Profesional Social a cargo le ha tocado brindar su número de teléfono personal para garantizar la comunicación con la comunidad; situación que se ha expuesto en diversos comités sociales y el Contratista no ha acatado las observaciones.

Por otro lado, a nivel general se evidencia que el Contratista en el momento que contrató a la Profesional Social Sandra Morato no le brindó la información general del proyecto, el estado del mismo, ni el conducto regular de entrega de la información a la Interventoría para su aprobación, como tampoco los documentos, procedimientos contractuales. Situaciones que se ven reflejadas en la interacción con la comunidad en el manejo de la información y en la entrega de los procedimientos ante la Interventoría.

- **Estado de cumplimiento del componente social frente al cronograma general del Proyecto:**

Tabla 23. Estado de Cumplimiento del Componente Social

Actividad	**Estado**
Atención a la Comunidad	Se dio apertura a la oficina el 15 de agosto del 2025, la cual no cuenta con número de teléfono dispuesto para la oficina de Atención a la Comunidad, ya que la Profesional Social le ha tocado disponer de su número de contacto personal.
Información y Divulgación: Reunión de inicio Piezas comunicativas Puntos	• Debido a la tardanza del inicio de la etapa de ejecución del proyecto el Contratista no ha cumplido con esta actividad. • Durante el presente mes el Contratista envió la encuesta de aplicación a la comunidad, la cual quedó

Satélites de información-PSI	aprobada por parte de la Interventoría el 12 de agosto del 2025, la cual no ha sido enviado el resultado de esta y tampoco se ha dado respuesta el estado actual de esta. • Los volantes presentados durante el mes en su totalidad fueron aprobados por la Interventoría, pero se evidencia que no acatan las observaciones de los anteriores volantes, ya que son reiterativas las observaciones. • Las piezas comunicativas de actas de vecindad no fueron aprobadas ya que no contaban con la información pertinente a dicha actividad. Por tanto, se encuentran en ajustes por el Contratista. • Referente a los Puntos Satélites de Información-PSI, el Contratista durante el mes realizó actualización y mantenimiento de estos el 20 de agosto del presente año, en el que se retiró la avante de director de obra y se instaló nuevamente el afiche informativo del proyecto.
Manejo de Infraestructura	• En los Comités Sociales desarrollados en el presente mes de agosto se reiteró • al Contratista la entrega de las metodologías de las actas de vecindad y las actas de entorno, las cuales fueron enviadas el 13 de agosto y no fueron aprobadas debido a que no contemplaban lo estipulado en el PAGA. • El Contratista no ha culminado la consecución de los números de contacto de los propietarios de los predios susceptibles para realización de actas de vecindad. • El Contratista no ha dado inicio con la elaboración de las actas de vecindad y actas de entorno, las cuales deben realizarse previo a las actividades de ejecución del proyecto.

Cultura Vial y Participación Comunitaria: Espacios de Participación Comunitaria	• En el informe del mes de julio el Contratista se comprometió a enviar la metodología de los talleres y espacios de participación comunitaria para revisión y aprobación por parte de la Interventoría, para el mes de agosto, pero dicha actividad no se cumplió. • El Contratista ha venido actualizando el directorio telefónico de líderes comunitarios y demás actores sociales referentes al proyecto.
Contratación de mano de obra:	• De acuerdo con los volantes aprobados se conoció de las vacantes laborales de ayudante de obra que se requieren para los Municipios de Susa, Ubaté y Tausa. • En los informes entregados por parte del Contratista de los meses junio y julio no fue claro el proceso de contratación local, ni el número preciso del personal del área de influencia del proyecto contratado, observaciones que fueron realizadas y por consiguiente a la fecha no se cuenta con la aprobación de dichos informes, como tampoco se conoce el personal contratado para el mes de agosto en la Provincia de Ubaté. • Se le ha reiterado al Contratista que debe tener claro el proceso de convocatoria y contratación, lo cual se debe contar con la trazabilidad del debido proceso.

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Ver Anexo. 6 Informe Social – Ubate

- **Trazabilidad Piezas Comunicativas**
- **Trazabilidad metodología de Actas de Vecindad**

Acompañamiento territorial

La Interventoría en el mes de agosto realizó el acompañamiento y verificación de la instalación de piezas de comunicación dispuestos en la Provincia de Ubaté.

Instalación y seguimiento de Planes Sociales de Información (PSI).

El contratista cuenta con cinco (5) Puntos Satélite de Información instalados en la Provincia de Ubaté. Es pertinente mencionar que el Contratista durante el mes de agosto sólo realizó un (1) mantenimiento y la publicación de un afiche informativo del proyecto.

Tabla 24. Puntos Satélites de Información-PSI Ubate

No.	Nombre del Establecimiento	Ubicación	Municipio	Contacto
1	Tienda Pola y Rana	Barrio San Gil-	Municipio de Susa	Expedito Predes 3219721764
2	Tienda la Caseta Roja	Vereda el Pantano	Municipio de Simijaca	Paula Hernández 3104860108
3	Tienda donde Angela	Vereda Patera Centro	Municipio de Ubaté	María Inés Franco 3132893749
4	Tienda la Y	Vereda Pajarito	Municipio de Tausa	Jackeline Aguirre 3003830839
5	Tienda Tres Esquinas	Vereda Rasgata	Municipio de Tausa	Mónica Hernández 3212576971

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

De igual forma, el Consorcio Intervial ICCU-050 realizó seguimiento a los Puntos Satélite de Información instalados por el contratista. A continuación, se presenta el registro fotográfico realizado por la Interventoría:

Tabla 25. Puntos Satélites de Información

No.	Fecha	Nombre del Establecimiento	Ubicación	Contacto	Pieza Comunicativa

1	20-08-25	Tienda Pola y Rana	Barrio San Gil-Municipio de Susa	Expedito Predes 3219721764	• Afiche Informativo del Proyecto. • Mantenimiento del PSI.
2	20-08-25	Tienda la Caseta Roja	Vereda el Pantano Municipio de Simijaca	Paula Hernández 3104860108	• Afiche Informativo del Proyecto. • Mantenimiento del PSI.
3	20-08-25	Tienda donde Angela	Vereda Patera Centro Município de Taubaté	María Inés Franco 3132893749	• Afiche Informativo del Proyecto. • Mantenimiento del PSI.
4	20-08-25	Tienda la Y	Vereda Pajarito Municipio de Tausa	Jackeline Aguirre 3003830839	• Afiche Informativo del Proyecto. • Mantenimiento del PSI.
5	20-08-25	Tienda Tres Esquinas	Vereda Rasgata Municipio de Tausa	Mónica Hernández 3212576971	• Afiche Informativo del Proyecto. • Mantenimiento del PSI.

Recorridos en campo y reuniones comunitarias, Actas de vecindad e inventarios prediales:

Para el presente periodo se realizó recorrido de campo en compañía de la Profesional Social Sandra Morato, con el objeto de verificar la estructura de madera ubicada en la alcantarilla en el tramo de ejecución del Municipio de Susa. Mediante el cual se pudo constatar que los dueños de la estructura ya se encontraban retirándose.

En el mes de agosto del presente año no se realizaron reuniones comunitarias y tampoco se dio continuidad por parte del Contratista en la consecución de números de contactos de los propietarios faltantes en el inventario predial realizado.

Por otro lado, el Contratista no ha dado inicio con la programación y elaboración de las actas de vecindad de inicio y las actas de entorno de inicio.

Número de PQRS recibidas, estado y trámite:

Para el presente informe el Contratista YVY no recibió PQRS para la Provincia de Ubaté.

PROVINCIA DE ALMEIDAS

Síntesis de las actividades sociales más relevantes del mes de agosto de 2025.

Este informe tiene como finalidad evidenciar las diferentes actividades realizadas desde la gestión social en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, por parte de la Gestora Social del Consorcio Intervial ICCU 050 Diana Marcela Chavarrio Escobar, el cual tiene como objeto describir puntualmente los impactos identificados por parte del Contratista Consorcio YVY en coherencia al Plan de Adaptación a la Guía Ambiental PAGA, precisando el cumplimiento los siguientes subprogramas: Aclarando que aún en la provincia de Almeidas se encuentra en etapa de caracterización.

En el mes de agosto, la profesional Social del Contratista YVY brinda información en el punto de atención al usuario ubicada en la dirección Oficina 305 tercer piso del Centro Comercial Molino del Parque, Municipio de Chocontá, Departamento de Cundinamarca con horarios de atención jueves y viernes de 8:00am a 12:00pm y de 1:00pm a 4:00 pm, esto quiere decir que la atención se ejecuta dos veces por semana, actividad que se contrasta por parte de la Profesional Social del Consorcio Intervial ICCU 050 Diana Marcela Chavarrio Escobar, realizando visitas al punto de atención verificando que efectivamente la oficina se encuentren en servicio en los días y horarios remitidos en los cronogramas semanales, las piezas informativas se encuentran expuestas en un lugar visible al exterior de la oficina, se lleve el registró de control de visita de los usuarios, que las líneas de comunicación se encuentren activas igual que los correos electrónicos y la profesional Social cuente con la dotación entregada por el Contratista para su respectiva identificación, por lo anteriormente mencionado, se evidencia por parte de la Interventoría el cumplimiento dichas actividades.

En cuanto a la atención y dar respuestas a las inquietudes, quejas y reclamos dadas por la comunidad y las instituciones del área de influencia del proyecto, para este mes no se presentaron novedades ni PQR´ s.

En el desarrollo de estrategias de acercamiento a la comunidad en este periodo se realizó dos salidas a campo en compañía de la profesional Social del Contratista a los tres municipios de la provincia de Almeidas, realizando actualización de las piezas comunicativas las cuales tienen información relevante sobre el proyecto y las vacantes laborales que son de interés para la comunidad, de igual manera se comparte la información por diferentes vías de comunicación con los presidentes de las JAC, grupos de información de las veredas, secretarios de planeación y Alcaldías municipales, esta estrategia ha resultado efectiva para dar respuesta a la comunidad, fortaleciendo las relaciones y generando confianza entre la población y el proyecto.

Durante este periodo las profesionales Sociales de las provincias de Ubaté, Rionegro y Almeidas del Consorcio Intervial ICCU 050, realizaron mesa de trabajo mediante la cual la interventoría indicó dos observaciones al informe de abril, las cuales fueron subsanadas por parte del contratista, se remite el Informe Social Abril N°1 y anexos para fines pertinentes y el día 5 de agosto se remite aprobación mediante el comunicado YVY-164-25 y se da respuesta con el Mediante la presente, el comunicado ICCU-S-184-2025 – "Respuesta de Aprobación al comunicado YVY-164-25. Informe mensual 1 de abril", y a su vez se realiza revisión al Informe del mes de julio con las observaciones pertinentes por parte de las profesionales Sociales de la Interventoría para su respectiva subsanación.

Estas actividades Sociales se plasman en informes semanales, donde se describen las actividades realizadas durante el periodo según calendario, y otro informe mensual el cual se remite los primeros días del mes siguiente en el que se describe detalladamente el total de las actividades realizadas por las tres provincias, Ubaté, Rionegro y Almeidas y que a su vez se soportan con anexos como: evidencias fotográficas, documentación, oficios y correos electrónicos, para la revisión y aprobación por parte del Ingeniero del Consorcio Intervial ICCU 050.

Hallazgos principales Almeidas.

En la provincia de Almeida, durante el mes de agosto, en el Punto de Atención al usuario, se evidenció que, en la primera semana de atención, que fueron los días 6 y 8 del

presente mes, la profesional social del contratista lleva el registro de visitas de usuario y aún desconoce parte de los documentos que se deben revisar y ajustar para la respectiva aprobación por parte de las profesionales sociales del consorcio Intervial ICCU 050.

El área social y técnica del Consorcio Intervial ICCU 050 y Consorcio YVY realiza recorrido en el municipio de Chocontá, en el cual se evidencia por parte de la profesional social de Interventoría, Diana Chavarrio, que la profesional social del contratista Nancy Riascos desde el inicio del recorrido presenta inconsistencias en el procedimiento a requerido para el desarrollo de la actividad.

No cuenta con listado de asistencia para llevar registro de los profesionales que acompañan el recorrido y por esta razón la profesional social del consorcio Intervial ICCU 050 le solicita un formato para recolectar la información.

No cuenta con el Formato de control de Puntos Satelitales.

Está actualizando PSI (Puntos de Información Satelital) con piezas comunicativas de Ayudante de Obra e inicio de Actividades Complementarias, sin estar aprobados por el área social del consorcio Intervial ICCU 050.

En el cronograma remitido por el contratista el día 22 de agosto de 2025, para la semana comprendida entre el 25 y el 29 de agosto de 2025, no informan que se realizará recorrido de actualización de los PSI (Puntos de Información Satelital) en los municipios de Manta y Chocontá el día 26 de agosto de 2025, y el 27 de agosto de 2025 en el municipio de Sesquilé. Por tal motivo, no se están cumpliendo los compromisos tratados en los Comités Sociales. En estos comités, se solicita al consorcio YVY remitir esta información dentro de los cronogramas semanales para que el Área Social del consorcio Intervial ICCU 050 pueda realizar el acompañamiento.

Se evidencia que el consorcio YVY no cumplió con el compromiso de colocarle plástico a los PSI (Puntos de Información Satelital) y, durante el recorrido, se verifica que las piezas de información colocadas allí se encuentran en mal estado, se encuentran mojadas, no se puede leer la información, faltan piezas informativas y, en general, se encuentran en mal estado.

Los profesionales del Área Técnica y Social no cuentan con la dotación ni identificación que permitan relacionarlos con alguna entidad.

- **Estado del cumplimiento del componente social frente al cronograma general del proyecto.**

Tabla 26. Estado de Cumplimiento del Componente Social Almeidas

Actividad	Estado
Atención a la Comunidad	En el mes de agosto, brindo atención a la comunidad en la oficina de atención al usuario dos (2) veces por semana, es decir, 8 días al mes, horarios de atención: jueves y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Quien está al frente de la oficina es la profesional del consorcio YVY, Nancy Riascos.
Información y Divulgación: Reunión de inicio Piezas comunicativas Puntos Satélites de información-PS	La metodología de divulgación por parte del consorcio YVY, en la provincia de Almeida, ha tenido acogida por parte de la comunidad, presidentes de las JACs, secretarios de planeación, alcaldías y demás entidades territoriales, ya que, a través de correos electrónicos, grupos de WhatsApp, llamadas telefónicas, atención personalizada en los puntos de atención al usuario, se ha emitido información acerca del proyecto. • La reunión de inicio no ha sido posible por retrasos en los cronogramas de los profesionales técnicos del contratista. • Durante este mes se han remitido diferentes piezas comunicativas, las cuales a la fecha cuentan con la aprobación de interventoría para su divulgación; no obstante, se les ha sugerido a las profesionales de contratista remitir la información al mismo tiempo para las tres (3) provincias, que estas piezas se trabajen sobre la misma estructura, que tengan presente la información de envío (es decir, a qué provincia está dirigida), que antes de enviarlas se reúnan y consoliden la información, evitando retrocesos en el ejercicio. • El día 26 de agosto de 2025, se realizó la actualización de las PSI (Puntos Satelitales de Información) en los municipios de Manta, Chocontá y Sesquilé. En ese momento no se contaba con la aprobación de las piezas comunicativas para las vacantes de obra de mano no calificada, y en el cronograma no se evidenciaba la salida a esta actividad; por tanto, se informó a la coordinadora social y profesional social del

	contratista que esta actividad, que estas piezas comunicativas, no podrían ser colocadas en los PSI.
Manejo de Infraestructura	• Por parte del Contratista, fue enviada la propuesta de Metodología de Actas de Vecindad y de entorno, las cuales se remitieron con las observaciones pertinentes para su ajuste y posterior remisión.
Cultura Vial y Participación Comunitaria: Espacios de Participación Comunitaria	• En la provincia de Almeidas por retrasos en el proyecto estas actividades no se han podido ejecutar, en reiteradas ecuaciones en los Comités Sociales se ha reiterado la importancia de dar ejecución y avances a estos programas, evitando inconformidades entre la Interventoría, Contratista y población en el cual se desarrolla el proyecto.
Contratación de mano de obra	• la fecha, solo se ha realizado contratación de mano de obra no calificada en el municipio de Manta para limpieza de alcantarillado; son 5 personas contratadas, entre ellas una mujer, las cuales cuentan con registro de residencia del municipio.

- **Acompañamiento territorial Almeidas**

Durante este mes se realizó acompañamiento a la profesional del contratista Nancy Riascos a la actualización de los PSI (Puntos de Información Satelital) el día 26 de agosto de 2025, en los municipios de Chocontá, Sesquilé y Manta.

- **Instalación y seguimiento de Planes Sociales de Información (PSI) Almeidas**

Los PSI (Puntos de Información Satelital) de la provincia de Almeidas se encuentran ubicados uno (1) para el municipio de Chocontá, uno (1) para Sesquilé y dos para el municipio de Manta, y a los cuales se le brinco acompañamiento a la profesional Social del Contratista para su actualización.

Tabla 27. Puntos Satélites de Información

No.	Fecha	Nombre del Establecimiento	Ubicación	Contacto	Pieza Comunicativa
1	26-08-25	Tienda Doña Martha	Municipio de Chocontá, Vereda Agua Caliente	3122291007	• Afiche Informativo del Proyecto. • Mantenimiento del PSI.
2	26-08-25	Tienda	Municipio de Sesquilé Vereda Tierra negra	3138680539	• Afiche Informativo del Proyecto. • Mantenimiento del PSI.
3	26-08-25	Tienda	Municipio de Manta Casa Familia Torres	3202200232	• Afiche Informativo del Proyecto. Mantenimiento de PSI

- Recorridos en campo y reuniones comunitarias, Actas de vecindad e inventarios prediales (si aplica).

  NO APLICA

- Número de PQRS recibidas, estado y trámite.

En el periodo transcurrido del 1 al 31 de agosto no se registraron PQRS por parte del Consorcio YVY

PROVINCIA DE ALMEIDAS

- **Actividades pendientes o reprogramadas Almeidas**

El día 26 de agosto durante la instalación de los PSI (Puntos de Información Satelital), Se reprograma la actualización de estas piezas comunicativas, ya que al momento de la instalación no se encontraban aprobadas por le Interventoría. Esta actividad se programó para el 3 de septiembre.

Se está en la espera de la respuesta del contratista frente a las observaciones realizadas a la metodología de actas de vecindad y actas de entorno, las cuales serán remitidas la primera semana de septiembre.

El área social del Contratista enviará a la Interventoría las actividades previas del inicio de la etapa de ejecución de las obras, las cuales están descritas en el PAGA.

Se está en la espera en la instalación del buzón de sugerencia, el cual se debe instalar en cada Punto de Atención al Ciudadano, la Social del Contratista se comprometió a colocarlo el 4 de septiembre de 2025.

- **Situaciones sociales relevantes del mes Almeidas**

En este periodo se presentaron situaciones que causaron confusión con las profesionales sociales del contratista, en especial en la provincia de Almeida. Esto es porque, antes de iniciar sus actividades contractuales, no cuentan con capacitaciones previas que les permitan identificar las funciones y actividades, lo cual genera un retroceso en el envío de información, respuesta a correos en los tiempos indicados, no tener claro la aplicación de los formatos, quién se debe decepcionar la información, etc.

Se ha reiterado por correos electrónicos, en Comités Sociales, el envío de información que compete a las tres provincias en la misma fecha, ya que la recepción de esta información se remite para cada provincia en fechas diferentes, lo cual impide y limita. Su revisión y aprobación.

Se sugiere insistentemente que las piezas publicitarias se actualicen sobre las que ya han sido aprobadas para evitar realizar las mismas observaciones a un trabajo realizado previamente; estas acciones generan retrocesos sustanciales en la revisión y aprobación de las mismas.

Durante este mes no se han presentado bloqueos ni solicitudes por parte de la comunidad, se aclara que cada semana en él envió del cronograma semanal remitidos por parte del Contratista todos los viernes, se informe si recibieron PQRS, observaciones, quejas o reclamos.

Actividades del Contratista Almeidas

Subprograma de Atención a la Comunidad Almeidas

El punto de Atención al Usuario en el municipio de Chocontá se encuentra se encuentra ubicada en el Centro del municipio a un frente del parque Principal y a un costado de la Alcaldía, cuenta con las condiciones mínimas establecidas para la seguridad de los usuarios: escaleras de libre concurrencia, escaleras de emergencia, ascensor, tres entradas y salidas, baños para hombres y mujeres, extintores, botiquines y demás elementos que permiten reaccionar ante cualquier eventualidad.

horarios de atención: jueves y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. Quien está al frente de la oficina es la profesional del Consorcio YVY, Nancy Riascos.

Tabla 28. Canal de Atención a la Comunidad

Medio de Atención	Canal	Línea telefónica	Punto de Atención a la Comunidad
Correo electrónico	socialalmeidas.consorcioyvy@gmail.com	3232264673	Carrera 5 3#14-22 Centro Comercial el Molino del parque oficina 305.

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Ver Anexo 6. Informe Social - Almeidas

- **Punto de atención al usuario municipio Chocontá**
- **Imagen 1. Punto de Atención a la Comunidad Provincia de Ubaté**
- **Contrato de arriendo Oficina de Atención a la Comunidad**

Subprograma de Información y Divulgación:

Reunión de inicio Almeidas

A la fecha no se racializado reuniones de inicio de etapa de ejecución en ninguno de los municipios de la provincia de Almeidas, el Contratista alega retrasos en la ejecución por parte del área técnica y falta de profesionales para la ejecución.

Volantes Informativos Almeidas

Hasta el momento estas piezas de divulgación no han sido remitidas por parte de la profesional Social del Contratista, ya inicio la aplicación de la encuesta, pero hasta el momento no remite información de cómo, cuándo y dónde se genera esta información.

Puntos Satélites de Información-PSI Almeidas

Se solicito otro PSI (Punto Satelital de Información) en el municipio de Sesquilé, ya que el tramo es de 17,5 km de intervención y su extensión lo requiere y que toda la comunidad esta informada acerca del proyecto y sus avances.

Subprograma de Contratación de Mano de Obra:

Población Reintegrada.

El Contratista para este periodo reporto que los 5 ayudantes de mano de obra no calificada contratados en el municipio de Sesquilé para limpieza de alcantarillas no pertenecen a ningún grupo de desmovilización ni de reinserción, a lo cual se le ha solicitado en varias oportunidades a la Social del Contratista remitir el registro de residencia, el cual acredita el domicilio de una persona en un lugar específico.

Mano de Obra No Calificada.

Durante este periodo no se ha remitido por parte del contratista, información de nuevas vinculaciones laborales.

Hojas de vida.

El contratista no ha reportado en este periodo la recepción de hojas de Vida por ningún canal de información dispuesto por ellos como: en el Punto de Atención al usuario, correos electrónicos, WhatsApp y vías telefónicas.

3.4.7 Actas de vecindad LOTE 2

Tabla 29. Actas de vecindad

Actas de Vecindad Municipio	Total	Estado
Tausa	35	Pendiente por programar
Ubaté	44	Pendiente por programar
Simijaca	14	Pendiente por programar
Susa	14	Pendiente por programar

Actas de Vecindad de Inicio.

De acuerdo a lo Contractualmente estipulado en el Contrato, para el mes de agosto, el Contratista no ha realizado las actas de vecindad de inicio, las cuales deben estar realizadas antes del inicio de la etapa de ejecución del proyecto, en donde la Interventoría en los Comités Sociales del presente mes le solicitó reiterativamente la entrega de la metodología y la programación de las mismas, en donde sólo se cuenta con la metodología la cual se encuentra en ajustes por parte del Contratista Y, por ende no se cuenta con la programación de la realización de las actas de vecindad.

El Contratista radicó ante la oficina de Planeación e Infraestructura del Municipio de Simijaca y a la oficina de Gestión del Riesgo de este mismo Municipio, el reporte del estado del puente vehicular en la vía Retén el Pantano y el estado de estructura del municipio de Simijaca.

Ver Anexo 6. Informe Social

- **Reporte Municipio de Simijaca**

Actas de vecindad de Entorno de Inicio.

De acuerdo a lo Contractualmente estipulado en el Contrato, para el mes de agosto, el Contratista no ha realizado las (48) actas de vecindad de entorno de inicio, las cuales deben estar realizadas antes del inicio de la etapa de ejecución del proyecto, en donde la Interventoría en los Comités Sociales del presente mes le solicitó reiterativamente la entrega de la metodología y la programación de las mismas, en donde sólo se cuenta con la metodología la cual se encuentra en ajustes por parte del Contratista Y, por ende no se cuenta con la programación de la realización de las actas de entorno de inicio.

Hojas de vida.

El Contratista para la fecha de cierre del presente informe no ha reportado las hojas de vida allegadas al proyecto por parte de la ciudadanía correspondientes a la Provincia de Ubaté, de los Municipios de Susa, Tausa, Simijaca y Ubaté.

Situaciones sociales relevantes del mes:

Se evidencia rotación de Profesionales Sociales en corto plazo.

2. Las Profesionales Sociales que ha venido contratando el Contratista YVY desde el inicio del proyecto, no han recibido la correspondiente información del proyecto como los procesos de envío de documentación y demás información al Consorcio Intervial ICCU-050, para su correspondiente revisión y aprobación por parte de la Interventoría.

3. Se percibe que las Profesionales Sociales del Contratista YVY no manejan la información del proyecto; (Avances, estado, ni documentos contractuales, ni documentos aprobados, como tampoco los informes mensuales).

4. El Contratista YVY está instalando piezas comunicativas y demás información del proyecto en los Puntos Satélites de Información-PSI sin ser enviados a revisión y aprobación por parte del Consorcio Intervial ICCU-050.

5. Las Oficinas de Atención al Ciudadano no cuentan con un número de teléfono establecido para cada una de las Provincias, ya que, el que está para dichas oficinas es el número personal de la de la Profesional Social de la Provincia de Almeidas que recién contrataron (Nancy Riasco) o en su defecto están colocando el de alguien administrativo de la oficina del Contratista YVY ubicada en la Ciudad de Bogotá; situación que al momento de que la comunidad llame a pedir información del proyecto o a pedir información de las vacantes laborales para cualquiera de las Provincias, no hay quien les brinde la información oportuna, acertada y clara para las correspondientes Provincias.

6. Se percibe que entre las Profesionales Sociales del Contratista YVY, no hay un consenso en la información, ni en los procesos que realizan; ya que se evidencia tanto en los informes mensuales, como en la información que envían para cada una de las Provincias la no continuidad de los procesos.

Tabla 30 Relación correspondencia del mes de agosto 2025

N.º	FECHA	CONSECUTIVO	ASUNTO	ENVIADA/RECIBIDA
1	06-08-2025	YVY-185-25	Respuesta a comunicado ICCU-S-157-2025, atención a observaciones informe N°3 – Contratista.	Recibida en la Interventoría por radicación del Contratista YVY.
2	10-08-2025	YVY-190-25	Entrega informe mensual N° 4 correspondiente a julio 2025.	Recibida en la Interventoría por radicación del Contratista YVY.
3	11-08-2025	ICCU-S-184-2025	Respuesta de Aprobación al comunicado YVY-164-25. Informe mensual 1 abril.	Enviada al Contratista YVY por la Gestión Social de Interventoría.

4	20-08-2025	ICCU-S-196-2025	Respuesta a comunicación YVY-181-25 - Remisión hojas de vida etapa de ejecución.	Enviada al Contratista YVY por la Gestión Social de Interventoría.
5	21-08-2025	YVY-206-25	Notificación de ajustes de asignación de personal (Contrato ICCU-139).	Recibida en la Interventoría por radicación del Contratista YVY.
6	26-08-2025	YVY-215-25	solicitud de aprobación para cambio de cargo en el equipo de trabajo (Contrato ICCU-139).	Recibida en la Interventoría por radicación del Contratista YVY.

Fuente: Consorcio Intervial ICCU-050

Conclusiones Ubate

- Se estableció un punto físico de atención en el Municipio de La Palma y se habilitaron canales de comunicación (correo y teléfono).
- No se recibieron PQRSD en agosto, lo que podría indicar una buena comunicación o que aún no han surgido problemas graves.
- Se aprobaron y revisaron piezas informativas, y se actualizaron los Puntos Satélite de Información (PSI) en el Municipio de Yacopí.
- Se realizó un inventario de 54 predios para la elaboración de actas de vecindad, un paso importante previo al inicio de las obras.
- Se realizaron convocatorias para mano de obra local en la Provincia de Rionegro y se contrató a un topógrafo de mano de obra calificada.
- Aún no se evidencia la contratación de ayudantes de obra, a pesar de las convocatorias.
- Hay una falta de comunicación entre las áreas del contratista YVY, lo que causa demoras y la difusión de información sin la aprobación de la interventoría.
- El contratista no ha cumplido con la entrega de metodologías para los talleres y espacios de participación. Tampoco ha finalizado la obtención de datos de los propietarios de predios para las actas de vecindad y aún no ha comenzado a elaborarlas, lo que podría retrasar el inicio de la obra.

- No se ha habilitado un número de teléfono exclusivo para la oficina de atención de la Provincia de Almeidas y Ubaté, lo que obliga a la profesional social a usar su número personal, una situación que ha sido señalada repetidamente por la interventoría sin una solución aparente.
- No se tiene claridad sobre el proceso de contratación de mano de obra local y la cantidad exacta de personal contratado en la Provincia de Almeidas y Ubaté.
- El contratista ha abierto un punto de atención en Chocontá con condiciones de seguridad adecuadas. El horario de atención es jueves y viernes, y se han habilitado canales de comunicación como un número de teléfono y un correo electrónico.
- No se han realizado reuniones de avance o finalización. El contratista alega retrasos técnicos y falta de personal. No ha remitido volantes informativos a la interventoría ni ha proporcionado información sobre la aplicación de encuestas.
- Se reportó la contratación de 5 ayudantes no calificados en Sesquilé, pero se ha solicitado al contratista el registro de residencia para verificar que sean de la zona. No se han reportado nuevas contrataciones ni recepción de hojas de vida.
- Se ha identificado falta de capacitación previa para las profesionales sociales del contratista, lo que genera confusión en sus funciones, retrasos en el envío de información y dificultades para cumplir con los procedimientos establecidos.
- Se ha reiterado al contratista la necesidad de enviar la información de las tres provincias (Ubaté, Rionegro y Almeidas) en la misma fecha para facilitar la revisión y aprobación por parte de la interventoría.
- El contratista presenta piezas publicitarias sin haber revisado y aplicado las observaciones previas de la interventoría, lo cual genera retrasos y un trabajo repetitivo.
- Se está a la espera de la instalación de los buzones de sugerencias en los Puntos de Atención al Ciudadano, programada para el 4 de septiembre.

Recomendaciones sociales Ubate

1. Se evidencia rotación de Profesionales Sociales en corto plazo, lo cual deben analizarlo lo cual es perjudicial para el proyecto.

2. Las Profesionales Sociales que ha venido contratando el Contratista YVY desde el inicio del proyecto, no han recibido la correspondiente información del proyecto como los procesos de envío de documentación y demás información al Consorcio Intervial ICCU-050, para su correspondiente revisión y aprobación por parte de la Interventoría. Lo cual es de vital importancia para evitar retrasos administrativos.

3. Se percibe que las Profesionales Sociales del Contratista YVY no manejan la información del proyecto; (Avances, estado, ni documentos contractuales, ni documentos aprobados, como tampoco los informes mensuales). Se debe brindar capacitación para fortalecer los procesos.

4. El Contratista YVY está instalando piezas comunicativas y demás información del proyecto en los Puntos Satélites de Información-PSI sin ser enviados a revisión y aprobación por parte del Consorcio Intervial ICCU-050. Se recuerda que todo debe ser aprobado por interventoría, de lo contrario no tendrán ninguna validez.

5. Las Oficinas de Atención al Ciudadano no cuentan con un número de teléfono establecido para cada una de las Provincias, ya que, el que está para dichas oficinas es el número personal de la de la Profesional Social de la Provincia de Almeidas que recién contrataron (Nancy Riasco) o en su defecto están colocando el de alguien administrativo de la oficina del Contratista YVY ubicada en la Ciudad de Bogotá; situación que al momento de que la comunidad llame a pedir información del proyecto o a pedir información de las vacantes laborales para cualquiera de las Provincias, no hay quien les brinde la información oportuna, acertada y clara para las correspondientes Provincias.

6. Se percibe que entre las Profesionales Sociales del Contratista YVY, no hay un consenso en la información, ni en los procesos que realizan; ya que se evidencia tanto en los informes mensuales, como en la información que envían para cada una de las Provincias la no continuidad de los procesos.

3.5 Salud y Seguridad en el Trabajo (SST)

Durante el cuarto mes de ejecución del proyecto en el periodo comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2025, se realizó una inducción al Especialista hidráulico nuevo de Interventoría, así como los respectivos exámenes de ingreso, de igual manera se implementan actividades de SST al personal y la ejecución del plan de trabajo del mes respectivo.

Por su parte el contratista, realizo actividades en campo de limpieza de alcantarillas el cual continuaron en los municipios de Ubaté, Susa y Manta.

A continuación, se relaciona punto por punto la ejecución de las actividades de parte de la Interventoría.

3.5.1 Listado de personal de interventoría

Durante el periodo se presentaron las hojas de vida de los profesionales para la etapa de ejecución, resaltando que una parte del personal tiene contrato con la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia, firma que hace parte del CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050 y el resto está contratado directamente por el Consorcio, a continuación, se relaciona el personal incorporado en el desarrollo del cuarto mes de la etapa de ejecución del proyecto con sus respectivas dedicaciones:

Tabla 31. Listado de personal de interventoría

PERSONAL MINIMO REQUERIDO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	EMPRESA CONTRATANTE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDGAR MAURICIO BELTRAN CARDENAS	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	60%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CAROLINA PEÑA LOPEZ	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ALVARO HERNAN NEIRA GIRON	OPS	50%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	DIEGO FERNANDO CAMACHO SUAREZ	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	80%
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	YESSICA PAOLA HERNANDEZ MENDEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	TANIA MELISA ESCOBAR VIRGUEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%

PROFESIONAL SISO 1	YESSICA PAOLA MORA TORRES	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	70%
SECRETARIA	HELEN SANCHEZ CORONADO	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	GIOVANNY ALEJANDRO BORRAEZ RODRIGUEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	40%
INSPECTORA DE INTERVENTORIA	ANGIE LORENA JIMENEZ OBANDO	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
TOPOGRAFO	JOHN JARBY ROZO SANCHEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	50%
PROFESIONAL INGENIERO DE APOYO	JUAN SEBASTIAN CRUZ ACEVEDO	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	DIANA MARCELA CHAVARRIO ESCOBAR	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	SANDRA JOHANA BENAVIDES BERMUDEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	50%
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	JONATHAN EDUARDO CASTAÑEDA	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	EDWIN ALEXANDER VARGAS MELGAR	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ADRIANA JOHANNA MEDIORREAL RAMIREZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	50%
INSPECTORA DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA MATIZ GOMEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
ESPECIALISTA AMBIENTAL	CARLOS ARTURO CHAPARRO SANCHEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	60%
ESPECIALISTA HIDRAULICO	FABIAN ESTEBAN RODRIGUEZ CARDENAS	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	40%

De acuerdo con el cuadro precedente, en el mes de agosto se registraron modificaciones en los cargos y en las dedicaciones asignadas según aprobación de parte de ICCU, las cuales se describen a continuación:

- La dedicación del director de Interventoría cambio al 60%
- La profesional SST cambia su porcentaje de dedicación al 70%
- El cargo del trabajador Edwin Vargas cambia a Residente de Interventoría
- Las profesionales sociales la dedicación cambia al 100%

3.5.2 Indicadores SST

Durante la ejecución del quinto mes del proyecto se realizó la medición de los indicadores del SGSST en la fase de ejecución del proyecto de acuerdo a lo establecido en la normativa colombiana Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.3 Actividades ejecutadas en obra

En el quinto periodo de la ejecución de actividades en obra relacionados en el componente SST se registra evidencia de campo de las actividades de limpieza de alcantarillas en los municipios de Susa, Ubaté y Manta.

En el mes de agosto no se realizaron reuniones de seguimiento desde el componente SST, ya que el profesional de apoyo de parte de ICCU Oscar Lamprea, se tuvo contacto vía telefónica (WhatsApp) el cual se recibió las indiciaciones respectivas de la información que debe contener el informe.

3.5.4 Plan de trabajo SST

En el presente informe se adjunta el plan de trabajo durante el periodo del mes de agosto de la ejecución de las actividades programadas. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.5 Inducción, Capacitación y Entrenamiento

Durante el mes de agosto se realizó una inducción del personal nuevo que ingreso en este periodo con sus respectivos soportes firmados por parte del profesional, por otro lado, se ejecutaron capacitaciones de sobre temas osteomusculares y pausas activas, capacitación sobre riesgo público, capacitación sobre seguridad vial y capacitación sobre equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.6 Documentos de ingreso y retiro

En el periodo del mes de agosto se registró 1 ingreso que a continuación se relaciona, (**Ver Anexo 7. Informe SST).**

Tabla 31. Documentos de ingreso y retiro

CARGO	TRABAJADOR	EMPRESA	FECHA DE INGRESO
INGRESOS			
ESPECIALISTA HIDRAULICO	FABIAN ESTEBAN RODRIGUEZ CARDENAS	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	01/08/2025

3.5.7 Seguridad social y pago de parafiscales

En el presente informe se adjuntan las planillas individuales del personal correspondiente al pago de la seguridad social de la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia y la planilla general del Consorcio Intervial ICCU 050.

Así mismo, se anexan las certificaciones del pago de parafiscales de las dos empresas que conforman el Consorcio firmados por el Revisor Fiscal y por parte del Consorcio firmada por el Representante Legal. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.8 Cálculo del IBC

En el presente informe se anexa el formato de cálculo de IBC con su respectiva firma del profesional SST y Representante Legal. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.9 Entrega de EPP

Durante el periodo no se realizó entrega de EPP

3.5.10 Gestión de peligros y riesgos

En el transcurso de la ejecución del quinto mes del proyecto se realizaron actividades relacionadas al riesgo psicosocial con una capacitación sobre equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral y una capacitación de riesgo biomecánico sobre una lotería de temas musculo-esqueléticas. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.11 Reporte e investigación de accidente de trabajo

En el mes de agosto no se presentó ningún accidente de trabajo. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.12 Copasst

Se realizo en el mes de julio la reunión del COPASST el día 28 de agosto de 2025 por parte de la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.13 Cocola

Se realizo en el mes de julio la reunión del COCOLA el día 20 de agosto de 2025 por parte de la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.14 Inspecciones

En el mes de agosto se realizaron de los elementos de emergencia de extintor y botiquín. **Ver Anexo 7. Informe SST.**

3.5.15 Seguimiento de actividades al contratista

En el mes de agosto iniciaron con las actividades de limpieza de alcantarillas por los municipios de Tausa y Manta, Susa ejecución de apiques y La Palma Topografía. Durante en el mes se presentaron inconvenientes por parte del contratista de acuerdo a los respectivos inicios de trabajo ya que no estaban recibiendo sus respectivos pagos de nómina.

Durante la ejecución de actividades en obra, se evidencio que al inicio la personal tenia los EPPS y la dotación correspondiente para el cumplimiento de las tareas por las cuales fueron contratados.

3.6 Gestión Predial

Durante el mes de agosto no se presentaron afectaciones prediales, dado que las actividades se limitaron a labores de limpieza en alcantarillas. A la fecha, no se han iniciado obras que generen este tipo de impactos, por lo cual no ha sido necesario elaborar actas de obra, actas de estado de predios ni gestionar permisos de trabajo con propietarios colindantes.

3.7 Gestión sostenibilidad

A la fecha, la etapa de ejecución del proyecto se encuentra pendiente y en proceso de empalme por parte del Contratista, dado que aún no se ha finalizado la fase de caracterización. Cabe señalar que la gestión de sostenibilidad no fue contemplada contractualmente en la etapa de caracterización ni en el anexo técnico, motivo por el cual no debía adelantarse en dicha fase. En este sentido, la sostenibilidad del proyecto estará a cargo del Contratista y se desarrollará en la segunda etapa (ejecución), estando sujeta a la revisión y aprobación de la Interventoría.

3.8 Sectorización del proyecto y modificaciones

Tabla 32. Sectorización de proyecto y modificaciones.

LA PALMA

LONG TRACK INICIAL ICCU	20.5	km
PH TRACK CAMPO	0.923	km
TRAMO CON DESCUENTO	19.577	km
SALDO	0.923	km

YACOPÍ

LONG TRACK INICIAL ICCU	20.15	km
T1	4.14745	km
T2	3.609	km
T3	13.61227	km
TOTAL TRAMOS	**21.36872**	
PH	1.22156	
TRACK CAMPO 3 TRAMOS INCLUYENDO DESCUENTOS POR PH	20.15	km

TOPAIPÍ

LONG TRACK INICIAL ICCU	23.2	km
PH TRACK CAMPO	2.92366	km
TRAMO CON DESCUENTO	20.27634	km
SALDO	2.92366	km
PH PROYECTADAS	2.05	km
PH EN PROCESO DE PROY	0.2	km
SALDO	5.17366	km

VILLAGOMEZ

LONG TRACK INICIAL ICCU	2.51	km
PH TRACK CAMPO	0.345	km
TRAMO CON DESCUENTO	2.165	km
SALDO	0.345	km

UBATÉ			TAUSA		
LONG TRACK INICIAL ICCU	7.8	km	LONG TRACK INICIAL ICCU	6.71	km
PH TRACK CAMPO	0.18062	km	PH TRACK CAMPO	0.73831	km
TRAMO CON DESCUENTO	7.61938	km	TRAMO CON DESCUENTO	5.97169	km
SALDO	0.18062	km	SALDO	0.73831	km
SUSA			SIMIJACA		
LONG TRACK INICIAL ICCU	6.71	km	LONG TRACK INICIAL ICCU	5.72	km
PH TRACK CAMPO	0.73831	km	PH TRACK CAMPO	2.26755	km
TRAMO CON DESCUENTO	5.97169	km	TRAMO CON DESCUENTO	3.45245	km
SALDO	0.73831	km	SALDO	2.26755	km
MANTA			CHOCONTÁ		
LONG	8.98	km	LONG TRACK INICIAL ICCU	8.64	km
PH	2.0343	km	TRACK CAMPO	9	KM
TRAMO CON DESCUENTO	6.9457	km	PH TRACK CAMPO	2.3347	km

TRAMO ADICIONAL	1.883	km	TRAMO CON DESCUENTO	6.6653	km
			SALDO	1.9747	km
SESQUILE					
LONG TRACK INICIAL ICCU	17.44	km			
TRACK CAMPO	17.35352	KM			
PH TRACK CAMPO	3.20548	km			
TRAMO CON DESCUENTO	14.14804	km			
SALDO	3.29196	km			

Nota: esta fue la identificación inicial de tramos realizada para obtener los puntos iniciales y finales, en la etapa de caracterización por parte del contratista se levantará a detalle la información de cada sector.

3.9 Socialización del proyecto

En el presente mes no se registran modificaciones en el proyecto. Este ya fue socializado con las alcaldías municipales y comunidades en los primeros meses de la vigencia, por lo que se mantiene la misma información en los informes. En caso de generarse alguna novedad o ajuste, se realizará la anotación correspondiente.

La identificación inicial de tramos realizada en marzo y abril de 2025 tuvo como propósito establecer los puntos de inicio y final de cada vía. El levantamiento detallado de la información de cada sector será desarrollado en la etapa de ejecución, bajo responsabilidad del contratista.

En las visitas de campo se elaboraron actas de localización y actas de reunión (ver Anexo 11 – Actas de reunión) con el fin de dejar constancia formal de las actividades. Las actas de reunión cuentan con las firmas respectivas, mientras que las actas de localización permanecen en revisión por parte de las alcaldías municipales y están pendientes de suscripción, motivo por el cual no se anexan en este informe.

Tabla 33. Socialización proyecto

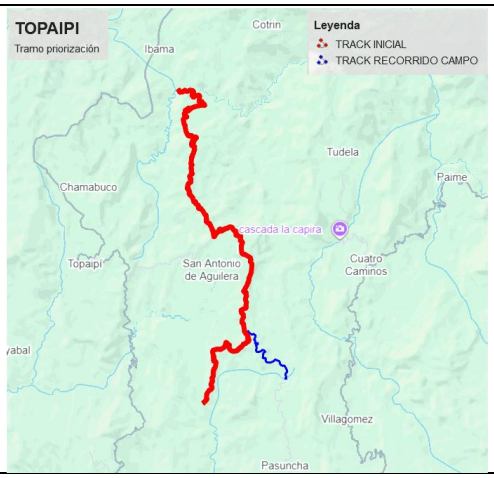
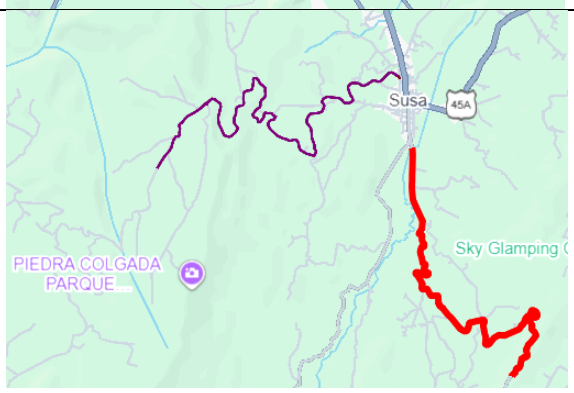
N° DE ACTA	FECHA	ASUNTO
4	19-mar-25	socialización proyecto LA PALMA
5	20-mar-25	socialización proyecto YACOPI
6	19-mar-25	socialización proyecto TOPAIPI
7	21-mar-25	socialización proyecto VILLAGOMEZ
13	31-mar-25	Socialización proyecto SUSA
14	7-abr-25	Socialización proyecto MANTA
15	29-mar-25	Socialización proyecto TAUSA
17	7-abr-25	Socialización proyecto CHOCONTA
18	8-abr-25	Socialización proyecto SESQUILE
19	31-mar-25	Socialización proyecto SIMIJACA
21	29-mar-25	Socialización proyecto UBATE

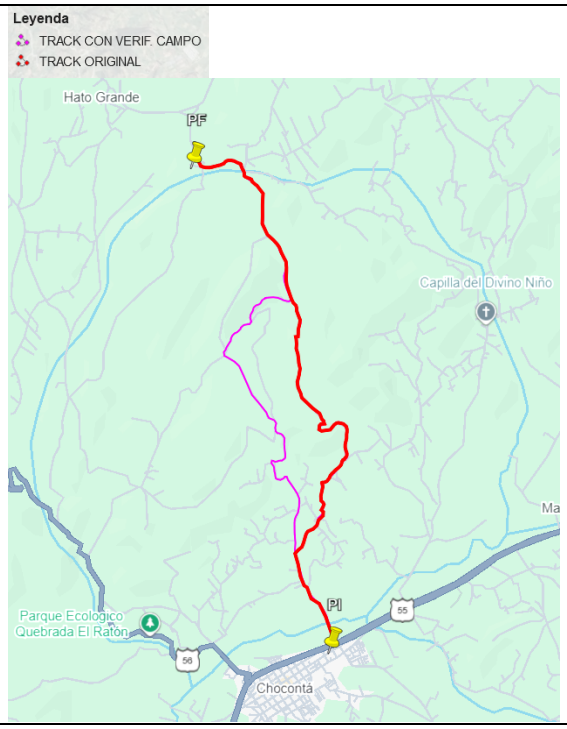
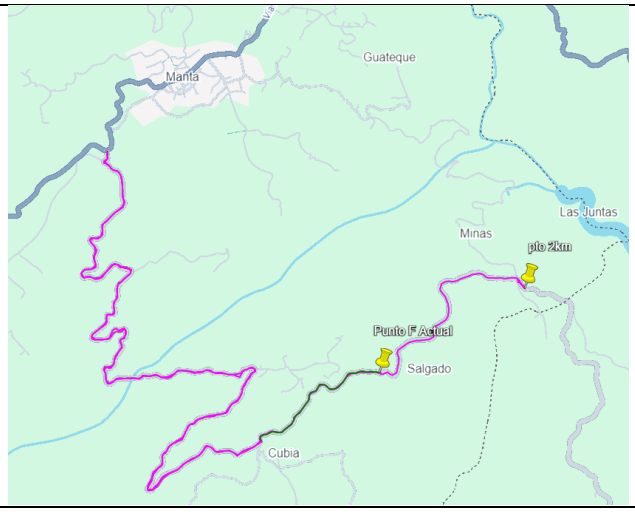
Como resultado de las socializaciones del proyecto, realizadas a las alcaldías municipales, se identificaron novedades en algunos de los tramos inicialmente definidos. Estas observaciones fueron debidamente informadas al ICCU durante la reunión del 10 de abril de 2025, según consta en el Acta de Reunión Nº10.

A la fecha, varias alcaldías aún no han suscrito las respectivas actas. Se les ha reiterado que permanecemos a la espera de sus firmas para poder dar por finalizado este componente y consolidar formalmente la información de los tramos priorizados. **Ver Anexo 11 Actas de reunión.**

Tabla 34. Novedades de acta N°10.

MUNICIPIO	NOVEDAD

TOPAIPI En la parte final del tramo se aclara por el alcalde y por el secretario de planeación que la ruta principal va por la parte señalada en color azul. En la reunión del 10 de abril de 2025 (Acta de reunión Nº10) con ICCU- Interventoría y contratista se informó por parte del ICCU que efectivamente el tramo principal es el señalado en azul.	
UBATÉ El punto señalado como PF2 tendría un cambio de ubicación por lo que está por definición Alcaldía – ICCU.	
SUSA La Alcaldía informa que pasará solicitud ante ICCU para que se priorice la vía que se presenta en color morado, por lo que según lo indicado por la entidad debe presentar una comunicación justificando debidamente la solicitud y la importancia de la vía seleccionada. Vía Susa - (Carmen de Carupa-las vueltas) vía la cual solicito el municipio en comunicado oficial al ICCU finalmente para intervención.	

CHOCONTA Se aclara por el alcalde y por el secretario de planeación que la ruta principal va por la parte señalada en color magenta.	
MANTA Se Informó por la Alcaldía que se solicitará ante el ICCU ampliación del tramo hasta la zona Y (minas). El tramo actual tiene 2km de placa huellas por lo que se evaluaría este caso.	

SIMIJACA Presenta 2 sectores del tramo con pavimentos existente el cual presenta fallas equivalentes a 2.26km por lo que en la reunión del 10 de abril de 2025 (Acta de reunión Nº10) se solicitó al contratista evaluar si dentro del balance del contratista es posible generar un APU de fresado y pasar una propuesta la vía se encuentra en tercer orden.	

3.10 Seguimiento ítems no previstos

Teniendo en cuenta que el contratista aún no ha iniciado la ejecución del contrato, a la fecha no se han generado ítems no previstos, sin embargo, se solicitó evaluar la posibilidad de realizar la actividad de fresado para los sectores de la vía del Municipio de Simijaca donde se presenta pavimento en estado de deterioro, para lo cual el contratista mediante Comunicación YVY-093-2025 de fecha 17 de junio de 2025 entrego los análisis de Precios No previstos para los ítems DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE PARA APIQUES DE CAMPO y FRESADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 5 CM DE ESPESOR. INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO, en el periodo se recibió el comunicado YVY-182-25 de respuesta por parte del contratista a las observaciones realizadas mediante comunicado ICCU-S-099-2025 al APU presentado inicialmente, así mismo se responde al contratista con el comunicado ICCU-S-192-2025 solicitando al Consorcio YVY revaluar la alternativa respecto al uso del cargador como equipo, considerado para la actividad de demolición del pavimento flexible, en la ejecución de apiques de campo, dado el bajo volumen de material demolido (1.00*1.00*.05=0.05 m3 por demolición en el sitio de apique) es decir casi 0.5 m3 para el total de apiques a realizar (1 cada 250 mts). Igualmente, así mismo reconsiderar la cantidad del personal para ejecución.

El seguimiento y control de las cantidades de obra ejecutadas se realizará una vez se inicie la etapa de ejecución y en caso de presentarse variaciones frente a lo aprobado inicialmente, se justificarán oportunamente conforme a lo establecido en los lineamientos contractuales y normativos. **Ver Anexo 9. Correspondencia.**

4 Reportes ejecución mensual contrato de obra

4.1 Informes semanales mes de agosto

Se anexan los informes semanales presentados en el periodo Ver Anexo. 1. Informes semanales agosto.

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra

En el periodo la Interventoría emitió respuesta a la relación del equipo mínimo disponible para la etapa de ejecución presentada por el contratista en el comunicado OFICIO YVY-171-25. La respuesta fue remitida con el comunicado ICCU-S-213-2025 del 29 de agosto 2025.

Tabla 35. Listado de equipos de maquinaria

Tabla 2 Lista de observaciones sobre los documentos de la maquinaria

MAQUINARIA	N° INTERNO	OBSERVACIONES
VIBROCOMPACTADOR	VC838	-
	VC912	No coincide el año del modelo indicado en la tarjeta de registro de maquinaria y la certificación de monitoreo y localización.
	VC913	No coincide el año del modelo indicado en la tarjeta de registro de maquinaria y la certificación de monitoreo y localización.
	VC923	No coincide el año del modelo indicado en la tarjeta de registro de maquinaria y la certificación de monitoreo y localización.
	VC925	-
EXCAVADORA	EX070	-
	EX069	-
	EX067	-
	EX026	La tarjeta de registro de maquinaria no es visible en su totalidad.
	EX002	No coincide el año del modelo indicado en la tarjeta de registro de maquinaria y la certificación de monitoreo y localización.
MOTONIVELADORA	MT738	En la certificación de monitoreo y localización no registra número de motor.
	MT988	-
	MT977	-
	MT376	La tarjeta de registro de maquinaria esta borrosa y no se encuentra la declaración de importación.
	MT045	-

El contratista remitió solicitud de ajuste en la capacidad en equipo mínimo comunicado OFICIO YVY-149-25, esta solicitud la realiza para el sector de Rionegro ya que en los documentos contractuales solo figura el Vibro compactador de 9 TN y el contratista manifiesta que debido a las condiciones de accesibilidad de algunos sectores principalmente en La Palma y Yacopí de la provincia de Río Negro se propone un Vibro compactador de 7 TN sin afectar la calidad de la Intervención a realizar. Al respecto la

Interventoría mediante comunicado ICCU-S-212-2025 del 29 de agosto 2025, indica que para saber las características del equipo mínimo es necesario conocer los espesores de capa que se tiene previstos compactar en los tramos mencionados.

4.3 Personal, control Aporte Legales y seguridad social contrato de obra

Este documento se encuentra anexado en el Informe SST, dentro del apartado de documentación del contratista. **Anexo informe 7 SST**.

4.4 Control de aportes legales y seguridad social

En el presente informe se adjuntan las planillas individuales del personal correspondiente al pago de la seguridad social de la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia y la planilla general del Consorcio Intervial ICCU 050. **Ver anexo 7 Informe SST**.

Así mismo, se anexan las certificaciones del pago de parafiscales de las dos empresas que conforman el Consorcio Intervial ICCU 050 firmados por el Revisor Fiscal y por el Representante Legal. Ver anexo control de aportes y seguridad social.

4.5 Informe financiero y presupuestal contrato de obra

Dado que el contratista continúa desarrollando actividades de la etapa de caracterización, el seguimiento financiero se mantiene con base en el presupuesto presentado el 1 de abril de 2025 mediante el comunicado YVY-039-25, en el cual se reporta la incidencia de las actividades del cronograma de caracterización para el seguimiento de avances en su versión 2. Con dichos porcentajes, la interventoría realiza el control correspondiente.

En el periodo anterior, se recibió el presupuesto para la etapa de ejecución, considerando los inventarios realizados y la actualización de las obras de drenaje (Oficio YVY-134-25 del 9 de julio de 2025). No obstante, mediante comunicado YVY-134-25 del 25 de julio de 2025, la interventoría advirtió que dicho presupuesto no adjuntaba las memorias de cálculo, especialmente en lo relacionado con las cantidades de concreto, las cuales requieren del diseño de alcantarilla tipo para su verificación. En consecuencia, se solicitó la entrega de la propuesta de intervención de las obras de drenaje y las cantidades de obra para las alcantarillas que demandan recursos adicionales.

Adicionalmente, el 5 de agosto de 2025 se llevó a cabo una reunión entre el contratista y la interventoría (Acta N° 35), en la cual se reiteró la necesidad de que el contratista presente una propuesta integral, dado que, conforme a los inventarios levantados, las cantidades contractuales previstas para el mantenimiento y ejecución de alcantarillas resultan insuficientes. Por lo anterior, el contratista iniciará visitas de verificación en campo con el fin de estructurar y presentar la propuesta de reemplazo de alcantarillas.

Ver tabla 8. Mantenimiento de alcantarillas

A la fecha de corte del presente informe, el Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca – ICCU aprobó el uso del anticipo mediante el comunicado ICCU-S-2025-0006010 del 28 de agosto de 2025, en respuesta a la comunicación ICCU-S-188-2025 titulada "Solicitud de desembolso anticipo No. 1".

Posteriormente, el 29 de agosto de 2025, a través del comunicado ICCU-S-2025-0006072, en respuesta a la comunicación ICCU-S-210-2025 con asunto "Respuesta al Comunicado ICCU-S-2025-0006043 – Solicitud de uso de anticipo No. 2", se autorizó el uso de los recursos correspondientes al segundo anticipo.

Estos recursos fueron debidamente socializados y soportados con las respectivas nóminas, comprobantes de pago al personal, aportes parafiscales y pagos de nómina correspondientes al periodo comprendido entre los meses de abril y agosto de 2025.

A la fecha, no se han efectuado desembolsos al contrato de obra. **Ver Anexo 2 Informe Administrativo y Financiero.**

4.6 Estado general del tiempo

Se adjunta el formato de seguimiento correspondiente al estado del tiempo y las condiciones de la superficie por tramo, en el marco de los recorridos realizados durante el mes de junio.

Ver en Anexo 5. Informe de Residente de Interventoría – Formatos Estado del tiempo.

4.7 Aclaraciones y Evidencias para Protección del Instituto

A la fecha se tienen las siguientes pólizas vigentes por parte del contratista:
Recibidas mediante comunicado YVY-081-25 del 4 de junio 2025, en la plataforma Secop se evidencia aprobación de las mismas por parte de la entidad ICCU. **Ver Anexo 9. Correspondencia.**

Tabla. 36 pólizas

POLIZA	REFERENCIA	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO	10_NB-100367480 Anexo 2 Certificado 72371928	Desde:24 ene 2025 Hasta: 31 dic 2028
RCE	24_NB-100094971 Anexo 1 Certificado 72371622	Desde:24 ene 2025 Hasta: 31 dic 2028

4.8 Resumen Ensayos de Laboratorio

En el periodo respecto a los ensayos de laboratorio, se tiene un 5.14% por ejecutar. En el periodo se remitieron los siguientes ensayos:

- Caracterización de los materiales: En el periodo se remitieron resultados de caracterización de los siguientes municipios, hay que aclarar que algunos de los resultados remitidos son preliminares como se discrimina a continuación.
-

Tabla 37. Resumen de laboratorio

CONSECUTIVO	FECHA RECIBO	OBJETO
YVY-178-25	1-ago-25	Resultados apiques Villagómez Preliminares caracterización
YVY-186-25	8-ago-25	Entrega de Resultados Preliminares y Resultados de Comprensiones Tausa y Susa y preliminares caracterización Yacopí y la palma.
YVY-192-25	11-ago-25	Entrega de resultados de laboratorio Municipio de La Palma (preliminares caracterización) y Yacopí (preliminares caracterización)
YVY-217-25	27-ago-25	Entrega resultados de laboratorio. Tausa - Chocontá Villagómez - compilados definitivos caracterización

4.9 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

A la fecha se tienen las siguientes pólizas vigentes por parte del contratista:

Recibidas mediante comunicado YVY-081-25 del 4 de junio 2025, en la plataforma Secop se evidencia aprobación de las mismas por parte de la entidad ICCU.

Tabla 38. Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

POLIZA	REFERENCIA	VIGENCIA

CUMPLIMIENTO	**10_NB-100367480 - Anexo 2 Certificado 72371928**	**Desde:24 ene 2025 Hasta: 31 dic 2028**
RCE	**24_NB-100094971 Anexo 1 Certificado 72371622**	**Desde:24 ene 2025 Hasta: 31 dic 2028**

4.10 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

Se solicitó al Contratista YVY elaborar y remitir un listado completo de los indicadores de gestión considerados para el seguimiento y la medición de los procesos a su cargo. Estos indicadores deberán reflejar con precisión el desempeño, la eficiencia y la eficacia de las actividades ejecutadas, permitiendo un control técnico riguroso, la identificación de desviaciones y la implementación de acciones correctivas oportunas, en concordancia con los lineamientos y estándares establecidos para el proyecto.

4.11 Seguimiento al Factor de Calidad de Obra (Plan de Gerencia)

A corte del presente informe el Contratista se encuentra ejecutando las actividades de limpieza y mantenimiento de alcantarillas, al respecto se remitió a el Contratista el comunicado ICCU-S-154-2025 con el cual se hizo observaciones relacionadas con el incumplimiento de los EPP's y dotación del personal que se encontraba ejecutando las actividades de limpieza de las alcantarillas así como sobre la correcta disposición del material que es retirado para evitar que contamine el terreno adyacente y un posible retorno al curso de agua.

4.12 Otros documentos seguimiento mensual

4.12.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

El contratista presentó el plan de inversión del anticipo con el comunicado YVY-004-25 de fecha 26 de marzo 2025, la Interventoría dio aprobación al plan de inversión con el comunicado ICCU-S-015-2025 de fecha 19 de abril 2025. En el periodo anterior se recibió el plan de inversión del anticipo modificado de acuerdo a solicitud de ajuste de la cuenta de cobro del anticipo comunicados YVY-139-25 y YVY-148-25 respectivamente, del 14 y 17 de julio 2025 respectivamente, el cual fue firmado por Interventoría. El 25 de julio 2025 se remitió al ICCU la solicitud del contratista del 30%

de anticipo de la etapa de caracterización de acuerdo a las cláusulas contractuales mediante comunicado ICCU-S-152-2025.

4.12.2 Seguimiento Programa de Inversión

El 2 de julio de 2025 se remitió la comunicación YVY-108-25, de fecha 27 de junio de 2025, por medio de la cual el contratista hace entrega de la primera cuenta de acuerdo con lo establecido en el CONTRATO ICCU-139-2025, CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO, numeral 1. FORMA DE PAGOCARACTERIZACION DE CORREDORES VIALES Y ENSAYOS, literal a) Un primer desembolso correspondiente al 25% se realizará una vez sea entregado y aprobado por Interventoría el PLAN DE CAMPO METODOLOGIA DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE TRABAJO, aprobados por la interventoría mediante comunicación ICCU-S-050-2025.

Se aclara que la documentación fue revisada por la Interventoría y se realizaron observaciones mediante comunicación ICCU-S-104-2025 las cuales fueron subsanadas por el contratista y por lo tanto se procede a su trámite.

4.12.3 Seguimiento Programa de Obra

En cuanto al cronograma presentado por el contratista con el comunicado YVY-035-25 se realizó el seguimiento de acuerdo a que aún se encuentra en ejecución actividades de caracterización encontrando lo siguiente:

Para el periodo con corte al semanal Nº22 el contrato presenta un avance de 46.66%, y presenta un atraso del 53,34 %, el % de atraso continúa siendo alto, aunque en el periodo se avanzó en la entrega de resistencias a la compresión por parte del contratista sin embargo al tener un alto % de la programación discriminado en los tramos de prueba esto hace que él % de atraso sea alto para la etapa de caracterización. Igualmente, no se cuentan con diseños de las estabilizaciones al cierre del periodo por lo que esto se refleja en él % de avance. En el periodo la Interventoría presentó la actualización al informe de Presunto Incumplimiento ante el ICCU comunicado ICCU-S-207-2025 del 28 de agosto 2025 y al contratista con el ICCU-S-206-2025 del 28 de agosto 2025. **Ver Anexo 11. Actas de Reunión.**

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION

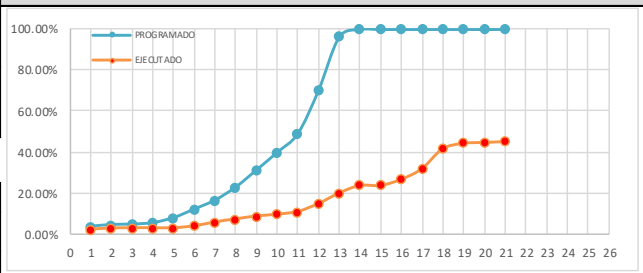
AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	100.00%	44.91%	-55.09%
Durante el periodo	0.00%	0.40%	0.40%
Acumulado Actual	100.00%	45.31%	-54.69%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
274 días	146.00	128.00	-149.86

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO



4.13 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría

Transcurridos 5 meses del proyecto el contratista continuó con las actividades de caracterización en cuanto a ejecución de laboratorios y remitió los primeros resultados de las pruebas con estabilizantes. Sin embargo, a la fecha se presenta retraso en las actividades de laboratorios, diseño y que conforman la entrega de la fase y fase 2 de la caracterización.

En el periodo se realizó acompañamiento al proceso por presunto incumplimiento del contratista, se estuvo atento a posibles requerimientos o solicitudes del ICCU el cual convoco al contratista a Audiencia 4 el 04 de agosto 2025, audiencia 6 el 19 de agosto 2025 y como se informó en el numeral anterior se presentó la actualización al informe del presunto incumplimiento. En relación con el proceso por presunto incumplimiento, el ICCU remitió el 29 de agosto 2025 el documento AUTO DE TRÁMITE“ Por medio del cual se prorroga el termino probatorio dentro del proceso sancionatorio N° 010 - 2025 por posible incumplimiento parcial contrato de obra ICCU - 139 de 2025” en el cual dispone: *ARTÍCULO PRIMERO: PRORROGAR POR TREINTA (30) DIAS MAS, a partir de la fecha el termino probatorio dentro del proceso sancionatorio 010 de 2025 por posible incumplimiento parcial del contrato de obra ICCU 139 de 2025.*

Así mismo en el periodo actual se realizaron reuniones de seguimiento al contratista, mesas de trabajo contratista – interventoría y se asistió a las mesas de trabajo convocadas por el ICCU, con miras de requerir el inmediato avance en la entrega de alternativas de diseño e inicio de actividades de ejecución.

Se relaciona las diferentes reuniones técnicas que se han generado de seguimiento al contratista en el periodo:

Tabla 39. Reunión de Seguimiento.

tpf INGENIERÍA			Código F-TEC-006
			Versión: 0
			Fecha: 1/12/2022
Nº DE ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**PARTICIPANTES**
34	1-ago-25	Reunion seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
35	5-ago-25	Reunion tema presupuesto - Obras de drenaje	Técnica - Interventoría - Contratista -
36	5-ago-25	Seguimiento entregables de Pavimentos - Contrato de obra ICCU-139 de 2025	Técnica - Interventoría - Contratista -
37	13-ago-25	Seguimiento entregables de Pavimentos - Contrato de obra ICCU-139 de 2025	Esp pavimentos interventoria y contratista
38	14-ago-25	Reunion seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
39	20-ago-25	Seguimiento entregables Pavimentos - Diseños	Esp pavimentos interventoria y contratista
40	22-ago-25	Reunion seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
41	27-ago-25	Seguimiento entregables Pavimentos - Diseños	Esp pavimentos interventoria y contratista

Así mismo se presenta la trazabilidad de los diferentes requerimientos que ha realizado la Interventoría al contratista.

5 Información contrato de interventoría

5.1 Información general del contrato de interventoría

El **Contrato de Interventoría No. ICCU-220 de 2025**, suscrito en el marco del Programa Caminos Vecinales, Caminos para Quedarse del Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca, tiene como finalidad la interventoría integral al contrato de obra No. ICCU-139 de 2025, correspondiente a la intervención de vías rurales en los municipios de las provincias de Ubaté, Almeidas y Rionegro, en el departamento de Cundinamarca.

Datos contractuales relevantes:

- **Número del proceso de selección:** ICCU-CM-050 DE 2024
- **Número del contrato:** ICCU-220 de 2025
- **ID SECOP:** CO1.PCCNTR.7439044
- **Fecha de Inicio:** 1 de abril de 2025

Contratista: Consorcio Intervial ICCU 050

- **Representante legal:** Claudia Liliana Ramirez Gaitan
- **Cédula:** 52.263.288
- **Dirección:** Calle 98 # 21 – 50, Piso 3, Bogotá D.C.

Integrantes del consorcio y composición accionaria:

TPF Getinsa Euroestudios Colombia S.A.S.

- NIT: No informado (matriz: TPF S.A. con 98.19%)
- Accionistas minoritarios: Gregorio López Vallejo (0.75%), Jonathan Morgan (0.76%), Ahmed El Khadri (0.07%), José Manuel Ballesteros (0.23%)

Euroestudios Ingenieros de Consulta S.A.S.

- NIT: 84840685
- 100% propiedad de TPF Getinsa Euroestudios S.L.

Valor y condiciones del contrato:

- **Valor inicial y actual:** $3.865.474.025
- **Anticipo otorgado:** $773.094.805
- **Pagos efectuados a la fecha:** $0
- **Valor pendiente por pagar:** $3.865.474.025
- **Plazo del contrato:** 274 días calendario
- **Fecha de inicio:** 1 de abril de 2025
- **Fecha de terminación actual:** 31 de diciembre de 2025
- **Modificaciones contractuales:**

Aclaración No 1"

- La ingeniera LAURA DANIELA NIETO GUTIÉRREZ, Es directora de caminos vecinales. Y como supervisor del contrato el Ing. Wilson Santander. A la fecha, no se han registrado modificaciones, suspensiones, aclaraciones ni cesiones contractuales.

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor

Se describen en el numeral 3.2

5.3 Informes especialistas

Durante el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de agosto de 2025, se contó con el acompañamiento y participación de profesionales y especialistas en los

componentes de Geotecnia, Pavimentos y de obra. cuyas actividades se describen a continuación:

5.3.1 Especialista en Geotecnia

- Alcance del informe: El presente informe relaciona las actividades ejecutadas en el marco del Contrato de Interventoría No. 220 de 2025 para el componente de Geotecnia en el mes de agosto de 2025.
- Rol del especialista en Geotecnia dentro de la interventoría: Se tiene como función principal de los Especialistas en Geotecnia de la Interventoría la revisión documental de la información remitida a la Interventoría por parte del Contratista como parte del desarrollo de sus actividades, así como la emisión de observaciones tendientes a contar con productos que den cumplimiento a lo establecido en el Anexo Técnico, el marco normativo aplicable para este proyecto, así como a las buenas prácticas de ingeniería.
- Objetivo del documento: Presentar el seguimiento, verificación y control del componente de Geotecnia en las provincias de Rionegro, Almeidas y Ubaté, para el periodo comprendido entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2025.

Informe de especialistas general de las 3 provincias

Dentro de la información emitida el presente mes se encuentran las siguientes:

- Informes semanales de ejecución de actividades.
- Revisión de observaciones realizadas por el ICCU a los informes mensuales 3 y 4.

Actividades realizadas en el mes para el componente de Geotecnia

- Inicio de revisión de información de información preliminar de estratigrafía remitida por el Contratista para los sectores Topaipí y Yacopí mediante comunicación YVY-154-25, para emisión de observaciones.
- Revisión de actividades ejecutadas en el mes de julio para elaboración de informe mensual.
- Revisión de información de información preliminar de estratigrafía remitida por el Contratista del sector Villagómez, para emisión de observaciones.
- Revisión de información interna reportada por el personal de campo en relación con inestabilidad identificada en un tramo adyacente a la vía a intervenir en el sector Manta, ubicado en las coordenadas Lat 4°59´10.29N – Long 73°31´43.35".
- Revisión de información correspondiente al Informe mensual No. 4, correspondiente al mes de julio de 2025.

- Revisión de resultados de laboratorio de caracterización física y de compresión encofinada en muestras de suelo con estabilizantes químicos, para análisis de resultados en los sectores a intervenir en el marco del contrato.
- Asistencia a reunión con el Contratista de obra para revisión de ensayos de laboratorio. Reunión realizada el día 22 de agosto de 2025, y en la cual el Contratista no asistió para la presentación de los resultados.
- Inicio de revisión de informes de campo remitidos por el Contratista para los municipios de Chocontá, Sesquilé, Susa, Ubaté, Yacopí (Tramo Llano Mateo), remitidos con la comunicación YVY-218-25.
- **Ver Anexo 9. Correspondencia.**

Para este periodo no se realizaron visitas de campo o recorridos a los trazados del proyecto.

Conclusiones y recomendaciones Geotecnia

- Para el caso del periodo no se tienen avances significativos desde el componente de Geotecnia, puesto que el Contratista allegó únicamente los informes de visita realizados, los cuales, si bien referencian algunos de los puntos críticos, no se cuenta con un listado consolidado de los mismos, requerimiento realizado en diferentes espacios de trabajo realizados con el contratista, así como mencionado en los informes mensuales de los meses 2 y 3 entregados por esta interventoría.
- Las dificultades en el avance de los trabajos de revisión del componente de Geotecnia de la Interventoría se deben a la falta de completitud y orden en la entrega de información del componente de Geotecnia por parte del Contratista, ya que la falta de esta información no permite establecer con exactitud aspectos relevantes de los sitios críticos como lo son:
  - Ubicación detallada mediante coordenadas de referencia y abscisado.
  - Características de las inestabilidades identificadas.
  - Afectación de las inestabilidades identificadas sobre las condiciones de operación de la vía.
  - Medidas de intervención recomendadas para posibles intervenciones futuras.
  - Limitaciones en la ejecución contractual del contratista a causa de las inestabilidades.

  Estas condiciones son de vital importancia para poder acometer las actividades técnicas a las que haya lugar, así como a remitir información a la Entidad contratante en relación con las posibles limitaciones que pueda manifestar el Contratista en el marco del objeto contractual.

- En la primera semana de septiembre, y como parte del proceso de seguimiento, la Interventoría emitirá una comunicación al Contratista reiterando los puntos técnicos reportados en este informe, con el propósito de documentar las dificultades identificadas y continuar con la trazabilidad de las mismas.
- Se recomienda al ICCU, tomar las acciones tendientes a solicitar al Contratista la remisión de la información del componente de Geotecnia para revisión, esto teniendo en cuenta que, en diferentes espacios de trabajo con Contratista, Interventoría e ICCU, el contratista ha manifestado contar con la totalidad de la información del componente de Geotecnia, sin que a la fecha se haya hecho entrega oficial de los mismos a esta Interventoría.
- La falta de completitud en la información, así como las radicaciones incompletas de los informes del componente de Geotecnia tienen implicaciones técnicas asociadas a la falta de debida identificación de riesgos técnicos para este componente, lo cual deriva en una posible identificación errada de las condiciones geotécnicas particulares de los sitios críticos, así como la posible presentación de soluciones de ingeniería inadecuadas para la atención de las mismas, o que no atiendan la totalidad de las áreas que se identifiquen como sitios críticos.
- Bajo las condiciones actuales de disponibilidad de información, no es posible establecer recomendaciones o ajustes a los diseños geotécnicos propuestos de parte del Contratista, así como tampoco es posible ponderar las medidas preventivas y correctivas para el manejo y posible control de riesgos geotécnicos, dado que no se cuenta con información consolidada para revisión, como se ha mencionado en apartados anteriores del presente informe.
- Se recomienda que, para los sitios críticos reportados en los informes de visita para los municipios de Chocontá, Sesquilé, Susa, Ubaté, Yacopí (Tramo Llano Mateo) se lleven a cabo inspecciones visuales y se documenten las condiciones de estabilidad de taludes mediante registros fotográficos que permitan el seguimiento a las condiciones geotécnicas de los sitios reportados. Adicionalmente se recomienda la revisión y complementación de los sitios críticos reportados.
- Se requiere que el Contratista envíe la totalidad de informes de visitas de campo para poder llevar a cabo la revisión de los mismos, y que en la elaboración del os informes faltantes se incluyan las observaciones plasmadas en el presente informe.
- Es necesario que el Contratista refuerce sus actividades de campo del componente de Geotecnia con el propósito de finalizar el levantamiento de sitios críticos, así como realizar las actividades de seguimiento a los mismos.

Evidencia documental y fotográfica Geotecnia

Las evidencias documentales de las solicitudes del componente de Geotecnia se han realizado mediante las revisiones de los informes mensuales y las observaciones emitidas a los mismos, los cuales no han permitido la aprobación de estos.

Ver Anexo 3. Informe Geotecnia

5.3.2 Especialista Pavimentos

El presente informe semanal tiene como objetivo presentar las actividades de seguimiento, control y verificación del componente de pavimentos realizadas durante la semana en las provincias de Rionegro, Almeidas y Ubaté, en el marco de la interventoría del contrato vigente.

Actividades semanales desarrolladas

Actividades de Campo:

Durante la semana no se adelantaron actividades constructivas directas en campo.

Laboratorios

- Revisión de resultados de compresión encofinada (UCS) y CBR incluidos en los informes de diseño.
- Resultados por encima del 100%, en el caso de los CBR in situ obtenidos con PDC, falta de información georreferenciada.
- Los CBR inalterados continúan pendientes de entrega; el contratista se comprometió a remitir un cronograma de resultados.
- Se continúa con los ensayos de compresión encofinada con el uso de estabilizantes químicos para las diferentes provincias.

Documental

Se dio respuesta a los siguientes oficios:

Tabla 40. Radicación de oficios estado

Consecutivo	Fecha Recibo	Objeto	Estado / Acción

YVY-219-25	28/08/2025	Elección de tramos homogéneos	Respuesta entregada con observaciones.
YVY-221-25	29/08/2025	Informe de diseño de estabilizantes químicos	Revisión técnica y observaciones enviadas.
YVY-223-25	29/08/2025	Complemento al informe de diseño de estabilizantes químicos	Observaciones remitidas y mesa de trabajo convocada (01/09/2025).

Reuniones técnicas

- 01/09/2025 – Mesa de trabajo contratista/interventoría: Presentación de diseños con estabilizante D-STBWAY + 3% cemento. La interventoría señaló vacíos en la caracterización geotécnica y en la correlación entre métodos de diseño.
- 03/09/2025 – Reunión ICCU (contratista–interventoría–supervisión): Se fijaron compromisos:
- Subsanación de observaciones a los diseños (revisión el 05/09/2025).
- Revisión de especificación particular y presupuesto de intervención.
- Inicio de obras en Susa el 08/09/2025, incluyendo profundización de apiques
- 05/09/2025 – Mesa de trabajo interventoría–contratista:
- Discusión sobre correlación entre métodos de diseño (AASHTO, Austroads, PCA).
- Análisis de tránsito y su incidencia en el diseño.
- Propuesta estructural: 25 cm de afirmado estabilizado, con verificación mediante UCS, LWD y ensayo de placa en tramos piloto.
- Tratamiento superficial propuesto: doble riego asfáltico, pendiente de diseño y presupuesto.
- Necesidad de zonificación en Susa (apiques 16–20) por alto contenido de materia orgánica (≈10 %), que requiere reemplazo de material. Se realizarán ensayos de permanganato de sodio.

- Definición de equipos de obra para mezclado y compactación.
- Compromisos: entrega de informe con ajustes, cronograma de CBR inalterados.

Avance semanal del componente pavimentos

La semana se centró en la revisión y ajuste de diseños estructurales, la sectorización de tramos y la definición de compromisos para el inicio de obras en el municipio de Susa el 8 de septiembre de 2025 y para las entregas de la documentación faltante. Aunque se avanzó en coordinación con la supervisión y se ejecutaron mesas técnicas, persisten vacíos técnicos que deben subsanarse de manera inmediata.

Observaciones y hallazgos en las provincias de Rionegro, Almeidas y Ubate.

- Exploración geotécnica insuficiente: perfiles y apiques incompletos, sin documentación integral.
- Suelos críticos: alta plasticidad y contenidos de materia orgánica importante, con valores de CBR muy bajos.
- Eficiencia desigual de estabilizantes: Terrasil y Pro-Road con resultados deficientes; mejor desempeño de D-STBWAY + cemento.
- Zonas críticas de control: apiques 16–20 en Susa y revisar puntos críticos en general en donde se requieren tratamientos especiales o recambio de material y se pueda garantizar un espesor de 25 cm de material estabilizado, así como garantizar un CBR >4%.
- Condiciones de tránsito: No se muestra un análisis de las condiciones reales según el tramo estudiado.
- Ausencia de parámetros complementarios (módulo resiliente, CBR post-estabilización).
- Riesgos de durabilidad: se requiere recubrimiento asfáltico sobre capas estabilizadas para evitar deterioro prematuro.

Recomendaciones de la interventoría para las provincias de Rionegro, Almeidas y Ubate pavimentos.

- Entregar informes geotécnicos completos, georreferenciados y con análisis estratigráficos.
- Repetir o validar ensayos inconsistentes y complementar con parámetros faltantes.
- Ajustar diseños de pavimento considerando tránsito según las condiciones propias del lugar, drenaje, así como el régimen climático local. Retomar las recomendaciones realizadas en las diferentes mesas de trabajo de la semana para la elaboración del informe final de diseño.
- Zonificar áreas críticas y prever el uso de material granular en zonas con materia orgánica considerables.
- Cumplir los compromisos adquiridos en reuniones del 03 y 05 de septiembre, para no afectar el inicio de la fase de ejecución.

Conclusiones

Durante la semana del 1 al 7 de septiembre se consolidaron compromisos clave para dar inicio a las obras en Susa el 8 de septiembre.

La interventoría resalta avances en la discusión de diseños y sectorización, pero también insiste en la necesidad de subsanar vacíos técnicos y documentales. El éxito del inicio de obra dependerá del cumplimiento estricto de los compromisos y la corrección de los aspectos observados.

Evidencia documental y fotográfica Pavimentos

- Oficios YVY-219-25, YVY-221-25, YVY-223-25.
- Acta mesa de trabajo contratista–interventoría (01/09/2025).
- Acta reunión ICCU (03/09/2025).
- Acta mesa de trabajo interventoría–contratista (05/09/2025).
- Documento ICCU-S-215-2025 ANEXOS.

Ver Anexo 4. Informe Pavimentos.

5.3.3 Residente de interventoría

Las actividades realizadas se describen en el numeral 3.2 **Ver Anexo 5. Informe de Residente.**

El 30 de junio 2025 finalizó la etapa de caracterización, esta etapa contempla Fase 1 y fase 2 lo cual incluye la caracterización de los suelos y las propuestas de diseño. A la fecha no se ha recibido la entrega final de la etapa, al respecto la Interventoría ha continuado con el seguimiento a las actividades en ejecución por el contratista, ha promovido mesas de trabajo y ha instado al contratista con el fin de dar cumplimiento y finalización de estas fases. Sin embargo, ante los presuntos incumplimientos por parte del contratista en el periodo se remitió la actualización del informe del proceso en curso por presunto incumplimiento comunicado ICCU-S-207-2025 de 28 de agosto 2025 y se remitió al contratista el comunicado ICCU-S-206-2025 de 28 de agosto 2025 en el cual se le informa el estado actual de las entregas y se le informa acerca del presunto incumplimiento.

- **Ensayos de laboratorio**

Caracterización de los materiales

En el periodo se remitieron resultados preliminares de caracterización de los municipios Yacopí y la palma y resultados de caracterización compilados definitivos de Chocontá y Villagómez.

Ensayos de compresión

En el periodo se remitió por el contratista los resultados de compresiones a 7 días para los 11 tramos así mismo se remitió resultados de 7 y 14 días para Ubaté y Tausa. Y por otra parte se remitió resultados de 7, 14 y 28 días Sesquilé y Simijaca.

Dando como resultado por el momento que los tramos que están cumpliendo con la condición de 1Mpa de resistencia en condición saturada con el estabilizante Stepway y 3% de cemento son:

- Susa
- Manta
- Simijaca

Diseños de estabilización y tramos de prueba

A la fecha de corte del presente informe no se ha remitido el diseño por parte del contratista por lo anterior se requirió al contratista mediante comunicado ICCU-S-206-2025 del 28 de agosto 2025 en el cual se da cuenta de la información entregada y

pendiente por entrega por parte del contratista y se da como termino 2 días hábiles para la entrega de la información.

Etapa de Ejecución

- Actividades de limpieza y mantenimiento y ejecución de alcantarillas

En el periodo se continuó con la actividad de mantenimiento de alcantarillas sin embargo El contratista debe presentar propuesta de priorización de alcantarillas a ejecutar. Se ha solicitado celeridad en la revisión de alcantarillas a intervenir y logística para que inicie el tema de construcción de alcantarillas tanto por el ICCU como por la Interventoría como consta en el acta de reunión 40 de fecha 22 de agosto 2025.

- Actividades de Topografía

No se han iniciado las actividades de topografía en campo se ha solicitado en las diferentes reuniones de seguimiento al contratista por parte del ICCU y de la Interventoría el inicio de actividades de topografía y en general las actividades de ejecución en campo. Acta de reunión 34 del 1 de agosto.

- Seguimiento programa de obra

Para el periodo con corte al semanal Nº22 y respecto al cronograma de caracterización el contrato presenta un avance de 46.66%, y un atraso del 53,34 %. En el periodo la Interventoría presentó la actualización al informe de Presunto Incumplimiento ante el ICCU comunicado ICCU-S-207-2025 del 28 de agosto 2025 y al contratista con el ICCU-S-206-2025 del 28 de agosto 2025.

- -Registro fotográfico del avance de las obras.
- Se adjunta Formato Registro fotográfico del periodo.
- Bitácora del mes
- Ver Anexo Se adjunta scanner de la bitácora de obra, diligenciada en el periodo.

5.4 Seguimiento a la inversión del anticipo interventoría

Mediante comunicado ICCU-S-052-2025 (11/06/2025) se solicitó al ICCU información sobre el trámite del anticipo, concluyéndose en mesa de trabajo que el desembolso aún se encontraba pendiente. Posteriormente, a través del comunicado ICCU-S-188-2025 (13/08/2025), se autorizó el uso del anticipo N.º 1, cuyo reporte incluyó únicamente costos asociados a personal y recursos pagados por el Consorcio Intervial ICCU 050.

Con posterioridad, se gestionó mediante comunicado ICCU-S-198-2025 la solicitud de uso del anticipo correspondiente a la nómina del mes de agosto del Consorcio Intervial ICCU 050. Finalmente, se atendieron las observaciones emitidas por el ICCU a través de la respuesta al comunicado ICCU-S-2025-0006043, formalizada mediante comunicado ICCU-S-210-2025.

De esta manera, la interventoría ha realizado seguimiento oportuno a la inversión del anticipo, asegurando la trazabilidad de los trámites y la atención de observaciones emitidas por la entidad.

Ver Anexo 9. Correspondencia.

5.5 Informe del Programa Anual de Caja – PAC

A continuación, se muestra el Programa Anual de Caja previsto para el Contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025.

PAC ICCU CTO 220 DE 2025	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	ago-25	sep-25	oct-25	nov-25	dic-25	ene-26	feb-26	mar-26	abr-26
CLASIFICACIÓN													
PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACION													
CDP No. DIS-2025000090 DE 2025		$ 80.945.168	$ 165.029.668	$ 192.126.333	$ 168.389.667	$ 280.955.000	$ 280.955.000	$ 280.955.000	$ 280.955.000	$ 280.955.000	$ 280.955.000	$ 280.955.000	$ 226.152.500

5.6 Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría

Todo el personal vinculado al proyecto ha sido verificado conforme a los perfiles y requisitos establecidos en los pliegos de condiciones de los contratos de obra e interventoría. La selección del equipo técnico y profesional se realizó en cumplimiento de los criterios definidos en el proceso de contratación, incluyendo los criterios de asignación de puntaje establecidos para la evaluación de propuestas.

Adicionalmente, las hojas de vida y demás soportes documentales del personal propuso han sido revisadas y aprobadas por el Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU), dando cumplimiento a lo exigido en la etapa precontractual. A la fecha, se ha garantizado que todos los profesionales designados en el proyecto cumplen con los compromisos adquiridos durante la fase de selección contractual.

6 Reportes ejecución mensual contrato de interventoría

6.1 Equipo y vehículos Contrato de Interventoría

En cumplimiento al contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025 y en cumplimiento a las obligaciones propias del CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050, a continuación, se relacionan los equipos designados para el desarrollo y ejecución del proyecto, en el periodo correspondiente al mes de agosto de 2025.

✓ **Equipos**


En cumplimiento al contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025 y en cumplimiento a las obligaciones propias del CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050, a continuación, se relacionan los equipos designados para el desarrollo y ejecución del proyecto, en el periodo correspondiente al mes de julio de 2025.

✓ Computadores:

Tabla 41. Computadores interventoría.

MARCA	ALMACENAMIENTO	PROCESADOR	RAM	TARJETA DE VIDEO
HP	256 GB	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 2.10 GHz 64 bits x64	8,00 GB	AMD RADEOS Graphics
HP	500 GB	Intel® Core™ i5-4590 CPU @ 3.30 GHz 64 bits x64	12.0 GB	
JANUS	500 GB	Intel® Core™ i7-7700 CPU @3.60GHz 64 bits x64	8,00 GB	
ASUS	1 TB	AMD Ryzen 7 4700U with Radeon Graphics 2.00GHz 64 bits x64	16.0 GB	
POWER GROUP	1 TB	AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 3.80GHz 64 bits x64	6.0 GB	
COLIGAR	1 TB	AMD Ryzen 7 5700X 8-Core Processor 3.40GHz 64 bits x64	32.0GB	
HP	256 GB	AMD Ryzen 5 5500U with Radeon Graphics 2.10 GHz 64 bits x64	12.0 GB	

Tabla 42. Equipo de Topografía.

EQUIPO	REFERENCIA	SERIAL
Nivel Sokkia	B40	S/N: 320450 
Estación Topcon	GTS 332	S/N: XJ0349 

VEHICULOS

El Consorcio Intervial ICCU 050 en cumplimiento a lo establecido en el contrato de Interventoría ICCU No. 220 de 2025 y en ejecución del mismo, presentó al ICCU los vehículos requeridos y que cumplen con lo estipulado, los cuales fueron avalados por la entidad, para lo cual acorde a lo establecido se tiene:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	5

Por lo anterior, a continuación, se relacionan los vehículos designados para el desplazamiento de los profesionales a los frentes de obra del proyecto:

Tabla 42. Seguimiento Programa de Obra.

MARCA	LINEA	MODELO	TIPO	CILINDRAJE	PLACAS	COLOR	APROBACIÓN
Suzuki	Grand Vitara	2017	Wagon	2.393	WMP023	Blanco	2025003809
Mahindra	Mahindra Pick Up	2018	Doble cabina	2.179	ESM872	Blanco Ártico	2025004343

Mahindra	Mahindra Pick Up	2018	Doble cabina	2.179	HFQ049	Negro	2025004343
Renault	Duster	2022	Wagon	1.333	KOK733	Blanco Glacial	2025004343
Renault	Duster	2019	Wagon	1.998	EJR997	Blanco Glacial	ICCU-S-2025-0003725

OFICINAS

El Consorcio Intervial ICCU 050 cuenta con las siguientes oficinas para la ejecución del proyecto.

- Oficina sede Bogotá: Calle 98 No. 21 – 50 Piso 3, Oficina 301, Centro Empresarial Calle 98, Chicó Norte, Bogotá D.C.
- Oficina provincia Rionegro: Carrera 3 No. 5 – 81 Torre 3, Piso 4, apartamento 405, Conjunto residencial Altos de Buenavista, casco urbano del municipio de La Palma, Cundinamarca.
- Oficina provincia Ubaté y Almeida: Vereda Timiguita sector bajo, lote Leticia El Recuerdo, municipio de Susa, Cundinamarca.

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría

Durante el periodo se presentaron las hojas de vida de los profesionales asignados a la etapa de caracterización. Es importante resaltar que parte del personal cuenta con contrato laboral con la empresa TPF Getinsa Euroestudios Colombia, firma integrante del CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050, mientras que el resto ha sido contratado directamente por el Consorcio.

A continuación, se detalla el personal vinculado durante el primer mes de ejecución de la etapa de caracterización del proyecto, junto con sus respectivas dedicaciones:

Tabla 43. Personal mínimo requerido.

PERSONAL MINIMO REQUERIDO	NOMBRE DEL TRABAJADOR	EMPRESA CONTRATANTE	PORCENTAJE DE DEDICACIÓN
DIRECTOR DE INTERVENTORIA	EDGAR MAURICIO BELTRAN CARDENAS	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	60%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CAROLINA PEÑA LOPEZ	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ALVARO HERNAN NEIRA GIRON	OPS	50%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	DIEGO FERNANDO CAMACHO SUAREZ	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	80%
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	YESSICA PAOLA HERNANDEZ MENDEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	TANIA MELISA ESCOBAR VIRGUEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
PROFESIONAL SISO 1	YESSICA PAOLA MORA TORRES	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	70%
SECRETARIA	HELEN SANCHEZ CORONADO	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	GIOVANNY ALEJANDRO BORRAEZ RODRIGUEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	40%
INSPECTORA DE INTERVENTORIA	ANGIE LORENA JIMENEZ OBANDO	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
TOPOGRAFO	JOHN JARBY ROZO SANCHEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	50%
PROFESIONAL INGENIERO DE APOYO	JUAN SEBASTIAN CRUZ ACEVEDO	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
PROFESIONAL GESTOR SOCIAL	DIANA MARCELA CHAVARRIO ESCOBAR	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	SANDRA JOHANA BENAVIDES BERMUDEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	50%
INSPECTOR DE INTERVENTORIA	JONATHAN EDUARDO CASTAÑEDA	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
RESIDENTE DE INTERVENTORIA	EDWIN ALEXANDER VARGAS MELGAR	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	100%
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ADRIANA JOHANNA MEDIORREAL RAMIREZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	50%

INSPECTORA DE INTERVENTORIA	MAIRA ALEJANDRA MATIZ GOMEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	100%
ESPECIALISTA AMBIENTAL	CARLOS ARTURO CHAPARRO SANCHEZ	CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	60%
ESPECIALISTA HIDRAULICO	FABIAN ESTEBAN RODRIGUEZ CARDENAS	TPF GETINSA EUROESTUDIOS COLOMBIA	40%

Ver Anexo 9. Correspondencia. Aprobación de personal.

Tabla 44. Directorio telefónico de personal

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050
N.I.T. 901.915.452-1

DIRECTORIO PROYECTO

TPF INGENIERÍA

ESPECIALIDAD O CARGO	NOMBRE	CORREO	TELEFON
Profesional ingeniero Apoyo - ICCU	Juan Sebastian Cruz Acevedo	ingeniero.jsca@gmail.com	320 4566052
Director de Interventoría - INTERVIAL 050	Edgar Mauricio Beltran	edgar.beltran@tpfingenieria.com	3118629894
Residente Interventoría - INTERVIAL 050	Carolina Peña López	carolina.pena@tpfingenieria.com	3043071485
Residente Interventoría - INTERVIAL 050	Edwin Vargas	residente1.intervial050@gmail.com	3192048216
Coordinadora Administrativa - INTERVIAL 050	Helen Sanchez	helen.sanchez@tpfingenieria.com	3126053217
Ingeniero de apoyo - INTERVIAL 050	Jonathan castañeda	ingeniero.intervial050@gmail.com	3102501294
Especialista en Pavimentos - INTERVIAL 050	Sandra Benavides	pavimentos1.intervial050@gmail.com	3134053658
Especialista en Pavimentos 2 - INTERVIAL 050	Alvaro Neira Giron	pavimentos2.intervial050@gmail.com	3016212795
Especialista en Pavimentos 3 - INTERVIAL 050	Adriana Johanna medioreal	Pavimentos3.intervial050@gmail.com	310 2575480
Especialista en Geotecnia - INTERVIAL 050	Diego Camacho suarez	diego.camacho@tpfingenieria.com	3006475037
Especialista en Geotecnia2 - INTERVIAL 050	Alejandro borraez	geotecnia.intervial050@gmail.com	3115314005
Profesional SISO - INTERVIAL 050	Yessica Paola Mora	yessica.mora@tpfingenieria.com	3178552942
Profesional social - INTERVIAL 050	Tania Escobar	social2rionegro.intervial050@gmail.com	3138855032
Profesional social - INTERVIAL 050	Yessica Paola Hernandez	social3ubate.intervial050@gmail.com	3208898982
Profesional social - INTERVIAL 050	Diana Marcela Chavarrio	socialalmeidas.intervial050@gmail.com	3124857057
Inspector interventoria - La Palma	Angie Lorena Jimenez Obando	inspector1.intervial050@gmail.com	322 8924566
Inspector interventoria - Topaipi	Maira alejandra Matiz gomez	inspector2.intervial050@gmail.com	3112903450
Topografo 1 - Ubate	Jhon Roso	Topografia1.intervial050@gmail.com	304 5571360

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría

El informe financiero y presupuestal de la Interventoría fue elaborado con base en la plantilla de personal correspondiente a la etapa de caracterización; no obstante, se encuentra a la espera de que el ICCU se pronuncie respecto a los ajustes en las dedicaciones y la vinculación de nuevo personal. Esta definición es necesaria para reflejar de manera adecuada las dedicaciones en el cuadro financiero presentado en el **Anexo No. 2 – Informe Financiero y Presupuestal**.

ICCU — *INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA*

PRESUPUESTO INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMARÁN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Longitud Total: *128.79 m*

Duración en meses de interventoria

SUPERVISION EJECUCION DE OBRA *11.50*

SUPERVISION FASE CARACTERIZACION *3.00*

Provincias: *UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO* **Frentes** *5*

COSTOS DE PERSONAL

CLASIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA RETIRO	REMUNERACIÓN MENSUAL	CANTIDAD	% DE DEDICACIÓN TOTAL	Tiempo en Meses	Factor Multiplicador	VALOR TOTAL
PERSONAL PROFESIONAL FASE CARACTERIZACION								
Director de interventoria 1 (principal)			$ 8,000,000.00	1.0	50%	0.00	2.30	$ -
Especialista Pavimentos			$ 6,500,000.00	3.0	50%	0.00	2.30	$ -
Especialista en Geotecnia			$ 6,500,000.00	3.0	40%	0.00	2.30	$ -
Profesional Gestor Social			$ 4,500,000.00	5.0	50%	0.00	2.30	$ -
Profesional SISO 1			$ 4,500,000.00	1.0	50%	0.00	2.30	$ -
Ingeniero SIG			$ 5,000,000.00	1.0	100%	0.00	2.30	$ -
Ingeniero Residente de interventoria 1			$ 5,000,000.00	1.0	100%	0.00	2.30	$ -
Profesional Ingeniero Apoyo (Juan Sebastian Cruz)	23/05/2025		$ 2,800,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 6,440,000.00
Inspector de interventoria			$ 2,350,000.00	5.0	100%	0.00	2.30	$ -
Topografo (John Rozo)	6/05/2025		$ 2,300,000.00	1.0	50%	1.00	2.30	$ 2,645,000.00
Secretaria			$ 1,700,000.00	1.0	100%	0.00	2.30	$ -
PERSONAL PROFESIONAL								
Director de interventoria 1 (principal) (Edgar Beltrán)	1/04/2025		$ 8,000,000.00	1.0	60%	0.00	2.30	$ 11,040,000.00
Director de interventoria 2			$ 8,000,000.00	2.0	50%	0.00	2.30	
Especialista Pavimentos (Sandra Benavides)	20/05/2025	31/08/2025	$ 6,500,000.00	1.0	50%	1.00	2.30	$ 7,475,000.00
(Adriana Mediorreal)	3/06/2025		$ 6,500,000.00	1.0	50%	1.00	2.30	$ 7,475,000.00
(Alvaro Neira)	16/07/2025		$ 6,500,000.00	1.0	50%	1.00	2.30	$ 7,475,000.00
Especialista en Geotecnia (Diego Camacho)	3/04/2025		$ 6,500,000.00	1.0	80%	1.00	2.30	$ 11,960,000.00
(Giovanny Borraez)	24/04/2025		$ 6,500,000.00	1.0	40%	1.00	2.30	$ 5,980,000.00
Especialista en Estructuras			$ 6,500,000.00	1.0	30%	0.00	2.30	
Especialista Ambiental (Carlos Chaparro)	23/07/2025		$ 5,000,000.00	1.0	60%	1.00	2.30	$ 6,900,000.00
Especialista Hidraulico (Fabian Rodriguez)	1/07/2025		$ 6,500,000.00	1.0	40%	1.00	2.30	$ 5,980,000.00
Abogado (José Pacheco)	1/08/2025		$ 5,000,000.00	1.0	10%	1.00	2.30	$ 1,150,000.00
Profesional Gestor Social (Yessica Hernandez)	10/04/2025		$ 4,500,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 10,350,000.00
(Tania Escobar)	14/04/2025		$ 4,500,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 10,350,000.00
(Diana Chavarrio)	26/05/2025		$ 4,500,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 10,350,000.00
Profesional SISO 1 (Yessica Mora)	3/04/2025		$ 4,500,000.00	1.0	70%	1.00	2.30	$ 7,245,000.00
Profesional SISO 2			$ 4,500,000.00	4.0	50%	0.00	2.30	
Ingeniero Residente de interventoria 1 (Carolina Peña)	1/04/2025		$ 5,000,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 11,500,000.00
Ingeniero Residente de interventoria 2 (Edwin Vargas)	1/08/2025		$ 5,000,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 11,500,000.00
PERSONAL TECNICO								
Profesional Ingeniero Apoyo			$ 2,800,000.00	1.0	100%	0.00	2.30	$ -
Inspector de interventoria (Jonathan Castañeda)	1/05/2025		$ 2,350,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 5,405,000.00
(Angie Jimenez)	2/05/2025		$ 2,350,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 5,405,000.00
(Maira Matiz)	3/06/2025		$ 2,350,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 5,405,000.00
Topografo			$ 2,300,000.00	5.0	50%	0.00	2.30	$ -
Cadenero 1			$ 1,800,000.00	5.0	50%	0.00	2.30	$ -
Secretaria (Helen Sánchez)	16/04/2025		$ 1,700,000.00	1.0	100%	1.00	2.30	$ 3,910,000.00
							TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A) * (B) = (3)	***$ 155,940,000.00***

2. OTROS COSTOS

DESCRIPCIÓN	FECHA DE INGRESO	CANTIDAD	No. de Meses	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	1/04/2025	1	1.00	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00
	22/04/2025 - 08/08/2025	1	0.27	$ 1,866,666.67	$ 1,866,666.67
	22/04/2025	1	0.73	$ 5,133,333.33	$ 5,133,333.33
	22/04/2025	1	1.00	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00
	3/05/2025	1	1.00	$ 7,000,000.00	$ 7,000,000.00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	1/04/2025	1	1.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios	6/05/2025	1	1.00	$ 2,000,000.00	$ 2,000,000.00
Oficina (incluye servicios)	1/04/2025	1	1.00	$ 1,200,000.00	$ 1,200,000.00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías	1/04/2025	1	1.00	$ 780,000.00	$ 780,000.00
Alquiler GPS manual			0.00	$ 2,415,000.00	$ -
Alquiller PC Alto Rendimiento y Software SIG			0.00	$ 2,500,000.00	$ -
				Subtotal Otros Costos (2)	***$ 33,180,000.00***

Ensayos de Laboratorio

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	No. de Meses	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	1	0.00	$ 14,885,000.00	$ -
			Subtotal Otros Costo (3)	***$ -***

Presupuesto para Inteventoria

TOTAL COSTOS (1) + (2) + (3)= (4)	***$ 189,120,000.00***
IVA (4) * 19% = (5)	***$ 35,932,800.00***
AJUSTE AL PESO	
COSTO TOTAL POR EL TIEMPO DE LA INTERVENTORÍA	***$ 225,052,800.00***

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

Se remite el control de garantías del contrato de Interventoría No. 220 de 2025 con las pólizas que han sido presentadas a la fecha de corte del presente informe.

Tabla 45. Seguimiento Garantías contrato de Interventoría.

CONSORCIO INTERVIAL ICCU 050	SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA			
ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A**			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO				
No. DE PÓLIZA	**No. DE ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**OBJETO ACTUALIZACIÓN**	
NB-100373049	0	3/03/2025	Inicio del contrato	
AMPARO	**No. DE CERTIFICADO**	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	72328646	$ 579.821.103,75	3/03/2025	30/06/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	72328646	$ 773.094.805,00	3/03/2025	30/06/2026
PRESTACIONES SOCIALES	72328646	$ 386.547.402,50	3/03/2025	31/12/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	72328646	$ 773.094.805,00	31/12/2025	31/12/2028
No. DE PÓLIZA	**No. DE ANEXO**	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	**OBJETO ACTUALIZACIÓN**	
NB-100373049	2	8/04/2025	Acta de Inicio	
AMPARO	**No. DE CERTIFICADO**	**VALOR**	**VIGENCIA DESDE**	**VIGENCIA HASTA**
CUMPLIMIENTO	72370914	$ 579.821.103,75	1/04/2025	29/07/2026
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	72370914	$ 773.094.805,00	1/04/2025	29/07/2026
PRESTACIONES SOCIALES	72370914	$ 386.547.402,50	1/04/2025	29/01/2029
CALIDAD DEL SERVICIO	72370914	$ 773.094.805,00	29/01/2026	29/01/2029

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría

Durante el periodo reportado, la Interventoría realizó el seguimiento al cumplimiento del Plan de Calidad establecido para el contrato, mediante los procedimientos definidos por el área de calidad. Este seguimiento incluyó la verificación de actividades, formatos y controles implementados en la gestión documental, técnica y administrativa del contrato. Se revisaron los registros asociados al control de calidad, la trazabilidad de observaciones y el cumplimiento de compromisos derivados de las reuniones técnicas y de seguimiento.

Asimismo, se hizo control a la aplicación de los procedimientos internos de la interventoría relacionados con el aseguramiento de la calidad, garantizando la

trazabilidad en la revisión de productos entregables del contratista, la validación de personal asignado y la conformidad de los procesos con los requisitos contractuales establecidos en los pliegos de condiciones.

Cabe señalar que el Plan de Calidad presentado por el contratista continúa en proceso de revisión por parte de la Interventoría, en atención a las observaciones previamente emitidas. Su aprobación quedará sujeta al ajuste y cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos en los términos contractuales.

6.5.1 Seguimiento al Factor de Calidad Contrato de Interventoría

Durante el periodo reportado, la Interventoría realizó el seguimiento al factor de calidad establecido en el contrato, conforme a los lineamientos definidos en el área de calidad del proyecto. Este seguimiento se ha enfocado en verificar el cumplimiento de los indicadores y compromisos asociados a este factor, tanto en el contrato de interventoría como en el contrato de obra.

Actualmente, la interventoría se encuentra en proceso de verificación y análisis de los soportes relacionados con el cumplimiento del factor de calidad, incluyendo la trazabilidad de actividades, el control de entregables, la calidad documental, y la correcta aplicación de los procedimientos técnicos establecidos. Esta revisión permitirá consolidar los resultados mensuales y generar los ajustes o requerimientos necesarios al contratista y al equipo de interventoría, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de los estándares contractuales.

6.6 Otros Documentos seguimiento mensual

6.6.1 Seguimiento a la inversión del Anticipo

Mediante comunicado ICCU-S-052-2025 (11/06/2025) se solicitó al ICCU información sobre el trámite del anticipo, concluyéndose en mesa de trabajo que el desembolso aún se encontraba pendiente. Posteriormente, a través del comunicado ICCU-S-188-2025 (13/08/2025), se autorizó el uso del anticipo N.º 1, cuyo reporte incluyó únicamente costos asociados a personal y recursos pagados por el Consorcio Intervial ICCU 050.

Con posterioridad, mediante comunicado ICCU-S-198-2025, se gestionó la solicitud de uso del anticipo correspondiente a la nómina del mes de agosto del Consorcio Intervial ICCU 050. Frente a este trámite, el ICCU emitió observaciones, las cuales fueron atendidas y respondidas mediante comunicado ICCU-S-210-2025, dando trazabilidad a lo requerido.

A la fecha, aunque se ha enviado la documentación para el uso del anticipo, este no se ha efectuado, quedando su aplicación sujeta a la aprobación de recursos por parte de la supervisión.

La interventoría mantiene el seguimiento permanente a este proceso, garantizando la atención de observaciones y la trazabilidad de las comunicaciones.

6.6.2 Seguimiento Programa de Inversión

A la fecha del presente informe, no se ha efectuado el desembolso del anticipo por parte del ICCU, razón por la cual no se ha iniciado la ejecución del Programa de Inversión correspondiente. En consecuencia, no se cuenta con información financiera o técnica que permita realizar un seguimiento detallado.

6.6.3 Actas de Comité de Obra

- Actas de comité de obra del mes de agosto de 2025 formato ES-MC-FR-06_ACTA DE REUNION y registros de asistencia ES-MC-FR-02_Registro de Asistencia. **Ver Anexo 11 de actas de comité de obra.**

Tabla 46. Actas de Comité de Obra.

tpf INGENIERÍA			Código F-TEC-006
			Versión: 0
			Fecha: 1/12/2022
N° DE ACTA	**FECHA**	**ASUNTO**	**PARTICIPANTES**
34	1-Aug-25	Reunion seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
35	5-Aug-25	Reunion tema presupuesto - Obras de drenaje	Técnica - Interventoría - Contratista -
36	5-Aug-25	Seguimiento entregables de Pavimentos - Contrato de obra ICCU-139 de 2025	Técnica - Interventoría - Contratista -
37	13-Aug-25	Seguimiento entregables de Pavimentos - Contrato de obra ICCU-139 de 2025	Esp pavimentos interventoria y contratista
38	14-Aug-25	Reunion seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
39	20-Aug-25	Seguimiento entregables Pavimentos - Diseños	Esp pavimentos interventoria y contratista
40	22-Aug-25	Reunion seguimiento avance cto. de obra	Técnica -ICCU - Interventoría - Contratista -
41	27-Aug-25	Seguimiento entregables Pavimentos - Diseños	Esp pavimentos interventoria y contratista

7 Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones:

Ambiental

- El contratista implementó los subprogramas del PAGA, pero este aún se encuentra en construcción y pendiente de aprobación por la Interventoría y el ICCU.

- Interventoría y contratista están en proceso de completar los equipos ambientales en las provincias de Rionegro y Ubaté. Almeidas a la fecha se está terminando con el fin de tener un modelo general para todas las provincias.
- Algunos subprogramas aún no aplican por estar en etapa inicial de construcción, aunque se mantiene el seguimiento.

Social

- Se habilitaron puntos de atención en La Palma, Yacopí y Chocontá, con algunos avances en comunicación comunitaria.
- No se recibieron PQRSD en agosto, lo que refleja buena recepción inicial.
- Se avanzó en inventario predial (54 predios) y convocatorias para mano de obra local; sin embargo, persisten falencias en la contratación de ayudantes de obra y en la claridad sobre el proceso en Almeidas y Ubaté.
- Se identificaron problemas de coordinación interna del contratista, falta de metodologías para talleres, ausencia de teléfono exclusivo en algunos puntos, retrasos en piezas comunicativas y debilidades en la capacitación de profesionales sociales.

Geotecnia

- No se registran avances significativos por la falta de información consolidada y completa entregada por el contratista.

- Persiste la ausencia de listados claros de sitios críticos con ubicación, características, afectaciones y medidas recomendadas.
- La interventoría reiterará mediante comunicación formal las falencias identificadas.
- Se recomienda al ICCU exigir la entrega completa de la información, dado que el contratista ha manifestado contar con ella.
- La falta de información adecuada limita la identificación de riesgos técnicos y podría conllevar soluciones inadecuadas.

Pavimentos

- Se consolidaron compromisos para iniciar obra en Susa el 8 de septiembre.
- Se destacan avances en la discusión de diseños y sectorización, pero aún existen vacíos técnicos y documentales que deben ser subsanados para garantizar el éxito en el inicio de obra.

Recomendaciones

Pavimentos y Obras

- Garantizar la adecuada disposición de los materiales extraídos en las labores de limpieza de alcantarillas en el tramo de Manta, conforme a lo solicitado mediante comunicado ICCU-S-195-2025 del 20 de agosto de 2025.
- Entregar informes geotécnicos completos, georreferenciados y con análisis estratigráficos, que permitan trazabilidad y soporte técnico.
- Repetir o validar ensayos inconsistentes y complementar con parámetros faltantes.
- Ajustar los diseños de pavimento considerando tránsito, drenaje y condiciones climáticas locales, retomando las recomendaciones realizadas en mesas de trabajo del 03 y 05 de septiembre.
- Zonificar áreas críticas y prever el uso de material granular en sectores con alta presencia de materia orgánica.
- Cumplir los compromisos adquiridos en reuniones técnicas, garantizando que no se afecte el inicio de la fase de ejecución.

Sociales

- Analizar la alta rotación de profesionales sociales, dado que afecta la continuidad y estabilidad del componente social.
- Garantizar que las profesionales sociales reciban información completa del proyecto (procesos de radicación documental, informes contractuales y de avance) para evitar retrasos administrativos.
- Brindar capacitaciones de fortalecimiento a las profesionales sociales en temas de gestión, avances y documentación del proyecto.
- Asegurar que las piezas comunicativas y material informativo instalados en los Puntos Satélite de Información (PSI) sean remitidos previamente a la interventoría para su revisión y aprobación.
- Establecer números telefónicos exclusivos para las Oficinas de Atención al Ciudadano en las provincias de Rionegro, Almeidas y Ubaté, evitando el uso de líneas personales o administrativas.

- Mejorar la coherencia en los procesos y la información reportada por las profesionales sociales en cada provincia, garantizando continuidad y consistencia en la gestión social.

Geotecnia

- Entregar la información geotécnica consolidada que incluya: ubicación detallada con coordenadas y abscisado, características de las inestabilidades, afectaciones sobre la vía, medidas de intervención recomendadas y limitaciones contractuales.
- Atender observaciones realizadas en informes mensuales previos (meses 2 y 3), evitando radicaciones incompletas que limiten la identificación de riesgos técnicos.
- Remitir oficialmente la información geotécnica que, según lo manifestado en mesas de trabajo, ya se encuentra disponible.
- Complementar los informes con inspecciones visuales y registros fotográficos en los municipios de Chocontá, Sesquilé, Susa, Ubaté y Yacopí (Tramo Llano Mateo), fortaleciendo la documentación de sitios críticos.
- Reforzar actividades de campo en geotecnia para culminar el levantamiento de sitios críticos y garantizar el seguimiento técnico oportuno.

7.1 Correspondencia

CONTRATO 220-2025 CONTROL Y SEGUIMIENTO COMUNICADOS ENVIADOS

Ítem	Consecutivo	Dirigido a	Asunto	Anexos	Fecha Envío	Rad.	Fecha rad.
168	ICCU-S-168-2025	Consorcio YVY	Alcance a nuestro comunicado ICCU-S-116-2025 y ICCU-S-150-2025. Respuesta a comunicados OFICIO YVY-156-25 Resultados Laboratorios municipio de Manta y OFICIO YVY-127-25 Estratigrafía de Manta.	NO	1/8/2025		
169	ICCU-S-169-2025	Consorcio YVY	Respuesta a comunicado OFICIO YVY-161-25 resultados compresión inconfinada 7 días municipio de Ubaté y OFICIO YVY-175-25 informe análisis de resultados – Ubaté.	NO	1/8/2025		
170	ICCU-S-170-2025	Consorcio YVY	Alcance a nuestro comunicado ICCU-S-149-2025, ICCU-S-139-2025, ICCU-S-116-2025 y ICCU-S-150-2025. Respuesta a comunicado OFICIO YVY-145-25 complemento apiques Susa-Fausa-Simijaca-Chocontá.	NO	1/8/2025		
171	ICCU-S-171-2025	Consorcio YVY	Rta. Revision cumplimiento vehiculos obra2	NO	1/8/2025		
172	ICCU-S-172-2025	Consorcio YVY	Solicitud remisión del informe mensual de julio.	NO	4/8/2025		
173	ICCU-S-173-2025	Laura Daniela Nieto	Hoja de Vida Abogado Jose Pacheco	NO	8/8/2025	ICCU-E-2025-0010147	8/8/2025
174	ICCU-S-174-2025	Consorcio YVY	Remisión Solicitud Primer pago Etapa de Caracterización.	SI	5/8/2025		
175	ICCU-S-175-2025	Laura Daniela Nieto	Para Revision y Aprobacion Hoja de vida Topografo Charlixon Robles	NO	5/8/2025	ICCU-E-2025-0010022	6/8/2025
176	ICCU-S-176-2025	Consorcio YVY	Respuesta comunicado YVY-033-25 Entrega de plan de calidad con observaciones subsanadas	NO	5/8/2025		
177	ICCU-S-177-2025	Consorcio YVY	Alcance a nuestro comunicado ICCU-S-116-2025 y ICCU-S-150-2025. Respuesta a comunicados OFICIO YVY-156-25 y ICCU-S-169-2025. Requerimiento por no atención de observaciones de la Interventoría	SI	5/8/2025		
178	ICCU-S-178-2025	Consorcio YVY	Respuesta comunicado YVY-163-25 Subsanación ICCU-S-140-2025 Remisión de archivos SIG de caracterización vial.	SI	6/8/2025		
179	ICCU-S-179-2025	Laura Daniela Nieto	Remisión Informe semanal No 18 de Interventoria	SI	6/8/2025	ICCU-E-2025-0010046	6/8/2025
180	ICCU-S-180-2025	Laura Daniela Nieto	Respuesta a comunicado ICCU-S-2025-2025. Solicitud de concepto técnico con alternativas sobre resultados de estabilización de los tramos correspondientes al contrato de obra ICCU-139-2025 y contrato de Interventoría ICCU-220-2025.	SI	6/8/2025	ICCU-E-2025-0010060	6/8/2025
181	ICCU-S-181-2025	Consorcio YVY	Respuesta a su comunicación YVY-172-25 – Remisión Hojas de Vida	NO	8/8/2025		
182	ICCU-S-182-2025	Consorcio YVY	Solicitud identificación de posibles fuentes de material cercanas	NO	8/8/2025		
183	ICCU-S-183-2025	Consorcio YVY	Respuesta a su comunicación YVY-174-25 – Remisión Hojas de Vida	NO	11/8/2025		
184	ICCU-S-184-2025	Consorcio YVY	Respuesta de Aprobación al comunicado YVY-164-25. Informe mensual 1 abril.	NO	11/8/2025		
185	ICCU-S-185-2025	Consorcio YVY	Remisión Nota 31 - Transport Research Laboratory (TRL).	SI	12/8/2025		
186	ICCU-S-186-2025	Consorcio YVY	Comunicado especialistas Pavimentos	NO	12/8/2025		
187	ICCU-S-187-2025	Consorcio YVY	Remisión Informe Semanal No 19	SI	12/8/2025	ICCU-E-2025-0010318	13/08/2025
188	ICCU-S-188-2025	Luz Angela Sanabria	Solicitud de desembolso anticipo No. 1	SI	13/08/2025	ICCU-E-2025-0010361	13/08/2025
189	ICCU-S-189-2025	Laura Daniela Nieto	Alcance a nuestra comunicación ICCU-S-159-2025. Remisión Solicitud Primer pago Etapa de Caracterización.	SI	14/08/2025	ICCU-E-2025-0010430	14/08/2025
190	ICCU-S-190-2025	Rosaura Coca Molina	Solicitud Información Vehículo de Placas ESM872 - Rosaura Coca Molina	NO	20/08/2025		
191	ICCU-S-191-2025	Consorcio YVY	Respuesta a comunicaciones YVY-173-25 – Respuesta entrega programación preliminar etapa de ejecución Contrato de obra ICCU-139 de 2025 y YVY 202-25 Remisión de porcentajes de Incidencia de actividad por provincia	NO	20/08/2025		
192	ICCU-S-192-2025	Consorcio YVY	Respuesta a comunicación YVY-182-25 - APU NP-01 Demolición de pavimento flexible para apiques de campo	NO	20/08/2025		
193	ICCU-S-193-2025	Raul Suarez	Terminación contrato de Arrendamiento Raul Suarez - KOK 733	NO	20/08/2025		
194	ICCU-S-194-2025	Laura Daniela Nieto	Remisión Informe Semanal No 20	SI	20/08/2025	ICCU-E-2025-0010689	21/08/2025
195	ICCU-S-195-2025	Consorcio YVY	Observaciones sobre la disposición final del material y el no uso de elementos de protección personal durante las actividades de limpieza y mantenimiento de alcantarillas – Municipio de Manta	NO	20/08/2025		
196	ICCU-S-196-2025	Consorcio YVY	Respuesta a comunicación YVY-181-25 - Remisión hojas de vida etapa de ejecución	NO	20/08/2025		
197	ICCU-S-197-2025	Consorcio YVY	Remisión oficio N°. ICCU-S-2025-0005761 Termino de ejecución y entregables FASES 1 y 2 – Contrato de Obra Pública No. ICCU-139 de	SI	22/08/2025		

7.2 Registro fotográfico del avance de las obras.

Se anexa registro fotográfico correspondiente al reconocimiento de los tramos, así como a las reuniones técnicas y sociales sostenidas con la interventoría, la comunidad y los

especialistas involucrados, lo cual constituye un avance preparatorio clave para la ejecución del contrato. **Ver Anexo 5. Informe Residente Interventoría.**

- **Fotografía 7. Limpieza de Alcantarillas**



Ver Anexo 1. Informes Semanales

7.3 Registro fotográfico de las actividades sociales.

Durante el periodo evaluado, las actividades se han concentrado exclusivamente en el componente social, razón por la cual el registro fotográfico anexo corresponde únicamente a las gestiones adelantadas en este frente. **Ver Anexo 6. Informe Social.**

- **Fotografía 8. Actividades Sociales**

Responsable: Paola Hernández	
Cargo: Profesional Social	**Fecha:** 25-08 al 30-08 2025
 **Imagen 1.** Verificación de funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad.	**Descripción Fotografía** Fecha: 27/08/2025 Hora: 12:52 pm El Contratista YVY instala afiche con información general del proyecto y los canales de comunicación del mismo.
 **Imagen 2.** Verificación de funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad.	**Descripción Fotografía** Fecha: 27/08/2025 Hora: 12:52 pm Se verifica que la oficina de Atención al Ciudadano brindó su atención en el horario de 9:00 am a 6:00 pm en jornada continua. La cual se encuentra localizada en casco urbano del Municipio de Ubaté.
 **Imagen 3.** Atención del Punto de Atención a la Comunidad.	**Descripción Fotografía** Fecha: 27/08/2025 Hora: 3:21 pm Se verifica que la Profesional Social del Contratista YVY Sandra Morato presto atención a la comunidad, atendiendo inquietudes y brindando información general del proyecto.

- **Fotografía 9. Actividades Sociales**

Proyecto: "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE UBATÉ, ALMEIDAS Y RÍONEGRO, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA."

Responsable: Paola Hernández

Cargo: Profesional Social | **Fecha:** 19-08 al 23-08 2025



Imagen 1. Verificación de funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad.

Descripción Fotografía

Fecha: 20/08/2025
Hora: 2:07 pm

Se verifica que la oficina de Atención al Ciudadano brindó su atención en el horario de 2:00 pm a 5:00 pm. La cual se encuentra localizada en casco urbano del Municipio de Ubaté.



Imagen 2. Verificación de funcionamiento del Punto de Atención a la Comunidad.

Descripción Fotografía

Fecha: 20/08/2025
Hora: 2:08 pm

Se verifica que la Profesional Social del Contratista YVY se encontraba en la oficina de Atención al Ciudadano, presta a recibir a la comunidad en general.



Imagen 3. Actualización del Punto Satélite de Información-PSI.

Descripción Fotografía

Fecha: 20/08/2025
Hora: 11:16 am

Actualización y mantenimiento del Punto Satélite de Información-PSI con el afiche informativo del proyecto, localizado en la tienda la "Caseta Roja" del sector del Reten de la vereda El Pantano del Municipio de Simijaca de la Provincia de Ubaté.

7.4 Bitácora del mes correspondiente

Durante el mes correspondiente al presente informe se presenta bitácora de las actividades ejecutadas. **Ver Anexo 5. Informe Residente Interventoría.**

7.5 Acta de costos de interventoría

Se anexa el acta correspondiente formato Ver anexo 08. Acta de Costos Interventoría.
