	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Puertas de emergencia Cortafuego (0.9-1.2 X 2.4) según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
16,4		UNIDAD	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



PU-07	0.90	2.05	Puerta batiente de emergencia, marco CR cal. 16 cargado con grouting, hoja entamborada lisa en lámina CR. Cal 20 con relleno tipo honeycomb, acabado pintura electrostática color gris RAL 7042 aplicada sobre tratamiento anticorrosivo.	Barra antipánico tipo "Yale Tampa de 1 punto" o similar instalada con manija metálica tipo "Yale Versailles", cierrapuertas hidráulico instalado en la parte superior de la hoja.	Sin observaciones.	Pisos 1 a 4 - Salidas a escaleras y pasillos de emergencia.	10	0	10
PU-08	0.90	2.40	Puerta batiente con montante, marco CR cal. 16 cargado, hoja y montante entamborados lisos en lámina CR. Cal 20 con relleno tipo honeycomb, acabado pintura electrostática negro mate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo.	Barra antipánico tipo "Yale Tampa de 1 punto" o similar instalada con manija metálica tipo "Yale Versailles", control electromagnetico controlado a distancia y cierrapuertas hidráulico instalado en la parte superior de la hoja.	Coordinar instalación de puerta con sistema de control y seguridad del edificio para control de apertura electrómagnético.	Piso 1 - Salidas de emergencia sobre fachada principal.	1	0	1
PU-09	2.05	2.40	Puerta batiente con montante y complemento fijo lateral, marco CR cal. 16 cargado, hoja y montante entamborados lisos en lámina CR Cal 20 con relleno tipo honeycomb, acabado pintura electrostática negro mate aplicada sobre tratamiento anticorrosivo. Hoja 1,20 x 2,05.				1	0	1

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PU-07 (0,90X2,05)							
	1er piso							
	Acceso escalera. Eje 2'(A-B)						1,00	1,00
	2do piso							
	Acceso escalera. Eje 2'(A-B)						1,00	1,00
	3er piso							
	Acceso escalera. Eje 2'(A-B)						1,00	1,00
	4to piso							
	Acceso escalera. Eje 2'(A-B)						1,00	1,00
	PU-09 (0,90X2,05)							
	1er piso							
	Salida emergencia 1. Eje 1(A'-B)						1,00	1,00
	DESCONTAR ADCUMULADO ACTA ANTERIORES							**-1,00**
								-
	EN PROCESO DE PINTURA AL HORN0							**-2,00**
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								2,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**2,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Fachadas metalicas/celosia según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
16,12		M2	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

REJILLAS METÁLICAS

PUERTA	DIMENSIONES (Metros)			DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD
	ANCHO	ALTO	ÁREA				
RM-01	5.86	0.53	3.11	Rejilla en ángulos y platinas metálicas 38mm, seccionada en varios paneles con apariencia exterior continua sin subdivisiones. RM-01 con varillas lisas verticales Ø1" cada 60cms como rigidizadores de platinas de persianas. Acabado pintura electrostática negro RAL RAL 9005 mate.	Consultar fijaciones con ingeniero estructural en obra para garantizar estabilidad y seguridad de los anclajes.	Piso 1 Fachada ppal	1
RM-02	0.62	8.80	5.46			Pisos 2 a 4 Fachada ppal	1
RM-03	1.20	2.69	3.23	Reja en ángulos 50mm con barrotes en varilla lisa Ø20mm cada 10 cms, con platinas horizontales 50x3mm cada 29 cms, fijaciones perimetrales en varilla roscada y tuerca anclada y asegurada con soldadura. Panel batiente elaborado de la misma manera, con bisagras de cápsula, cerrojo operado con llave por ambas caras, acabado pintura electrostática gris mate.		Piso 1 Carceletas	2

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	RM-01 (5,86 X 0,53)							
	FACHADA PRINCIPAL. EJE1(C-D). 1er PISO		5,83	0,53	3,09		1,00	3,09
	RM-02 (0,62 X 8,80)							
	FACHADA PRINCIPAL. EJE D. 2do a 4to PISO		0,62	6,36	3,94		1,00	3,94
								-
								7,03
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		7,03

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Puerta sencilla en madera sencilla según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	UNIDAD	FECHA:	
17,1		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
		**PU-40 (0,80X2,05)**							
		3er piso. Baño de seguridad						1,00	1,00
		PU-41 (0,90X2,05)							
		1er piso. Sala de audiencia 3						1,00	1,00
		1er piso. Sala de audiencia 2						1,00	1,00
		1er piso. Sala de audiencia 1						1,00	1,00
		PU-42 (1,00X2,05)							
		4to piso. JUZGADO						1,00	1,00
		4to piso. SALA DE RELAJACION						1,00	1,00
		4to piso. SALA DE AUDIENCIA 6						1,00	1,00
									1,00
									1,00
									1,00
									1,00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									11,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	11,00

PUERTAS EN MADERA									
PU-40	0.80	2.05	Puerta sencilla batiente con marco en madera maciza y hoja entamborada con estructura interior y caras con triplex 5mm madera cedro, relleno con fibra de vidrio tipo frescasa. Acabado de marco y hojas con laca transparente mate poro abierto, hoja instalada con bisagras ocultas.	Manija metálica tipo institucional para baños.	Sin observaciones	Piso 3 Baño Seguridad	0	1	1
PU-41	0.90			Manija metálica tipo "Yale Versailles institucional" o similar con llave para espacios interiores, acabado satinado.	Sin observaciones	Piso 1 Acceso jueces Sala de audiencias	1	2	3
PU-42	1.00				Sin observaciones	Pisos 1 y 4 Acceso salas de aundiencia	4	2	6

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Rejilla piso -baño redonda 3" X 2" plastica. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
18,1		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

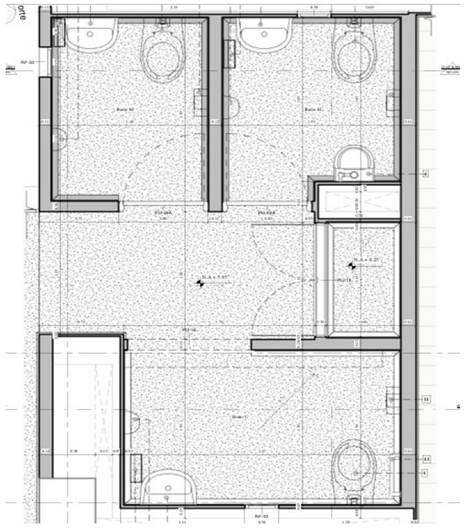



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
AR-01	**1er PISO**							
	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑS CARCELETA						3,00	3,00
	2do PISO							
AR-02	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	3er PISO							
AR-03	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJE 2(C-D). SEGURIDAD						1,00	1,00
	3er PISO							
AR-04	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJE 2(C-D). SEGURIDAD						1,00	1,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								17,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	17,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Sanitario Institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
18,2		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

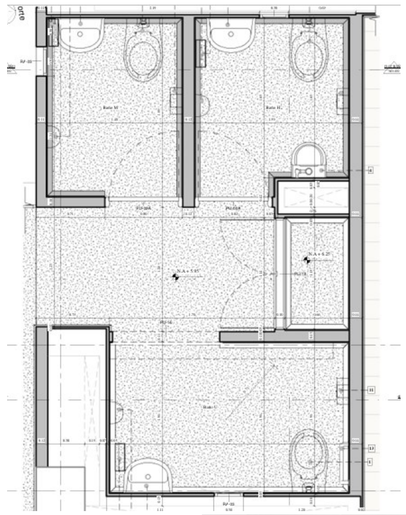



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	1er PISO							
AR-01	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑS CARCELETA						1,00	1,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑS GIMNASIO						2,00	2,00
	EJES (C-D)(4-5). BAÑO DIRECCION						1,00	1,00
	2do PISO							
AR-02	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	3er PISO							
AR-03	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJE 2(C-D). SEGURIDAD						1,00	1,00
	4toPISO							
AR-04	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								17,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**17,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Lavamanos Institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
18,3		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

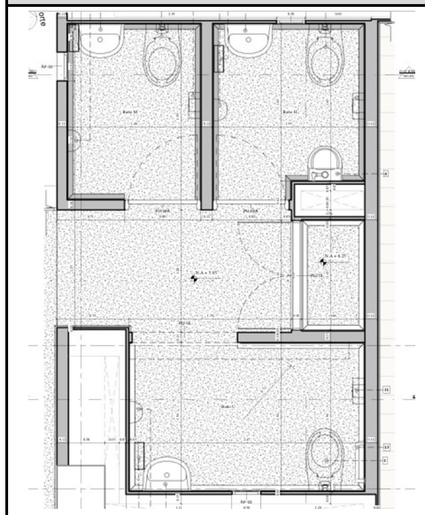



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	1er PISO							
AR-01	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑS CARCELETA						1,00	1,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑS GIMNASIO						2,00	2,00
	EJES (C-D)(4-5). BAÑO DIRECCION						1,00	1,00
	2do PISO							
AR-02	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	3er PISO							
AR-03	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJE 2(C-D). SEGURIDAD						1,00	1,00
	4to PISO							
AR-04	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								17,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**17,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Griferia lavamanos Institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
18,4		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

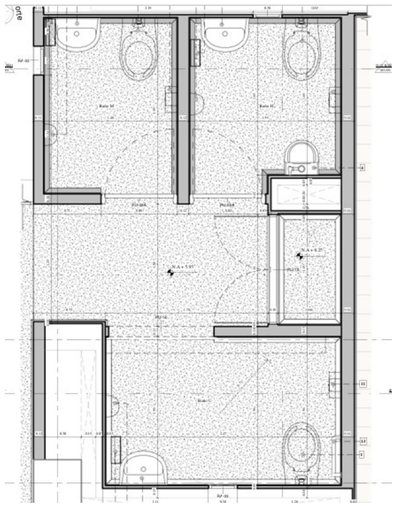




REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	1er PISO							
AR-01	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑS CARCELETA						1,00	1,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑS GIMNASIO						2,00	2,00
	EJES (C-D)(4-5). BAÑO DIRECCION						1,00	1,00
	2do PISO							
AR-02	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	3er PISO							
AR-03	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJE 2(C-D). SEGURIDAD						1,00	1,00
	4to PISO							
AR-04	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Sensor Lavamanos/Sanitario/Orinal. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
18,7		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

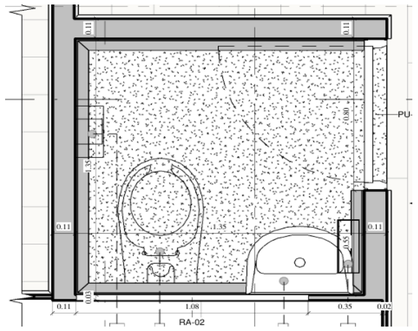



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
AR-01	**1er PISO**							
	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						7,00	7,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑ CUSTODIOS							-
	2do PISO							
AR-02	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						7,00	7,00
	3er PISO							
AR-03	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						7,00	7,00
	EJE 2(C-D). SEGURIDAD						2,00	2,00
	4to PISO							
AR-04	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						7,00	7,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								30,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**30,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA



Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Orinal institucional. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
18,9		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

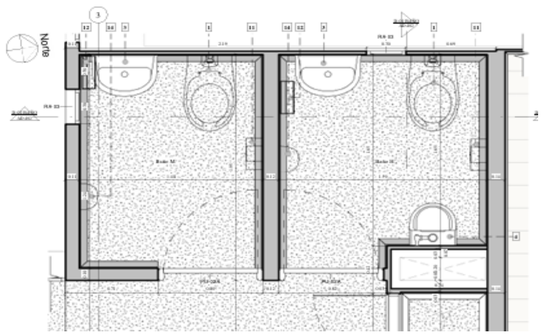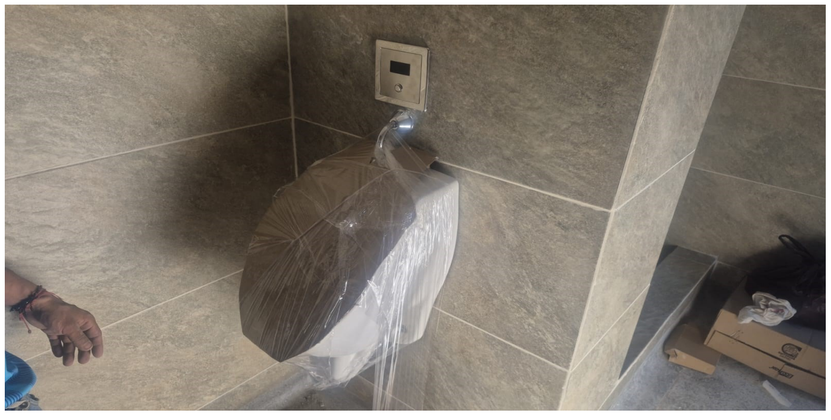DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto				
	AR-01	**1er PISO**							
		EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						1,00	1,00
		2do PISO							
	AR-02	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						1,00	1,00
		3er PISO							
	AR-03	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						1,00	1,00
		4to PISO							
	AR-04	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						1,00	1,00
									
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									4,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**4,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Barras de seguridad en L. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
18,11		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

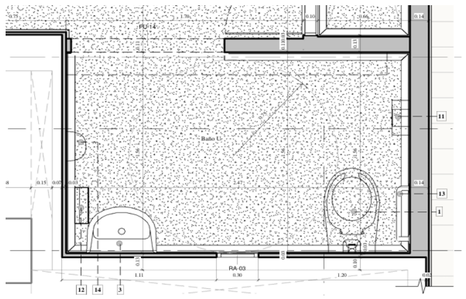



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
AR-01	**1er PISO**							
	EJES (A-B)(3-3'). BAÑO U						1,00	1,00
	2do PISO							
AR-02	EJES (A-B)(3-3'). BAÑO U						1,00	1,00
	3er PISO							
AR-03	EJES (A-B)(3-3'). BAÑO U						1,00	1,00
	4to PISO							
AR-04	EJES (A-B)(3-3'). BAÑO U						1,00	1,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								4,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**4,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Poceta de aseo. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
18,16		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

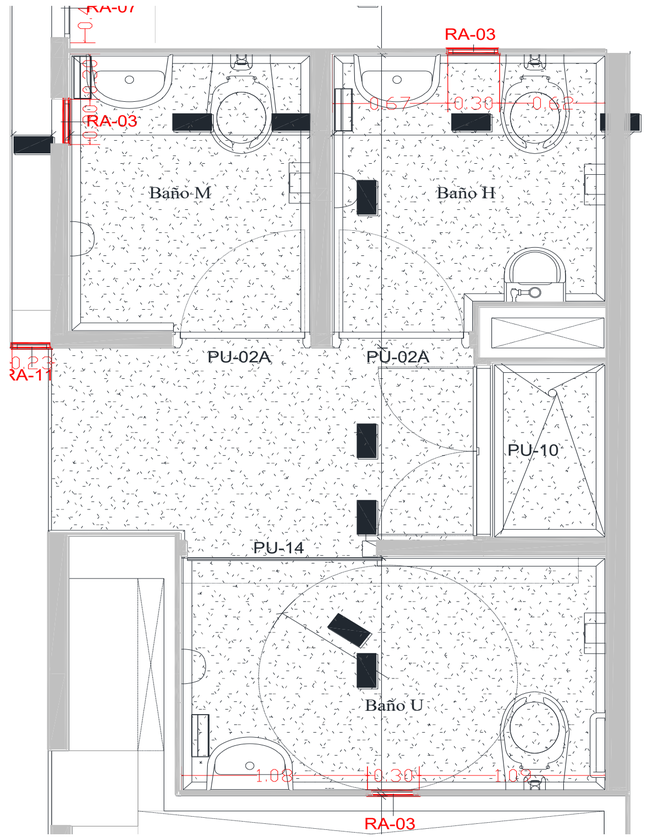


REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
AR-01	**1er PISO**							
	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						1,00	1,00
	2do PISO							
AR-02	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						1,00	1,00
	3er PISO							
AR-03	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						1,00	1,00
	4to PISO							
AR-04	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						1,00	1,00
								-
								-
								-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Bordillo en concreto 21 Mpa (3000 psi) fundido en sitio -Pisos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación.	UNIDAD	FECHA:	
20,3		ML	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	OBRAS EXTERIORES	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

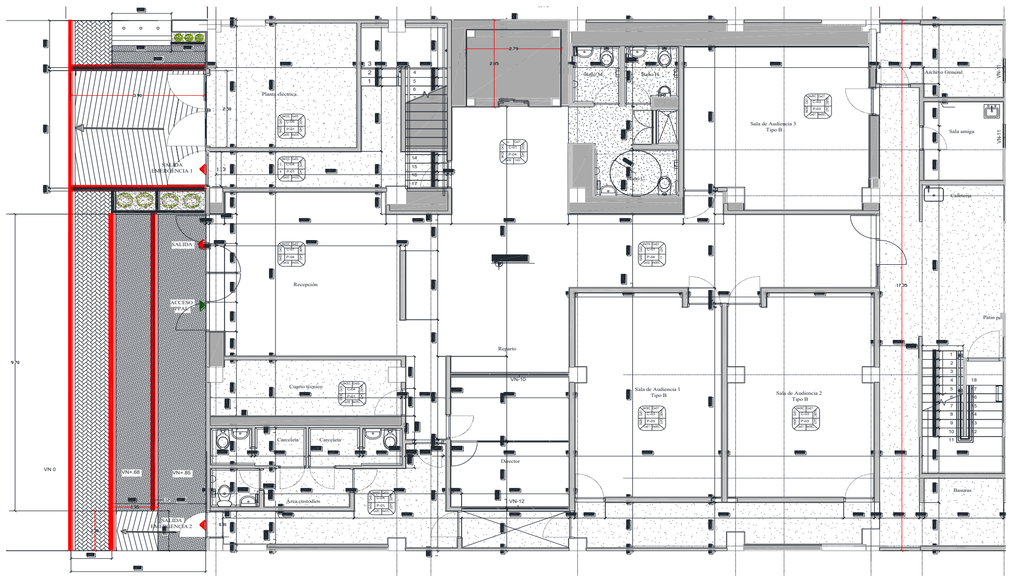

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (mL)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	ANDEN ENTRADA AL EDIFICIO							
	Bordillo entre anden y via	29,50					1,00	29,50
	Bordillo entre anden y escaleras	11,50					1,00	11,50
	Bordillo paso alto escaleras	9,70					1,00	9,70
	Bordillo contra hastas banderas	3,95					1,00	3,95
	Bordillo contra materas	3,95					1,00	3,95
		1,23					1,00	1,23
	DESCONTAR ACUMULADO PAGADO ACTAS ANTERIORES							**-54,66**
								5,17
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**5,17**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Detector de humo fotoeléctrico. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
24,101		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Diam	Pero	Volumen total (m3)		
	1ER PISO	PRIMER PISO						1,00	1,00
								1,00	
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	Detector de Temperatura. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:
	24,102		UN	30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025


DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Diam	Pero	Volumen total (m3)		
	1ER PISO	1ER PISO						2,00	2,00
								2,00	
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		2,00

ELABORÓ:



CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Estación Manual. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
24,103		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Diam	Pero	Volumen total (m3)		
	CUARTO PISO	CUARTO PISO						12,00	12,00
								12,00	
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		12,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Alarma Audición visual. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
24,104		ML	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Diam	Pero	Volumen total (m3)		
1ER PISO	CUARTO PISO						19,00	19,00
							19,00	
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		19,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Modulo de Relé simple para integración con control de acceso, Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
24,105		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

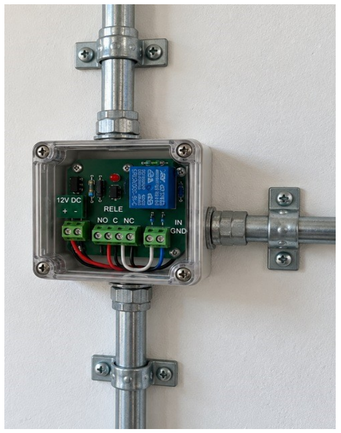DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Diam	Pero	Volumen total (m3)		
	1ER PISO	SUB ESTACION ELECTRICA						1,00	1,00

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	24,106	Panel de incendio, incluye baterías y accesorios para su correcto funcionamiento, debe contar con al menos 2 nacs 1 loops para 250 equipos y tarjeta expansora para un loop adiciona para 250 equipos, incluye todos los materiales, insumos, andamios y elementos de SST para su correcta fabricación o instalación	UN	30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Diam	Pero	Volumen total (m3)		
	1ER PISO	PRIMER PISO						1,00	1,00
								1,00	
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 24,201	Cableado 2x16. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: Und	FECHA: 30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	1ER PISO							35,00	35,00
								35,00	35,00
								40,00	40,00
								10,00	10,00
	215								

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ITEM No.: 24,202	Tuberías EMT de 3/4" con accesorios de instalación. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: ml	FECHA: 30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
1ER PISO		66,74						66,74
		67,56						67,56
		68,90						68,90
		64,60						64,60
								-
								-
								267,80
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**267,80**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 24,203	Salidas para sensor, incluye cajas y accesorios de conexión. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD: Und	FECHA: 30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA


DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	PISO 2	JUZGADO 14						3,00	3,00
		JUZGADO 11 Y 6						3,00	3,00
		JUZGADO 5 Y 16						4,00	4,00
		JUZGADO 10						2,00	2,00
	PISO 3	JU ZGADO 2 Y HALL ASCENSOR						3,00	3,00
		JUZGADO 9						2,00	2,00
		JUZGADO 13 Y 3						4,00	4,00
		JUZGADO 15						3,00	3,00
	PISO 4	JUZGADO 4						2,00	2,00
		JUZGADO 15						2,00	2,00
		JUZGADO 1						2,00	2,00
		SALA AUDIENCIA 6						1,00	1,00
		SALA AUDIENCIA 5						1,00	1,00
		SALA AUDIENCIA 4						1,00	1,00
		DEPOSITO						1,00	1,00
		HALL ASCENSOR						1,00	1,00
	PISO 1	SALA AUDI 2						6,00	6,00
		SALA AUD 3						4,00	4,00
		DIRECTOR						4,00	4,00
		CARCELETA						4,00	4,00
		GIMNASIO						4,00	4,00
									-
									-
									57,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**57,00**

ELABORÓ:



CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: 24,204	Salidas para estación manual o señal audiovisual, incluye cajas y accesorios de conexión	UNIDAD: Und	FECHA: 30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	PISO 2	ESTACION MANUAL						3,00	3,00
		SEÑAL AUDIOVISUAL						3,00	3,00
	TERCER PISO	ESTACION MANUAL						3,00	3,00
									4,00
									-
									-
									13,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**13,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.: NP012	Construccion de columnetas o vigas de coronacion en concreto de 3000 psi con seccion base menor a 0.12 altura menor a 0.12	UNIDAD: ML	FECHA: 30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA: C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
3ER PISO	BAÑO EJE (D-C) (3-4)	0,20	0,10	2,20			5,00	11,00
4TO PISO	ACCESO	0,20	0,10	2,40			8,00	19,20
	JUZGADO 4	0,20	0,10	2,40			4,00	9,60
	SALA AUDIENCIA 4	0,20	0,10	2,40			4,00	9,60
	BAÑOS	0,20	0,10	2,40			7,00	16,80
	CUARTO MAQUINAS	0,20	0,10	2,40			5,00	12,00
1ER PISO	BAÑOS	0,20	0,10	2,40			12,00	28,80
4TO PISO	FACHADA BALCON	0,20	0,10	2,25			2,00	4,50
		0,15	0,10	0,90			5,00	4,50
1ER PISO	CÁRCAMO	0,20	0,10	2,88			1,00	2,88
		0,20	0,10	2,60			1,00	2,60
3ER PISO	FACHADA BALCON	0,20	0,10	2,25			2,00	4,50
		0,15	0,10	0,90			5,00	4,50
2do PISO	FACHADA BALCON	0,20	0,10	2,25			2,00	4,50
		0,15	0,10	0,90			5,00	4,50
1ER PISO	viga cinta de muro balcon	4,60	0,10	0,20			1,00	4,60
3ER PISO	viga cinta de muro balcon	4,60	0,10	0,20			1,00	4,60
2do PISO	viga cinta de muro balcon	4,60	0,10	0,20			1,00	4,60
4TO PISO	FACHADA EJE A-1	2,34	0,10	0,20			2,00	4,68
	FACHADA POSTERIOR A-5	2,34	0,10	0,20			1,00	2,34
	FACHADA POSTERIOR B'-5	2,34	0,10	0,20			1,00	2,34
	FACHADA POSTERIOR D-5	2,34	0,10	0,20			1,00	2,34
EJE 1 FACHADA	FACHADA EJE B'	2,60	0,20	0,15			1,00	2,60
	FACHADA EJE B''	2,60	0,20	0,15			1,00	2,60
	FACHADA EJE C'	2,60	0,20	0,15			1,00	2,60
4TO PISO (2-3)(C-D)	MURO VACIO (columneta)	0,90	0,15	0,10			13,00	11,70
	MURO VACIO (viga corona)	8,95	0,15	0,10			1,00	8,95
3ER PISO (2-3)(C-D)	MURO VACIO (columneta)	0,90	0,15	0,10			13,00	11,70
	MURO VACIO (viga corona)	8,95	0,15	0,10			1,00	8,95
2do PISO (2-3)(C-D)	MURO VACIO (columneta)	0,90	0,15	0,10			9,00	8,10
								222,18
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**222,18**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: NP012	Construccion de columnetas o vigas de coronacion en concreto de 3000 psi con seccion base menor a 0.12 altura menor a 0.12	UNIDAD: ML	FECHA: 30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
	MURO VACIO (viga corona)	5,83	0,15	0,10			1,00	5,83
ANDEN FACHADA	MURO BANDERAS	0,75	0,17	0,10			4,00	3,00
PRIMER PISO	BUITRON C3	2,60	0,13	0,10			5,00	13,00
SEGUNDO PISO	ENTRADA ESCALERAS	2,30	0,20	0,10			1,00	2,30
PRIMER PISO	MURO ESCALERA CARA ASC	2,68	0,13	0,10			4,00	10,72
PRIMER PISO	MURO BUITRON B2	2,68	0,13	0,10			3,00	8,04
PRIMER PISO	BUITRON B2	2,68	0,13	0,10			2,00	5,36
Z. N. N+0,0 - N+3,14	ARC. GRAL Y SALA AMIGA	2,70	0,13	0,10			10,00	27,00
	ARCHIVO	2,68	0,13	0,10			2,00	5,36
	CAFETERIA	2,68	0,13	0,10			4,00	10,72
ZONA NUEVA 2DO P	PERSONAL	2,40	0,13	0,10			2,00	4,80
		2,70	0,13	0,10			2,00	5,40
	COL C5	2,20	0,13	0,10			2,00	4,40
ZONA NUEVA 3ER	ZONA AMIGA	2,30	0,13	0,10			2,00	4,60
	COL C5	2,17	0,13	0,10			2,00	4,34
ZONA NUEVA 3ER	GRADAS	2,00	0,13	0,10			2,00	4,00
ZONA NUEVA 2DO	GRADAS	2,00	0,13	0,10			2,00	4,00
ZONA NUEVA 1ER	ESCALERAS POSTERIOR	2,50	0,13	0,10			2,00	5,00
	ESCALERAS FRONTAL	2,52	0,13	0,10			2,00	5,04
2DO PISO	EJE A2	2,08	0,13	0,10			1,00	2,08
3ER PISO	EJE A2	2,03	0,13	0,10			1,00	2,03
	EJE 5A	1,80	0,13	0,10			2,00	3,60
4to piso	eje D-5	2,37	0,13	0,10			1,00	2,37
	ZONA NUEVA EJE 6	2,35	0,13	0,10			2,00	4,70
PRIMER PISO	CUARTO TECNICO	2,50	0,13	0,10			1,00	2,50
2DO PISO ZONA UN	BUITRON COL C5	2,42	0,13	0,10			1,00	2,42
4to piso	EJE A2	2,25	0,13	0,10			1,00	2,25
	ZONA NUEVA	2,63	0,13	0,10			2,00	5,26
3ER PISO	ZONA NUEVA	2,65	0,13	0,10			2,00	5,30
	EJE 5-C'	2,10	0,13	0,10			2,00	4,20
								169,62
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	391,80

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: NP012	Construccion de columnetas o vigas de coronacion en concreto de 3000 psi con seccion base menor a 0.12 altura menor a 0.12	UNIDAD: ML	FECHA: 30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
PRIMER PISO	MURO POSTERIOR	2,75	0,13	0,10			27,00	74,25
4TO PISO	MURO LLEGADA ESCALERA	2,60	0,13	0,10			1,00	2,60
1ER PISO	VIGA CORONA PATIO	18,74	0,13	0,13			2,00	37,48
1ER PISO	PATIO EJE D	2,75	0,13	0,10			6,00	16,50
	PATIO EJE A	2,75	0,13	0,10			5,00	13,75
	VIGA C. LATERAL EJE A	3,62	0,13	0,13			1,00	3,62
	VIGA C. LATERAL EJE A	3,87	0,13	0,13			1,00	3,87
								152,07
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		152,07

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	SUMINISTRO E INSTALACION PLÁSTICO NEGRO CAL 3.5 EN SUPERFIECIE PLACAS DE CONRAPISO	UNIDAD	FECHA:	
NP014		M2	30 de septiembre de 2026	


OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA
		C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

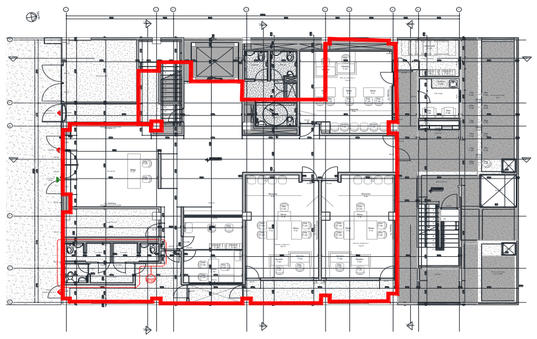

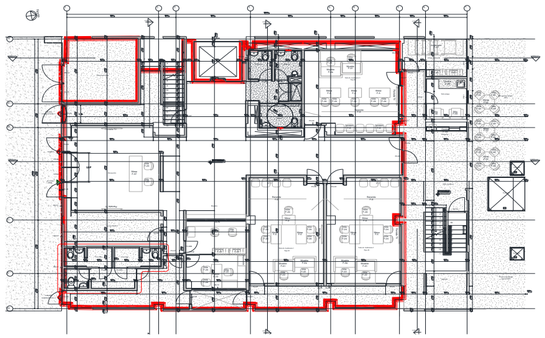

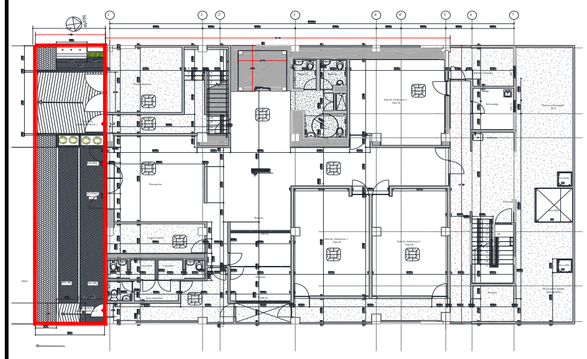

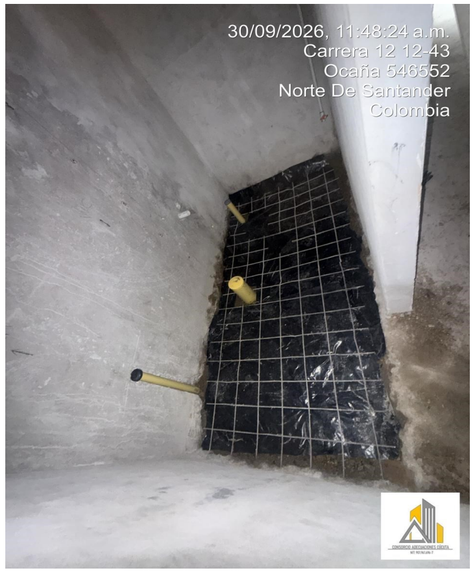

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
1ER PISO	OFI. DIREC.	1,4		1,2			1,00	1,68
	GIMNASIO	1,1		2,6			2,00	5,72
	CARCELETA	1,33		0,8			1,00	1,06
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								8,46
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**8,46**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: NP014	SUMINISTRO E INSTALACION PLÁSTICO NEGRO CAL 3.5 EN SUPERFIECIE PLACAS DE CONRAPISO	UNIDAD	M2	FECHA: 30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

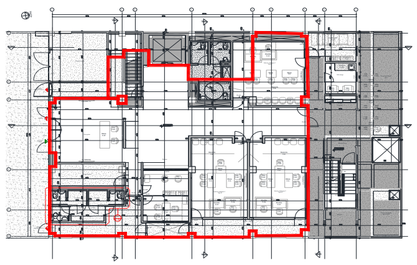

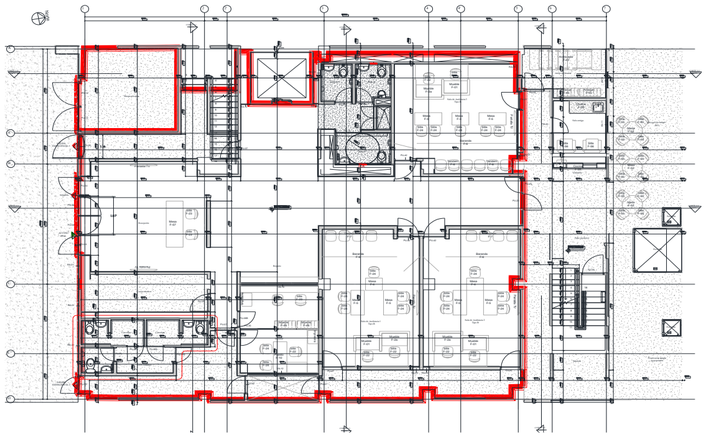



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
1ER PISO	ANDEN	8,48	4,15		35,18		1,00	35,18
1ER PISO	OFI. DIREC.	1,4		1,2			1,00	1,68
	GIMNASIO	1,1		2,6			2,00	5,72
	CARCELETA	1,33		0,8			1,00	1,06
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								43,65
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		43,65

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: **NP034**	**Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación**	**FECHA:** M2	**30 de septiembre de 2026**

HOJA 1 DE 1

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

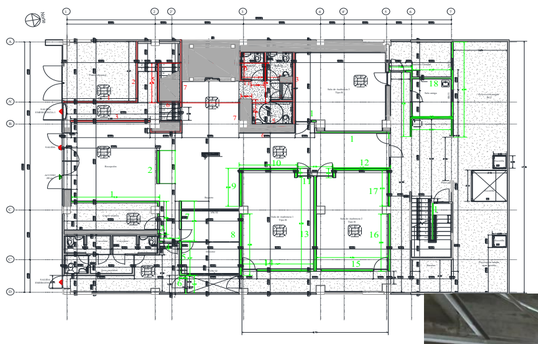



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PISO 1							
AD-301	EJE C(1-2). CUARTO TÉCNICO (1)	5,31		2,40	12,74		1,00	12,74
	EJE 2(B'-B"). RECEPCIÓN (2)	2,25		2,40	5,40		1,00	5,40
	EJE 2(C-C'). CUARTO TÉCNICO (3)	2,26		2,40	5,42		1,00	5,42
	EJE C'(2-2'). CUSTODIOS (4)	1,20		2,40	2,88		1,00	2,88
	EJE C'(2-2'). CUSTODIOS (5)	2,37		2,40	5,69		1,00	5,69
	EJE 2'(C-C'). DIRECTOR (6)	1,23		2,40	2,95		1,00	2,95
	EJE 2'(C-C'). DIRECTOR (7)	2,75		2,40	6,60		1,00	6,60
	EJE 2'(C-C'). DIRECTOR (8)	4,20		2,40	10,08		1,00	10,08
	EJE 2'(C-C'). REPARTO (9)	2,60		2,40	6,24		1,00	6,24
	EJE 2'(C-C'). SALA AUDIENCS 1 (10)	3,49		2,40	8,38		1,00	8,38
	EJE 2'(C-C'). SALA AUDIENCS 1 (11)	3,42		2,40	8,21		1,00	8,21
	EJE 2'(C-C'). SALA AUDIENCS 2 (12)	3,47		2,40	8,33		1,00	8,33
	EJE 2'(C-C'). SAL AUDINCS 1 y 2 (13)	6,50		2,40	15,60		1,00	15,60
	EJE 2'(C-C'). SAL AUDINCS 1 (14)	4,27		2,40	10,25		1,00	10,25
	EJE 2'(C-C'). SAL AUDINCS 2 (15)	4,26		2,40	10,22		1,00	10,22
	EJE 2'(C-C'). SAL AUDINCS 2 (16)	3,89		2,40	9,34		1,00	9,34
	EJE 2'(C-C'). SAL AUDINCS 2 (17)	2,43		2,40	5,83		1,00	5,83
	EJE 2'(C-C'). SAL AMIGA (18)	1,39		2,40	3,34		1,00	3,34
		2,33		2,40	5,59		1,00	5,59
		4,51		2,40	10,82		1,00	10,82
		2,31		2,40	5,54		1,00	5,54
		6,49		2,40	15,58		1,00	15,58
	EJE 2'(C-C'). ESCALERA (19)	2,58		2,40	6,19		1,00	6,19
	OFI. DIRECTOR	4,15		2,30	9,55		1,00	9,55
		1,20		2,30	2,76		1,00	1,20
	GIMNASIO	5,28		2,30	12,14		1,00	5,28
	SALIDA DIRECTOR	1,15		2,30	2,65		2,00	2,30
								199,55
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**199,55**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: NP034	Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación	M2	FECHA: 30 de septiembre de 2026

HOJA 1 DE 1

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

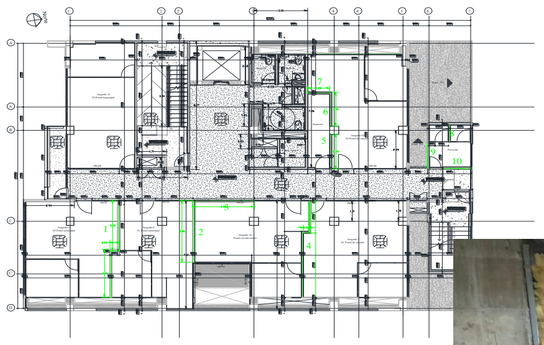



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PISO 2							
AD-302	EJE (C-D)(1-5). JUZGADS 11 y 6. (1)	3,25		2,72	8,84		1,00	8,84
		0,55		2,72	1,50		1,00	1,50
		3,10		2,10	6,51		-1,00	-6,51
	EJE (C-D)(1-5). JUZGADS 6 y 16. (2)	3,98		2,72	10,83		1,00	10,83
	EJE (C-D)(1-5). JUZGAD 16. (3)	8,58		2,72	23,34		1,00	23,34
	EJE (C-D)(1-5). JUZGAD 5 y 16. (4)	2,06		2,72	5,60		1,00	5,60
		0,32		2,72	0,87		1,00	0,87
		4,15		2,72	11,29		1,00	11,29
	EJE (AC)(3-7). DEPÓSITO. (5)	2,24		2,72	6,09		1,00	6,09
	EJE (AC)(3-7). DEPÓSITO. (6)	2,18		2,72	5,93		1,00	5,93
	EJE (AC)(3-7). DEPÓSITO. (7)	1,28		2,72	3,48		1,00	3,48
	EJE (AC)(3-7). DEPÓSITO. (8)	1,10		2,72	2,99		1,00	2,99
	EJE (AC)(3-7). DEPÓSITO. (9)	1,65		2,72	4,49		1,00	4,49
	EJE (AC)(3-7). DEPÓSITO. (10)	2,53		2,72	6,88		1,00	6,88
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								85,62
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		285,17

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: **NP034**	**Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación**	M2	**FECHA:** **30 de septiembre de 2026**

HOJA 1 DE 1

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

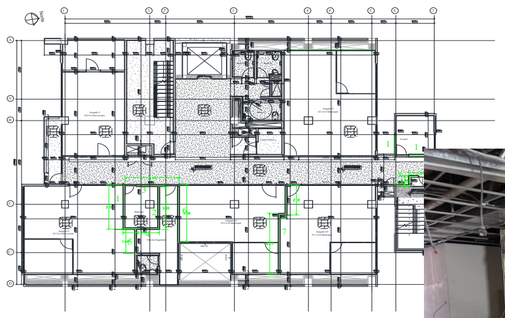



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PISO 3							
AD-303	EJES (C-D)(1-7). DEPÓSITO. (1)	3,10		2,30	7,13		1,00	7,13
	EJES (C-D)(1-7). DEPÓSITO. (2)	3,00		2,30	6,90		1,00	6,90
	EJES (C-D)(1-7). DEPÓSITO. (3)	3,41		2,30	7,84		-1,00	-7,84
	EJES (C-D)(1-7). DEPÓSITO. (4)	2,29		2,30	5,27		1,00	5,27
	EJES (C-D)(1-7). OFICIN SEGURID. (5)	1,68		2,30	3,86		1,00	3,86
	EJES (C-D)(1-7). OFICIN SEGURID. (6)	4,00		2,30	9,20		1,00	9,20
	EJES (C-D)(1-7). JUZG 13 y 3. (7)	4,27		2,30	9,82		1,00	9,82
		0,43		2,30	0,99		1,00	0,99
		2,10		2,30	4,83		1,00	4,83
	EJES (C-D)(1-7). ESCALERA. (8)	0,92		2,30	2,12		1,00	2,12
		0,75		2,30	1,73		1,00	1,73
		1,60		2,30	3,68		1,00	3,68
	EJES (C-D)(1-7). ASONAL. (9)	1,65		2,30	3,80		1,00	3,80
	EJES (C-D)(1-7). ASONAL. (10)	2,48		2,30	5,70		1,00	2,48
								-
								53,95
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**339,12**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.: **NP034**	**Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación**	M2	**FECHA:** **30 de septiembre de 2026**


HOJA 1 DE 1


OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	**TRABAJOS PRELIMINARES**

ÍTEM	**Muro en Superboad 8mm dos caras con frescasa según indicaciones planos de detalle. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación**	**UNIDAD**	M2

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

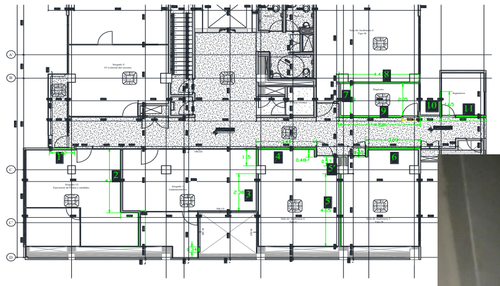

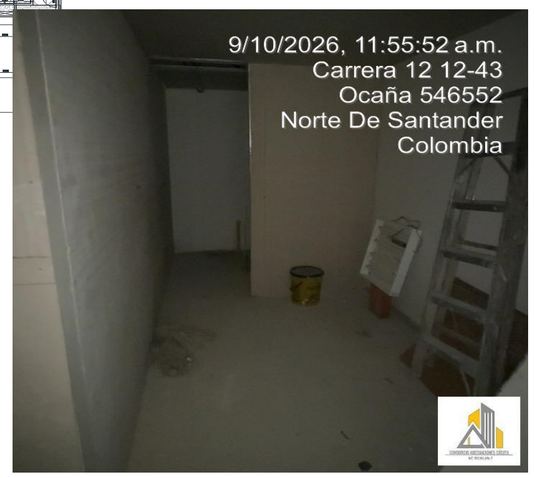

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PISO 4							
AD-403	EJES (C-D)(1-7). JUZGAD 15. (1)	1,42		2,50	3,55		1,00	3,55
	EJES (C-D)(1-7). JUZGADS 1 y 15. (2)	4,10		2,50	10,25		1,00	10,25
		1,00		2,50	2,50		-1,00	-2,50
		2,27		2,50	5,68		1,00	5,68
	EJES (C-D)(1-7). JUZGADS 1	0,34		2,50	0,85		1,00	0,85
	EJES (C-D)(1-7). JUZGAD 1 y SALA AUD 6. (3)	1,15		2,50	2,88		1,00	2,88
		2,38		2,50	5,95		1,00	5,95
	EJES (C-D)(1-7). SALA AUD 6. (4)	3,40		2,50	8,50		1,00	8,50
	EJES (C-D)(1-7). SALA AUD 6. (5)	4,65		2,50	11,63		1,00	11,63
	EJES (C-D)(1-7). SALA AUD 6 y 5. (5')	0,48		2,50	1,20		1,00	1,20
		2,73		2,50	6,83		1,00	6,83
		0,60		2,50	1,50		1,00	1,50
		0,57		2,50	1,43		1,00	1,43
	EJES (C-D)(1-7). SALA AUD 6 . (6)	3,09		2,50	7,73		1,00	7,73
	EJES (C-D)(1-7). DEPÓSITO. (7)	2,03		2,50	5,08		1,00	5,08
	EJES (C-D)(1-7). DEPÓSITO. (8)	4,47		2,50	11,18		1,00	11,18
	EJES (C-D)(1-7). DEPÓSITO. (9)	4,58		2,50	11,45		1,00	11,45
	EJES (C-D)(1-7). INGENIEROS. (10)	1,65		2,50	4,13		1,00	4,13
	EJES (C-D)(1-7). INGENIEROS. (11)	2,60		2,50	6,50		1,00	6,50
								220,00
	DESCONTAR ACUMULADO PAGADO ACTAS ANTERIORES							**-441,69**
								-117,92
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**221,21**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	REJILLA EN ACERO PARA POZO EYECTOR, 1,10X0,70. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO	UNIDAD	FECHA:
	NP076		UN	30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	CUARTO DE BOMBAS							1,00	1,00
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									1,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	**Tuberia de cobre aislada, diametro inferior a 1/2" con pared ais de 1/2" y 3/4"**	**UNIDAD**	**FECHA:**
	NP090		MI	**30 de septiembre de 2026**

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025
CAPÍTULO	**MAMPOSTERIA**	

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	2DO	JUZ 11	9,20					1,00	9,20
		JUZ 14	11,40					1,00	11,40
		JUZ 6	8,50					1,00	8,50
		JUZ 16	4,80					1,00	4,80
		JUZ 5	7,80					1,00	7,80
		JUZ 10	7,00					1,00	7,00
		JUZ 11	6,50					1,00	6,50
		PASILLO	1,70					1,00	1,70
		JUZ 14	3,30					1,00	3,30
		PASILLO	2,20					1,00	2,20
		JUZ 6	7,30					1,00	7,30
		PASILLO	3,00					1,00	3,00
		JUZ 16	5,40					1,00	5,40
		PASILLO	4,20					1,00	4,20
		JUZ 5	4,60					1,00	4,60
		PASILLO	3,00					1,00	3,00
		JUZ 10	2,60					1,00	2,60
		PASIILLO	7,30					1,00	7,30
		PASILLO	3,90					1,00	3,90
			8,30					1,00	8,30
			4,20					1,00	4,20
	3ER PISO	JUZ 8	10,00					1,00	10,00
		OFI SEG	6,40					1,00	6,40
		JUZ 13	4,60					1,00	4,60
		JUZ 3	7,40					1,00	7,40
		JUZ 2	7,70					1,00	7,70
		JUZ 9	8,90					1,00	8,90
		ASONAL ZONA NUEVA	5,30					1,00	5,30
	3ER PISO	JUZ 8	3,70					1,00	3,70
		PASILLO	4,20					1,00	4,20
		JUZ 2	8,40					1,00	8,40
									182,80
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**182,80**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			UNIDAD	FECHA:
NP090	Tuberia de cobre aislada, diametro inferior a 1/2" con pared ais de 1/2" y 3/4"		MI	30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
		4,20					1,00	4,20
	JUZ 13	4,60					1,00	4,60
		4,80					1,00	4,80
	JUZ 3	2,40					1,00	2,40
		3,50					1,00	3,50
	JUZ 9	4,20					1,00	4,20
		6,20					1,00	6,20
	PASILLO	6,20					1,00	6,20
	PASILLO	7,00					1,00	7,00
	PASILLO	4,90					1,00	4,90
		4,80					1,00	4,80
4TO PISO	JUZ 4	5,9					1,00	5,90
	JUZ 15	8,2					1,00	8,20
	ZONA NUEVA	5,3					1,00	5,30
	JUZ 4	3,4					1,00	3,40
		6,2					1,00	6,20
	JUZ 15	4,1					1,00	4,10
		4,8					1,00	4,80
	JUZ 1	3,2					1,00	3,20
	S. AUD. 6	5,2					1,00	5,20
	S. AUD. 5	5,2					1,00	5,20
	S. AUD. 4	10,5					1,00	10,50
	PASILLO	7,1					1,00	7,10
1ER PISO	GIMNASIO	9					1,00	9,00
		4,5					1,00	4,50
	ZONA NUEVA	10,7					1,00	10,70
	RECEPCION	6					1,00	6,00
		5,3					1,00	5,30
	OFI. ADMINISTRACION	5,7					1,00	5,70
	S. AUD. 2	6,9					1,00	6,90
	S. AUD. 3	7,00					1,00	7,00
								177,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**359,80**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:			**UNIDAD**	**FECHA:**
NP090	**Tuberia de cobre aislada, diametro inferior a 1/2" con pared ais de 1/2" y 3/4"**		MI	**30 de septiembre de 2026**

OBJETO:	**"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"**	**CONTRATO DE OBRA** C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	**MAMPOSTERIA**

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
	PASILLO	5,1					1,00	5,1
VERTICAL	3ER	1,50					1,00	1,5
	2DO	5,30					1,00	5,3
		1,50					1,00	1,5
2DO PISO	CUARTO TECNICO	7,70					1,00	7,7
		15,00					1,00	15
3ER PISO	CUARTO TECNICO	4,80					1,00	4,8
		15,00					1,00	15
4TO PISO	CUARTO TECNICO	2,20					1,00	2,2
		15,00					1,00	15
TODOS LOS PISOS	EMPALME UNIDAD	0,60					20,00	12,00
TODOS LOS PISOS	EMPALME UNIDAD	0,60					25,00	15,00
CUBIERTA	EMPALME CONDENSADOR							
	DESCONTAR ACUMULADO PAGADO ACTAS ANTERIORES							**-322,30**
								-222,20
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**137,60**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: NP091	Tuberia de cobre aislada, diametro entre 1/2" a 7/8" con pared ais de 1/2" y 3/4"	UNIDAD: MI	FECHA: 30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	2DO	JUZ 11	9,2					1	9,2
		JUZ 14	11,4					1	11,4
		JUZ 6	8,5					1	8,5
		JUZ 16	4,8					1	4,8
		JUZ 5	7,8					1	7,8
		JUZ 10	7					1	7
		JUZ 11	6,5					1	6,5
		PASILLO	1,7					1	1,7
		JUZ 14	3,3					1	3,3
		PASILLO	2,2					1	2,2
		JUZ 6	7,3					1	7,3
		PASILLO	3					1	3
		JUZ 16	5,4					1	5,4
		PASILLO	4,2					1	4,2
		JUZ 5	4,6					1	4,6
		PASILLO	3					1	3
		JUZ 10	2,6					1	2,6
		PASIILLO	7,3					1	7,3
		PASILLO	3,9					1	3,9
			8,3					1	8,3
			4,2					1	4,2
		PASILLO	4,4					1	4,4
	3ER PISO	JUZ 8	10,00					1,00	10,00
		OFI SEG	6,40					1,00	6,40
		JUZ 13	4,60					1,00	4,60
		JUZ 3	7,40					1,00	7,40
		JUZ 2	7,70					1,00	7,70
		JUZ 9	8,90					1,00	8,90
		ASONAL ZONA NUEVA	5,30					1,00	5,30
	3ER PISO	JUZ 8	3,70					1,00	3,70
		PASILLO	4,20					1,00	4,20
									178,80
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**178,80**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:	
NP091	Tuberia de cobre aislada, diametro entre 1/2" a 7/8" con pared ais de 1/2" y 3/4"	MI	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
	JUZ 2	8,40					1,00	8,40
		4,20					1,00	4,20
	JUZ 13	4,60					1,00	4,60
		4,80					1,00	4,80
	JUZ 3	2,40					1,00	2,40
		3,50					1,00	3,50
	JUZ 9	4,20					1,00	4,20
		6,20					1,00	6,20
	PASILLO	6,20					1,00	6,20
	PASILLO	7,00					1,00	7,00
4TO PISO	JUZ 4	5,9					1,00	5,90
	JUZ 15	8,2					1,00	8,20
	ZONA NUEVA	5,3					1,00	5,30
	JUZ 4	3,4					1,00	3,40
		6,2					1,00	6,20
	JUZ 15	4,1					1,00	4,10
		4,8					1,00	4,80
	JUZ 1	3,2					1,00	3,20
	S. AUD. 6	5,2					1,00	5,20
	S. AUD. 5	5,2					1,00	5,20
	S. AUD. 4	10,5					1,00	10,50
	PASILLO	7,1					1,00	7,1
	PASILLO	2,10					1,00	2,10
		2,90					1,00	2,90
		4,10					1,00	4,10
1ER PISO	GIMNASIO	9					1,00	9,00
		4,5					1,00	4,50
	ZONA NUEVA	10,7					1,00	10,70
	RECEPCION	6					1,00	6,00
		5,3					1,00	5,30
	OFI. ADMINISTRACION	5,7					1,00	5,70
								170,90
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**349,70**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.: NP091	Tuberia de cobre aislada, diametro entre 1/2" a 7/8" con pared ais de 1/2" y 3/4"	UNIDAD: MI	FECHA: 30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

CAPÍTULO	MAMPOSTERIA

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
		S. AUD. 2	6,9					1,00	6,90
		S. AUD. 3	7,00					1,00	7,00
		PASILLO	5,1					1,00	5,1
	1ER PISO	PASILLO	3,50					1,00	3,50
			1,10					1,00	1,10
			3,40					1,00	3,40
	VERTICAL	3ER	1,50					1,00	1,5
		2DO	5,30					1,00	5,3
			1,50					1,00	1,5
		4TO	2,10					1,00	2,10
		3ER	2,8					1,00	2,80
			1,5					1,00	1,50
		2DO	4,3					1,00	4,30
			2,8					1,00	2,80
			0,6					1,00	0,60
		1ER PISO	7,1					1,00	7,10
			2,6					1,00	2,60
			0,7					1,00	0,70
	2DO PISO	CUARTO TECNICO	7,70					1,00	7,7
			15,00					1,00	15
	3ER PISO	CUARTO TECNICO	4,80					1,00	4,8
			15,00					1,00	15
	4TO PISO	CUARTO TECNICO	2,20					1,00	2,2
			15,00					1,00	15
	TODOS LOS PISOS	EMPALME UNIDAD	0,60					20,00	12,00
	TODOS LOS PISOS	EMPALME UNIDAD	0,60					25,00	15,00
	CUBIERTA	EMPALME CONDENSADOR	15,00					1,00	15,00
		DESCONTAR ACUMULADO PAGADO ACTAS ANTERIORES							**-332,00**
									-170,50
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**179,20**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Estructura metálica forrada en fibrocemento para voladizo en cubierta sobre fachada principal		UNIDAD	FECHA:
NP104			UN	30 de septiembre de 2026


OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

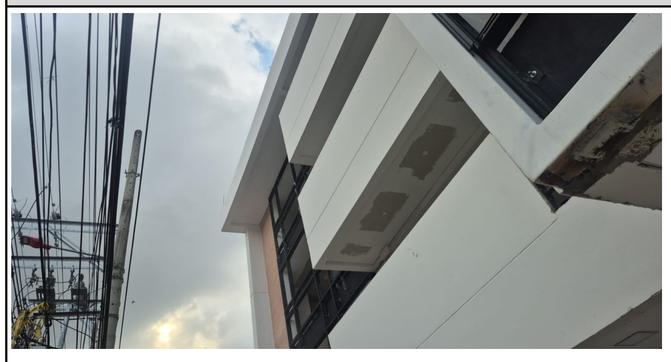

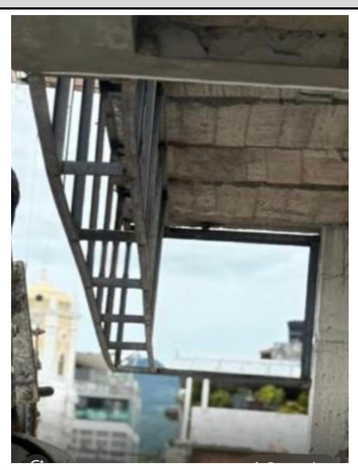

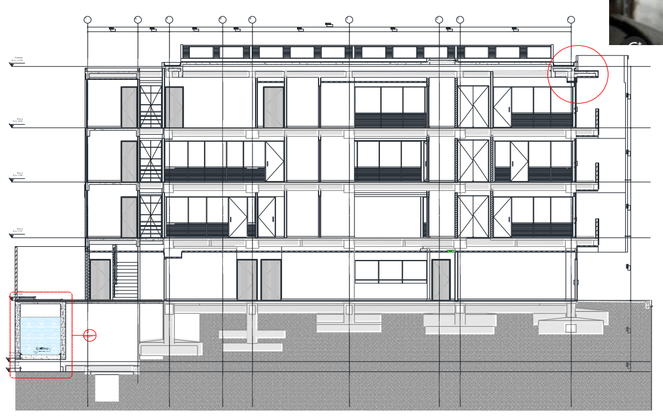



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
CUBIERTA	EJE1(A-B)	5,5					1,00	5,50
								-
								-
								5,50
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**5,50**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES


	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	Red de llenado tanque de ACPM, colgante bajo placa, en tuberia de acero galvanizado Ø2", incluye uniones, curvas y soportes de fijación	UNIDAD	FECHA:
	NP105		ML	30 de septiembre de 2026


OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

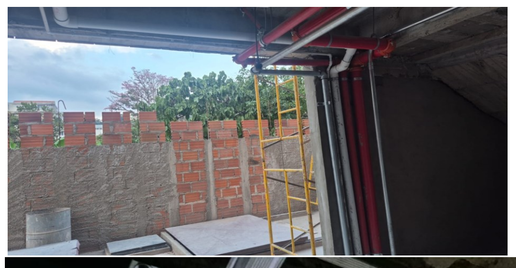



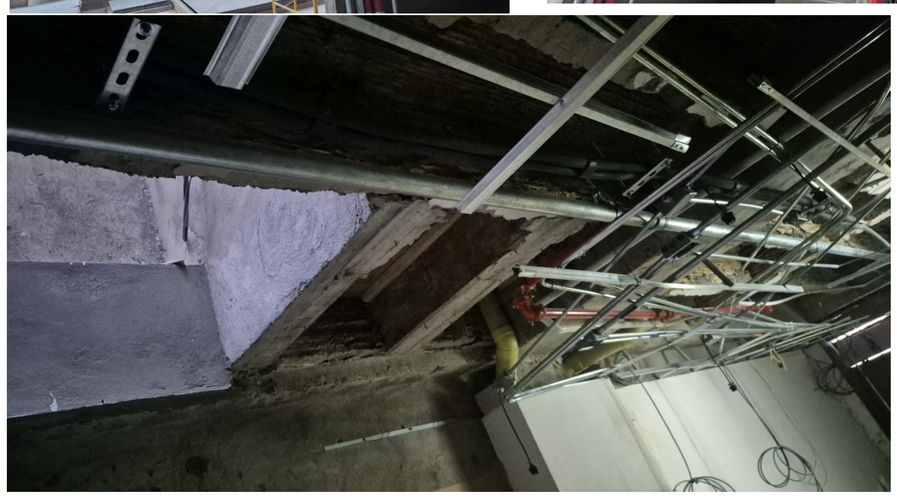

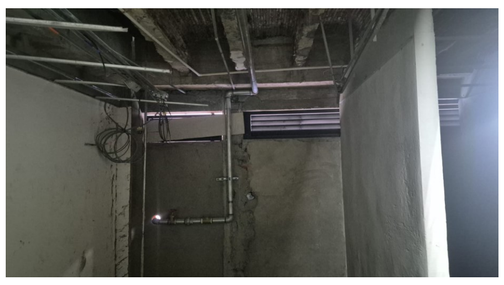

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
PRIMER PISO	VERTICAL EN FACHADA	4					1,00	4,00
	HORIZONTAL EN TECHO EDIFICIO ANTIGUO	21,74					1,00	21,74
	HORIZONTAL Y VERTICAL EDIFICIO NUEVO	6					1,00	6,00
	VERTICAL CUARTO DE BOMBAS	3					1,00	3,00
								-
								-
								34,74
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**34,74**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:		UNIDAD	FECHA:
	NP106	Desfogue motor diesel en acero galvanizado ø3", incluye curvas, uniones y soportes de fijación	ML	30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

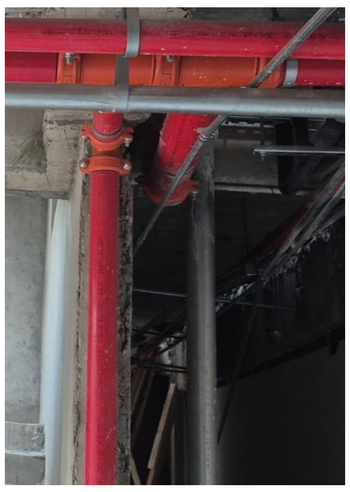



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Vol total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto				
MOTOR BOMBA RCI	EN CUARTO DE BOMBAS	6					1,00	6,00
	VERTICAL DE 1er PISO A CUBIERTA	11,8					1,00	11,80
		0,6					1,00	0,60
MOTOR PLANTA ELÉCTRICA	EN CUARTO PLANTA ELÉCTRICA	3,1						
	VERTICAL DE 2do PISO A CUBIERTA	9,8					1,00	9,80
		0,6					1,00	0,60
		0,2					1,00	0,20
								-
								-
								-
								29,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**29,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ITEM No.: NP107	Baldosa en concreto de 30x30, cuadrícula pulida para piso exterior. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST	UNIDAD M2	FECHA: 30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

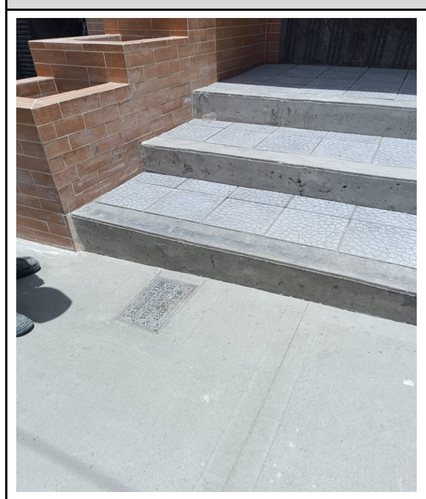



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
PISO LOSETA	GRADA 1	9,18	0,48					4,41
	GRADA 2	9,18	0,48					4,41
	GRADA 3	10,7	1,18					12,63
	GRADA BANDERAS 1	2,55	0,40					1,02
	GRADA BANDERAS 2	2,74	0,60					1,64
								24,10
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**24,10**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
	ÍTEM No.:	Suministro, transporte e instalación de CABLEADO en 3No4+1No8T AWG, THHN-THHW cobre,, conexionado, accesorios y pruebas, desde tablero de distribución CD-HVAC hasta unidad condensadora de refrigeración	UNIDAD	FECHA:
	NP110		ML	30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
SUBESTACION	1 ER PISO	3,00						3,00
								-
								-
								3,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**3,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Switch selector trifasico tipo mazorca para transferencia manual de 124A para UPS de 30 KVA		UNIDAD	FECHA:
NP111			ML	30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
									
	CUARTO TECNICO								1,00
									-
									-
									1,00
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	1,00

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Traslado planta eléctrica de cuarto antiguo a cuarto nuevo		UNIDAD	FECHA:
NP114			UN	30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025


DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
									
		Traslado planta eléctrica						1,00	1,00
									-
									-
									
									1,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**1,00**

ELABORÓ:



CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:



JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander		
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER		
ÍTEM No.:	Tapa en lamina alfajor reforzada para cuarto electrico	UNIDAD	FECHA:
NP115		ML	30 de septiembre de 2026

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	alto	Área total (m2)	Vol total (m3)		
		Tapa en lámina alfajor	7,75					1,00	7,75
									7,75
								CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	7,75



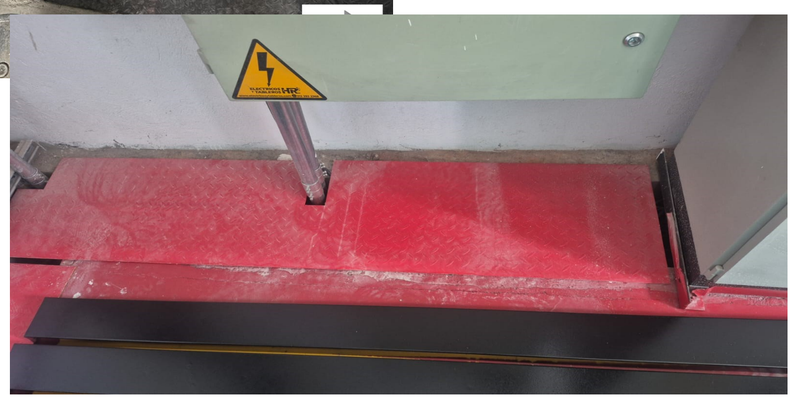

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA


Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Secador de manos. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
18,10		UN	30 de septiembre de 2026	


OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

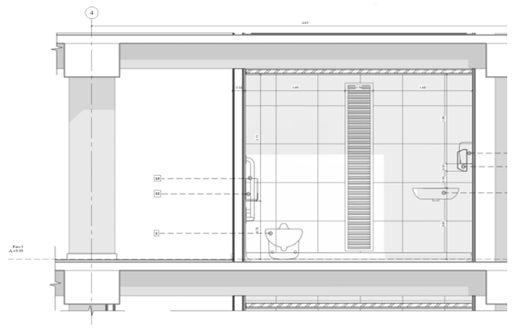DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO	REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
			Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
 	1ER PISO							1,00	1,00
	2DO PISO							1,00	1,00
	3ER PISO							1,00	1,00
	4TO PISO							1,00	1,00
									-
									-
									-

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Dispensador De Jabon. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
18,12		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

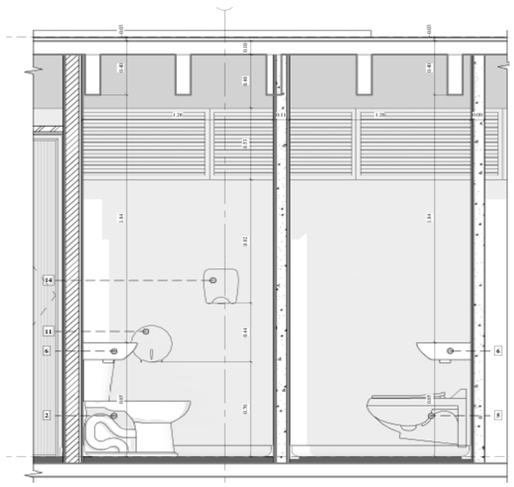



REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones					No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto	Área total (m2)	Volumen total (m3)		
AR-01	**1er PISO**							
	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑ CUSTODIOS						1,00	1,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑ GIMNASIO						2,00	2,00
	EJES (C-D)(4-5). BAÑ DIRECCION						1,00	1,00
	2do PISO							
AR-02	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	3er PISO							
AR-03	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJE 2(C-D). SEGURIDAD						1,00	1,00
	4to PISO							
AR-04	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								17,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**17,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:


JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ


OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Dispensador de papel higienico. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
18,14		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO

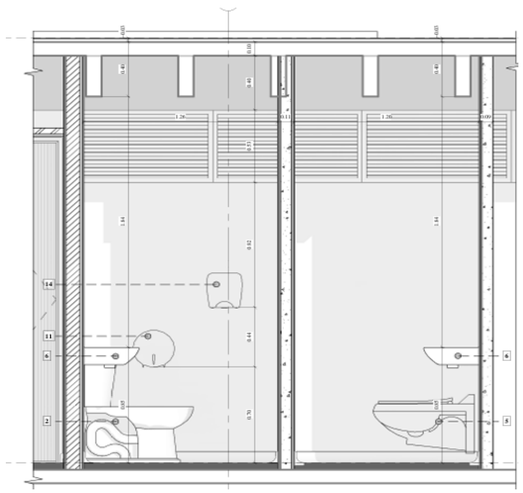

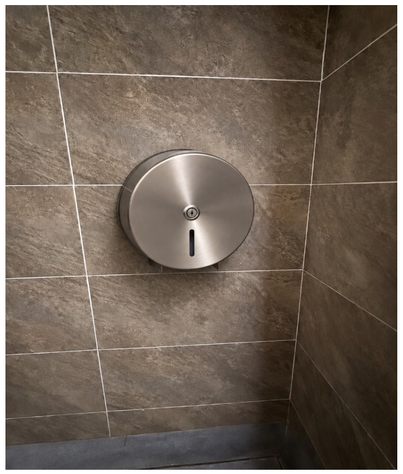

REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
AR-01	**1er PISO**							
	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑ CUSTODIOS						1,00	1,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑ GIMNASIO						2,00	2,00
	EJES (C-D)(4-5). BAÑ GIMNASIO						1,00	1,00
	2do PISO							
AR-02	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	3er PISO							
AR-03	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJE 2(C-D). SEGURIDAD						1,00	1,00
	4to PISO							
AR-04	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								17,00
							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	**17,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES

	Consejo Superior de la Judicatura Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta – Norte de Santander			
	CUCUTA - NORTE DE SANTANDER			
ÍTEM No.:	Dispensador de toallas de papel. Incluye suministro e instalación, accesorios y todos los materiales, insumos y elementos de SST necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UNIDAD	FECHA:	
18,15		UN	30 de septiembre de 2026	

OBJETO:	"REALIZAR LAS OBRAS DE REFORZAMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER"	CONTRATO DE OBRA C - 019 DE 2025

DIAGRAMA (DETALLE DE ACTIVIDAD) Y/O REGISTRO FOTOGRÁFICO





REF. DE UBICACIÓN ESPACIAL EN EL PLANO	DESCRIPCIÓN	Dimensiones			Área total (m2)	Volumen total (m3)	No Elem.	Medida Total
		Longitud	Ancho	Alto				
AR-01	**1er PISO**							
	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑ CUSTODIOS						1,00	1,00
	EJES (C-D)(1-2). BAÑ GIMNASIO						2,00	2,00
	EJES (C-D)(4-5). BAÑ DIRECTOR						1,00	1,00
	2do PISO							
AR-02	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	3er PISO							
AR-03	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
	EJE 2(C-D). SEGURIDAD						1,00	1,00
	4to PISO							
AR-04	EJES (A-B)(3-3'). BATERIA BAÑOS						3,00	3,00
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								-
								17,00
						CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		**17,00**

ELABORÓ:

CONSORCIO ADECUACIONES CUCUTA

Vo.Bo.:

JULIO ANDRES CASTRO GONZALEZ

OBSERVACIONES
