INFORME MENSUAL No. 4

PERIODO:

1 DE AGOSTO DE 2026 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

CONTRATO DG-087-2026

CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026
R/L JHONATAN RICARDO ROJAS SANDOVAL

Agosto 2026

Carrera 22 # 11-86 San José del Guaviare. Celular: 312 280 7382
Correo electrónico: consorciosolarnuqui2026@gmail.com

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4
2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO 4
2.1. Generalidades 4
2.2. Localización 4
3. OBJETIVOS 4
3.1. Objetivo general 4
3.2. Objetivos específicos. 5
4. INFORMACIÓN LEGAL Y JURIDICA DEL CONTRATO. 6
4.1. Garantías aprobadas para el contrato de obra. 7
4.2. Relación de personal contratado 9
planillas de seguridad social 10
4.3. relación de informes presentados 11
4.4. Correspondencia enviada 11
4.5. Correspondencia recibida 12
4.6. Comités de obra 12
5. LABORES DE VIGILANCIA FINANCIERA. 13
5.1. Balance Financiero Del Contrato DG-087-2026 13
6. LABORES TÉCNICAS. 14
6.1. Cronograma De Obra 14
6.2. Curva S del proyecto. 17
6.4. Descripción de actividades ejecutadas y registro fotográfico 26
6.5. Avance físico del periodo y avance acumulado. 27
7. OTRAS ACTIVIDADES PARA INFORMAR EN EL PERIODO. 31
7.1 Solicitud suspensión del contrato de obra 31
Respuesta a la solicitud de precisión del sustento jurídico 32
7.2 Información de estado de obra posterior a catástrofe del día 10 de agosto de 2026. 33
7.3 Solicitud de autorización para para la extracción y utilización de material de arena para el relleno y adecuación del área del parque solar. 34
8. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 35
9. INFORME AMBIENTAL 36
10. INFORME SOCIAL 36
11. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES. 37

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Ficha técnica contrato de obra. 6
Tabla 2. Ficha técnica contrato de interventoría. 7
Tabla 3. Pólizas contrato de obra con ocasión a la suscripción del contrato. 7
Tabla 4. Pólizas contrato de obra con ocasión Acta de inicio. 8
Tabla 5. Equipo de trabajo CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026 propuesto en la oferta 9
Tabla 6. Equipo de trabajo CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026 *activo en obra mes de agosto de 2026.* 10
Tabla 7. Planilla de seguridad social CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026 activo en obra mes de agosto de 2026. 10
Tabla 8. Relación de informes presentados 11
Tabla 9. Correspondencia enviada agosto 2026 11
Tabla 10. Correspondencia recibida agosto 2026 12
Tabla 11. Comités de obra 12
Tabla 12. Balance Financiero del Contrato DG-087-2026 13
Tabla 13. Seguimiento a pagos realizados a obra 14
Tabla 14. Programación Obra (Reprogramación de acuerdo a Replanteo) 14
Tabla 15. Flujo de caja (Nivel 1) 16
Tabla 16. Proyección y ejecución de curva S - agosto 2026 (de acuerdo con Reprogramación Replanteo) 17
Tabla 17. Presupuesto del proyecto - agosto 2026 (según Replanteo) 20
Tabla 18. Actividades realizadas agosto 2026 23
Tabla 19.Avance del periodo 28

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Programado vs ejecutado (de acuerdo a Reprogramación replanteo) 18
Ilustración 2. Curva S del periodo informado agosto 2026 (de acuerdo a Reprogramación Replanteo) 18

ANEXO 1. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2026
ANEXO 2. ACTAS DE COMITÉ AGOSTO 2026
ANEXO 3. CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE FONDOS
ANEXO 4. ACTA DE AVANCE DE OBRA NO. 04
ANEXO 5. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO No. 04
ANEXO 6. INFORME AMBIENTAL No. 04
ANEXO 7. INFORME SOCIAL No. 04

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento corresponde al informe mensual de Obra No. 4 de las actividades desarrolladas en el periodo del 1 de agosto al 31 de agosto del 2026 conforme al seguimiento realizado al contrato de obra DG-087-2026 para la ejecución del proyecto: “CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.”.

El informe presenta los resultados y seguimiento realizado a las labores administrativas, legales, financieras, técnicas, seguridad y salud en el trabajo y calidad de las obras.

Luego de la suscripción del acta de inicio, y de conformidad con el esquema de trabajo propuesto por el contratista de obra, se verificó las condiciones de afiliación del equipo de trabajo, la realización de capacitación previo al inicio de labores y la disponibilidad de materiales en la etapa constructiva.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

2.1. Generalidades

El Contrato de Obra DG-087-2026, fue firmado el 23 de abril de 2026, tiene acta de inicio del 15 de mayo de 2026, con un valor contratado de SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($73.340.601.831) M/TE, INCLUIDO IVA y un plazo inicial de ejecución de Siete (07) meses, con fecha de terminación 30 de noviembre de 2026.

2.2. Localización

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Nuquí, en su centro poblado y los corregimientos de Jurubirá, Panguí y Tribugá.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo general

Construcción de una Planta Solar Fotovoltaica en el Municipio de Nuquí, Chocó, para atender la Demanda de Energía Eléctrica de la Población.

El municipio de Nuquí actualmente cuenta con el servicio de energía eléctrica mediante la generación de plantas electrógenas de combustible diésel, con dificultades de sostenibilidad. Este proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema solar fotovoltaico con almacenamiento, que aprovechará la radiación solar de la región para generar electricidad de manera limpia y renovable.

La energía fotovoltaica se basa en la conversión de la luz solar en electricidad mediante el uso de paneles solares, que contienen celdas fotovoltaicas. Este sistema no solo reducirá la dependencia del diésel, que es la fuente principal de energía en el municipio, sino que también contribuirá a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la mejora de la calidad del aire.

La propuesta incluye la integración de infraestructura para la generación y almacenamiento con fuentes de energía renovable a la red eléctrica existente, permitiendo una transición eficiente hacia una matriz energética más sostenible. Al implementar esta solución, se busca dejar la generación diésel existente como suplencia del servicio de energía eléctrica de la región y garantizar un suministro de energía sin interrupciones, confiable, económico y amigable con el medio ambiente.

3.2. Objetivos específicos.

- Mostrar en el presente informe, el avance de las actividades realizadas por el contratista de obra CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026 en el periodo del mes de agosto de 2026.
- Contar con el personal profesional técnico, administrativo y mano de obra calificada para el desarrollo y cumplimiento de las actividades establecidas en el contrato.
- Ejecutar las actividades en las cantidades establecidas en el contrato de obra DG-087-2026 cumpliendo con las especificaciones técnicas del presupuesto (APU´s), en el documento técnico, memorias de cálculo y el reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE.
- Cumplir con las normas y reglamentación de seguridad industrial y salud en el trabajo.

4. INFORMACIÓN LEGAL Y JURIDICA DEL CONTRATO.

Tabla 1. Ficha técnica contrato de obra.

NÚMERO DEL CONTRATO:	DG-087-2026
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.
CONTRATANTE:	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
	NIT: 818.001.629-4
	R.L. ANDRÉS FELIPE HORTA ROJAS
	C.C. No. 1.140.877.541 de Barranquilla
CONTRATISTA:	CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026
	NIT: 902.058.031-0
	JHONATAN RICARDO ROJAS SANDOVAL
	C.C. No. 74.382.253 de Duitama,Boyacá
INTERVENTORIA:	CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
	NIT: 902.055.388-0
	R.L. JAMES MARTINEZ GALLEGO
	C.C. No. 6.400.932
SUPERVISIÓN:	ING. RICARDO RIBERO
	SUPERVISOR EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
	C.C. No. 91.072.064
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS ($73.340.601.831) M/TE, INCLUIDO IVA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	23 DE ABRIL 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES.
FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2026.
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2026.

Tabla 2. Ficha técnica contrato de interventoría.

NÚMERO DEL CONTRATO:	DG-086-2026
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, AMBIENTAL, PREDIAL, SOCIAL Y CONTABLE PARA EL CONTRATO DE OBRA PARA LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS
CONTRATANTE:	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
	NIT: 818.001.629-4
	R.L. ANDRÉS FELIPE HORTA ROJAS
	C.C. No. 1.140.877.541 de Barranquilla
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
	NIT: 902.055.388-0
	R.L. JAMES MARTINEZ GALLEGO
	C.C. No. 6.400.932
SUPERVISIÓN:	ING. RICARDO RIBERO
	SUPERVISOR EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACÍFICO S.A. E.S.P.
	C.C. No. 91.072.064
VALOR DEL CONTRATO:	$ 3.116.610.000 M/TE, Incluido IVA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	15 DE ABRIL 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	24 DE ABRIL 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2026

4.1. Garantías aprobadas para el contrato de obra.

El contrato de obra contempla dentro de sus obligaciones la suscripción de garantías, las cuales debe estar actualizadas, vigentes y aprobadas por la entidad contratante.

Las pólizas del contrato de obra se adquirieron con las aseguradoras SEGUROS DEL ESTADO S.A. y COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Tabla 3. Pólizas contrato de obra con ocasión a la suscripción del contrato.

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101070032		
Anexo N°	0		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición:	29 de abril de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento del contrato	23/04/2026	31/03/2027	$ 22.002.180.579,30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	23/04/2026	31/03/2028	$ 29.336.240.772,40

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/04/2026	31/03/2030	$ 3.667.030.096,55
Calidad del servicio	23/04/2026	31/03/2030	$ 7.334.060.193,10
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 2 años, 7 meses y 9 días		$ 22.002.180.579,30

Póliza de Responsabilidad Civil:	30-40-101026610		
Anexo No.	0		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición:	29 de abril de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Predios, labores y operaciones	23/04/2026	30/11/2028	$ 3.667.030.091,55
Contratistas y subcontratistas	23/04/2026	30/11/2028	$ 3.667.030.091,55
Vehículos propios y no propios	23/04/2026	30/11/2028	$ 3.667.030.091,55

Póliza todo riesgo construcción y montaje:	CV-100000130		
Anexo No.	0		
Expedida por:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición:	11 de mayo de 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Daños materiales	23/04/2026	01/02/2027	$ 73.340.601.831,00
Terremoto, temblor, erupción volcánica	23/04/2026	01/02/2027	$ 73.340.601.831,00
Ciclón, huracán, inundación, tempestad, enfangamiento y desl	23/04/2026	01/02/2027	$ 73.340.601.831,00
Mantenimiento	23/04/2026	01/02/2027	$ 73.340.601.831,00
Responsabilidad civil extracontractual por daños materiales	23/04/2026	01/02/2027	$ 1.000.000,00
Responsabilidad civil extracontractual por daños personales	23/04/2026	01/02/2027	$ 1.000.000,00
Remoción de escombros	23/04/2026	01/02/2027	$ 2.000.000,00
AMIT - HMACC	23/04/2026	01/02/2027	$ 1.000.000,00

Tabla 4. Pólizas contrato de obra con ocasión Acta de inicio.

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101070032		
Anexo N°	1		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición:	24 de junio 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Cumplimiento del contrato	23/04/2026	31/03/2027	$ 22.002.180.579,30
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	23/04/2026	31/03/2028	$ 29.336.240.772,40
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	23/04/2026	31/03/2030	$ 3.667.030.096,55
Calidad del servicio	23/04/2026	31/03/2030	$ 7.334.060.193,10
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	Si ampara 2 años, 7 meses y 9 días		$ 22.002.180.579,30

Póliza de Responsabilidad Civil:	30-40-101026610		
Anexo No.	1		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de expedición:	24 de junio 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Predios, labores y operaciones	23/04/2026	30/11/2028	$ 3.667.030.091,55
Contratistas y subcontratistas	23/04/2026	30/11/2028	$ 3.667.030.091,55
Vehículos propios y no propios	23/04/2026	30/11/2028	$ 3.667.030.091,55

Póliza todo riesgo construcción y montaje:	CV-100000130		
Anexo No.	2		
Expedida por:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de expedición:	03 de julio del 2026		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	Fecha Inicial	**Fecha Final**	
Daños materiales	15/05/2026	23/02/2027	$ 73.340.601.831,00
Terremoto, temblor, erupción volcánica	15/05/2026	23/02/2027	$ 73.340.601.831,00
Ciclón, huracán, inundación, tempestad, enfangamiento y desl	15/05/2026	23/02/2027	$ 73.340.601.831,00
Mantenimiento	15/05/2026	23/02/2027	$ 73.340.601.831,00
Responsabilidad civil extracontractual por daños materiales	15/05/2026	23/02/2027	$ 1.000.000,00
Responsabilidad civil extracontractual por daños personales	15/05/2026	23/02/2027	$ 1.000.000,00
Remoción de escombros	15/05/2026	23/02/2027	$ 2.000.000,00
AMIT - HMACC	15/05/2026	23/02/2027	$ 1.000.000,00

4.2. Relación de personal contratado

Para la ejecución de los trabajos, en la oferta presentada para el contrato de obra se definió un equipo de trabajo mínimo. El CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026 oferto un equipo de trabajo básico conformado por 12 personas con las siguientes condiciones:

Tabla 5. Equipo de trabajo CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026 propuesto en la oferta

PROFESIONALES PRESENTADOS EN OFERTA INICIAL EN CONTRATO OBRA 233 DE 2024		
ITEM	**CARGO**	**NOMBRES**
1	Director de Proyecto	Evaristo Mantilla Mora
2	Ingeniero Residente	Jhonatan Ricardo Rojas Sandoval
3	Supervisores en terreno	Esneyder Desiderio Lozano Ariza
4	Supervisores en terreno	Leder Ferley Gitan Muñoz
5	Supervisores en terreno	Robinson Fernando Arcila Arcila
6	Coordinador HSEQ	Carlos Alberto Rodriguez Ayala
7	Coordinador HSEQ	Maritza Johana Bello Torres
8	Coordinador HSEQ	Juan Carlos Garcia Carrillo
9	Profesional social	Betsy Yolanda Valencia Mosquera
10	Profesional social	Madelen Asprilla Pretelt
11	Ingeniero ambiental	Marlen Yadira Cetre Perea
12	Ingeniero civil	Jakson Renteria Lezcano

Tabla 6. Equipo de trabajo CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026 *activo en obra mes de agosto de 2026.*

No.	Nombres Y Apellidos	Cargo	EPS	AFP	Riesgo	ARL
1	Evaristo Mantilla Mora	Director de Proyecto	Sanitas S.A	Porvenir	5	SURA
2	Jhonatan Ricardo Rojas Sandoval	Ingeniero Residente	Nueva EPS	Colfondos	5	SURA
3	Esneyder Desdiderio Lozano Ariza	Supervisor en terreno	Nueva EPS	Colfondos	5	SURA
4	Leder Ferley Gaitan Muñoz	Supervisor en terreno	Nueva EPS	Porvenir	5	SURA
5	Robinson Fernando Arcila Arcila	Supervisor en terreno	Nueva EPS	Porvenir	5	SURA
6	Carlos Alberto Rodriguez Ayala	Coordinador HSEQ	Sanitas S.A	Colfondos	4	SURA
7	Maritza Johana Bello Torres	Coordinador HSEQ	Sanitas S.A	Porvenir	5	SURA
8	Juan Carlos Garcia Carrillo	Coordinador HSEQ	Nueva EPS	Porvenir	5	SURA
9	Betsy Yolanda Valencia Mosquera	Profesional social	Nueva EPS	Colpensiones	4	SURA
10	Madelen Asprilla Pretelt	Profesional social	Sanitas S.A	Colpensiones	4	SURA
11	Marlen Yadira Cetre Perea	Ingeniero ambiental	Nueva EPS	Colpensiones	5	SURA
12	Jakson Renteria Lezcano	Ingeniero civil	EPS Suramericana S.A	Colpensiones	5	SURA
Personal Adicional Planilla Seguridad Social julio 2026						
13	Carlos Andres Gutierrez Vargas	Auxiliar Administrativo	Nueva EPS	Protección	3	SURA
14	Karol Lizeth Quitian Rivera	Contadora	Proteger EPS	Protección	3	SURA
15	José Ruperto Murillo Mosquera	Profesional Social	Comfamiliar Chocó	Colpensiones	4	SURA
16	Huris Marcela Palacios Murillo	Abogada	EPS Sura	Porvenir S.A.	4	SURA
17	Jorge Alexander Torres Zarabanda	Supervisor de terreno	Nueva EPS	Colpensiones	5	SURA
18	Fausto Ever Valencia Hernández	Topógrafo	Nueva EPS	Colpensiones	5	SURA

planillas de seguridad social

Tabla 7. Planilla de seguridad social CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026 activo en obra mes de agosto de 2026.

CONSORCIO MODERNO 2024					
PERIODO	**No. PLANILLA**	**SALUD**	**PENSIÓN**	**ARL**	**CCF**
MAYO-2026	9506869398	$ 1.380.100,00	$ 1.702.000,00	$ 544.000,00	$ 442.300
JUNIO-2026	9507394696	$ 3.157.200,00	$ 12.147.000,00	$ 3.626.900,00	$ 3.157.200
JULIO-2026	9508746199	$ 2.275.600,00	$ 8.621.400,00	$ 2.715.600,00	$ 2.275.600,00
AGOSTO-2026	9510196635	$ 1.935.800.00	$7.573.500.00.	$ 2.147.000.00	$ 1.935.800.00

4.3. relación de informes presentados

Tabla 8. Relación de informes presentados

ITEM	INFORMES	FECHE DE ENTREGA
1	INFORME DE OBRA No. 1 – 15 MAYO 2026 A 31 MAYO 2026	5 de junio de 2026
2	IINFORME DE OBRA No. 2 – 1 JUNIO 2026 A 30 JUNIO 2026	6 de julio de 2026
3	IINFORME DE OBRA No. 3 – 1 JULIO 2026 A 31 JULIO 2026	5 de agosto 2026
4	IINFORME DE OBRA No. 4 – 1 AGOSTO 2026 A 31 AGOSTO 2026	5 de septiembre 2026

4.4. Correspondencia enviada

Tabla 9. Correspondencia enviada agosto 2026

CORRESPONDENCIA DE SALIDA				
ASUNTO	**FECHA**	**CONSECUTIVO**	**REMITENTE**	**DESTINATARIO**
ANTICIPO 40%	03/08/2026	OFIC-CSN-0034-2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026	CONSORCION INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
SOLICITUD DE SUSPENSION CONTRATO DE OBRA	05/08/2026	OFIC-CSN-0035-2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026	CONSORCION INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
INFORME MENSUAL N.3 -01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026	05/08/2026	OFIC-CSN-0036-2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026	CONSORCION INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
SOLICITUD DE PROPUESTA DE FECHA PARA EL DESARROLLO DE LA ETAPA DE PRECONSULTA DEL PROYECTO DG-087-2026	06/08/2026	OFIC-CSN-0037-2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026	NELFER VALOYES ANGULO-Representante legal consejo comunitario LOS RISCALES Nuqui-Choco
ACLARACION A SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA - RESPUESTA A OFICIO NUQ-030-26	06/08/2026	OFIC-CSN-0038-2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026	CONSORCION INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
SOLICITUD DE REUNION PARA PROCESO DE CONSULTA PREVIA EN TERRITORIO	11/08/2026	OFIC-CSN-0039-2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026	MINISTERIO DEL INTERIOR
RELLENO Y ADECUACION DEL PARQUE SOLAR	19/08/2026	OFIC-CSN-0040-2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026	ALCALDIA DE NUQUI
INFORMACION DE ESTADO DE OBRA POSTERIOR A CATASTROFE DEL DIA 10 DE AGOSTO 2026.	20/08/2026	OFIC-CSN-0041-2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026	SEGUROS DEL ESTADO – SEGURO MUNDIAL
REITERACION A SOLICITUD DE SUSPENSION	28/08/2026	OFIC-CSN-0042-2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026	CONSORCION INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026

4.5. Correspondencia recibida

Tabla 10. Correspondencia recibida agosto 2026

CORRESPONDENCIA RECIBIDA				
ASUNTO	**FECHA**	**CONSECUTIVO**	**REMITENTE**	**DESTINATARIO**
RESPUESTA DE OFOCIO CSN-0035-2026-SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DG-087-26	06/08/2026	NUQ – 030 – 26	CONSORCIO INT NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026
AVAL SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA	10/08/2026	NUQ – 031 – 26	CONSORCIO INT NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026
Respuesta al Oficio No. 037 del 06 de agosto de 2026 – "Solicitud de propuesta de fecha el desarrollo de la etapa de preconsulta del proyecto DG-087-2026 para el proceso de consulta previa.	10/08/2026	OFICIO 004-2026	ASOCIACION DE CONSEJO COMUNITARIO GENERAL LOS RISCALES	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026
REMISIÓN DE INFORME MENSUAL DE OBRA DEL MES DE JULIO DE 2026.	24/08/2026	NUQ-034-26	CONSORCIO INT NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026
REMISIÓN Y CONCEPTO SOBRE REITERACIÓN DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA – OFICIO OFIC-CSN-0042-2026	28/08/2026	NUQ-035-26	CONSORCIO INT NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026	CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026

4.6. Comités de obra

Tabla 11. Comités de obra

ÍTEM	ASUNTO	No. Acta	FECHA
1	Analizar la viabilidad técnica del cruce de la línea de media tensión sobre el Golfo de Tribugá, identificando las restricciones del diseño inicial y evaluando las alternativas de solución disponibles.	01	06-05-2026
2	Socialización de la documentación correspondiente al replanteo entregado por CONSORCIO SOLAR NUQUÍ para la ejecución del proyecto.	02	22-06-2026
3	-Realizar seguimiento quincenal al cronograma de obra reprogramado, verificando el avance frente a cada hito contractual. -Establecer y conciliar compromisos concretos con fechas puntuales para la subsanación de pendientes técnicos, administrativos, ambientales, etc. -Revisar el estado del trámite de anticipo, la gestión ambiental y el inicio de actividades civiles y de suministro de materiales.	03	27/07/2026
4	Socialización de la documentación correspondiente al replanteo entregado por CONSORCIO SOLAR NUQUÍ para la ejecución del proyecto.	04	09/07/2026

5	Socialización de la documentación correspondiente al replanteo entregado por CONSORCIO SOLAR NUQUÍ para la ejecución del proyecto.	05	15/07/2026
6	- Realizar seguimiento a los compromisos establecidos en la reunión anterior relacionados con el contrato de obra DG-087-2026. - Revisar el estado del trámite de la solicitud de suspensión de los contratos de obra e interventoría ante el Ministerio de Minas y Energía. - Conocer el avance del proceso de consulta previa con el Consejo Comunitario Los Riscales y su incidencia sobre el cronograma del proyecto.	06	10/08/2026

5. LABORES DE VIGILANCIA FINANCIERA.

5.1. Balance Financiero Del Contrato DG-087-2026

Para el mes de agosto de 2026, el avance financiero del Contrato de obra DG-087-2026 se presenta de la siguiente manera:

Tabla 12. Balance Financiero del Contrato DG-087-2026

BALANCE GENERAL		
VALOR DEL CONTRATO		**$ 73.340.601.831,00**
VALOR ANTICIPO 40%	40,00%	$ 29.336.240.732,40
VALOR ACTA PARCIAL No 1	0,00%	$ 0,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No 1	40,00%	$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL No 2	0,00%	$ 0,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No 2	40,00%	$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL No 3	0,00%	$ 0,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No 3	40,00%	$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL No 4	0,00%	$ 0,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No 4	40,00%	$ 0,00
VALOR ACTA PARCIAL No 5	0,00%	$ 0,00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO ACTA PARCIAL No 5	40,00%	$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No 1		**$ 0,00**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No 2		**$ 0,00**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No 3		**$ 0,00**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No 4		**$ 0,00**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL No 5		**$ 0,00**
VALOR POR AMORTIZAR DEL CONTRATO	40,00%	$ 29.336.240.732,40
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO		**$ 73.340.601.831,00**

Tabla 13. Seguimiento a pagos realizados a obra

Pago	No. Comprobante Egreso y/o orden de pago	Valor total	Deducciones	Valor pagado
Anticipo				
Pago parcial No.01				
Pago parcial No.02				
Pago parcial No.03				
Pago parcial No.04				
Pago parcial No.05				

6. LABORES TÉCNICAS.

6.1. Cronograma De Obra

Para el desarrollo del proyecto, se presenta el siguiente cronograma de obra:

Tabla 14. Programación Obra (Reprogramación de acuerdo a Replanteo)

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
0	**CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.**	**170 días**	**vie 15/05/26**	**lun 30/11/26**
1	Inicio	0 días	vie 15/05/26	vie 15/05/26
2	**PERMISOS AMBIENTABLES Y MEDIDAS DE COMPENSACIÓN (Ley 633 de 200 art. 96)**	**80 días**	**vie 15/05/26**	**lun 17/08/26**
2.1	Permisos ambientales y medidas de compensación	80 días	vie 15/05/26	lun 17/08/26
3	**REVISIÓN DE DISEÑOS**	**50 días**	**vie 15/05/26**	**lun 13/07/26**
3.1	Aprobación de diseños de detalle de ingenieria	50 días	vie 15/05/26	lun 13/07/26
4	**GESTIÓN SOCIAL**	**162 días**	**lun 25/05/26**	**lun 30/11/26**
4.1	Gestión y aprobación de servidumbres y/o permiso de paso	162 días	lun 25/05/26	lun 30/11/26
5	**REPLANTEO DE OBRA**	**44 días**	**vie 15/05/26**	**lun 6/07/26**
5.1	Localizacion y Replanteo	44 días	vie 15/05/26	lun 6/07/26
6	**ETAPA DE ADQUISICIÓN, LEGALIZACIÓN Y TRANSPORTE**	**96 días**	**lun 6/07/26**	**lun 26/10/26**
6.1	Ordenes de compra de equipos nacionales e importados	27 días	lun 6/07/26	jue 6/08/26
6.2	Adquisción, transporte y nacionalización de equipos (importación)	96 días	lun 6/07/26	lun 26/10/26
7	**SISTEMA FOTOVOLTÁICO**	**25 días**	**sáb 31/10/26**	**lun 30/11/26**
7.1	Panel solar bifacial de alta eficiencia 710Wp, 0.4% de degradación y eficiencia de 22.86%.	25 días	sáb 31/10/26	lun 30/11/26
7.2	Estructuras de fijación paneles en Acero galvanizado. Fabricados con galvanizado por inmersión en caliente conforme a ASTM A123. Mesas de 2x20 paneles.	25 días	sáb 31/10/26	lun 30/11/26
7.3	Inversor de 150kW - 1100VDC/480VAC, eficiencia máxima de 98,8%, IP66, 7MPP con 3 entradas por cada una.	20 días	sáb 31/10/26	mar 24/11/26
7.4	Tablero de distribucion de potencia T_1/ 6000 Amperios, 440VAC/42 kA	20 días	sáb 31/10/26	mar 24/11/26
7.5	Tablero de distribucion de potencia T_2/ 6000 Amperios, 440VAC/42 kA	20 días	sáb 31/10/26	mar 24/11/26
7.6	Tablero de distribucion de potencia T_3/ 4000 Amperios, 440VAC/42 kA	20 días	sáb 31/10/26	mar 24/11/26
7.7	Celda de interrupcion DM1A_17 kAmp./SF6 con celda de remonte	20 días	jue 5/11/26	sáb 28/11/26
7.8	Cluster de baterías de litio, sistema de almacenamiento de 241kWh con inversor bidireccional de 108kW, grado de protección IP65.	20 días	sáb 31/10/26	mar 24/11/26
7.9	Transformador 2000 kVA trifásico 13.2/0.46 kV	20 días	sáb 31/10/26	mar 24/11/26
8	**SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO**	**30 días**	**lun 26/10/26**	**lun 30/11/26**
8.1	Sincronismo GENERADORES	30 días	lun 26/10/26	lun 30/11/26

8.2	Main Control	30 días	lun 26/10/26	lun 30/11/26
9	**SISTEMAS DE PROTECCIÓN**	**10 días**	**mar 10/11/26**	**sáb 21/11/26**
9.1	Celda de medida en media tensión normalizada, medidor bidireccional 4 cuadrantes medida activa – Reactiva, con interfase de comunicación para el sistema SCADA, bloque de pruebas de tres elementos, transformadores de medida de corriente 200/5A clase 0.5s,	10 días	mar 10/11/26	sáb 21/11/26
9.2	Acometida por MPPT	10 días	mar 10/11/26	sáb 21/11/26
9.3	Acometida por inversor solar en AC	10 días	mar 10/11/26	sáb 21/11/26
9.4	Acometida clústeres de baterias a T-3	10 días	mar 10/11/26	sáb 21/11/26
9.5	Sistema de tierras de la planta solar	10 días	mar 10/11/26	sáb 21/11/26
9.6	Sistema de apantallamiento general de la central de generacion solar	10 días	mar 10/11/26	sáb 21/11/26
9.7	Cableado de instrumentación y control	10 días	mar 10/11/26	sáb 21/11/26
9.8	Acometida T2 a Transformador TR1	10 días	mar 10/11/26	sáb 21/11/26
9.9	Sistema de servicios auxiliares (trafo 75 KVA 440/208;Iluminacion interior y exterior ;tomas industriales,etc)	10 días	mar 10/11/26	sáb 21/11/26
10	**CIMENTACIÓN CIVIL**	**5 días**	**vie 2/10/26**	**jue 8/10/26**
10.1	Fundiciones civiles para clúster , bases trafos y cárcamos de alimentación, cajas de paso	5 días	vie 2/10/26	jue 8/10/26
10.2	Zanjado de conductores	5 días	vie 2/10/26	jue 8/10/26
10.3	Caseta de control estructura modular prefabricada	5 días	vie 2/10/26	jue 8/10/26
10.4	Alforamiento al circuito 13.2kV de distribución	5 días	vie 2/10/26	jue 8/10/26
11	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**	**110 días**	**jue 23/07/26**	**sáb 28/11/26**
11.1	Cerramiento perimetral campo solar	44 días	jue 8/10/26	sáb 28/11/26
11.2	Desbroce, excavación, relleno y compactación	60 días	jue 23/07/26	jue 1/10/26
12	**LINEAS ELECTRICAS**	**80 días**	**vie 28/08/26**	**lun 30/11/26**
12.1	Red Compacta de 13,2kV y red trenzada para conexión y distribución de Jurubira Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecologica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui.	80 días	vie 28/08/26	lun 30/11/26
12.2	Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecologica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui.	75 días	vie 28/08/26	mar 24/11/26
12.3	Red trenzada de baja tensión de Jurubida.	75 días	vie 28/08/26	mar 24/11/26
13	**EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA (RECONECTADORES) Y FIBRA OPTICA**	**76 días**	**vie 28/08/26**	**mié 25/11/26**
13.1	Equipos de control automático con elementos de corte y maniobra para los circuitos de nivel de tensión II (13.2kV)	76 días	vie 28/08/26	mié 25/11/26
13.2	Fibra óptica para la comunicación entre el sistema SCADA del parque de generación solar hibrido y los equipos de control automático instalados en los circuitos de nivel de tensión II.	76 días	vie 28/08/26	mié 25/11/26
14	**CAPACITACIÓN**	**30 días**	**lun 26/10/26**	**lun 30/11/26**
14.1	Transferencia tecnológica y capacitación en energías renovables/solar fotovoltaica	30 días	lun 26/10/26	lun 30/11/26
14.2	Capacitacion en operación y mantenimiento de plantas generadoras	30 días	lun 26/10/26	lun 30/11/26
14.3	Capacitación en sincronismo del sistema, monitoreo local y control	30 días	lun 26/10/26	lun 30/11/26
15	**ETAPA DE LIQUIDACIÓN**	**20 días**	**vie 6/11/26**	**lun 30/11/26**
15.1	Entrega de infraestructura, recopilación de documentación y liquidación del contrato de obra	20 días	vie 6/11/26	lun 30/11/26
16	**RETIE**	**50 días**	**vie 2/10/26**	**lun 30/11/26**
16.1	Certificación RETIE	50 días	vie 2/10/26	lun 30/11/26
17	**COSTOS INDIRECTOS**	**170 días**	**vie 15/05/26**	**lun 30/11/26**
17.1	Administración	170 días	vie 15/05/26	lun 30/11/26
17.2	Imprevistos	170 días	vie 15/05/26	lun 30/11/26
17.3	Utilidad	170 días	vie 15/05/26	lun 30/11/26
17.4	iva/utilidad	170 días	vie 15/05/26	lun 30/11/26
18	FIN	0 días	lun 30/11/26	lun 30/11/26

Ver Anexo 3. *Cronograma y Flujo de Fondos*

Tabla 15. Flujo de caja (Nivel 1)

FLUJO DE FONDOS								
		PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7
EDT	Nombre de tarea	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
0	CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.	$ 83.091.466	$ 136.936.259	$ 1.415.794.796	$ 1.160.023.558	$ 3.552.563.866	$ 7.467.294.772	$ 59.524.897.113
1	Inicio							
2	PERMISOS AMBIENTABLES Y MEDIDAS DE COMPENSACIÓN (Ley 633 de 200 art. 96)	$ 39.457.187	$ 73.937.792	$ 76.781.553	$ 37.324.366	$ -	$ -	$ -
3	REVISIÓN DE DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
4	GESTIÓN SOCIAL	$ 5.484.397	$ 5.484.397	$ 5.484.397	$ 5.484.397	$ 5.484.397	$ 5.484.397	$ 5.484.397
5	REPLANTEO DE OBRA	$ 19.998.992	$ 27.601.070	$ 3.918.136	$ -	$ -	$ -	$ -
6	ETAPA DE ADQUISICIÓN, LEGALIZACIÓN Y TRANSPORTE	$ -	$ -	$ 832.460.285	$ -	$ -	$ 832.460.285	$ -
7	SISTEMA FOTOVOLTÁICO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 624.366.242	$ 33.273.325.583
8	SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 608.056.942	$ 2.785.749.247
9	SISTEMAS DE PROTECCIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.225.831.410
10	CIMENTACIÓN CIVIL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.087.690.036	$ -
11	CERRAMIENTO PERIMETRAL	$ -	$ -	$ 187.877.548,69	$ 620.294.129,00	$ 620.294.129,00	$ 316.266.886,72	$ 363.256.496,59
12	LINEAS ELECTRICAS	$ -	$ -	$ -	$ 158.408.587,15	$ 1.381.046.416,04	$ 1.460.113.933,75	$ 1.196.315.247,87
13	EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA (RECONECTADORES) Y FIBRA OPTICA	$ -	$ -	$ -	$ 85.111.075	$ 769.700.159	$ 784.502.085	$ 610.579.453
14	CAPACITACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 30.570.432,90	$ 101.664.462,90
15	ETAPA DE LIQUIDACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.162.935,36
16	RETIE	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 86.592.529,05	$ 84.033.143,95
17	COSTOS INDIRECTOS	$ 18.150.891	$ 29.913.001	$ 309.272.877	$ 253.401.004	$ 776.038.766	$ 1.631.191.003	$ 12.861.494.737
18	FIN							

6.2. Curva S del proyecto.

Teniendo en cuenta que el contrato se inició el 15 de mayo de 2026, el corte del presente informe corresponde a 31 de agosto de 2026.

Para el periodo No.4 correspondiente a agosto de 2026, se tiene contemplado en la programación del contrato de obra No. DG-087-2026 las actividades de:

- Permisos ambientales y medidas de compensación
- Aprobación de diseños de detalle de ingeniería
- Gestión y aprobación de servidumbres y/o permiso de paso
- Localización y Replanteo
- Órdenes de compra de equipos nacionales e importados
- Adquisición, transporte y nacionalización de equipos (importación)
- Desbroce, excavación, relleno y compactación
- Red Compacta de 13,2kV y red trenzada para conexión y distribución de Jurubira Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecológica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui.
- Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecológica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui.
- Red trenzada de baja tensión de Jurubida.
- Equipos de control automático con elementos de corte y maniobra para los circuitos de nivel de tensión II (13.2kV)
- Fibra óptica para la comunicación entre el sistema SCADA del parque de generación solar hibrido y los equipos de control automático instalados en los circuitos de nivel de tensión II.

Se puede corroborar en el cronograma de ejecución la ejecución de estas actividades.

La siguiente tabla permite visualizar la programación por periodos en términos de porcentaje, comparando lo ejecutado para cada periodo y de esta forma realizar control a la ejecución, lo que facilita identificar eventuales atrasos que pueden poner en riesgo el desarrollo de la ejecución en el plazo definido.

Tabla 16. Proyección y ejecución de curva S - agosto 2026 (de acuerdo con Reprogramación Replanteo)

MES	N° DE INFORME	PROYECTADO	EJECUTADO
Mayo	Periodo 1	0,11%	0,33%
Junio	Periodo 2	0,30%	1,97%
Julio	Periodo 3	2,23%	2,25%
Agosto	Periodo 4	3,81%	2.44%
Septiembre	Periodo 5	8,66%	
Octubre	Periodo 6	18,84%	
Noviembre	Periodo 7	100,00%	

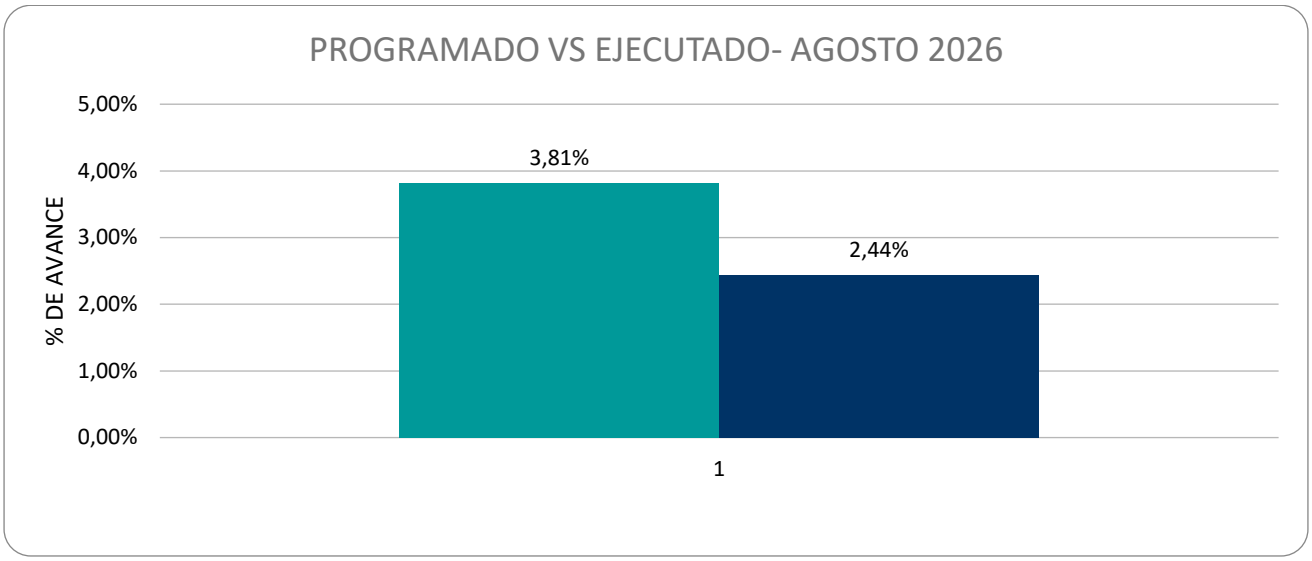


Ilustración 1. Programado vs ejecutado (de acuerdo a Reprogramación replanteo)

La información registrada en la tabla 16, se grafica en la siguiente ilustración, mostrando el movimiento de la curva S. Para graficar la curva S solo te toman 2 decimales del porcentaje de avance.

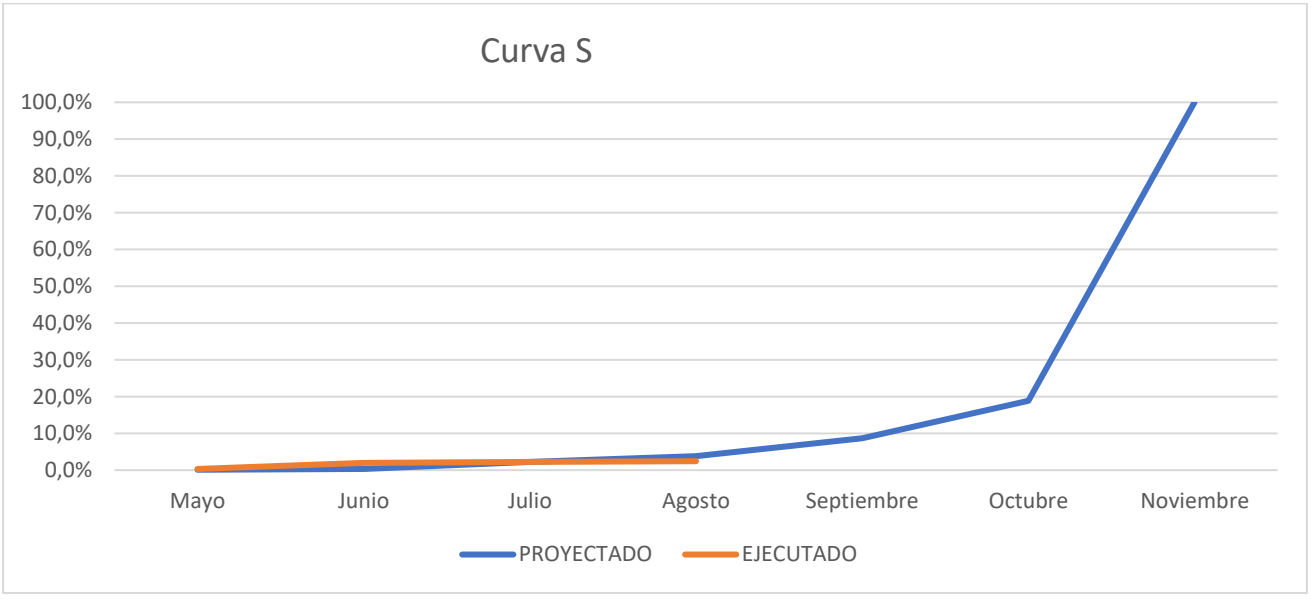


Ilustración 2. Curva S del periodo informado agosto 2026 (de acuerdo a Reprogramación Replanteo)

Para el periodo informado, la curva S del proyecto muestra una ejecucion acumulada a agosto de 2026 del 2,44%, es decir -1,38% por debajo de lo programado.

Con respecto a este retraso, el Consorcio Solar Nuquí 2026 presento el dia 5 de agosto de 2026 mediante oficio OFIC-CSN-0035-2026 Solicitud de suspensión contrato de obra por motivo de:

- Que **no procede** la consulta previa con Comunidades Indígenas.
- Que **PROCEDE** la consulta previa con el **CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE NUQUI – LOS RISCALES.**
- Que **no procede** la consulta previa con Comunidades Rom.

El dia 6 de agosto de 2026 mediante oficio OFIC-CSN-0038-2026 se envio Aclaraciones a Solicitud de suspensión contrato de obra – respuesta a oficio NUQ – 030 – 26 enviado por interventoria.

El dia 10 de agosto de 2026 mediante oficio NUQ – 031 – 26, la interventoria Consorcio Inter Nuqui Centralizado Solar 2026 remite a la Empresa De Energía Del Pacífico SA ESP (DISPAC) el AVAL SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA.

El dia 28 de agosto de 2026 mediante oficio OFIC-CSN-0042-2026 el Consorcio Solar Nuquí 2026 presento Reiteración de solicitud de suspensión del contrato de obra.

Este mismo dia 28 de agosto de 2026 la interventoria Consorcio Inter Nuqui Centralizado Solar 2026 mediante oficio NUQ – 035 – 26 remite a la Empresa De Energía Del Pacífico SA ESP (DISPAC) la remisión y concepto sobre reiteración de solicitud de suspensión del contrato de obra.

El avance presentado en el mes de agosto de 2026 corresponde al avance generado en las actividades de:

- Desbroce, excavación, relleno y compactación.
- Transferencia tecnológica y capacitación en energías renovables/solar fotovoltaica.
- Permisos ambientalles y medidas de compensación.

La fuente de información corresponde a información propia tomada directamente desde la verificación efectuada en campo.

Dificultades presentadas durante el mes de agosto 2026

1. Durante el periodo reciente se ha evidenciado un incremento significativo en los niveles de precipitación en la zona de ejecución del proyecto, lo cual ha generado condiciones climáticas adversas que han afectado directamente el desarrollo de las actividades operativas. La presencia recurrente de lluvias intensas ha producido encharcamientos, suelos inestables y superficies resbaladizas, limitando la ejecución segura de las tareas.

2. Las mareas en Nuquí (costa del Pacífico colombiano) son un fenómeno natural diario de gran amplitud (varían entre 3 y 4 metros de altura). El mar sube y baja de manera drástica cada seis (6) horas aproximadamente, marcando el pulso de la vida cotidiana, el transporte fluvial y el turismo. Este hecho afecta el transporte tanto del personal como de los equipos y material a la obra desde Nuquí hacia Tribuga zona de ejecución del parque solar.

3. El Consorcio Solar Nuquí 2026 presento el día 5 de agosto de 2026 mediante oficio OFIC-CSN-0035-2026 Solicitud de suspensión contrato de obra por motivo de:

- Que **no procede** la consulta previa con Comunidades Indígenas.
- Que **PROCEDE** la consulta previa con el **CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE NUQUI – LOS RISCALES.**
- Que **no procede** la consulta previa con Comunidades Rom.

6.3. Seguimiento a las actividades constructivas.

De conformidad con lo preceptuado en el contrato de obra, las siguientes son las especificaciones técnicas, cantidades y precios.

Tabla 17. Presupuesto del proyecto - agosto 2026 (según Replanteo)

CONDICIONES REPLANTEO					
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VR. UNITARIO**	**VALOR PARCIAL**
1	**SISTEMA FOTOVOLTÁICO**				**$ 35.562.612.395,00**
1.1	Panel solar bifacial de alta eficiencia 710Wp, 0.4% de degradación y eficiencia de 22.86%.	Modulos	5720	$ 847.504,00	$ 4.847.722.880,00
1.2	Estructuras de fijación paneles en Acero galvanizado. Fabricados con galvanizado por inmersión en caliente conforme a ASTM A123. Mesas de 2x20 paneles.	Und	143	$ 15.361.542,00	$ 2.196.700.506,00

1.3	Inversor de 150kW - 1100VDC/480VAC, eficiencia máxima de 98,8%, IP66, 7MPP con 3 entradas por cada una.	Und	27	$ 71.136.598,00	$ 1.920.688.146,00
1.4	Tablero de distribucion de potencia T_1/ 6000 Amperios, 440VAC/42 kA	Und	1	$ 1.615.237.538,00	$ 1.615.237.538,00
1.5	Tablero de distribucion de potencia T_2/ 6000 Amperios, 440VAC/42 kA	Und	1	$ 2.568.787.318,00	$ 2.568.787.318,00
1.6	Tablero de distribucion de potencia T_3/ 4000 Amperios, 440VAC/42 kA	Und	1	$ 2.902.699.653,00	$ 2.902.699.653,00
1.7	Celda de interrupcion DM1A_17 kAmp./SF6 con celda de remonte	Und	2	$ 427.097.413,00	$ 854.194.826,00
1.8	Cluster de baterías de litio, sistema de almacenamiento de 241kWh con inversor bidireccional de 108kW, grado de protección IP65.	Und	20	$ 890.755.039,00	$ 17.815.100.780,00
1.9	Transformador 2000 kVA trifásico 13.2/0.46 kV	Und	2	$ 420.740.374,00	$ 841.480.748,00
2	**SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO**				**$ 3.393.806.189,00**
2.1	Sincronismo GENERADORES	Und	1	$ 425.775.755,00	$ 425.775.755,00
2.2	Main Control	Und	1	$ 2.968.030.434,00	$ 2.968.030.434,00
3	**SISTEMAS DE PROTECCIÓN**				**$ 8.225.831.410,00**
3.1	Celda de medida en media tensión normalizada, medidor bidireccional 4 cuadrantes medida activa – Reactiva, con interfase de comunicación para el sistema SCADA, bloque de pruebas de tres elementos, transformadores de medida de corriente 200/5A clase 0.5s, transformadores de tensión 7620/120V.	Und	2	$ 126.569.905,00	$ 253.139.810,00
3.2	Acometida por MPPT	Und	286	$ 8.548.167,00	$ 2.444.775.762,00
3.3	Acometida por inversor solar en AC	Und	27	$ 169.686.670,00	$ 4.581.540.090,00
3.4	Acometida clústeres de baterias a T-3	Und	20	$ 14.376.517,00	$ 287.530.340,00
3.5	Sistema de tierras de la planta solar	Und	1	$ 51.811.513,00	$ 51.811.513,00
3.6	Sistema de apantallamiento general de la central de generacion solar	Und	1	$ 52.271.555,00	$ 52.271.555,00
3.7	Cableado de instrumentación y control	ml	2860	$ 10.090,00	$ 28.857.400,00
3.8	Acometida T2 a Transformador TR1	Und	2	$ 156.685.078,00	$ 313.370.156,00
3.9	Sistema de servicios auxiliares (trafo 75 KVA 440/208;Iluminacion interior y exterior ;tomas industriales,etc)	Und	1	$ 212.534.784,00	$ 212.534.784,00
4	**CIMENTACIÓN CIVIL**				**$ 1.087.690.036,00**
4.1	Fundiciones civiles para clúster , bases trafos y cárcamos de alimentación, cajas de paso	m3	297,7	$ 2.472.109,00	$ 735.946.849,00
4.2	Zanjado de conductores	ml	1237	$ 61.947,00	$ 76.628.439,00

4.3	Caseta de control estructura modular prefabricada	Global	1	$ 165.733.628,00	$ 165.733.628,00
4.4	Alforamiento al circuito 13.2kV de distribución	Global	2	$ 54.690.560,00	$ 109.381.120,00
5	**CERRAMIENTO PERIMETRAL**				**$ 2.107.989.190,00**
5.1	Cerramiento perimetral campo solar	ml	1180	$ 573.340,00	$ 676.541.200,00
5.2	Desbroce, excavación, relleno y compactación	m3	5766,74	$ 248.225,00	$ 1.431.447.990,00
6	**LINEAS ELECTRICAS**				**$ 4.247.402.383,00**
6.1	Red Compacta de 13,2kV y red trenzada para conexión y distribución de Jurubira Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecologica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui.	km	11,859	$ 155.162.435,00	$ 1.840.071.317,00
6.2	Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecologica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui.	km	16,864	$ 118.589.848,00	$ 1.999.899.197,00
6.3	Red trenzada de baja tensión de Jurubida.	km	1,428	$ 285.316.435,00	$ 407.431.869,00
7	**EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA (RECONECTADORES) Y FIBRA OPTICA**				**$ 2.249.892.772,00**
7.1	Equipos de control automático con elementos de corte y maniobra para los circuitos de nivel de tensión II (13.2kV)	Und	9,0	$ 146.174.933,00	$ 1.315.574.397,00
7.2	Fibra óptica para la comunicación entre el sistema SCADA del parque de generación solar hibrido y los equipos de control automático instalados en los circuitos de nivel de tensión II.	km	28,723	$ 32.528.579,00	$ 934.318.375,00

	TOTAL COSTOS DIRECTOS		**$56.875.224.375**
8	**CAPACITACION**	**0,10%**	**$170.625.672**
8.1	Transferencia tecnológica y capacitación en energías renovables/solar fotovoltaica		**$56.875.224**
8.2	Capacitacion en operación y mantenimiento de plantas generadoras		**$56.875.224**
8.3	Capacitación en sincronismo del sistema, monitoreo local y control		**$56.875.224**
	TOTAL COSTOS DIRECTOS+CAPACITACIONES		**$57.045.850.047**
		Porcentajes	
	ADMINISTRACIÓN	**19,00%**	$ 10.806.292.631,00
	IMPREVISTOS MINIMO %	**3,00%**	$ 1.706.256.731,00
	UTILIDAD	**5,00%**	$ 2.843.761.219,00
	IVA / UTILIDAD	**19,00%**	$ 540.314.632,00

TOTAL COSTO INDIRECTOS	**27,00%**	**$ 15.896.625.213,00**
PERMISOS AMBIENTABLES Y MEDIDAS DE COMPENSACIÓN (Ley 633 de 2000 art. 96)	**0,40%**	$ 227.500.898,00
CERTIFICACION RETIE	**0,30%**	$ 170.625.673,00
VALOR CONSTRUCCIÓN PROYECTO (TOTAL COSTOS DIRECTOS + TOTAL COSTOS INDIRECTOS)		**$ 73.340.601.831,00**
VALOR TOTAL PROYECTO HIBRIDO NUQUÍ 4 MW		**$ 73.340.601.831,00**

A continuación se presenta la ejecución de actividades realizadas en el periodo informado.

Tabla 18. Actividades realizadas agosto 2026

CONSORCIO SOLAR
NUQUÍ - 2026

CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

CONDICIONES INICIALES						CANT. REPLANTEO						CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 01 AL 31 AGOSTO 2026	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
SISTEMA FOTOVOLTAICO						**SISTEMA FOTOVOLTAICO**							
2.1.	Panel solar Mono facial STC 605 Watt/tolerancia positiva en potencia +5W/0,6%degradacion lineal/eficiencia modulo >= 21,6%.	Modulos	6.600	$ 722.170,00	$ 4.766.322.000,00	**1.1**	Panel solar bifacial de alta eficiencia 710Wp, 0.4% de degradación y eficiencia de 22.86%.	Modulos	5.720,00	$ 847.504,00	$ 4.847.722.880,00		$ 0,00
2.2.	Estructuras de fijación paneles Acero galvanizado (>70 micras), para 90 modulos, dimensiones (31,74 m*6m)	Und	73	$ 29.955.001,00	$ 2.196.700.073,00	**1.2**	Estructuras de fijación paneles en Acero galvanizado. Fabricados con galvanizado por inmersión en caliente conforme a ASTM A123. Mesas de 2x20 paneles.	Und	143,00	$ 15.361.542,00	$ 2.196.700.506,00		$ 0,00
2.3.	Inversores de conexión a red 175 KW /1500 VDC/800 VAC/Eficiencia maxima >=98,9/IP65/9 MPPT	Und	18	$ 82.992.659,00	$ 1.493.867.862,00	**1.3**	Inversor de 150kW - 1100VDC/480VAC, eficiencia máxima de 98,8%, IP66, 7MPP con 3 entradas por cada una.	Und	27,00	$ 71.136.598,00	$ 1.920.688.146,00		$ 0,00
2.4.	Tablero de distribucion de potencia T_1/ 1600 Amperios,800VAC/42 kA	Und	1	$ 1.615.237.538,00	$ 1.615.237.538,00	**1.4**	Tablero de distribucion de potencia T_1/ 6000 Amperios, 440VAC/42 kA	Und	1,00	$ 1.615.237.538,00	$ 1.615.237.538,00		$ 0,00
2.5.	Tablero de distribucion de potencia T_2/ 2000 Amperios,480 VAC/42 kA	Und	1	$ 2.568.787.318,00	$ 2.568.787.318,00	**1.5**	Tablero de distribucion de potencia T_2/ 6000 Amperios, 440VAC/42 kA	Und	1,00	$ 2.568.787.318,00	$ 2.568.787.318,00		$ 0,00
2.6.	Tablero de distribucion de potencia T_3/ 1600 Amperios,480 VAC/42 kA	Und	1	$ 2.902.699.653,00	$ 2.902.699.653,00	**1.6**	Tablero de distribucion de potencia T_3/ 4000 Amperios, 440VAC/42 kA	Und	1,00	$ 2.902.699.653,00	$ 2.902.699.653,00		$ 0,00
2.7.	Celda de interrupcion DM1A_17 kAmp./SF6 con celda de remonte	Und	1	$ 427.097.413,00	$ 427.097.413,00	**1.7**	Celda de interrupcion DM1A_17 kAmp./SF6 con celda de remonte	Und	2,00	$ 427.097.413,00	$ 854.194.826,00		$ 0,00
2.8.	Cluster de baterias(BAT) Litio, 200.15 KVA e inversor bidireccional 208 KVA (europeo).Incluye contenedor IP65	Und	24	$ 739.770.154,00	$ 17.754.483.696,00	**1.8**	Cluster de baterías de litio, sistema de almacenamiento de 241kWh con inversor bidireccional de 108kW, grado de protección IP65.	Und	20,00	$ 890.755.039,00	$ 17.815.100.780,00		$ 0,00
2.11.	Transformador 2000 kVA trifásico 13.2/0.46 kV	Und	2	$ 420.740.374,00	$ 841.480.748,00	**1.9**	Transformador 2000 kVA trifásico 13.2/0.46 kV	Und	2,00	$ 420.740.374,00	$ 841.480.748,00		$ 0,00
2.12.	Transformador Seco clase H, 1300 kVA trifásico 800/440V. Incluye contenedor ventilado	Und	3	$ 310.943.035,00	$ 932.829.105,00								
2.13.	Transformador Seco clase H, 750 kVA trifásico 480/440V. Incluye contenedor ventilado	Und	6	$ 293.968.585,00	$ 1.763.811.510,00								
SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO						**SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO**							
3.1.	Sincronismo GENERADORES	Und	1	$ 425.775.755,00	$ 425.775.755,00	**2.1**	Sincronismo GENERADORES	Und	1,00	$ 425.775.755,00	$ 425.775.755,00		$ 0,00
3.2	Main Control	Und	1	$ 2.968.030.434,00	$ 2.968.030.434,00	**2.2**	Main Control	Und	1,00	$ 2.968.030.434,00	$ 2.968.030.434,00		$ 0,00
SISTEMAS DE PROTECCIÓN						**SISTEMAS DE PROTECCIÓN**							
4.1	Celda de medida en media tensión normalizada, medidor bidireccional 4 cuadrantes medida activa – Reactiva, con interfase de comunicación para el sistema SCADA, bloque de pruebas de tres elementos, transformadores de medida de corriente 200/5A clase 0.5s, transformadores de tensión 7620/120V. (IVA incluido en el costo)	Und	1	$ 126.569.905,00	$ 126.569.905,00	**3.1**	Celda de medida en media tensión normalizada, medidor bidireccional 4 cuadrantes medida activa – Reactiva, con interfase de comunicación para el sistema SCADA, bloque de pruebas de tres elementos, transformadores de medida de corriente 200/5A clase 0.5s, transformadores de tensión 7620/120V.	Und	2,00	$ 126.569.905,00	$ 253.139.810,00		$ 0,00
4.2	Acometida por MPPT(IVA Incluido en conductores)	Und	264	$ 8.548.167,00	$ 2.256.716.088,00	**3.2**	Acometida por MPPT	Und	286,00	$ 8.548.167,00	$ 2.444.775.762,00		$ 0,00
4.3	Acometida por inversor de conexion a red(IVA Incluido en conductores)	Und	18	$ 169.686.670,00	$ 3.054.360.060,00	**3.3**	Acometida por inversor solar en AC	Und	27,00	$ 169.686.670,00	$ 4.581.540.090,00		$ 0,00
4.4	Acometida clusters de baterias a T_3(IVA Incluido en conductores)	Und	24	$ 14.376.517,00	$ 345.036.408,00	**3.4**	Acometida clústeres de baterias a T-3	Und	20,000	$ 14.376.517,00	$ 287.530.340,00		$ 0,00
4.5	Acometidas Transformadores TR3 y TR4(IVA Incluido en conductores)	Und	6	$ 88.459.528,00	$ 530.757.168,00								
4.6	Acometida transformador TR_2(IVA Incluido en conductores)	Und	3	$ 87.247.394,00	$ 261.742.182,00								
4.7	Sistema de tierras de la planta solar(IVA Incluido en conductores)	Und	1	$ 51.811.513,00	$ 51.811.513,00	**3.5**	Sistema de tierras de la planta solar	Und	1,00	$ 51.811.513,00	$ 51.811.513,00		$ 0,00
4.8	Sistema de apantallamiento general de la central de generacion solar(IVA Incluido en conductores)	Und	1	$ 52.271.555,00	$ 52.271.555,00	**3.6**	Sistema de apantallamiento general de la central de generacion solar	Und	1,00	$ 52.271.555,00	$ 52.271.555,00		$ 0,00
4.9	Alambrado de instrumentación y control	ml	2.860	$ 10.090,00	$ 28.857.400,00	**3.7**	Cableado de instrumentación y control	ml	2.860,00	$ 10.090,00	$ 28.857.400,00		$ 0,00
4.10	Acometida T2 a Transformador TR1 (IVA incluido en conductores)	Und	2	$ 156.685.078,00	$ 313.370.156,00	**3.8**	Acometida T2 a Transformador TR1	Und	2,00	$ 156.685.078,00	$ 313.370.156,00		$ 0,00
4.11	Sistema de servicios auxiliares (trafo 75 KVA 440/208;Iluminacion interior y exterior ;tomas industriales,etc)	Und	1	$ 212.534.784,00	$ 212.534.784,00	**3.9**	Sistema de servicios auxiliares (trafo 75 KVA 440/208;Iluminacion interior y exterior ;tomas industriales,etc)	Und	1,00	$ 212.534.784,00	$ 212.534.784,00		$ 0,00

CIMENTACIÓN CIVIL						**CIMENTACIÓN CIVIL**							
5.1	Fundaciones civiles para clúster , bases trafos y cárcamos de alimentación, cajas de paso	m3	29	$ 2.472.109,00	$ 70.455.106,00	**4.1**	Fundiciones civiles para clúster , bases trafos y cárcamos de alimentación, cajas de paso	m3	297,70	$ 2.472.109,00	$ 735.946.849,00		$ 0,00
5.2	Zanjado de conductores	ml	415	$ 61.947,00	$ 25.708.005,00	**4.2**	Zanjado de conductores	ml	1.237,00	$ 61.947,00	$ 76.628.439,00		$ 0,00
5.3	Caseta de control y cuarto de maquinas	Global	1	$ 355.131.011,00	$ 355.131.011,00	**4.3**	Caseta de control estructura modular prefabricada	Global	1,00	$ 165.733.628,00	$ 165.733.628,00		$ 0,00
5.4	Alforamiento del circuito 13.2kV de distribución	Global	1	$ 54.690.560,00	$ 54.690.560,00	**4.4**	Alforamiento al circuito 13.2kV de distribución	Global	2,00	$ 54.690.560,00	$ 109.381.120,00		$ 0,00
CERRAMIENTO PERIMETRAL						**CERRAMIENTO PERIMETRAL**							
6.1	Cerramiento perimetral campo solar	ml	1.180	$ 573.340,00	$ 676.541.200,00	**5.1**	Cerramiento perimetral campo solar	ml	1.180,00	$ 573.340,00	$ 676.541.200,00		$ 0,00
6.2	Desbroce, excavación, relleno y compactación	m3	7.500	$ 248.225,00	$ 1.861.687.500,00	**5.2**	Desbroce, excavación, relleno y compactación	m3	5.766,74	$ 248.225,00	$ 1.431.447.990,00	420,00	$ 104.254.500,00
LINEAS ELECTRICAS						**LINEAS ELECTRICAS**							
7.1	Red Compacta de 13,2kV y red trenzada para conexión y distribución de Jurubira Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecologica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui (Incluye replanteo).	km	13	$ 123.848.853,00	$ 1.548.110.662,00	**6.1**	Red Compacta de 13,2kV y red trenzada para conexión y distribución de Jurubira Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecologica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui.	km	11,86	$ 155.162.435,00	$ 1.840.071.317,00		$ 0,00
7.2	Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecologica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui (Incluye replanteo y desmonte).	km	16	$ 110.425.764,00	$ 1.766.812.224,00	**6.2**	Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecologica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui.	km	16,86	$ 118.589.848,00	$ 1.999.899.197,00		$ 0,00
7.3	Red trenzada de baja tensión de Jurubida (Incluye replanteo y desmonte).	km	1,6	$ 249.101.984,00	$ 398.563.174,00	**6.3**	Red trenzada de baja tensión de Jurubida.	km	1,43	$ 285.316.435,00	$ 407.431.869,00		$ 0,00
EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA (RECONECTADORES) Y FIBRA OPTICA													
8.1	Equipos de control automático con elementos de corte y maniobra para los circuitos de nivel de tensión II (13.2kV)	Und	9,00	$ 146.174.933,00	$ 1.315.574.397,00	**7.1**	Equipos de control automático con elementos de corte y maniobra para los circuitos de nivel de tensión II (13.2kV)	Und	9,00	$ 146.174.933,00	$ 1.315.574.397,00		$ 0,00
8.2	Fibra óptica para la comunicación entre el sistema SCADA del parque de generación solar hibrido y los equipos de control automático instalados en los circuitos de nivel de tensión II.	km	28,00	$ 32.528.579,00	$ 910.800.212,00	**7.2**	Fibra óptica para la comunicación entre el sistema SCADA del parque de generación solar hibrido y los equipos de control automático instalados en los circuitos de nivel de tensión II.	km	28,72	$ 32.528.579,00	$ 934.318.375,00		$ 0,00
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 56.875.224.375,00**						**$ 56.875.224.375,00**		**$ 104.254.500,00**
CAPACITACION													
9.1	Transferencia tecnológica y capacitación en energías renovables/solar fotovoltaica			**0,10%**	$ 56.875.224,00	**8.1**	Transferencia tecnológica y capacitación en energías renovables/solar fotovoltaica			**0,10%**	$ 56.875.224,00		$ 104.255,00
9.2	Capacitacion en operación y mantenimiento de plantas generadoras			**0,10%**	$ 56.875.224,00	**8.2**	Capacitacion en operación y mantenimiento de plantas generadoras			**0,10%**	$ 56.875.224,00		
9.3	Capacitación en sincronismo del sistema, monitoreo local y control			**0,10%**	$ 56.875.224,00	**8.3**	Capacitación en sincronismo del sistema, monitoreo local y control			**0,10%**	$ 56.875.224,00		
TOTAL COSTOS DIRECTOS+CAPACITACIONES					**$ 57.045.850.047,00**						**$ 57.045.850.047,00**		**$ 104.358.755,00**
ADMINISTRACIÓN				**19,00%**	$ 10.806.292.631,00	**ADMINISTRACIÓN**				**19,00%**	$ 10.806.292.631,00		$ 19.808.355,00
IMPREVISTOS MINIMO %				**3,00%**	$ 1.706.256.731,00	**IMPREVISTOS MINIMO %**				**3,00%**	$ 1.706.256.731,00		$ 3.127.635,00
UTILIDAD				**5,00%**	$ 2.843.761.219,00	**UTILIDAD**				**5,00%**	$ 2.843.761.219,00		$ 5.212.725,00
IVA / UTILIDAD				**19,00%**	$ 540.314.632,00	**IVA / UTILIDAD**				**19,00%**	$ 540.314.632,00		$ 990.418,00
TOTAL COSTO INDIRECTOS				**27,00%**	**$ 15.896.625.213,00**	**TOTAL COSTO INDIRECTOS**				**27,00%**	**$ 15.896.625.213,00**		**$ 29.139.133,00**
SUBTOTAL PROYECTO					**$ 72.942.475.260,00**	**SUBTOTAL PROYECTO**					**$ 72.942.475.260,00**		**$ 133.497.888,00**
PERMISOS AMBIENTABLES Y MEDIDAS DE COMPENSACIÓN (Ley 633 de 2000 art. 96)				**0,40%**	$ 227.500.898,00	**PERMISOS AMBIENTABLES Y MEDIDAS DE COMPENSACIÓN (Ley 633 de 2000 art. 96)**				**0,40%**	$ 227.500.898,00		$ 417.018,00
CERTIFICACION RETIE				**0,30%**	$ 170.625.673,00	**CERTIFICACION RETIE**				**0,30%**	$ 170.625.673,00		
TOTAL PROYECTO					**$ 73.340.601.831,00**	**TOTAL PROYECTO**					**$ 73.340.601.831,00**		**$ 133.914.906,00**
AVANCE MES (%)						**AVANCE MES (%)**							**0,18259%**

Carrera 22 # 11-86 San José del Guaviare. Celular: 312 280 7382
Correo electrónico: consorciosolarnuqui2026@gmail.com

6.4. Descripción de actividades ejecutadas y registro fotográfico

Durante el periodo correspondiente al 01 de agosto de 2026 a día 31 de agosto de 2026 se han venido adelantando las actividades contractuales contempladas dentro de la proyección del cronograma de obra y correspondientes a:

CERRAMIENTO PERIMETRAL - Desbroce, excavación, relleno y compactación

ITEM	CERRAMIENTO PERIMETRAL	UNIDAD	CANTIDAD REPLANTEO	CANTIDAD AVANCE	CANTIDAD ACOMULADA	PORCENTAJE AVANCE
5.2	Desbroce, excavación, relleno y compactación	m3	5.766,74	420,00	3840	66,59%

Desbroce, excavación, relleno y compactación









6.5. Avance físico del periodo y avance acumulado.

Con el avance en las actividades informadas en el periodo del 1 de agosto de 2026 al 31 de agosto del 2026 se presenta ejecución del **0,18259%**, para un acumulado total del **2.43540%.**

El avance mensual correspondiente a **agosto de 2026** para el presente contrato corresponde a una ejecución de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 133.914.906,00**), para un porcentaje de avance mensual de **0,18259%**.

El avance acumulado para el presente contrato corresponde a una ejecución de **MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 1.786.139.706,00**), para un porcentaje de cumplimiento acumulado del **2.43540%.**

Tabla 19.Avance del periodo

CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.																
CONDICIONES INICIALES						CANT. REPLANTEO						CANTIDADES EJECUTADAS CORTE 01 AL 31 AGOSTO 2026		EJECUTADO ACUMULADO		EJECUCIÓN
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
SISTEMA FOTOVOLTAICO						SISTEMA FOTOVOLTAICO										
2.1.	Panel solar Mono facial STC 605 Watt/tolerancia positiva en potencia +5W/0,6%degradacion lineal/eficiencia modulo >= 21,6%.	Modulos	6.600	$ 722.170,00	$ 4.766.322.000,00	1.1	Panel solar bifacial de alta eficiencia 710Wp, 0.4% de degradación y eficiencia de 22.86%.	Modulos	5.720,00	$ 847.504,00	$ 4.847.722.880,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.2.	Estructuras de fijación paneles Acero galvanizado (>70 micras), para 90 modulos, dimensiones (31,74 m*6m)	Und	73	$ 29.955.001,00	$ 2.196.700.073,00	1.2	Estructuras de fijación paneles en Acero galvanizado. Fabricados con galvanizado por inmersión en caliente conforme a ASTM A123. Mesas de 2x20 paneles.	Und	143,00	$ 15.361.542,00	$ 2.196.700.506,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.3.	Inversores de conexión a red 175 KW /1500 VDC/800 VAC/Eficiencia maxima >=98,9/IP65/9 MPPT	Und	18	$ 82.992.659,00	$ 1.493.867.862,00	1.3	Inversor de 150kW - 1100VDC/480VAC, eficiencia máxima de 98,8%, IP66, 7MPP con 3 entradas por cada una.	Und	27,00	$ 71.136.598,00	$ 1.920.688.146,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.4.	Tablero de distribucion de potencia T_1/ 1600 Amperios,800VAC/42 kA	Und	1	$ 1.615.237.538,00	$ 1.615.237.538,00	1.4	Tablero de distribucion de potencia T_1/ 6000 Amperios, 440VAC/42 kA	Und	1,00	$ 1.615.237.538,00	$ 1.615.237.538,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.5.	Tablero de distribucion de potencia T_2/ 2000 Amperios,480 VAC/42 kA	Und	1	$ 2.568.787.318,00	$ 2.568.787.318,00	1.5	Tablero de distribucion de potencia T_2/ 6000 Amperios, 440VAC/42 kA	Und	1,00	$ 2.568.787.318,00	$ 2.568.787.318,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.6.	Tablero de distribucion de potencia T_3/ 1600 Amperios,480 VAC/42 kA	Und	1	$ 2.902.699.653,00	$ 2.902.699.653,00	1.6	Tablero de distribucion de potencia T_3/ 4000 Amperios, 440VAC/42 kA	Und	1,00	$ 2.902.699.653,00	$ 2.902.699.653,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.7.	Celda de interrupcion DM1A_17 kAmp./SF6 con celda de remonte	Und	1	$ 427.097.413,00	$ 427.097.413,00	1.7	Celda de interrupcion DM1A_17 kAmp./SF6 con celda de remonte	Und	2,00	$ 427.097.413,00	$ 854.194.826,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.8.	Cluster de baterias(BAT) Litio, 200.15 KVA e inversor bidireccional 208 KVA (europeo).Incluye contenedor IP65	Und	24	$ 739.770.154,00	$ 17.754.483.696,00	1.8	Cluster de baterías de litio, sistema de almacenamiento de 241kWh con inversor bidireccional de 108kW, grado de protección IP65.	Und	20,00	$ 890.755.039,00	$ 17.815.100.780,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.11.	Transformador 2000 kVA trifásico 13.2/0.46 kV	Und	2	$ 420.740.374,00	$ 841.480.748,00	1.9	Transformador 2000 kVA trifásico 13.2/0.46 kV	Und	2,00	$ 420.740.374,00	$ 841.480.748,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
2.12.	Transformador Seco clase H, 1300 kVA trifásico 800/440V. Incluye contenedor ventilado	Und	3	$ 310.943.035,00	$ 932.829.105,00											
2.13.	Transformador Seco clase H, 750 kVA trifásico 480/440V. Incluye contenedor ventilado	Und	6	$ 293.968.585,00	$ 1.763.811.510,00											
SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO						SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y MONITOREO										
3.1.	Sincronismo GENERADORES	Und	1	$ 425.775.755,00	$ 425.775.755,00	2.1	Sincronismo GENERADORES	Und	1,00	$ 425.775.755,00	$ 425.775.755,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
3.2	Main Control	Und	1	$ 2.968.030.434,00	$ 2.968.030.434,00	2.2	Main Control	Und	1,00	$ 2.968.030.434,00	$ 2.968.030.434,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%

SISTEMAS DE PROTECCIÓN						**SISTEMAS DE PROTECCIÓN**										
4.1	Celda de medida en media tensión normalizada, medidor bidireccional 4 cuadrantes medida activa – Reactiva, con interfase de comunicación para el sistema SCADA, bloque de pruebas de tres elementos, transformadores de medida de corriente 200/5A clase 0.5s, transformadores de tensión 7620/120V. (IVA incluido en el costo)	Und	1	$ 126.569.905,00	$ 126.569.905,00	**3.1**	Celda de medida en media tensión normalizada, medidor bidireccional 4 cuadrantes medida activa – Reactiva, con interfase de comunicación para el sistema SCADA, bloque de pruebas de tres elementos, transformadores de medida de corriente 200/5A clase 0.5s, transformadores de tensión 7620/120V.	Und	2,00	$ 126.569.905,00	$ 253.139.810,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4.2	Acometida por MPPT(IVA Incluido en conductores)	Und	264	$ 8.548.167,00	$ 2.256.716.088,00	**3.2**	Acometida por MPPT	Und	286,00	$ 8.548.167,00	$ 2.444.775.762,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4.3	Acometida por inversor de conexion a red(IVA Incluido en conductores)	Und	18	$ 169.686.670,00	$ 3.054.360.060,00	**3.3**	Acometida por inversor solar en AC	Und	27,00	$ 169.686.670,00	$ 4.581.540.090,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4.4	Acometida clusters de baterias a T_3(IVA Incluido en conductores)	Und	24	$ 14.376.517,00	$ 345.036.408,00	**3.4**	Acometida clústeres de baterias a T-3	Und	20,000	$ 14.376.517,00	$ 287.530.340,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4.5	Acometidas Transformadores TR3 y TR4(IVA Incluido en conductores)	Und	6	$ 88.459.528,00	$ 530.757.168,00											
4.6	Acometida transformador TR_2(IVA Incluido en conductores)	Und	3	$ 87.247.394,00	$ 261.742.182,00											
4.7	Sistema de tierras de la planta solar(IVA Incluido en conductores)	Und	1	$ 51.811.513,00	$ 51.811.513,00	**3.5**	Sistema de tierras de la planta solar	Und	1,00	$ 51.811.513,00	$ 51.811.513,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4.8	Sistema de apantallamiento general de la central de generacion solar(IVA Incluido en conductores)	Und	1	$ 52.271.555,00	$ 52.271.555,00	**3.6**	Sistema de apantallamiento general de la central de generacion solar	Und	1,00	$ 52.271.555,00	$ 52.271.555,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4.9	Alambrado de instrumentación y control	ml	2.860	$ 10.090,00	$ 28.857.400,00	**3.7**	Cableado de instrumentación y control	ml	2.860,00	$ 10.090,00	$ 28.857.400,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4.10	Acometida T2 a Transformador TR1 (IVA incluido en conductores)	Und	2	$ 156.685.078,00	$ 313.370.156,00	**3.8**	Acometida T2 a Transformador TR1	Und	2,00	$ 156.685.078,00	$ 313.370.156,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
4.11	Sistema de servicios auxiliares (trafo 75 KVA 440/208;Iluminacion interior y exterior ;tomas industriales,etc)	Und	1	$ 212.534.784,00	$ 212.534.784,00	**3.9**	Sistema de servicios auxiliares (trafo 75 KVA 440/208;Iluminacion interior y exterior ;tomas industriales,etc)	Und	1,00	$ 212.534.784,00	$ 212.534.784,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
CIMENTACIÓN CIVIL						**CIMENTACIÓN CIVIL**										
5.1	Fundaciones civiles para clúster , bases trafos y cárcamos de alimentación, cajas de paso	m3	29	$ 2.472.109,00	$ 70.455.106,00	**4.1**	Fundiciones civiles para clúster , bases trafos y cárcamos de alimentación, cajas de paso	m3	297,70	$ 2.472.109,00	$ 735.946.849,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5.2	Zanjado de conductores	ml	415	$ 61.947,00	$ 25.708.005,00	**4.2**	Zanjado de conductores	ml	1.237,00	$ 61.947,00	$ 76.628.439,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5.3	Caseta de control y cuarto de maquinas	Global	1	$ 355.131.011,00	$ 355.131.011,00	**4.3**	Caseta de control estructura modular prefabricada	Global	1,00	$ 165.733.628,00	$ 165.733.628,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
5.4	Alforamiento del circuito 13.2kV de distribución	Global	1	$ 54.690.560,00	$ 54.690.560,00	**4.4**	Alforamiento al circuito 13.2kV de distribución	Global	2,00	$ 54.690.560,00	$ 109.381.120,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
CERRAMIENTO PERIMETRAL						**CERRAMIENTO PERIMETRAL**										
6.1	Cerramiento perimetral campo solar	ml	1.180	$ 573.340,00	$ 676.541.200,00	**5.1**	Cerramiento perimetral campo solar	ml	1.180,00	$ 573.340,00	$ 676.541.200,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
6.2	Desbroce, excavación, relleno y compactación	m3	7.500	$ 248.225,00	$ 1.861.687.500,00	**5.2**	Desbroce, excavación, relleno y compactación	m3	5.766,74	$ 248.225,00	$ 1.431.447.990,00	420,00	$ 104.254.500,00	3840,00	$ 953.184.000,00	66,59%

	LINEAS ELECTRICAS						**LINEAS ELECTRICAS**									
7.1	Red Compacta de 13,2kV y red trenzada para conexión y distribución de Jurubira Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecologica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui (Incluye replanteo).	km	13	$ 123.848.853,00	$ 1.548.110.662,00	**6.1**	Red Compacta de 13,2kV y red trenzada para conexión y distribución de Jurubira Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecologica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui.	km	11,86	$ 155.162.435,00	$ 1.840.071.317,00		$ 0,00	1,30	$ 201.711.166,00	10,96%
7.2	Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecologica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui (Incluye replanteo y desmonte).	km	16	$ 110.425.764,00	$ 1.766.812.224,00	**6.2**	Modernización de Líneas de 13,2 kV Compacta ecologica interconexión Nuquí, Tribuga y Pangui.	km	16,86	$ 118.589.848,00	$ 1.999.899.197,00		$ 0,00	1,60	$ 189.743.757,00	9,49%
7.3	Red trenzada de baja tensión de Jurubida (Incluye replanteo y desmonte).	km	1,6	$ 249.101.984,00	$ 398.563.174,00	**6.3**	Red trenzada de baja tensión de Jurubida.	km	1,43	$ 285.316.435,00	$ 407.431.869,00		$ 0,00	0,16	$ 45.650.630,00	11,20%
	EQUIPOS DE CORTE Y MANIOBRA (RECONECTADORES) Y FIBRA OPTICA															
8.1	Equipos de control automático con elementos de corte y maniobra para los circuitos de nivel de tensión II (13.2kV)	Und	9,00	$ 146.174.933,00	$ 1.315.574.397,00	**7.1**	Equipos de control automático con elementos de corte y maniobra para los circuitos de nivel de tensión II (13.2kV)	Und	9,00	$ 146.174.933,00	$ 1.315.574.397,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
8.2	Fibra óptica para la comunicación entre el sistema SCADA del parque de generación solar hibrido y los equipos de control automático instalados en los circuitos de nivel de tensión II.	km	28,00	$ 32.528.579,00	$ 910.800.212,00	**7.2**	Fibra óptica para la comunicación entre el sistema SCADA del parque de generación solar hibrido y los equipos de control automático instalados en los circuitos de nivel de tensión II.	km	28,72	$ 32.528.579,00	$ 934.318.375,00		$ 0,00	0,00	$ 0,00	0,00%
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 56.875.224.375,00**						**$ 56.875.224.375,00**		**$ 104.254.500,00**		**$ 1.390.289.553,00**	
	CAPACITACION															
9.1	Transferencia tecnológica y capacitación en energías renovables/solar fotovoltaica			**0,10%**	$ 56.875.224,00	**8.1**	Transferencia tecnológica y capacitación en energías renovables/solar fotovoltaica			**0,10%**	$ 56.875.224,00		$ 104.255,00		$ 1.330.726,00	2,34%
9.2	Capacitacion en operación y mantenimiento de plantas generadoras			**0,10%**	$ 56.875.224,00	**8.2**	Capacitacion en operación y mantenimiento de plantas generadoras			**0,10%**	$ 56.875.224,00				$ 186.169,00	0,33%
9.3	Capacitación en sincronismo del sistema, monitoreo local y control			**0,10%**	$ 56.875.224,00	**8.3**	Capacitación en sincronismo del sistema, monitoreo local y control			**0,10%**	$ 56.875.224,00				$ 186.169,00	0,33%
	TOTAL COSTOS DIRECTOS+CAPACITACIONES				**$ 57.045.850.047,00**						**$ 57.045.850.047,00**		**$ 104.358.755,00**		**$ 1.391.992.617,00**	
	ADMINISTRACIÓN			**19,00%**	$ 10.806.292.631,00		**ADMINISTRACIÓN**			**19,00%**	$ 10.806.292.631,00		$ 19.808.355,00		$ 264.155.015,00	2,44%
	IMPREVISTOS MINIMO %			**3,00%**	$ 1.706.256.731,00		**IMPREVISTOS MINIMO %**			**3,00%**	$ 1.706.256.731,00		$ 3.127.635,00		$ 41.708.687,00	2,44%
	UTILIDAD			**5,00%**	$ 2.843.761.219,00		**UTILIDAD**			**5,00%**	$ 2.843.761.219,00		$ 5.212.725,00		$ 69.514.478,00	2,44%
	IVA / UTILIDAD			**19,00%**	$ 540.314.632,00		**IVA / UTILIDAD**			**19,00%**	$ 540.314.632,00		$ 990.418,00		$ 13.207.751,00	2,44%
	TOTAL COSTO INDIRECTOS			**27,00%**	**$ 15.896.625.213,00**		**TOTAL COSTO INDIRECTOS**			**27,00%**	**$ 15.896.625.213,00**		**$ 29.139.133,00**		**$ 388.585.931,00**	
	SUBTOTAL PROYECTO				**$ 72.942.475.260,00**		**SUBTOTAL PROYECTO**				**$ 72.942.475.260,00**		**$ 133.497.888,00**		**$ 1.780.578.548,00**	
	PERMISOS AMBIENTABLES Y MEDIDAS DE COMPENSACIÓN (Ley 633 de 2000 art. 96)			**0,40%**	$ 227.500.898,00		**PERMISOS AMBIENTABLES Y MEDIDAS DE COMPENSACIÓN (Ley 633 de 2000 art. 96)**			**0,40%**	$ 227.500.898,00		$ 417.018,00		$ 5.561.158,00	2,44%
	CERTIFICACION RETIE			**0,30%**	$ 170.625.673,00		**CERTIFICACION RETIE**			**0,30%**	$ 170.625.673,00					0,00%
	TOTAL PROYECTO				**$ 73.340.601.831,00**		**TOTAL PROYECTO**				**$ 73.340.601.831,00**		**$ 133.914.906,00**		**$ 1.786.139.706,00**	
	AVANCE MES (%)						**AVANCE MES (%)**						**0,18259%**		**2,43540%**	


7. OTRAS ACTIVIDADES PARA INFORMAR EN EL PERIODO.

Durante el periodo informado se realizaron otras actividades con el acompañamiento de la interventoría que son de importancia y por las que dejamos trazabilidad en el presente informe.

7.1 Solicitud suspensión del contrato de obra

Durante el mes de agosto de 2026 se realizaron las gestiones correspondientes a la solicitud de suspensión del contrato de obra. El 5 de agosto de 2026, mediante Oficio OFIC-CSN-0035-2026, se presentó la solicitud, de suspensión de contrato de obra por motivo que no procede la consulta previa con comunidades indígenas ni con comunidades Rom; la Interventoría emitió respuesta mediante Oficio NUQ-030-26 el día 6 de agosto 2026 presentando observaciones previas a emitir el aval correspondiente y remitir la solicitud a DISPAC S.A E.S.P. para su formalización. Posteriormente, mediante Oficio OFIC-CSN-0038-2026 con fecha 6 de agosto del 2026, se efectuaron las aclaraciones correspondientes a la solicitud de suspensión de contrato de obra, las cuales fueron atendidas por la Interventoría mediante Oficio NUQ-031-26 del 10 de agosto de 2026 dando aval a la solicitud de suspensión del contrato de obra.

El día 28 de agosto de 2026, mediante Oficio OFIC-CSN-0042-2026, se reiteró a interventoría la solicitud de suspensión del contrato de obra. Este mismo dia la interventoria Consorcio Inter Nuqui Centralizado Solar 2026 mediante oficio NUQ – 035 – 26 remite a la Empresa De Energía Del Pacífico SA ESP (DISPAC) el concepto sobre reiteración de solicitud de suspensión del contrato de obra.

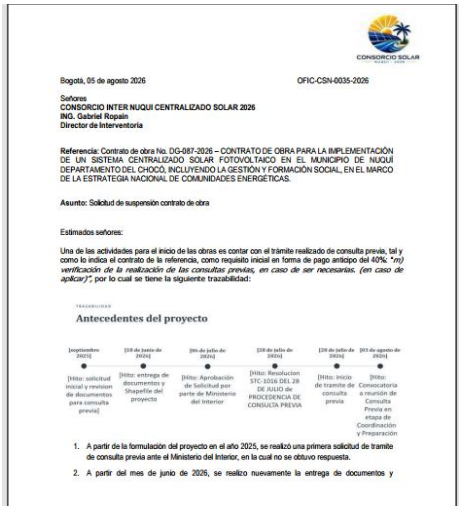

Bogotá, 05 de agosto 2026 OFIC-CSN-0035-2026

Señores
CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
ING. Gabriel Ropain
Director de Interventoria

Referencia: Contrato de obra No. DG-087-2026 – CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.


Asunto: Solicitud de suspensión contrato de obra

Estimados señores:

Una de las actividades para el inicio de las obras es contar con el trámite realizado de consulta previa, tal y como lo indica el contrato de la referencia, como requisito inicial en forma de pago anticipo del 40% *"m) verificación de la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (en caso de aplicar)"*, por lo cual se tiene la siguiente trazabilidad:

Antecedentes del proyecto

1. A partir de la formulación del proyecto en el año 2025, se realizó una primera solicitud de tramite de consulta previa ante el Ministerio del Interior, en la cual no se obtuvo respuesta.
2. A partir del mes de junio de 2026, se realizo nuevamente la entrega de documentos y

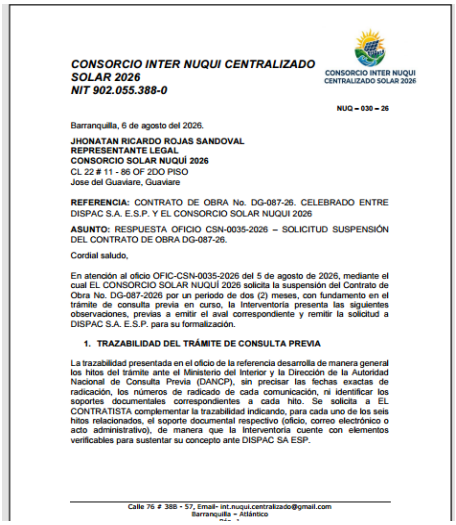

CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
NIT 902.055.388-0

NUQ – 030 – 26

Barranquilla, 6 de agosto del 2026.

JHONATAN RICARDO ROJAS SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026
CL 22 # 11 - 86 OF 2DO PISO
Jose del Guaviare, Guaviare

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. DG-087-26. CELEBRADO ENTRE DISPAC S.A. E.S.P. Y EL CONSORCIO SOLAR NUQUI 2026

ASUNTO: RESPUESTA OFICIO CSN-0035-2026 – SOLICITUD SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA DG-087-26.


Cordial saludo,

En atención al oficio OFIC-CSN-0035-2026 del 5 de agosto de 2026, mediante el cual EL CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026 solicita la suspensión del Contrato de Obra No. DG-087-2026 por un periodo de dos (2) meses, con fundamento en el trámite de consulta previa en curso, la Interventoría presenta las siguientes observaciones, previas a emitir el aval correspondiente y remitir la solicitud a DISPAC S.A. E.S.P. para su formalización.

1. **TRAZABILIDAD DEL TRÁMITE DE CONSULTA PREVIA**

La trazabilidad presentada en el oficio de la referencia desarrolla de manera general los hitos del trámite ante el Ministerio del Interior y la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP), sin precisar las fechas exactas de radicación, los números de radicado de cada comunicación, ni identificar los soportes documentales correspondientes a cada hito. Se solicita a EL CONTRATISTA complementar la trazabilidad indicando, para cada uno de los seis hitos relacionados, el soporte documental respectivo (oficio, correo electrónico o acto administrativo), de manera que la Interventoría cuente con elementos verificables para sustentar su concepto ante DISPAC SA ESP.

Calle 76 # 38B - 57, Email- int.nuqui.centralizado@gmail.com
Barranquilla – Atlántico

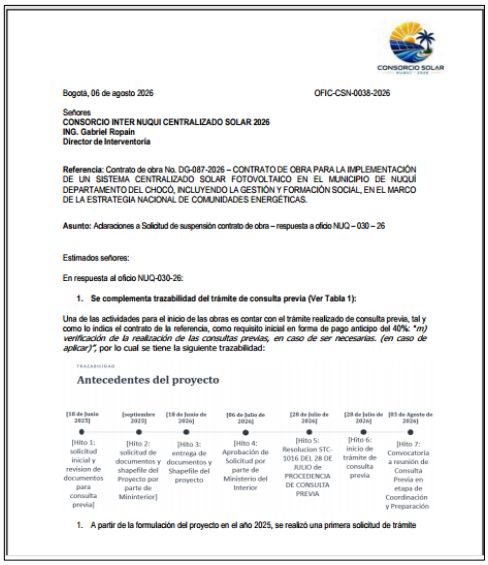

Bogotá, 06 de agosto 2026 OFIC-CSN-0038-2026

Señores
CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
ING. Gabriel Ropain
Director de Interventoría

Referencia: Contrato de obra No. DG-087-2026 – CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

Asunto: Aclaraciones a Solicitud de suspensión contrato de obra – respuesta a oficio NUQ – 030 – 26

Estimados señores:

En respuesta al oficio NUQ-030-26:

1. **Se complementa trazabilidad del trámite de consulta previa (Ver Tabla 1):**


Una de las actividades para el inicio de las obras es contar con el trámite realizado de consulta previa, tal y como lo indica el contrato de la referencia, como requisito inicial en forma de pago anticipo del 40%: *"m) verificación de la realización de las consultas previas, en caso de ser necesarias. (en caso de aplicar)"*, por lo cual se tiene la siguiente trazabilidad:

TRAZABILIDAD

Antecedentes del proyecto

[18 de Junio 2025]	[septiembre 2025]	[18 de Junio de 2026]	[06 de Julio de 2026]	[28 de Julio de 2026]	[28 de Julio de 2026]	[03 de Agosto de 2026]
[Hito 1: solicitud inicial y revision de documentos para consulta previa]	[Hito 2: solicitud de documentos y shapefile del Proyecto por parte de Mininterior]	[Hito 3: entrega de documentos y Shapefile del proyecto	[Hito 4: Aprobación de Solicitud por parte de Ministerio del Interior	[Hito 5: Resolucion STC-1016 DEL 28 DE JULIO DE PROCEDENCIA DE CONSULTA PREVIA	[Hito 6: inicio de trámite de consulta previa	[Hito 7: Convocatoria a reunión de Consulta Previa en etapa de Coordinación y Preparación

1. A partir de la formulación del proyecto en el año 2025, se realizó una primera solicitud de trámite

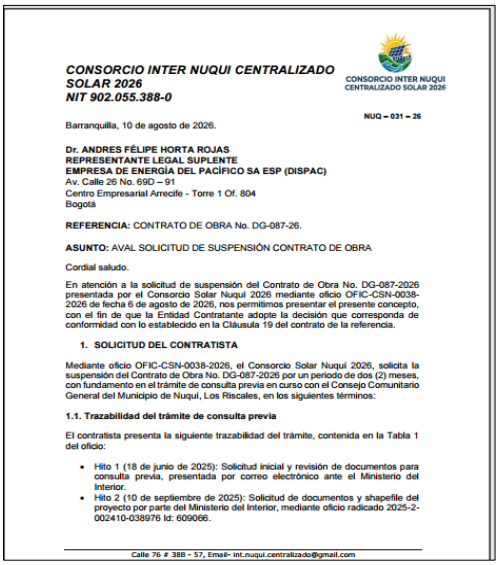

CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
NIT 902.055.388-0

CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026

NUQ – 031 – 26

Barranquilla, 10 de agosto de 2026.

Dr. ANDRES FÉLIPE HORTA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO SA ESP (DISPAC)
Av. Calle 26 No. 69D – 91
Centro Empresarial Arrecife - Torre 1 Of. 804
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. DG-087-26.

ASUNTO: AVAL SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA

Cordial saludo.

En atención a la solicitud de suspensión del Contrato de Obra No. DG-087-2026 presentada por el Consorcio Solar Nuquí 2026 mediante oficio OFIC-CSN-0038-2026 de fecha 6 de agosto de 2026, nos permitimos presentar el presente concepto, con el fin de que la Entidad Contratante adopte la decisión que corresponda de conformidad con lo establecido en la Cláusula 19 del contrato de la referencia.

1. **SOLICITUD DEL CONTRATISTA**


Mediante oficio OFIC-CSN-0038-2026, el Consorcio Solar Nuquí 2026, solicita la suspensión del Contrato de Obra No. DG-087-2026 por un periodo de dos (2) meses, con fundamento en el trámite de consulta previa en curso con el Consejo Comunitario General del Municipio de Nuquí, Los Riscales, en los siguientes términos:

1.1. Trazabilidad del trámite de consulta previa

El contratista presenta la siguiente trazabilidad del trámite, contenida en la Tabla 1 del oficio:

- **Hito 1 (18 de junio de 2025): Solicitud inicial y revisión de documentos para consulta previa, presentada por correo electrónico ante el Ministerio del Interior.**
- **Hito 2 (10 de septiembre de 2025): Solicitud de documentos y shapefile del proyecto por parte del Ministerio del Interior, mediante oficio radicado 2025-2-002410-038976 Id: 609066.**

Calle 76 # 38B - 57, Email- int.nuqui.centralizado@gmail.com

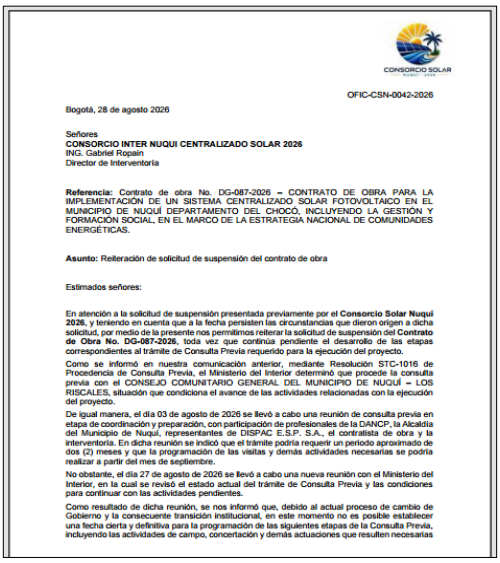

CONSORCIO SOLAR

OFIC-CSN-0042-2026

Bogotá, 28 de agosto 2026

Señores
CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
ING. Gabriel Ropain
Director de Interventoría

Referencia: Contrato de obra No. DG-087-2026 – CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

Asunto: Reiteración de solicitud de suspensión del contrato de obra

Estimados señores:

En atención a la solicitud de suspensión presentada previamente por el **Consorcio Solar Nuquí 2026,** y teniendo en cuenta que a la fecha persisten las circunstancias que dieron origen a dicha solicitud, por medio de la presente nos permitimos reiterar la solicitud de suspensión del **Contrato de Obra No. DG-087-2026**, toda vez que continúa pendiente el desarrollo de las etapas correspondientes al trámite de Consulta Previa requerido para la ejecución del proyecto.

Como se informó en nuestra comunicación anterior, mediante Resolución STC-1016 de Procedencia de Consulta Previa, el Ministerio del Interior determinó que procede la consulta previa con el CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE NUQUÍ – LOS RISCALES, situación que condiciona el avance de las actividades relacionadas con la ejecución del proyecto.

De igual manera, el día 03 de agosto de 2026 se llevó a cabo una reunión de consulta previa en etapa de coordinación y preparación, con participación de profesionales de la DANCP, la Alcaldía del Municipio de Nuquí, representantes de DISPAC E.S.P. S.A., el contratista de obra y la interventoría. En dicha reunión se indicó que el trámite podría requerir un periodo aproximado de dos (2) meses y que la programación de las visitas y demás actividades necesarias se podría realizar a partir del mes de septiembre.

No obstante, el día 27 de agosto de 2026 se llevó a cabo una nueva reunión con el Ministerio del Interior, en la cual se revisó el estado actual del trámite de Consulta Previa y las condiciones para continuar con las actividades pendientes.

Como resultado de dicha reunión, se nos informó que, debido al actual proceso de cambio de Gobierno y la consecuente transición institucional, en este momento no es posible establecer una fecha cierta y definitiva para la programación de las siguientes etapas de la Consulta Previa, incluyendo las actividades de campo, concertación y demás actuaciones que resulten necesarias



CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026
NIT 902.055.388-0

CONSORCIO INTER NUQUI CENTRALIZADO SOLAR 2026

NUQ – 035 – 26

Barranquilla, 28 de agosto de 2026.
Dr. ANDRES FÉLIPE HORTA ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO SA ESP (DISPAC)
Av. Calle 26 No. 69D – 91
Centro Empresarial Arrecife - Torre 1 Of. 804
Bogotá

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. DG-087-26.

ASUNTO: REMISIÓN Y CONCEPTO SOBRE REITERACIÓN DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA – OFICIO OFIC-CSN-0042-2026

Cordial saludo,

En atención a la comunicación OFIC-CSN-0042-2026 del 28 de agosto de 2026, mediante la cual el Consorcio Solar Nuquí 2026 reitera la solicitud de suspensión del Contrato de Obra No. DG-087-2026, nos permitimos remitir el oficio en mención, con el fin de que esta Entidad Contratante cuente con la información actualizada y el concepto correspondiente de esta Interventoría.

1. **ANTECEDENTES**

Mediante oficio NUQ-031-26 del 10 de agosto de 2026, esta Interventoría avaló la solicitud inicial de suspensión presentada por el contratista de obra (OFIC-CSN-0038-2026), al verificar que las circunstancias asociadas al trámite de consulta previa con el Consejo Comunitario General del Municipio de Nuquí, Los Riscales, se enmarcaban dentro de lo previsto en el Parágrafo Segundo y el Parágrafo Tercero de la Cláusula 21 (circunstancias imprevisibles e irresistibles) del Contrato DG-087-2026, con base en la trazabilidad aportada hasta la reunión de Coordinación y Preparación del 3 de agosto de 2026.

Mediante OFIC-CSN-0042-2026, el contratista informa que, con posterioridad a dicha reunión, el 27 de agosto de 2026 se realizó una nueva sesión con el Ministerio del Interior, en la cual se indicó que, debido al proceso de cambio de Gobierno y a la consecuente transición institucional, no es posible en este momento establecer una fecha cierta y definitiva para la programación de las siguientes etapas de la consulta previa (actividades de campo, concertación y demás actuaciones necesarias para culminar el trámite).

Calle 76 # 38B - 57, Email- int.nuqui.centralizado@gmail.com
Barranquilla - Atlántico
Pág. 1

Respuesta a la solicitud de precisión del sustento jurídico


En atención a la solicitud realizada, la suspensión obedece a la necesidad de permitir el desarrollo de las etapas administrativas de ***coordinación y preparación, concertación y adopción de acuerdos****, conforme al procedimiento de Consulta Previa adelantado ante la* ***Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa – DANCP****, cuyo desarrollo resulta ajeno al control y voluntad del contratista y condiciona la ejecución de las actividades de obra que puedan afectar el ámbito territorial del sujeto colectivo involucrado.*

Por lo anterior, solicitamos que la solicitud de suspensión del Contrato de Obra DG-087 de 2026 sea entendida y formalizada con fundamento en la ***procedencia de la Consulta Previa frente al Consejo Comunitario General del Municipio de Nuquí – Los Riscales****, y no frente a comunidades indígenas, manteniéndose como causa de la suspensión la necesidad de culminar el trámite administrativo correspondiente antes de continuar con las actividades contractuales que puedan verse afectadas por dicho procedimiento.*

Esta actividad es externa al contratista conforme a lo normado en el convenio 169/89 de la OIT, ley 21 de 1991 y directiva presidencial 08 de 2000, por lo tanto, las actividades estructurales del proyecto no se pueden desarrollar hasta tanto se surta la consulta previa.

7.2 Información de estado de obra posterior a catástrofe del día 10 de agosto de 2026.

El 20 de agosto de 2026 mediante oficio OFIC-CSN-0041-2026 el Consorcio Solar Nuquí 2026 informa a las aseguradoras **SEGUROS DEL ESTADO y SEGUROS MUNDIAL** que el Contrato de obra No. DG-087-2026 PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS – contrato en ejecución; no presenta afectaciones al personal, maquinaria, herramientas ni infraestructura, por cual no se ve afectado el correcto desarrollo de las diferentes actividades del contrato.

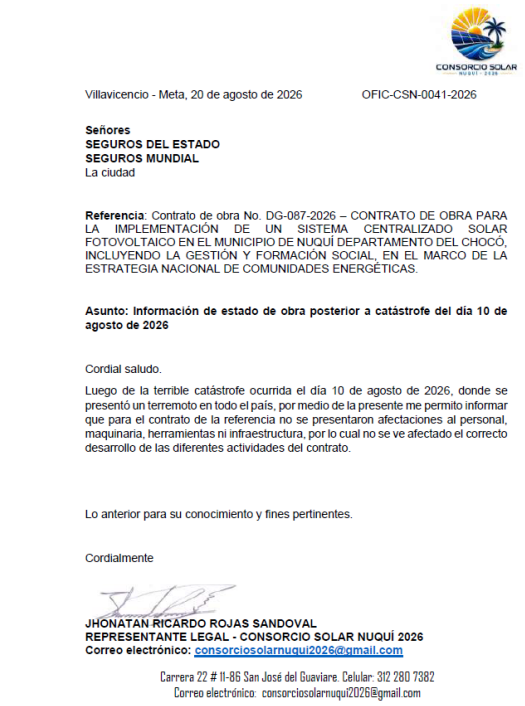

Villavicencio - Meta, 20 de agosto de 2026 OFIC-CSN-0041-2026

Señores
SEGUROS DEL ESTADO
SEGUROS MUNDIAL
La ciudad

Referencia: Contrato de obra No. DG-087-2026 – CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

Asunto: Información de estado de obra posterior a catástrofe del día 10 de agosto de 2026

Cordial saludo.

Luego de la terrible catástrofe ocurrida el día 10 de agosto de 2026, donde se presentó un terremoto en todo el país, por medio de la presente me permito informar que para el contrato de la referencia no se presentaron afectaciones al personal, maquinaria, herramientas ni infraestructura, por lo cual no se ve afectado el correcto desarrollo de las diferentes actividades del contrato.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente

JHONATAN RICARDO ROJAS SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026
Correo electrónico: consorciosolarnuqui2026@gmail.com

Carrera 22 # 11-86 San José del Guaviare. Celular: 312 280 7382
Correo electrónico: consorciosolarnuqui2026@gmail.com




7.3 Solicitud de autorización para para la extracción y utilización de material de arena para el relleno y adecuación del área del parque solar.

Mediante oficio OFIC-CSN-0040-2026 del día 19 de agosto de 2026 el Consorcio Solar Nuquí 2026 realizo la *Solicitud de autorización para la extracción y utilización de material de arena para el relleno y adecuación del área del Parque Solar,* ante el señor **RUBEN PRADO ASPRILLA** alcalde del municipio de Nuquí; La solicitud pide a la Administración Municipal:

- Evaluar y autorizar la extracción del material.
- Indicar el sitio autorizado para su aprovechamiento.
- Señalar las condiciones técnicas, ambientales y administrativas aplicables.
- Precisar los trámites o requisitos adicionales necesarios conforme a la normatividad vigente.

El solicitante se compromete a ejecutar las actividades de extracción, cargue, transporte y disposición del material bajo criterios de responsabilidad ambiental y seguridad, atendiendo las recomendaciones de las autoridades competentes. Se queda a la espera de la respuesta e instrucciones de la Alcaldía para proceder.

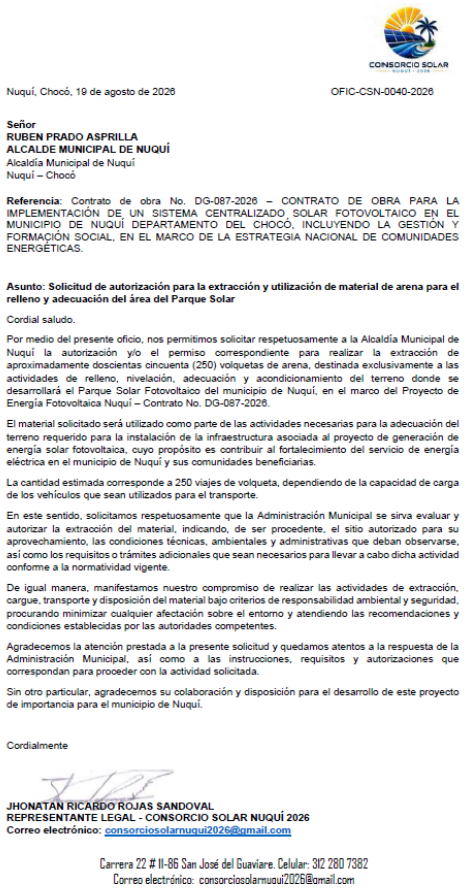

Nuquí, Chocó, 19 de agosto de 2026 OFIC-CSN-0040-2026

Señor
RUBEN PRADO ASPRILLA
ALCALDE MUNICIPAL DE NUQUÍ
Alcaldía Municipal de Nuquí
Nuquí – Chocó

Referencia: Contrato de obra No. DG-087-2026 – CONTRATO DE OBRA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA CENTRALIZADO SOLAR FOTOVOLTAICO EN EL MUNICIPIO DE NUQUÍ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ, INCLUYENDO LA GESTIÓN Y FORMACIÓN SOCIAL, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE COMUNIDADES ENERGÉTICAS.

Asunto: Solicitud de autorización para la extracción y utilización de material de arena para el relleno y adecuación del área del Parque Solar

Cordial saludo.

Por medio del presente oficio, nos permitimos solicitar respetuosamente a la Alcaldía Municipal de Nuquí la autorización y/o el permiso correspondiente para realizar la extracción de aproximadamente doscientas cincuenta (250) volquetas de arena, destinada exclusivamente a las actividades de relleno, nivelación, adecuación y acondicionamiento del terreno donde se desarrollará el Parque Solar Fotovoltaico del municipio de Nuquí, en el marco del Proyecto de Energía Fotovoltaica Nuquí – Contrato No. DG-087-2026.

El material solicitado será utilizado como parte de las actividades necesarias para la adecuación del terreno requerido para la instalación de la infraestructura asociada al proyecto de generación de energía solar fotovoltaica, cuyo propósito es contribuir al fortalecimiento del servicio de energía eléctrica en el municipio de Nuquí y sus comunidades beneficiarias.

La cantidad estimada corresponde a 250 viajes de volqueta, dependiendo de la capacidad de carga de los vehículos que sean utilizados para el transporte.

En este sentido, solicitamos respetuosamente que la Administración Municipal se sirva evaluar y autorizar la extracción del material, indicando, de ser procedente, el sitio autorizado para su aprovechamiento, las condiciones técnicas, ambientales y administrativas que deban observarse, así como los requisitos o trámites adicionales que sean necesarios para llevar a cabo dicha actividad conforme a la normatividad vigente.

De igual manera, manifestamos nuestro compromiso de realizar las actividades de extracción, cargue, transporte y disposición del material bajo criterios de responsabilidad ambiental y seguridad, procurando minimizar cualquier afectación sobre el entorno y atendiendo las recomendaciones y condiciones establecidas por las autoridades competentes.

Agradecemos la atención prestada a la presente solicitud y quedamos atentos a la respuesta de la Administración Municipal, así como a las instrucciones, requisitos y autorizaciones que correspondan para proceder con la actividad solicitada.

Sin otro particular, agradecemos su colaboración y disposición para el desarrollo de este proyecto de importancia para el municipio de Nuquí.

Cordialmente

JHONATAN RICARDO ROJAS SANDOVAL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO SOLAR NUQUÍ 2026
Correo electrónico: consorciosolarnuqui2026@gmail.com

Carrera 22 # 11-86 San José del Guaviare. Celular: 312 280 7382
Correo electrónico: consorciosolarnuqui2026@gmail.com

8. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

En el presente informe de obra se remite el informe de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por los profesionales en Salud Ocupacional Carlos Alberto Rodríguez Ayala, Juan Carlos García Carrillo y Maritza Johanna Bello Torres, correspondiente al periodo de tiempo comprendido entre el 01 de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2026.

Ver Anexo 5. *Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo No. 04 – agosto 2026*

Link Drive:

https://drive.google.com/drive/folders/1kVZ3iYc7eBfcypgZ0mZ63k1VFZGYY9Xo?usp=drive_link

9. INFORME AMBIENTAL

En el presente informe de obra se remite informe Socio Ambiental, elaborado por la profesional Marlen Yadira Cetre Perea, correspondiente al periodo de tiempo comprendido entre el 01 de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2026.

Ver Anexo 6. *Informe Ambiental No. 04 – agosto 2026*

Link Drive:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x5xpz_L6exSp9RnQ_x-cW563k-HlrIqH

10. INFORME SOCIAL

En el presente informe de obra se remite informe Social, elaborado por las profesionales Betsy Yolanda Valencia Mosquera y Madelen Asprilla Pretelt, correspondiente al periodo de tiempo comprendido entre el 01 de agosto de 2026 al 31 de agosto de 2026.

Ver Anexo 7. *Informe Social No. 04 – agosto 2026*

Link Drive: https://1drv.ms/f/c/e936fae6667abf2b/IgAdX8Rl-U_sRotCYX-LHgblAXp7xl1L5jbvEF6xb1su2B4?e=4ousHz

11. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES.

Durante el periodo correspondiente del 01 al 31 de agosto de 2026 se avanzó en las actividades de Desbroce, excavación, relleno y compactación, Transferencia tecnológica y capacitación en energías renovables/solar fotovoltaica, Permisos ambientales y medidas de compensación.

En términos de ejecución física, se obtuvo un avance acumulado de **2.43540%.**

Se constató el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad social integral del equipo de trabajo técnico – operativo y administrativo.

Se demuestra la correcta implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, así como de los protocolos de bioseguridad.

Para el periodo informado, la curva S del proyecto muestra una ejecucion acumulada a agosto de 2026 del 2,44%, es decir -1,38% por debajo de lo programado.

Con respecto a este retraso, el Consorcio Solar Nuquí 2026 presento el dia 5 de agosto de 2026 mediante oficio OFIC-CSN-0035-2026 Solicitud de suspensión contrato de obra por motivo de:

- Que **no procede** la consulta previa con Comunidades Indígenas.
- Que **PROCEDE** la consulta previa con el **CONSEJO COMUNITARIO GENERAL DEL MUNICIPIO DE NUQUI – LOS RISCALES.**
- Que **no procede** la consulta previa con Comunidades Rom.

El dia 6 de agosto de 2026 mediante oficio OFIC-CSN-0038-2026 se envio Aclaraciones a Solicitud de suspensión contrato de obra – respuesta a oficio NUQ – 030 – 26 enviado por interventoria.

El dia 10 de agosto de 2026 mediante oficio NUQ – 031 – 26, la interventoria Consorcio Inter Nuqui Centralizado Solar 2026 remite a la Empresa De Energía Del Pacífico SA ESP (DISPAC) el AVAL SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA.

El dia 28 de agosto de 2026 mediante oficio OFIC-CSN-0042-2026 el Consorcio Solar Nuquí 2026 presento Reiteración de solicitud de suspensión del contrato de obra.

Este mismo dia 28 de agosto de 2026 la interventoria Consorcio Inter Nuqui Centralizado Solar 2026 mediante oficio NUQ – 035 – 26 remite a la Empresa De Energía Del Pacífico

SA ESP (DISPAC) la remisión y concepto sobre reiteración de solicitud de suspensión del contrato de obra.

El avance mensual correspondiente a **agosto de 2026** para el presente contrato corresponde a una ejecución de **CIENTO TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 133.914.906,00**), para un porcentaje de avance mensual de **0,18259%**.

El avance acumulado para el presente contrato corresponde a una ejecución de **MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($ 1.786.139.706,00**), para un porcentaje de cumplimiento acumulado del **2.43540%.**

JHONATAN RICARDO ROJAS SANDOVAL
Representante Legal
Consorcio Solar Nuquí 2026

VER ANEXO 1.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL AGOSTO 2026

VER ANEXO 2.
ACTAS DE COMITÉ AGOSTO 2026

VER ANEXO 3.
CRONOGRAMA DE OBRA Y FLUJO DE FONDOS

VER ANEXO 4.
ACTA DE AVANCE DE OBRA AGOSTO 2026

VER ANEXO 5.
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NO. 04 – AGOSTO 2026

VER ANEXO 6.
INFORME AMBIENTAL No. 04 – AGOSTO 2026

VER ANEXO 7.
INFORME DE SOCIAL No. 04 – AGOSTO 2026
