PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y SISTEMAS
NIT 802.023.429-4

PROINGES

CUND-025-26

Barranquilla, 11 de Septiembre de 2026.

Señores
SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE DE CUNDINAMARCA
Calle 26 No 51-53, Sede Administrativa - Torre Central Piso 7
Bogotá, Cundinamarca.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. SEMS-CD-CI-060-2025 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA - SECRETARÍA DE ENERGÍAS Y MINERÍA SOSTENIBLE Y GENSA S.A. E.S.P.

ASUNTO: REMISIÓN DE INFORME SEMANAL DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA No. SEMS-CD-CI-060-2025.

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes para remitir informe semanal de seguimiento al contrato de obra No. SEMS-CD-CI-060-2025. Se destaca lo siguiente:

- El proyecto presenta un avance del 59 % ejecutado frente al 79 % programado.
- Durante el periodo no se registraron avances significativos respecto al informe anterior, priorizándose la adquisición y transporte de equipos mayores.
- Se mantiene la contingencia logística asociada a los equipos importados, implementándose como medida de mitigación la adquisición de equipos disponibles en el mercado nacional.
- La Interventoría continúa realizando seguimiento al suministro, ensamble de gabinetes y cumplimiento del cronograma.

Atentamente,

JAMES MARTINEZ G.
PROINGES S.A.S.
Representante Legal

INFORME DE INTERVENTORÍA

PROINGES

INFORME SEMANAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA
No. SEMS-CM-CI-051-2025

11/09/2026

Cundinamarca

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 4
2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 4
3. DIAGNÓSTICO Y ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN 6
3.1. RESUMEN EJECUTIVO 6
3.2. SUMINISTRO DE EQUIPOS 7
3.2.1. IMPORTACIÓN Y NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS 7
3.2.2. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NACIONALES 10
3.3. ESTADO DE HITOS Y FECHAS DE CUMPLIMIENTO 11
3.4. REPORTE DE ATRASOS Y DIFICULTADES 12
4. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA 13
4.1. AVANCE ACUMULADO HASTA LA FECHA 13
5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MITIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS 14
5.1. MEDIDAS IMPLEMENTADAS 14
5.2. FECHAS DE EJECUCIÓN PREVISTAS 15
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 16
7. REFERENCIAS Y ANEXOS 16

Lista de tablas

Tabla 1. Análisis ejecutivo _____6
Tabla 2. Resumen de estado de importación de equipos _____10
Tabla 4. Fechas estimadas para la importación de equipos _____12

Lista de figuras

Figura 1. Controlador EPEVER referencia TES6415 7
Figura 2. Batería EPEVER referencia LFP3.84KWH25.6V-P65L2-Colombia de 150Ah 8
Figura 3. Inversor EPEVER referencia NP1000-21 8
Figura 4. Estado de seguimiento de cargo.....9

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito exponer el estado actual del proceso de importación y nacionalización de los equipos requeridos para la implementación de las Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales (SSFVI) correspondientes al Contrato Interadministrativo No. SEMS-CD-CI-060-2025, así como analizar las afectaciones generadas sobre la programación contractual, los hitos de ejecución y las actividades asociadas a la puesta en servicio de las soluciones energéticas previstas para los municipios de Yacopí y Medina, departamento de Cundinamarca.

Durante el desarrollo del proyecto se han presentado situaciones asociadas a la fabricación, logística internacional y transporte de los equipos principales del sistema, particularmente controladores, inversores y baterías, circunstancias que han impactado los tiempos inicialmente previstos para su disponibilidad en territorio nacional. Lo anterior ha generado una afectación sobre actividades que dependen directamente de dichos componentes, tales como el ensamble final de los sistemas, las pruebas de energización, la puesta en marcha, la capacitación de usuarios y la entrega definitiva de las soluciones.

En atención a esta situación, el presente documento recopila el estado actualizado de los equipos en proceso de importación, las fechas estimadas para la culminación de los trámites logísticos y aduaneros, el análisis de las afectaciones sobre la ruta crítica del proyecto, las medidas de mitigación implementadas por el Contratista y el seguimiento efectuado por la Interventoría, con el fin de suministrar a la Secretaría de Energías y Minería Sostenible de Cundinamarca elementos técnicos que permitan evaluar el estado real de ejecución del Contrato y las acciones requeridas para garantizar el cumplimiento de su objeto.

2. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO No.	SEMS-CD-CI-060-2025
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
VALOR	DOS MIL CIENTO QUINCE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.115.035.564), incluido IVA y además costos directos, indirectos y todos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO	7 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos De perfeccionamiento y ejecución.
OBJETO	AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA A TRAVÉS DE INSTALACIÓN DE SOLUCIONES FOTOVOLTAICAS INDIVIDUALES EN ZONAS NO INTERCONECTADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Cesar Felipe Díaz Sarmiento

FECHA DEL CONTRATO	24 de noviembre de 2025
FECHA INICIO	4 de diciembre del 2025
FECHA DE TERMINACION	3 de julio del 2026
AVANCE PORCENTUAL DE VALIDACIÓN DE USUARIO (%)	100%
CANTIDAD DE USUARIOS REPLANTEADOS & VALIDADOS	64
AVANCE PORCENTUAL DE ENERGIZADOS (%)	1,56%
CANTIDADES DE UNIDADES INSTALADAS Y ENERGIZADAS	1
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA DE INSTALACIÓN	-
Contratista	GENSA S.A E.S.P.
NIT	NIT. 800.194.208 - 9
Representante Legal	Henry William Cruz Casas
Dirección del Contratista	Carrera 23 No. 64B-33, Edificio Centro de Negocios Siglo XXI, Torre GENSA.
Valor inicial del contrato	$ 2.115.035.564, incluido IVA
Interventor	PROINGES SAS
NIT	802.023.429 - 4
Representante legal	JAMES MARTINEZ GALLEGO
Dirección del interventor	Calle 76 No 38b – 57 - BARRANQUILLA
Director de interventoría	GABRIEL EDUARDO ROPAÍN SEGURA
Valor inicial del contrato	$ 452.571.280, incluido IVA
Contrato	SEMS-CM-CI-051-2025
Anticipo	-

Prórrogas del contrato	
No. de prórroga	Plazo
01	Sesenta (60) días hasta el 01/09/2026

Adiciones del contrato	
No. de adición	Valor
-	-

Modificación contractual	
No. de otrosí	Cláusula y descripción

-	-
Estado actual del contrato	ACTA DE INICIO SUSCRITA
Sanciones impuestas con anterioridad	
Causal	Acto administrativo
-	-
Garantías del contrato	
Clase de garantía y No.	Amparo y descripción
Cumplimiento de Entidad Estatal 42-44-101165360	- Cumplimiento del Contrato - Buen Manejo del Anticipo - Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones - Estabilidad de la Obra - Calidad de los Bienes Suministrados
Respons. Civil Extracontractual 42-40-101051177	- Responsabilidad Civil Extracontractual
Identificación de la compañía de seguros	
Nombre	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT	860.009.578-6

Tabla 1. Análisis ejecutivo

3. DIAGNÓSTICO Y ESTADO ACTUAL DE EJECUCIÓN

3.1. RESUMEN EJECUTIVO

La contingencia logística que actualmente afecta la disponibilidad de los controladores, inversores y baterías del proyecto se originó desde la etapa de fabricación y suministro de los equipos. Previamente, el día 6 de enero de 2026, el contratista de obra remitió a la Interventoría las fichas técnicas de los equipos propuestos para la ejecución del proyecto. Como resultado de la revisión técnica efectuada, la Interventoría emitió observaciones y no conformidades relacionadas con información incompleta y aspectos técnicos que requerían aclaración.

Posteriormente, el 15 de enero de 2026, GENSA S.A. E.S.P. presentó la información complementaria requerida, atendiendo las observaciones formuladas. Una vez verificado el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de los requisitos establecidos en el Contrato y sus documentos anexos, la Interventoría emitió el oficio CUND-004-26 mediante el cual otorgó el aval a los equipos y a las fichas técnicas presentadas, habilitando así el inicio de las gestiones de adquisición correspondientes.

La orden de compra de los equipos fue emitida el 26 de febrero de 2026; sin embargo, el fabricante Huizhou Epever Technology Co., Ltd. Reportó cese de actividades por la celebración del Año Nuevo Chino, situación que incidió en el inicio de los procesos productivos y en la posterior reactivación de la cadena de suministro.

Adicionalmente, el fabricante reportó retrasos en la adquisición de materias primas e insumos requeridos para la fabricación de los reguladores, inversores y baterías, circunstancia que extendió los tiempos de producción y pruebas de funcionamiento hasta el 18 de mayo de 2026.

Una vez finalizada la fabricación de los equipos, se dio inicio a los procesos de logística internacional requeridos para su transporte hacia Colombia. Durante esta etapa se presentaron situaciones asociadas a la coordinación del embarque y transporte de la mercancía, las cuales generaron ajustes en las fechas inicialmente previstas para su arribo al país.

Como resultado de lo anterior, se ha presentado una afectación en el cronograma de suministro de los equipos principales del proyecto, circunstancia que impacta directamente la ejecución de las actividades de instalación, energización, puesta en servicio, capacitación de usuarios y entrega final de los Sistemas Solares Fotovoltaicos Individuales (SSFVI).

3.2. SUMINISTRO DE EQUIPOS

3.2.1. IMPORTACIÓN Y NACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS

Los siguientes equipos se encuentran en tránsito marítimo desde el puerto de Shekou, República Popular China, con destino al puerto de Buenaventura, República de Colombia:

- 64 controladores de carga – referencia: TES6415.



Figura 1. Controlador EPEVER referencia TES6415

- 64 baterías de ion litio LiFePO4 – referencia: LFP3.84KWH25.6V-P65L2-Colombia.



Figura 2. Batería EPEVER referencia LFP3.84KWH25.6V-P65L2-Colombia de 150Ah

- 64 inversores de onda pura de baja frecuencia – referencia: NP1000-21.



Figura 3. Inversor EPEVER referencia NP1000-21

De acuerdo con la información reportada por la naviera, el buque CMA CGM BALI arribó al puerto de Lázaro Cárdenas (México) el 10 de agosto de 2026. Posteriormente, el contenedor CMAU2059131 fue transbordado al buque CMA CGM GREENLAND, cuya salida se encontraba programada para el 15 de agosto de 2026, con arribo estimado al puerto de Buenaventura el 18 de agosto de 2026.


No obstante, conforme a la información suministrada por el contratista de obra y verificada por la interventoría, la embarcación no efectuó su recalada en el puerto de Buenaventura debido a una falla técnica presentada en su motor principal, situación que obligó a modificar el itinerario inicialmente previsto. Según la comunicación recibida por parte de la operación de la nave, las reparaciones requeridas serán ejecutadas en Chile, razón por la cual el cronograma de navegación fue ajustado (Ver Anexo No. 01).

Como consecuencia de esta novedad, la carga con destino a Buenaventura permanecerá a bordo de la embarcación mientras se adelantan las actividades de reparación correspondientes. Actualmente, se estima que la nave podrá retomar su itinerario y efectuar la descarga de la mercancía en el puerto de Buenaventura el próximo 14 de septiembre de 2026, fecha que permanece sujeta a la culminación satisfactoria de las reparaciones y a las condiciones operativas existentes al momento de la reanudación de la ruta.

Adicionalmente, durante comunicación verbal entre el contratista de obra y la interventoría el día 21 de agosto de 2026, el contratista informó que se encuentra adelantando gestiones para la adquisición de equipos disponibles en el mercado nacional, con el propósito de mitigar los impactos derivados de los retrasos en la

importación y garantizar el cumplimiento de los tiempos de suministro e instalación establecidos en el cronograma contractual. La interventoría realizará seguimiento permanente a dichas gestiones y verificará la disponibilidad, especificaciones técnicas y oportunidad de entrega de los equipos que eventualmente sean adquiridos en el país, con el fin de evaluar su contribución al cumplimiento de las metas programadas del proyecto

A continuación, se adjunta imagen del seguimiento satelital al buque con corte al 11 de agosto de 2026 (Ver Anexo No. 01):

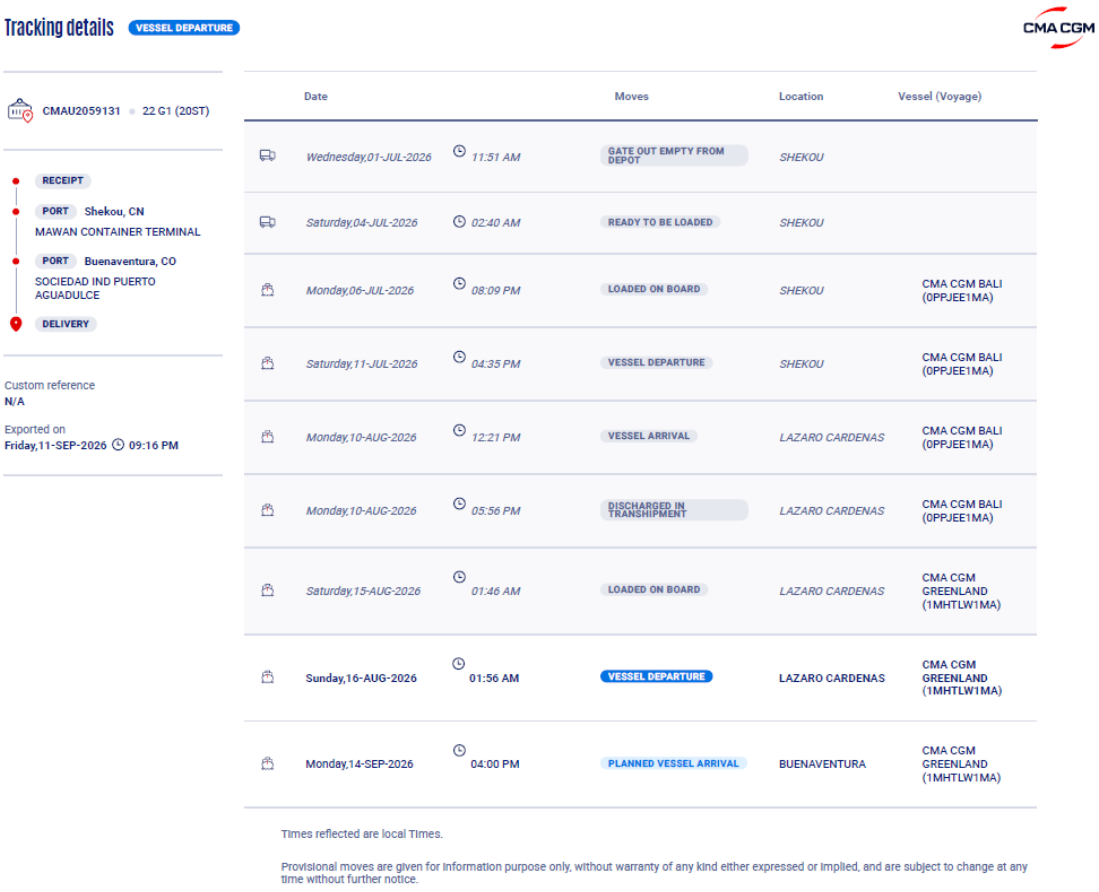

Tracking details VESSEL DEPARTURE

CMA CGM

CMAU2059131 · 22 G1 (20ST)

RECEIPT

PORT Shekou, CN
MAWAN CONTAINER TERMINAL

PORT Buenaventura, CO
SOCIEDAD IND PUERTO AGUADULCE

DELIVERY

Custom reference
N/A

Exported on
Friday,11-SEP-2026 09:16 PM

Date	Moves	Location	Vessel (Voyage)
Wednesday,01-JUL-2026 11:51 AM	GATE OUT EMPTY FROM DEPOT	SHEKOU	
Saturday,04-JUL-2026 02:40 AM	READY TO BE LOADED	SHEKOU	
Monday,06-JUL-2026 08:09 PM	LOADED ON BOARD	SHEKOU	CMA CGM BALI (0PPJEE1MA)
Saturday,11-JUL-2026 04:35 PM	VESSEL DEPARTURE	SHEKOU	CMA CGM BALI (0PPJEE1MA)
Monday,10-AUG-2026 12:21 PM	VESSEL ARRIVAL	LAZARO CARDENAS	CMA CGM BALI (0PPJEE1MA)
Monday,10-AUG-2026 05:56 PM	DISCHARGED IN TRANSHIPMENT	LAZARO CARDENAS	CMA CGM BALI (0PPJEE1MA)
Saturday,15-AUG-2026 01:46 AM	LOADED ON BOARD	LAZARO CARDENAS	CMA CGM GREENLAND (1MHTLW1MA)
Sunday,16-AUG-2026 01:56 AM	VESSEL DEPARTURE	LAZARO CARDENAS	CMA CGM GREENLAND (1MHTLW1MA)
Monday,14-SEP-2026 04:00 PM	PLANNED VESSEL ARRIVAL	BUENAVENTURA	CMA CGM GREENLAND (1MHTLW1MA)

Times reflected are local Times.

Provisional moves are given for information purpose only, without warranty of any kind either expressed or implied, and are subject to change at any time without further notice.

Figura 4. Estado de seguimiento de cargo

La mercancía se encuentra actualmente en proceso de importación bajo la modalidad de Operador de Transporte Multimodal (OTM), y su nacionalización se realizará una vez arribe al territorio nacional. Como resultado del ajuste en los tiempos de transporte derivado de la falla técnica presentada en el motor principal de la embarcación, la fecha estimada de arribo de la carga a territorio nacional fue reprogramada para el día 14 de septiembre de 2026, lo que genera una afectación directa sobre las actividades logísticas y de suministro previstas dentro del cronograma del proyecto.

Equipo	Controladores de carga – referencia: TES6415. Baterías de ion litio LiFePO4 – referencia: LFP3.84KWH25.6V-P65L2-Colombia. Inversor de onda pura de baja frecuencia – referencia: NP1000-21.
Entidad responsable	CARGOLOG INTERNACIONAL SAS
Fecha estimada de arribo	14 de septiembre de 2026
Estado	En tránsito marítimo.
Observaciones	CMA CGM informó que la motonave CMA CGM GRENLAND, con arribo inicialmente previsto para el 18 de agosto de 2026 en el puerto de Buenaventura, Colombia, omitió su recalada en Buenaventura debido a una falla técnica presentada en el motor principal de la embarcación.

Tabla 2. Resumen de estado de importación de equipos

3.2.2. TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE EQUIPOS NACIONALES

Adicionalmente, a la fecha se dispone del 100% de los paneles solares, los cuales se encuentran en proceso de transporte, entrega e instalación para los usuarios aprobados. Durante el mes de julio se culminó la intervención inicial a los usuarios del municipio de Yacopí, el 3 de agosto de 2026 se inició el despliego de materiales hacia Medina.

A continuación, a corte del 11 de septiembre de 2026 se tiene el siguiente reporte por parte de obra.

- Hincado de postes:

Municipio	Material	Transporte	Instalación
Yacopí	18	8	8
Medina	46	21	21
Total	64	29	29

Tabla 3. Hincado de postes en Yacopí y Medina

- Instalación de paneles:

Municipio	Material	Transporte	Instalación
Yacopí	18	14	8
Medina	46	21	21
Total	64	35	29

Tabla 4. Instalación de paneles en Yacopí y Medina

- Excavación de zanja e instalación de acometida principal:

Municipio	Material	Transporte	Instalación
Yacopí	18	18	12
Medina	46	46	21
Total	64	64	33

Tabla 5. Excavación de zanja e instalación de acomedida principal en Yacopí y Medina

- Acometida parcial eléctrica:

Municipio	Material	Transporte	Instalación
Yacopí	18	12	12
Medina	46	21	21
Total	64	33	33

Tabla 6. Acometida parcial en Yacopí y Medina

- Sistema de puesta a tierra (SPT):

Municipio	Material	Transporte	Instalación
Yacopí	18	18	12
Medina	46	21	21
Total	64	39	33

Tabla 7. Sistema de puesta a tierra en Yacopí y Medina

- Redes internas:

Municipio	Material	Transporte	Instalación
Yacopí	18	18	18
Medina	46	21	21
Total	64	39	39

Tabla 8. Instalación de redes internas en Yacopí y Medina

- Gabinete y equipos mayores:

Municipio	Material	Transporte	Instalación
Yacopí	1	1	1
Medina	6	6	0
Total	7	7	1

Tabla 9. Suministro e instalación de gabinete en Yacopí y Medina

Ver Anexo No. 02, en el cual se presenta el avance completo de las actividades ejecutadas.

3.3. ESTADO DE HITOS Y FECHAS DE CUMPLIMIENTO

En reunión virtual realizada el 21 de agosto de 2026, el contratista de obra se comprometió a adelantar las gestiones necesarias para la adquisición de los equipos a nivel nacional, con el propósito de mitigar los efectos del retraso en el transporte marítimo y evitar afectaciones en las fechas de entrega establecidas en el cronograma del proyecto. La Interventoría realizará seguimiento al cumplimiento de este compromiso. La Interventoría realizará seguimiento al cumplimiento de este compromiso y verificará la disponibilidad, especificaciones técnicas y oportunidad de suministro de los equipos que eventualmente sean adquiridos en el país.

A continuación, se presentan los principales hitos y fechas establecidas de cumplimiento asociados al proceso de importación, nacionalización, transporte, suministro y disponibilidad de los equipos mayores requeridos para la ejecución del proyecto y su estado actual:

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA ESTIMADA	ESTADO
1	Adquisición de 25 kits solares en mercado local	Contratista de obra	A partir de 07/09/2026	En proceso
2	Salida del buque desde puerto Lorenzo Cárdenas hacia puerto Buenaventura	Naviera y Puerto	15/08/2026	Cumplido
3	Llegada del buque al puerto Buenaventura	Naviera	18/08/2026	Atrasado
4	Trámites de nacionalización de equipos importados	Naviera y Puerto	17/09/2026	Atrasado
5	Retiro y cargue de la mercancía	Importador	18/09/2026	Atrasado
6	Ensamble de gabinetes con equipos importados	Contratista de obra	27/09/2026	A tiempo
7	Transporte e instalación de gabinetes a usuarios	Contratista de obra	17/10/2026	A tiempo

Tabla 10. Fechas estimadas para la importación de equipos

Cabe recalcar que el contratista ya se encuentra ejecutando las actividades de obras civiles. De acuerdo con la programación presentada, se tiene como fecha estimada para la finalización de la totalidad de las cimentaciones, redes internas e hincado de postes el día 18 de septiembre de 2026.

3.4. REPORTE DE ATRASOS Y DIFICULTADES

A continuación, se describen los atrasos y dificultades presentados hasta la fecha, los cuales han impactado el desarrollo normal de las actividades y el cumplimiento de la programación establecida:

1. La orden de compra de los equipos fue establecida el 26 de febrero del 2026, sin embargo, el fabricante, Huizhou Epever Technology Co., Ltd., se encontraba en período vacacional considerando la celebración del Año Nuevo Chino del 2026, el cual inició el 16 de febrero del 2026 y finalizó el 4 de marzo del 2026.

2. De acuerdo con lo informado por el fabricante, se registraron retrasos en la adquisición de los insumos requeridos para la fabricación de los reguladores, inversores y baterías, debido a las festividades mencionadas y a la posterior reactivación de la cadena de suministro. Consecuentemente, la compañía Huizhou Epever Technology Co., Ltd. finalizó la fabricación y los ensayos de funcionamiento el 18 de mayo del 2026.

3. Una vez finalizada la fabricación, el agente de carga inició la gestión para reservar el espacio en potenciales buques considerando que la mercancía incluía el manejo de baterías de ion litio, categorizadas en la Clase 9 como mercancía peligrosa por el Código IMDG (International Maritime Dangeruors Goods Code). Durante la gestión de la reserva, se

notificó por parte de la Naviera el rechazo en 2 oportunidades de la reserva solicitada, impactando directamente en el embarque la mercancía. Sin embargo, la naviera CMA CGM S.A. autorizó el embargue del contenedor en el buque CMA CGM BALI (IMO 9867827), el cual zarpó el 6 de julio del 2026 desde el puerto de Shekou (China), y se encuentra en tránsito hacia Colombia.

4. El día 10 de junio de 2026 se presentó un evento sísmico en el occidente del territorio colombiano, situación que generó afectaciones en la operación de infraestructura logística y portuaria. Como consecuencia de este hecho, se recibió comunicación emitida por APM Terminals informando el cese temporal de actividades en sus instalaciones mientras se adelantaban las evaluaciones técnicas y de seguridad correspondientes.

5. Posteriormente, mediante comunicado del 12 de agosto de 2026, APM Terminals informó la reactivación gradual de las operaciones portuarias, indicando que se autorizaría el retiro de los contenedores ubicados en aquellos módulos que cumplieran con las condiciones de seguridad requeridas para su manipulación y movilización.

6. Se presentó una contingencia en el proceso de transporte marítimo de los equipos importados debido a la omisión de recalada del buque CMA CGM GREENLAND en el puerto de Buenaventura, situación informada por la naviera y que ocasionó la modificación del itinerario inicialmente previsto para el contenedor CMAU2059131. Como consecuencia de lo anterior, la fecha estimada de arribo de la carga al territorio nacional fue reprogramada para el 14 de septiembre de 2026.

La Interventoría realizó seguimiento al estado del transporte marítimo y verificó la información suministrada por el contratista y la naviera respecto de la novedad presentada en el buque CMA CGM GREENLAND.

4. SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA

De acuerdo con la Solicitud de Prórroga presentada por GENSA S.A. E.S.P. mediante radicado 2026-IE-00001752 del 14 de agosto de 2026, se propone una modificación al cronograma de actividades del proyecto. Dicha modificación se sustenta en la necesidad de realizar una nueva focalización de beneficiarios, los retrasos presentados en la fabricación e importación de los equipos principales, las dificultades logísticas asociadas al transporte marítimo de mercancía clasificada como peligrosa, los ajustes en la fecha estimada de arribo de los equipos al país y las afectaciones derivadas del evento sísmico ocurrido el 10 de agosto de 2026, las cuales impactaron la operación portuaria, la movilidad de carga y los procesos de nacionalización y transporte requeridos para la ejecución del proyecto.

Teniendo en cuenta el cronograma actualizado presentado por el contratista, no se evidencian atrasos en la ejecución del proyecto a la fecha de corte del presente informe. Se adjunta cronograma actualizado en el Anexo No. 03.

4.1. AVANCE ACUMULADO HASTA LA FECHA

Con base en las actividades ejecutadas con corte a la fecha del presente informe, se mantuvo un avance general acumulado del 60 %, frente a un avance programado del 79 %, manteniéndose la desviación respecto de la programación establecida en el cronograma avalado por la Interventoría. Durante el periodo no se evidenciaron avances significativos frente al informe anterior, debido a que las actividades adelantadas estuvieron principalmente relacionadas con la adquisición y transporte de equipos mayores para el ensamble de gabinetes, sin que se evidenciara avance en las obras de campo. No obstante, a la fecha no se presentan actividades con fechas vencidas.

Por otra parte, de acuerdo con la metodología de medición y seguimiento del avance físico definida por el Contratista y validada por la Interventoría, el avance físico acumulado de las actividades ejecutadas corresponde al 37,25 % a la fecha de corte (Ver Anexo No. 02).

5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE MITIGACIÓN Y ACCIONES CORRECTIVAS

5.1. MEDIDAS IMPLEMENTADAS

A continuación, se relacionan las acciones relevantes que están siendo implementadas por el contratista de obra para el cumplimiento del alcance contractual:

- Inicio de actividades de obra en las viviendas aprobadas en el municipio de Yacopí, las cuales incluyen:
  - Suministro, transporte e instalación de estructura de soporte de paneles solares.
  - Suministro, transporte e instalación de módulos solares fotovoltaicos.
  - Ejecución de zanja para acometida principal.
  - Suministro, transporte e instalación de acometida principal eléctrica subterránea.
  - Suministro, transporte e instalación de acometida parcial hasta el tablero de distribución.
  - Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra.
  - Suministro, transporte e instalación de instalación interna en AC.

Durante el período comprendido entre el 25 y el 31 de agosto de 2026, se adelantaron obras civiles y actividades de instalaciones internas en el municipio de Medina.

- Suministro e instalación de equipos mayores:

Respecto de las actividades asociadas al suministro e instalación de los equipos importados, se presentó una contingencia derivada de la omisión de recalada de la motonave en el puerto de Buenaventura, situación informada por la naviera

CMA CGM y que generó la modificación de la fecha estimada de arribo del contenedor CMAU2059131, pasando del 18 de agosto de 2026 al 14 de septiembre de 2026.

Con el fin de mitigar los posibles impactos sobre la ejecución del proyecto y mantener el cumplimiento de los hitos establecidos en el cronograma aprobado, el CONSORCIO SOLAR ZNI CUNDINAMARCA remitió a la Interventoría el oficio CSZC-023-2026, mediante el cual informó la novedad presentada, expuso las gestiones adelantadas ante la naviera y propuso un plan de contingencia orientado a garantizar la continuidad de las actividades en campo.

Dentro de las medidas planteadas, el Contratista manifestó su intención de adquirir en el mercado nacional veinticinco (25) inversores y reguladores de carga requeridos para la energización de los sistemas fotovoltaicos. Lo anterior con el propósito de adelantar las actividades de energización, puesta en marcha y capacitación de usuarios, sin afectar el presupuesto contractual ni los compromisos de ejecución establecidos.

Adicionalmente, el Contratista se comprometió a continuar de manera ininterrumpida con las actividades de suministro e instalación de estructuras de soporte, módulos fotovoltaicos, acometidas eléctricas, sistemas de puesta a tierra e instalaciones internas en las viviendas intervenidas, así como a iniciar la instalación de gabinetes, controladores de carga, inversores, baterías y demás componentes del sistema dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la aprobación de los equipos propuestos por parte de la Interventoría.

El oficio CSZC-023-2026 fue acompañado de las fichas técnicas de los equipos propuestos para adquisición local y de los soportes relacionados con la contingencia presentada. Una vez revisada la documentación técnica allegada y verificado el cumplimiento de las especificaciones requeridas para el proyecto, la Interventoría emitió concepto favorable mediante oficio CUND-023-26, otorgando aval técnico para la adquisición de los equipos propuestos en el mercado nacional como medida de mitigación frente al retraso en la importación.

5.2. FECHAS DE EJECUCIÓN PREVISTAS

Teniendo en cuenta lo mencionado y lo expresado por el contratista de obra, se prevén los siguientes hitos:

- 7 de septiembre de 2026: adquisición y transporte de equipos mayores provenientes del mercado local.
- 9 de septiembre de 2026: inicio estimado de energizaciones en Medina.

- 14 de septiembre de 2026: arribo de equipos importados a puerto de Buenaventura.

La Interventoría se encuentra realizando seguimiento a las gestiones adelantadas por el contratista para la adquisición de equipos en el mercado nacional y al proceso de ensamble de gabinetes, con el propósito de actualizar las fechas de ejecución previstas en el cronograma del proyecto.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Estado general del proyecto: El proyecto mantiene un avance general acumulado del 59 %, frente al 79 % programado, con una desviación respecto al cronograma avalado por la Interventoría. No obstante, no se registran actividades con fechas vencidas a la fecha de corte.

Ejecución del periodo: No se evidenciaron avances significativos frente al informe anterior, debido a que las actividades se concentraron en la adquisición y transporte de equipos mayores para el ensamble de gabinetes, sin evidenciarse avance de obras en campo durante el periodo.

Suministro de equipos: Persiste la contingencia asociada al transporte marítimo de controladores, inversores y baterías, cuya llegada a Buenaventura se encuentra reprogramada para el 14 de septiembre de 2026. Como medida de mitigación, se adelantó la adquisición de equipos en el mercado nacional.

Acciones de mitigación: La Interventoría otorgó aval técnico para la adquisición de 25 inversores y reguladores de carga en el mercado nacional, como medida orientada a reducir los impactos derivados del retraso en la importación.

Seguimiento: La Interventoría continuará verificando la disponibilidad y suministro de los equipos, el ensamble de gabinetes y el cumplimiento de los hitos establecidos, especialmente el inicio de energizaciones previsto para el 9 de septiembre de 2026. No obstante, no se reportaron energizaciones a fecha del 11 de septiembre de 2026.

7. REFERENCIAS Y ANEXOS

ANEXO 1: DOCUMENTOS DE IMPORTACIÓN Y SEGUIMIENTO.
ANEXO 2: FORMATO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES.
ANEXO 3: CRONOGRAMA.

Atentamente,

James Martinez G
Representante Legal

Proinges SAS
