CONTRATO DE OBRA No 2024-3649

REALIZAR LAS ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

ZONA TRES

INFORME MENSUAL No 20


CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL

SEPTIEMBRE 2026

CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
DISEÑÓ Y APROBÓ	David Ferreira	Director De Proyecto MSc. Gerencia de proyectos	
REALIZÓ	Daniel Ferreira	Ing Residente	

INTERVENTORÍA CONSORCIO DIPROY

ESTADO DE REVISIÓN	NOMBRE	CARGO	FIRMA
APROBÓ	Ing. Jorge Enrique Agudelo	Director de interventoría	
APROBÓ	Ing. Julian Camilo Mora	Residente de interventoría	

MODIFICACIONES		
V1	26-10-2026	Atención observaciones

Contenido

1. INTRODUCCIÓN 6
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA 7
3. PERIODO DE REPORTE 9
4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN) ... 10
5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO 12
6. REGISTRO FOTOGRÁFICO 16
7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO 31
8. ASPECTOS TÉCNICOS 34
9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES 36
10. PLAN DE CALIDAD 37
11. PROTOCOLO DE MANEJOS Y RESIDUOS 38
12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES 39
13. REPORTE ESTADISTICO 40
14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS 42
15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN 43
16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN . 54
17. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA 55
17.1 PERSONAL 55
17.2 CUADRILLAS 55
17.3 EQUIPO 56
17.3.1 MAQUINARIA 56
17.3.2 VEHICULOS 57
18 VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE 58
19 VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES. 59
20 FACTOR SOCIAL 60

21 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE 61

21.1 GESTIÓN SST 61
21.2 GESTIÓN AMBIENTAL 61
21.2.1 GESTIÓN DOCUMENTAL 61
21.2.2 MANEJO AMBIENTAL ZONAS DE INTERVENCION 61
21.2.3 ATMOSFERA 63
21.2.4 PAISAJE 63
21.2.5 TRAFICO VEHICULAR 63
21.2.6 CAPACITACIONES 64
21.2.7 PROTECCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS 64
21.2.8 PROTECCION DE SUMIDEROS 64
21.2.9 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 64
- ORGÁNICOS, APROVECHABLES, NO APROVECHABLES 64
- PELIGROSOS 65
- RCD 66

CONTROL DE EMISIONES 66
21.2.10 REPORTE DE LLUVIAS 67

22 PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES 68

23 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS 69

24 PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO 70

25 CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS 71

26 LISTADO DE PROVEEDORES 72

27 ESTADO PRESUPUESTAL 73

28 FACTORES DE SELECCIÓN 80

29 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 82

30 ANEXOS 83

Tabla 1 Datos generales del Contrato 7
Tabla 2 Localidades con UPZ 8
Tabla 3 Listado de Pólizas 10
Tabla 4 Estado avance del contrato 12
Tabla 5 Plan de manejo de tránsito 31
Tabla 6 Ejecución por localidades 40
Tabla 7 Suministro entregado 43

Tabla 8 Resumen planillas Cuenta 20 73
Tabla 9 Balance presupuestal a cuenta 20 76
Tabla 10 Valor ejecutado cuenta 20 76

Ilustración 1 Localización Zona 3 8
Ilustración 2 Precipitación mensual (Fontibón) 34
Ilustración 3 Precipitación mensual (Engativá) 35

1. INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de dar atención integral a la ciudad de Bogotá D.C. en temas de seguridad vial, la Secretaría Distrital de Movilidad ha dispuesto adelantar este proceso licitatorio con el cual se desarrollarán actividades de suministro e implementación de señalización vertical, horizontal y otros elementos de seguridad vial.

Las actividades inherentes al proceso de señalización y seguridad vial para este proceso, corresponden a las contempladas en el Manual de señalización vial - "Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia 2015", adoptado mediante la Resolución 1885 de 2015, sin embargo, por actualización de la norma, se realizará transición al Manual de Señalización Vial de Colombia. Dispositivos uniformes en la infraestructura vial para la regulación del tránsito y la seguridad vial adoptado por la resolución 20243040045005 del 17 de septiembre de 2024, la cual fue publicada en el portal del Ministerio de Trabajo el 1 de octubre de 2024, ello de acuerdo con las condiciones establecidas en el Artículo 3 de la misma resolución del Ministerio de Transporte.

Para la planeación de la ejecución de las actividades objeto de este proceso contractual, la Secretaría Distrital de Movilidad ha considerado disponer la ciudad en siete (7) zonas, cada zona está integrada por grupos de localidades.
Para la disposición de las zonas, la Secretaría Distrital de Movilidad, ha utilizado un modelo de priorización en el que se evalúan parámetros como: requerimientos de señalización por parte de la comunidad, histórico de Intervenciones, accidentalidad y estado de la malla vial. Las actividades de demarcación y señalización objeto de este proceso serán realizadas en el Distrito Capital, sobre las áreas integrantes de los perfiles viales peatonal y vehicular constitutivos del Espacio Público Asociado a la Infraestructura de Transporte.

La SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD abrió la Licitación Pública número SDM-LP-95-2024 con el fin de contratar "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C" ZONA 3.

Mediante Resolución No 329884 DE 2024 la Entidad dio apertura al proceso de Contratación SDM-LP-95-2024, y mediante Resolución No. 757351 del diez (10) de Diciembre de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al **CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL** Zona 3, identificado con el NIT 901.898.430-6.

El 27 de Diciembre de 2024, se firmó el Contrato de Obra No 2024-3649 por un valor de **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE(18.771.473.428).** El 03 de febrero de 2025 se suscribió el acta de inicio, en donde se constata el cumplimiento de los aspectos necesarios para la suscripción y perfeccionamiento del documento contractual.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

Los datos generales del contrato se muestran en la siguiente tabla.

Tabla 1 Datos generales del Contrato

Contrato de obra:	2024-3649
Contratante	SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ
Contratista	CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL
Objeto:	REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
Zona:	ZONA 3
Localidades:	FONTIBON Y ENGATIVA Y EN LOS CORREDORES DE LA AV BOYACÁ (ENTRE RIO FUCHA Y CANAL SALITRE), AV EL DORADO (ENTRE KR 103 Y KR 68), AV CIUDAD DE CALI (ENTRE CANAL RIO FUCHA Y HASTA CANAL SALITRE), AV CALLE 80 (ENTRE RIO BOGOTA Y CARRERA 68), AV CALLE 13 (ENTRE RIO BOGOTÁ Y CARRERA 137)
Valor Inicial:	$ 18.771.473.428
Adición 1:	$1.276.983.847
Valor Total:	$ 20.048.457.275
Duración:	34 MESES
Fecha Acta de inicio:	3 DE FEBRERO DE 2025

Fuente: elaboración propia

2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará en la ciudad de Bogotá D.C., y se concentra en la Zona 3 , conformada por las localidades 9. Fontibón, 10 Engativá; también se ejecutarán actividades en los corredores prioritarios de la Av. Ciudad de Cali, Av. Calle 13, Av. el Dorado, Av. calle 80 y Av. Boyacá como se muestra en la siguiente figura:

Ilustración 1 Localización Zona 3



Estas localidades se encuentran conformadas por las siguientes Unidades de Planificación Zonal UPZ:

Tabla 2 Localidades con UPZ

9. Fontibón	10. Engativá
75. Fontibón Centro 76. San Pablo 77. Zona Franca 110. Ciudad Salitre Occidental 112. Granjas de Techo 114. Modelia 115. Capellanía 117. Aeropuerto 82. Patio Bonito	26. Las Ferias 29. Minuto de Dios 30. Boyacá Real 31. Santa Cecilia 72. Bolivia 73. Garcés Navas 74. Engativá 105. Jardín Botánico 116. Álamos

3. PERIODO DE REPORTE

Este informe presenta el detalle de las actividades de señalización horizontal, señalización vertical e Instalación de dispositivos de tránsito y/o elementos canalizadores del tráfico, realizadas por el Consorcio Movilidad Integral en el **VIGÉSIMO (20) MES** en cumplimiento del Contrato SDM-2024-3649, para el periodo del 03 de septiembre de 2026 al 02 de octubre de 2026.

4. ESTADO DE LAS PÓLIZAS DEL CONTRATO (VIGENTE/EN ACTUALIZACIÓN)

Una vez firmado el contrato de Obra No. SDM 2024-3649 (del 27 de diciembre de 2024), entre el Consorcio Movilidad Integral y la SDM, se remitieron las pólizas emitidas por parte de la compañía de seguros Solidaria de Colombia a la Entidad, conforme las exigencias establecidas en el contrato, las cuales fueron objeto de revisión y aprobación por parte de la SDM.

El día 15 de diciembre de 2025 se realiza la adición 1 al Contrato de obra por un valor de $1.276.983.847.

La ejecución de este contrato está amparada por las siguientes pólizas (las cuales se presentan en el **Anexo 1.** Pólizas) que cubren los respectivos riesgos, y se actualizaron con:

Tabla 3 Listado de Pólizas

REFERENCIA	POLIZA	NUMERO	AMPARO	VIGENCIA		SUMA ASEGURADA
				DESDE	HASTA	
FIRMA CONTRATO	CUMPLIMIENTO	11-44-101245335	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27/12/2024	30/04/2028	$ 5.631.442.029,00
			PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	27/12/2024	30/10/2030	$ 3.754.294.686,00
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	30/10/2027	30/04/2028	$ 5.631.442.029,00
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/10/2027	30/10/2032	$ 5.631.442.029,00
	RCE	11-40-101072827	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	27/12/2024	30/10/2027	$ 938.573.672,00
ACTA INICIO	CUMPLIMIENTO	11-44-101245335	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3/02/2025	7/06/2028	$ 5.631.442.029,00
			PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	3/02/2025	7/12/2030	$ 3.754.294.686,00
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	7/12/2027	7/06/2028	$ 5.631.442.029,00
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	7/12/2027	7/12/2032	$ 5.631.442.029,00
	RCE	11-40-101072827	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3/02/2025	7/12/2027	$ 938.573.672,00
ADICIÓN 1	CUMPLIMIENTO	11-44-101245335	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	3/02/2025	7/06/2028	$ 6.014.537182,50
			PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E	3/02/2025	7/12/2030	$ 4.009.691.455,00

			INDEMNIZACIONES LABORALES			
			CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	7/12/2027	7/06/2028	$ 6.014.537182,50
			ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	7/12/2027	7/12/2032	$ 6.014.537182,50
	RCE	11-40-101072827	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3/02/2025	7/12/2027	$ 1.002.422,863,75

Fuente: Elaboración propia

5. ESTADO DE AVANCE DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta los Identificadores de Diseño (ID) asignados, en la siguiente tabla se expone el estado de los diseños entregados para implementación:

Tabla 4 Estado avance del contrato

ID	Localidad	Inspección	Estado	Tipo de implementación
MV_09_189_1556_10_V12	Fontibon	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_AV_CALI_941_09_T1_V34	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_AV_CALI_941_09_T2_V33	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_AV_CALI_941_09_T3_V36	Fontibon	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_AV_BOYACA_941_09_T2_V35	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	Fontibon	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_AV_CALLE_80_1238_24_V0	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_AC26_643_24_V0	Fontibon	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
EX_10_001_872_24_V0	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_003_1560_10_V4	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_004_1560_10_V5	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
EX_10_064_1560_10_V3	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_352_1236_11_V6	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_353_1236_11_V6	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_374_1842_12_V4	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
MV_10_010_1747_10_V10	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_12_281_941_09 (CP)	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
EX_10_355_1236_11	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
EX_10_039_1560_10	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_115_1560_10	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_375_1842_12	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_007_1560_10	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_008_1560_10	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_363_1842_12	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical

ID	Localidad	Inspección	Estado	Tipo de implementación
MV_10_011	Engativa	No	Finalizado	Horizontal y vertical
EX_10_107_1560_10	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_360_1236_11	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_002_872_24	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_371_1842_12	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_340_1236_11	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_356_1236_11	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
EX_10_123_1789_10	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
MV_10_055_1789_10	Engativa	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
BC_10_001_754_19	Engativa	ok	En ejecución	Horizontal y vertical
EX_09_035_1556_10	Fontibon	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
EX_10_003_1560_10_CP (245)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_374_1842_12_CP (316-774)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_039_1560_10_CP (330)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_355_1236_11_CP (310-965)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_001_872_24_CP (2-221-342-348-820)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
MV_AV_BOYACA_941_09_T2_CP (260-921)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_002_872_24_CP (350)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_064_1560_10_CP (349)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_352_1236_11_CP (775)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_353_1236_11_CP (303-333-356-732)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
MV_AV_CALI_941_09_T3_CP (893)	Fontibon	ok	Finalizado	Vertical
MV_10_011_CP (340)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_004_1560_10_CP (769)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_115_1560_10_CP (346-1019)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_375_1842_12_CP (335-357)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_107_1560_10_CP (1043)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_371_1842_12_CP (363-724-812)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_008_1560_10_CP (685)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_377_1842_12_CP	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_09_005_872_24 (1113)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
SH_SV_URB_RESERVA_67_2017	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
EX_10_007_872_24	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_09_189_1556_10	Fontibon	ok	Finalizado	Horizontal y vertical

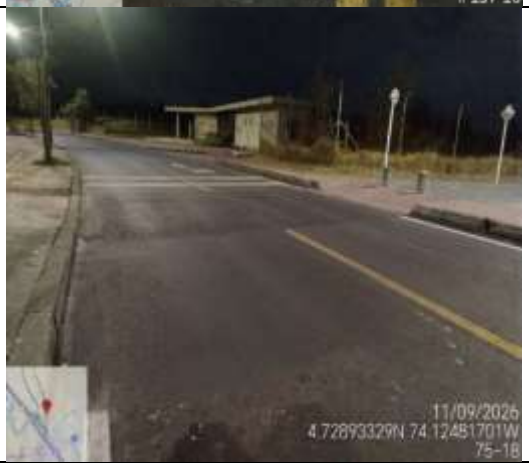
ID	Localidad	Inspección	Estado	Tipo de implementación
MV_09_048_1556_10_26	Fontibon	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_09_024_1249_11	Fontibon	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
DEI-013/CAM-01 AV CL 80 - CR 102 (E-O)	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
DEI-013/CAM-02 AV CL 80 - CR 102 (O-E)	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
CP 1184 camaras CL 52Bis x AV. Boyaca y CP AV Boyaca x CL52	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
CP_EX_10_110_1560_10	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
DEI-020-CAM-01 (CR 86 con CL 76)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
DEI-020-CAM-02 (CR 86 con CL 75A)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
DEI-023-CAM-01(Boyaca con CL 24C N-S)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
DEI-023-CAM-02 (Boyaca con CL 24C S-N)	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
CP AK 72 x CL 63D - Sentido S-N	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
CP 1165 EX_09_221_1881_12	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
CP 1165 MV_09_424_947_10	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
SH_SV_ZPP_2470_2021_CAPELLANIA_V0,	Fontibón	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
SH_SV_ZPP_2470_2021_HAYUELOS_V0,	Fontibón	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V0	Fontibón	ok	En ejecución	Horizontal y vertical
MV_09_424_947_10	Fontibón	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
CP - 2152 MV_12_281_941_09	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
CP - 2124 MV_09_001_872_10	Fontibón	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
SH_SV_ZPP_2470_2021_EXITO_MODELIA_V0	Fontibón	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_10_161_1560_10_T2	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
CP-2208 AV Boyaca	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_10_018_092_07	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
MV_AV_CALLE_80_1238_24	Engativa	ok	En ejecución	Horizontal y vertical
EX_10_374_1842_12	Engativa	ok	En ejecución	Horizontal y vertical
EX_10_003_1560_10	Engativa	ok	En ejecución	Horizontal y vertical
EX_10_004_1560_10	Engativa	ok	En ejecución	Horizontal y vertical
BC_10_001_754_19	Engativa	ok	En ejecución	Horizontal y vertical
MV_10_055_1789_10	Engativa	ok	En ejecución	Horizontal y vertical

ID	Localidad	Inspección	Estado	Tipo de implementación
EX_09_001_1214_15_V7 y MV_AC_13_872_24_T2_V0	Fontibón	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
CP 2550 Ciclorruta Plaza Claro	Fontibón	ok	Finalizado	Horizontal
CP 2515 EX_10_355_1236_11_V8	Engativa	ok	Finalizado	Vertical
CP 270	Engativa	ok	Finalizado	Horizontal y vertical
CP 2601	Engativa	ok	Sin iniciar	Horizontal
EX_09_185_1249_11	Fontibón	No	Sin iniciar	Horizontal y vertical
CP-2527	Engativa	ok	Sin iniciar	Horizontal
CP-2764	Engativa	ok	Sin iniciar	Horizontal

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO

6.1 HORIZONTAL

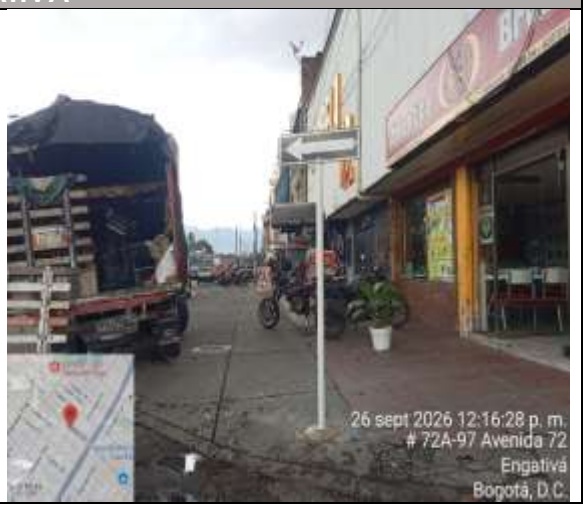
MV_10_161_1560_10 CTA20 ENGATIVÁ	
	

MV_10_018_092_07 ENGATIVÁ	
	
	


martes, 08 septiembre 2026
4°43'44"N 74°7'30"W
Conexión Calle 80 - Lisboa
martes, 08 septiembre 2026
4°43'44"N 74°7'30"W
118.30
BUS
ZONA
lunes, 31 agosto 2026
4°43'42"N 74°7'30"W
Conexión Calle 80 - Lisboa
martes, 08 septiembre 2026
4°43'42"N 74°7'30"W
Conexión Calle 80 - Lisboa

6.2 VERTICAL

BC_10_001_754_19_V3 CICLORRUTA JUAN AMARILLO ENGATIVÁ	
	
	
	
	

CP-270 ENGATIVA	
	

CP-2226 ENGATIVA	
	

CP-2355 FONTIBÓN	
	

CP-2515
FONTIBÓN





















EX_09_001_1214_15 CICLORRUTA EL PORVENIR FONTIBÓN


















EX_10_003_1560_10 CICLORRUTA JUAN AMARILLO ENGATIVA









EX_10_004_1560_V6 CICLORRUTA JUAN AMARILLO ENGATIVA	
	
	
	
	









EX_10_374_1842_12_V5 CICLORRUTA JUAN AMARILLO VERTICAL ENGATIVA













MV_10_018_092_07 (CP-2395)
ENGATIVA













MV_10_055_1789_10_V3 CICLORRUTA JUAN AMARILLO ENGATIVA	
	
	
	
	





MV_AC_13_872_24_T2 CICLORRUTA EL PORVNIR FONTIBÓN

















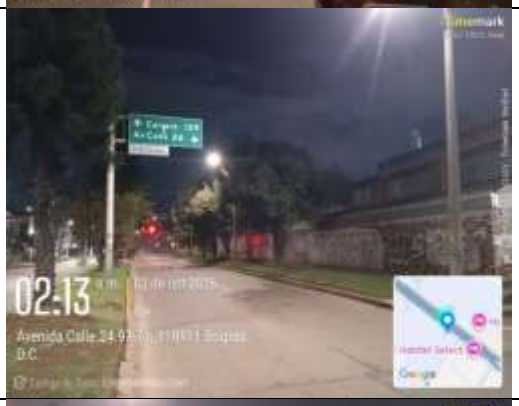

PASACALLES REVERSIBLES AV ESPERAZA FONTIBÓN	
	
	


Timemark
11:36 a.m.
Avenida Calle 24, 110911 Bogotá, D.C.

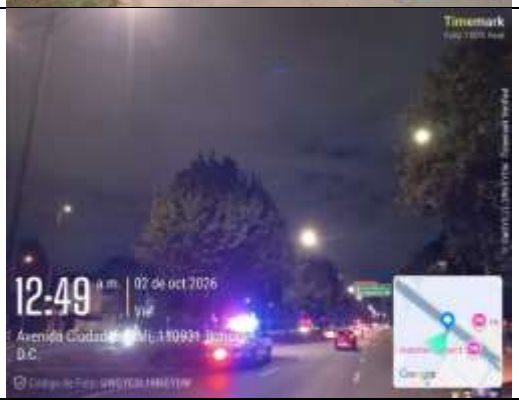

Timemark
12:18 a.m.
03 de oct 2026
54b
Avenida Calle 24, 110911 Bogotá, D.C.


Timemark
10:30 a.m.
Avenida Calle 17 129-11, 110921
Bogotá, D.C.

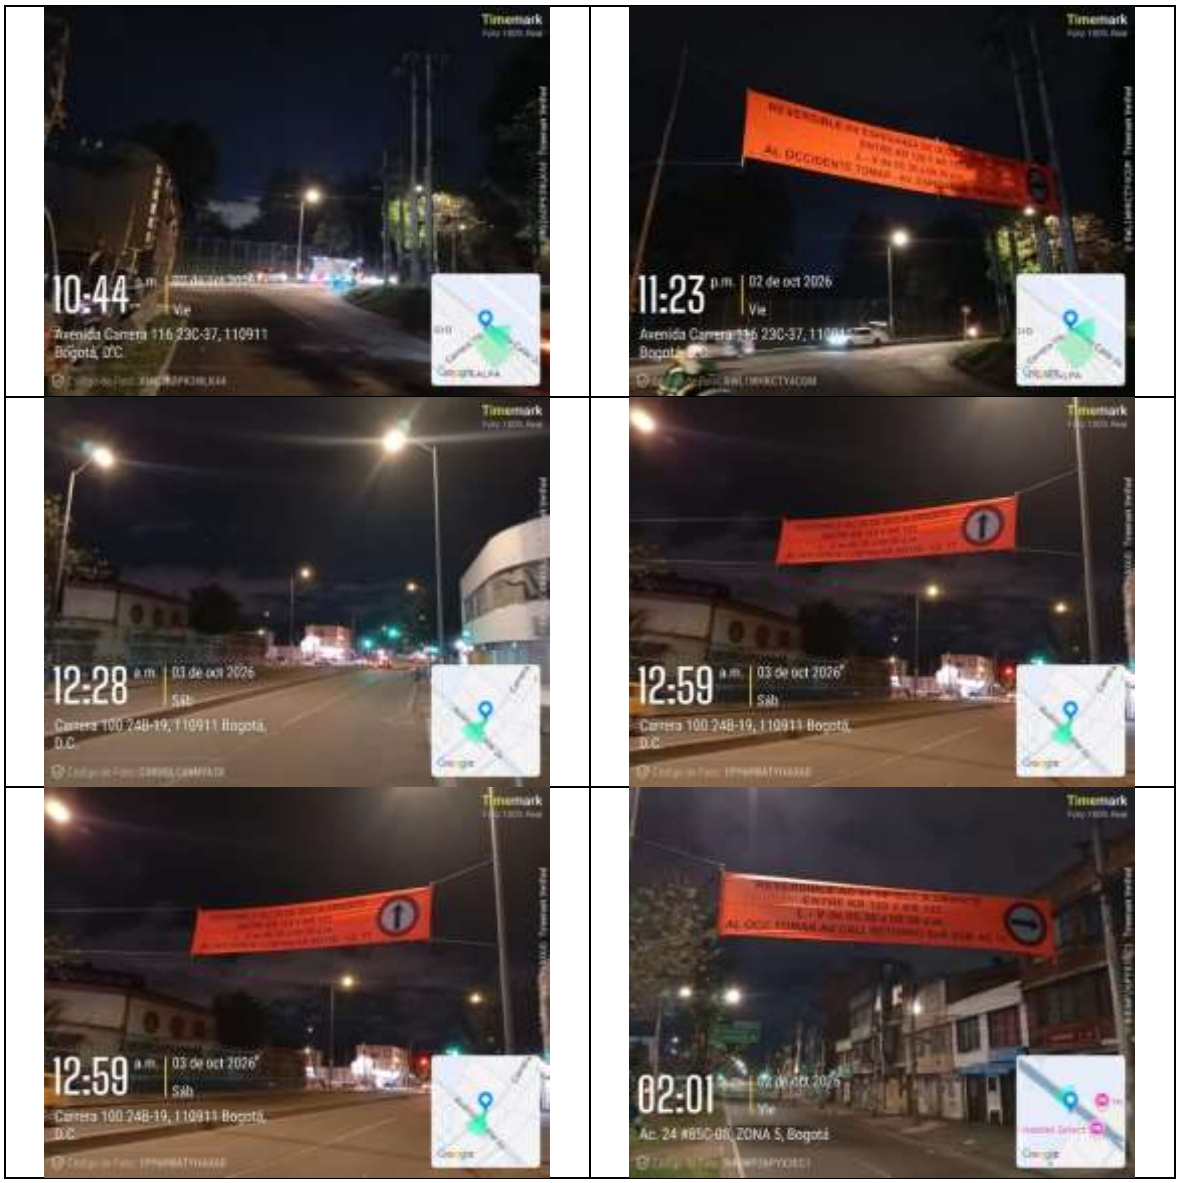

Timemark
11:33 a.m.
Avenida Calle 17 129-11, 110921
Bogotá, D.C.


Timemark
02:13 a.m.


Timemark
02:52 a.m.
02 de oct 2026
Vie


Timemark
12:49 a.m.
02 de oct 2026
Vie


Timemark
01:27 a.m.
02 de oct 2026
Vie
Avenida Ciudad de Cali, 110931 Bogotá, D.C.



6.3 HORIZONTAL

MV_10_018_092_07 ENGATIVA

7. PLANES DE MANEJO DE TRÁNSITO

A continuación, se relaciona la información de los COI solicitados durante la ejecución del Contrato SDM 2024-3649 con corte al 02 de octubre de 2026.

Tabla 5 Plan de manejo de tránsito

ID	Estado PMT	Vigencia inicio	Vigencia fin	COI	Estado de obra
MV_09_189_1556_10_V12	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
MV_AV_CALI_941_09_T1_V34	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
MV_AV_CALI_941_09_T2_V33	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
MV_AV_CALI_941_09_T3_V36	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
MV_AV_BOYACA_941_09_T2_V35	Vigente	16/05/2026	29/10/2026	20	En ejecución
MV_AV_BOYACA_941_09_V40_T3	Vigente	16/05/2026	29/10/2026	20	En ejecución
MV_AV_CALLE_80_1238_24_V0	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
MV_AC26_643_24_V0	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
EX_10_001_872_24_V0	Vigente	28/08/2026	11/02/2027	35	En ejecución
EX_10_003_1560_10_V4	Vigente	28/08/2026	11/02/2027	35	En ejecución
EX_10_004_1560_10_V5	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
EX_10_064_1560_10_V3	Vigente	28/08/2026	11/02/2027	35	En ejecución
EX_10_352_1236_11_V6	Vigente	11/09/2026	11/02/2027	37	En ejecución
EX_10_353_1236_11_V6	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
EX_10_374_1842_12_V4	Vigente	28/08/2026	11/02/2027	35	En ejecución
MV_10_010_1747_10_V10	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
MV_12_281_941_09 (CP)	Vigente	28/08/2026	11/02/2027	35	Finalizado
EX_10_355_1236_11	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
EX_10_039_1560_10	Vigente	11/09/2026	11/02/2027	37	En ejecución
EX_10_115_1560_10	Vigente	28/08/2026	11/02/2027	35	En ejecución
EX_10_375_1842_12	Vigente	28/08/2026	11/02/2027	35	En ejecución
EX_10_007_1560_10	Vigente	28/08/2026	11/02/2027	35	En ejecución
EX_10_008_1560_10	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
EX_10_363_1842_12	Vigente	28/08/2026	11/02/2027	35	En ejecución

ID	Estado PMT	Vigencia inicio	Vigencia fin	COI	Estado de obra
MV_10_011	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
EX_10_107_1560_10	Vigente	28/08/2026	11/02/2027	35	En ejecución
EX_10_360_1236_11	Vigente	11/09/2026	11/02/2027	37	En ejecución
EX_10_002_872_24	Vigente	28/08/2026	11/02/2027	35	En ejecución
EX_10_371_1842_12	Vigente	11/09/2026	11/02/2027	37	En ejecución
EX_10_340_1236_11	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
EX_10_356_1236_11	Vigente	11/09/2026	11/02/2027	37	En ejecución
EX_10_123_1789_10	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
MV_10_055_1789_10	Vigente	11/09/2026	11/02/2027	37	En ejecución
BC_10_001_754_19	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
EX_09_035_1556_10	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
EX_10_377_1842_12_CP	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
EX_10_007_872_24	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
MV_09_189_1556_10	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
MV_09_048_1556_10_26	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
MV_09_024_1249_11	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
CP_EX_10_110_1560_10	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
CP 1165 EX_09_221_1881_12	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
CP 1165 MV_09_424_947_10	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
SH_SV_ZPP_2470_2021_CAPELLANIA_V0,	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
SH_SV_ZPP_2470_2021_HAYUELOS_V0,	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V0	Vigente	31/07/2026	28/01/2027	31	En ejecución
MV_09_424_947_10	Vigente	14/08/2026	11/02/2027	33	En ejecución
CP - 2152 MV_12_281_941_09	Vigente	1/05/2029	29/10/2026	18	En ejecución
SH_SV_ZPP_2470_2021_EXITO_MODELIA_V0	Vigente	22/05/2026	1/10/2026	21	Mal estado
MV_10_161_1560_10_T2	Vigente	22/05/2026	1/10/2026	21	En ejecución
MV_10_018_092_07	Vigente	3/07/2026	31/12/2026	27	En ejecución
EX_09_001_872_24	Vigente	3/07/2026	31/12/2026	27	En ejecución

ID	Estado PMT	Vigencia inicio	Vigencia fin	COI	Estado de obra
CP 2550 Ciclorruta Plaza Claro	Vigente	4/09/2026	12/02/2026	36	En ejecución
EX_09_185_1249_11	En tramite				

En el Anexo 2 se encuentra el encuentra el oficio de aprobación del PMT GENERAL, y los COI aprobados.

8. ASPECTOS TÉCNICOS

8.1 ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se describen por etapas ejecutadas a la fecha:

- Implementación de señalización horizontal de acuerdo a los planos inspeccionados e instalación de dispositivos según diseños.

8.2 INSPECCIONES

A continuación se relacionan los diseños inspeccionados:

ID	TIPO	Localidad	Inspección	Observación
CP 270	CP	Engativa	Finalizada	S. Vertical y S. Horizontal
EX_09_185_1249_11	Normal	Fontibón	Finalizada	S. Vertical y S. Horizontal
CP-2527	CP	Engativa	Finalizada	S. Horizontal
CP-2764	CP	Engativa	Finalizada	S. Horizontal
CP-2601	CP	Engativa	Finalizada	S. Horizontal

8.3 ESTADO DEL CLIMA

A continuación se relacionan las ilustraciones donde se evidencia la precipitación presentada en el mes de septiembre para la localidad de Fontibón es 37.7 mm y de 34.2 mm en la localidad de Engativá.

Ilustración 2 Precipitación mensual (Fontibón)

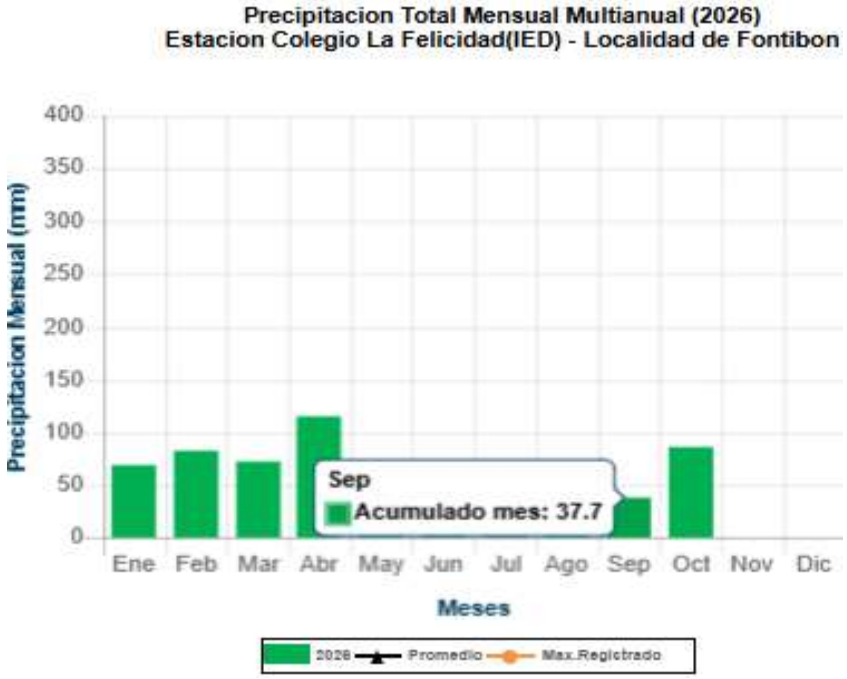
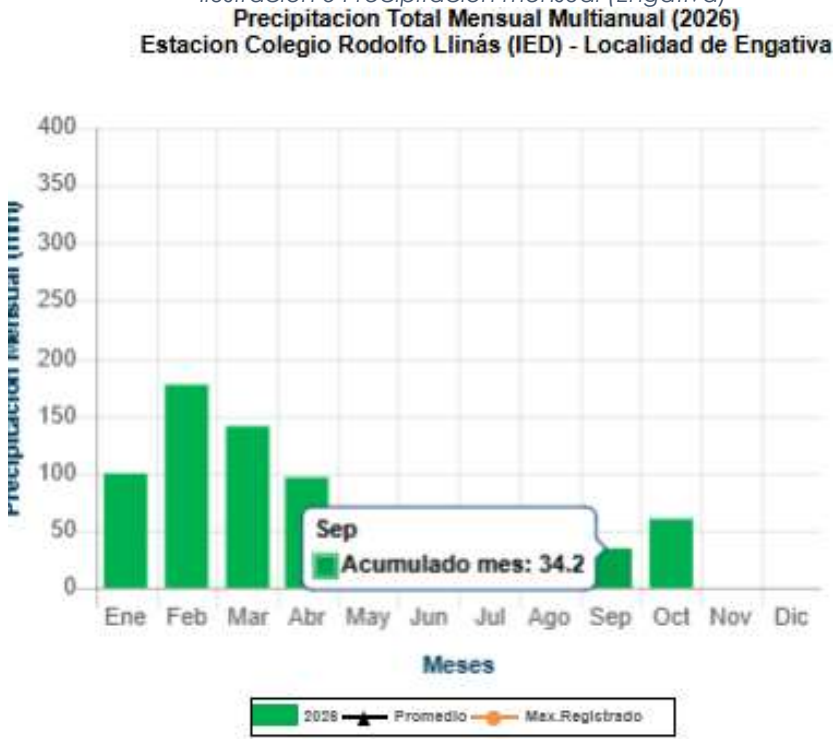


Ilustración 3 Precipitación mensual (Engativá)



8.4 GEOREFERENCIACIÓN

En el Anexo 3 (3.2 Georreferenciación) se encuentra la información actualizada con corte a la fecha a la que hace referencia este informe.

9. ACCIONES REALIZADAS RESPECTO A CRUCE DE INFORMACIÓN SOBRE PROYECTOS DE OTRAS ENTIDADES

En el Anexo 4 se encuentra la información respecto a las acciones realizadas, en el SIG-IDU.

10. PLAN DE CALIDAD

En el Anexo 5 se encuentra la información respecto al plan de calidad.

11. PROTOCOLO DE MANEJOS Y RESIDUOS

En el Anexo 6 se encuentra la información respecto al protocolo de manejos y residuos.

12. ACTIVIDADES REALIZADAS EN CORREDORES

En e periodo al que se hace referencia en este informe se ejecutaron actividades en los siguientes corredores:

12.1 MV_10_018_092_07

- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
- Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas
- Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas
- Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen
- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.
- Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramaS
- Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072
- Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024
- Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica.

12.2 MV_10_161_1560_10

- Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen
- Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica

13. REPORTE ESTADISTICO

13.1 EJECUCIÓN POR LOCALIDADES

A continuación, se relaciona los valores ejecutados en las localidades asignadas:

Tabla 6 Ejecución por localidades

Localidad	Valor ejecutado	Horizontal	Vertical
ENGATIVÁ	$ 51.958.526	$ 28.392.492	$ 23.566.033
FONTIBÓN	$ 81.091.544		$ 81.091.544
SUMINISTRO	$ 3.378.625		$ 3.378.625

El valor total ejecutado en el periodo al que hace referencia este informe es de $136,428,695.00 de los cuales en la localidad de Engativá se ejecutaron $51,958,526.00 correspondiente a un 38,08% y en la localidad de Fontibón se ejecutó un valor de $81,091,544,00 correspondiente a un 59,44%. Finalmente se realiza la entrega de suministros por un valor de $3,378,625.00 correspondiente a un 2,48%

13.2 ZONAS ESCOLARES

- EX_09_001_872_24

LOCALIDAD	ID	INSTITUCIÓN EDUCATIVA BENEFICIADA	DIRECCIÓN	TELEFONO	POBLACIÓN BENEFICIADA
Fontibón	EX_09_001_872_24	Pre-escolar Bellas personitas	Calle 24 b # 80 b - 36	3144212569	Ya no está en funcionamiento
		Instituto Nazareno Modelia	Calle 24c # 75 -13 Carrera 75 # 75 b - 12	6014100452 3007806326	250 NNA
		Colegio Bilingüe Nueva Alejandria sede principal	Calle 25d # 80 c -05	3024816221	120 NNA
		Colegio Bilingüe Nueva Alejandria sede B	Carrera 80b # 25 c - 20		120 NNA
		Liceo Jean de la Fontaine	Carrera 75 # 25d - 05	3157254135	200 NNA
		Jardin Infantil Piagetano	Calle 25 g # 75 - 55	3117740177	100 NNA
		Liceo Americano Mi Gran Casa Azul Sede A	Calle 24 a # 74 - 06	6013399309 3052906352	20 NNA

		Liceo Americano Mi Gran Casa Azul Sede C	Carrera 74 a # 24 -10		80 NNA
		Gimnasio Nuevo Reino Sede A	Carrera 74 a # 24 b - 13	6014104971 3168259823	50 NNA
		Gimnasio Nuevo Modelia	Carrera 74 # 24 d - 20	6017447295 3025400105	30 NNA
		Jardin Infantil Chiquitin	Calle 24 d bis # 73 c - 03	6016150913	50 NNA
		Jardin New Lipman School	Calle 25 c # 74 b - 24	3107144657	30 NNA
		Learning Academy	Carrera 73 b bis # 24 d - 79	3163582931	60NNA
		Centro de Estimulación Temprana Despertar	Carrera 73 c # 24 d - 44	6012952679 3152747820	48 NNA
		Colegio Amanecer	Calle 25 b bis # 73 a - 14	6012855980 3125915715	50 NNA
Total:					**1.208**

14. CERTFICADOS DE CALIBRACIÓN, FORMATOS DE SEGUIMIENTO A ESTADO DE LOS EQUIPOS

En el Anexo 7 se encuentra la información respecto a los certificados de calibración.

15. SEÑALIZACIÓN ENTREGADA A ALMACÉN

En el periodo al que hace referencia este informe se realiza la implementación de diferentes dispositivos y señales verticales, esta se relaciona a continuación:

Tabla 7 Suministro entregado

ITEM	UND	DESCRIPCION	ALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U	Cantidad	UNIDADES A INGRESAR A ALMACEN	SUBTOTAL
26	UN	Instalación de Señales Verticales de Pedestal (incluye Señales Sencillas tipo preventiva, Reglamentaria o informativa, Dúplex, Chevrones y Delineadores de todas las dimensiones) cumpliendo normatividad vigente.	$ 39.527	$ 12.700	10	0	$ 522.270,00
28	UN	Retiro de Señales Verticales (Incluye pedestal y tablero) con entrega a almacén de la SDM (incluye señales sencillas y Dúplex)	$ 21.197	$ 6.810	93	0	$ 2.604.651,00
30	M	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro 12 cm, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	$ 1.365	$ 438	3,6	0	$ 6.490,80
34	M2	Suministro y aplicación imprimante acrílico negro, espesor seco 4 mils y 50% de solidos por volumen	$ 12.342	$ 3.965	89,34	0	$ 1.456.867,38
40	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente marcas viales sin microesfera, con antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	$ 40.119	$ 12.890	30,8	0	$ 1.632.677,20
41	M2	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base solvente pigmentada (Multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) marcas viales sin microesfera, Incluye antideslizante, espesor seco 9 mils y 51% de solidos por volumen, incluye pictogramas	$ 38.302	$ 12.307	46,2	0	$ 2.338.135,80
48	M	Suministro y Aplicación de pintura Acrílica base agua 10 cm para líneas de demarcación en ciclorruta, sin microesfera, con antideslizante, espesor seco de 9 mils y 60% de sólidos por volumen	$ 2.637	$ 847	3,6	0	$ 12.542,40

ITEM	UND	DESCRIPCION	ALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U	Cantidad	UNIDADES A INGRESAR A ALMACEN	SUBTOTAL
65	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato con microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	$ 88.691	$ 28.497	5,92	0	$ 693.752,96
67	M2	Suministro y aplicación manual (método llana) de pintura de plástico en frio metilmetacrilato pigmentada (multicolor según 3.7.3. Color de las demarcaciones planas para urbanismos tácticos u otras intervenciones tácticas urbanas) sin microesferas, con antideslizante, para marcas viales de espesor seco de 50 mils según norma NTC 4744, incluye pictogramas	$ 93.229	$ 29.954	24,7	0	$ 3.042.620,10
68	M2	Suministro y aplicación de antideslizante para marcas viales según norma NTC 2072	$ 8.666	$ 2.784	30,62	0	$ 350.599,00
83	M2	Construcción de bandas sonoras reductoras de velocidad de 2 cm de altura, construida con gravilla de 1/2", pintura de larga duración blanca y resina epoxica	$ 319.493	$ 102.653	38,8	0	$ 16.379.264,80

Parcial 1	**$ 29.039.871**

- Suministros implementados

ITEM	UND	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U	CANTIDAD	UNIDADES A INGRESAR A ALMACEN	SUBTOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$ 302.563	$ 97.214	5,811	2	$ 2.323.104,15
	UN		$ 1.112.999	$ 48.553	2	2	$ 2.323.104,15
2	UN	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$ 96.240	$ 30.922	10	10	$ 1.271.620,00

ITEM	UND	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U	CANTIDAD	UNIDADES A INGRESAR A ALMACEN	SUBTOTAL
5	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal Reglamentaria, Preventiva o informativa de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16, E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SR - SP cumpliendo con normatividad vigente.	$ 240.015	$ 77.117	99	99	$ 31.396.068,00
6	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal doble de 60 cm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm para SP/SR-SI/SR cumpliendo con normatividad vigente.	$ 379.952	$ 122.079	22	22	$ 11.044.682,00
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	$ 347.016	$ 111.496	11,895	31	$ 5.454.000,24
	UN		$ 147.208	$ 28.727	31	31	$ 5.454.000,24
9	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-47 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm. cumpliendo con normatividad vigente.	$ 451.446	$ 145.049	1	1	$ 596.495,00
13	UN	Fabricación, suministro e instalación de delineador de curva horizontal de 51 x 36 cm (figura 5-14 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024), material reflectivo Tipo XI amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado 2" cumpliendo normatividad vigente.	$ 185.333	$ 59.548	9	9	$ 2.203.929,00

ITEM	UND	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U	CANTIDAD	UNIDADES A INGRESAR A ALMACEN	SUBTOTAL
15	UN	Fabricación, suministro e instalación de marcador de obstáculo vertical doble plano (figura 5-23 Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024) 90X45 cm, material reflectivo Tipo XI Amarillo /verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	$ 272.262	$ 87.478	8	8	$ 2.877.920,00
18	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SP-46 B, material reflectivo Tipo XI amarillo/verde fluorescente, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de 2" cumpliendo con normatividad vigente.	$ 350.281	$ 112.545	18	18	$ 8.330.868,00
19	UN	Fabricación, suministro e instalación de Señal SR-38 o SR-39 de 75 x 25 cm, material reflectivo tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, pedestal en tubo galvanizado de sección circular con diámetro interior de 2" y e=2 mm cumpliendo normatividad vigente.	$ 167.509	$ 53.820	2	2	$ 442.658,00
20	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, reglamentaría e informativa de 45 cm, lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm y material	$ 213.901	$ 68.727	37	37	$ 10.457.236,00
		reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y espesor de 2.0 mm cumpliendo normatividad vigente.					
21	UN	Fabricación, suministro e instalación de señal preventiva, Reglamentaria e informativa de 45 cm con tablero doble en lámina galvanizada C-16 E=1,5mm y material reflectivoTipo IV o superior, película antigraffiti, con tubo galvanizado de 2" de diámetro interno y	$ 315.166	$ 101.263	19	19	$ 7.912.151,00

ITEM	UND	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO SIN A.I.U	A.I.U	CANTIDAD	UNIDADES A INGRESAR A ALMACEN	SUBTOTAL
		espesor de 3.9 mm cumpliendo normatividad vigente. (Incluye la cimentación del soporte para la señal)					
73	UN	Suministro y anclaje de estoperoles metálicos con espigo, diámetro mínimo 10 cm y altura máxima 2,0 cm de altura con un espigo de mínimo 5 cm (NTC 4745) Incluye elementos de fijación. Figura 5-22 de la Resolución 20243040045005 de 17 de septiembre de 2024	$ 11.305	$ 3.632	166	166	$ 2.479.542,00
92	M2	Suministro e instalación de pasacalle en tela vendaval.	$ 110.119	$ 35.381	118,35	9	$ 17.219.925,00
	UN		$ 1.884.598	$ 28.727	9	9	$ 17.219.925,00

Parcial 2	$ 104.010.198

- Suministros entregados

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	CANT	TOTAL
1	M2	Fabricación y suministro de tableros en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, material reflectivo Tipo XI , película antigraffiti, para señales SP-SR-SI cumpliendo normatividad vigente. (Incluye elementos de fijación)	$399.777,00	3,96	$1.583.117
	UND		$143.919,720	11	$1.583.117
8	M2	Fabricación de plaquetas, suministro e instalación para señal SR - SP - SI - ST (alto mínimo de 23 cm) material reflectivo Tipo XI, película antigraffiti, en lámina galvanizada C-16 E=1,5 mm, cumpliendo normatividad vigente.	$458.512,00	0,546	$ 250.348
	UND		$83.449,184	3	$ 250.348
2	UND	Fabricación y suministro de pedestal sencillo en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales SP-SR-SI (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$127.162,000	8	$1.017.296

3	UND	Fabricación y suministro de pedestal doble en tubo galvanizado de sección circular con diametro interior de 2" y e=2mm para señales tipo dúplex SR/SP - SR/SR - SR/Plaqueta - SP/SP - SP/Plaqueta (para tableros iguales a 60 cm) cumpliendo normatividad vigente.	$175.955,000	3	$527.865
				Parcial 3	$ 3.378.625

Total	$ 136.428.695

Valor en letras	**CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS**

NOTA: Los elementos de señalización indicados en el cuadro anterior hacen parte del acta de recibo parcial de obra N° 20 para el contrato de obra 2024-3649.

Los anteriores elementos fueron instalados por el Contrato de Obra 2024-3649 en los siguientes puntos.

ITEM	UND	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
19	UND	CP-270	VERTICAL	ENGATIVA	KR 73A CON AV CHILE
1	M2	CP-2226	VERTICAL	ENGATIVA	KR 72BIS CON CL 81B
8	UND	CP-2226	VERTICAL	ENGATIVA	KR 72BIS CON CL 81B
1	M2	CP-2355	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 24A CON KR 68B
8	UND	CP-2355	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 24A CON KR 68B
1	M2	CP-2515	VERTICAL	ENGATIVA	CL 87 CON KR 95D
8	UND	CP-2515	VERTICAL	ENGATIVA	CL 87 CON KR 95D
8	M2	BC_10_001_754_19_V3	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
20	UND	BC_10_001_754_19_V3	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
21	UND	BC_10_001_754_19_V3	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO

ITEM	UND	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
28	UND	BC_10_001_754_19_V3	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
20	UND	EX_10_003_1560_10	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
21	UND	EX_10_003_1560_10	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
28	UND	EX_10_003_1560_10	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
8	M2	EX_10_004_1560_V6	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
20	UND	EX_10_004_1560_V6	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
21	UND	EX_10_004_1560_V6	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
28	UND	EX_10_004_1560_V6	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
8	M2	EX_10_374_1842_12_V5	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
21	UND	EX_10_374_1842_12_V5	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
28	UND	EX_10_374_1842_12_V5	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
8	M2	MV_10_055_1789_10_V3	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
20	UND	MV_10_055_1789_10_V3	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
21	UND	MV_10_055_1789_10_V3	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
28	UND	MV_10_055_1789_10_V3	VERTICAL	ENGATIVA	CICLORRUTA JUAN AMARILLO
34	M2	MV_10_161_1560_10	HORIZONTAL	ENGATIVA	CL 63 ENTRE CRA 11B Y CR 68

ITEM	UND	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
83	M2	MV_10_161_1560_10	HORIZONTAL	ENGATIVA	CL 63 ENTRE CRA 11B Y CR 68
5	UND	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA
6	UND	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA
15	UND	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA
30	ML	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA
34	M2	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA
40	M2	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA
41	M2	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA
48	ML	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA

ITEM	UND	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
65	M2	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA
67	M2	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA
68	M2	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA
73	UND	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA
83	M2	MV_10_018_092_07	HORIZONTAL	ENGATIVA	CONECTANTE CALLE 80 - LISBOA
20	UND	EX_09_001_1214_15	VERTICAL	FONTIBÓN	CICLORRUTA EL PORVENIR
21	UND	EX_09_001_1214_15	VERTICAL	FONTIBÓN	CICLORRUTA EL PORVENIR
28	UND	EX_09_001_1214_15	VERTICAL	FONTIBÓN	CICLORRUTA EL PORVENIR
1	M2	MV_AC_13_872_24_T2	VERTICAL	FONTIBÓN	CICLORRUTA EL PORVENIR

ITEM	UND	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
2	UND	MV_AC_13_872_24_T2	VERTICAL	FONTIBÓN	CICLORRUTA EL PORVENIR
8	M2	MV_AC_13_872_24_T2	VERTICAL	FONTIBÓN	CICLORRUTA EL PORVENIR
20	UND	MV_AC_13_872_24_T2	VERTICAL	FONTIBÓN	CICLORRUTA EL PORVENIR
26	UND	MV_AC_13_872_24_T2	VERTICAL	FONTIBÓN	CICLORRUTA EL PORVENIR
28	UND	MV_AC_13_872_24_T2	VERTICAL	FONTIBÓN	CICLORRUTA EL PORVENIR
1	M2	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V1	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 18, CL 18A Y CL 19A ENTRE KR 72 Y KR 78, Y KR 73, KR 77 ENTRE CL 13 Y CL 19A
5	UND	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V1	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 18, CL 18A Y CL 19A ENTRE KR 72 Y KR 78, Y KR 73, KR 77 ENTRE CL 13 Y CL 19A
6	UND	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V1	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 18, CL 18A Y CL 19A ENTRE KR 72 Y KR 78, Y KR 73, KR 77 ENTRE CL 13 Y CL 19A
8	M2	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V1	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 18, CL 18A Y CL 19A ENTRE KR 72 Y KR 78, Y KR 73, KR 77 ENTRE CL 13 Y

ITEM	UND	ID DE DISEÑO IMPLEMENTADO	TIPO DE IMPLEMENTACIÓN	LOCALIDAD	DIRECCIÓN
					CL 19A
9	UND	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V1	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 18, CL 18A Y CL 19A ENTRE KR 72 Y KR 78, Y KR 73, KR 77 ENTRE CL 13 Y CL 19A
13	UND	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V1	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 18, CL 18A Y CL 19A ENTRE KR 72 Y KR 78, Y KR 73, KR 77 ENTRE CL 13 Y CL 19A
15	UND	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V1	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 18, CL 18A Y CL 19A ENTRE KR 72 Y KR 78, Y KR 73, KR 77 ENTRE CL 13 Y CL 19A
18	UND	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V1	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 18, CL 18A Y CL 19A ENTRE KR 72 Y KR 78, Y KR 73, KR 77 ENTRE CL 13 Y CL 19A
19	UND	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V1	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 18, CL 18A Y CL 19A ENTRE KR 72 Y KR 78, Y KR 73, KR 77 ENTRE CL 13 Y CL 19A
26	UND	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V1	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 18, CL 18A Y CL 19A ENTRE KR 72 Y KR 78, Y KR 73, KR 77 ENTRE CL 13 Y CL 19A
28	UND	SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V1	VERTICAL	FONTIBÓN	CL 18, CL 18A Y CL 19A ENTRE KR 72 Y KR 78, Y KR 73, KR 77 ENTRE CL 13 Y CL 19A
92	M2	PASACALLES	VERTICAL	FONTIBÓN	CORREDOR AVENIDA ESPERANZA

16. REPORTE DE SEÑALIZACIÓN RETIRADA EN VÍA Y ENTREGADA A ALMACÉN

En el periodo al que hace referencia este informe se realizó entrega de señales retiradas en vía, la información se encuentra en el Anexo 9.

17. RECURSOS UTILIZADOS PARA EL CONTRATO DE OBRA

17.1 PERSONAL

A continuación se relaciona el personal mínimo del Contrato SDM 2024-3649.

Nro	NOMBRE	CARGO	CEDULA
1	David Francisco Ferreira Gómez	Director del Proyecto	1075256722
2	Yesid Francisco Ferreira Villegas	Especialista de Tránsito	12227758
3	Luisa Fernanda López Flórez	Ingeniero Residente de Obra Nocturno	52929295
4	Daniel Alfonso Ferreira Cuellar	Ingeniero Residente de Obra Diurno	1016035273
5	Maryith Alejandra Rivera Muñoz	Trabajadora Social	1018475531
6	Yessica Tatiana Londoño Cuellar	Profesional SST – Ambiental	1075281104
7	María Fernanda Santamaria Barón	Tecnólogo en Georreferenciación	1075689197
8	Miguel Angel Chaparro Molano	Conductor Diurno	79837259
9	Jairo Guerrero Lequizamon	Conductor Nocturno	4297221
10	July Alexandra Rojas Porras	Secretaria	1022344345

17.2 CUADRILLAS

CUADRILLA	NOMBRE
HORIZONTAL 1	Felix Francisco Espitia Blanquicetth
HORIZONTAL 1	Leider David Espitia Mercado
HORIZONTAL 1	Oscar Emidio Espitia Blanco
HORIZONTAL 1	Duber Jose Rosales Gamarra
HORIZONTAL 1	Jhonatan De Jesus Herrera Diaz
HORIZONTAL 1	Sandra Johana Arias Fonseca
HORIZONTAL 2	Heder Hernan Ipujan Cuaran
HORIZONTAL 2	Jennifer Paola Añasco Calambas
HORIZONTAL 2	Oswaldo Fajardo Tibocha
HORIZONTAL 2	David Humberto Hernandez Hurtado
HORIZONTAL 2	Yian Freddy Blanco Sanchez
HORIZONTAL 2	Benito Antonio Blanco Burgos
HORIZONTAL 3	Jose Giovanni Montaño
HORIZONTAL 3	John Freddy Guzman Gutierrez
HORIZONTAL 3	Wilson Orlando Zambrano Pedraza
HORIZONTAL 3	Jorge Armando Zambrano Pedraza
HORIZONTAL 3	Cristian Alberto Castro Ortegon
HORIZONTAL 3	Jose Alexander Vanegas Poveda
HORIZONTAL 4	Okely Antonio Cordero Jimenez
HORIZONTAL 4	Joseph Felipe Montaño Serrato
HORIZONTAL 4	Cristian Arbey Guzman Abril
HORIZONTAL 4	David José Romano Sanchez
HORIZONTAL 4	Irvin Adolfo Moreno Rosales
HORIZONTAL 4	Diego Fernando Grajales Marquez
VERTICAL 1	Ramiro Poveda Torres

CUADRILLA	NOMBRE
VERTICAL 1	Julio Everardo Ballesteros Torres
VERTICAL 1	Carlos Eduardo Forero Ballesteros
VERTICAL 1	Orlando Cacais Canacue
VERTICAL 2	William Perez Salgado
VERTICAL 2	Maria Del Carmen Diaz Guerra
VERTICAL 2	Cesar Manuel Toloza Vera
VERTICAL 2	Ruben Dario Trespalacios Caballero
VERTICAL 3	Pablo Antonio Bejarano Garcia
VERTICAL 3	Jose Jamir Vera
VERTICAL 3	Andres David Ballesteros Dorian
VERTICAL 3	Catherin Camila Olarte Rueda
ADICIONAL	Juan Daniel Molina Suarez
ADICIONAL	Julian Santiago Ferreira
ADICIONAL	Liceth Daniela Merchan Baquero

En el Anexo 10.1 (Personal) se encuentra el listado de personal profesional y personal operativo.

17.3 EQUIPO

17.3.1 MAQUINARIA

SOLICITADO	PROPUESTO
Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de pintura líquida que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer, como mínimo, dos (2) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo DROP - ON o sembrado, NTC 4744-2 numeral 5.2	Equipo MONTADO en camión HINO, ROAKPACK
Vehículo autopropulsado para aplicación de resina termoplástica que tenga incorporado el equipo delineador, el cual deberá poseer dos (2) boquillas para la aplicación de resina por extrusión o pulverización o spray y dos (2) dispensadores o boquillas para la aplicación de microesfera tipo DROP ON o sembrado a presión. Incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5.2	Vehículo autopropulsado para la aplicación de resina termoplástica
Vehículo autopropulsado y/o montado para aplicación de plástico en frío por el método de spray, el cual deberá poseer, como mínimo, cuatro (4) boquillas para la aplicación de pintura y otras dos (2) para la aplicación de microesfera tipo DROP – ON o sembrado de acuerdo con la NTC 4744-2 numeral 5.2	Equipo MONTADO en camión para la aplicación de plástico en frío por el método SPRAY.
Máquina manual para pintura líquida NTC 4744-2 numeral 5.1	Máquina para pintura liquida
Máquina manual para aplicación de termoplástico, incluye caldera. NTC 4744-2 numeral 5.1	Máquina manual para aplicación de termoplástico, incluye CALDERA

Máquina manual para aplicación de plástico en frío por el método spray. NTC 4744-2 numeral 5.1	Máquina manual para aplicación de PLASTICO EN FRIO SPRAY

17.3.2 VEHICULOS

VEHICULO/MARCA	PLACA	MODELO	CAPACIDAD
Camioneta HINO	GDW227	2020	1550 KG
Camión JAC	JKW051	2022	2080 KG
Camioneta JAC	JTS193	2022	1155 KG
Camión Grúa NISSAN	PEW278	2004	4500 KG
Camión FORD	SPO719	2007	4500 KG
Camión FORD	SPO720	2007	4500 KG
Camión JAC	TSM104	2015	2300 KG
Camión NISSAN	WGA868	2015	2400 KG
Camión CHEVROLET	WGY769	2015	2630 KG
Camión FOTON	THQ487	2020	6000 KG

18 VINCULACIÓN DE POBLACIÓN VULNERABLE.

La información referente a esta vinculación se encuentra en el Anexo 11. Gestión Social.

19 VINCULACIÓN DE PORCENTAJE DE MUJERES.

La información referente a esta vinculación se encuentra en el Anexo 11. Gestión Social.

20 FACTOR SOCIAL

El informe social se encuentra en el Anexo 11. Gestión Social.

21 GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

21.1 GESTIÓN SST

La información referente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en el Anexo 13

21.2 GESTIÓN AMBIENTAL

21.2.1 GESTIÓN DOCUMENTAL

En primera instancia, para el desarrollo adecuado de las actividades indicadas en el pliego de contratación del contrato de obra, se implementan de manera preliminar al inicio de labores en campo, cada uno de los documentos, planes y programas necesarios para la óptima operación en materia ambiental del proyecto.

Así las cosas, se procede con el desarrollo e implementación del Protocolo de Manejo de Residuos - Manejo Ambiental V1, el cual fue aprobado bajo el consecutivo CPD-047-2025 del día 21 de febrero del 2025, mediante el cual se enmarca el conjunto detallado de actividades, que producto de la evaluación ambiental del proyecto, están orientadas a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos ambientales que pudiesen causarse durante la ejecución de la obra del contrato No. 2024-3649 cuyo objeto es la "REALIZAR ACTIVIDADES INHERENTES AL SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." ZONA 3 – OCCIDENTE EN LAS LOCALIDADES DE ENGATIVÁ, FONTIBÓN Y EN LOS CORREDORES VIALES DE LA AVENIDA CENTENARIO, AVENIDA CALLE 26, AVENIDA BOYACA, AVENIDA CIUDAD DE CALI, AVENIDA CALLE 80, su propósito principal será el de optimizar el uso de las materias primas e insumos dando a conocer las medidas de prevención que se utilizan para causar el menor impacto ambiental debido a la generación de los residuos, estimando las cantidades y volumen de los residuos que se generaran en cada uno de los frentes de obra.

Por lo tanto, el propósito principal será el de optimizar el uso de las materias primas e insumos dando a conocer las medidas de prevención que se utilizan para causar el menor impacto ambiental debido a la generación de los residuos en cada uno de los frentes de obra.

También se procede con el desarrollo e implementación del Plan de Gestión Integral de los Residuos o Desechos Peligrosos (PGIRP), el cual fue aprobado el día 25 de febrero del 2025 por la interventoría bajo el consecutivo CPD-052-2025.

21.2.2 MANEJO AMBIENTAL ZONAS DE INTERVENCION

Dentro de la ejecución de las actividades del contrato no se realizará establecimiento de campamentos o instalaciones temporales puesto que el tiempo de ejecución de cada actividad no amerita la realización de estos por tal, razón tampoco se

contratará la prestación de servicio de sanitarios portátiles. No se realizarán intervenciones que requieran trámites o permisos ambientales.

Sin embargo, en el momento de la ejecución de la actividad se realizará la debida señalización de la zona a intervenir para evitar el tránsito de las personas mientras se ejecuta la actividad.

Durante el periodo se realizó la implementación de los siguientes diseños:

MV_10_161_1560_10
MV_10_018_092_07

A continuación, relacionamos las medidas de manejo implementadas durante la ejecución de las actividades por componente:

21.2.2.1 RECURSO HIDRICO

La implementación de las siguientes medidas permitió minimizar los impactos negativos de la obra sobre el agua y a contribuir con la protección de este recurso vital:

- ✓ Manejar adecuadamente los residuos sólidos y peligrosos
- ✓ Prevenir la contaminación del agua
- ✓ Racionalizar el uso del agua

- Indicador de seguimiento y monitoreo:
  Durante la ejecución de las actividades el personal de obra protege las fuentes de agua cercanas donde se realiza la implementación del diseño en los diferentes puntos previniendo su contaminación. Según los días laborado para el periodo:

  Actividades realizadas (10 Días laborados) / Actividades Planeadas (31 Días mes).

21.2.2.2 SUELO

La implementación de las siguientes medidas permitió minimizar los impactos negativos de la obra sobre este recurso vital y a contribuir con la protección del medio ambiente:

- ✓ Manejar adecuadamente los residuos sólidos y peligrosos

- Indicador de seguimiento y monitoreo:
  Para este periodo se realizó entrega de 1.000 KG de residuos peligrosos generados en los frentes de obra a la empresa a RECICLAJES RQJ para realizar la disposición final, estos estaban acopiados temporalmente en la bodega de almacenamiento temporal ubicada en la Carrera 98 # 18-60 Fontibón Centro, mientras se contaba con la cantidad suficiente para entregarlos al gestor externo y que realizara la disposición final, garantizando durante todo el

proceso, un manejo ambientalmente seguro. CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL, usa los servicios de la empresa RECICLAJES RQJ, en alianza con RECITAMBORES SAS y TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SAS ESP, quienes cuentan amplia experiencia en el manejo de residuos peligrosos, alianzas estratégicas para estos manejos.

21.2.3 ATMOSFERA

La implementación de las siguientes medidas permitió minimizar los impactos negativos de la obra sobre la calidad del aire y el ruido y a contribuir a un ambiente saludable para la comunidad:

- ✓ Utilizar maquinaria y equipo con bajas emisiones de gases contaminantes
- ✓ Implementar buenas prácticas de operación de la maquinaria
- ✓ Utilizar maquinaria y equipo con bajo nivel de ruido

- Indicador de seguimiento y monitoreo:

  Mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos

  Durante el periodo del presente informe no se realizaron mantenimientos de maquinaria, equipos y vehículos ya que estos están en óptimas condiciones para la ejecución de las labores.

  Inspección de equipos, maquinaria y vehículos

  En anexos informe mensual No. 20 SST, se adjunta en el Anexo - Inspecciones reporte de inspección de equipos, maquinaria, vehículos y herramientas para el presente periodo.

21.2.4 PAISAJE

La implementación de las siguientes medidas permitió minimizar los impactos negativos de la obra sobre el paisaje:

- ✓ Minimizar la alteración del paisaje
- ✓ Minimizar la generación de residuos

- Indicador de seguimiento y monitoreo:

  Durante el periodo del presente informe no se realizaron frentes de obras acondicionados, ni construcción de áreas temporales.

21.2.5 TRAFICO VEHICULAR

La implementación de las siguientes medidas permitió minimizar los impactos negativos tanto a trabajadores como a la comunidad:

- ✓ Cumplir con los horarios establecidos para realizar las actividades.
- ✓ Implementación de PMT
- ✓ Entregar elementos de protección personal

- Indicador de seguimiento y monitoreo:

Manejo de flujo vehicular
Durante el periodo del presente informe no se recibieron PQR.

21.2.6 CAPACITACIONES

Para el periodo del presente informe se realizaron las siguientes capacitaciones:

TEMA	FECHA
Interpretación de hojas de seguridad - SDS	26/09/2026

21.2.7 PROTECCION DE INDIVIDUOS ARBOREOS

Para el periodo del presente informe no se realizó protección de individuos arbóreos.

21.2.8 PROTECCION DE SUMIDEROS

Para el periodo del presente informe no se realizó protección de sumideros.

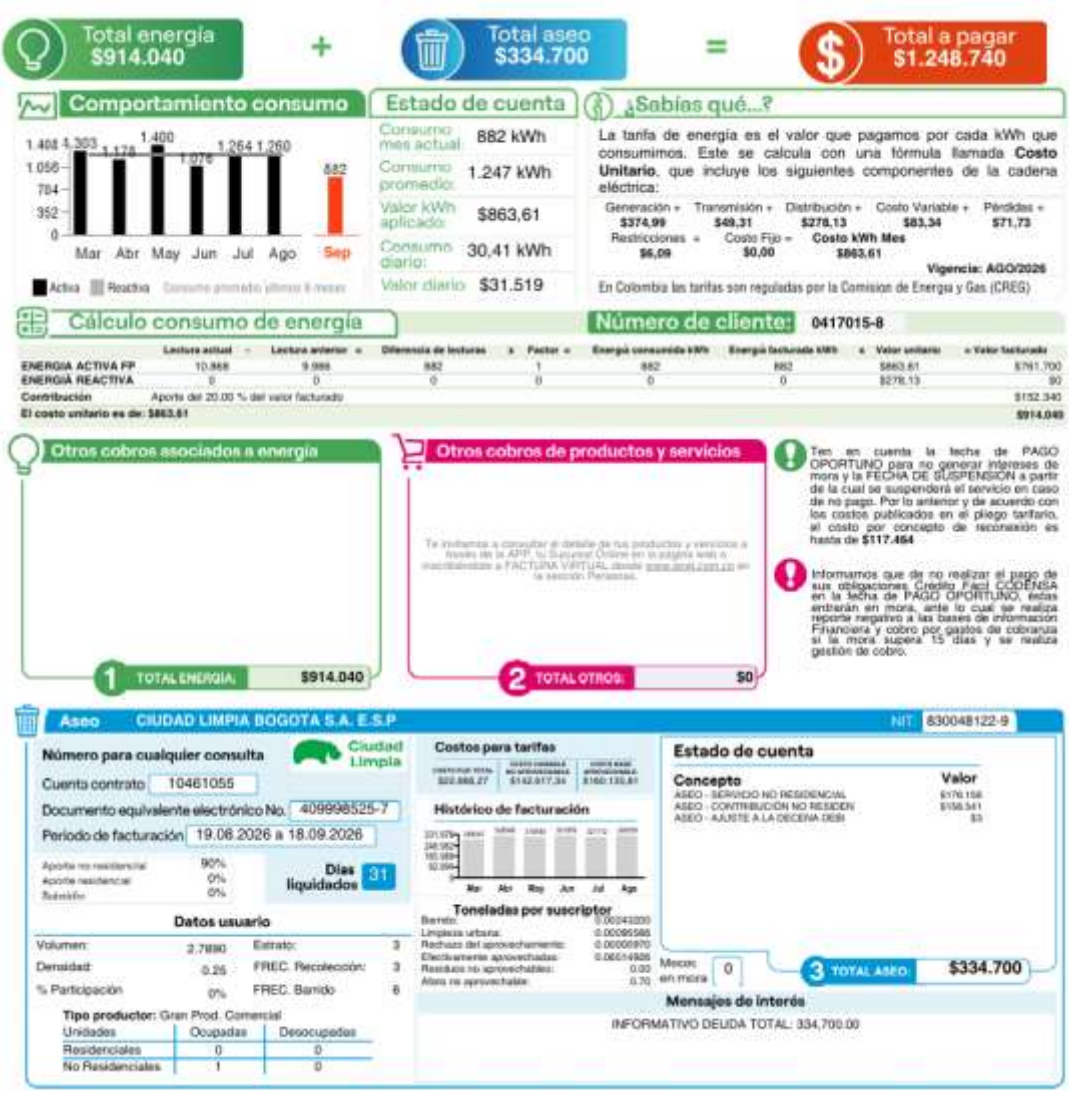
21.2.9 DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

La disposición se realizará dependiendo de la clase de residuos y sus características.

- **ORGÁNICOS, APROVECHABLES, NO APROVECHABLES**

  Con el fin de dar cumplimiento, se implementa el centro de acopio en el vehículo asociado al contrato para los frentes de obra de acuerdo con la normatividad vigente en lo relacionado con el código de colores, para la correcta separación de los residuos.

  La disposición final de los residuos generados se está llevando a cabo de la siguiente manera: los residuos ordinarios se disponen mediante la ruta recolectora de servicio de aseo, esta recolección se realiza en una periodicidad de tres veces a la semana, en relación con los residuos de tipología aprovechable estos son entregados a los recicladores informales con el fin de aportar en la mejora de las condiciones de vida de esta población. La empresa de aseo encargada de la recolección es Ciudad Limpia S.A. ESP. Esta entidad es el operador oficial designado por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP). La recolección se realiza generalmente en una periodicidad de tres veces por semana los días habituales son lunes, miércoles y viernes.



- **PELIGROSOS**

Los residuos peligrosos generados en los frentes de obra serán acopiados temporalmente en el vehículo, posteriormente se llevarán a la bodega de almacenamiento temporal ubicada en la Carrera 98 No. 18-60 Fontibón - Bogotá D.C., para ser acopiados mientras se cuenta con la cantidad suficiente para entregarlos al gestor externo que realizara la disposición final de los residuos, garantizando durante todo el proceso, un manejo ambientalmente seguro. Para la disposición final de los residuos peligrosos, se requiere que el proveedor seleccionado cuente con permiso o licencia para el transporte, almacenamiento y disposición final de los residuos peligrosos generados, durante la ejecución de las diferentes actividades contratadas, en las diferentes áreas a intervenir.

CONSORCIO MOVILIDAD INTEGRAL, usa los servicios de la empresa RECICLAJES RQJ, en alianza con RECITAMBORES SAS y TRATAMIENTOS Y RELLENOS AMBIENTALES DE

COLOMBIA SAS ESP, quienes cuentan amplia experiencia en el manejo de residuos peligrosos, alianzas estratégicas para estos manejos.

Durante el periodo objeto del presente informe se realizó entrega de 1.000 KG de residuos peligrosos generados en los frentes de obra a la empresa a RECICLAJES RQJ para realizar la disposición final.

- **RCD**

En el marco del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (PMA), se informa que la generación de RCD en el proyecto es mínima, fundamentada en la implementación de buenas prácticas para el manejo de materiales y la optimización de recursos en las actividades de señalización vertical.

x

- Se prioriza el aprovechamiento total del material en el lugar de la intervención. El concreto sobrante es utilizado como material de relleno (canto rodado) en la cimentación de las mismas estructuras de señalización. Al ser incorporado directamente en las obras, se evita que el material se convierta en un residuo, reduciendo drásticamente la necesidad de transporte y disposición final. Esta práctica permite:
-
    - Minimizar desperdicios.
    - Optimizar el consumo de materiales.
    - Garantizar una gestión ambientalmente responsable.

Dado que el alcance del contrato no contempla demoliciones y la remoción de capa vegetal para la instalación de postes es mínima, los impactos ambientales son controlados de manera inmediata bajo lineamientos de buenas prácticas de obra.

Durante el periodo objeto del presente informe, no se realizó entrega de estos residuos.

CONTROL DE EMISIONES

Durante las actividades del contrato no se realizará ningún tipo de demolición, movimiento de tierra u operación de maquinaria que pueda generar contaminación del aire en las diferentes áreas de intervención del proyecto. Sin embargo, se realizarán traslados de maquinaria y personal en vehículos que tengan la documentación de obligatorio cumplimiento para su respectiva movilización como los son: SOAT y Revisión técnico-mecánica.

- JKW051
- TSM104
- TLY999
- LHQ775

21.2.10 REPORTE DE LLUVIAS

A continuación, se refiere en la tabla el reporte de lluvias durante el periodo del presente informe:

DIA	FECHA	NOVEDAD
MARTES	27/09/2026	SE CANCELAN LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS
VIERNES	30/09/2026	SE CANCELAN LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS
MIERCOLES	1/10/2026	SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES POR LLUVIAS

22 PROTOCOLOS DE COMUNICACIONES

En el Anexo 13, se encuentra la correspondencia recibida y enviada durante el periodo al que hace referencia este informe.

23 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURÍDICOS

23.1 ASPECTO ADMINISTRATIVO

En el vigésimo mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 03 de septiembre de 2026 al 02 de octubre del 2026 se realizaron actividades administrativas como:

- Revisión de documentación contractual.
- Revisión de Anexo técnico.
- Requerimientos mediante oficios.
- Respuestas a requerimientos de Secretaría Distrital de Movilidad e Interventoría,
- Asistencia a comités técnicos y mesas de trabajo y revisión de acta de comité.
- Asistencia comités de representantes legales.
- Entrega y firma de planillas de implementación señalización horizontal y vertical.
- Atención a las solicitudes de Interventoría y la Secretaría Distrital de Movilidad, en desarrollo del objeto del contrato vigilado.
- Entrega financiera del contrato de obra
- Aprobación adición 1.

23.2 ASPECTO JURIDICO

En el vigésimo mes de ejecución del contrato comprendido entre el periodo del 03 de septiembre de 2026 al 02 de octubre del 2026 se realizaron actividades jurídicas como
:

- Ejecución del Contrato de Obra dentro del plazo, montos, calidades y demás términos establecidos para el mismo.
- Solicitudes de reclamaciones por parte de la interventoría.
- No se generaron reclamaciones por parte del contratista.
- No se generaron requerimientos de suspensión o prórroga del contrato de obra.

24 PLANILLAS DE PAGO DEL PERSONAL VINCULADO AL CONTRATO

Estas planillas se encuentran en el Anexo 12, Gestión seguridad y salud en el trabajo, anexos, anexo 3 Parafiscales.

25 CERTIFICACIÓN SALARIOS Y HONORARIOS

Esta certificación se encuentra en el Anexo 14 Certificación salarios y honorarios.

26 LISTADO DE PROVEEDORES

El contrato cuenta con los siguientes proveedores:

- Freestone
- Ferreira SAS

27 ESTADO PRESUPUESTAL

27.1 Resumen cuenta 20

A continuación, se relaciona la ejecución realizada por diseño, el valor de las actividades ejecutadas. En el Anexo 16, se encuentra el soporte de estas actividades: planillas de obra, acta de entrega a satisfacción a almacén, acta de reunión, formato de bienes y acta de obra de la cuenta 20.

Tabla 8 Resumen planillas Cuenta 20

ID	SEMANAL PROGRAMADO	ACUMULADO PROGRAMADO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	% ID EJECUTADO
	$ 106.997.398,54	$ 13.626.736.215,17	$ 13.540.895.167,17		
MV_09_189_1556_10 (Calle 13)				$ 44.065.252,06	100,00%
MV_AV_CALI_941_09_T3 (Av. Cali Rio Fucha - CL26)				$ 270.697.126,32	100,00%
MV_AV_CALI_941_09_T2 (Av. Cali CL26-CL80)				$ 533.023.316,34	100,00%
MV_AV_CALI_941_09_T1 (Av. Cali CL80-Rio Salitre)				$ 249.625.422,76	100,00%
MV_AV_BOYACA_941_09_T2 (Av. Boy CL26-CL80)				$ 1.244.140.474,92	100,00%
MV_AV_BOYACA_941_09_T3 (Av. Boy CL26-C17)				$ 961.355.158,76	100,00%
CP 1032 AC 72 (KR 87 - KR 84A) MV_12_281_941_09				$ 27.462.543,51	100,00%
ORDEN DE SUMINISTRO 17/02/2025				$ 127.421.057,00	100,00%
CP AC 80 (KR 30 Y KR 101) MV_10_183_1747_10				$ 5.753.442,00	100,00%
CP 310 (CALLE 88 - 86A) EX_10_355_1236_11				$ 1.099.293,00	100,00%
MV_AV_CALLE_80_1238_24				$ 2.711.414.149,31	100,00%
CP 1064 (TV 96 CALLE 71C) EX_10_377_1842_12				$ 733.084,00	100,00%
CP 769 (DG 91 KR 86) EX_10_004_1560_10				$ 348.047,00	100,00%
CP 921 (CL 86 A - AV. BOY) MV_10_055_1089_10				$ 580.994,00	100,00%
EX_10_355_1236_11 (BACHUE CLL 96)				$ 215.588.247,81	100,00%
EX_09_035_1556_10				$ 750.914.380,00	100,00%
MV_AC_26_643_24_V0				$ 2.266.106.441,73	100,00%
EX_10_004_1560_10 (BOCHICA AC 90)				$ 312.513.166,00	100,00%

SUMINISTRO IDIPRON (70 UND)				$ 19.880.691,00	100,00%
CP 2 - EX_10_001_872_24				$ 378.275,00	100,00%
SUMINISTRO ALMACEN (212 UND)				$ 62.318.196,00	100,00%
DEI13CAM01 - Cll 80 Crr 102 E-O				$ 6.245.347,00	100,00%
DEI13CAM02 - Cll 80 Crr 102 O-E				$ 5.405.113,00	100,00%
EX_10_007_782_24(ALAMOS TV 93 - AC 26)				$ 72.458.130,40	100,00%
DEI-020-CAM-01 - Cali Cll 75A N-S				$ 7.290.728,00	100,00%
DEI-020-CAM-02 - Cali Cll 75A S-N				$ 6.155.262,72	100,00%
DEI-023-CAM-01 - Boy Cll 24 N-S				$ 13.894.782,17	100,00%
DEI-023-CAM-02 - Boy Cll 24 S-N				$ 12.862.619,76	100,00%
MV_10_010_1747_10				$ 96.042.965,00	100,00%
CP 1113 - MV_09_024_1249_11				$ 12.573.257,00	100,00%
CP 732 - EX_10_353_1236_11				$ 334.340,00	100,00%
CP 260 - SH_SV_URB_RESERVA_67_2017				$ 792.084,00	100,00%
CP 743 - EX_10_110_1560_10				$ 1.099.293,00	100,00%
CP EX_10_010_1560_10				$ 9.355.545,64	100,00%
EX_10_353_1236_11 INT SEMAFORICA 6				$ 14.651.357,00	100,00%
CP EX_10_123 Y EX_10_008 INT SEMAFORICA 7				$ 12.677.745,00	100,00%
CP EX_10_340 y EX_10_123 INT SEMAFORICA 8				$ 14.103.763,00	100,00%
CP PARQUE FONTIBON 1845				$ 4.682.860,00	100,00%
MV_10_011_092_07 (AC 72 - KR 110G)				$ 335.529.084,72	100,00%
SUMINISTRO ALMACEN ADICION No.1				$ 8.483.905,00	100,00%
DVTRSH00 AV BOYACA CLL 22D				$ 73.354.558,00	100,00%
MV_09_424_947_01 (AC 24- KR 72A)				$ 58.611.581,84	100,00%
EX_09_221_1881_12				$ 1.981.313,26	100,00%
CP 1133. SALITRE				$ 415.257,43	100,00%
ZPP SECTOR HAYUELOS				$ 445.594.957,20	100,00%
SH_SV_ZPP_2470_2021 CAPELLANIA				$ 77.833.103,00	100,00%
CP 330 (KR 102 Cll 80) EX_10_039_1560_10_V7				$ 10.129.158,00	100,00%
CP 820 (Cll 81 KR 73) EX_10_001_872_24_V7				$ 4.383.805,00	100,00%
CP 245 (Cll 86 KR 116 A) EX_10_003_1560_10_V4				$ 299.322,00	100,00%
CP 774 (DG 82 A KR 110) EX_10_374_1842_12_V4				$ 662.075,00	100,00%

CP 1719 (REN CAM CLL 13 - CR 135)				$ 6.298.569,00	100,00%
CP 350 ANIMALES EN LA VIA				$ 8.187.376,00	100,00%
CP ZONA SEGURA DE TAXIS				$ 3.386.104,00	100,00%
CP 1580 (Cll 19 KR 106 Y KR 108) EX_10_039_1560_10				$ 4.896.842,56	100,00%
CP 1246 (KR 95G Cll 91A Y Cll 96) EX_10_355_1236_11				$ 804.410,00	100,00%
CP 1257 (KR 90 Cll 86A) EX_10_363_1842_12				$ 951.396,00	100,00%
CP 1260 (Cll 73 KR 101) EX_10_116_1560_10				$ 799.328,32	100,00%
CP 1788 (TV 112C DG 66 Y Cll 64D) EX_10_347_1236_11				$ 817.668,80	100,00%
CP 1118 (CL 77 KR 69Q Y KR 69R) EX_10_001_V10				$ 1.226.503,00	100,00%
CP 1225 (Cll 72 KR 70 y KR 70F) SH_SV_IDU_1384 _2017_V0				$ 408.834,40	100,00%
CP 1898 (KR 101ABis CON CL 23IBis) EX_09_185_1249_11				$ 634.264,00	100,00%
CP 1443 (CL 16J KR 97 Y KR 98) EX_09_036_1556_10				$ 817.668,80	100,00%
CP 951 (AC 24 AK 106) EX_09_185_1249_11				$ 662.271,00	100,00%
CP 745 (CL 22Bis KR 100) MV_09_001_1214_15				$ 317.132,00	100,00%
CP 1787 (CL 23H Bis KR 106) EX_09_185_1229_11				$ 776.402,72	100,00%
CP 1274 (KR 112 AC 63 Y CL 65B) EX_10_347_1236_11				$ 3.675.420,76	100,00%
MV_09_424_947_10 LA ESPERANZA				$ 331.829.293,66	100,00%
EX_10_362_1842_12 (CP1119)				$ 3.460.593,00	100,00%
MV_12_281_941_09_T2 (CP 2152				$ 22.475.759,00	100,00%
DEI07CAM02 RENOVACION (CP 2208)				$ 1.352.841,30	100,00%
CP EMERGENCIA TV 94 SEÑALES PMT				$ 1.437.155,00	100,00%
SUMINISTRO TABLEROS CONTROL				$ 10.793.979,00	100,00%
(CALLE 63) MV_10_161_1560_10				$ 1.468.565.354,00	100,00%
CP 1120 (EX_10_001_V10)				$ 25.339.931,87	100,00%
CP 2388 (EX_09_001_872_24)				$ 346.407.112,00	100,00%
CP 2395 (MV_10_018_092_07)				$ 80.187.456,00	100,00%
CP 2550 (EX_09_017_1249_11 Y SH_SV_IDU_1345_2017)				$ 37.320.503,00	100,00%
SUMINISTRO SEÑALES CICLOMOTORES				$ 2.683.035,00	100,00%
SUMINISTRO SEÑALES FOTODETECCION				$ 4.699.566,00	100,00%
CP 2515 (EX_10_355_1236_11_V8)				$ 1.725.965,00	100,00%
CICLORUTA PORVENIR				$ 5.727.293,00	8,09%

CICLORUTA JUAN AMARILLO				$ 23.678.237,32	14,61%
ZPP SECTOR MULTIPLAZA V1				$ 20.856.600,00	4,34%
SUMINISTRO GLORIETA				$ 3.378.625,00	100,00%
CP 2226 (EX_10_001_872_24)				$ 388.660,00	100,00%
CP 270 (MV_12_281_941_09_V29)				$ 221.329,00	100,00%
CP 2355 (BAHIA CALLE 24A)				$ 383.616,00	100,00%
% GENERAL	**0,53%**	**67,97%**	**67,54%**		

27.2 Balance presupuestal

Tabla 9 Balance presupuestal a cuenta 20

PRESUPUESTO INICIAL	**$ 18.771.473.428,00**
ADICIÓN 1	$..... 1.276.983.847,00
FACTURADO HASTA CUENTA 20	$ 13.581.624.839,00
PRESUPUESTO POR EJECUTAR	$ $ 6.466.832.436,00

Tabla 10 Valor ejecutado cuenta 20

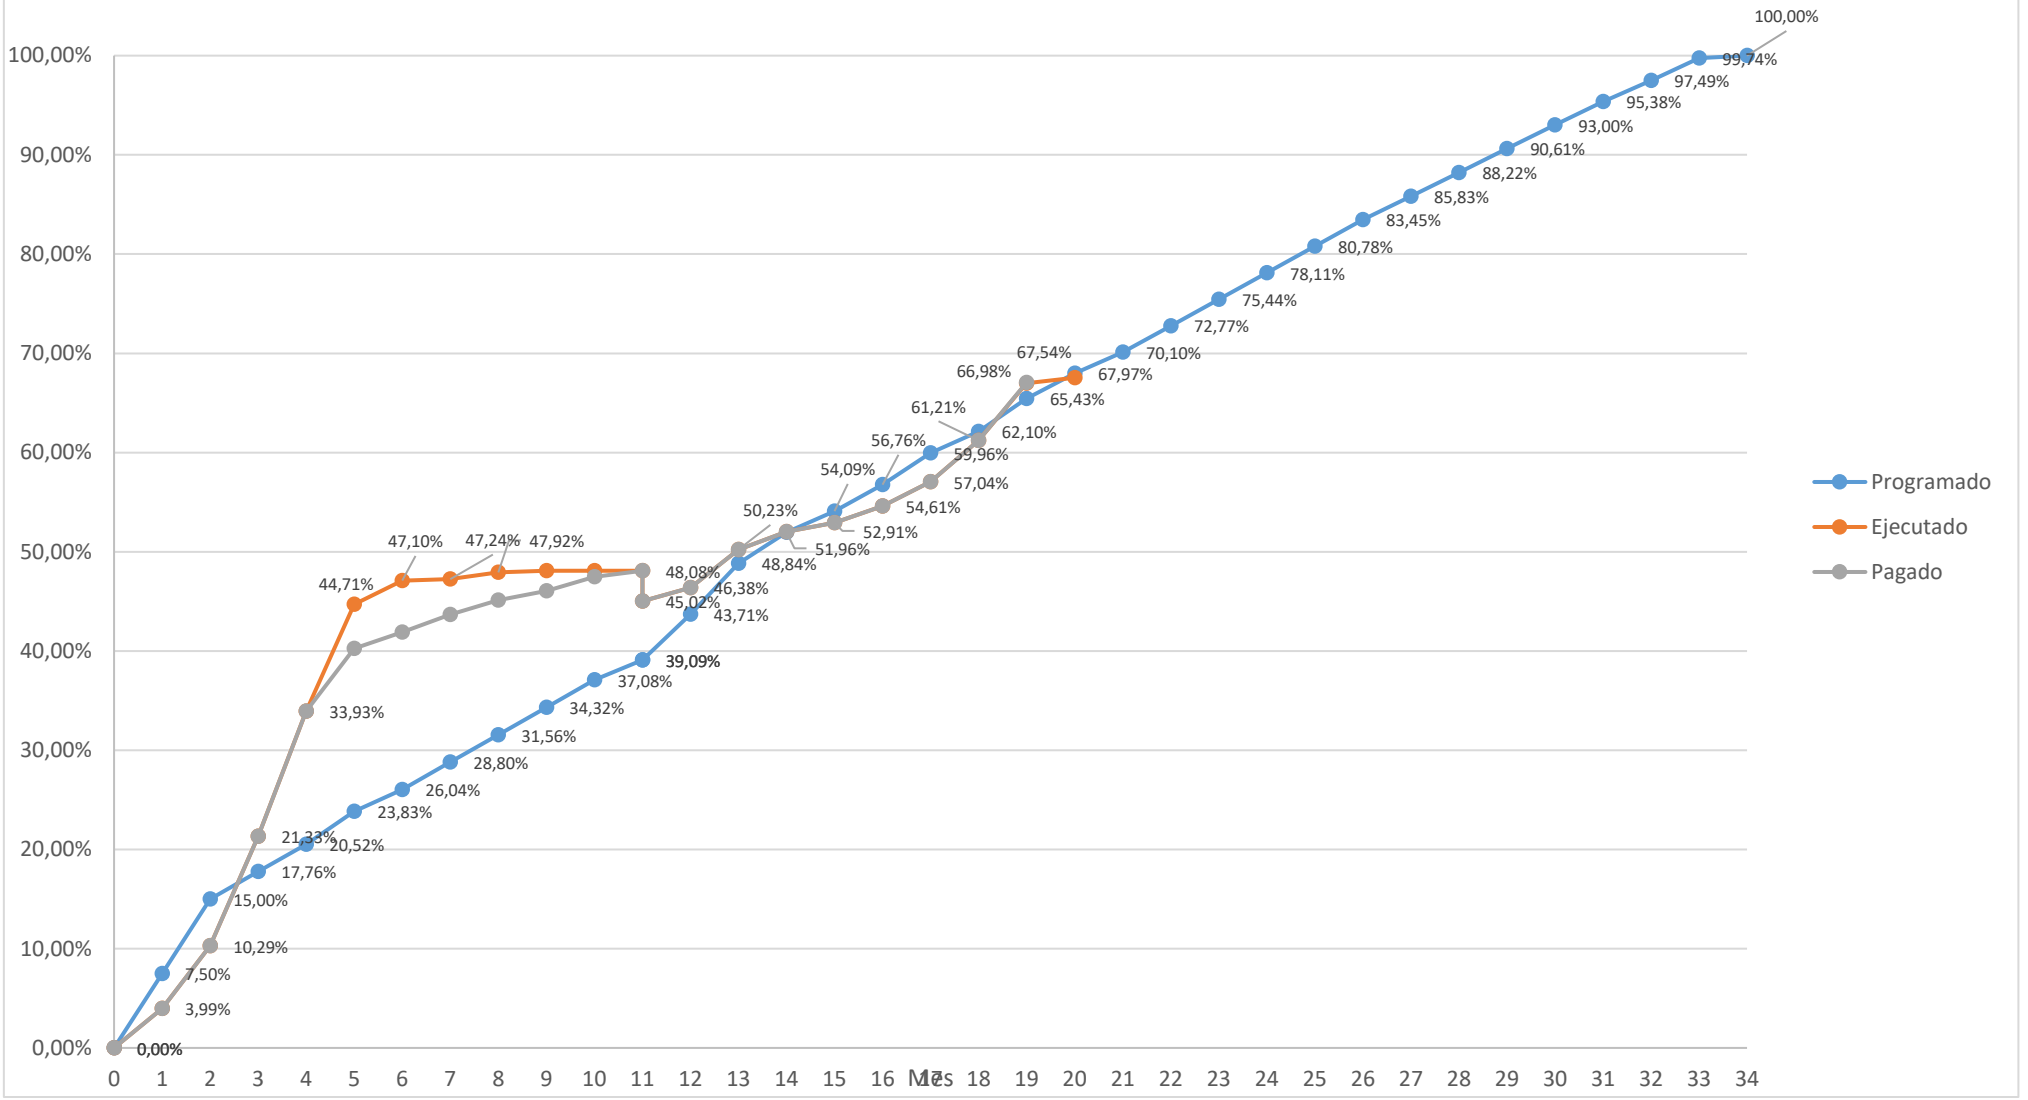
Cuenta	Ejecutado	%Ejecutado
Total, facturado cuenta 1	$ 748.077.094,00	3,99%
Total, facturado cuenta 2	$ 1.183.854.967,00	6,31%
Total, facturado cuenta 3	$ 2.072.543.691,00	11,04%
Total, facturado cuenta 4	$ 2.365.314.539,00	12,,60%
Total, facturado cuenta 5	$ 1.187.768.479,00	6,33%
Total, facturado cuenta 6	$ 308.148.167,00	1,64%
Total, facturado cuenta 7	$ 331.504,908,00	1,77%
Total, facturado cuenta 8	$ 273.391.184,00	1,46%
Total, facturado cuenta 9	$ 172.182.879,00	0,92%
Total, facturado cuenta 10	$ 266.113.045,00	1,42%
Total, facturado cuenta 11	$ 116,309.904,00	0,62%
Total, facturado cuenta 12	$ $ 293.244.565,00	1,46%
Total, facturado cuenta 13	$ $455.782.972	2,27%

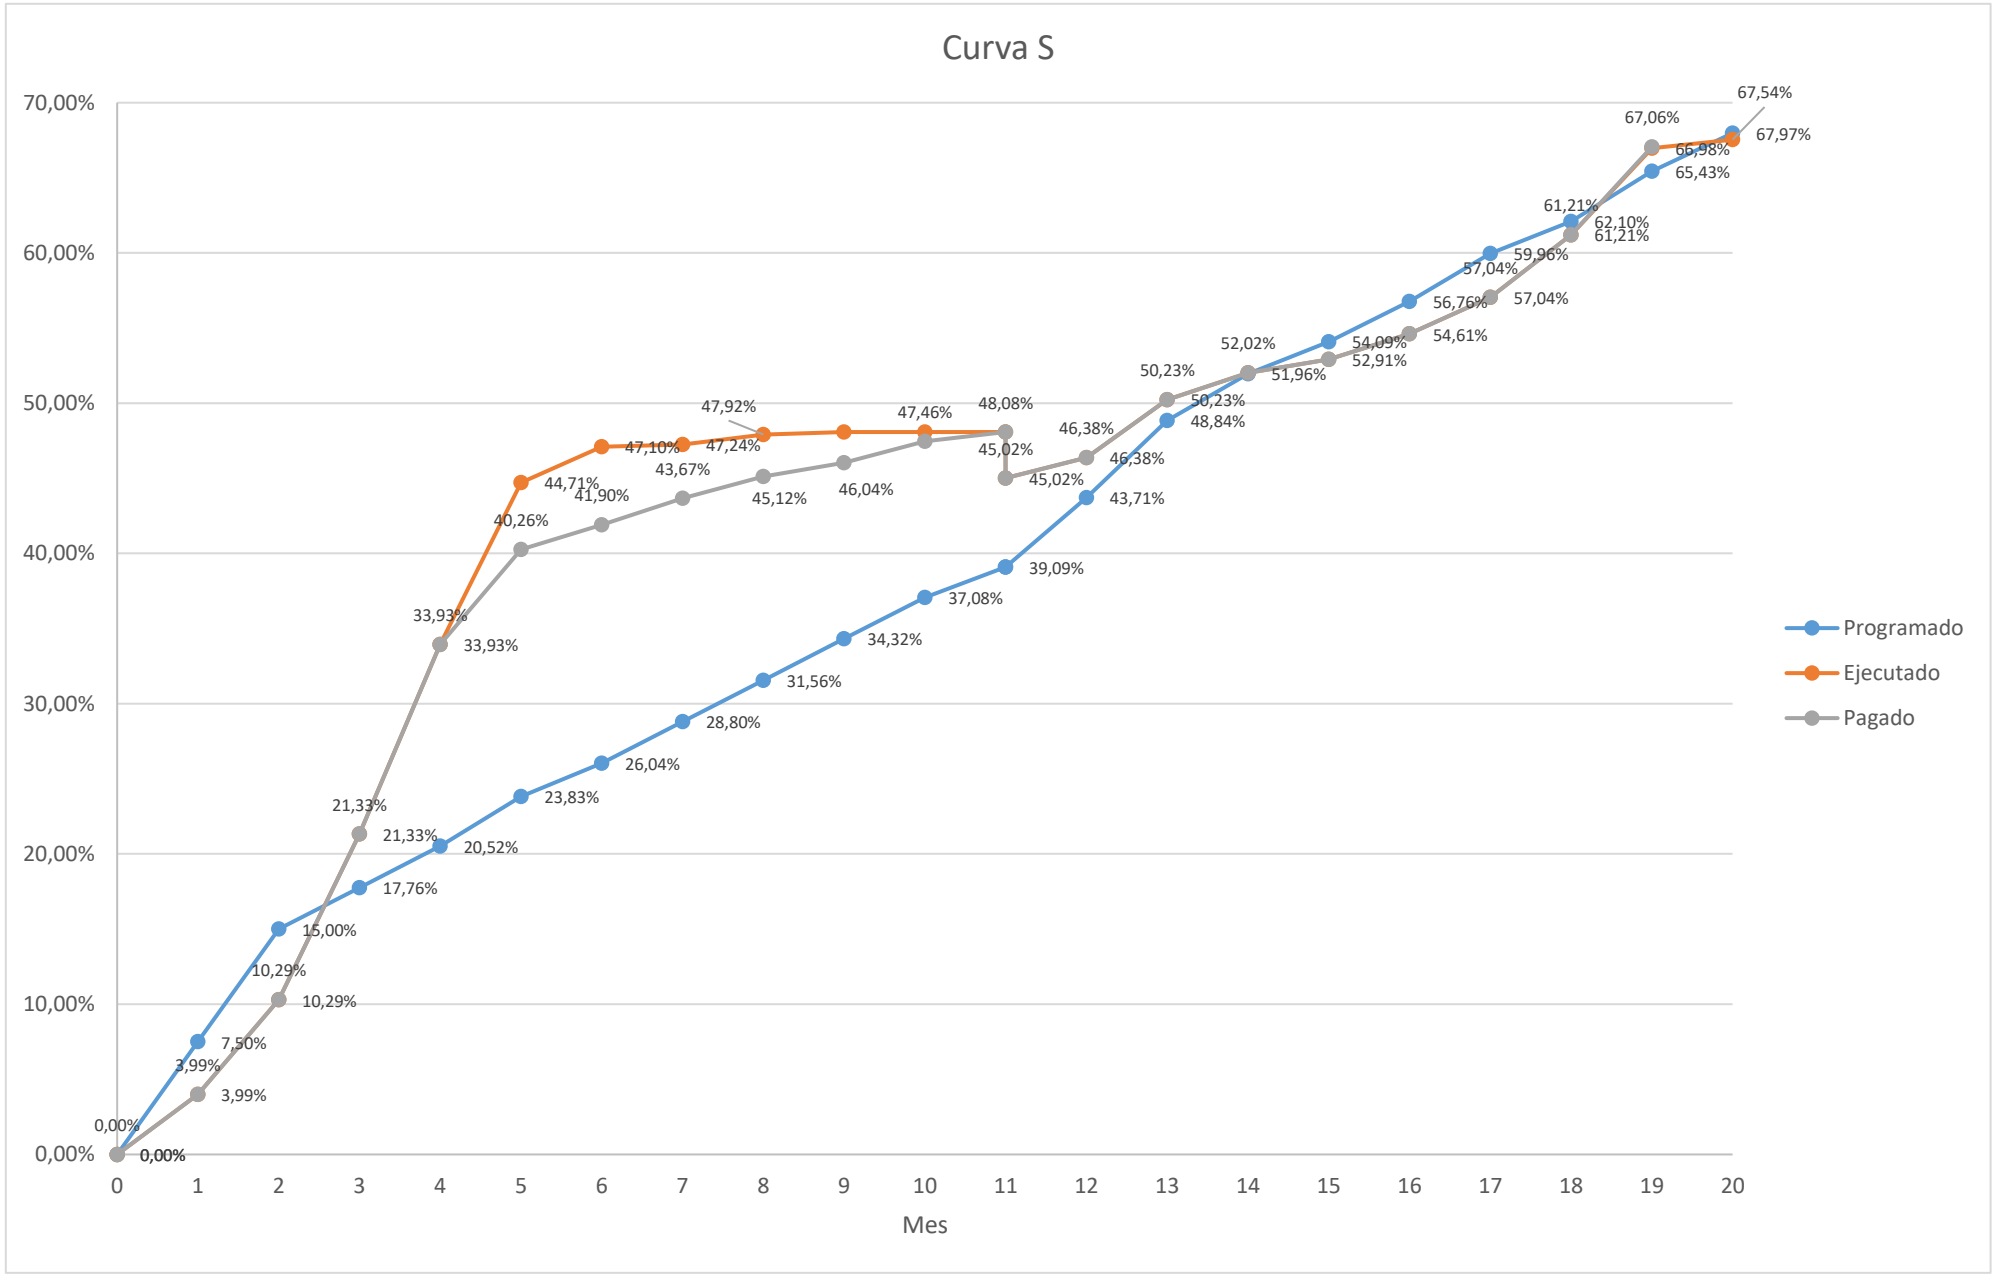
Cuenta	Ejecutado	%Ejecutado
Total, facturado cuenta 14	$ $671.653.453,00	3,35%
Total, facturado cuenta 15	$ $173.900,888,00	0,87%
Total, facturado cuenta 16	$ $386.638.488,00	1,93%
Total, facturado cuenta 17	$ $428.597.879,32	2,14%
Total, facturado cuenta 18	$ $765.527.969	3,82%
Total, facturado cuenta 19	$ $1.244.641.073	6,21%
Total, facturado cuenta 20	$ $136.428.695,00	0,68%

Gráfica 1 Pago efectuado Cuenta 20

Curva S

Las gráficas presentadas a continuación han sido ajustadas con la adición 1.




Curva S
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Mes
Programado
Ejecutado
Pagado
0,00%
0,00%
3,99%
7,50%
10,29%
15,00%
17,76%
20,52%
23,83%
26,04%
28,80%
31,56%
34,32%
37,08%
39,09%
43,71%
48,84%
50,23%
52,02%
54,09%
56,76%
59,96%
61,21%
65,43%
67,06%
67,97%
0,00%
3,99%
10,29%
21,33%
33,93%
40,26%
41,90%
43,67%
45,12%
46,04%
47,46%
45,02%
46,38%
50,23%
51,96%
52,91%
54,61%
57,04%
61,21%
66,98%
67,54%
33,93%
44,71%
47,10%
47,24%
47,92%
48,08%
45,02%
46,38%
43,71%
48,84%
50,23%
51,96%
52,91%
54,61%
57,04%
62,10%
61,21%

28 FACTORES DE SELECCIÓN

Durante el periodo comprendido entre el 3 de septiembre de 2026 y el 2 de octubre de 2026, se dio cumplimiento al reporte, seguimiento y control de las actividades correspondientes a las áreas SST, ambiental, administrativa, técnica, jurídica y demás componentes asociados a la ejecución contractual, conforme a las actividades establecidas en el Plan Gerencial inicial propuesto por el contratista y aprobado por la Interventoría.

En este sentido, se realizó seguimiento al cumplimiento del alcance contractual, control del cronograma de ejecución, seguimiento físico y financiero de las actividades, control de calidad de las intervenciones, gestión documental y administrativa, así como la verificación de recursos técnicos, humanos y operativos requeridos para el desarrollo del contrato.

De igual manera, se ejecutaron actividades de inspección y diagnóstico de sectores priorizados, programación y priorización de intervenciones, seguimiento a PMT, implementación de señalización y dispositivos de seguridad vial, georreferenciación de actividades ejecutadas, control fotográfico, registro en bitácora, validación de actividades por interventoría, manejo de comunicaciones oficiales, informes de seguimiento y control de calidad conforme al plan establecido.

Asimismo, se evidenció cumplimiento en la gestión SST mediante el uso de EPP, aplicación de protocolos de seguridad y seguimiento al personal operativo; en el componente ambiental mediante el manejo adecuado de residuos y mitigación de impactos; y en el componente administrativo y técnico mediante el control de personal, equipos, programación de obra, análisis de precios unitarios y seguimiento a cronogramas específicos.

Las actividades anteriormente relacionadas fueron ejecutadas a cabalidad conforme al plan de trabajo propuesto dentro del Plan Gerencial durante el periodo referido, para los siguientes IDS:

- CP 270
- CP 2226
- MV_10_161_1560_10
- CP 2355
- MV_10_018_092_07
- CP 2515

- BC_10_001_754_19_V3
- EX_10_003_1560_10
- EX_10_004_1560_V6
- EX_10_374_1842_12_V5
- MV_10_055_1789_10_V3
- EX_09_001_1214_15
- MV_AC_13_872_24_T2
- Pasacalles
- SH_SV_ZPP_2470_2021_MULTIPLAZA_V1
- Suministro

29 COMENTARIOS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se presenta una ejecución de contrato en un 67,97% que contrastado con lo programado 67,54% representa una diferencia del -0,43 % por debajo de lo solicitado en el anexo técnico. Se aclara que los valores han sido ajustados, tras la adición N°1 al contrato de obra.

- Se adelantaron inspecciones de varios diseños y la solicitud de planes de manejo de tránsito de los mismo esto con el fin de tener varios frentes activos y lograr nivelar la ejecución.

- Se ejecutan las actividades correspondientes al área social.

- Se ejecutan las actividades correspondientes a gestión de seguridad y salud en el trabajo.

30 ANEXOS

ANEXO 1. Pólizas

ANEXO 2. Plan de Manejo de Tránsito

ANEXO 3. Aspectos Técnicos

ANEXO 4. Reservas

ANEXO 5. Plan de Calidad

ANEXO 6. Protocolo de Manejos y Residuos

ANEXO 7. Certificados de calibración

ANEXO 8. Suministro

ANEXO 9. Señales retiradas en vía

ANEXO 10. Recursos en contrato de obra

ANEXO 11. Gestión social

ANEXO 12. Gestión seguridad y salud en el trabajo

ANEXO 13. Correspondencia

ANEXO 14. Certificación honorarios y parafiscales

ANEXO 15. Balance presupuestal
