
CONTRATO NO. 1105 DE 2022 “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 12”	**CONSORCIO ACI -3B 197**

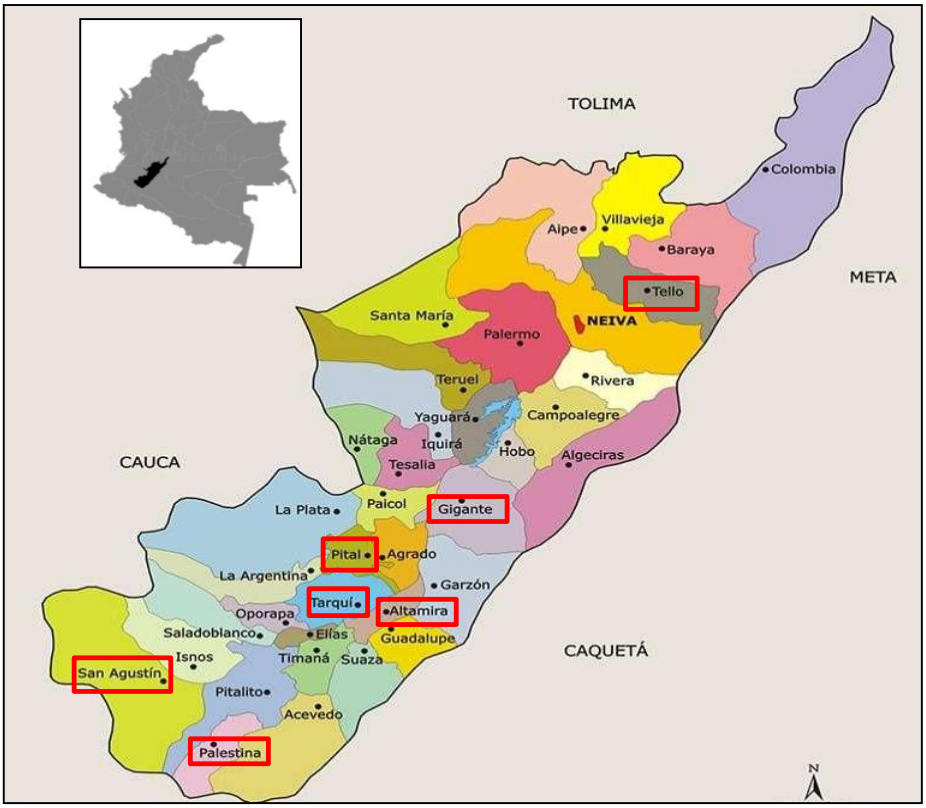


INFORME NO. 13 DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

NEIVA –HUILA, 3 DE OCTUBRE DE 2023

INFORME MENSUAL No. 13	**CONSORCIO ACI – 3B 197**	**DEL 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**
INFORME MENSUAL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		

TITULO DOCUMENTO:		**INTEGRANTES**	
APROBACION	RESPONSABLE POR ELABORACIÓN " Residente de interventoría "	Nombre	Carlos Alberto Villanueva Peñas
		Firma	
		Fecha	05/01/2024
	RESPONSABLE APROBACIÓN "Director de Interventoría"	Nombre	Ing. Andrés Hernán Angarita Beltrán
		Firma	
		Fecha	05/01/2024

INTRODUCCION

COLOMBIA RURAL es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita.

El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de PALESTINA, GIGANTE, SAN AGUSTÍN, EL PITAL, TARQUÍ, TELLO, SAN AGUSTÍN Y ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

A continuación, se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de OCHO (8) Convenios Interadministrativos que se suscribieron entre INVIAS y municipios del Departamento del Huila en la vigencia 2021, del Programa Colombia Rural:

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1804 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1794 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1805 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VÍA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1793 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1842 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1841 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TELLO (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1992 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1993 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE ALTAMIRA (HUILA).

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

"*En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.*" (La subraya no es del texto)

Ante este imperativo legal, el INVIAS encontró necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona, natural o jurídica, que realizará las labores de interventoría de los contratos realizados por los municipios en los convenios indicados anteriormente.

El INVIAS abrió el concurso de méritos abierto CMA-DTE-SEP-197-2021-LOTE 12, quetenía por objeto contratar la interventoría de obra pública para **INTERVENTORÍA TÉCNICA,**

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN MUNICIPIOS DEDEPARTAMENTOS DE COLOMBIA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 12. Finalizado el proceso de evaluación y selección del citado concurso de méritos, la citada interventoría fue adjudicada mediante resolución No. 1715 del 24 de mayo de 2022 al proponente No 124 **CONSORCIO ACI – 3B 197,** consorcio conformado por ACI PROYECTOS SAS, sociedad identificada con el NIT. 860.059.851-6, con un porcentaje de participación del 60%, y 3B PROYECTOS SAS, sociedad identificada con el NIT. 900.504.398-4, con un porcentaje de participación del 40%.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA	
Proceso de selección:	CMA-DTE-SEP-197-2021-LOTE 12
Contrato:	1105 de 2022
Fecha de Suscripción	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 12
Interventor:	CONSORCIO ACI – 3B 197
Integrantes:	ACI PROYECTOS S.A.S. con NIT 860.059.851-6, con participación del 60% Y 3B PROYECTOS S.A.S. con NIT 900.504.398-4 con participación del 40%
NIT:	901.598.587-6
Valor inicial:	$ 1.098.134.737 INCLUIDO IVA
Adiciones:	0
Valor actualizado:	$ 1.098.134.737 INCLUIDO IVA
Modificaciones:	0
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023
Prórroga:	0
Fecha de inicio:	23 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Dirección:	CR 7 No. 156-10 EDIF TORRE KRYSTAL PISO 31, BOGOTÁ
Teléfono:	3115412555

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el presente periodo la residencia de Interventoría realizó actividades administrativas y de campo del contrato de interventoría , así como seguimiento al estado de los contratos de obra que tienen orden de inicio, así como el seguimiento de los procesos que han sido adjudicados lo cual requieren acompañamiento permanente por parte de la interventoría con el fin de aclarar las dudas y aclaraciones de cada contratista de obra y oficinas de secretarias de planeación de cada uno de los proyectos a ser supervisados por el contrato de interventoría No. 1105 de 2022 así como la visitas a los proyectos para definir el alcance real de las obras y la socialización de los proyectos que haya a lugar.

Durante este periodo se continuó ejecutando las actividades del contrato LP-001-2023 derivado del convenio No. 1793-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de Pital, ubicado en el departamento del Huila, en donde se estan interviniendo la vías hacia las veredas El Uvital, Cauchal Y los Olivos.

El contratista de obra dio continuidad a la construcción de filtros para vía y el corte y el figurado de acero para placa huella en la vereda los Olivos. Se realizó la construcción de la placa Huella en la Vereda El Uvital en su totalidad.

Durante este periodo se continuo ejecutando las actividades del contrato de obra número 001-2023 derivado del convenio No. 1842-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de Tarqui, ubicado en el departamento del Huila, en donde se continuo con las actividades de demolición de alcantarillas existentes, excavación varias sin clasificar, Instalación de tubería de 36", Concreto clase F y D para construcción de alcantarilla de 36" en las veredas Rica brisa y Bellavista, se dio continuidad a la actividades de construcción de placa Huella en la vereda Bellavista y Ricabrisa.

Durante este periodo se continuó ejecutando las actividades del contrato de obra número LP-001-2023 derivado del convenio No. 1993-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de Altamira, ubicado en el departamento del Huila, El contratista de obra termino con la construcción de placa huella de los tramos 1 y 2 y con la construcción de las alcantarillas de 36" faltantes en la vereda Pajiji.

Durante este periodo se continuo ejecutando las actividades del contrato de obra número LP-001-2022 derivado del convenio No. 1804-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de Palestina, ubicado en el departamento del Huila, El contratista de obra termino con las actividades de Relleno para estructuras para construcción de los muros de

contención ubicados en el Km 4+300 y K7+420 y con la construcción de las alcantarillas de 36" en la vereda San Isidro- El Silencio, se dio aprobación por parte del ministerio de transporte de la caracterización vial del corredor.

Durante este periodo se continuó ejecutando las actividades del contrato de obra número 008-2022 derivado del convenio No. 1992-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de San Agustín, ubicado en el departamento del Huila, El contratista de obra termino con las actividades de construcción de placa huella en el tramo No 1 y 2 y se tramito ante el ministerio de transporte la caracterización vial del corredor.

Durante este periodo se continuó ejecutando las actividades del contrato de obra número 007-2022 derivado del convenio No. 1805-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de San Agustín, ubicado en el departamento del Huila, El contratista de obra continuo con las actividades de construcción de placa huella en la vereda Arauca Pedregal y la vereda Quinchana. Se realizo por parte del contratista de obra el trámite para el radicado de la caracterización vial del corredor.

Durante este periodo se continuo ejecutando las actividades del contrato de obra número 060-2023 derivado del convenio No. 1841-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de San Tello, ubicado en el departamento del Huila, El contratista de obra continuo con las actividades de Excavaciones varias sin clasificar, conformación de calzada y extendida-compactación de material de subbase granular, fundida en concreto MR: 4,0 Mpa para placa de pavimento rígido y concreto de 3000 psi para cunetas de la vía que conduce al centro poblado San Andrés. Se continuaron con las actividades de construcción del muro de contención con la fundida de la zarpa en concreto de 3000 psi.

Durante este periodo se continuo con las actividades del contrato de obra número 274-2023 derivado del convenio No. 1794-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de Gigante, ubicado en el departamento del Huila, El contratista de obra continuo con las actividades de construcción de alcantarillas de 36" vereda el Cogollo y el Piñal, se continuo con las actividades de placa huella en la vereda El Cogollo y construcción de filtros para via en la vereda el Piñal.

Los contratos de obra de cada uno de los ocho (08) contratos derivados de los convenios 1804, 1794, 1805, 2257, 1793, 1842, 1841, 1992, y 1993 de 2021 celebrados por el INVIAS y los Municipios de Palestina, Gigante, San Agustín, El Pital, Tarqui, Tello, San Agustín y Altamira, respectivamente, ubicados todos en el departamento del Huila, se encuentran en etapas de ejecución y terminación de obra a los cuales se realizara el respectivo tramite de liquidación aun surtan los efectos de las observaciones que haya a lugar por parte de la interventoria.. Los contratos productos de los convenios 1805, 1804, 1992,1793, 1842,

1841,1992 y 1993 de 2021 con los municipios de San Agustín, Palestina, Tello, Tarqui, Altamira, Pital y Gigante respectivamente, a los que esta interventoría ha acompañado y participado en la prórroga de cada convenio y contrato de esos proyectos, así como el desarrollo y aclaraciones que cada contratista haya realizado para la finalización correcta de los proyectos.


REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1. Vía Pedregal. Contrato No. 007 de 2022. Excavaciones varias sin clasificar y extendida de material de afirmado, Construcción Placa Huella Vereda Pedregal.



Fotografía 1. Vía Pedregal. Contrato No. 007 de 2022. Acero de refuerzo, piedra pegada y Concreto Clase D, para huellas y riostras, Construcción Placa Huella Vereda Pedregal

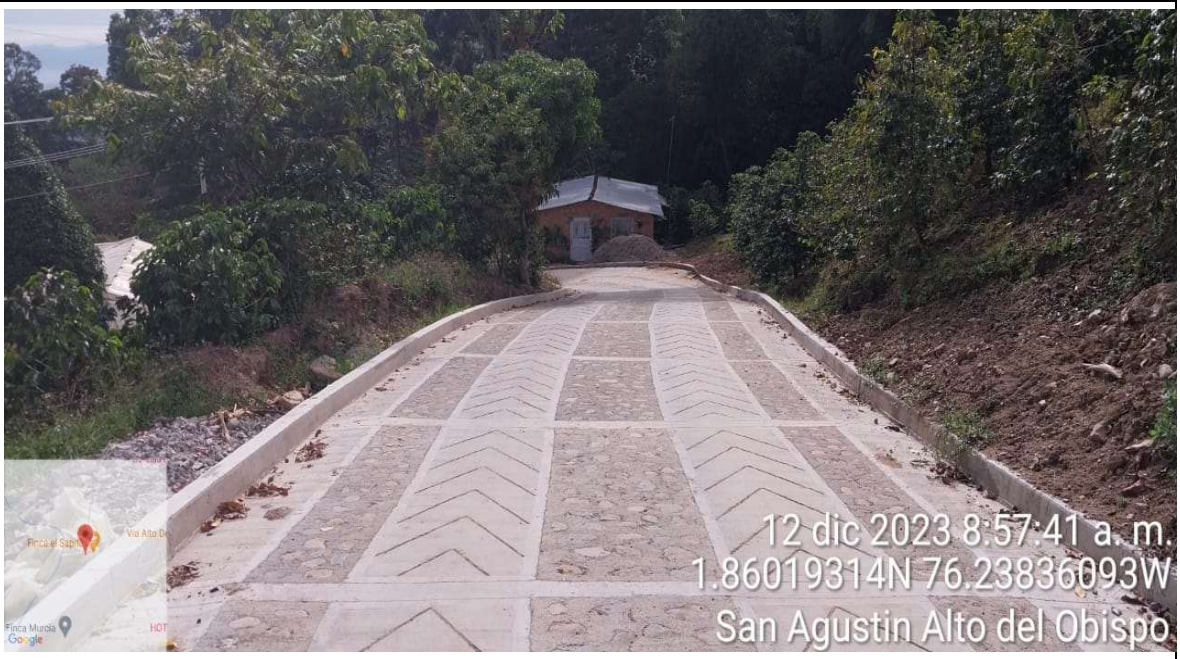

Fotografía 2. Contrato No. 008 de 2022. Construcción Placa Huella, Tramo 1 Vía hacia el centro Poblado El Obispo



Fotografía 3. Contrato No. 008 de 2022. Construcción Placa Huella, Tramo 2 Vía hacia el centro Poblado El Obispo



Fotografía 5. Contrato LP- 001 de 2022. Vía hacia la Vereda El Silencio, Muro de Contención K4+300.



Fotografía 6. Contrato LP- 001 de 2022. Vía hacia la Vereda El Silencio, Muro de Contención K7+420.



Fotografía 7. Contrato No. 060-2023 Tello. Instalación Acero de refuerzo y fundición Zarpa en concreto 21 Mpa para Construcción Muro de Contención en el corredor de la vía hacia el centro poblado San Andrés.



Fotografía 8. Contrato No. 060-2023 Tello. Construcción pavimento rígido en el corredor de la vía hacia el centro poblado San Andrés.



Fotografía 9. Contrato LP- 001 de 2022, Sello de Juntas, Construcción de Placa Huella Vía hacia la Vereda Pajiji Altamira.



Fotografía 10. Contrato LP- 001 de 2022. Construcción Alcantarillas y rellenos con recebo, Vía hacia la Vereda Pajiji Altamira.



Fotografía 11. Contrato LP- 001 de 2023, El Pital, Instalación Acero de refuerzo, placa piedra pegada, Concreto clase D para Huellas, riostras y cunetas, construcción Placa Huella Vereda Los Olivos.



Fotografía 12. Contrato LP- 001 de 2023, El Pital, Instalación Acero de refuerzo y concreto clase D para huellas y riostras, Construcción de Placa Huella Vereda Los Olivos.



Fotografía 13. Contrato No 001 de 2023, Tarqui, Construcción de Placa Huella Vereda Ricabrisa



Fotografía 14. Contrato No 001 de 2023, Tarqui, Construcción de Placa Huella Vereda Bellavista.



Fotografía 15. Contrato No 274 de 2023, Gigante, Construcción Placa Huella y rampa de acceso, Construcción de Placa Huella en la Vereda el Cogollo.



Fotografía 16. Contrato No 274 de 2023, Gigante, Construcción Alcantarilla Vereda El Piñal.
