INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO DE OBRA No. MC-075-2026

CONVENIO		CONTRATO	X	TIPO	CONTRATO DE OBRA		
No. Contrato	MC-075-2026		Fecha de suscripción del contrato		DÍA	MES	AÑO
					14	09	2026
Objeto del Contrato:	**DESMONTE Y CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ALTA MOVILIDAD PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ, 2026.**						
Supervisor:	**DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA** Secretario de Planeación e Infraestructura SUPERVISOR						
Contratista:	**RONEL ARTURO GARCES ANZOLA** **C.C 9.498.187 de Otanche** **Carrera 1 # 6 – 47 Barrio Danubio** **Otanche – Boyacá**						

TIEMPO DE EJECUCIÓN	DÍA	MES	AÑO
Fecha de inicio	15	09	2026
Fecha de Terminación Inicial	29	09	2026
Fecha de Terminación final	14	10	2026

Valor inicial del contrato:	$ 5.499.999.00	**Valor Adición:** $ 0.0	
Valor total del Contrato:	$ 5.499.999.00		
Duración inicial del contrato:	TREINTA (30) DIAS)	**Prorroga según otro si: N/A**	
Duración del contrato:	Quince (15) días		
Registro Presupuestal:	**No.**	**Código Presupuestal:**	**Denominación Presupuestal:**
	2026091400003	2.3.2.02.02.009.09	Mantenimiento y expansión de alumbrado público.
		2.3.2.02.02.009.09	Mantenimiento y expansión de alumbrado publico


ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO

DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 5.499.999.00	
(+) Valor Adición	$ 0,00	
(=) Valor total contrato	$ 5.499.999.00	
(-) Anticipo		
(-) Valor actas parciales		$ 0,00
(-) Valor a pagar presente acta		$ 5.499.999.00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 5.499.999.00	$ 5.499.999.00

De acuerdo a ejecución del contrato en referencia, el contratista **RONEL ARTURO GARCES ANZOLA** Identificado con C.C: 9.498.187 expedida en Otanche, (teléfono 3118055945, correo electrónico karenalexandragualterosgarces@gmail.com, cumplió a cabalidad con el objeto del contrato **MC-075-2025 DESMONTE Y CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ALTA MOVILIDAD PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ, 2026.**se realizo al 100% la ejecución de las siguientes actividades a continuación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	GENERAL	PARTICULAR	UNIDAD	CANT	DIST
1	**PRELIMINARES**					
1,1	DESMONTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED - 40W DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES INCLUYE ACCESORIOS		PARTICULAR	UND	55	0%


El presente informe describe las actividades ejecutadas durante el periodo del 15 de septiembre del 2026 al 29 de septiembre del 2026, con un porcentaje del 100% donde se realizó la instalación de las lluminarias led en diferentes partes del municipio de Otanche, luminarias instaladas para iluminación de las vías públicas en los Barrios Centro, Porvenir, Acapulco, el Bosque, Danubio y El Carmen, vía central, vereda centro, en cumplimiento del objeto contractual.

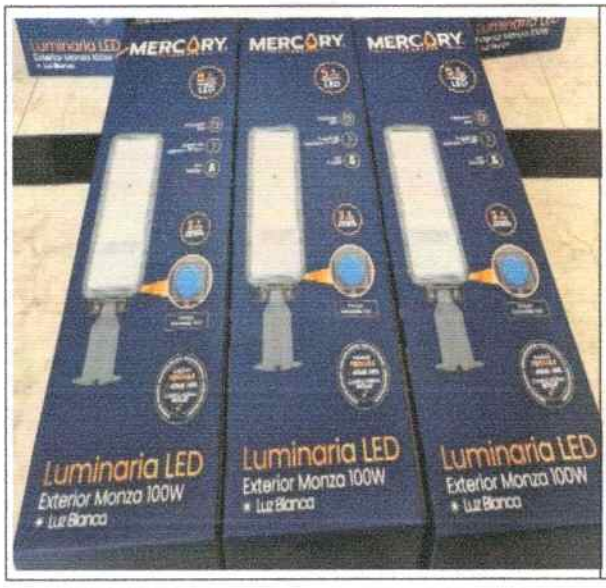







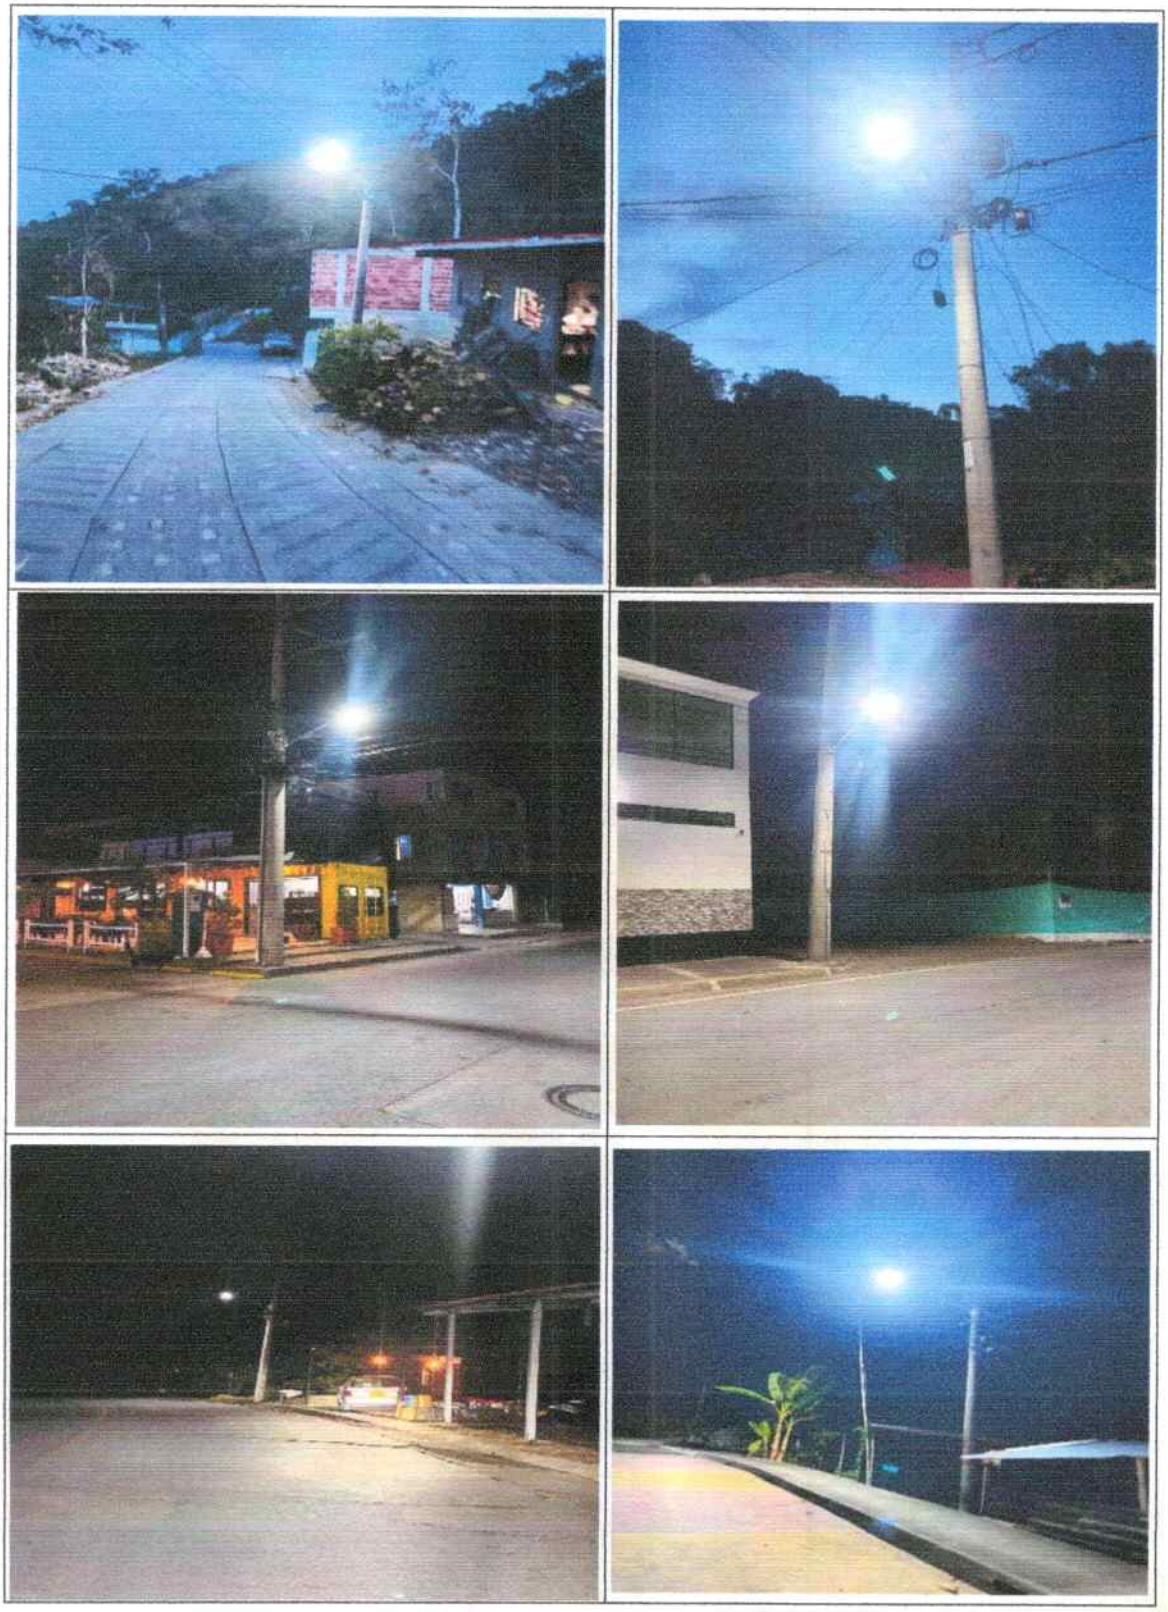



Documentos originales que reposan en la carpeta del contrato de obra No. MC-075-2026.

DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Proyectó: Yency escobar
Revisó: DUAR FABIAN FRANCO
Archivado en: CONTRATO DE OBRA No. MC-075-2026.

Administración Municipal 2024- 2027	República de Colombia – Departamento de Boyacá Municipio de Otanche PROCESO: CONTRATACION NIT 891.801.362-1		
CODIGO: SG210	INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL	FECHA 11/03/2024	VERSION: 1

CIUDAD Y FECHA	OTANCHE 02 DE OCTUBRE DEL 2026						
CONTRATISTA:	RONEL ARTURO GARCES ANZOLA			C.C. O NIT:	C.C 9.498.187 de Otanche		
REPRESENTANTE LEGAL (cuando aplique)							
RÉGIMEN DEL IMPUESTO DE VENTAS	COMUN	X	SIMPLIFICADO	0	TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA	
Nº CONTRATO: MC-075 -2026	AÑO CONTRATO:	2026	VIGENCIA DESDE:	15-sep-2026	HASTA:	14-oct-2026	
OBJETO DEL CONTRATO	DESMONTE Y CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ALTA MOVILIDAD PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ, 2026.						
PERIODO DE PAGO:	DESDE:	15-sep-2026	HASTA:	29-sep-2026	PAGO No.	1	
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y CARGO O INTERVENTOR:	DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA						

ESTADO DE CUENTA DEL CONTRATO		
DETALLE	(+)	(-)
(+) Valor inicial del contrato	$ 5.499.999,00	
(+) Valor adiciones	$ 0,00	
(=) Valor total contrato	$ 5.499.999,00	
(-) Anticipo		
(-) Valor pagos parciales		$ 0,00
(-)Valor a pagar		$ 5.499.999,00
(-) Valor pendiente de ejecución		$ 0,00
SUMAS IGUALES	$ 5.499.999,00	$ 5.499.999,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($ 5.499.999,00) M/CTE

Administración Municipal 2024- 2027	República de Colombia – Departamento de Boyacá Municipio de Otanche PROCESO: CONTRATACION NIT 891.801.362-1		
CODIGO: SG210	**INFORME DE EJECUCION CONTRACTUAL**	**FECHA 2024/03/11**	**VERSION: 1**

(*) El valor de los pagos correspondientes a los aportes obligatorios en salud, pensión y Fondo de Solidaridad Pensional deben estar calculados con base en el 40% de los honorarios mensuales (sin incluir IVA); en este valor deben estar excluidos los intereses de mora si estos fueron causados, en ningun caso puede ser inferior al salario minimo mensual legal vigente.. (**)Todos los empleadores, persona natural o jurídica, público o privado que empleen uno o más trabajadores permanentes, están obligados a pagar aportes parafiscales a la Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF. (***) Sujetos pasivos del impuesto para la equidad CREE

NUMERO PLANILLA DE APORTES	9512407970	**APORTES OBLIGATORIOS EN SALUD(*):**	$ 109.500,00	**APORTES OBLIGATORIOS EN PENSIÓN (*)**	$ 140.100,00	**APORTES ARL (*):**	$ 4.600,00		
VALOR APORTES SENA(**)		**VALOR APORTES ICBF (**)**		**VALOR APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN (**)**		**AUTORRETENEDOR CREE (***)**			

	RELACION DE OBLIGACIONES DESARROLLADAS	PORCENTAJE DE EJECUCION
1	**DESMONTE Y CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ALTA MOVILIDAD PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ, 2026.**	100,0%
4	ANEXO SABANA DE INFORME	

ANEXA INFORME DE ACTIVIDADES	SI	X	NO		TOTAL ANEXOS	No, FOLIOS		CD	N/A
NOTA: LOS ANEXOS MENCIONADOS REPOSAN EN LA CARPETA CONTRACTUAL, EN LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MUNICIPIO.									

* ***En mi calidad de contratista certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de los aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a***

RONEL ARTURO GARCES ANZOLA
C.C 9.498.187 de Otanche
Carrera 1 # 6 – 47 Barrio Danubio
CONTRATISTA

CERTIFICACION DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR DEL CONTRATO

* ***En mi calidad de supervisor y/o interventor del Contrato de obea MC-075.-2026-arriba relacionado, certifico el cumplimiento de las obligaciones establecidas segun las evidencias verificadas, para el periodo del informe.***

DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

ASTRID KARINA HERNÁNDEZ PÁEZG
Alcaldesa Municipal Encargada
Decreto No. 099 del 30 de septiembre del 2026.

Administración Municipal 2024 - 2027	República de Colombia Departamento de Boyacá **Alcaldía Municipal de Otanche** Nit. 891.801.362-1	Código: SP&IOP-GSCC Versión: 01 Fecha: 04/12/2023	mipg
	Secretaria de Planeación e Infraestructura	Página 1 de 1	

LA SUSCRITA SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE OTANCHE - BOYACA

C E R T I F I C A:

Que, **RONEL ARTURO GARCES ANZOLA** identificado con cedula de ciudadanía C.C 9.498.187 de Otanche – Boyacá., en calidad de CONTRATISTA cumplió con el objeto del contrato de obra No. **MC-075-2026**, el cual tiene como objetivo principal: **DESMONTE Y CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ALTA MOVILIDAD PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ, 2026.** periodo correspondiente desde el día quince (15) del mes de septiembre del 2026 – hasta el día veintinueve (29) del mes de septiembre del 2026, de acuerdo a las especificaciones descritas en el contrato:

CONTRATO No:	MC-075-2026
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$5.499.999.00
OTRO SI	$ 00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$5.499.999.00
VALOR ACTAS PARCIALES	$.000
VALOR PRESENTE ACTA	$5.499.999.00
VALOR PENDIENTE POR EJECUCION	$ 00

Que, **RONEL ARTURO GARCES ANZOLA C.C 9.498.187 de Otanche – Boyacá.**, en calidad de CONTRATISTA Régimen ha cumplido con el pago de seguridad social.

Para constancia se firma al segundo (02) días del mes de octubre del 2026,

DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

Administración Municipal 2024 - 2027	República de Colombia Departamento de Boyacá **Alcaldía Municipal de Otanche** Nit. 891.801.362-1	**Código: SG**	mipg modelo integrado de planeación y gestión
		Versión: 01	
		Fecha: 04/12/2023	
	Secretaria de gobierno	**Página 1 de 1**	

ACTA DE SALIDA ALMACEN MUNICIPAL

CONTRATO DE OBRA No. MC-075-2026, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OTANCHE (BOYACÁ) Y RONEL ARTURO GARCES ANZOLA identificado con C.C. **9.498.187** de Otanche en calidad de CONTRATISTA

FECHA DE SALIDA: 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2026 **HORA: 8:30 a.m.**

CONTRATISTA: **RONEL ARTURO GARCES ANZOLA**
C.C. 9.498.187 de Otanche

SUPERVISORA DEL CONTRATO **DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA**
Secretario de Planeación e Infraestructura

ALMACENISTA MUNICIPAL: **JOSE GILDARDO ESCARRAGA SAAAVEDRA**
Almacenista municipal

MATERIALES ENTREGADOS

DESMONTE Y CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ALTA MOVILIDAD PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ, 2026			
ITEM	**DESCRIPCION**	**UN/MEDIDA**	**CANTIDAD**
1	**DESMONTE Y CAMBIO DE LUMINARIAS LED EN LOS DIFERENTES PUNTOS DE ALTA MOVILIDAD PERTENECIENTES AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OTANCHE BOYACÁ, 2026**	UND	55

FIRMA ALMACENISTA MUNICIPAL: Jose Gildardo Escarraga S
JOSE GILDARDO ESCARRAGA SAAVEDRA
ALMACENISTA MUNICIPAL

SUPERVISOR DEL CONTRATO: **DUAR FABIAN FRANCO CASTAÑEDA**
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

CONTRATISTA: Ronel A Garces D
RONEL ARTURO GARCES ANZOLA
C.C. 9.498.187 de Otanche
CONTRATISTA
