INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. SBV-CD-CVI-235-2025	
*Informe Parcial: **X*** *No. Del Informe: 5*	*Informe Final:*
Periodo del Informe: 29 de junio de 2026 al 28 de agosto de 2026	
Fecha en la que se rinde en informe	*02 de octubre de 2026*

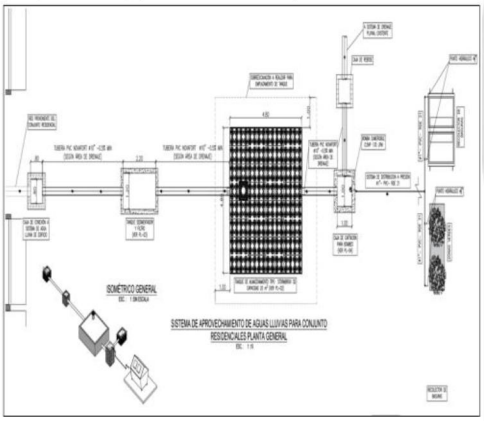
1. INFORMACIÓN GENERAL	
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DIANA CAROLINA POSADA RUEDA
IDENTIFICACIÓN	CC 1.010.214.835 DE BOGOTÁ
CARGO	DIRECTORA
ÁREA	DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA - SECRETARIA DE BIENESTAR VERDE
PARTE DEL CONVENIO	EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A E.S.P
IDENTIFICACIÓN	NIT.900.222.346-0
SUPERVISOR DESIGNADO	LUCY ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ
IDENTIFICACIÓN	52.655.365 DE VILLETA
CARGO	SUBGERENTE TÉCNICA Y OPERATIVA
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS INNOVADORES DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS ATMOSFÉRICAS, ORIENTADOS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO, LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN SOBRE LOS ACUEDUCTOS, CONFORME A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
FECHA DEL CONVENIO	20 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	28 DE OCTUBRE DE 2025

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	7100070490 DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	4600032263 del 23 de octubre de 2025
VALOR INICIAL DEL PROYECTO	$2.128.453.598
ADICIÓN	N.A
VALOR TOTAL DEL PROYECTO	$2.128.453.598
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
MODIFICACIÓN AL CRONOGRAMA	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	VEINTICUATRO (24) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	27/10/2027
SUSPENSIÓN (SEGÚN APLIQUE)	N.A
FECHA DE SUSPENSIÓN (SI SE LLEVÓ A CABO)	N.A
FECHA DE REINICIO (SI SE LLEVÓ A CABO)	N.A
CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA	N.A

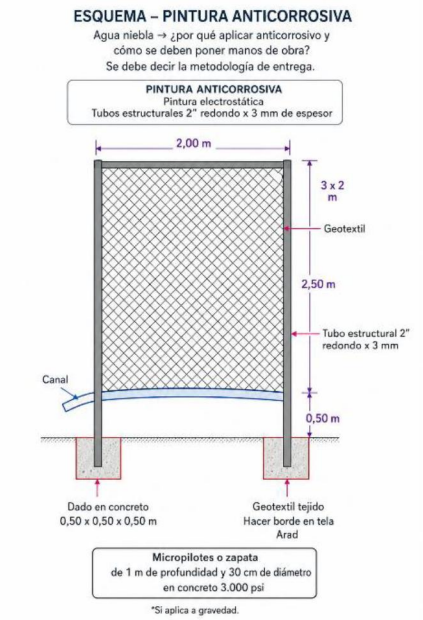
2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Con el fin de dar cumplimiento al Convenio “AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA IMPLEMENTAR SISTEMAS INNOVADORES DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS ATMOSFÉRICAS, ORIENTADOS A LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL RECURSO HÍDRICO, LA REDUCCIÓN DE LA PRESIÓN SOBRE LOS ACUEDUCTOS, CONFORME A LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.”, se adelantaron las siguientes actividades.

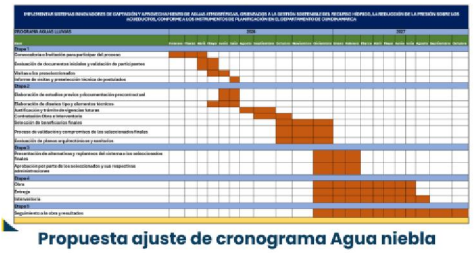

PRODUCTOS	EJECUCIÓN DE AVANCE	SOPORTE	PORCENTAJE DE AVANCE
Propuesta de evaluación de postulados en campo y visitas técnicas	Se realiza la propuesta de complementar visitas a los postulados para instalación de sistemas de aprovechamiento de agua niebla, con la finalidad de complementar la información remitida en el marco de la convocatoria y la verificación documental en contacto directo con los postulados; para el sistema atrapaniebla se revisará las condiciones del entorno y condiciones propias de abastecimiento; esto dado que un número de postulados al programa cuentan con suministro de agua 24 horas al día.	Adjunto en el: Anexo 1_Comite_SBV235-2025_EPC_0926	50%

PRODUCTOS	EJECUCIÓN DE AVANCE	SOPORTE	PORCENTAJE DE AVANCE
	Esto permite priorizar los postulados por el nivel de vulnerabilidad hídrica**,** identificando qué familias o predios tienen una mayor deficiencia de acceso al agua y, por ende, donde el sistema de captación y almacenamiento generará un mayor impacto. Para garantizar una asignación de puntuación se elaborará una matriz técnica de ponderación y evaluación para los postulados. Esta herramienta permitirá seleccionar de manera objetiva a los usuarios mediante los criterios de selección. Se propone organizar y realizar las visitas de campo para el sistema atrapanieblas el mes de octubre de 2026. Es importante resaltar que estos sistemas no serán la fuente principal o única de abastecimiento de agua potable para los usuarios. Su propósito es actuar como un sistema alternativo, complementario y de soporte, destinado a reducir la presión sobre las fuentes tradicionales o acueductos.		
Prediseños tipo y especificaciones técnicas de los sistemas	Consolidación y ajuste de los prediseños tipo para los sistemas de captación: **Sistema Agua Lluvia:** Esquema de captación en cubiertas, trampas de sedimentos, tanque modular (20 m^3), electrobomba sumergible 0.5 HP (130 LPM) y red de uso no potable.  **Sistema Agua Niebla:** Estructura en tubo estructural de 2" × 3 mm anticorrosivo, dados de cimentación (3.000 psi), malla/geotextil (9 m^2), tanque de ultrafiltración y almacenamiento (250 L a 1.000 L).	Adjunto en el: Anexo 1_Comite_SBV235-2025_EPC_0926. Anexo 3_DISEÑO ATRAPANIEBLA	100%

GOBº LIBRE E INDEPTE DE CUNDINCA

PRODUCTOS	EJECUCIÓN DE AVANCE	SOPORTE	PORCENTAJE DE AVANCE
	 Se establece que EPC debe constituir y estructurar un comparativo de alternativas técnicas del sistema de atrapanieblas (materiales, resistencia, eficiencia) para la selección definitiva a solicitud de la Secretaría de Bienestar Verde y reevaluar su costo con respecto a la contratación derivada del convenio.		
Consolidación de Vigencias Futuras para obra e interventoría	Distribución presupuestal: $264.000.000 (15% - Vigencia 2026) y $1.496.000.000 (85% - Vigencia 2027) para el contrato de obra ($1.760.000.000 total). Distribución presupuestal: $264.000.000 (15% - Vigencia 2026) y $1.496.000.000 (85% - Vigencia 2027) para el contrato de obra ($1.760.000.000 total). • Presupuesto estimado de interventoría por $240.000.000.	Adjunto en el: Anexo 4_ VIGENCIAS FUTURAS	100%

Calle 24 #51-40 Bogotá D.C.
Edificio Capital Tower-Pisos 7 y 11
Código Postal: 111321 – Teléfono: 7954480
contactenos@EPC.gov.co
www.EPC.gov.co
@EPCUNDI

PRODUCTOS	EJECUCIÓN DE AVANCE	SOPORTE	PORCENTAJE DE AVANCE
Propuesta de cronograma ajustado 2026–2027 por etapas	Esta reprogramación responde a la necesidad técnica y administrativa de articular las fases de contratación de obra e interventoría con la aprobación del cupo de vigencias futuras. Esta propuesta específica 8 meses para la construcción de los sistemas y 9 meses para la interventoría técnica. Esta planificación se somete a consideración y validación formal del Comité Técnico del Convenio. **Propuesta ajuste de cronograma Agua Lluvia**  **Propuesta ajuste de cronograma Agua niebla** 	Adjunto en el: Anexo 2_Cronograma_EPC_0926	100%
Reporte financiero y entrega de rendimientos financieros del convenio	Entrega formal del reporte de rendimientos financieros generados por la cuenta bancaria del Convenio Interadministrativo No. SBV-CD-235-2025, acompañados del soporte detallado de extractos bancarios mensuales correspondientes al periodo comprendido desde diciembre de 2025 hasta agosto de 2026.	Adjunto en el: Anexo 6_RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EXTRACTOS BANCARIOS	100%
Total avance	**36%**		

LUCY ADRIANA HERNANDEZ HERNANDEZ
SUBGERENTE TÉCNICA Y OPERATIVA
EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA E.S.P

Elaboró: Yury Andrea Castellanos García / Contratista Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P.
Revisó: Martín Alfonso Vargas Vega / Contratista Empresas Públicas de Cundinamarca S.A E.S.P
