
SE instalo un aire de 24000 b tu

Reporte técnico de trabajos realizados en la institución Liceo de Bolívar

## Sede principal

## Salón audiovisuales

al aire piso techo de 5 TR  se le hizo cambio del capacitor de marcha de 70 microfaradios y se procedió hacer el mantenimiento a dicho aire

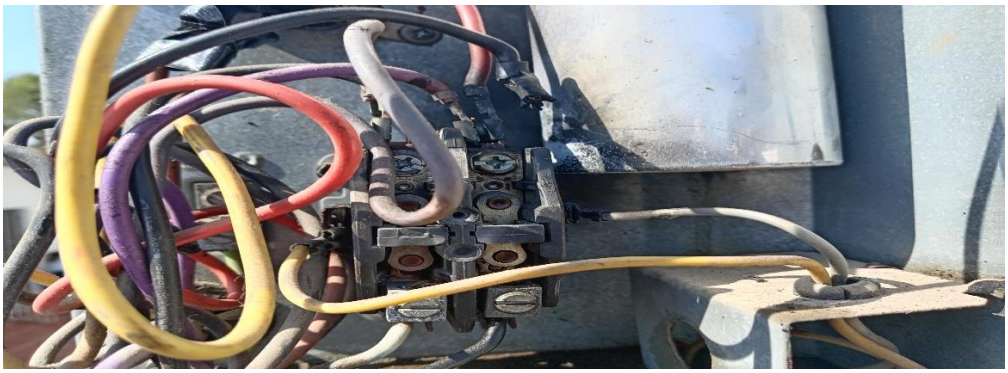


## oficina del simag

aire mini Split de 24000btu.se le realizo mantenimiemto y cambio del fan coil

l 







## Salon bilinguismo


SE instalo un aire de 24000 b tu



Se le realizo mantenimiento preventivo a un aire de  24000 btu

## Salon del pae

Se reparo una nevera que tenia fuga interna.se reemplazo la tuberia interna se cambio filtro secador se le hizo vacio y se volvio a realizar el catgue de refrigerante

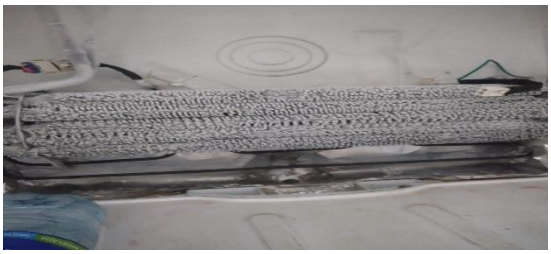



## Biblioteca

Se realizo manteniento preventivo a un aire de 5 toneladas de modelo mpiso techo







**Salon  media tecnica**

**RECTORiA**



SE instalo un aire de 24000 b tu

Se realizo cambio de tarjeta electronica y se le hizo mantenimiento

## coordinacion





## Sede 11 de noviembre



Se le hizo cambio de tarjeta electronica de un aire de 18000 btu

## Salon de sistema



Se ~~desinstalo~~ un aire de 36000btu y se instaló un aire de 24000´

