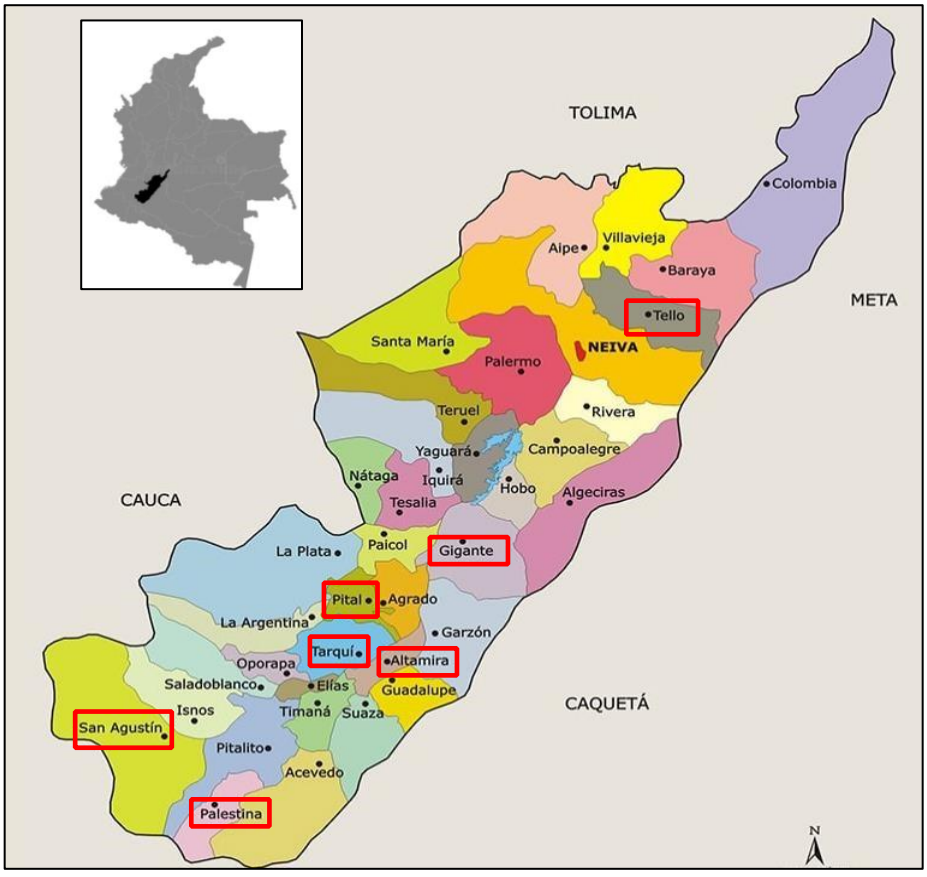


INFORME NO. 07 DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2023

NEIVA –HUILA, 5 DE JULIO DE 2023

INFORME MENSUAL No. 06	**CONSORCIO ACI – 3B 197**	**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2023**
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		

Distribución de copias:

No.	Destinatario
1	INVIAS - Bogotá
2	INVIAS – Territorial Huila
3	CONSORCIO ACI - 3B 197-Bogotá
4	CONSORCIO ACI - 3B 197-Huila


TITULO DOCUMENTO:		**INTEGRANTES**	
APROBACION	POR RESPONSABLE ELABORACIÓN " Secretaria "	Nombre	Ángela María Artunduaga Correa
		Firma	
		Fecha	05/06/2023
	ÓN RESPONSABLE APROBAC "Director de Interventoría"	Nombre	Ing. Andrés Hernán Angarita Beltrán
		Firma	
		Fecha	05/06/2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 14
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 16
2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....19
2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS 21
2.2.1. PALESTINA-SAN ISIDRO-EL SILENCIO:.....21
2.2.2. TRAMOS: EL SALADO, EL COGOLLO, ALTO COROZAL-SECTOR LA CUMBRE, .21
ALTO SILVANIA, EL PIÑAL, LA VEGA.....21
2.2.3. VÍA HACIA EL CENTRO POBLADO RURAL ALTO DEL OBISPO 22
2.2.4. VÍA LOS OLIVOS-EL CAUCHAL-EL UVITAL.....22
2.2.5. VÍA A VEREDAS EL TAMBO, MERCEDES, RICA BRISA, BELLAVISTA 23
2.2.6. VÍA MUNICIPIO DE TELLO AL CENTRO POBLADO SAN ANDRÉS 23
2.2.7. VÍA ARAUCA II-PEDREGAL-CENTRO POBLADO QUINCHANA 24
2.2.8. VÍA ALTAMIRA-PAJIJI 25
2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....25
3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 26
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1804 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA):.....26
3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 27

3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES 27

3.1.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 28

3.1.4. INFORME DE AVANCES 28

3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1794 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA): 28

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 30

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES 30

3.2.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 31

3.2.4. INFORME DE AVANCES 31

3.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1805 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA): 31

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 33

3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES 33

3.3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 34

3.3.4. INFORME DE AVANCES 34

3.4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1793 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA): 34

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 35

3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES 36

3.4.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 36

3.4.4. INFORME DE AVANCES 36

3.5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1842 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA): 37

3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 38

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES 38

3.5.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 39

3.5.4. INFORME DE AVANCES 39

3.6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1841 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TELLO (HUILA): 39

3.6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 41

3.6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES 41

3.6.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 41

3.6.4. INFORME DE AVANCES 42

3.7. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1992 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA): 42

3.7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 43

3.7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES 43

3.7.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 44

3.7.4. INFORME DE AVANCES 44

3.8. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1993 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE ALTAMIRA (HUILA): 45

3.8.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 46

3.8.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES 46

3.8.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 47

3.8.4. INFORME DE AVANCES 47

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA 48

4.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1804 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA) 48

4.1.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 48

4.1.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 48

4.1.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN 48

Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 48

4.1.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 49

4.1.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 49

4.1.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 49

4.1.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 50

4.1.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 50

4.1.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL 50

4.2. REPORTE EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO 1794 DE 2020 – INVIAS Y MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA).....51

4.2.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.....51

4.2.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....51

4.2.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN 51

Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 51

4.2.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 52

4.2.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....52

4.2.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 52

4.2.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.....53

4.2.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 53

4.2.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....53

4.3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1805 DE 2020 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA). CONTRATO NO. 007 DE 2022.....54

4.3.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.....54

4.3.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....54

4.3.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN 54

Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 54

4.3.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 55

4.3.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....55

4.3.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 55

4.3.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.....56

4.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 56

4.3.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....56

4.4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1793 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE EL PITAL (TOLIMA).....57

4.4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 57

4.4.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....57

4.4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN 57

Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 57

4.4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 58

4.4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....58

4.4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 58

4.4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.....59

4.4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 59

4.4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....59

4.5. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1842 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA) 60

4.5.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 60

4.5.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....60

4.5.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN 60

Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 60

4.5.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 61

4.5.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....61

4.5.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 62

4.5.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.....62

4.5.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 62

4.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....62

4.6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1841 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TELLO (HUILA).....63

4.6.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO.....63

4.6.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....63

4.6.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN 63

Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 63

4.6.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 64

4.6.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 64

4.6.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 64

4.6.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.....65

4.6.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 65

4.6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....65

4.7. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1992 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA).....66

4.7.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 66

4.7.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....66

4.7.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN 66

Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 66

4.7.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 67

4.7.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.....67

4.7.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 67

4.7.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.....68

4.7.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 68

4.7.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....68

4.8. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1993 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE ALTAMIRA (HUILA).....69

4.8.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 69

4.8.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....69

4.8.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN 69

Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 69

4.8.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 70

4.8.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO....70

4.8.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 70

4.8.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA....71

4.8.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 71

4.8.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL....71

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 72

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO 72

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 73

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS 73

5.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC 76

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS....77

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 77

6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA 77

6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 77

6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA....78

6.4. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES 78

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA 78

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....78

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....80

ANEXOS 81

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Vías a intervenir 13
Tabla 2 Información general del Contrato de Obra N. LP-001 de 2022..... 20
Tabla 3 Información general del Contrato de Obra 23
Tabla 4 Información general del Contrato de Obra N. 007 de 2022 25
Tabla 5 Información general del Contrato de Obra 27
Tabla 6 Información general del Contrato de Obra 29
Tabla 7 Información general del Contrato de Obra 31
Tabla 8 Información general del Contrato de Obra N. 008 de 2022 33
Tabla 9 Información general del Contrato de Obra 36
Tabla 10 Estado general del tiempo del Contrato N. LP-001 de 2022 39
Tabla 11 Estado general del tiempo Contrato N. 007 de 2022 43
Tabla 12 Estado general del tiempo 46
Tabla 13 Estado general del tiempo 48
Tabla 14 Estado general del tiempo 50
Tabla 15 Estado general del tiempo Contrato N. 008 de 2022 53
Tabla 16 Estado general del tiempo 55
Tabla 17 Información general del Contrato de interventoría N. 1105 de 2022 57

1. INTRODUCCIÓN

COLOMBIA RURAL es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita.

El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de PALESTINA, GIGANTE, SAN AGUSTÍN, EL PITAL, TARQUÍ, TELLO, SAN AGUSTÍN Y ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

A continuación, se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de OCHO (8) Convenios Interadministrativos que se suscribieron entre INVIAS y municipios del Departamento del Huila en la vigencia 2021, del Programa Colombia Rural:

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1804 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1794 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1805 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VÍA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1793 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1842 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1841 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TELLO (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1992 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1993 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE ALTAMIRA (HUILA).

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

"*En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto*." (La subraya no es del texto)

Ante este imperativo legal, el INVIAS encontró necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona, natural o jurídica, que realizará las labores de interventoría de los contratos realizados por los municipios en los convenios indicados anteriormente.

El INVIAS abrió el concurso de méritos abierto CMA-DTE-SEP-197-2021-LOTE 12, que tenía por objeto contratar la interventoría de obra pública para **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 12.** Finalizado el proceso de evaluación y selección del citado concurso de méritos, la citada interventoría fue adjudicada mediante resolución No. 1715 del 24 de mayo de 2022 al proponente No 124 **CONSORCIO ACI – 3B 197,** consorcio conformado por ACI PROYECTOS SAS, sociedad identificada con el NIT. 860.059.851-6, con un porcentaje de participación del 60%, y 3B PROYECTOS SAS, sociedad identificada con el NIT. 900.504.398-4, con un porcentaje de participación del 40%.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los proyectos correspondientes a los convenios interadministrativos entre INVIAS y los diferentes municipios del departamento del Huila corresponden a los siguientes corredores:

MUNICIPIO	VIA A INTERVENIR
PALESTINA	PALESTINA-SAN ISIDRO-EL SILENCIO
GIGANTE	TRAMOS: EL SALADO, EL COGOLLO, ALTO COROZAL-SECTOR LA CUMBRE, ALTO SILVANIA, EL PIÑAL, LA VEGA

SAN AGUSTIN	VÍA ARAUCA II-PEDREGAL-CENTRO POBLADO QUINCHANA
EL PITAL	LOS OLIVOS-EL CAUCHAL-EL UVITAL
TARQUI	VÍA A VEREDAS EL TAMBO, MERCEDES, RICA BRISA, BELLAVISTA
TELLO	TELLO AL CENTRO POBLADO SAN ANDRÉS
SAN AGUSTIN	VIA HACIA EL CENTRO POBLADO RURAL ALTO DEL OBISPO
ALTAMIRA	VÍA ALTAMIRA-PAJIJI

Tabla 1 Vías a intervenir

Los municipios en donde se realizarán las diferentes intervenciones se encuentran desde el norte hasta el extremo sur del departamento de Huila, como se aprecia en el Gráfico 1. Estos corredores viales transcurren en topografía variada entre ondulada y montañosa, en su mayoría montañosa. Todas las superficies de rodadura se encuentran a nivel de afirmado o a nivel de subrasante.

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por esta interventoría, en desarrollo del contrato de interventoría No. 1105 de 2022 comprenden entre otras, las siguientes:

ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Construcción de Placa Huella
Pavimentos Convencionales
Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención.


Construcción de Filtros y/o
cunetas Bases Estabilizadas
Tecnologías Alternativas.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Conformación de la calzada existente
Mejoramiento de la subrasante con adición de material Suministro e instalación de afirmado.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



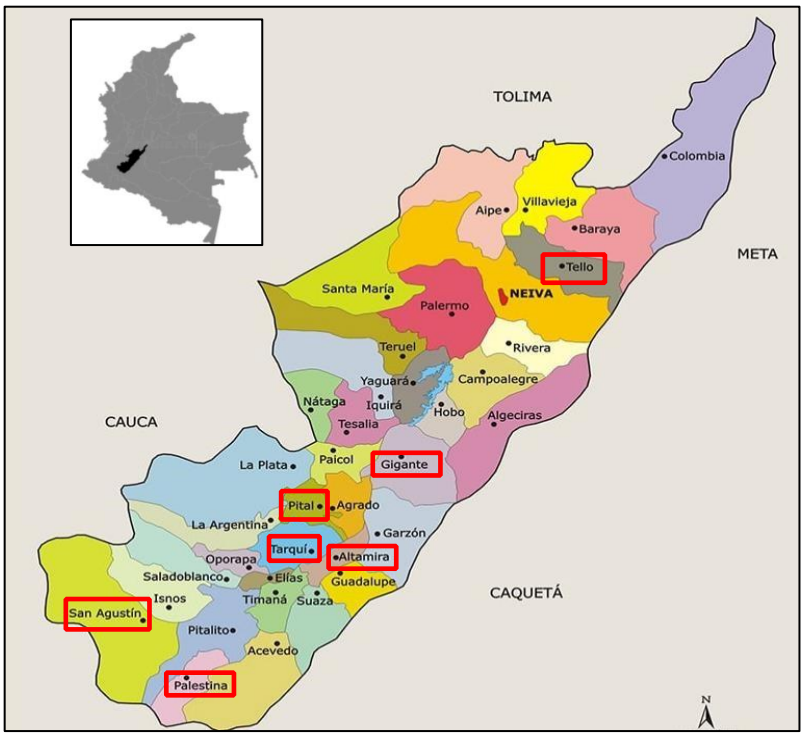

Gráfica 1. Localización del proyecto.

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

A continuación, se presentan los diferentes corredores viales a intervenir en este proyecto:

2.2.1. PALESTINA-SAN ISIDRO-EL SILENCIO:

En el municipio de Palestina, departamento del Huila, en una vía en afirmado y a nivel de subrasante entre regular y mal estado, le corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de alcantarillas de 36". Muro de contención.
- Construcción de disipador de energía.
- Construcción de filtros.
- Caracterización vial del corredor.

2.2.2. TRAMOS: EL SALADO, EL COGOLLO, ALTO COROZAL-SECTOR LA CUMBRE, ALTO SILVANIA, EL PIÑAL, LA VEGA

En el municipio de Gigante, departamento del Huila, en todos los tramos están en afirmado en mal estado y topografía montañosa. En los tramos a intervenir tramos se ejecutaran las siguientes obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de alcantarillas de 36".

• Construcción de placahuellas en concreto.
• Construcción de filtro, disipador y cuneta in situ.

2.2.3. VÍA HACIA EL CENTRO POBLADO RURAL ALTO DEL OBISPO

En el municipio de San Agustín, departamento del Huila, en una vía conformado por material granular seleccionado en regular y mal estado, con pendientes mayores al 10%, con anchos de vía disponibles entre 8m en las curvas y de 5.50 a 6m en rectas, vía a la cual corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

•Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
• Construcción de alcantarillas de 36".
• Disipador tipo escalera.
• Construcción de placahuellas en concreto.
• Caracterización vial del corredor.

2.2.4. VÍA LOS OLIVOS-EL CAUCHAL-EL UVITAL

En el municipio de El Pital, departamento del Huila, la vía a intervenir pertenece al corredor vial a cargo del Departamento del Huila, una parte del carreteable está a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), en una longitud de aproximadamente de 8 kms, los cuales se encuentran unas partes en pésimas y otras en aceptables condiciones, vía a la cual corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

•Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
• Construcción de alcantarillas de 36".
• Construcción de placahuellas en concreto.
• Construcción de filtros.

• Caracterización vial del corredor.

2.2.5. VÍA A VEREDAS EL TAMBO, MERCEDES, RICA BRISA, BELLAVISTA

En el municipio de Tarqui, departamento del Huila, en la actualidad los tramos de las vías en afirmado a intervenir presentan deficiencias en su funcionalidad debido al mal estado desde superficie de rodadura, el cual se manifiesta de diversas formas por todo el sector, afectando no solo al exterior, en algunos casos infraestructuras construidas en el área de influencia, sino también al inadecuado manejo de aguas lluvias en canales abiertos realizados manualmente lo que no permite la correcta funcionalidad de algunas alcantarillas ya existentes en otros sectores por falta de obras de arte para la conducción de aguas lluvias. Los tramos principales a tratar en el sector rural están ubicados en las veredas El Tambo, Mercedes, Rica Brisa, Bellavista, vía a la cual corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

•Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
• Construcción de alcantarillas de 36".
• Construcción de placahuellas en concreto.
• Construcción de box culvert.
• Muro de contención.
• Construcción de disipador de energía.
• Caracterización vial del corredor.

2.2.6. VÍA MUNICIPIO DE TELLO AL CENTRO POBLADO SAN ANDRÉS

En el municipio de Tello, departamento del Huila, actualmente este tramo objeto de esta intervención se encuentra sin estructura de pavimento, con un ancho de banca que oscila entre 5.0 m y 6.0m, se pretende hacer el cálculo del espesor del pavimento rígido, a esta vía le corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de alcantarillas de 36".
- Construcción de pavimento rígido.
- Construcción de muros de contención.
- Construcción de filtros.
- Caracterización vial del corredor.

2.2.7. VÍA ARAUCA II-PEDREGAL-CENTRO POBLADO QUINCHANA

En el municipio de San Agustín, departamento del Huila, iniciando el recorrido por los tramos priorizados del convenio 1805 de 2021, llegando hasta el centro poblado Quinchana ubicado a 25 km desde la zona urbana del municipio. El corredor hasta la vereda está conformado por una superficie de rodadura en mal estado, cuyo tiempo de trayecto es mayor a la hora. Una vez ubicados en el centro poblado se evidencia que las vías están en regular estado conformadas por material seleccionado con pendientes entre 1% y 5. El segundo tramo priorizado ubicado entre el casco urbano del municipio y la vereda Arauca II, cuya superficie de rodadura se encuentra en regular y mal estado, con pendientes mayores al 10% conformada por material granular seleccionado, con anchos de vía disponibles entre 6m y 4m. El tercer tramo priorizado está ubicado en la vereda llamada Pedregal, corredor con una superficie en regular estado conformado por material granular seleccionado y suelo natural, con pendientes en algunos sectores mayores al 10 %, con anchos de vía disponibles entre 8m en las curvas y 6 a 4m en rectas o tangentes. La siguientes son las principales actividades u obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de alcantarillas de 36".

• Construcción de placahuellas.
• Construcción de disipador tipo escalera.
• Caracterización vial del corredor.

2.2.8. VÍA ALTAMIRA-PAJIJI

En el municipio de Altamira, departamento del Huila, la mayor parte de la longitud del corredor se encuentra a nivel de afirmado, en general se encuentra en regulares condiciones, el ancho promedio de la vía es de 5 m. las principales actividades u obras a ejecutar:

• Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
• Construcción de alcantarillas de 36".
• Construcción de placahuellas.
• Construcción de filtros.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Cada uno de los contratistas que asignaron a los ocho (08) proyectos de los convenios correspondientes al Lote 12 del Programa Colombia Rural en el departamento del Huila, deben realizar la revisión y/o ajuste de diseños base de la Cartilla Colombia Rural adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20. Por lo tanto, producto de esa revisión y/o ajuste y/o complementación de la Cartilla Rural, las diferentes obras a realizar en cada vía se deberán ajustar a las condiciones existente de la topografía, tránsito y características geotécnicas de cada vía, de manera que no se afectarán las especificaciones geométricas de las carreteras que serán intervenidas, tan solo mejorando las condiciones de rodadura en los tramos en donde serán realizadas las placahuellas y pavimento rígido.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1804 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-001-2022
Contrato:	LP-001 de 2022
Fecha de Suscripción	27 DE OCTUBRE DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL CONVENIO 1804 DE 2021.
Contratista:	CONSTRUCTORA SAAVAR S.A.S. con NIT. 900.281.931-1
Integrantes:	NO APLICA
NIT:	. 900.281.931-1
Valor inicial:	$ 866.025.723 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 866.025.723 Incluido IVA

Plazo inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2022
Prórroga:	1
Fecha de inicio:	28 de diciembre de 2022
Fecha de terminación:	31 de mayo de 2023
Dirección:	Calle 46 # 16-24 Neiva, Huila
Teléfono:	3232314888, saavarsascontratacion@gmail.com

Tabla 2 Información general del Contrato de Obra N. LP-001 de 2022

.

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de junio de 2023, el Contratista de obra dio inicio a las obras.

3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.1.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.1.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.1.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

3.1.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.1.4. INFORME DE AVANCES

3.1.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

El contratista dio inicio a la obras establecidas junto con la interventoría se visitó el proyecto para supervisar el inicio de obras.

3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1794 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-005-2022 (Proceso declarado desierto)
Contrato:	Por definir

Fecha de Suscripción	Por definir
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1794 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS-.
Contratista:	Por Definir
Integrantes:	Por definir
NIT:	
Valor inicial:	$ Por definir
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ Por definir
Plazo inicial:	
Prórroga:	0
CONTRATISTA	
Fecha de inicio:	Por definir
Fecha de terminación:	Por definir
Dirección:	

Teléfono:	

Tabla 3 Información general del Contrato de Obra

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, el día 01 de junio se realizó una reunión de seguimiento de convenios, en la ciudad de Neiva-Huila se presentaron las partes, precontractual el día martes 06/06/2023 acordaron que se publicaran los pliegos definitivos.

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.2.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social del contrato de obra del municipio de Gigante.

3.2.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental del contrato de obra del municipio de Gigante.

3.2.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO del contrato de obra del municipio de Gigante.

3.2.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.2.4. INFORME DE AVANCES

3.2.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Al no haberse ejecutado obras en este periodo producto de no haberse definido el contratista de obra que ejecutará el proyecto producto del convenio No. 1794 entre el INVIAS y el municipio de Gigante, no presentaron avance de obras programadas.

3.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1805 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LICITACIÓN PÚBLICA N° 05 de 2022
Contrato:	007 DE 2022
Fecha de Suscripción	21 DE NOVIEMBRE DE 2022

Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE ARAUCA II PEDREGAL Y CENTRO POBLADO QUINCHANA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1805 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN E INVIAS
Contratista:	CONSORCIO GYC 2022 con NIT. 901.655.774-1
CONTRATISTA	
Integrantes:	CONINPRA INGENIERIA S.A.S. (95%) con NIT 900737143, GM SOLUTIONS S.A.S. (5%) con NIT 891105078
NIT:	CONINPRA INGENIERIA S.A.S. con NIT 900737143, y GM SOLUTIONS S.A.S. con NIT 891105078
Valor inicial:	$ 1.294.873.389,7 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 1.294.873.389,7 Incluido IVA
Plazo inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Prórroga:	1
Fecha de inicio:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación:	31 DE AGOSTO DE 2023
Dirección:	CALLE 6 A No. 10-13
Teléfono:	

Tabla 4 Información general del Contrato de Obra N. 007 de 2022

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de junio de 2023 del contrato 007, el Contratista de obra dio inicio a las obras la interventoría se desplazó al lugar del proyecto donde se iniciaron las obras.

3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.3.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social del contrato 007 del municipio de San Agustín.

3.3.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental del contrato 007 del municipio de San Agustín.

3.3.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO del contrato 007 del municipio de San Agustín.

3.3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.3.4. INFORME DE AVANCES

3.3.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

El contratista de obra dio inicio a la obras, y la interventoría se desplazó al lugar donde se dio inicio de obras para verificar que todo estuviera en orden.

3.4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1793 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-001-2022
CONTRATISTA	
Contrato:	LP-001-2022
Fecha de Suscripción	08-09-2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL RURAL LOS OLIVOS - EL CAUCHAL – EL UVITAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL - NACIONAL

Contratista:	CONSORCIO GYG SOLUCIONES
Integrantes:	OSCAR JAVIER ARCE CEPEDA
NIT:	901688774
Valor inicial:	$864,988,745.00 Peso Colombiano
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$864,988,745.00 Peso Colombiano
Plazo inicial:	3 MESES
Prórroga:	0
Fecha de inicio:	Por definir
Fecha de terminación:	Por definir
Dirección:	
Teléfono:	

Tabla 5 Información general del Contrato de Obra

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 junio el contratista envió documentación como estudios y diseños, hojas de vida del personal de obra.

3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.4.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.4.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 junio de 2023 de 2022, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.4.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

3.4.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.4.4. INFORME DE AVANCES

3.4.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Al haberse suspendido el proceso licitatorio No. LP-001 de 2022 por parte de la alcaldía de El Pital, no se desarrollaron actividades de este convenio.

3.5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1842 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-001-2022
Contrato:	Por definir
Fecha de Suscripción	Por definir
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Contratista:	CONSORCIO RURAL SANTA RITA
Integrantes:	Por definir
NIT:	Por definir
Valor inicial:	$ 596.453.777,36 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 3.419.333.945,00 Incluido IVA

Plazo inicial:	CINCO MESES (05) MESES
Prórroga:	0
Fecha de inicio:	Por definir
Fecha de terminación:	Por definir
Dirección:	Por definir
Teléfono:	Por definir

Tabla 6 Información general del Contrato de Obra

3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, el contratista envió documentación de control de obra tales como: paga, estudios de suelo estudios hidráulicos y hojas de vida del personal correspondiente a contratar, las cuales fueron revisada por la interventoría

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.5.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.5.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.5.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

3.5.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.5.4. INFORME DE AVANCES

3.5.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Al no haberse ejecutado obras en este periodo, no presentaron avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato de obra producto del convenio No. 1842 entre el INVIAS y el municipio de Tarqui.

3.6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1841 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TELLO (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-001 DE 2022

Contrato:	CO-060-2023
Fecha de Suscripción	23 DE MARZO
Objeto:	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE DE TELLO CONDUCE AL CENTRO POBLADO SAN ANDRÉS EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1841 DE 2021, CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1841 DE 2021, CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Contratista:	VYM INGENIERA S.A.S
Integrantes:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO
NIT:	900062688
Valor inicial:	$ $2,581,941,957.90
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ $2,581,941,957.90
Plazo inicial:	3 MESES
Prórroga:	0
Fecha de inicio:	21 ABRIL
Fecha de terminación:	Por definir
Dirección:	
Teléfono:	

Tabla 7 Información general del Contrato de Obra

3.6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 Junio el contratista de obra dio inicio a dichas obras. Junto con la interventoría se hizo una visita para verificar los inicios de obra.

3.6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.6.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.6.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.6.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 30 junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

3.6.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.6.4. INFORME DE AVANCES

3.6.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

En el presente periodo el contratista dio inicio a las obras. Como construcción de alcantarillas y limpieza.

3.7. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1992 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-04-2022
Contrato:	008 DE 2022
Fecha de Suscripción	29 DE NOVIEMBRE DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL CORREDOR HACIA EL CENTRO POBLADO RURAL ALTO DEL OBISPO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1992 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN E INVIAS
Contratista:	CONSORCIO EL OBISPO con NIT. 901.657.474-6
Integrantes:	V&M INGENIERIA S.A.S. NIT: 900062688 con una participación del 90% ,y BARINCO INGENIEROS S.A.S. NIT: 900874409 con una participación del 10%

NIT:	V&M INGENIERIA S.A.S. NIT: 900062688 y BARINCO INGENIEROS S.A.S. NIT: 900874409
Valor inicial:	$ 669.354.696,27 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 669.354.696,27 Incluido IVA
Plazo inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
Prórroga:	1
Fecha de inicio:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación:	31 DE AGOSTO DE 2023
Dirección:	Por definir
Teléfono:	Por definir

Tabla 8 Información general del Contrato de Obra N. 008 de 2022

3.7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de junio de 2023 del contrato 008, el Contratista de obra envió ajustes y diseños, los cuales fueron revisados por la interventoría, el día 24 de mayo dieron inicio de obra demolición, e instalación de tubería de 36”

3.7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.7.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social del contrato 008 del municipio de San Agustín.

3.7.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental del contrato 008 del municipio de San Agustín.

3.7.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO del contrato 008 del municipio de San Agustín.

3.7.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.7.4. INFORME DE AVANCES

3.7.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Al haberse ejecutado obras en este periodo se hizo demolición, e instalación de tuberías de 36”

3.8. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1993 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE ALTAMIRA (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-001-2022
Contrato:	1993-2021
Fecha de Suscripción	02 noviembre 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1993 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Contratista:	DANES INGENIERO S.AS.
Integrantes:	NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA
NIT:	900219918
Valor inicial:	$ 660.391.531,00 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 660.391.531,00 Incluido IVA
Plazo inicial:	TRES (03) meses
Prórroga:	0
Fecha de inicio:	30 junio 2023

Fecha de terminación:	Por definir
Dirección:	Por definir
CONTRATISTA	
Teléfono:	Por definir

Tabla 9 Información general del Contrato de Obra

3.8.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de junio de 2023, esta Interventoría revisó la documentación del proceso licitatorio de este contrato, tales como pliego de condiciones, anexos, contrato y demás documentación pertinente, así como el estado de legalización del mismo por parte del contratista de obra y el municipio de Altamira, pero a la fecha del cierre del presente informe la entidad contratante ya tiene el acta de inicio los cuales ya fueron cargados al SECOP

3.8.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.8.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.8.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.8.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

3.8.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.8.4. INFORME DE AVANCES

3.8.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Al no haberse ejecutado obras en este periodo, no presentaron avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato producto del convenio No. 1993 de 2021 entre INVIAS y el municipio de Altamira.

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA

4.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1804 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA).

Si se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023. **Nota:** Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.4 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.1.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.1.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.1.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra, en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presenta en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral

y parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor .

4.1.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.1.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	714
Lluvias moderadas	12
Lluvias intensas	14

Tabla 10 Estado general del tiempo del Contrato N. LP-001 de 2022

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.1.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de ensayos de laboratorio entre el 1 y el 30 de junio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se relacionarán cada uno de los ensayos realizados.

4.1.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registra el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra.

4.1.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realizará el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.1.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.1.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato cuenta con anticipo, pero el plan de inversión del anticipo aún no ha sido aprobado en el periodo de este informe.

4.1.9.2. Seguimiento programa de Obra El programa de obra aún no ha sido aprobado.

4.1.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presentará copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones cuando el mismo sea revisado y aprobado por la Interventoría e INVIAS de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MNIN-6-FR-2**.

4.1.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión En el presente periodo de este informe mensual, si se presentaron comités de obra para seguimiento de convenios se llevara a cabo el día 10 de julio del 2023

4.1.9.5. Informes semanales de Interventoría

Los informes semanales de este periodo se presentan en el Anexo 8.3.

4.2. REPORTE EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO 1794 DE 2020 – INVIAS Y MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA).

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023 debido a que el contrato de obra de este proceso licitatorio aún no ha sido adjudicado.
Nota: Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.5 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.2.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.2.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

No se ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.2.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra en donde se realizará cuando se conozca el contratista de obra, en el cual se presentará la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presentará en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y

parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor.

.

4.2.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.2.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 10 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	729
Lluvias moderadas	3
Lluvias intensas	5

Tabla 10. Estado general del tiempo.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe el estado general del tiempo no afecta el proyecto debido a que aún no se ha adjudicado.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.2.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de los ensayos de laboratorio del mes de diciembre de 2022, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.2.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registrará el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra cuando este sea adjudicado.

4.2.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realizará el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.2.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.2.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato no cuenta con anticipo por lo cual no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.2.9.2. Seguimiento programa de Obra El

contrato de obra aún no ha iniciado.

4.2.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presenta copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones revisados por la Interventoría de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.2.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión En el presente periodo de este informe mensual, si se presentaron reunión para seguimiento de convenio el día 10 de julio 2023

4.2.9.5. Informes semanales de Interventoría

No se desarrolló ningún informe semanal específico de este contrato de obra en este periodo de tiempo, debido a que la fecha del cierre del presente informe mensual aún no se había conocido el contratista de obra de este convenio.

4.3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1805 DE 2020 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA). CONTRATO NO. 007 DE 2022.

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023. **Nota:** Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.6 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.3.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.3.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria y equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.3.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra, en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presenta en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral

y parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor.

4.3.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.3.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 11 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	717
Lluvias moderadas	9
Lluvias intensas	13

Tabla 11 Estado general del tiempo Contrato N. 007 de 2022

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.3.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de ensayos de laboratorio entre el 1 y el 30 de junio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.3.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MINFRA-MN-IN-15-FR-12**, donde se registra el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra.

4.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-14**, donde se realiza el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.3.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.3.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato no cuenta con anticipo, por lo tanto no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.3.9.2. Seguimiento programa de Obra El programa de obra aún no ha sido aprobado.

4.3.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presentará copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones cuando el mismo sea revisado y aprobado por la Interventoría e INVIAS de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MNIN-6-FR-2**.

4.3.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión En el presente periodo de este informe mensual, si se prestaron reunión para seguimiento de convenio el día 10 de julio del 2023 .

4.3.9.5. Informes semanales de Interventoría

Los informes semanales de este periodo se presentan en el Anexo 8.3.

4.4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1793 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA).

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de junio de 2023 debido a que el contrato de obra de este proceso licitatorio aún no ha sido adjudicado.
Nota: Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.7 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-3**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.4.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-15-FR-4.**

4.4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra en donde se realizará cuando se conozca el contratista de obra, en el cual se presenta la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presenta en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del

contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor.

4.4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 12 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	723
Lluvias moderadas	9
Lluvias intensas	6

Tabla 12 Estado general del tiempo

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe el estado general del tiempo no afecta el proyecto debido a que aún no se ha adjudicado.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de los ensayos de laboratorio del mes de junio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registrará el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra cuando este sea adjudicado.

4.4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realiza el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.4.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato no cuenta con anticipo por lo cual no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.4.9.2. Seguimiento programa de Obra El

contrato de obra aún no ha iniciado.

4.4.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presenta copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones revisados por la Interventoría de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.4.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión En el presente periodo de este informe mensual, si se presentó reunión para seguimiento de convenios el día 10 de julio del 2023

4.4.9.5. Informes semanales de Interventoría

No se desarrolló ningún informe semanal específico de este contrato de obra en este periodo de tiempo, debido a que la fecha del cierre del presente informe mensual aún no se había conocido el contratista de obra de este convenio.

4.5. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1842 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA).

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de julio de 2023 debido a que el contrato de obra de este proceso licitatorio aún no se ha iniciado.
Nota: Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.8 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.5.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.5.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-15-FR-4.**

4.5.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra en donde se realizará cuando se inicie el contrato de obra, en el cual se presentará la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presentará en ese mismo formato la revisión

y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor cuando se inicie el respectivo contrato de obra.

4.5.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.5.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 13 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	714
Lluvias moderadas	12
Lluvias intensas	14

Tabla 13 Estado general del tiempo

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe el estado general del tiempo no afecta el proyecto debido a que aún no ha iniciado actividades de obra.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.5.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de los ensayos de laboratorio del mes de junio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.5.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registrará el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra cuando este sea adjudicado.

4.5.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realiza el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.5.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato no cuenta con anticipo reportado, por lo tanto no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.5.9.2. Seguimiento programa de Obra El contrato de obra aún no ha iniciado.

4.5.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presenta copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones revisados por la Interventoría de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.5.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión En el presente periodo de este informe mensual, si se presentó reunión de seguimiento de convenios el día 10 de julo 2023

4.5.9.5. Informes semanales de Interventoría

No se desarrolló ningún informe semanal específico de este contrato de obra en este periodo de tiempo, debido a que la fecha del cierre del presente informe mensual aún no se había dado la orden de inicio del contrato de obra producto de este convenio.

4.6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1841 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TELLO (HUILA).

El contratista del proyecto dio inicio a las correspondientes obras.

4.6.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.6.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria y equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-15-FR-4.**

4.6.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra en donde se realizará cuando se conozca el contratista de obra, en el cual se presenta la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presenta en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del

contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor.

4.6.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.6.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 14 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	731
Lluvias moderadas	6
Lluvias intensas	0

Tabla 14 Estado general del tiempo

.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe el estado general del tiempo no afecta el proyecto debido a que aún no se han comenzado obras.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.6.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de los ensayos de laboratorio del mes de mayo de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.6.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registrará el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra cuando este sea adjudicado.

4.6.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realiza el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.6.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato no cuenta con anticipo conocido, por lo tanto no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.6.9.2. Seguimiento programa de Obra El

contrato de obra aún no ha iniciado.

4.6.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presenta copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones revisados por la Interventoría de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.6.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión En el presente periodo de este informe mensual, si se presentó reunión de seguimiento de convenios el día 10 de julio del 2023.

4.6.9.5. Informes semanales de Interventoría

Los informes semanales de este periodo se presentan en el Anexo 8.3.

4.7. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1992 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA).

si se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de julio de 2023. **Nota:** Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.10 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.7.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.7.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista si ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.7.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra, en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presenta en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor.

4.7.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.7.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 15 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	734
Lluvias moderadas	15
Lluvias intensas	0

Tabla 15 Estado general del tiempo Contrato N. 008 de 2022

.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.7.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de los ensayos de laboratorio del mes de mayo de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.7.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registra el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra.

4.7.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realiza el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.7.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.7.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato no cuenta con anticipo, por lo tanto no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.7.9.2. Seguimiento programa de Obra El

programa de obra aún no ha sido aprobado.

4.7.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presenta copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones revisados por la Interventoría de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.7.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión En el presente periodo de este informe mensual, si se presentó reunión de seguimiento de convenio el día 01 de junio del 2023.

4.7.9.5. Informes semanales de Interventoría

Los informes semanales de este periodo se presentan en el Anexo 8.3.

4.8. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1993 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE ALTAMIRA (HUILA).

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 30 de julio de 2022 debido a que el contrato de obra de este proceso licitatorio aún no ha sido adjudicado.
Nota: Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.11 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.8.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.8.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista no ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.8.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra en donde se realizará cuando se inicie el contrato de obra, en el cual se presentará la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presentará en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor cuando se inicie el respectivo contrato de obra.

4.8.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.8.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 16 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	728
Lluvias moderadas	7
Lluvias intensas	5

Tabla 16 Estado general del tiempo

.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe el estado general del tiempo no afecta el proyecto debido a que aún no ha iniciado actividades técnicas ni de obra.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.8.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de los ensayos de laboratorio del mes de junio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.8.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registrará el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra cuando este sea adjudicado.

4.8.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realiza el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.8.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.8.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato no cuenta con anticipo, por lo tanto no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.8.9.2. Seguimiento programa de Obra

El contrato de obra aún no ha iniciado actividades técnicas.

4.8.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presenta copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones revisados por la Interventoría de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.8.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión En el presente periodo de este informe mensual, si se presentó reunión para seguimiento de convenios el día 10 de julio del 2023.

4.8.9.5. Informes semanales de Interventoría

No se desarrolló ningún informe semanal específico de este contrato de obra en este periodo de tiempo, debido a que la fecha del cierre del presente informe mensual aún no se había dado la orden de inicio del contrato de obra producto de este convenio.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA	
Proceso de selección:	CMA-DTE-SEP-197-2021-LOTE 12
Contrato:	1105 de 2022
Fecha de Suscripción	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL” LOTE 12
Interventor:	CONSORCIO ACI – 3B 197
Integrantes:	ACI PROYECTOS S.A.S. con NIT 860.059.851-6, con participación del 60% Y 3B PROYECTOS S.A.S. con NIT 900.504.398-4 con participación del 40%
NIT:	901.598.587-6
Valor inicial:	$ 1.098.134.737 INCLUIDO IVA
Adiciones:	0
Valor actualizado:	$ 1.098.134.737 INCLUIDO IVA
Modificaciones:	0

Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023
Prórroga:	0
Fecha de inicio:	23 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023
Dirección:	CR 7 No. 156-10 EDIF TORRE KRYSTAL PISO 31, BOGOTÁ
Teléfono:	3115412555

Tabla 17 Información general del Contrato de interventoría N. 1105 de 2022

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el presente periodo la Interventoría realizó actividades administrativas del contrato de interventoría, así como seguimiento al estado de los contratos de obra que tienen orden de inicio, así como el seguimiento de los procesos licitatorios que aún no han sido adjudicados y acompañamiento a las aclaraciones de cada contratista de obra y oficinas de secretarias de planeación de cada uno de los proyectos a ser supervisados por el contrato de interventoría No. 1105 de 2022.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS

En el presente periodo de tiempo, entre el 1 y el 30 de junio de 2023, si se requirió revisión de estudios y diseños de los especialistas hicieron varias observaciones a los mencionados convenios, soportados en oficios de correspondencia generada por la interventoría la cual se encuentra en los ANEXOS 8.1 carpeta correspondencia.

Convenio 1804-2021 (Palestina)

REVISIÓN 7 ENVIO INFORMACIÓN INCIAL DEL CONTRATO: Mediante el anexo SAL-23-010073 se expedido por parte de la interventoría y especialistas.

APROBACIÓN PLAN DE ADAPTACIÓN PAGA: Mediante el anexo SAL 23-009557 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

SOLISITUD PRESENTACIÓN HOJAS DE VIDA: Mediante el anexo SAL 23-010081 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

RESPUESTA FIDUCCIA: Mediante el anexo SAL 23-010223 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

CONVENIO SAN AGUSTIN 1992-2021

OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO: Mediante el anexo SAL 23-010690 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

AVAL DISEÑO GEOMETRICO: Mediante del anexo SAL 23-009827 se expedido por parte de la interventoría y especialistas.

CONVENIO SAN AGUSTIN 1805-2021

OBSERVACIONES PAGA: Mediante el anexo SAL 23-009932 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

OBSERVACIONES 5 DOCUMENTACIÓN CONTROL DE OBRA: Mediante el anexo SAL 23-009868 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

APROBACIÓN DISEÑO GEOMETRICO: Mediante el anexo SAL 23-010874 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

CONVENIO 1993- 2021 ALTAMIRA

OBSERVACIONES PAGA: Mediante el anexo SAL 23-010586 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

OBSERVACIONES 1 A LA DOCUMENTACIÓN EJECUCCIÓN DE OBRA: Mediante el anexo SAL 23010625 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

CONVENIO- TARQUI 1842-2021

OBSERVACIONES ESTUDIO HIDRAHULICO: Mediante el anexo SAL-23-009594 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

OBSERVACIONES DISEÑO GEOMETRICO: Mediante el anexo SAL 23-009589 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

OBSERVACIONES 2 PAGA: Mediante el anexo SAL-010583 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

APROBACIÓN DISEÑO GEOMETRICO: Mediante el anexo SAL 23-010710 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.
OBSERVACIONES DISEÑO BOXCULVER: Mediante el anexo SAL 23-010947 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

CONVENIO 1841 2021-TELLO

APROBACIÓN DISEÑO PAVIMIENTO: Mediante el anexo SAL 23-009929 se expidió por parte de la interventoría y especialistas
REVISIÓN DISEÑO MESZCLAS: Mediante el anexo SAL SAL 23-010654 se expidió por parte de la interventoría y especialistas
OBSERVACIONES PLAN AMBIENTAL: Mediante el anexo SAL 23-010584 se expidió por parte de la interventoría y especialistas.

5.3.1 ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL RESIDENTE DE INVERVENTORIA

Durante el presente periodo la residencia de Interventoría realizó actividades administrativas del contrato de interventoría como reuniones, Actas de comité, etc. así como también seguimiento al estado de los contratos de obra que tienen orden de inicio, así como el seguimiento de los procesos licitatorios que aún no han sido adjudicados y acompañamiento a las aclaraciones de cada contratista de obra y oficinas de secretarias de planeación de cada uno de los proyectos a ser supervisados por el contrato de interventoría No. 1105 de 2022 así como la visitas a los proyectos para definir el alcance real de las obras y la socialización de los proyectos que haya a lugar. Durante este periodo se dio inicio al contrato 060-2023 derivado del convenio No. 1841-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de Tello, ubicado en el departamento del Huila, en donde se intervendrá la vía HACIA EL CENTRO POBLADO SAN ANDRES. En el inicio de este contrato se realizó la supervisión de las actividades para la construcción de alcantarillas de 36" de la vía hacia el centro poblado San Andrés. Se dio inicio al contrato de obra número LP-001 de 2022 derivado del convenio No. 1804-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de Palestina, ubicado en el departamento del Huila, en donde se inició la construcción de un muro de contención ubicado en el K7+420 de la vía que comunica la vereda el Silencio. Se dio inicio al contrato de obra número 007 de 2022 derivado del convenio No. 1805-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de San Agustín, ubicado en el departamento del Huila, en donde se inició la construcción de alcantarillas de 36" en la vereda Arauca II.

5.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Se hará control y seguimiento por parte de esta Interventoría al Programa Anual de Caja – PAC.

REPORTE SIIF NACIÓN PAGOS:

Como parte del seguimiento y control de pagos que se realizan a los Contratistas, se reportará la tabla de pagos del SIIFF NACIÓN de cada uno de los convenios del INVIAS con cada municipio.

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

APLICATIVO CIFRA DEL PORTAL INVIAS:

Debido a que los ocho (08) contratos de obra del programa Colombia Rural fueron adjudicados por entidades diferente al Instituto Nacional de Vías (INVIAS), no se implementó el aplicativo CIFRA del portal INVIAS en los contratos de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nota: Los formatos de obra del Contrato de Interventoría se presentan en el ANEXO 8.12 del presente documento.

6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-5** con el control diario de equipo de la Interventoría, donde se relaciona el equipo en la obra día a día y si se encuentra en reparación, activo o inactivo.

6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

En el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-7** se presenta el control diario del personal de la Interventoría en este período, donde se relacionan los hombre-mes laborados por el personal profesional técnico, operativo y administrativo, así como se presenta en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del personal de Interventoría (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Supervisor.

6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta la información financiera del contrato de interventoría de acuerdo con el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-9**.

6.4. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

En el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-13** se presenta el seguimiento a las garantías del contrato de Interventoría.

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta el seguimiento y verificación del cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de Interventoría de acuerdo con lo establecido en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR18**.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

El Contrato de Interventoría no contará con anticipo por lo cual no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

El Plan de Cargas y el seguimiento al plan de cargas del contrato de Interventoría se presentará en el formatos **MEPI-MN-IN-9-FR-2** el cual va a ser presentado para aprobación del INVIAS.

Las bitácoras o diarios de obra de cada proyecto se iniciarán cuando se inicien las actividades de obra en cada proyecto, las cuales se iniciarán con la aprobación de la revisión de estudios y diseños base de la cartilla “Colombia Rural” adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los contratos de obra de cada uno de los ocho (08) contratos derivados de los convenios 1804, 1794, 1805, 2257, 1793, 1842, 1841, 1992, y 1993 de 2021 celebrados por el INVIAS y los Municipios de Palestina, Gigante, San Agustín, El Pital, Tarqui, Tello, San Agustín y Altamira, respectivamente, ubicados todos en el departamento del Huila, se encuentran en diferentes etapas del proceso de adjudicación y legalización. Se dio orden de inicio a los contratos productos de los convenios 1805, 1804, 1992 de 2021 con los municipios de San Agustín, Palestina y San Agustín, respectivamente, a los que esta interventoría acompaño y participo en la prórroga de cada convenio y contrato de esos proyectos, así como el desarrollo y aclaraciones que cada contratista haya realizado.
- Se dio orden de inicio al contrato de interventoría No. 1105 de 2021 por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), como entidad contratante del citado contrato. Se realizaron las actividades administrativas para entrega de la documentación solicitada por parte de la entidad contratante en el documento base o pliego tipo y de sus respectivos anexos del contrato de interventoría No. 1105 de 2022.

ANEXOS
