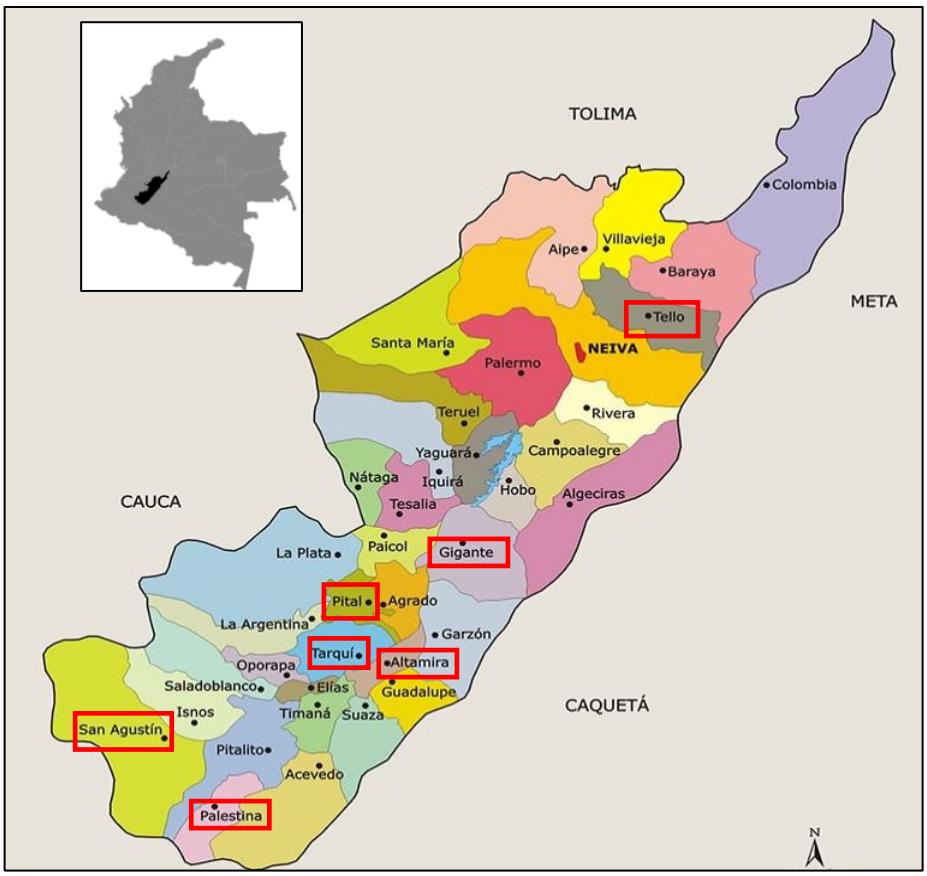


INFORME NO. 08 DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023

NEIVA –HUILA, 5 DE AGOSTO DE 2023

INFORME MENSUAL No. 08	**CONSORCIO ACI – 3B 197**	**DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023**
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA		

Distribución de copias:

No.	Destinatario
1	INVIAS - Bogotá
2	INVIAS – Territorial Huila
3	CONSORCIO ACI - 3B 197-Bogotá
4	CONSORCIO ACI - 3B 197-Huila


TITULO DOCUMENTO:		**INTEGRANTES**	
APROBACION	RESPONSABLE POR ELABORACIÓN " Residente de Interventoría "	Nombre	Ing. Carlos Alberto Villanueva
		Firma	
		Fecha	05/08/2023
	RESPONSABLE APROBACIÓN "Director de Interventoría"	Nombre	Ing. Andrés Angarita Beltrán
		Firma	
		Fecha	05/08/2023

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 11
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 13
2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 15
2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS 16
2.2.1. PALESTINA-SAN ISIDRO-EL SILENCIO: 16
2.2.2. TRAMOS: EL SALADO, EL COGOLLO, ALTO COROZAL-SECTOR LA CUMBRE, ALTO SILVANIA, EL PIÑAL, LA VEGA 16
2.2.3. VÍA HACIA EL CENTRO POBLADO RURAL ALTO DEL OBISPO 16
2.2.4. VÍA LOS OLIVOS-EL CAUCHAL-EL UVITAL 17
2.2.5. VÍA A VEREDAS EL TAMBO, MERCEDES, RICA BRISA, BELLAVISTA 17
2.2.6. VÍA MUNICIPIO DE TELLO AL CENTRO POBLADO SAN ANDRÉS 18
2.2.7. VÍA ARAUCA II-PEDREGAL-CENTRO POBLADO QUINCHANA 18
2.2.8. VÍA ALTAMIRA-PAJIJI 19
2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO 19
3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA 21
3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1804 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA): 21
3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 22
3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES. 22
3.1.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS 22
3.1.4. INFORME DE AVANCES 23
3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1794 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA): 23
3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 24
3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES. 24

3.2.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.....25

3.2.4. INFORME DE AVANCES.....25

3.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1805 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA):.....25

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 26

3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.....27

3.3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.....27

3.3.4. INFORME DE AVANCES.....27

3.4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1793 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA): 28

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 29

3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.....29

3.4.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.....29

3.4.4. INFORME DE AVANCES.....30

3.5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1842 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA): 30

3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 31

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.....31

3.5.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.....32

3.5.4. INFORME DE AVANCES.....32

3.6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1841 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TELLO (HUILA):.....32

3.6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 33

3.6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.....33

3.6.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.....34

3.6.4. INFORME DE AVANCES.....34

3.7. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1992 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA):.....35

3.7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 36

3.7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.....36

3.7.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.....36

3.7.4. INFORME DE AVANCES.....37

3.8. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1993 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE ALTAMIRA (HUILA):.....37

3.8.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES 38

3.8.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.....38

3.8.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.....39

3.8.4. INFORME DE AVANCES.....39

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA 40

4.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1804 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA). 40

4.1.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 40

4.1.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA.....40

4.1.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 40

4.1.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA.....40

4.1.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 41

4.1.6. ENSAYOS DE LABORATORIO.....41

4.1.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA.....41

4.1.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA.....41

4.1.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....41

4.2. REPORTE EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO 1794 DE 2020 – INVIAS Y MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA). 42

4.2.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 42

4.2.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 42

4.2.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 43

4.2.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 43

4.2.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 43

4.2.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 44

4.2.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 44

4.2.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 44

4.2.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....44

4.3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1805 DE 2020 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA). CONTRATO NO. 007 DE 2022. 45

4.3.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 45

4.3.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 45

4.3.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 45

4.3.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 45

4.3.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 45

4.3.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 46

4.3.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 46

4.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 46

4.3.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....46

4.4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1793 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE EL PITAL (TOLIMA). 47

4.4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 47

4.4.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 47

4.4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 47

4.4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 48

4.4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 48

4.4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 48

4.4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 48

4.4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 49

4.4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....49

4.5. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1842 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA). 49

4.5.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 49

4.5.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 49

4.5.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 50

4.5.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 50

4.5.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 50

4.5.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 51

4.5.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 51

4.5.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 51

4.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....51

4.6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1841 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TELLO (HUILA). 51

4.6.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 52

4.6.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 52

4.6.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 52

4.6.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 52

4.6.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 52

4.6.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 53

4.6.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 53

4.6.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 53

4.6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....53

4.7. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1992 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA). 54

4.7.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 54

4.7.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 54

4.7.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 54

4.7.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 54

4.7.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 55

4.7.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 55

4.7.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 55

4.7.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 55

4.7.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL.....55

4.8. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1993 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE ALTAMIRA (HUILA). 56

4.8.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO 56

4.8.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA 56

4.8.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL 56

4.8.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA 57

4.8.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO 57

4.8.6. ENSAYOS DE LABORATORIO 57

4.8.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA 58

4.8.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA 58

4.8.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL....58
5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA....59
5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO....59
5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES....59
5.3. INFORMES ESPECIALISTAS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS....60
5.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC....60
5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS....60
6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA....60
6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA....61
6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA....61
6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA....61
6.4. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES....61
6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA....61
6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL....61
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES....63
ANEXOS....64

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1 Vías a intervenir 13
Tabla 2 Información general del Contrato de Obra N. LP-001 de 2022 21
Tabla 3 Información general del Contrato de Obra 24
Tabla 4 Información general del Contrato de Obra N. 007 de 2022.....26
Tabla 5 Información general del Contrato de Obra 29
Tabla 6 Información general del Contrato de Obra 31
Tabla 7 Información general del Contrato de Obra 33
Tabla 8 Información general del Contrato de Obra N. 008 de 2022.....35
Tabla 9 Información general del Contrato de Obra 38
Tabla 10 Estado general del tiempo del Contrato N. LP-001 de 2022 41
Tabla 11 Estado general del tiempo Contrato N. 007 de 2022 46
Tabla 12 Estado general del tiempo 48
Tabla 13 Estado general del tiempo 50
Tabla 14 Estado general del tiempo 53
Tabla 15 Estado general del tiempo Contrato N. 008 de 2022 55
Tabla 16 Estado general del tiempo 57
Tabla 17 Información general del Contrato de interventoría N. 1105 de 2022.....59

1. INTRODUCCIÓN

COLOMBIA RURAL es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita.

El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de PALESTINA, GIGANTE, SAN AGUSTÍN, EL PITAL, TARQUÍ, TELLO, SAN AGUSTÍN Y ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

A continuación, se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de OCHO (8) Convenios Interadministrativos que se suscribieron entre INVIAS y municipios del Departamento del Huila en la vigencia 2021, del Programa Colombia Rural:

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1804 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1794 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1805 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VÍA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1793 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1842 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1841 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TELLO (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1992 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.
RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO
CONVENIO: 1993 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE ALTAMIRA (HUILA).

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

"*En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto*." (La subraya no es del texto)

Ante este imperativo legal, el INVIAS encontró necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona, natural o jurídica, que realizará las labores de interventoría de los contratos realizados por los municipios en los convenios indicados anteriormente.

El INVIAS abrió el concurso de méritos abierto CMA-DTE-SEP-197-2021-LOTE 12, que tenía por objeto contratar la interventoría de obra pública para **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN MUNICIPIOS DE DEPARTAMENTOS DE COLOMBIA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 12.** Finalizado el proceso de evaluación y selección del citado concurso de méritos, la citada interventoría fue adjudicada mediante resolución No. 1715 del 24 de mayo de 2022 al proponente No 124 **CONSORCIO ACI – 3B 197,** consorcio conformado por ACI PROYECTOS SAS, sociedad identificada con el NIT. 860.059.851-6, con un porcentaje de participación del 60%, y 3B PROYECTOS SAS, sociedad identificada con el NIT. 900.504.398-4, con un porcentaje de participación del 40%.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Los proyectos correspondientes a los convenios interadministrativos entre INVIAS y los diferentes municipios del departamento del Huila corresponden a los siguientes corredores:

MUNICIPIO	VIA A INTERVENIR
PALESTINA	PALESTINA-SAN ISIDRO-EL SILENCIO
GIGANTE	TRAMOS: EL SALADO, EL COGOLLO, ALTO COROZAL-SECTOR LA CUMBRE, ALTO SILVANIA, EL PIÑAL, LA VEGA
SAN AGUSTIN	VÍA ARAUCA II-PEDREGAL-CENTRO POBLADO QUINCHANA
EL PITAL	LOS OLIVOS-EL CAUCHAL-EL UVITAL
TARQUI	VÍA A VEREDAS EL TAMBO, MERCEDES, RICA BRISA, BELLAVISTA
TELLO	TELLO AL CENTRO POBLADO SAN ANDRÉS
SAN AGUSTIN	VIA HACIA EL CENTRO POBLADO RURAL ALTO DEL OBISPO
ALTAMIRA	VÍA ALTAMIRA-PAJIJI

Tabla 1 Vías a intervenir

Los municipios en donde se realizarán las diferentes intervenciones se encuentran desde el norte hasta el extremo sur del departamento de Huila, como se aprecia en el Gráfico 1. Estos corredores viales transcurren en topografía variada entre ondulada y montañosa, en su mayoría montañosa. Todas las superficies de rodadura se encuentran a nivel de afirmado o a nivel de subrasante.

Las principales actividades y obras por ejecutar que deben ser supervisadas, controladas, verificadas, aprobadas, medidas y constatadas por esta interventoría, en desarrollo del contrato de interventoría No. 1105 de 2022 comprenden entre otras, las siguientes:


ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO

Construcción de Placa Huella
Pavimentos Convencionales
Construcción y/o reparación de obras de drenaje, muros de contención.
Construcción de Filtros y/o cunetas
Bases Estabilizadas
Tecnologías Alternativas.

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Conformación de la calzada existente
Mejoramiento de la subrasante con adición de material
Suministro e instalación de afirmado.

2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

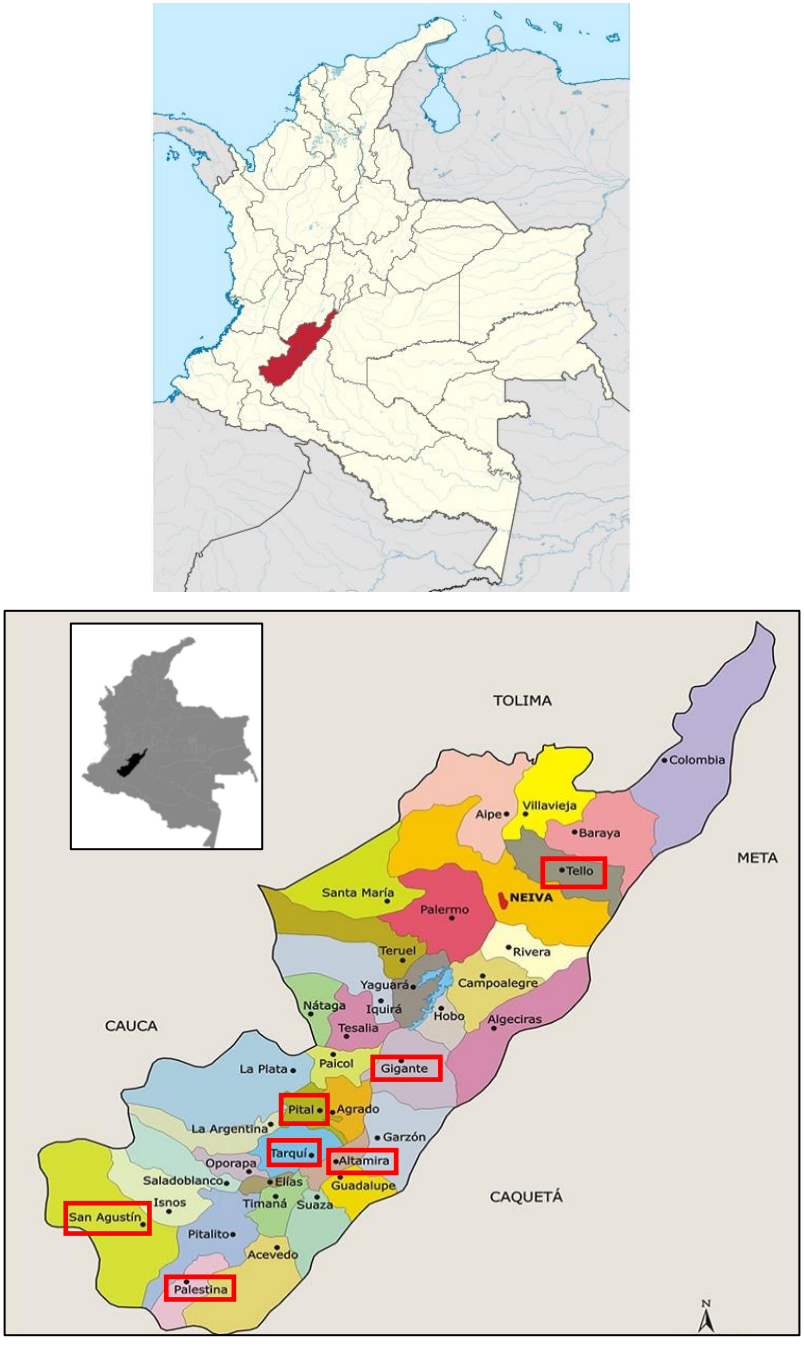

Gráfica 1. Localización del proyecto.

2.2. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VÍAS

A continuación, se presentan los diferentes corredores viales a intervenir en este proyecto:

2.2.1. PALESTINA-SAN ISIDRO-EL SILENCIO:

En el municipio de Palestina, departamento del Huila, en una vía en afirmado y a nivel de subrasante entre regular y mal estado, le corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de alcantarillas de 36".
- Muro de contención.
- Construcción de disipador de energía.
- Construcción de filtros.
- Caracterización vial del corredor.

2.2.2. TRAMOS: EL SALADO, EL COGOLLO, ALTO COROZAL-SECTOR LA CUMBRE, ALTO SILVANIA, EL PIÑAL, LA VEGA

En el municipio de Gigante, departamento del Huila, en todos los tramos están en afirmado en mal estado y topografía montañosa. En los tramos a intervenir tramos se ejecutaran las siguientes obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de alcantarillas de 36".
- Construcción de placa huella en concreto de 3000 PSI.
- Construcción de filtro, disipador y cuneta in situ.

2.2.3. VÍA HACIA EL CENTRO POBLADO RURAL ALTO DEL OBISPO

En el municipio de San Agustín, departamento del Huila, en una vía conformado por material granular seleccionado en regular y mal estado, con pendientes mayores al 10%, con anchos

de vía disponibles entre 8m en las curvas y de 5.50 a 6m en rectas, vía a la cual corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

•Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
• Construcción de alcantarillas de 36".
• Disipador tipo escalera.
• Construcción de placa huellas en concreto de 3000 PSI.
• Construcción de filtro para Vía.
• Caracterización vial del corredor.

2.2.4. VÍA LOS OLIVOS-EL CAUCHAL-EL UVITAL

En el municipio de El Pital, departamento del Huila, la vía a intervenir pertenece al corredor vial a cargo del Departamento del Huila, una parte del carreteable está a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), en una longitud de aproximadamente de 8 kms, los cuales se encuentran unas partes en pésimas y otras en aceptables condiciones, vía a la cual corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

•Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
• Construcción de alcantarillas de 36".
• Construcción de placa huella en concreto de 3000 PSI.
• Construcción de filtros.
• Caracterización vial del corredor.

2.2.5. VÍA A VEREDAS EL TAMBO, MERCEDES, RICA BRISA, BELLAVISTA

En el municipio de Tarqui, departamento del Huila, en la actualidad los tramos de las vías en afirmado a intervenir presentan deficiencias en su funcionalidad debido al mal estado desde superficie de rodadura, el cual se manifiesta de diversas formas por todo el sector, afectando no solo al exterior, en algunos casos infraestructuras construidas en el área de influencia, sino también al inadecuado manejo de aguas lluvias en canales abiertos realizados manualmente lo que no permite la correcta funcionalidad de algunas alcantarillas ya existentes en otros sectores por falta de obras de arte para la conducción de aguas lluvias. Los tramos principales a tratar en el sector rural están ubicados en las veredas El

Tambo, Mercedes, Rica Brisa, Bellavista, El triunfo, La playa, El Líbano, etc vía a la cual corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de alcantarillas de 36".
- Construcción de placa huellas en concreto de 3000 PSI.
- Construcción de box culvert.
- Muro de contención.
- Construcción de disipador de energía.
- Caracterización vial del corredor.

2.2.6. VÍA MUNICIPIO DE TELLO AL CENTRO POBLADO SAN ANDRÉS

En el municipio de Tello, departamento del Huila, actualmente este tramo objeto de esta intervención se encuentra sin estructura de pavimento, con un ancho de banca que oscila entre 5.0 m y 6.0m, se pretende hacer el cálculo del espesor del pavimento rígido, a esta vía le corresponde las siguientes principales actividades u obras a ejecutar:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de alcantarillas de 36".
- Construcción de pavimento rígido.
- Construcción de muros de contención.
- Construcción de filtros.
- Caracterización vial del corredor.

2.2.7. VÍA ARAUCA II-PEDREGAL-CENTRO POBLADO QUINCHANA

En el municipio de San Agustín, departamento del Huila, iniciando el recorrido por los tramos priorizados del convenio 1805 de 2021, llegando hasta el centro poblado Quinchana ubicado a 25 km desde la zona urbana del municipio. El corredor hasta la vereda está conformado por una superficie de rodadura en mal estado, cuyo tiempo de trayecto es mayor a la hora. Una vez ubicados en el centro poblado se evidencia que las vías están en regular estado conformadas por material seleccionado con pendientes entre 1% y 5. El segundo tramo priorizado ubicado entre el casco urbano del municipio y la vereda Arauca II, cuya superficie de rodadura se encuentra en regular y mal estado, con pendientes mayores al 10% conformada por material granular seleccionado, con anchos de vía

disponibles entre 6m y 4m. El tercer tramo priorizado está ubicado en la vereda llamada Pedregal, corredor con una superficie en regular estado conformado por material granular seleccionado y suelo natural, con pendientes en algunos sectores mayores al 10 %, con anchos de vía disponibles entre 8m en las curvas y 6 a 4m en rectas o tangentes. La siguientes son las principales actividades u obras a ejecutar:

• Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
• Construcción de alcantarillas de 36".
• Construcción de placa huellas en concreto de 3000 PSI.
• Construcción de Filtro para Via.
• Caracterización vial del corredor.

2.2.8. VÍA ALTAMIRA-PAJIJI

En el municipio de Altamira, departamento del Huila, la mayor parte de la longitud del corredor se encuentra a nivel de afirmado, en general se encuentra en regulares condiciones, el ancho promedio de la vía es de 5 m. las principales actividades u obras a ejecutar:

• Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructurales y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
• Construcción de alcantarillas de 36".
• Construcción de placa huella en concreto de 3000 PSI.
• Construcción de filtro para via.

2.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Cada uno de los contratistas que asignaron a los ocho (08) proyectos de los convenios correspondientes al Lote 12 del Programa Colombia Rural en el departamento del Huila, deben realizar la revisión y/o ajuste de diseños base de la Cartilla Colombia Rural adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20. Por lo tanto, producto de esa revisión y/o ajuste y/o complementación de la Cartilla Rural, las diferentes obras a realizar en cada vía se deberán ajustar a las condiciones existente de la topografía, tránsito y características geotécnicas de cada vía, de manera que no se afectarán las especificaciones geométricas de las carreteras que serán intervenidas, tan solo mejorando las condiciones de rodadura en los tramos en donde serán realizadas las placa huellas y pavimento rígido.

3. INFORMACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1804 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-001-2022
Contrato:	LP-001 de 2022
Fecha de Suscripción	27 DE OCTUBRE DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL CONVENIO 1804 DE 2021.
Contratista:	CONSTRUCTORA SAAVAR S.A.S. con NIT. 900.281.931-1
Integrantes:	NO APLICA
NIT:	. 900.281.931-1
Valor inicial:	$ 866.025.723 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 866.025.723 Incluido IVA
Plazo inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2022
Prórroga:	2
Fecha de inicio:	28 de diciembre de 2022
Fecha de terminación:	31 de Agosto de 2023
Dirección:	Calle 46 # 16-24 Neiva, Huila
Teléfono:	3232314888, saavarsascontratacion@gmail.com

Tabla 2 Información general del Contrato de Obra N. LP-001 de 2022

.

3.1.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, el Contratista de obra realizó las actividades de Excavación varias sin clasificar, Suministro e instalación de acero de refuerzo, Concreto clase F y D para los muros de contención ubicados en el K04+300 y K07+420 así como la topografía y los ensayos de geotecnia base para el estudio y diseño de las obras planteadas, cuyos resultados los están revisando y procesando los especialistas del contratista de obra para la respectiva revisión, ajuste, y/o complementación de los diseños base de la cartilla Colombia Rural.

3.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.1.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.1.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental, se está a la espera de la entrega por parte del contratista del Informe No 1 del PAGA.

3.1.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de julio de 2023, se realizaron actividades correspondientes al componente SISO que estarán plasmadas en el informe No 1 a entregar por parte del contratista de obra.

3.1.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.1.4. INFORME DE AVANCES

3.1.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Se presentan los avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas durante el periodo.

- Meta Física Programada: 75,74%
- Meta Física Ejecutada: 36,98%

3.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1794 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	**SAM – UI- 004 DE 2023.**
Contrato:	Por definir
Fecha de Suscripción	Por definir
Objeto:	MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1794 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS-.
Contratista:	Por Definir
Integrantes:	Por definir
NIT:	
Valor inicial:	$ Por definir
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ Por definir

CONTRATISTA	
Plazo inicial:	
Prórroga:	0
Fecha de inicio:	Por definir
Fecha de terminación:	Por definir
Dirección:	
Teléfono:	

Tabla 3 Información general del Contrato de Obra

3.2.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023 aún no se ha definido por parte de la alcaldía de Gigante el contratista de obra que ejecutará el respectivo proyecto producto del convenio No. 1794 de 2021 entre el INVIAS y el municipio de Gigante, debido a que el proceso de selección abreviada se encuentra en etapa de evaluación de las propuestas presentadas a el municipio de Gigante. En conclusión, no se realizaron actividades técnicas, sociales y ambientales en este periodo por lo indicado anteriormente.

3.2.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.2.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social del contrato de obra del municipio de Gigante.

3.2.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental del contrato de obra del municipio de Gigante.

3.2.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO del contrato de obra del municipio de Gigante.

3.2.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.2.4. INFORME DE AVANCES

3.2.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Al no haberse ejecutado obras en este periodo producto de no haberse definido el contratista de obra que ejecutará el proyecto producto del convenio No. 1794 entre el INVIAS y el municipio de Gigante, no presentaron avance de obras programadas ni ejecutadas.

3.3. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1805 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LICITACIÓN PÚBLICA N° 05 de 2022
Contrato:	007 DE 2022
Fecha de Suscripción	21 DE NOVIEMBRE DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL CORREDOR DE ARAUCA II PEDREGAL Y CENTRO POBLADO QUINCHANA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1805 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTIN E INVIAS

CONTRATISTA	
Contratista:	UNION TEMPORAL CORREDOR ARAUCA con NIT. 901.738.215-3
Integrantes:	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS (10%) con NIT 813012067, GM SOLUTIONS S.A.S. (90%) con NIT 891105078
NIT:	PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y MONTAJES SAS con NIT 813012067, y GM SOLUTIONS S.A.S. con NIT 891105078-9
Valor inicial:	$ 1.294.873.389,7 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 1.294.873.389,7 Incluido IVA
Plazo inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
Prórroga:	1
Fecha de inicio:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación:	31 DE AGOSTO DE 2023
Dirección:	CALLE 6 A No. 10-13
Teléfono:	

Tabla 4 Información general del Contrato de Obra N. 007 de 2022

3.3.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023 del contrato 007, el Contratista de obra realizó la topografía para la revisión, ajuste, y/o complementación de los estudios y diseños base de la cartilla Colombia Rural, también coordinó la ejecución de la toma de muestras de los ensayos de campo de la geotecnia para el diseño del pavimento de las placa huellas, en cuanto al avance físico de las actividades del contrato realizo al construcción de 2 alcantarillas de 36" y construcción de placa huella en la vereda Arauca II Tramo 3 y 4.

3.3.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.3.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social del contrato 007 del municipio de San Agustín.

3.3.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental del contrato 007 del municipio de San Agustín, se está a la espera de la entrega del PAGA de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría.

3.3.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, se realizaron actividades correspondientes al componente SISO del contrato 007 del municipio de San Agustín que fueron supervisadas por la interventoría.

3.3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.3.4. INFORME DE AVANCES

3.3.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Se presentan los avance de obras programadas, ejecutadas y acumuladas durante el periodo.

- Meta Física Programada: 25,53%
- Meta Física Ejecutada: 27,98%

3.4. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1793 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-001-2022
Contrato:	LP-001-2023
Fecha de Suscripción	21 de Marzo de 2023
Objeto:	MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL RURAL LOS OLIVOS - EL CAUCHAL – EL UVITAL DEL MUNICIPIO DE EL PITAL HUILA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Contratista:	Consorcio GYG Soluciones
Integrantes:	Proinco Ingenieria SAS (90%), Proyectos, construcciones y Montajes SAS(10%)
NIT:	901.688.774-3
Valor inicial:	$ 864.988.745
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 864.988.745
Plazo inicial:	Tres Meses
Prórroga:	0
Fecha de inicio:	
Fecha de terminación:	
Dirección:	

CONTRATISTA	
Teléfono:	313 3479711

Tabla 5 Información general del Contrato de Obra

3.4.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Julio de 2023, el contratista de obra inicio las actividades de demolición de alcantarilla existente, excavaciones varias sin clasificar e instalación de tubería de 36” en las veredas el Uvital y el Cauchal.

3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.4.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.4.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.4.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

3.4.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.4.4. INFORME DE AVANCES

3.4.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Se presentan los avances de obras programadas, ejecutadas y acumuladas durante el periodo.

- Meta Física Programada: 1%
- Meta Física Ejecutada: 0,05%

3.5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1842 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-001-2022
Contrato:	001-2023
Fecha de Suscripción	21 de Enero de 2023
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE TARQUI DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL
Contratista:	DANES INGENIERIOS SAS
Integrantes:	
NIT:	900.219.918
Valor inicial:	$ 3.419.333.945,00 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 3.419.333.945,00 Incluido IVA

CONTRATISTA	
Plazo inicial:	CINCO MESES (05) MESES
Prórroga:	0
Fecha de inicio:	15 de Mayo de 2023.
Fecha de terminación:	31 de Julio de 2023
Dirección:	Carrera 1 Este No 77-05 apartamento 201
Teléfono:	315 2052190

Tabla 6 Información general del Contrato de Obra

3.5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, El contratista de obra inicio con las actividades de demolición de alcantarillas existentes, excavación varias sin clasificar, Instalación de tubería de 36", Concreto clase F y D para construcción de alcantarilla de 36" en las veredas el Tambo y Las mercedes.

3.5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.5.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.5.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.5.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

3.5.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.5.4. INFORME DE AVANCES

3.5.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Se presentan los avances de obras programadas, ejecutadas y acumuladas durante el periodo.

- Meta Física Programada: 6,25%
- Meta Física Ejecutada: 0,48%

3.6. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1841 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TELLO (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-001 DE 2022
Contrato:	060-2023
Fecha de Suscripción	23 de Marzo de 2023
Objeto:	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA QUE DE TELLO CONDUCE AL CENTRO POBLADO SAN ANDRÉS EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1841 DE 2021, CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS EN MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1841 DE 2021, CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Contratista:	V&M INGENIERIA SAS

CONTRATISTA	
Integrantes:	
NIT:	900.062.688-7
Valor inicial:	$ 2.581.941.957,9
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 2.581.941.957,9
Plazo inicial:	3 MESES
Prórroga:	1
Fecha de inicio:	21 de Abril de 2023
Fecha de terminación:	30 de Octubre de 2023
Dirección:	
Teléfono:	

Tabla 7 Información general del Contrato de Obra

3.6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 Julio de 2023, el contratista de obra continuo con la construcción de 7 alcantarillas de 36" a lo largo del corredor vial hacia el centro poblado San Andrés.

3.6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.6.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.6.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 Julio de 2023, se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental que se plasmaran en la entrega del informe No 1 del PAGA.

3.6.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 Julio de 2023, se realizaron actividades correspondientes al componente SISO que se plasmaran en la entrega del informe No1 SST.

3.6.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.6.4. INFORME DE AVANCES

3.6.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Se presentan los avances de obras programadas, ejecutadas y acumuladas durante el periodo de acuerdo a la reprogramación de obras enviadas por el contratista de obra.

- Meta Física Programada: 12,95%
- Meta Física Ejecutada: 5,00%

3.7. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1992 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-04-2022
Contrato:	008 DE 2022
Fecha de Suscripción	29 DE NOVIEMBRE DE 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EN EL CORREDOR HACIA EL CENTRO POBLADO RURAL ALTO DEL OBISPO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL NACIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 1992 DE 2021, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN E INVIAS
Contratista:	CONSORCIO EL OBISPO con NIT. 901.657.474-6
Integrantes:	V&M INGENIERIA S.A.S. NIT: 900062688 con una participación del 90% ,y BARINCO INGENIEROS S.A.S. NIT: 900874409 con una participación del 10%
NIT:	V&M INGENIERIA S.A.S. NIT: 900062688 y BARINCO INGENIEROS S.A.S. NIT: 900874409
Valor inicial:	$ 669.354.696,27 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 669.354.696,27 Incluido IVA
Plazo inicial:	31 DE DICIEMBRE DE 2022
Prórroga:	1
Fecha de inicio:	28 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación:	31 DE AGOSTO DE 2023
Dirección:	
Teléfono:	

Tabla 8 Información general del Contrato de Obra N. 008 de 2022

3.7.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023 del contrato 008, el Contratista de obra realizó la topografía de la revisión, ajuste, y/o complementación de los estudios y diseños base de la cartilla Colombia Rural, también coordinó la ejecución de la toma de muestras de los ensayos de campo de la geotecnia para el diseño del pavimento de las placa huellas, durante el periodo el avance físico de las obras se ve reflejada en la construcción de 5 alcantarillas de 36” en los tramos 1 y 2, Construcción de placa huella en el tramo 1.

3.7.2. DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.7.2.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social del contrato 008 del municipio de San Agustín.

3.7.2.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de julio de 2023, se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental del contrato 008 del municipio de San Agustín que se plasmaron en la entrega del informe No 1 correspondiente al Plan de adaptación a la Guía Ambiental PAGA

3.7.2.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, se realizaron actividades correspondientes al componente SISO del contrato 008 del municipio de San Agustín que se plasmaron en la entrega del informe No 1 SST.

3.7.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.7.4. INFORME DE AVANCES

3.7.4.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Se presentan los avances de obras programadas, ejecutadas y acumuladas durante el periodo.

- Meta Física Programada: 86,19 %
- Meta Física Ejecutada: 21,29 %

3.8. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO PRODUCTO DEL CONVENIO 1993 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE ALTAMIRA (HUILA):

CONTRATISTA	
Proceso de selección:	LP-001-2022
Contrato:	LP-001-2023
Fecha de Suscripción	2 de Noviembre de 2022
Objeto:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE ALTAMIRA DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL - NACIONAL, EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1993 DE 2021 CELEBRADO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
Contratista:	DANES INGENIEROS SAS
Integrantes:	NO APLICA
NIT:	900.219.918-2
Valor inicial:	$ 660.391.531,00 Incluido IVA
Adición 1:	$ 0
Valor actualizado:	$ 660.391.531,00 Incluido IVA
Plazo inicial:	TRES (03) meses

CONTRATISTA	
Prórroga:	0
Fecha de inicio:	30 de mayo de 2023
Fecha de terminación:	30 de Agosto de 2023
Dirección:	Por definir
Teléfono:	Por definir

Tabla 9 Información general del Contrato de Obra

3.8.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, El contratista de obra inicio con las actividades de demolición de alcantarillas existentes, Excavaciones varias sin clasificar, Instalación de tubería de 36", Concreto clase F y D para construcción de alcantarillas de 36" Vereda Pajiji.

DESCRIPCIÓN DE LAS GESTIONES Y AVANCE DEL PROYECTO EN LA GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL DURANTE EL PRESENTE MES.

3.8.1.1. Resumen ejecutivo y avance del proyecto en la Gestión Social.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente social.

3.8.1.2. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión Ambiental

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente ambiental.

3.8.1.3. Resumen ejecutivo de las gestiones y avance del proyecto en la Gestión SISO

Durante el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023, no se realizaron actividades correspondientes al componente SISO.

3.8.2. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS

A la fecha de corte del presente informe no se tienen ítems no previstos.

3.8.3. INFORME DE AVANCES

3.8.3.1. Avance de obras Programadas, Ejecutadas y acumuladas del contrato

Se presentan los avances de obras programadas, ejecutadas y acumuladas durante el periodo.

- Meta Física Programada: 19,33 %
- Meta Física Ejecutada: 2,59 %

4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATOS DE OBRA

4.1. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1804 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA).

Se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023.
Nota: Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.4 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.1.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.1.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria y equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.1.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra, en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presenta en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor .

4.1.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.1.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 9 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	691
Lluvias moderadas	13
Lluvias intensas	40

Tabla 10 Estado general del tiempo del Contrato N. LP-001 de 2022

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.1.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

Se presenta registro de ensayos de laboratorio entre el 1 y el 31 de Julio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se relacionarán cada uno de los ensayos realizados.

4.1.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registra el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra.

4.1.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realizará el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.1.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.1.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato cuenta contaba anticipo, pero el contratista de obra renuncio a ese derecho mediante otro si No 3.

4.1.9.2. Seguimiento programa de Obra

El programa de obra está aprobado a la fecha.

4.1.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presentará copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones cuando el mismo sea revisado y aprobado por la Interventoría e INVIAS de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.1.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el presente periodo de este informe mensual, se presentaron comités de obra o reuniones.

4.1.9.5. Informes semanales de Interventoría

Los informes semanales de este periodo se presentan en el Anexo 8.3.

4.2. REPORTE EJECUCION MENSUAL DEL CONVENIO 1794 DE 2020 – INVIAS Y MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA).

No se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023 debido a que el contrato de obra de este proceso licitatorio aún no ha sido adjudicado.
Nota: Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.5 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.2.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.2.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

No se ha dispuesto a la fecha maquinaria ni equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.2.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra en donde se realizará cuando se conozca el contratista de obra, en el cual se presentará la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presentará en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor.

.

4.2.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.2.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 10 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	737
Lluvias moderadas	5
Lluvias intensas	2

Tabla 10. Estado general del tiempo.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe el estado general del tiempo no afecta el proyecto debido a que aún no se ha adjudicado.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.2.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de los ensayos de laboratorio del mes de Julio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.2.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registrará el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra cuando este sea adjudicado.

4.2.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realizará el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.2.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.2.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato no cuenta con anticipo por lo cual no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.2.9.2. Seguimiento programa de Obra

El contrato de obra aún no ha iniciado.

4.2.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presentara copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones cuando se dé inicio al contrato de obra la cual sera revisados por la Interventoría de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.2.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el presente periodo de este informe mensual, no se presentaron comités de obra o reuniones.

4.2.9.5. Informes semanales de Interventoría

No se desarrolló ningún informe semanal específico de este contrato de obra en este periodo de tiempo, debido a que la fecha del cierre del presente informe mensual aún no se había conocido el contratista de obra de este convenio.

4.3. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1805 DE 2020 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA). CONTRATO NO. 007 DE 2022.

Se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023.
Nota: Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.6 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.3.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.3.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria y equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.3.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra, en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presenta en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor.

4.3.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.3.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 11 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	691
Lluvias moderadas	13
Lluvias intensas	40

Tabla 11 Estado general del tiempo Contrato N. 007 de 2022

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.3.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

Se presenta registro de ensayos de laboratorio entre el 1 y el 31 de Julio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.3.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MINFRA-MN-IN-15-FR-12**, donde se registra el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra.

4.3.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MINFRA-MN-IN-15-FR-14**, donde se realiza el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.3.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.3.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato no cuenta con anticipo, por lo tanto no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.3.9.2. Seguimiento programa de Obra

El programa de obra está aprobado a la fecha.

4.3.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presentará copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones cuando el mismo sea revisado y aprobado por la Interventoría e INVIAS de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.3.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el presente periodo de este informe mensual, no se presentaron comités de obra o reuniones.

4.3.9.5. Informes semanales de Interventoría

Los informes semanales de este periodo se presentan en el Anexo 8.3.

4.4. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1793 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE EL PITAL (TOLIMA).

Se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023.
Nota: Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.7 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.4.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-3**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.4.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria y equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-15-FR-4.**

4.4.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra en donde se realizará cuando se conozca el contratista de obra, en el cual se presenta la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presenta en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del

contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor.

4.4.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 12 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	691
Lluvias moderadas	13
Lluvias intensas	40

Tabla 12 Estado general del tiempo

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe el estado general del tiempo predomina el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.4.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de los ensayos de laboratorio del mes de Julio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registrará el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra cuando este sea adjudicado.

4.4.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realiza el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.4.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato cuenta con anticipo por lo cual se presentara informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.4.9.2. Seguimiento programa de Obra

Se encuentra en revisión por parte de la interventoría la programación de obra.

4.4.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presenta copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones revisados por la Interventoría de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.4.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el presente periodo de este informe mensual, no se presentaron comités de obra o reuniones.

4.4.9.5. Informes semanales de Interventoría

Se presenta informe semanal específico de este contrato de obra en este periodo de tiempo.

4.5. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1842 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA).

Se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023.
Nota: Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.8 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.5.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.5.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria y equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-15-FR-4.**

4.5.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra en donde se realizará cuando se inicie el contrato de obra, en el cual se presentará la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presentará en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor cuando se inicie el respectivo contrato de obra.

4.5.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.5.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 13 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	691
Lluvias moderadas	13
Lluvias intensas	40

Tabla 13 Estado general del tiempo

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe el estado general del tiempo predomino seco por lo cual no afecto no afecto el inicio de las actividades del proyecto.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.5.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de los ensayos de laboratorio del mes de Julio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.5.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registrará el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra cuando este sea adjudicado.

4.5.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realiza el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.5.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.5.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato cuenta con anticipo reportado, por lo tanto se presentara informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.5.9.2. Seguimiento programa de Obra

La programación de obra se encuentra aprobada a la fecha.

4.5.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presenta copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones revisados por la Interventoría de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.5.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el presente periodo de este informe mensual, no se presentaron comités de obra o reuniones.

4.5.9.5. Informes semanales de Interventoría

Se presenta informe semanal específico de este contrato de obra en este periodo de tiempo.

4.6. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1841 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TELLO (HUILA).

Se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023.

Nota: Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.9 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.6.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.6.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria y equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-15-FR-4.**

4.6.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra en donde se realizará cuando se conozca el contratista de obra, en el cual se presenta la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presenta en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor.

4.6.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.6.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 14 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	685
Lluvias moderadas	15

Lluvias intensas	43

Tabla 14 Estado general del tiempo

.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe el estado general del tiempo no afecta el proyecto ya que predomino el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.6.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de los ensayos de laboratorio del mes de Julio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.6.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registrará el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra cuando este sea adjudicado.

4.6.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realiza el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.6.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.6.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato no cuenta con anticipo conocido, por lo tanto no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.6.9.2. Seguimiento programa de Obra

Se realiza seguimiento a la programación de obra aprobada.

4.6.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presenta copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones revisados por la Interventoría de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.6.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el presente periodo de este informe mensual, no se presentaron comités de obra o reuniones.

4.6.9.5. Informes semanales de Interventoría

Se presenta informe semanal específico de este contrato de obra en este periodo de tiempo.

4.7. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1992 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA).

Se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023.
Nota: Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.10 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.7.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.7.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria y equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.7.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra, en el cual se registra la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presenta en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor.

4.7.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.7.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 15 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	691
Lluvias moderadas	13
Lluvias intensas	40

Tabla 15 Estado general del tiempo Contrato N. 008 de 2022

.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe predominó el tiempo seco.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.7.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de los ensayos de laboratorio del mes de Julio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.7.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registra el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra.

4.7.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realiza el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.7.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.7.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato no cuenta con anticipo, por lo tanto no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.7.9.2. Seguimiento programa de Obra

Se realiza seguimiento de la programación de obra aprobada

4.7.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presenta copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones revisados por la Interventoría de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.7.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el presente periodo de este informe mensual, no se presentaron comités de obra o reuniones.

4.7.9.5. Informes semanales de Interventoría

Los informes semanales de este periodo se presentan en el Anexo 8.3.

4.8. REPORTE EJECUCIÓN MENSUAL DEL CONVENIO 1993 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE ALTAMIRA (HUILA).

Se ejecutaron obras en el periodo comprendido entre el 1 y 31 de Julio de 2023.
Nota: Los formatos de obra de este Contrato se presentan en el ANEXO 8.11 del presente documento con la información que posee la interventoría a la fecha.

4.8.1. RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-2**, en el cual se registra de manera resumida el estado general de la ejecución del contrato.

4.8.2. CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

El contratista ha dispuesto a la fecha maquinaria y equipo como se puede apreciar en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-4.**

4.8.3. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE OBRA Y REVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES LEGALES (PARAFISCALES) Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-6** el control diario del personal del contratista de obra en donde se realizará cuando se inicie el contrato de obra, en el cual se presentará la verificación del personal dispuesto en la obra en cumplimiento de lo previsto en el pliego de condiciones del Contrato de Obra, así como se presentará en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del contratista de obra (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Interventor cuando se inicie el respectivo contrato de obra.

4.8.4. INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-15-FR-8**, en el cual se presenta el control financiero y presupuestal del contrato de obra.

4.8.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

En la Tabla 16 se presenta la relación de horas de lluvias intensas, moderadas y tiempo seco del presente periodo de 2023.

CLASE DE TIEMPO	HORAS EN EL PERIODO
Seco	738
Lluvias moderadas	6
Lluvias intensas	0

Tabla 16 Estado general del tiempo

.

Como se puede observar, en el periodo de tiempo que corresponde a este informe el estado general del tiempo no afecta el proyecto debido a que aún no ha iniciado actividades técnicas ni de obra.

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-10**, donde se registra el estado del tiempo desde el punto de vista de horas de lluvia y su intensidad, así como los mapas de interpolación diaria de precipitación en milímetros para el país de acuerdo con la información suministrada por el IDEAM.

4.8.6. ENSAYOS DE LABORATORIO

No se presenta registro de los ensayos de laboratorio del mes de Julio de 2023, en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-11** se deben relacionar cada uno de los ensayos realizados.

4.8.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA

Se presenta el documento **MEPI-MN-IN-15-FR-12**, donde se registrará el seguimiento a las garantías y seguros contrato de obra cuando este sea adjudicado.

4.8.8. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-14**, donde se realiza el seguimiento al Plan de Calidad del proyecto.

4.8.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

4.8.9.1. Informe de inversión y buen manejo del anticipo:

El contrato no cuenta con anticipo, por lo tanto no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

4.8.9.2. Seguimiento programa de Obra

Se realiza seguimiento a la programación de obra aprobada..

4.8.9.3. Seguimiento programa de Inversiones

Se presenta copia del programa de inversiones vigente y copia del documento de seguimiento al programa de obra e inversiones revisados por la Interventoría de acuerdo con los formatos **MEPI-MN-IN-6-FR-1** y **MEPI-MN-IN-6-FR-2**.

4.8.9.4. Copia de las Actas de Comité de Obra y Actas de reunión

En el presente periodo de este informe mensual, no se presentaron comités de obra o reuniones.

4.8.9.5. Informes semanales de Interventoría

Se presenta informe semanal específico de este contrato de obra en este periodo de tiempo.

5. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA	
Proceso de selección:	CMA-DTE-SEP-197-2021-LOTE 12
Contrato:	1105 de 2022
Fecha de Suscripción	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 12
Interventor:	CONSORCIO ACI – 3B 197
Integrantes:	ACI PROYECTOS S.A.S. con NIT 860.059.851-6, con participación del 60% Y 3B PROYECTOS S.A.S. con NIT 900.504.398-4 con participación del 40%
NIT:	901.598.587-6
Valor inicial:	$ 1.098.134.737 INCLUIDO IVA
Adiciones:	0
Valor actualizado:	$ 1.098.134.737 INCLUIDO IVA
Modificaciones:	0
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023
Prórroga:	0
Fecha de inicio:	23 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023
Dirección:	CR 7 No. 156-10 EDIF TORRE KRYSTAL PISO 31, BOGOTÁ
Teléfono:	3115412555

Tabla 17 Información general del Contrato de interventoría N. 1105 de 2022

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el presente periodo la Interventoría realizó actividades administrativas y de campo del contrato de interventoría, así como seguimiento al estado de los contratos de obra que tienen orden de inicio, así como el seguimiento de los procesos licitatorios que aún no han sido adjudicados y acompañamiento a las aclaraciones de cada contratista de obra y

oficinas de secretarias de planeación de cada uno de los proyectos a ser supervisados por el contrato de interventoría No. 1105 de 2022.

5.3. INFORMES ESPECIALISTAS, PROFESIONALES Y TÉCNICOS

En el presente periodo de tiempo, entre el 1 y el 31 de Julio de 2023, se desarrollaron actividades por parte de especialistas, profesionales y técnicos.

5.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Se hará control y seguimiento por parte de esta Interventoría al Programa Anual de Caja – PAC.

REPORTE SIIF NACIÓN PAGOS:

Como parte del seguimiento y control de pagos que se realizan a los Contratistas, se reportará la tabla de pagos del SIIFF NACIÓN de cada uno de los convenios del INVIAS con cada municipio.

5.5. INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS

APLICATIVO CIFRA DEL PORTAL INVIAS:

Debido a que los ocho (08) contratos de obra del programa Colombia Rural fueron adjudicados por entidades diferente al Instituto Nacional de Vías (INVIAS), no se implementó el aplicativo CIFRA del portal INVIAS en los contratos de obra.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Nota: Los formatos de obra del Contrato de Interventoría se presentan en el ANEXO 8.12 del presente documento.

6.1. CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE LA INTERVENTORÍA

Se presenta el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-5** con el control diario de equipo de la Interventoría, donde se relaciona el equipo en la obra día a día y si se encuentra en reparación, activo o inactivo.

6.2. CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

En el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-7** se presenta el control diario del personal de la Interventoría en este período, donde se relacionan los hombre-mes laborados por el personal profesional técnico, operativo y administrativo, así como se presenta en ese mismo formato la revisión y verificación de pago de aportes a la seguridad social integral y parafiscales del personal de Interventoría (artículo 50 de la ley 789 de 2001 – Ley 823 de 2003, Ley 1150 de 2007), por parte del Supervisor.

6.3. INFORMACIÓN FINANCIERA CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta la información financiera del contrato de interventoría de acuerdo con el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-9**.

6.4. SEGUIMIENTO A LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

En el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-13** se presenta el seguimiento a las garantías del contrato de Interventoría.

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Se presenta el seguimiento y verificación del cumplimiento mensual del plan de calidad del contrato de Interventoría de acuerdo con lo establecido en el formato **MEPI-MN-IN-15-FR-18**.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL

El Contrato de Interventoría no contará con anticipo por lo cual no se presenta informe de inversión y buen manejo del anticipo.

El Plan de Cargas y el seguimiento al plan de cargas del contrato de Interventoría se presentará en el formatos **MEPI-MN-IN-9-FR-2** el cual va a ser presentado para aprobación del INVIAS.

Las bitácoras o diarios de obra de cada proyecto se están diligenciando de acuerdo a las actividades de obra de cada proyecto, las cuales se iniciaron con la aprobación de la revisión de estudios y diseños base de la cartilla “Colombia Rural” adoptada mediante Resolución No. 2483 del 19-oct-20.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los contratos de obra de cada uno de los ocho (08) contratos derivados de los convenios 1804, 1794, 1805, 2257, 1793, 1842, 1841, 1992, y 1993 de 2021 celebrados por el INVIAS y los Municipios de Palestina, Gigante, San Agustín, El Pital, Tarqui, Tello, San Agustín y Altamira, respectivamente, ubicados todos en el departamento del Huila, se encuentran en diferentes etapas de ejecución a excepción del proceso de adjudicación y legalización de Gigante, Huila. Se dio orden de inicio a los contratos productos de los convenios 1805, 1804, 1992,1793, 1842, 1841,1992 y 1993 de 2021 con los municipios de San Agustín, Palestina, Tello, Tarqui, Altamira, Pital respectivamente, a los que esta interventoría ha acompañado y participado en la prórroga de cada convenio y contrato de esos proyectos, así como el desarrollo y aclaraciones que cada contratista haya realizado.
- Se dio orden de inicio al contrato de interventoría No. 1105 de 2021 por parte del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), como entidad contratante del citado contrato. Se realizaron las actividades administrativas para entrega de la documentación solicitada por parte de la entidad contratante en el documento base o pliego tipo y de sus respectivos anexos del contrato de interventoría No. 1105 de 2022.

ANEXOS
