
CONTRATO NO. 1105 DE 2022 “INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL” LOTE 12”	**CONSORCIO ACI -3B 197**

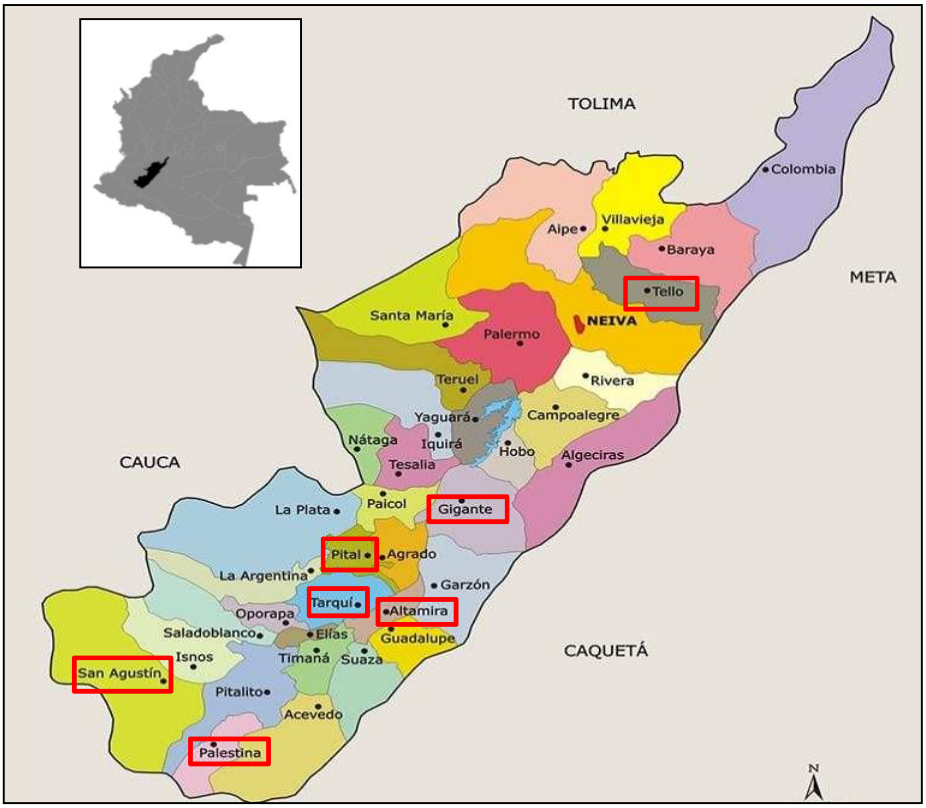


INFORME NO. 11 DE INTERVENTORÍA

PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

NEIVA –HUILA, 5 DE NOVIEMBRE DE 2023

INFORME MENSUAL No. 08	**CONSORCIO ACI – 3B 197**	**DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2023**
INFORME MENSUAL RESIDENTE DE INTERVENTORÍA		

TITULO DOCUMENTO:		**INTEGRANTES**	
APROBACION	RESPONSABLE POR ELABORACIÓN " Residente de interventoría "	Nombre	Carlos Alberto Villanueva Peñas
		Firma	
		Fecha	05/11/2023
	RESPONSABLE APROBACIÓN "Director de Interventoría"	Nombre	Ing. Andrés Hernán Angarita Beltrán
		Firma	
		Fecha	03/11/2023

INTRODUCCION

COLOMBIA RURAL es un programa del Gobierno nacional para el mejoramiento y mantenimiento de las vías rurales del país con las que se genera la gran conexión que el campo colombiano necesita.

El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de PALESTINA, GIGANTE, SAN AGUSTÍN, EL PITAL, TARQUÍ, TELLO, SAN AGUSTÍN Y ALTAMIRA EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

A continuación, se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en ejecución de OCHO (8) Convenios Interadministrativos que se suscribieron entre INVIAS y municipios del Departamento del Huila en la vigencia 2021, del Programa Colombia Rural:

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1804 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE PALESTINA (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1794 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE GIGANTE (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1805 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VÍA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1793 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE EL PITAL (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1842 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TARQUI (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1841 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE TELLO (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1992 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN (HUILA).

TIPO DE VIA: TERCIARIA.

RESPONSABLE DE LA VIA: MUNICIPIO

CONVENIO: 1993 DE 2021 – INVIAS Y MUNICIPIO DE ALTAMIRA (HUILA).

El inciso segundo del numeral 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 impone:

"*En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.*" (La subraya no es del texto)

Ante este imperativo legal, el INVIAS encontró necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona, natural o jurídica, que realizará las labores de interventoría de los contratos realizados por los municipios en los convenios indicados anteriormente.

El INVIAS abrió el concurso de méritos abierto CMA-DTE-SEP-197-2021-LOTE 12, quetenía por objeto contratar la interventoría de obra pública para **INTERVENTORÍA TÉCNICA,**

ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN MUNICIPIOS DEDEPARTAMENTOS DE COLOMBIA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", LOTE 12. Finalizado el proceso de evaluación y selección del citado concurso de méritos, la citada interventoría fue adjudicada mediante resolución No. 1715 del 24 de mayo de 2022 al proponente No 124 **CONSORCIO ACI – 3B 197,** consorcio conformado por ACI PROYECTOS SAS, sociedad identificada con el NIT. 860.059.851-6, con un porcentaje de participación del 60%, y 3B PROYECTOS SAS, sociedad identificada con el NIT. 900.504.398-4, con un porcentaje de participación del 40%.

INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

INTERVENTORÍA	
Proceso de selección:	CMA-DTE-SEP-197-2021-LOTE 12
Contrato:	1105 de 2022
Fecha de Suscripción	15 DE NOVIEMBRE DE 2022
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE HUILA DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" LOTE 12
Interventor:	CONSORCIO ACI – 3B 197
Integrantes:	ACI PROYECTOS S.A.S. con NIT 860.059.851-6, con participación del 60% Y 3B PROYECTOS S.A.S. con NIT 900.504.398-4 con participación del 40%
NIT:	901.598.587-6
Valor inicial:	$ 1.098.134.737 INCLUIDO IVA
Adiciones:	0
Valor actualizado:	$ 1.098.134.737 INCLUIDO IVA
Modificaciones:	0
Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2023
Prórroga:	0
Fecha de inicio:	23 DE DICIEMBRE DE 2022
Fecha de terminación:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
Dirección:	CR 7 No. 156-10 EDIF TORRE KRYSTAL PISO 31, BOGOTÁ
Teléfono:	3115412555

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

Durante el presente periodo la residencia de Interventoría realizó actividades administrativas y de campo del contrato de interventoría , así como seguimiento al estado de los contratos de obra que tienen orden de inicio, así como el seguimiento de los procesos que han sido adjudicados lo cual requieren acompañamiento permanente por parte de la interventoría con el fin de aclarar las dudas y aclaraciones de cada contratista de obra y oficinas de secretarias de planeación de cada uno de los proyectos a ser supervisados por el contrato de interventoría No. 1105 de 2022 así como la visitas a los proyectos para definir el alcance real de las obras y la socialización de los proyectos que haya a lugar.

Durante este periodo se continuo ejecutando las actividades del contrato LP-001-2023 derivado del convenio No. 1793-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de Pital, ubicado en el departamento del Huila, en donde se intervendrá la vías hacia las veredas El Uvital, Cauchal Y los Olivos.

El contratista de obra dio continuidad a la construcción de filtros para vía y el corte y el figurado de acero para placa huella en la vereda los Olivos. Se realizó la construcción de la placa Huella en la Vereda El Uvital en su totalidad. Durante el periodo se presentaron problemas de orden público que afectaron el desarrollo normal de las actividades.

Durante este periodo se continuo ejecutando las actividades del contrato de obra número 001-2023 derivado del convenio No. 1842-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de Tarqui, ubicado en el departamento del Huila, en donde se continuo con las actividades de demolición de alcantarillas existentes, excavación varias sin clasificar, Instalación de tubería de 36", Concreto clase F y D para construcción de alcantarilla de 36" en las veredas el Tambo, Las mercedes, Rica brisa y Bellavista, se dio continuidad a la actividades de construcción de placa Huella en la vereda Rica Brisa , las mercedes y El tambo.

Durante este periodo se continuo ejecutando las actividades del contrato de obra número LP-001-2023 derivado del convenio No. 1993-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de Altamira, ubicado en el departamento del Huila, El contratista de obra continuo con la construcción de placa huella de los tramos 1 y 2 en la vereda Pajiji.

Durante este periodo se continuo ejecutando las actividades del contrato de obra número LP-001-2022 derivado del convenio No. 1804-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de Palestina, ubicado en el departamento del Huila, El contratista de obra continuo con las actividades de Excavaciones varias sin clasificar, Concreto clase F y D y actividades de Relleno para estructuras para construcción de los muros de contención ubicados en el Km 4+300 y K7+420, se inició la construcción de las alcantarillas de 36" en la vereda San Isidro- El Silencio y el inicio de actividades de caracterización vial del corredor.

Durante este periodo se continuo ejecutando las actividades del contrato de obra número 008-2022 derivado del convenio No. 1992-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de San Agustín, ubicado en el departamento del Huila, El contratista de obra termino con las actividades de construcción de placa huella en el tramo No 1 y 2, durante el periodo siguiente se contempla finalizar el contrato de obra con las actividades de sello de juntas y la caracterización vial del corredor.

Durante este periodo se continuo ejecutando las actividades del contrato de obra número 007-2022 derivado del convenio No. 1805-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de San Agustín, ubicado en el departamento del Huila, El contratista de obra continuo con las actividades de construcción de placa huella en el tramo No 1, 2 3 en la vereda Arauca II y la vereda Quinchana. Se contempla finalizar la ejecución del proyecto en el siguiente periodo con las actividades de construcción de placa Huella en la vereda Pedregal y la caracterización vial del corredor.

Durante este periodo se continuo ejecutando las actividades del contrato de obra número 060-2023 derivado del convenio No. 1841-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de San Tello, ubicado en el departamento del Huila, El contratista de obra continuo con las actividades de construcción de Alcantarilla de 36" y se continuo con las actividades de Excavaciones varias sin clasificar, conformación de calzada y extendida- compactación de material de subbase granular y fundida en concreto MR: 4,0 Mpa para la construcción de pavimento de la vía que conduce al centro poblado San Andrés. Se iniciaron las actividades de construcción del muro de contención.

Durante este periodo se continuo con las actividades del contrato de obra número 274-2023 derivado del convenio No. 1794-2021, celebrado entre el INVIAS y el municipio de Gigante, ubicado en el departamento del Huila, El contratista de obra continuo con las actividades de construcción de alcantarillas de 36" y el corte y figurado de acero de placa huella en la vereda El Cogollo.

Los contratos de obra de cada uno de los ocho (08) contratos derivados de los convenios 1804, 1794, 1805, 2257, 1793, 1842, 1841, 1992, y 1993 de 2021 celebrados por el INVIAS y los Municipios de Palestina, Gigante, San Agustín, El Pital, Tarqui, Tello, San Agustín y Altamira, respectivamente, ubicados todos en el departamento del Huila, se encuentran en en etapas de ejecución. Se dio orden de inicio a los contratos productos de los convenios 1805, 1804, 1992,1793, 1842, 1841,1992 y 1993 de 2021 con los municipios de San Agustín, Palestina, Tello, Tarqui, Altamira, Pital y Gigante respectivamente, a los que esta interventoría ha acompañado y participado en la prórroga de cada convenio y contrato de esos proyectos, así como el desarrollo y aclaraciones que cada contratista haya realizado.

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1. Vía Quinchana. Contrato No. 007 de 2022. Extendida y compactación material de afirmado para Construcción Placa Huella Vereda Quinchana.




Fotografía 1. Vía a Arauca II. Contrato No. 007 de 2022. Construcción Placa Huella Tramos 1 y 2, Vereda Arauca II



Fotografía 2. Contrato No. 008 de 2022. Construcción Placa Huella, Tramo 2 Vía hacia el centro Poblado El Obispo



Fotografía 3. Contrato No. 008 de 2022. Concreto Clase D para Huellas, riostras y cunetas, Construcción de placa huella tramo 2 Vía hacia el centro poblado El Obispo

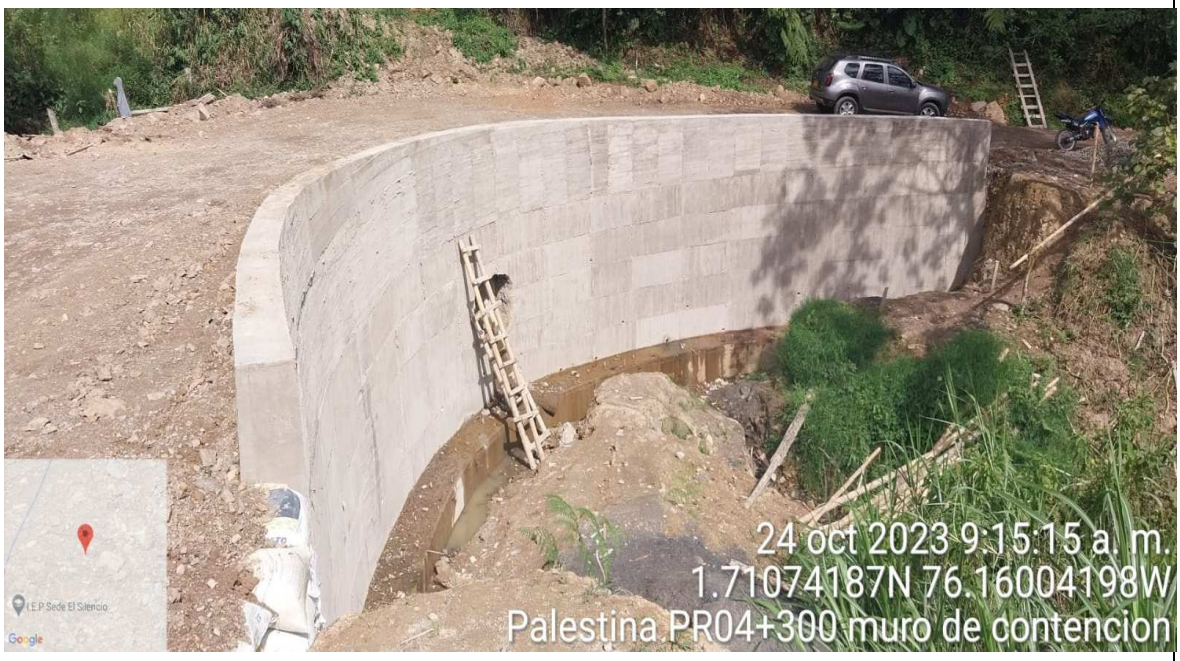

Fotografía 5. Contrato LP- 001 de 2022. Vía hacia la Vereda El Silencio, Construcción de filtro y relleno con recebo compactado, Muro de Contención K4+300



Fotografía 6. Contrato LP- 001 de 2022. Vía hacia la Vereda El Silencio, Construcción de Cuneta y disipador energía Muro de Contención K7+420.



Fotografía 7. Contrato No. 060-2023 Tello. Instalación Dovelas de transferencia y Fundición Concreto MR 4,0 Mpa para Construcción pavimento rígido en el corredor de la vía hacia el centro poblado San Andrés.





Fotografía 9. Contrato LP- 001 de 2022, Construcción de Placa Huella Vía hacia la Vereda Pajiji Altamira.



Fotografía 10. Contrato LP- 001 de 2022. Construcción de Placa Huella Vía hacia la Vereda Pajiji Altamira.



Fotografía 11. Contrato LP- 001 de 2023, El Pital, Instalación Acero de refuerzo, y fundición Concreto clase D para Huellas y Riostras, construcción Placa Huella Vereda el Uvital.



Fotografía 12. Contrato LP- 001 de 2023, El Pital, Construcción de Placa Huella Vereda el Uvital.



Fotografía 13. Contrato No 001 de 2023, Tarqui, Instalación de acero de refuerzo, Fundición Concreto Clase D para Huellas, riostras y cunetas, Construcción de Placa Huella Vereda el Tambo



Fotografía 14. Contrato No 001 de 2023, Tarqui, Fundición Concreto Clase D para Huellas, riostras y cunetas, Construcción de Placa Huella Vereda las Mercedes.



Fotografía 15. Contrato No 274 de 2023, Gigante, Relleno para estructuras con recebo compactado, construcción de Alcantarillas en la Vereda el Cogollo.



Fotografía 16. Contrato No 274 de 2023, Gigante, Muro Cabezal salida, construcción de alcantarillas en la Vereda el Cogollo.
