	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Contrato de Obra No. 001-2025 **Contratista:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

Contrato de Interventoría No. 0754-2026 **Interventoría:** ARA INGENIERIA S.A.S

Objeto Contrato de Obra:

"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"

INFORME MENSUAL No. 5 **MES O PERIODO:** AGOSTO

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCIÓN**		9
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		9
2.1	Localización		9
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		11
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		12
2.4	Características técnicas del proyecto		14
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		16
3.1	Información general del contrato		16
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		17
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		17
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		17
4	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		18
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	18
4.2	Maquinaria y Equipo del Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	19
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social del Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	19
4.4	Informe Financiero y Presupuestal del Convenio Solidario	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	19
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	19
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	19
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	20
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	20
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		20
4.9.1	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	20
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	20
4.9.2	• Seguimiento Programa de Obra		
4.9.2.1	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	20
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	20
4.9.3	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	21
4.9.4	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	21
5	**INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		22
5.1	Información general del contrato		22
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		25
5.3	Informes especialistas y profesionales		25
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		25
5.5	Informe matriz de riesgos.		25
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		25
5.7	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		25
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		25
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	25
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	25
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	26
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	26
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	26
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		26
6.6.1	Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado y seguimiento al plan de cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-2	26
6.7	Acta de Costos	MEPI-MN1-IN-8-FR-1	27
7	**CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES**		27
8	**ANEXOS**		27
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor.		28
8.2	Registro fotográfico del avance de las obras		28
8.3	Registro fotográfico de las actividades ambientales, sociales y sst.		28
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		28

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.



Firma:

Nombre: ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 525 de fecha 27 de febrero de 2026

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA: 31/08/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER
PERIODO MES: AGOSTO

CONTRATO DE OBRA No.: 001-2025
OBJETO: "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

PLAZO INICIAL: 10
FECHA DE INICIO: 20/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/05/2026
FECHA DE REANUDACIÓN: 22/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 22/03/2027
PLAZO ACUMULADO: 10

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 4.833.792.020,67
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ -
31 **VALOR ACUMULADO (incluido IVA):** $ 4.833.792.020,67
ANTICIPO CONCEDIDO:
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 0754-2026
INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
TRAMO 4 - L=210.00 m - K8+290 a K8+500			
PRELIMINARES	Excavación sin clasificar en material común a nivel de subrasante	M3	239,06
	Terraplen para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m	M3	120,80
	Conformación de la subrasante	M2	1077,78
	Relleno compactado con material de prestamo (Sub Base	M3	72,38
PLACA HUELLA	Subbase Granular extendida y compactada	M3	163,56
	Excavaciones varias manual sin clasificar	M3	43,02
	Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m	ML	366,92
	Placa Huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2	460,96
	Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.175x0.55 m	ML	420,00
	Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m	ML	390,75
	Piedra Pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2	273,65
	Acero de refuerzo de 60.000 psi para placas, riostras, bordillos, alcantarillas	KG	14419,48
	Solado en Concreto Clase F (2.000 psi)	M2	73,38
	Sello de juntas, incluye corte	ML	494,40
OBRAS DE ARTE	Tuberia corrugada PVC D=48"	ML	0,00
	Tuberia corrugada PVC D=60"	ML	0,00
	Relleno compactado con material de sub-base granular	M3	64,82
	Alcantarilla - Caja y estructura de entrega en Concreto Clase D (4.000 psi) impermeabilizado	M3	0,00
	Box Coulvert: Estructura nueva en Concreto Clase D (4000 psi) impermeabilizado	M3	27,83
			3,00
SEÑALIZACIÓN VIAL	Suministro e instalacion de señalizacion vertical	UND	3,00
RETIRO DE SOBRANTES	Disposicion final de material en (Escombrera municipal y/o sitio establecido por municipio)	M3-KM	6018,67

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
TRAMO 4 - L=210.00 m - K8+290 a K8+500				
PRELIMINARES	Excavación sin clasificar en material común a nivel de subrasante	M3	130,04	130,04
	Terraplen para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m	M3	175,45	175,45
	Conformación de la subrasante	M2	1200,2	1.200,20
	Relleno compactado con material de prestamo (Sub Base granular)	M3	19,38	19,38
				-
PLACA HUELLA	Subbase Granular extendida y compactada	M3		-
	Excavaciones varias manual sin clasificar	M3		-
	Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m	ML		-
	Placa Huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2		-
	Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.175x0.55 m	ML		-
	Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m	ML		-
	Piedra Pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2		-
	Acero de refuerzo de 60.000 psi para placas, riostras, bordillos, alcantarillas	KG		-
	Solado en Concreto Clase F (2.000 psi)	M2		-
	Sello de juntas, incluye corte	ML		-
		-		-
OBRAS DE ARTE	Tuberia corrugada PVC D=48"	ML		-
	Tuberia corrugada PVC D=60"	ML		-
	Relleno compactado con material de sub-base granular	M3		-
	Alcantarilla - Caja y estructura de entrega en Concreto Clase D (4.000 psi) impermeabilizado	M3		-
	Box Coulvert: Estructura nueva en Concreto Clase D (4000 psi) impermeabilizado	M3		-
		-		-
SEÑALIZACIÓN VIAL	Suministro e instalacion de señalizacion vertical	UND		-
				-
RETIRO DE SOBRANTES	Disposicion final de material en (Escombrera municipal y/o sitio establecido por municipio)	M3-KM		-

TRAMO 3 - L=95.00 m - Pr7+342,78 a Pr7+437,78			
PRELIMINARES	Excavación sin clasificar en material común a nivel de subrasante	M3	108,14
	Terraplen para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m	M3	54,65
	Conformación de la subrasante	M2	487,57
	Relleno compactado con material de prestamo (Sub Base granular) para la conformacion de terraplenes	M3	32,85
PLACA HUELLA	Subbase Granular extendida y compactada	M3	73,99
	Excavaciones varias manual sin clasificar	M3	19,46
	Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m	M3	165,99
	Placa Huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	ML	208,53
	Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.175x0.55 m	M2	190,00
	Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m	ML	176,77
	Piedra Pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	ML	123,80
	Acero de refuerzo de 60.000 psi para placas, riostras, bordillos, alcantarillas	KG	6523,10
	Solado en Concreto Clase F (2.000 psi)	M2	33,20
	Sello de juntas, incluye corte	ML	223,66
OBRAS DE ARTE	Tuberia corrugada PVC D=48"	ML	0,00
	Tuberia corrugada PVC D=60"	ML	0,00
	Relleno compactado con material de sub-base granular	M3	29,32
	Alcantantarilla - Caja y estructura de entrega en Concreto Clase	M3	0,00
	Box Coulvert: Estructura nueva en Concreto Clase D (4000 psi)	M3	27,83
			1,00
SEÑALIZACIÓN VIAL	Suministro e instalacion de señalizacion vertifical	UND	1,00
RETIRO DE SOBRANTES	Disposicion final de material en (Escombrera municipal y/o sitio establecido por municipio)	M3-KM	2722,74

TRAMO 2 - L=419.96 m - Pr5+435 a Pr5+854,96			
PRELIMINARES	Excavación sin clasificar en material común a nivel de subrasante	M3	478,07
	Terraplen para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m	M3	241,58
	Conformación de la subrasante	M2	2155,35
	Relleno compactado con material de prestamo (Sub Base granular) para la conformacion de terraplenes	M3	145,23
PLACA HUELLA	Subbase Granular extendida y compactada	M3	327,09
	Excavaciones varias manual sin clasificar	M3	86,02
	Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m	ML	733,76
	Placa Huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2	921,83
	Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.175x0.55 m	ML	839,92
	Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m	ML	781,42
	Piedra Pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2	547,26
	Acero de refuerzo de 60.000 psi para placas, riostras, bordillos, alcantarillas	KG	28836,21
	Solado en Concreto Clase F (2.000 psi)	M2	146,75
	Sello de juntas, incluye corte	ML	988,71
OBRAS DE ARTE	Box Coulvert: Estructura nueva en Concreto Clase D (4000 psi) impermeabilizado	ML	0,00
	Tuberia corrugada PVC D=48"	ML	6,60
	Tuberia corrugada PVC D=60"	M3	23,10
	Relleno compactado con material de sub-base granular	M3	129,63
	Alcantantarilla - Caja y estructura de entrega en Concreto Clase D (4.000 psi) impermeabilizado	M3	23,88
SEÑALIZACIÓN VIAL	Suministro e instalacion de señalizacion vertifical	UND	5,00

TRAMO 3 - L=95.00 m - Pr7+342,78 a Pr7+437,78				
PRELIMINARES	Excavación sin clasificar en material común a nivel de subrasante	M3	127,16	127,16
	Terraplen para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m	M3		-
	Conformación de la subrasante	M2	603,05	603,05
	Relleno compactado con material de prestamo (Sub Base granular) para la conformacion de terraplenes	M3		-
				-
PLACA HUELLA	Subbase Granular extendida y compactada	M3		-
	Excavaciones varias manual sin clasificar	M3		-
	Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m	M3		-
	Placa Huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	ML		-
	Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.175x0.55 m	M2		-
	Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m	ML		-
	Piedra Pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	ML		-
	Acero de refuerzo de 60.000 psi para placas, riostras, bordillos, alcantarillas	KG		-
	Solado en Concreto Clase F (2.000 psi)	M2		-
	Sello de juntas, incluye corte	ML		-
OBRAS DE ARTE	Tuberia corrugada PVC D=48"	0		-
	Tuberia corrugada PVC D=60"	ML		-
	Relleno compactado con material de sub-base granular	ML		-
	Alcantantarilla - Caja y estructura de entrega en Concreto Clase D (4.000 psi) impermeabilizado	M3		-
	Box Coulvert: Estructura nueva en Concreto Clase D (4000 psi)	M3		-
				-
				-
SEÑALIZACIÓN VIAL	Suministro e instalacion de señalizacion vertifical	UND		-
				-
RETIRO DE SOBRANTES	Disposicion final de material en (Escombrera municipal y/o sitio establecido por municipio)	M3-KM		-

TRAMO 2 - L=419.96 m - Pr5+435 a Pr5+854,96				
PRELIMINARES	Excavación sin clasificar en material común a nivel de subrasante	M3		-
	Terraplen para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m	M3		-
	Conformación de la subrasante	M2		-
	Relleno compactado con material de prestamo (Sub Base granular) para la conformacion de terraplenes	M3		-
PLACA HUELLA	Subbase Granular extendida y compactada	M3		-
	Excavaciones varias manual sin clasificar	M3		-
	Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m	ML		-
	Placa Huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2		-
	Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.175x0.55 m	ML		-
	Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m	ML		-
	Piedra Pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2		-
	Acero de refuerzo de 60.000 psi para placas, riostras, bordillos, alcantarillas	KG		-
	Solado en Concreto Clase F (2.000 psi)	M2		-
	Sello de juntas, incluye corte	ML		-
				-
OBRAS DE ARTE	Box Coulvert: Estructura nueva en Concreto Clase D (4000 psi) impermeabilizado	ML		-
	Tuberia corrugada PVC D=48"	ML		-
	Tuberia corrugada PVC D=60"	M3		-
	Relleno compactado con material de sub-base granular	M3		-
	Alcantantarilla - Caja y estructura de entrega en Concreto Clase D (4.000 psi) impermeabilizado	M3		-
				-
SEÑALIZACIÓN VIAL	Suministro e instalacion de señalizacion vertifical	UND		-
				-

RETIRO DE SOBRANTES	Disposicion final de material en (Escombrera municipal y/o sitio establecido por municipio)	M3-KM	12036,20
TRAMO 1 - L=397.85 m - Pr4+595,00 a Pr4 + 992,85			
PRELIMINARES	Excavación sin clasificar en material común a nivel de subrasante	M3	452,90
	Terraplen para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m	M3	228,86
	Conformación de la subrasante	M2	2041,88
	Relleno compactado con material de prestamo (Sub Base granular) para la conformacion de terraplenes	M3	137,59
PLACA HUELLA	Subbase Granular extendida y compactada	M3	309,87
	Excavaciones varias manual sin clasificar	M3	81,49
	Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m	ML	695,13
	Placa Huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2	873,30
	Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.175x0.55 m	ML	795,70
	Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m	ML	740,28
	Piedra Pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2	518,44
	Acero de refuerzo de 60.000 psi para placas, riostras, bordillos,	KG	27318,04
	Solado en Concreto Clase F (2.000 psi)	M2	139,03
	Sello de juntas, incluye corte	ML	936,65
OBRAS DE ARTE	Tuberia corrugada PVC D=48" (1)	ML	5,40
	Tuberia corrugada PVC D=60" (4)	ML	18,90
	Relleno compactado con material de sub-base granular	M3	122,81
	Alcantantarilla - Caja y estructura de entrega en Concreto Clase D (4.000 psi) impermeabilizado	M3	19,54
	Box Coulvert: Estructura nueva en Concreto Clase D (4000 psi)	UND	0,00
SEÑALIZACIÓN VIAL	Suministro e instalacion de señalizacion vertifical	UND	5,00
RETIRO DE SOBRANTES	Disposicion final de material en (Escombrera municipal y/o sitio	M3-KM	11402,52
PMA	Plan de Manejo Ambiental	UND	1,00
CARACTERIZACION DE LA VIA	Caracterización de la vía	UND	1,00

RETIRO DE SOBRANTES	Disposicion final de material en (Escombrera municipal y/o sitio establecido por municipio)	M3-KM		-
TRAMO 1 - L=397.85 m - Pr4+595,00 a Pr4 + 992,85				
PRELIMINARES	Excavación sin clasificar en material común a nivel de subrasante	M3	20,64	20,64
	Terraplen para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m	M3		-
	Conformación de la subrasante	M2		-
	Relleno compactado con material de prestamo (Sub Base granular) para la conformacion de terraplenes	M3	15,15	15,15
PLACA HUELLA	Subbase Granular extendida y compactada	0		-
	Excavaciones varias manual sin clasificar	M3		-
	Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m	M3		-
	Placa Huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	ML		-
	Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.175x0.55 m	M2		-
	Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m	ML		-
	Piedra Pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	ML		-
	Acero de refuerzo de 60.000 psi para placas, riostras, bordillos, alcantarillas	M2		-
	Solado en Concreto Clase F (2.000 psi)	KG		-
	Sello de juntas, incluye corte	M2		-
				-
OBRAS DE ARTE	Tuberia corrugada PVC D=48" (1)	0		-
	Tuberia corrugada PVC D=60" (4)	ML		-
	Relleno compactado con material de sub-base granular	ML		-
	Alcantantarilla - Caja y estructura de entrega en Concreto Clase D (4.000 psi) impermeabilizado	M3		-
	Box Coulvert: Estructura nueva en Concreto Clase D (4000 psi) impermeabilizado	M3		-
				-
SEÑALIZACIÓN VIAL	Suministro e instalacion de señalizacion vertifical	0	0,1	0,10
				-
RETIRO DE SOBRANTES	Disposicion final de material en (Escombrera municipal y/o sitio establecido por municipio)	0		-
				-
PMA	Plan de Manejo Ambiental	0	0,1	0,10
		UND		-
CARACTERIZACION DE LA VIA	Caracterización de la vía	UND		-

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 3.810.850.449,08	$ 893.903.191,76	$ 4.704.753.640,84
PMT	$ 13.979.788,70	$ 3.279.209,70	$ 17.258.998,40
CARACTERIZACION VIAL	$ 3.866.384,00	$ 906.929,58	$ 4.773.313,58
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 14.580.000,00	$ 3.420.000,00	$ 18.000.000,00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 72.094.914,96	$ 16.911.152,89	$ 89.006.067,85
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 4.833.792.020,67**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 92.926.701,36	$ 21.797.621,31	$ 114.724.322,67	$ 114.724.322,67
PMT	$ 1.397.978,87	$ 327.920,97	$ 1.725.899,84	$ 1.725.899,84
CARACTERIZACION VIAL				
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 14.580.000,00	$ 3.420.000,00	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00
GESTION AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	$ 7.209.491,50	$ 1.691.115,29	$ 8.900.606,79	$ 8.900.606,79
VALOR EJECUTADO				**$ 143.350.829,30**

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA: 31/08/2026 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	206.886.298,48
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	143.350.829,30
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		2,97%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	9
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	8
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19

REGISTRO FOTOGRÁFICO



UBICACIÓN: TRAMO 4
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: ISTALACION DE GEOTEXTIL, EXTENCION DE MATERIAL DE RRELLENO Y COMPACTACION EN TRAMO 4.



UBICACIÓN: TRAMO 1
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD: INSTALACION DE TUBERIA DE 36 ", CON ATRAQUE EN SUB-BASE GRANULAR DEBIDAMENTE COMPACATADA CON CANGURO.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN

Firma
Nombre: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoria
Matricula Profesional No. 25202-45905 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INFORME DE INTERVENTORIA No 05



OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO”

CONTRATO DE OBRA: No 001-2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 4

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO 4

2.1 Localización 4

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto 6

2.3 Inventario y estado actual de la vía 7

2.4 Características técnicas del proyecto. 9

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA 11

3.1 Información General del Contrato 11

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas por el contratista en mes. 12

3.3 Seguimiento de Ítems no previstos. 12

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría. 12

4. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO OBRA 13

4.1 Informe Semanal: 13

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra 14

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato Obra 14

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra 14

4.5 Estado General del Tiempo 14

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio 14

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra 15

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra 15

4.9 Otros Documentos seguimiento mensual 15

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA 17

5.1 Información general del contrato 17

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor. 18

5.3 Informes Especialistas y Profesionales 20

5.4 Informe del Programa Anual de Caja -PAC 20

5.5 Informe matriz de Riesgos 20

5.6 Información otros programas y aplicativos 20

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL INTERVENTORIA 20

6.1 Equipos y Vehículos contrato de Interventoría 20

6.2 Personal, Control Aportes y Seguridad social contrato Interventoría 20

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato Interventoría 21

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría 21

6.5 Seguimiento al plan de calidad Contrato Interventoría 21

6.6 Otros documentos seguimiento mensual 21

6.7 Acta de costos 22

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 22

8. ANEXOS 22

8.1 Relación de la correspondencia 22

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras 23

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas. 23

8.4 copia de la bitácora del mes correspondiente. 23

1. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Vías – INVIAS - suscribió con la empresa ARA INGENIERIA SAS el Contrato **No. 0754 DE 2026,** cuyo objeto es **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEERDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

Este informe describe las actividades desarrolladas por la Interventoría y el Contratista en el periodo comprendido entre el **01 al 31 de agosto de 2026** contemplando aspectos contractuales, técnicos, administrativos, financieros y ambientales.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Localización

Las obras objeto del presente contrato se ejecutarán en el municipio del Tibú, el cual se halla ubicado la parte región oriental con un aproximado de 2.696 kilómetros cuadrados, su temperatura entre 32°C su cabecera municipal está localizada a los 8°38´24N72°44´17"0. Limita con el norte y oriente con Venezuela, al sur con Cúcuta y Sardinata y al occidente con Teorama, El Tarra y San Calixto.

Ubicado en el valle del rio Catatumbo y sus afluentes, el área municipal es de 2.737. km² y limita al Norte y al Este con la Republica de Venezuela, al sur con Cúcuta y Sardinata y al Oeste

con san Calixto, El Tarra y Teorama. Cuenta con los corregimientos y centros poblados de Barco la silla, Campo Dos, Campo Giles, La Gabarra, La Llana, Paccelly, Tres Bocas y Versalles, además de caseríos y asentamientos humanos que se han desarrollado con la dinámica de la migración.

Es una zona ondulada con cotas de altura que fluctúan entre los 600 m.s.n.m, en la parte baja de Talipa y Manantial y 1.700 m.s.n.m, en los cerros de Tabor y la Palestina, El municipio de Tibú se encuentra enmarcado dentro de la cuenca del Catatumbo que constituye una depresión estructural entre las serranías de Perijá al occidente y los Andes de Mérida el S-W. en forma general el falla miento predominante es de tipo inverso y algunas estructuras de cabalgamiento que han moldeado el relieve de la zona. Entre las principales estructuras se encuentra: falla de carbonera, falla de leoncito, anticlinal de petrolera, anticlinal de sardinata, anticlinal y sinclinal de Tibú, anticlinal y sinclinal rio de oro y caracol, etc., por su ubicación geográfica y geológica de la zona de estudio su desarrollo tectónico estructural está relacionado con la deformación y levantamiento de la cordillera oriental colombiana, particularmente durante la denominada orogénesis andina.

La zona del proyecto se localiza en la vía que comunica al municipio de Tibú con la vereda Caño Victoria, ubicado en la zona sur oriental de la zona rural del municipio de Tibú departamento Norte de Santander como se puede observar en la siguiente imagen:

Localización General del Municipio de TIBU



Ilustración. Localización Específica tramos del proyecto.



Ilustración. Localización Específica tramos del proyecto.

2.2 Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto

Actualmente hay dificultad en las intercomunicaciones terrestres de la población rural del municipio de Tibú, debido a que las vías que comunican el casco urbano de Tibú, con las veredas y en especialmente con caño victoria, se encuentran en mal estado y con deficiente mantenimiento periódico generando aumento en los tiempos de viaje.

Las vías que terciarias que se encuentran dentro de los municipios de Tibú, cuenta con una longitud de 943.2 kilómetros, por lo que se requiere intervención para mejorar, especialmente la vereda caño victoria.

2.3 Inventario y estado actual de la vía

El proyecto contempla la intervención a la vereda Caño Victoria, municipio de Tibú, en los sectores que se indican a continuación para garantizar la transitabilidad de la vía.

Las actividades para desarrollar son:

- Revisión, ajuste y/o actualización y/o modificación y/o complementación de los estudios y diseños y/o elaboración del cálculo de la estructura del pavimento y/o cálculos estructuras y/o de obras requeridas para garantizar la estabilidad de la infraestructura vial.
- Construcción de 1.122,81 ml de placa huella, ubicados en 4 tramos críticos, de acuerdo con diseño de pavimento el cual se realizó en base a la guía de Diseño de pavimentos con Placa Huella del INVIAS.

VIAS	TRAMO A INTERVENIR		LONGITUD TRAMO	INTERVENCION
	KINICIAL	KFINAL		
TRAMO 1	PK4+595,00	PK4+992.85	397,85	CONSTRUCCION PLACA HUELLA
TRAMO 2	PK5+435,00	PK5+854,96	419,96	CONSTRUCCION PLACA HUELLA
TRAMO 3	PK7+342,78	PK8+500,00	95,00	CONTRUCCION PLACA HUELLA
TRAMO 4	PK8+290,00	PK8+500,00	210,00	CONSTRUCCION PLACA HUELLA
TOTAL			**1122,81**	

- Construcción de 9 obras de drenaje o de arte que se requieran según los estudios y diseños existentes, considerando la posible necesidad de descoles para gestionar eficazmente el flujo de agua en la zona, en la búsqueda de una solución efectiva y sostenible para garantizar la seguridad y la funcionalidad a largo plazo de esta importante vía de comunicación:

VIAS	OBRAS DE DRENAJE	UBICACIÓN ABCISADO	TIPO DE OBRA DE DRENAJE
TRAMO 1	4	4+671,87	ALCANTARILLA UNA SOLA TUBERIA
		4+746,65	ALCANTARILLA UNA SOLA TUBERIA
		4+794,76	ALCANTARILLA UNA SOLA TUBERIA
		4+864,66	ALCANTARILLA UNA SOLA TUBERIA
TRAMO 2	3	5+452,17	ALCANTARILLA UNA SOLA TUBERIA
		5+543,78	ALCANTARILLA DOBLE TUBERIA
		5+753,11	ALCANTARILLA DOBLE TUBERIA
TRAMO 3	1	7+342,78	BOX COULVERT
TRAMO 4	1	8+310,00	BOX COULVERT
TOTAL	**9**		

Así mismo se contempla la construcción de estructuras de drenaje vial, correspondiente a obras o estructuras de protección de protección a la entrada y salida, cunetas y filtros, y aquellas que se requieran, mejorando las condiciones actuales de la vía. En los casos que resultare aplicable, previo a la construcción de las obras, el contratista, debe obtener los permisos de las autoridades ambientales competentes para adelantar el desmonte y limpieza de zona boscosas, la remoción y disposición de materiales provenientes de dicho desmonte y limpieza, la remoción de tocones y raíces, la tala de árboles, el aprovechamiento forestal, etc., de conformidad con lo dispuesto en las especificaciones generales de construcción de carreteras y la legislación ambiental vigente.

Adicionalmente se ejecuta el plan ambiental y el plan de manejo de tránsito para cada tramo del proyecto, interventoría técnica y financiera y gerencia del proyecto.

2.4 Características técnicas del proyecto.

El proyecto abarca la realización las siguientes actividades relevantes así:

- Excavación sin clasificar en material común a nivel subrasante
- Excavaciones varias manual sin clasificar
- Terraplén para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m
- Conformación de la subrasante
- Relleno compactado con material de préstamo (Sub Base Granular) para la conformación de terraplenes
- Subbase granular extendida y compactada
- Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m
- Placa huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m
- Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones 0.175x0.55 m
- Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m
- Piedra pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m
- Acero de refuerzo de 60.000psi horas placas, riostras, bordillos, alcantarillas,
- Solado en Concreto Clase F (200 psi)
- Sello de juntas, incluye corte
- Suministro e instalación de señalización vertical
- Tubería corrugada PVC D=36"
- Relleno compactado con material de subbase granular
- Alcantarillada – Caja y estructura de entrega en concreto Clase D (3.000 psi) impermeabilizado
- Box Coulvert: Estructura nueva en concreto Clase D (3.000 psi)

- Disposición final de material en (escombrera municipal y/o sitio establecido por municipio.)

Las especificaciones para utilizar corresponden a las establecidas por el INVIAS en su versión vigente, el mejoramiento de la vía permite un aporte positivo en el fortalecimiento de la red terciaria estableciendo un acceso a la región y brindando vías transitables para comunicación con otros centros poblados del departamento.

Para la ejecución de las obras se deberá realizar control de la construcción, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las especificaciones generales de Construcción de Carreteras, vigente y a las especificaciones particulares para su ejecución y a la Normas de Ensayo de Materiales del Instituto Nacional de Vías Invias.

Durante el plazo del contrato, el contratista de obra será responsable por la trazabilidad, así mismo deberá tomar todas las medidas necesarias a fin de garantizar la seguridad vial del usuario en el corredor.

Es responsabilidad del contratista de obra la revisión de la utilización de materiales que permitan la optimización del recurso, por tanto, se debe valorar nuevas alternativas y/o tecnológicas reglamentadas por la entidad, que se puedan dar uso en la zona y que den cumplimiento a todas las especificaciones que demanden las obras.

3. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA

3.1 Información General del Contrato

Contrato No.:	001-2025
Objeto:	MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033
Contratista:	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA
Representante Legal:	SAUL ALFONSO GOMEZ ANGARITA
Sitio de ejecución de la Obra:	MUNICIPIO DE TIBÚ
Valor Inicial del Contrato:	$ 4.833.792.020,67
Valor adiciones:	0
Valor Acumulado:	0
Plazo Inicial del Contrato:	10 MESES
Fecha de Inicio:	20 DE ABRIL DE 2026
Fecha de Suspensión:	22 DE MAYO DE 2026
Fecha de Reinicio:	22 DE JUNIO DE 2026
Fecha de Terminación inicial:	22 DE MARZO 2027
Dirección:	CALLE 11 A No 1E-135 Piso 3 ED. ALTAMIRA-CUCUTA NTE SANTANDER
Teléfono:	320-4492686

3.2 Descripción de las actividades ejecutadas por el contratista en mes.

A continuación, presentamos los avances del contratista, en el periodo comprendido entre el 01/08/2026 y el 31/08/2026**.**

- **AREA TECNICA:**

- Se inició la instalación de geotextil en tramo 4.
- Se realizó la instalación de material de relleno para tramo 4.
- Se le realizaron densidades a la sub-rasante del tramo 4
- se realizó densidades a material de relleno a tramo.
- Nivelación en tramo 3 con maquinaria pesada.
- Densidades en tramo al terreno de sub-rasante.
- Instalación de material de relleno en tramo 3.
- Instalación de tubería de 36" para la alcantarilla 2 en tramo 1.
- Relleno en los atraques con material de sub-base granular en la alcantarilla 2 del tramo 1.
- Llega a obra material de arena, triturado, acero de refuerzos, geotextil, cemento.

3.3 Seguimiento de Ítems no previstos.

Se encuentra en proceso de sub sanaciones por faltantes en la solicitud enviada por el contratista, la interventoría está a la espera que el contratista realice las observaciones dadas por esta interventoría.

3.4 Estado de avance y acciones a seguir por parte de la interventoría.

Durante este periodo de agosto iniciaron actividades en forma en el proyecto en la vereda caño victoria, a pesar que tienen avance se evidencia un pequeño atraso del 1,31 % de acuerdo a la programación enviada por el contratista.

- Valor programado del mes en miles de pesos: $ 172.444.333,93
- Valor ejecutado en el mes en miles de pesos: $ 125.350.829.30
- Valor total programado acumulado de $ 206.718.259.71
- Valor total ejecutado acumulado de $ 143350829,30
- **% total ejecutado acumulado con respecto al valor total del contrato deobra: 2,97%**

4. REPORTE EJECUCION MENSUAL CONTRATO OBRA

A continuación, se muestra las ejecuciones realizadas durante el periodo por el contratista.

4.1 Informe Semanal:

Se adjunta formato MEPI-MN1-IN-15-FR-3 debidamente diligenciado con los informes semanales del mes de agosto de 2026

- Informe semanal No 12 julio 31 a agosto 06 de 2026
- Informe semanal No 13 agosto 07 a agosto 13 de 2026
- Informe semanal No 14 agosto 14 a agosto 20 de 2026
- Informe semanal No 15 agosto 21 a agosto 27 de 2026
- Informe semanal No 16 agosto 28 a septiembre 03 de 2026

Ver anexo 1.

4.2 Maquinaria y Equipo Contrato de Obra

En el formato diligenciado se refleja los equipos utilizadores para el desarrollo de la obra en ejecución por el contratista; se anexa formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4 como soporte.

Ver anexo 2.

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato Obra

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-6, que se anexa al presente informe, se relaciona el personal empleado por el contratista para el ejercicio de sus funciones contractuales establecidas en el contrato.

Ver anexo 3.

4.4 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-8, que se anexa al presente informe, se relaciona el Informe financiero y presupuestal por el contratista para el ejercicio de sus funciones contractuales establecidas en el contrato.

Ver anexo 4.

4.5 Estado General del Tiempo

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-10, que se anexa al presente informe, se relaciona el Informe estado general del tiempo por el contratista para el ejercicio de sus funciones contractuales establecidas en el contrato.

Ver anexo 5.

4.6 Resumen Ensayos de Laboratorio

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11, que se anexa al presente informe, se relaciona el

Informe resumen ensayos de laboratorio por el contratista para el ejercicio de sus funciones contractuales establecidas en el contrato.

Ver anexo 6.

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-12, que se anexa al presente informe, se relaciona el Informe seguimiento garantías y seguros por el contratista para el ejercicio de sus funciones contractuales establecidas en el contrato.

Ver anexo 7.

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-14, que se anexa al presente informe, se relaciona el Informe plan de calidad por el contratista para el ejercicio de sus funciones contractuales establecidas en el contrato.

Ver anexo 8.

4.9 Otros Documentos seguimiento mensual

- **SEGUIMIENTO A LA INVERSION DEL ANTICIPO**

No se solicitó anticipo de obra.

- **SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES**

En el seguimiento al programa de inversiones se presentan los siguientes formatos:

- MEPI-MN-IN-6-FR-1 PROGRAMA DE INVERSIONES
- MEPI-MN-IN-6-FR-2 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

Ver anexo 9 y anexo 10

- **ACTAS DE COMITÉ DE OBRA**

A continuación, se anexan el formato MEPI-MN1-IN-14-FR-, de los comités de obra que se han realizado durante este periodo.

- MEPI-MN1-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA 1 campo
- MEPI-MN1-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA 2 campo
- MEPI-MN1-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA 3 campo
- MEPI-MN1-IN-14-FR-1 ACTA COMITE DE OBRA 4 campo

Ver anexo 11

- **ACTAS DE REUNION**

Hasta la fecha se realizó reunión con el supervisor del proyecto.

Se adjunta formato MEPI-MN-IN-14-FR-2 ACTA DE REUNION 3

Ver anexo 12.

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

5.1 Información general del contrato

Proceso de selección	CONCURSO DE MERITOS
Contrato No:	0754-2026
Fecha de suscripción	26 DE ENERO DE 2026
Objeto:	INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"
Contratista:	ARA INGENIERIA SAS
Representante Legal:	KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
Localización de la Obra:	MUNICIPIO TIBÚ
Valor Inicial del Contrato:	$ 452.084.151.00
Valor Adiciones	0
Plazo Inicial del Contrato:	10 MESES
Fecha de Iniciación:	20 ABRIL DE 2026
Fecha de Suspensión:	22 DE MAYO DE 2026
Fecha de Reinicio:	22 DE JUNIO DE 2026
Fecha de Terminación inicial:	22 DE MARZO DE 2027
Dirección:	CALLE 95 No 15-33 OFICINA 404
Teléfono:	313-2093792 – 601 2896745

5.2 Descripción de las actividades realizadas por el Interventor.

- **AREA TECNICA**

Durante este periodo se iniciaron actividades físicas en el proyecto en la vereda caño victoria:

- Seguimiento diario con el ingeniero residente de interventoría.
- Se ha mantenido en con tacto estrecho con el interventor para adelantar obras.
- Mesas de trabajo con la parte administrativa del contratista.
- Informes semanales a la entidad territorial y al supervisor.
- Registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el proyecto.
- Comités de obra en situ.
- Informe mensual a la entidad territorial y supervisor.
- Solicitud al contratista, al cumplimiento a la calidad del proyecto a ejecutar.
- Oficios al contratista solicitando documentación necesaria para el proceso de ejecución del proyecto.

- **AREA SOCIAL**

- Durante el mes de agosto se realizaron las adecuaciones necesarias para la instalación del punto físico de atención a la comunidad, quedando debidamente señalizado y en condiciones para atender cualquier solicitud, queja o sugerencia por parte de la comunidad del área de influencia, además cuenta con una cartelera informativa.
- La apertura del punto de atención fue realizada en conjunto con el profesional social del contratista y se informó a la comunidad con un volante compartido por el grupo de WhatsApp, donde se indica que los días lunes y miércoles se realizará atención en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m.
- El 18 de agosto se llevó a cabo una reunión con algunos miembros de la JAC, el maestro de obra, el área técnica y social, para concertar el tema de contratación de mano de obra local
- Durante el mes de agosto se realizaron dos (2) actas de vecindad que no pudieron ser realizadas en el mes de julio debido a que no fue posible contactar a sus propietarios, éstas sumadas a las del mes anterior darían diez (10), quedando una pendiente por

realizar ya que el propietario del predio no se encuentra en la zona, para un total de 11 actas de vecindad.

- Teniendo en cuenta que la ejecución de cualquier obra genera cambios temporales en las condiciones habituales de movilidad de la comunidad, debido a la presencia de maquinaria, vehículos de transporte, materiales, trabajadores y posibles restricciones o modificaciones en la circulación y según lo establecido en el cronograma, el 20 de agosto se realizó un taller sobre cultura vial dirigido a la comunidad del área de influencia directa del proyecto
- Con el propósito de garantizar la disponibilidad del personal requerido y dar continuidad a las actividades programadas, se ha ampliado el proceso de convocatoria a habitantes de veredas cercanas y, de manera complementaria, al casco urbano del municipio. Esta medida busca contar con un mayor número de postulantes que cumplan con los perfiles, experiencia y disponibilidad requeridos, manteniendo como criterio de priorización, en la medida de lo posible, la vinculación de mano de obra del área de influencia del proyecto.

Ver anexo 13

- **AREA SST:**

- Durante el mes de agosto en el área de sst se realizó junto con siso contratista la verificación de las hojas de vida de los postulados a la obra.
- Se verifica las planillas de pago de seguridad social al contratista
- Se verifican también los exámenes de ingreso de los trabajadores
- Se verifica las personas que están en obra:

  Maestro: 1

  Oficiales: 2

  Obreros: 6

  Maquinistas; 3

  Topógrafos: 2

  Personal contratista: 3
- Se realiza verificación de la papelería en sst por parte del contratista para su ejecución

- Se notifica al contratista cumplir con los requerimientos dándole inducción a los trabajadores, verificación del cronograma semanal y mensual
- Se dan tareas al contratista para revisión próxima visita

Elementos de protección personal

Adecuación de baños

Puntos ecológicos

Dotación

Ver anexo 14

5.3 Informes Especialistas y Profesionales

Se anexa informe presentado por la ingeniera ambiental para el periodo de agosto 01 al 31 de 2026

Ver anexo 15.

5.4 Informe del Programa Anual de Caja -PAC

5.5 Informe matriz de Riesgos

5.6 Información otros programas y aplicativos

6. REPORTES EJECUCION MENSUAL INTERVENTORIA

6.1 Equipos y Vehículos contrato de Interventoría

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5, que se anexa el presente informe, se relaciona los equipos o vehículos que fueron utilizados por la interventoría para el ejercicio de sus funciones contractuales establecidas en el contrato.

Ver anexo 16.

6.2 Personal, Control Aportes y Seguridad social contrato Interventoría

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, que se anexa al presente informe, se relaciona el personal empleado por la interventoría para el ejercicio de sus funciones contractuales establecidas en el contrato.

Ver anexo 17.

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato Interventoría

En el formato MEPI-MNI-IN-15-FR-9, se diligencio la información correspondiente al presente informe.

Ver anexo 18.

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría

En el formato MEPI-MNI-IN-15-FR-13, se diligencio la actualización de póliza con orden de suspensión contrato.

Ver anexo 19.

6.5 Seguimiento al plan de calidad Contrato Interventoría

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-15, se encuentra los datos diligenciados durante el periodo de agosto.

Ver anexo 20.

6.6 Otros documentos seguimiento mensual

A continuación, se anexa el acta de modificación de costos MEPI-MN1-IN-9-FR-1 y reprogramación del plan de cargas MEPI-MN1-IN-9-FR-2.

Ver anexo 21 y anexo 22.

6.7 Acta de costos

A continuación, se anexa el formato acta de costos MEPI-MN1-IN-8-FR-1

Ver anexo 23.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo que comprende de 01 agosto a 31 agosto del año 2026, se han iniciado las obras en la vereda CAÑO VICTORIA, se encuentra ejecutando en los tramos 1.3 y 4. Con un porcentaje ejecutado del 2,97 %. con respecto a lo programado de 4,28 %. Esto conlleva a un atraso del 1,31 %, se le ha pedido al contratista realizar actividades complementarias para que esta diferencia sea mínima en el próximo cierre mensual.

Se le pide al contratista agilizar las observaciones emitidas por la interventoría con respecto a APUS NPS, para dar su trámite correspondiente. La interventoría no ha avalado ningún acta de cobro por parte del contratista.

Se ha pedido suspender actividades no aprobadas por esta interventoría hasta que se dé tramite a los APUS NPS enviados por el contratista.

8. ANEXOS

8.1 Relación de la correspondencia

Se anexa la relación de la correspondencia generada entre el contratista y la interventoría correspondiente al mes de agosto.

Ver anexo 24.

8.2 Registro fotográfico y video del avance de las obras

A continuación, se realiza el anexo del registro fotográfico durante el mes de agosto del 2026.

Ver anexo 25

8.3 Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas.

Se adjunta registro fotográfico de las actividades realizadas durante el mes.

Ver anexo 26.

8.4 copia de la bitácora del mes correspondiente.

Se anexa bitácora correspondiente al mes de agosto de 2026.

Ver anexo 27.

ANEXO 1: informes semanales MEPI-MN1-IN-15-FR-3
ANEXO 2: maquinaria y equipo contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-4
ANEXO 3: personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-6
ANEXO 4: informe financiero y presupuestal contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8
ANEXO 5: estado general del tiempo MEPI-MN1-IN-15-FR-10
ANEXO 6: resumen ensayos de laboratorio MEPI-MN1-IN-15-FR-11
ANEXO 7: seguimiento garantías y seguros contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12
ANEXO 8: seguimiento plan de calidad contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-14
ANEXO 9: programa de inversiones MEPI-MN-IN-6-FR-1
ANEXO 10: seguimiento al programa de inversiones MEPI-MN-IN-6-FR-2
ANEXO 11: acta comité de obra MEPI-MN1-IN-14-FR-1
ANEXO 12: actas de reunión MEPI-MN-IN-14-FR-2
ANEXO 13: informe social interventoría.

ANEXO 14: informe sst interventoría.
ANEXO 15: informe especialista y profesionales
ANEXO 16: equipos y vehículos contrato de interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-5
ANEXO 17: personal, control aportes y seguridad social contrato de interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7
ANEXO 18: informe financiero y presupuestal contrato interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9
ANEXO 19: seguimiento garantías contrato de interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13
ANEXO 20: seguimiento al plan de calidad contrato interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-15
ANEXO 21: acta de modificación de costos MEPI-MN1-IN-9-FR-1
ANEXO 22: reprogramación plan de cargas MEPI-MN1-IN-9-FR-2
ANEXO 23: formato acta de costos MEPI-MN1-IN-8-FR-1
ANEXO 24: relación de la correspondencia
ANEXO 25: registro fotográfico y video del avance de las obras
ANEXO 26: registro fotográfico de las actividades ambientales sociales prediales y de sostenibilidad
ANEXO 27: bitácora del mes de agosto 2026

ANEXO 1: Informes semanales
MEPI-MN1-IN-15-FR-3

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	01 de 01
		FECHA	lunes, 10 de agosto de 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER** SEMANA N°: **11** del **31** al **06** Último Informe Semanal SI ☐
(Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA**		
INTEGRANTES:	**SAGA INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION INTERVENTORIA S.A.S (60%) - SIGMA S.A.S (40%)**		
CONTRATO N°	**001-2025**	VALOR INICIAL:	**$ 4.833.792.020,67**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE SUSPENSION 01:	**viernes, 22 de mayo de 2026**		**$ 4.833.792.020,67**
FECHA DE REANUDACIÓN 01:	**lunes, 22 de junio de 2026**		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**lunes, 22 de marzo de 2027**		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	**ARA INGENIERIA S.A.S**		
INTEGRANTES:	**N/A**		
CONTRATO N°	**0754-2026**	VALOR INICIAL:	**$ 452.084.151,00**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE SUSPENSION 01:	**viernes, 22 de mayo de 2026**	VALOR ACUMULADO:	**$ 452.084.151,00**
FECHA DE REANUDACIÓN 01:	**lunes, 22 de junio de 2026**	VALOR ANTICIPO:	**$ 113.970.794,40**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**	VALOR AMORTIZADO:	**$ 4.339.994,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**lunes, 22 de marzo de 2027**	SALDO POR AMORTIZAR:	**$ 109.630.800,40**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026 CONVENIO 4363 DE 2024	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 4.833.792.021	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 18.000.000	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 4.815.792.021	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 452.084.151	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 17.215.309	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 434.868.842	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.833.792.020,67	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	34.273.234,52	0,71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	18.000.000,00	0,4%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(16.273.234,52)	-0,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	18.000.000	0,37%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	18.000.000	0,37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	18.000.000	0,37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		100%	0,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	1.695.215.530	0,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	-	

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: **N/A**
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**452.084.151,00**	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**17.215.308,74**	3,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	**$**	**12.139.589,75**	2,7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	**$**	**8.545.000,00**	1,9%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: jul-26
VALOR FACTURA: $ 5.758.586,12

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	**SIN INFORMACION**
Amortizado $	**$ -**
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	**$ 113.970.794,40**
Amortizado $	**$ 2.888.250,00**
Saldo $	**$ 111.082.544,40**

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,351% Avance o Atraso Físico % -0,351%
Meta Física Ejecutada %

Meta Física (Programa de Obra) Linea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 4	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
construccion placa huella	mts	1.123			Prog	$ 16.952.155,30			$ 16.952.155,30	0,35%
					Ejec	$ -			$ -	
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					
*					Prog					
					Ejec					

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Ninguno por ahora		
TOTAL		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1:
TRAMO Y/O SECTOR (n):
TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
EMISIONES:	SI		NO	N/A	**N/A**
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **Sin Información por parte del Contratista**

OBSERVACIONES:

Se desarrolla Revisión y Aval por parte de la Interventoría a la Revisión de Diseños efectuada por el Contratista

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	-	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **10**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: **02**

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: **Ninguna**

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vivienda de la señora Berenice Pabón KDX 5 (El punto se encuentra en adecuaciones)

OBSERVACIONES:

- Se realiza segunda reunión el día 23 de julio 2026, con la comunidad de la VEREDA CAÑO VICTORIA, dando respuesta a las sugerencias emitidas en la socialización anterior. Se concluye que están de acuerdo a la realización del proyecto en la vía
- Se inician las visitas a los predios correspondientes para realizar las actas de vecindad en los 4 tramos donde se va ha desarrollar el proyecto de placa huella. A la fecha se han realizado 8 actas de vecindad.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: **N/A**
FICHAS PREDIALES APROBADAS: **N/A**
AVALÚOS APROBADOS: **N/A**
PREDIOS ADQUIRIDOS: **N/A**

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se realiza

* Se realizan 8 actas de vecindad en sector donde se va a desarrollar el proyecto de placa huella.
* El contratista inicia los trabajos de logística en la zona.
* Se realiza replanteo, nivelación y estacado en el tramo 3 y 4, de la via a intervenir en la vereda CAÑO VICTORIA.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Inicio físico de la obra
* Excavasiones y nivelacion en el tramo 03 de la placa huella a intervenir.
*

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



levantamiento topografico, chequeo, nivelacion y estacado de anchos en el tramo 4



herramienta menor del contratista para la ejecuacion del proyecto de la vereda CAÑO VICTORIA.



levantamiento topografico, chequeo, nivelacion y estacado de anchos en el tramo 4

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Seguimiento periódico en la obra por parte del ingeniero residente.
2. Revision de actas de vecindad emitidas por el contratista
3. informes mensual N° 4
4. informe semanales

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**
Matrícula Profesional N° **25202-45905 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	01 de 01
		FECHA	martes, 18 de agosto de 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER** SEMANA N°: **13** del **07** al **13** (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA**		
INTEGRANTES:	**SAGA INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION INTERVENTORIA S.A.S (60%) - SIGMA S.A.S (40%)**		
CONTRATO N°	**001-2025**	VALOR INICIAL:	**$ 4.833.792.020,67**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE SUSPENSION 01:	**viernes, 22 de mayo de 2026**		**$ 4.833.792.020,67**
FECHA DE REANUDACIÓN 01:	**lunes, 22 de junio de 2026**		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**lunes, 22 de marzo de 2027**		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	**ARA INGENIERIA S.A.S**		
INTEGRANTES:	**N/A**		
CONTRATO N°	**0754-2026**	VALOR INICIAL:	**$ 452.084.151,00**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE SUSPENSION 01:	**viernes, 22 de mayo de 2026**	VALOR ACUMULADO:	**$ 452.084.151,00**
FECHA DE REANUDACIÓN 01:	**lunes, 22 de junio de 2026**	VALOR ANTICIPO:	**$ 113.970.794,40**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**	VALOR AMORTIZADO:	**$ 4.339.994,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**lunes, 22 de marzo de 2027**	SALDO POR AMORTIZAR:	**$ 109.630.800,40**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026 CONVENIO 4363 DE 2024	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 4.833.792.021	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 18.598.801	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 4.815.193.219	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 452.084.151	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 17.215.309	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 434.868.842	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.833.792.020,67	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	71.931.119,32	1,49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	18.598.801,26	0,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(53.332.318,06)	-1,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	18.000.000	0,37%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	18.000.000	0,37%
TOTAL INVERSION EJECUTADA:	$	18.000.000	0,37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		100%	0,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	37.657.885	0,78%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	599.164	0,01%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: **N/A**
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**452.084.151,00**	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**17.215.308,74**	3,8%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	**$**	**12.139.589,75**	2,7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	**$**	**8.545.000,00**	1,9%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: jul-26
VALOR FACTURA: $ 5.758.586,12

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	**SIN INFORMACION**
Amortizado $	**$** -
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	**$ 113.970.794,40**
Amortizado $	**$ 2.888.250,00**
Saldo $	**$ 111.082.544,40**

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,78% Avance o Atraso Físico % -0,77%
Meta Física Ejecutada % 0,01%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Total	%
construccion placa huella	mts	1.123			Prog				$ 41.254.205,85	$ 41.254.205,85	0,85%
					Ejec				$ 599.176,38	$ 599.176,38	0,01%
* alcantarilla	und	4			Prog						
					Ejec						
*					Prog						
					Ejec						
*					Prog						
					Ejec						

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	SI	
TOTAL		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO 1: L=397.85 m - Pr4+595.00 a Pr4 + 992.85
TRAMO 2 : L=419.96 m - Pr5+435 a Pr5+854.96
TRAMO 3 : L=95.00 m - Pr7+342.78 a Pr7+437.78
TRAMO 4 : L=210.00 m - Pr8+290 a Pr8+500

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
EMISIONES:	SI		NO	N/A	**N/A**
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **Sin Información por parte del Contratista**

OBSERVACIONES:

Se desarrolla Revisión y Aval por parte de la Interventoría a la Revisión de Diseños efectuada por el Contratista

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	-	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	13	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **17**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: **02**

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: **Ninguna**

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vivienda de la señora Berenice Pabón

KDX 5 (El punto se encuentra en adecuaciones)

OBSERVACIONES:

- Se realiza segunda reunión el día 23 de julio 2026, con la comunidad de la VEREDA CAÑO VICTORIA, dando respuesta a las sugerencias emitidas en la socialización anterior. Se concluye que están de acuerdo a la realización del proyecto en la vía
- Se inician las visitas a los predios correspondientes para realizar las actas de vecindad en los 4 tramos donde se va ha desarrollar el proyecto de placa huella. A la fecha se han realizado 8 actas de vecindad.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: **N/A**
FICHAS PREDIALES APROBADAS: **N/A**
AVALÚOS APROBADOS: **N/A**
PREDIOS ADQUIRIDOS: **N/A**

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS


Se realiza

- **TECNICA**: inician trabajos de movimiento y nivelacion de la razante con maquinaria pesada.
- se realiza chequeo con topografias para tener niveles de la razante.
- **SST**: se hace verificacion de las hojas de vida , se verifica la documentacion que el contratista lleva formatos, bitacoras, etc
  llegada de maquinaria amarilla a la obra
  se realiza seguimiento diario a las actividades de SST por parte del contrarista.
  llegada de material y herramientas al centro de acopio.
- **SOCIAL:** Se mantiene comunicación constante con el profesional contratista y se revisa el cronograma mensual a ejecutar.
- Se realiza visita al punto escogido por el contratista para establecer el punto de atención a la comunidad, se observa que el espacio ya está adecuado, queda pendiente ubicar la cartelera informativa y demas señalización.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- **TECNICA:** movimiento de tierra en tramo 4
- Excavasiones y nivelacion en el tramo 4 de la placa huella a intervenir.
- rellenos con material seleccionado.
- **SOCIAL:** Una vez terminada la adecuación del punto de atención se dará apertura al buzón de PQRS.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



chequeo topografico para niveles de via rasante tramo 4.



movimeinto de tierra con retro-cargador en el tramo 4.



señalizacion PMT en el tramo 4



Punto de atención a la comunidad.



Moviliario dentro del punto de atención.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Seguimiento periódico en la obra por parte del ingeniero residente.
2. Revision de actas de vecindad emitidas por el contratista
3. informes mensual N° 4
4. informe semanales

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**

Matrícula Profesional N° **25202-45905 CND**

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	01 de 01
		FECHA	lunes, 24 de agosto de 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER** SEMANA N°: **14** del **14** al **20** (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA**		
INTEGRANTES:	**SAGA INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION INTERVENTORIA S.A.S (60%) - SIGMA S.A.S (40%)**		
CONTRATO N°	**001-2025**	VALOR INICIAL:	**$ 4.833.792.020,67**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE SUSPENSION 01:	**viernes, 22 de mayo de 2026**		**$ 4.833.792.020,67**
FECHA DE REANUDACIÓN 01:	**lunes, 22 de junio de 2026**		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**lunes, 22 de marzo de 2027**		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	**ARA INGENIERIA S.A.S**		
INTEGRANTES:	**N/A**		
CONTRATO N°	**0754-2026**	VALOR INICIAL:	**$ 452.084.151,00**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE SUSPENSION 01:	**viernes, 22 de mayo de 2026**	VALOR ACUMULADO:	**$ 452.084.151,00**
FECHA DE REANUDACIÓN 01:	**lunes, 22 de junio de 2026**	VALOR ANTICIPO:	**$ 113.970.794,40**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**	VALOR AMORTIZADO:	**$ 12.513.933,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**lunes, 22 de marzo de 2027**	SALDO POR AMORTIZAR:	**$ 101.456.861,40**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026 CONVENIO 4363 DE 2024	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 4.833.792.021	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 20.561.624	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 4.813.230.397	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 452.084.151	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 49.638.601	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 402.445.550	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.833.792.020,67	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	121.928.445,95	2,52%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	20.561.623,68	0,43%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(101.366.822,27)	-2,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	18.000.000	0,37%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	18.000.000	0,37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	18.000.000	0,37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		100%	0,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	49.997.327	1,03%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	1.962.822	0,04%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: **N/A**
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**452.084.151,00**	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**49.638.600,90**	11,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	**$**	**12.139.589,75**	2,7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	**$**	**8.545.000,00**	1,9%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: jul-26
VALOR FACTURA: $ 24.249.352,16

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	**SIN INFORMACION**
Amortizado $	**$ -**
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	**$ 113.970.794,40**
Amortizado $	**$ 4.339.994,00**
Saldo $	**$ 109.630.800,40**

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1,03% Avance o Atraso Físico % -0,99%
Meta Física Ejecutada % 0,04%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Total	%
	construcción placa huella	mts	1.123			Prog				$ 51.856.973,94	$ 51.856.973,94	1,07%
						Ejec				$ 1.770.293,85	$ 1.770.293,85	0,04%
*	alcantarilla	und	4			Prog						
						Ejec						
*	otros					Prog				$ 6.641.432,69	$ 6.641.432,69	0,14%
						Ejec				$ 192.564,28	$ 192.564,28	0,00%
*						Prog						
						Ejec						

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	SI	1
MOTONIVELADORA	SI	1
VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON	SI	1
TOTAL		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO 1: L=397.85 m - Pr4+595,00 a Pr4 + 992,85
TRAMO 2 : L=419.96 m - Pr5+435 a Pr5+854,96
TRAMO 3 : L=95.00 m - Pr7+342,78 a Pr7+437,78
TRAMO 4 : L=210.00 m - Pr8+290 a Pr8+500

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
VERTIMIENTOS:	SI		NO	N/A	**Sin Información aún**
EMISIONES:	SI		NO	N/A	**N/A**
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **Sin Información por parte del Contratista**

OBSERVACIONES:

Se desarrolla Revisión y Aval por parte de la Interventoría a la Revisión de Diseños efectuada por el Contratista

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	-	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **20**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: **02**

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: **01**

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: Vivienda de la señora Berenice Pabón

KDX 5 (El punto se encuentra en adecuaciones)

OBSERVACIONES:

- Se realiza segunda reunión el día 23 de julio 2026, con la comunidad de la VEREDA CAÑO VICTORIA, dando respuesta a las sugerencias emitidas en la socialización anterior. Se concluye que están de acuerdo a la realización del proyecto en la vía
- Se inician las visitas a los predios correspondientes para realizar las actas de vecindad en los 4 tramos donde se va ha desarrollar el proyecto de placa huella. A la fecha se han realizado 8 actas de vecindad.
- Se realiza el primer taller de formación dirigido a la comunidad.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: **N/A**

FICHAS PREDIALES APROBADAS: **N/A**

AVALÚOS APROBADOS: **N/A**

PREDIOS ADQUIRIDOS: **N/A**

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

GESTION TECNICA

* Continúan los trabajos con maquinaria pesada tipo retro cargador en el tramo 4 los días 14,18, 19y 20 de agosto.
* Se realiza nivelación a cota de sub-rasante, con motoniveladora en el tramo 4 los días 19 y 20 de agosto
* Se realiza compactación del material nivelado a cota de sub-rasante en el tramo 4 los días 19 y 20 de agosto.
* Se mantiene acompañamiento con comisión topográfica en tramo 4 los días 14, 18,19 y 20 de agosto.

GESTION SST

* comunicación constante con la auxiliar siso del contratista y se revisa lo programado y próximo a realizar
* se realizo el registro de las hojas de vida para la contratación
* se realiza verificación de los exámenes de ingreso a trabajadores

GESTION SOCIAL

* Se mantiene comunicación constante con el profesional contratista y se revisa el cronograma semanal a ejecutar.
* Se realizó taller de cultura vial dirigido a la comunidad de la zona de influencia del proyecto.
* Se realizó reunión con algunos miembros de la JAC, el maestro de obra, el área técnica y el área social para concertar el tema de contratación de mano de obra local.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* densidades en el tramo 4
* instalación de geotextil en el ramo 4
* instalación de material granular de mejoramiento en el tramo 4.
* nivelación con maquinaria pesada en el tramo 3.
* Excavaciones y nivelación en el tramo 4 de la placa huella a intervenir.
* rellenos con material seleccionado.
* **SOCIAL:** Apertura del buzón de PQRS.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



nivelación a cota de sub-rasante. Tramo 4.



chequeo periódico con topografía. Tramo 4



nivelación con maquinaria pesada. Tramo 4.



Taller seguridad vial.



Reunión JAC - Área técnica y social.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. Seguimiento periódico en la obra por parte del ingeniero residente. 2. informes mensual N° 4 3. informe semanales 4. acta de reunión obra.	FIRMA NOMBRE: **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO** Matricula Profesional N° **25202-45905 CND**

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	01 de 01
		FECHA	lunes, 31 de agosto de 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER** SEMANA N°: **15** del **21** al **27** Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA**
INTEGRANTES: **SAGA INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION INTERVENTORIA S.A.S (60%) - SIGMA S.A.S (40%)**

CONTRATO N°	**001-2025**	VALOR INICIAL:	**$**	**4.833.792.020,67**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$**	**-**
FECHA DE SUSPENSION 01:	**viernes, 22 de mayo de 2026**		**$**	**4.833.792.020,67**
FECHA DE REANUDACIÓN 01:	**lunes, 22 de junio de 2026**			
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**			
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**lunes, 22 de marzo de 2027**			

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR: **ARA INGENIERIA S.A.S**
INTEGRANTES: **N/A**

CONTRATO N°	**0754-2026**	VALOR INICIAL:	**$**	**452.084.151,00**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$**	**-**
FECHA DE SUSPENSION 01:	**viernes, 22 de mayo de 2026**	VALOR ACUMULADO:	**$**	**452.084.151,00**
FECHA DE REANUDACIÓN 01:	**lunes, 22 de junio de 2026**	VALOR ANTICIPO:	**$**	**113.970.794,40**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**	VALOR AMORTIZADO:	**$**	**12.513.933,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**lunes, 22 de marzo de 2027**	SALDO POR AMORTIZAR:	**$**	**101.456.861,40**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026 CONVENIO 4363 DE 2024	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 4.833.792.021	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 32.705.350	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 4.801.086.671	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 452.084.151	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 49.638.601	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 402.445.550	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.833.792.020,67	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	169.777.608,57	3,51%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	32.705.349,62	0,68%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(137.072.258,95)	-2,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	18.000.000	0,37%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	18.000.000	0,37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	18.000.000	0,37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		100%	0,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	47.849.163	0,99%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	12.143.726	0,25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: **N/A**
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**452.084.151,00**	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**49.638.600,90**	11,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	**$**	**12.139.589,75**	2,7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	**$**	**8.545.000,00**	1,9%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: jul-26
VALOR FACTURA: $ 24.249.352,16

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	**SIN INFORMACION**
Amortizado $	**$ -**
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	**$ 113.970.794,40**
Amortizado $	**$ 4.339.994,00**
Saldo $	**$ 109.630.800,40**

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 0,99% Avance o Atraso Físico % -0,74%
Meta Física Ejecutada % 0,25%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Total	%
construcción placa huella	mts	1.123			Prog			$ -	$ 62.106.671,31	$ 62.106.671,31	1,28%
					Ejec			$ 1.345.423,33	$ 13.168.017,77	$ 14.513.441,10	0,30%
* alcantarilla	und	4			Prog						
					Ejec						
* otros					Prog				$ 6.641.432,69	$ 6.641.432,69	0,14%
					Ejec				$ 192.564,28	$ 192.564,28	0,00%
* estudios y diseños	und	1			Prog	4500000	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 18.000.000,00	0,37%
					Ejec	4500000	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 18.000.000,00	0,37%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	SI	1
MOTONIVELADORA	SI	1
VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON	SI	1
TOTAL		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO 1: L=397.85 m - Pr4+595,00 a Pr4 + 992,85
TRAMO 2 : L=419.96 m - Pr5+435 a Pr5+854,96
TRAMO 3 : L=95.00 m - Pr7+342,78 a Pr7+437,78
TRAMO 4 : L=210.00 m - Pr8+290 a Pr8+500

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO	

OBSERVACIONES: Pendiente por parte del contratista la información de las fuentes de materiales y los respectivos permisos, licencias y certificados. Dicha solicitud fue realizada mediante Oficio ARA-005-ADM del 19 de agosto de 2026.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	**Sin Información aún**
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	**Sin Información aún**
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	**Sin Información aún**
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	**Sin Información aún**
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	**Sin Información aún**
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	**Sin Información aún**
EMISIONES:	SI	NO	N/A	**N/A**
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Información ambiental pendiente de entrega por parte del contratista. Mediante Oficio ARA-005-ADM del 19 de agosto de 2026 se solicitaron los respectivos certificados, permisos y licencias, encontrándose a la fecha pendiente su remisión y verificación.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **Sin Información por parte del Contratista**

OBSERVACIONES:

Se desarrolla Revisión y Aval por parte de la Interventoría a la Revisión de Diseños efectuada por el Contratista

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	-	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	-	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	-	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **11**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: **02**

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: **01**

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Vivienda de la señora Berenice Pabón KDX 5

OBSERVACIONES:

- Se realiza segunda reunión el día 23 de julio 2026, con la comunidad de la VEREDA CAÑO VICTORIA, dando respuesta a las sugerencias emitidas en la socialización anterior. Se concluye que están de acuerdo a la realización del proyecto en la vía
- Se inician las visitas a los predios correspondientes para realizar las actas de vecindad en los 4 tramos donde se va ha desarrollar el proyecto de placa huella. A la fecha se han realizado 8 actas de vecindad.
- Se realiza el primer taller de formación dirigido a la comunidad.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: **N/A**

FICHAS PREDIALES APROBADAS: **N/A**

AVALÚOS APROBADOS: **N/A**

PREDIOS ADQUIRIDOS: **N/A**

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

GESTION TECNICA

* Continúan los trabajos con maquinaria pesada tipo retro cargador, motoniveladora y vibro compactador en el tramo 3 y 4.
* Se realiza nivelación a cota de sub-rasante, con motoniveladora en el tramo 3 y 4; 95 ml de nivelación.
* Se realiza compactación del material nivelado a cota de sub-rasante en el tramo 3 y 4. 95ml de compactación.
* Se mantiene acompañamiento con comisión topográfica en tramo 3 y 4.
* Se realiza densidades del material nivelado y compactado en los tramos 4 y 5.
* Llega a obra hierro aproximadamente 35 ton; varilla de ½" y ¼" de pulgada.
* Llega obra estribos de 3/8" y ¼".
* instalacion de geotextil tramo 4 con una longitud de 100 ml

GESTION SST

* verificacion de la documentacion de conductores de maquinaria (al dia)
* inspeccion de maquinas y herramientas en el lugar de almacen en compañia de siso contratista
* con el acompañamiento de SISO contratista se verifica los resultados de los examnes de ingreso de los trbajadores
* se realiza la verificacion del listados de los trabajadores y el personal en obra del contratista
* se verifican las hojas de vida de las maquinas y herramientas junto con los documentos de las mismas
* en comunicación constante con el personal SISO se revisa el cronograma semanal que se va a ejecutar y se verifica que toda la documentacion este al día

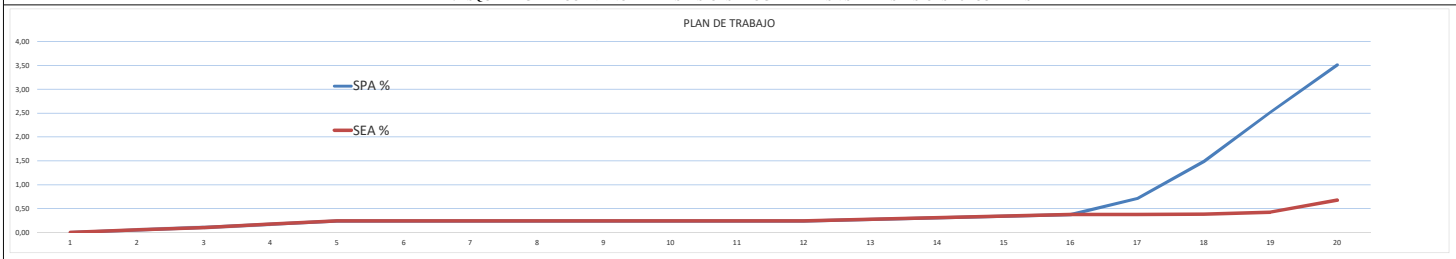
GESTION SOCIAL

* Se mantiene comunicación constante con el profesional contratista y se revisa el cronograma semanal a ejecutar.
* Se realizó la adecuación del punto de atención a la comunidad, se instaló la cartelera informativa y se dio apertura al buzón de sugerencias.
* Se ha mantenido informada a la comunidad de los avances y las actividades realizadas mediante el canal de whatsapp.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Densidades en el tramo 3
* Instalación de geotextil en el tramo 3 y 4.
* Instalación de material granular de mejoramiento en el tramo 4.
* Nivelación con maquinaria pesada en el tramo 3.
* Excavaciones y nivelación en el tramo 4 de la placa huella a intervenir.
* Rellenos con material seleccionado tramo 3 y 4.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



llega a obra 35 ton de hierro



nivelacion con motoniveladora. Tramo 3



compactacion a cota de sub-rasante. Tramo 4 y 3.



chequeo de niveles con topografia. Tramo 3 y 4.



nivelacion a cota de sub-rasante. Tramo 3



densidades en campo, material sub-rasante. Tramo 3 y 4.



Adecuación del punto de atención.



Apertura del buzon de sugerencias.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. Seguimiento periódico en la obra por parte del ingeniero residente. 2. informes mensual N° 4 3. informe semanales 4. acta de reunión obra. 5. seguimiento periodico por parte de los profesionales sst y social.	FIRMA NOMBRE: **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO** Matricula Profesional N° **25202-45905 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	01 de 01
		FECHA	martes, 8 de septiembre de 2026 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER** SEMANA N°: **16** del **28** al **03** (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO** GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:

OBJETO CONTRATO DE OBRA: **"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA Y OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES (TIPO PLACA HUELLA) Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE TRANSVERSAL.

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	**UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA**		
INTEGRANTES:	**SAGA INGENIERIA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION INTERVENTORIA S.A.S (60%) - SIGMA S.A.S (40%)**		
CONTRATO N°	**001-2025**	VALOR INICIAL:	**$ 4.833.792.020,67**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE SUSPENSION 01:	**viernes, 22 de mayo de 2026**		**$ 4.833.792.020,67**
FECHA DE REANUDACIÓN 01:	**lunes, 22 de junio de 2026**		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**lunes, 22 de marzo de 2027**		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	**ARA INGENIERIA S.A.S**		
INTEGRANTES:	**N/A**		
CONTRATO N°	**0754-2026**	VALOR INICIAL:	**$ 452.084.151,00**
FECHA DE INICIO:	**lunes, 20 de abril de 2026**	VALOR ADICIONES:	**$ -**
FECHA DE SUSPENSION 01:	**viernes, 22 de mayo de 2026**	VALOR ACUMULADO:	**$ 452.084.151,00**
FECHA DE REANUDACIÓN 01:	**lunes, 22 de junio de 2026**	VALOR ANTICIPO:	**$ 113.970.794,40**
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	**sábado, 20 de febrero de 2027**	VALOR AMORTIZADO:	**$ 12.513.933,00**
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	**lunes, 22 de marzo de 2027**	SALDO POR AMORTIZAR:	**$ 101.456.861,40**

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2024	2025	2026 CONVENIO 4363 DE 2024	2027
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 4.833.792.021	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 143.347.938	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 4.690.444.083	
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA			$ 452.084.151	
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA			$ 49.638.601	
	SALDO DE VIGENCIA			$ 402.445.550	

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$	4.833.792.020,67	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$	262.019.852,42	5,42%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	143.347.938,10	2,97%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$	(118.671.914,32)	-2,46%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$	-	
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS	$	18.000.000	0,37%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$	18.000.000	0,37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$	18.000.000	0,37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:		100%	0,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$	92.242.244	1,91%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$	110.243.131	2,28%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: **N/A**
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	**$**	**452.084.151,00**	100,0%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	**$**	**49.638.600,90**	11,0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	**$**	**12.139.589,75**	2,7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	**$**	**8.545.000,00**	1,9%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: **N/A**
PERIODO FACTURADO: jul-26
VALOR FACTURA: $ 24.249.352,16

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:

ANTICIPOS	
Otorgado $	**SIN INFORMACION**
Amortizado $	**$ -**
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	**$ 113.970.794,40**
Amortizado $	**$ 4.339.994,00**
Saldo $	**$ 109.630.800,40**

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 1,91% Avance o Atraso Físico % 0,37%
Meta Física Ejecutada % 2,28%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada						
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo 1	Tramo 2	Tramo 3	Tramo 4	Total	%
construcción placa huella	mts	1.123			Prog			$ -	$ 87.489.890,03	$ 87.489.890,03	1,81%
					Ejec	$ 21.477.759,02		$ 2.308.746,43	$ 81.932.815,31	$ 105.719.320,76	2,19%
* alcantarilla	und	4			Prog						
					Ejec	$ 7.564.797,91				$ 7.564.797,91	0,16%
* otros					Prog				$ 13.282.865,38	$ 13.282.865,38	0,27%
					Ejec				$ 10.626.292,30	$ 10.626.292,30	0,22%
* estudios y diseños	und	1			Prog	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 18.000.000,00	0,37%
					Ejec	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ 18.000.000,00	0,37%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETRO EXCAVADORA	SI	1
MOTONIVELADORA	SI	1
VIBROCOMPACTADOR DE 8 TON	SI	1
TOTAL		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO 1: L=397.85 m - Pr4+595,00 a Pr4 + 992,85
TRAMO 2 : L=419.96 m - Pr5+435 a Pr5+854,96
TRAMO 3 : L=95.00 m - Pr7+342,78 a Pr7+437,78
TRAMO 4 : L=210.00 m - Pr8+290 a Pr8+500

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO
UBICACIÓN:	**Contratista aún NO informa**	PERMISO MINERO:	SI	NO
		LICENCIA AMBIENTAL	SI	NO

OBSERVACIONES: Pendiente por parte del contratista la información de las fuentes de materiales y los respectivos permisos, licencias y certificados. Dicha solicitud fue realizada mediante Oficio ARA-005-ADM del 19 de agosto de 2026.

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	**Sin Información aún**
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	**Sin Información aún**
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	**Sin Información aún**
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A	**Sin Información aún**
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A	**Sin Información aún**
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	**Sin Información aún**
EMISIONES:	SI	NO	N/A	**N/A**
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	

OBSERVACIONES: Información ambiental pendiente de entrega por parte del contratista. Mediante Oficio ARA-005-ADM del 19 de agosto de 2026 se solicitaron los respectivos certificados, permisos y licencias, encontrándose a la fecha pendiente su remisión y verificación.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: **Sin Información por parte del Contratista**

OBSERVACIONES:

Se desarrolla Revisión y Aval por parte de la Interventoría a la Revisión de Diseños efectuada por el Contratista

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	-	
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	2	-
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	8	-

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: **24**

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: **02**

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: **01**

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

Vivienda de la señora Berenice Pabón KDX 5

OBSERVACIONES:

- Se realiza segunda reunión el día 23 de julio 2026, con la comunidad de la VEREDA CAÑO VICTORIA, dando respuesta a las sugerencias emitidas en la socialización anterior. Se concluye que están de acuerdo a la realización del proyecto en la vía
- Se inician las visitas a los predios correspondientes para realizar las actas de vecindad en los 4 tramos donde se va ha desarrollar el proyecto de placa huella. A la fecha se han realizado 8 actas de vecindad.
- Se realiza el primer taller de formación dirigido a la comunidad.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: **N/A**

FICHAS PREDIALES APROBADAS: **N/A**

AVALÚOS APROBADOS: **N/A**

PREDIOS ADQUIRIDOS: **N/A**

OBSERVACIONES:

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

GESTION TECNICA

* Se extiende geotextil en tramo 4 en toda su recorrido
* Se realiza extensión de material para mejoramiento de la vía en el tramo 4
* Continúan los trabajos de compactación en tramo 3
* Se hace nivelación en tramo 2 con comisión topográfica
* Inician los trabajos de instalación de tubería de 36 pul, para alcantarilla en tramo 1. K4 + 775
* Llega a obra 350 pacas de cemento y triturado a obra.
* armando aceros de las riostras para la placa huella.
*

GESTION SST

* durante la semana se realizo:
* inspeccion de maquinas y herramientas en el lugar de almacen en compañia de siso contratista
  se realiza verificacion del listado de trabajadores y personal en obra
* hasta el momento en campo hay obreros: 5 oficiales: 2 maestro 1
* maquinistas: 3 , topografos : 2 y personal de contratista : 3
* se verifican las hojas de vida de las maquinas y herramientas junto con los documentos de las mismas
* en comunicación constante con el personal SISO se revisa el cronograma semanal que se va a ejecutar y se verifica que toda la documentacion este al dia
  se realiza la induccion de los trabajadores


GESTION SOCIAL

* adecuacion del punto fisico señalado y listo para atender cualquier necesidad de la comiunidad
* reunion con miembros de la JAC para concertar temas de contratacion del personal
* se realizaron actas de vecindad (10)
* taller sobre cultura vial dirigido a la comunidad directamente inplicada
  actividades sociales dirigidas a la comunidad

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

* Compactación de material de recebo en tramo 4.
* Instalación de geotextil en tramo 3.
* Instalación de material de recebo en tramo 3
* Compactación de material de recebo en tramo 3.
* Densidades en campo del material de recebo en tramo 3 y 4.
*

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS



El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



instalacion de 210 ml geotextil tramo 4.



terraplen con e= 0,15 de material mejorado. Tramo 4



riego de material con motoniveladora. terraplen con e= 0,15 de material mejorado. Tramo 4




terraplen con material ejorado en tramo 4.



instalacion de tuberia alcantarilla d=36 pul tramo 1 K4 + 775



instalacion de tuberia alcantarilla d=36 pul tramo 1 K4 + 775



Cronograma de actividades



Horario de atención a la comunidad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Seguimiento periódico en la obra por parte del ingeniero residente.
2. informes mensual N° 4
3. informe semanales
4. acta de reunión obra.
5. seguimiento periodico por parte de los profesionales sst y social.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**

Matrícula Profesional N° **25202-45905 CND**

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 2: Maquinaria y equipo contrato de obra
MEPI-MN1-IN-15-FR-4

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CONVENIO No. 4363 DE 2024. ENC - INVIAS, BENEFICIARIO - MUNICIPIO DE TIBU (NDS), CONTRIBUYENTES - MEDICAL DUARTE ZF SAS Y DUMIAN MEDICAL SAS.

DIRECCIÓN TERRITORIAL: Cucuta

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATO No. 001 - 2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 0754 DE 2026

INTERVENTORÍA: ARA INGENIERÍA S.A.S.

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROCARGADOR 420D	CATERPILLAR	88HP	VEREDA CAÑO VICTORIA													A	A	I			A	A	A	A	I		A	A	A	A	A	I		A
MOTONIVELADORA 120H	CATERPILLAR	125HP	VEREDA CAÑO VICTORIA																				A	A	I		A	A	A	A	A	A		A
VIBROCOMPACTADOR CASE	CASE	8 TN	VEREDA CAÑO VICTORIA																				A	A	I		A	A	A	A	A	A		A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				0		0	0	0	0		0		0	0	0	1	1	1			1	1	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3		3
TOTAL ACTIVO				0		0	0	0	0		0		0	0	0	1	1	0			1	1	3	3	0	0	3	3	3	3	2		3
TOTAL EN REPARACIÓN				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
TOTAL INACTIVO				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1		0

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	100%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	0,6	60%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0,07	7%

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):
LOS DIAS QUE ESTUVO INACTIVA LA MAQUINARIA FUE POR LLUVIA O POR DAÑO MECANICO.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

Firma
"Nombre: GLADYS TERESA LANDAZABAL GRANADOS
Residente de Obra
"Matrícula Profesional No.: 54202 - 37708 NDS

Firma
Nombre: ALEXIS RODRIGUEZ BARON
Residente de Interventoría
Matrícula profesional No:

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 3: Personal, control aportes legales y seguridad social contrato de obra

MEPI-MN1-IN-15-FR-6

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	31/08/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CONVENIO No. 4363 DE 2024. ENC - INVIAS, BENEFICIARIO - MUNICIPIO DE TIBU (NDS), CONTRIBUYENTES - MEDICAL DUARTE ZF SAS Y DUMIAN MEDICAL SAS. PARA EL MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TIBU. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. CODIGO BPIN 20240214000033

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: 001-2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: ago-26

PROYECTO: "MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0754 DE 2026

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

NOMBRE ARL: POSITIVA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFAORIENTE

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	Saúl Alfonso Gómez Angarita	13.468.198	Director de Obra	$ 7.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	$ 7.000.000,00	$ 487.200	V	SANITAS	38517356	$ 170.033	COLPENSIONES	38517356	$ 680.067	$ 280.000	$ -	$ -	
2	Nircy Tinoco Romero	60.299.473	Ing. Control y seguimiento	$ 4.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	$ 4.000.000,00	$ 278.400	V	SANITAS	38517356	$ 170.033	COLPENSIONES	38517356	$ 680.067	$ 160.000	$ -	$ -	
3	Gladys Teresa Landazabal Granados	60.281.641	Ing. Residente de Obra	$ 4.023.690	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	$ 4.023.690,00	$ 280.049	V	COOSALUD	38517356	$ 161.000	SINAFP	38517356	$ -	$ 161.000	$ -	$ -	
4	Jennifer Katherine Hernandez Díaz	1.093.921.671	Técnico en Seguridad Ocupacional y Laboral	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	$ 1.750.905,00	$ 121.863	V	COMFAORIENTE	38517356	$ 70.100	COLPENSIONES	38517356	$ 680.067	$ 70.100	$ -	$ -	
5	Diego Andrés Medellín Díaz	1.093.787.385	Trabajador Social	$ 2.200.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	$ 2.200.000,00	$ 153.325	V	NUEVA EPS	38517356	$ 88.000	PORVENIR	38517356	$ 352.000	$ 88.000	$ -	$ -	
6	Jesús Alberto Tinoco Romero	13.452.583	Almacenista y oficios varios	$ 1.750.905	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	$ 1.750.905,00	$ 121.863	V	SANITAS	38517356	$ 170.033	PROTECCIÓN	38517356	$ 280.200	$ 70.100	$ -	$ -	
7	Jesús Ramón Rivera Ovallos	13.268.883	Maestro de Obra	$ 1.750.905																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	UT PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	$ 641.999,00	$ 44.700	V	SIN EPS	38517652	$ -	SINAFP	38517652	$ -	$ -	$ -	$ -	
8	Jesús Ramón Rivera Ovallos	13.268.883	Maestro de Obra	$ 1.750.905																					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Jesús Ramón Rivera Ovallos	$ 641.999,00	$ -	V	COOSALUD	38528707	$ 80.300	COLPENSIONES	38528707	$ 102.800	$ -	$ -	$ -	
9	Henry David Barbosa Jaramillo	1.093.923.761	Obrero	$ 1.750.905																													X	X	X	Jesús Ramón Rivera Ovallos	$ 175.091,00	$ 12.200	V	NUEVA EPS mov	38528513	$ 7.100	PORVENIR	38528513	$ 28.100	$ 7.100	$ -	$ -	
10	Victor Manuel Barbosa Jaramillo	1.093.916.123	Obrero	$ 1.750.905																			X	X	X	X	X	X	X							Jesús Ramón Rivera Ovallos	$ 408.545,00	$ 16.400	V	COMFAORIENTE	38528513	$ 28.500	PORVENIR	38528513	$ 65.400	$ 16.400	$ -	$ -	
11	Luis Leonardo Castro Correa	1.093.911.792	Oficial de Obra	$ 1.750.905																											X	X	X	X	X	Jesús Ramón Rivera Ovallos	$ 291.818,00	$ 11.700	V	NUEVA EPS mov	38528513	$ 20.400	PORVENIR	38528513	$ 46.700	$ 11.700	$ -	$ -	
12	Eliecer Fernando Quintero Acuña	1.093.915.152	Obrero	$ 1.750.905																													X	X		Jesús Ramón Rivera Ovallos	$ 116.727,00	$ 4.700	V	COMFAORIENTE	38528513	$ 8.200	PORVENIR	38528513	$ 18.700	$ 4.700	$ -	$ -	
13	Eulises Salazar Figueroa	1.093.775.535	Obrero	$ 1.750.905																													X	X		Jesús Ramón Rivera Ovallos	116727	$ 4.700	V	NUEVA EPS	38528513	$ 8.200	PORVENIR	38528513	$ 18.700	$ 4.700	$ -	$ -	
14																																																		
15																																																		
16																																																		
17																																																		
18																																																		
19																																																		
20																																																		

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha 4/09/2026 a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma
Nombre:
Director de Obra: Saúl Alfonso Gómez Angarita
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría: Jose Alberto Rojas Prieto
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38517356
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901982531	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 11A # 1E-135 PISO3 EDIF.ALTAMIRA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	INES8AK@OUTLOOK.COM	TELÉFONO	6075714823
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13468198	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	ANGARITA
PRIMER NOMBRE	SAUL	SEGUNDO NOMBRE	ALFONSO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 09	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$20.725.500		38517356

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13468198	01	No	No	No	54	1	5422001	Fijo	GOMEZ ANGARITA SAUL ALFONSO	$7.000.000
CC-1093921671	01	No	No	No	54	1	5422001	Fijo	HERNANDEZ DIAZ JENNIFER KATHERINE	$1.750.905
CC-60281641	01	5	No	No	54	1	5422001	Fijo	LANDAZABAL GRANADOS GLADYS TERESA	$4.023.690
CC-1093787385	01	No	No	No	54	1	5422001	Fijo	MEDELLIN DIAZ DIEGO ANDRES	$2.200.000
CC-13452583	01	No	No	No	54	1	5422001	Fijo	TINOCO ROMERO JESUS ALBERTO	$1.750.905
CC-60299473	01	No	No	No	54	1	5422001	Fijo	TINOCO ROMERO NIRCY	$4.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13468198																													0		
CC - 1093921671																													0		
CC - 60281641																													0		
CC - 1093787385																													0		
CC - 13452583																													0		
CC - 60299473																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13468198	COLPENSIONES	30	$7.000.000	0.1600000	$1.120.000	$0	$0	$1.120.000	$0	$0	$0
CC - 1093921671	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 60281641	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1093787385	PORVENIR	30	$2.200.000	0.1600000	$352.000	$0	$0	$352.000	$0	$0	$0
CC - 13452583	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 60299473	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13468198	SANITAS	30	$7.000.000	0.0400000	$280.000	$0	0	$0	0	$0	30	$7.000.000	1	0.0696000	$487.200
CC - 1093921671	COMFAORIENTE	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 60281641	EPS-S COOSALUD	30	$4.023.690	0.0400000	$161.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.023.690	1	0.0696000	$280.100
CC - 1093787385	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.200.000	0.0400000	$88.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.200.000	1	0.0696000	$153.200
CC - 13452583	SANITAS	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	$0	0	$0	0	$0	30	$1.750.905	1	0.0696000	$121.900
CC - 60299473	SANITAS	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	$0	0	$0	0	$0	30	$4.000.000	1	0.0696000	$278.400

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13468198	COMFAORIENTE	30	$7.000.000	0.0400000	$280.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093921671	COMFAORIENTE	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-60281641	COMFAORIENTE	30	$4.023.690	0.0400000	$161.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093787385	COMFAORIENTE	30	$2.200.000	0.0400000	$88.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-13452583	COMFAORIENTE	30	$1.750.905	0.0400000	$70.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-60299473	COMFAORIENTE	30	$4.000.000	0.0400000	$160.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PROTECCION	1	$280.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$280.200
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$2.040.200	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$2.040.200
PORVENIR	1	$352.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$352.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	3	$510.100	$0	0	$0	0	$0	$510.100	0	$0	$0	$510.100	$0	0	$0	$0	$510.100	$0	$0	$510.100
COMFAORIENTE	1	$70.100	$0	0	$0	0	$0	$70.100	0	$0	$0	$70.100	$0	0	$0	$0	$70.100	$0	$0	$70.100
EPS-S COOSALUD	1	$161.000	$0	0	$0	0	$0	$161.000	0	$0	$0	$161.000	$0	0	$0	$0	$161.000	$0	$0	$161.000
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$88.000	$0	0	$0	0	$0	$88.000	0	$0	$0	$88.000	$0	0	$0	$0	$88.000	$0	$0	$88.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	6	$1.442.700	0	$0	$0	$1.442.700	0	$0	$1.442.700	0	$0	$0	$1.442.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAORIENTE	6	$829.200	0	$0	$829.200
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$829.200
PENSIONES	3	$2.672.400
RIESGOS PROFESIONALES	1	$1.442.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$829.200
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$5.773.500

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38517652
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901982531	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 11A 1E-135 PISO3 EDIFALTAMIRA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	INES8AK@OUTLOOK.COM	TELÉFONO	6075714823
FAX	0	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	ARL INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Contratante

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	60301664	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	ANGARITA
PRIMER NOMBRE	SAUL	SEGUNDO NOMBRE	ALFONSO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 08	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		38517652

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13268883	59	No	No	No	54	810	5411101	Salario	RIVERA OVALLOS JESUS RAMON	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13268883	R	2026-08-20																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13268883	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13268883	SIN EPS	0	$0	0.0000000	$0	$0	0	$0	0	$0	11	$641.999	1	0.0696000	$44.700

APORTES PARAFISCALES														
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13268883	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SIN EPS	1	$0	$0	0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	1	$44.700	0	$0	$0	$44.700	0	$0	$44.700	0	$0	$0	$44.700

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	0	$0
PENSIONES	0	$0
RIESGOS PROFESIONALES	1	$44.700
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$44.700

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38528707
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JESUS RAMON RIVERA OVALLOS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13268883	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	Independiente
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 8A 12 78 BARRIO LOS PINOS	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	TIBU
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	INES8AK@OUTLOOK.COM	TELÉFONO	3106367950
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	INDEPENDIENTE
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	SINARP	Tipo de aportante	Independiente

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
1		$0		38528707

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13268883	03	No	No	No	54	810	0	Salario	RIVERA OVALLOS JESUS RAMON	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13268883	X	2026-08-20																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13268883	COLPENSIONES	11	$641.999	0.1600000	$102.800	$0	$0	$102.800	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 13268883	EPS-S COOSALUD	11	$641.999	0.1250000	$80.300	$0	0	$0	0	$0	0	$0	0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cot a CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-13268883	SIN CCF	0	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	1	$102.800	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$102.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
EPS-S COOSALUD	1	$80.300	$0	0	$0	0	$0	$80.300	0	$0	$0	$80.300	$0	0	$0	$0	$80.300	$0	$0	$80.300

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
SINARP	0	$0	0	$0	$0	$0	0	$0	$0	0	$0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
SIN CCF	1	$0	0	$0	$0
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	1	$80.300
PENSIONES	1	$102.800
RIESGOS PROFESIONALES	0	$0
CAJAS DE COMPENSACIÓN	0	$0
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$183.100

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38528513
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-09-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JESUS RAMON RIVERA OVALLOS	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13268883	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 8A 12 78 BARRIO LOS PINOS	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	TIBU
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4111	CORREO ELECTRÓNICO	INES8AK@OUTLOOK.COM	TELÉFONO	3106367950
FAX	0	SUCURSAL	1	NOMBRE SUCURSAL	EMPLEADOS
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	ARL SURA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2026	Mes: 08	Año: 2026	Mes: 09	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
5		$1.108.908		38528513

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1093923761	01	No	No	No	54	810	5411101	Fijo	BARBOSA JARAMILLO HENRY DAVID	$1.750.905
CC-1093916123	01	No	No	No	54	810	5411101	Fijo	BARBOSA JARAMILLO VICTOR MANUEL	$1.750.905
CC-1093911792	01	No	No	No	54	810	5411101	Fijo	CASTRO CORREA LUIS LEONARDO	$1.750.905
CC-1093915152	01	No	No	No	54	810	5411101	Fijo	QUINTERO ACUÑA ELIECER FERNANDO	$1.750.905
CC-1093775535	01	No	No	No	54	810	5411101	Fijo	SALAZAR FIGUEROA EULISES	$1.750.905

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1093923761	X	2026-08-28																											0		
CC - 1093916123	X	2026-08-19	X	2026-08-25																									0		
CC - 1093911792	X	2026-08-26																											0		
CC - 1093915152	X	2026-08-29																											0		
CC - 1093775535	X	2026-08-29																											0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1093923761	PORVENIR	3	$175.091	0.1600000	$28.100	$0	$0	$28.100	$0	$0	$0
CC - 1093916123	PORVENIR	7	$408.545	0.1600000	$65.400	$0	$0	$65.400	$0	$0	$0
CC - 1093911792	PORVENIR	5	$291.818	0.1600000	$46.700	$0	$0	$46.700	$0	$0	$0
CC - 1093915152	PORVENIR	2	$116.727	0.1600000	$18.700	$0	$0	$18.700	$0	$0	$0
CC - 1093775535	PORVENIR	2	$116.727	0.1600000	$18.700	$0	$0	$18.700	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1093923761	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	3	$175.091	0.0400000	$7.100	$0	0	$0	0	$0	3	$175.091	1	0.0696000	$12.200
CC - 1093916123	COMFAORIENTE	7	$408.545	0.0400000	$16.400	$0	0	$0	0	$0	7	$408.545	1	0.0696000	$28.500

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1093911792	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	5	$291.818	0.0400000	$11.700	$0	0	$0	0	$0	5	$291.818	1	0.0696000	$20.400
CC - 1093915152	COMFAORIENTE	2	$116.727	0.0400000	$4.700	$0	0	$0	0	$0	2	$116.727	1	0.0696000	$8.200
CC - 1093775535	NUEVA E.P.S. S.A.	2	$116.727	0.0400000	$4.700	$0	0	$0	0	$0	2	$116.727	1	0.0696000	$8.200

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1093923761	COMFAORIENTE	3	$175.091	0.0400000	$7.100	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093916123	COMFAORIENTE	7	$408.545	0.0400000	$16.400	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093911792	COMFAORIENTE	5	$291.818	0.0400000	$11.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093915152	COMFAORIENTE	2	$116.727	0.0400000	$4.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1093775535	COMFAORIENTE	2	$116.727	0.0400000	$4.700	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2026 - 08											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
PORVENIR	5	$177.600	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$177.600

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
NUEVA E.P.S. S.A.	1	$4.700	$0	0	$0	0	$0	$4.700	0	$0	$0	$4.700	$0	0	$0	$0	$4.700	$0	$0	$4.700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	2	$18.800	$0	0	$0	0	$0	$18.800	0	$0	$0	$18.800	$0	0	$0	$0	$18.800	$0	$0	$18.800

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
COMFAORIENTE	2	$21.100	$0	0	$0	0	$0	$21.100	0	$0	$0	$21.100	$0	0	$0	$0	$21.100	$0	$0	$21.100

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
ARL SURA	5	$77.500	0	$0	$0	$77.500	0	$0	$77.500	0	$0	$0	$77.500

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFAORIENTE	5	$44.600	0	$0	$44.600
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$44.600
PENSIONES	1	$177.600
RIESGOS PROFESIONALES	1	$77.500
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$44.600
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$344.300

ANEXO 4: Informe financiero y presupuestal contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-8

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CONVENIO No. 4363 DE 2024. ENC - INVIAS, BENEFICIARIO - MUNICIPIO DE TIBU (NDS), CONTRIBUYENTES - MEDICAL DUARTE ZF SAS Y DUMIAN MEDICAL SAS. PARA EL MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TIBU. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. CODIGO BPIN 20240214000033

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÚCUTA

CONTRATO DE OBRA No: 001-2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

MES INFORME MENSUAL: ago-26

PROYECTO: "MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0754 DE 2026

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	Convenio 4363	Mecanismo de Obra por impuestos	1	CONTRIBUYENTES: MEDICAL DUARTE ZF S.A.S Y DUMIAN MEDICAL	001-2025	$ 4.833.792.020,67	
TOTAL						**$ 4.833.792.020,67**	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 4.833.792.020,67**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

OBSERVACIONES: Hasta la fecha NO se han realizado ni presentados actas parciales de obra

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.044.010.101	$ 789.781.919	**$ 4.833.792.020,67**
VALOR AJUSTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CONTRATO DE OBRA	$ 15.126.050	$ 2.873.950	**$ 18.000.000**
ADICIONALES DE OBRA (ITEM NO PREVISTOS CONTRATO DE OBRA)	$ -	$ -	**$ -**
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 4.059.136.152	$ 792.655.869	**$ 4.851.792.021**
VALOR TOTAL	$ 4.059.136.152	$ 792.655.869	**$ 4.851.792.020,67**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre: Saúl Alfonso Gómez Angarita
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Director de Interventoría: Jose Alberto Rojas
Matrícula Profesional No.: 15202-093568

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 5: Estado general del tiempo
MEPI-MN1-IN-15-FR-10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/08/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CONVENIO No. 4363 DE 2024. ENC - INVIAS, BENEFICIARIO - MUNICIPIO DE TIBU (NDS), CONTRIBUYENTES - MEDICAL DUARTE ZF SAS Y DUMIAN MEDICAL SAS.

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÚCUTA

CONTRATO DE OBRA No: 001-2025

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO DE 2026

PROYECTO: "MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0754 DE 2026

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	23	22	23	22	23	24	24	24	23	24	24	24	21	22	21	19	22	23	20	24	20	24	23	24	24	24	24	24	24	24	21	708
Lluvias moderadas	1	2	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	2	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	25
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	1	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA: Iniciaron actividades en campo con maquinaria pesada el dia 13 del mes de Agosto

OBSERVACIONES:

Los dias 13, 16 y 19 las precipitaciones se presentaron acompañadas de fuertes vientos y tormentas eléctricas.

Firma
Nombre:
Residente de Obra: Gladys Teresa Landazabal Granados
Matrícula Profesional No.: 5420237708 NDS

Firma Jhonny Rodriguez
Nombre:
Residente de Interventoría: Jhonny Alexis Rodríguez Barón
Matrícula Profesional No.: 54202-373127 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 6: Resumen ensayos de laboratorio
MEPI-MN1-IN-15-FR-11

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
		VERSIÓN	1
		PAGINA	

FECHA: 31/08/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: CONVENIO No. 4363 DE 2024. ENC - INVIAS, BENEFICIARIO - MUNICIPIO DE TIBU (NDS), CONTRIBUYENTES - MEDICAL DUARTE ZF SAS Y DUMIAN MEDICAL SAS.

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No.: 001-2025

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: AGOSTO 2026

PROYECTO: "MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0754 DE 2026

INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES

No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	28/08/2026	Densidades en subrasante con método de cono y arena	INVE-161-2013	Subrasante tramo 3 (K7+430)	1	95%	95,79%	SÍ	
2	28/08/2026	Densidades en subrasante con método de cono y arena	INVE-161-2014	Subrasante tramo 3 (K7+360)	1	95%	98,04%	SÍ	
3	28/08/2026	Densidades en subrasante con método de cono y arena	INVE-161-2014	Subrasante tramo 4 (K8+490)	1	95%	98,71%	SÍ	
4	28/08/2026	Densidades en subrasante con método de cono y arena	INVE-161-2014	Subrasante tramo 4 (K8+430)	1	95%	98,99%	SÍ	
5	28/08/2026	Densidades en subrasante con método de cono y arena	INVE-161-2014	Subrasante tramo 4 (K8+360)	1	95%	96,03%	SÍ	
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: SAÚL ALFONSO GÓMEZ ANGARITA
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre:
Director de Interventoría: Jose Alberto Rojas
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INFORME ENSAYO DE LABORATORIO **DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA** **NORMA INVE-161-2013**	**Código: FR-LAB-20** **Versión: 05** **Fecha: Mayo 15 de 2025**

***PROYECTO:**	MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		
***LOCALIZACION:**	Vereda Caño Victoria, Tibú, Norte de Santander.	**FECHA DE EMISION INFORME:**	28/08/2026
***CLIENTE:**	Unión Temporal Placa Huella Caño Victoria	**INFORME:**	DEN-159-2026
***MATERIAL:**	Subrasante Natural - Arcilla limo-arenosa con presencia de grava o cantos rodados	**PÁGINA:**	1 de 1

PRUEBA No.	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
FECHA DE REALIZACIÓN	26/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	26/08/2026	26/08/2026
ABSCISA/TORRE*	TRAMO #4			TRAMO #3	
	K8+490	K8+430	K8+360	K7+430	K7+360
COSTADO/PATA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
PROFUNDIDAD DEL HUECO (cm)	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
ESPESOR DE LA CAPA ENSAYADA (cm)*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO (mm)*	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Masa de frasco + arena inicial (g.)	6226,0	6218,0	6210,0	6166,0	6150,0
Masa de frasco + arena restante (g.)	1760,0	1616,0	1387,0	1853,0	1800,0
Masa de los retenidos en 3/4 " (g.)	716,00	1672,00	2111,00	592,00	1537,00
Porcentaje de material retenido en 3/4" seco (%)	19,33%	40,01%	46,66%	17,50%	40,57%
Masa de los retenidos en 3/4 " seco (g.)	708,91	1655,45	2090,10	586,14	1521,78
Masa especifico SH. Material retenido en 3/4" (g.)	2,560	2,560	2,560	2,560	2,560
Masa de arena total usada (g.)	4466,0	4602,0	4823,0	4313,0	4350,0
Masa Constante del cono (g.)	1775	1775	1775	1775	1775
Masa de arena en el hueco (g.)	2691,0	2827,0	3048,0	2538,0	2575,0
Densidad de la arena (g/cm^3)	1,375	1,375	1,375	1,375	1,375
Volumen del hueco (cm^3)	1957,09	2056,00	2216,73	1845,82	1872,73
Peso del material extraido humedo (grs.)	4364,0	4818,0	4972,0	3661,0	4122,0
Porcentaje de material pasa 3/4" seco (%)	80,67%	59,99%	53,34%	82,50%	59,43%
Peso del material extraido seco (g.)	3704,6	4178,7	4524,1	3383,5	3788,6
DENSIDAD DEL MATERIAL TOTAL (grs/cm^3)	**1,893**	**2,032**	**2,041**	**1,833**	**2,023**
DENSIDAD CORREGIDA DEL MATERIAL PASA 3/4" (grs/cm^3)	**1,782**	**1,787**	**1,733**	**1,729**	**1,770**
DENSIDAD MAXIMA DE LABORATORIO PASA 3/4" (grs/cm^3)	**1,805**	**1,805**	**1,805**	**1,805**	**1,805**
VERIFICACIÓN DE DENSIDAD ESPECIFICADA	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**
% DE HUMEDAD OPTIMA DE LABORATORIO	**15,50%**	**15,50%**	**15,50%**	**15,50%**	**15,50%**
% DE COMPACTACION DEL TERRENO	**98,71%**	**98,99%**	**96,03%**	**95,79%**	**98,04%**
% DE COMPACTACION ESPECIFICADO	**95,00%**	**95,00%**	**95,00%**	**95,00%**	**95,00%**
CONTENIDO DE HUMEDAD PASA 3/4" (%)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
CONTENIDO DE HUMEDAD RETENIDO 3/4" (%)	**1,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**1,00%**	**1,00%**
****HUMEDAD OBTENIDA A PARTIR DEL SPEEDY**	**17,80%**	**15,30%**	**9,90%**	**8,20%**	**8,80%**

CONO UTILIZADO	
CODIGO INTERNO:	SGD007-3
BALANZA	
MARCA Y SERIE:	CZNEWTON - 2018010193
CÓDIGO INTERNO:	SG 00002-12

INCERTIDUMBRE K=2 NIVEL DE CONFIANZA 95%		
Humedad (%) INV E 122-2013		±
Densidad (kN/m^3) INVE 161:2013		±

Ing. Victor Alfonso Florez Duran
Revisó y Aprobó

** Este procedimiento no cuenta con acreditacion ante el ONAC

Este informe se entrega en su forma original, queda terminantemente prohibida cualquier reproducción parcial sin la autorización escrita previa del laboratorio. los resultados mostrados son exclusivamente de la muestra analizada. SOLUCIONES GEOCIVILES SAS no se hace responsable de la información suministrada por el cliente, la cual se encuentra precedida de un asterisco (*).

Los ensayos fueron realizados en el sitio del proyecto informado por el cliente.

ANEXO 7: Seguimiento garantías y seguros contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	8 (Mes)	26 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: CONVENIO No. 4363 DE 2024. ENC - INVIAS, BENEFICIARIO - MUNICIPIO DE TIBU (NDS), CONTRIBUYENTES - MEDICAL DUARTE ZF SAS Y DUMIAN MEDICAL SAS.

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 001-2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

OBJETO DEL CONTRATO:

"MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033"

FECHA DE INICIO: 20/04/2026

PLAZO INICIAL: 10,00 meses

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/03/2027
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 4.833.908.227,67

VALOR ACUMULADO: $ 4.833.908.227,67
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.000.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 18.000.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0754 DE 2026

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	30%	$ 1.450.137.606,20	5	11	2025	5	1	2027
Salarios y prestaciones sociales	10%	$ 483.379.202,07	5	11	2025	5	9	2029
Calidad del servicio	30%	$ 1.450.137.606,20	5	9	2026	5	9	3031
Estabilidad y calidad de la Obra	30%	$ 1.450.137.606,20	5	9	2026	5	9	3031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100012183

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros Mundial

Fecha de aprobación de la garantía:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	$ 483.379.202,07	5	11	2025	20	10	2026
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100002761

OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros mundial

Fecha de aprobación del seguro:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	8 (Mes)	26 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	30%	$ 1.450.137.606,20	22	6	2026	23	7	2027
Salarios y prestaciones sociales	10%	$ 483.379.202,07	22	6	2026	22	3	2030
Calidad del servicio	30%	$ 1.450.137.606,20	22	3	2027	22	3	3032
Estabilidad y calidad de la Obra	30%	$ 1.450.137.606,20	22	3	2027	22	3	3032

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100012183

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros Mundial

Fecha de aprobación de la garantía: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** 1

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	5%	$ 483.379.202,07	5	11	2025	6	4	2027
Otros	N.A	N.A	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100002761 **OTRAS PÓLIZAS No.** N.A

Certificado de modificación o anexo No. 2
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: Seguros Mundial

Fecha de aprobación del seguro: .....

OBSERVACIONES:

Se actualizan las pólizas del contrato de obra de acuerdo al acta de reinicio No. 1 del 22 de junio de 2026.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: Saúl Alfonso Gómez Angarita
Director de Obra

Firma
Nombre:
Director de Interventoría : Alberto Rojas Prieto
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 8: Seguimiento plan de calidad contrato de obra MEPI-MN1-IN-15-FR-14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2026 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: CONVENIO No. 4363 DE 2024. ENC - INVIAS, BENEFICIARIO - MUNICIPIO DE TIBU (NDS), CONTRIBUYENTES - MEDICAL DUARTE ZF SAS Y DUMIAN MEDICAL SAS. **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 001-2025 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033"

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

FECHA DE INICIO: 20/04/2026 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 10 meses **FECHA DE VENCIMIENTO:** 22/03/2027 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 0754 DE 2026 (Indicar número y año)

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI [X] NO [ ] APROBADO: SI [ ] NO [ ] VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 2026

OBSERVACIONES:

El contrato de obra se rige bajo el plan de gestión integral de Obra (PGIO) aprobado por la interventoría.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI [ ] NO [X]
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI [ ] NO [X]

No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: N.A
No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: N.A
FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: N.A
FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: N.A

OBSERVACIONES:

No Aplica la obligación de realización de Auditorias de calidad para el contrato de obra según PGIO.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI [X] NO [ ] APROBADO: SI [ ] NO [ ] FECHA DE APROBACIÓN:

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES 2 No. TOTAL DE ENSAYOS EJECUTADOS EN EL MES: 2

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI [X] NO [ ]

OBSERVACIONES:

De acuerdo con el Plan de Gestión Integral de Obra, la realización de los ensayos de obra se realizan de acuerdo al avance de obra, cantidad de ensayos de toma de densidades a la capa de subrasante conformada se realizó de acuerdo a la longitud del tramo.
Tramo 3: Se tomaron 2 puntos para densidades de cono y arena
Tramo 4: Se tomaron 3 puntos para densidades de cono y arena.
Se adjunta el informe de los resultados de los ensayos.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0
No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Hasta la fecha no se han presentado Reporte de No Conformidades

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0
No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

FECHA: 31 (Día) 8 (Mes) 2026 (Año)

OBSERVACIONES:

Hasta la fecha no se han presentado Quejas y Reclamos respecto en torno al contrato de Obra.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Resistencia a la compresión del concreto.	0	Fórmula: (Número de cilindros con resistencia de diseño / Total de cilindros ensayados) X 100
IG2: conformidad del espesor de la losa de concreto	0	Fórmula: (Número de apiques o mediciones con espesor conforme / Total de mediciones realizadas) X 100
IG3: Colocación de aceros	0	Fórmula: (Número de tramos de acero aprobados / Total de tramos de acero revisados antes del vaciado) X 100.
IG4: Asentamiento de concreto	0	Fórmula: (Número de ensayos de cono de Abrams conformes / Total de ensayos realizados) X 100.

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

El valor de los IG por mes es cero debido a que no se han iniciado actividades de dichos indicadores

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
1	Estación total	Topcon GTS 236W	284523	29-jul-26	Certificado 365 29 de julio de 2026	29-ene-27	
2	Horno	Pinzuar PG-2002	169	8-oct-25	T-35496-001 R0 14 Octubre 2025	N.A	
3	Instrumento de pesaje No automático	Cznewton CWT22	2018010156	8-oct-25	M-35496-004 R0 20 Octubre 2025	N.A	

OBSERVACIONES:

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: Saúl Alfonso Gómez Angarita
Director de la Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Helwin Gaitán Vargas
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Jose Albero Rojas Prieto
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

Escriba el texto aquí

ANEXO 9: Programa de inversiones
MEPI-MN-IN-6-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** ____ **DE** ____ (Indicar mes y año) **FECHA** 31/08/2026

VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ -

SEGUIMIENTO No. ____
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 001-2025

OBJETO:
"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0754-2026 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: 10 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/04/2026 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/05/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 4.833.792.020,67 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 4.833.792.020,67

PLAZO ACUMULADO: 10 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/03/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 22/06/2026 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) **(B)**: $ -

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	MES 1 (abr-26)								
Construcción Placa Huella Construcción Alcantarillas	$ 4.833.792.020,67	100,00%	$ 1.428.571,43	% P	0,03%								100%
				$ P	$1.428.571								
	$ 4.833.792.020,67	100,00%	$ 1.428.571,43	$ E	$1.428.571,4								
				% E	0,03%								
				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									50%
				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									0%
TOTAL OTROS ITEMS				% P									
				$ P									
				$ E									
				% E									
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.833.792.020,67**	**100,00%**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.833.792.020,67**	**100,00%**											

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,03%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.428.571,43								
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,03%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.428.571,43								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,03%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.428.571								
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,03%								
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.428.571								

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS		$ -	0,00%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS		$ -	50,00%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS		$ -	50,00%
GISAP		$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ -	$ -	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	###############		

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

NOTA:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:
se requiere realizar una reprogramacion al programa de inversiones debido a que el proyecto se suspendio

Aprueba Firma: ____
Nombre:
Representante legal
Contratista

Aprueba Firma: ____
Nombre: KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
Representante legal
Interventoría

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 10: Seguimiento al programa de inversiones
MEPI-MN-IN-6-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/08/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: NORTE DE SANTANDER

PROGRAMA DE INVERSIONES

REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. 1
(Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)

CONTRATO No: 001-2025

OBJETO:

"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0754-2026 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

PLAZO INICIAL: 10 MESES (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/04/2026 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/05/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

PLAZO ACUMULADO: 10 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 22/03/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

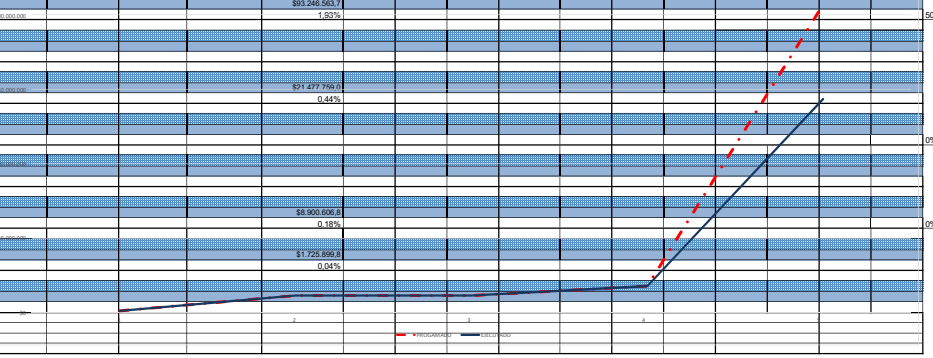
FECHA DE REANUDACIÓN: 22/06/2026 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 4.833.792.020,67 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 4.833.792.020,67

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos		MES 1 abr-26	MES 2 may-26	MES 3 jun-26	MES 4 jul-26	MES 5 ago-26	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 18.000.000,00	0,37%	$18.000.000,00	% P	0,03%	0,21%	0,00%	0,13%						
	$ 18.000.000,00	0,37%	$18.000.000,00	$ P	$1.428.571	$10.238.095	$0	$6.333.333						
				$ E	$1.428.571,4	$10.238.095,2	$0,0	$6.333.333,3						
				% E	0,03%	0,21%	0,00%	0,13%						
PRELIMINARES	$ 578.179.054,75	11,96%	$ -	% P										
	$ 578.179.054,75	11,96%	$ 93.246.563,66	$ P										
				$ E					$93.246.563,7					
				% E					1,93%					
PLACA HUELLA	$ 3.553.421.109,22	73,51%	$ -	% P										
	$ 3.553.421.109,22	73,51%		$ P										
				$ E										
				% E										
OBRAS DE ARTE	$ 501.903.195,12	10,38%	$ -	% P										
	$ 501.903.195,12	10,38%	$ 21.477.759,02	$ P										
				$ E					$21.477.759,0					
				% E					0,44%					
SEÑALIZACION	$ 13.913.644,50	0,29%	$ -	% P										
	$ 13.913.644,50	0,29%		$ P										
				$ E										
				% E										
RETIRO DE SOBRANTES	$ 57.434.130,66	1,19%	$ -	% P										
	$ 57.434.130,66	1,19%		$ P										
				$ E										
				% E										
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)	$ 89.006.067,85	1,84%	$ -	% P										
	$ 89.006.067,85	1,84%	$ 8.900.606,79	$ P										
				$ E					$8.900.606,8					
				% E					0,18%					
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	$ 17.258.998,40	0,36%	$ -	% P										
	$ 17.258.998,40	0,36%	$ 1.725.899,84	$ P										
				$ E					$1.725.899,8					
				% E					0,04%					
CARACTERIZACION VIAL	$ 4.773.313,58	0,10%	$ -	% P										
	$ 4.773.313,58	0,10%		$ P										
				$ E										
				% E										
TOTAL OTROS ITEMS				% P										
				$ P										
				$ E										
				% E										
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	**$ 4.833.792.020,67**	**100,00%**	**$ 18.000.000**											
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 4.833.792.020,67**	**100,00%**												



		MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,03%	0,21%	0,00%	0,13%	3,90%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.428.571	$10.238.095	$0	$6.333.333	$188.714.090					
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	0,03%	0,24%	0,24%	0,37%	4,28%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.428.571	$11.666.667	$11.666.667	$18.000.000	$206.714.090					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	0,03%	0,21%	0,00%	0,13%	2,59%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.428.571	$10.238.095	$0	$6.333.333	$125.350.829					
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	0,03%	0,24%	0,24%	0,37%	2,97%					
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.428.571,43	$11.666.666,67	$11.666.666,67	$18.000.000,00	$143.350.829,30					

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	$ -	$ -	0,00%
COMPLEMENTACION Y/O AJUSTES A DISEÑOS	$ -	$ -	0,00%
VALOR IVA(19%) AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	0,00%
GISAP	$ -	$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)		$ -	0,00%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	**$ 4.833.792.020,67**		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	**$ 4.833.792.020,67**	**$ -**	

NOTAS:

1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en $0.
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

OBSERVACIONES:

De acuerdo al presente informe se evidencia que el procentaje programado se encuentra en un 4,28 % y un ejecutado de 2,97 % de acuerdo a esta reprogramacion, ejecusion que se ha generado deacuerdo al avance de obra ejecuatnadose en el tramo 1, 3 y 4.

Aprueba Firma:
Nombre: KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
Representante legal

Revisó Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Aprueba Firma
Nombre:
Jefe de Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.:

Revisó Firma:
Nombre: ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No: 68202-75786 STD

Firma:
Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE
Director Territorial
Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS

Revisó Firma:
Nombre:
Gestor Técnico de Proyecto
Matrícula Profesional No.:

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE TRABAJO DE OBRA
MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS - REGIMEN PRIVADO

CODIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	1 de
FECHA	22/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: CONVENIO No. 4363 DE 2024. ENC - INVIAS, BENEFICIARIO - MUNICIPIO DE TIBU (NDS), CONTRIBUYENTES - MEDICAL DUARTE ZF SAS Y DUMIAN MEDICAL SAS. PARA EL MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TIBU. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. CODIGO BPIN 20240214000033

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÚCUTA

REGIMEN CONTRACTUAL: PRIVADO (MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS)

CONTRATO PRIVADO DE OBRA No.
001 -2025
CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
0754 DE 2026
CONTRATISTA:
ARA INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL:	10 MESES
FECHA DE INICIO:	20/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/05/2026
FECHA DE REINICIO:	22/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/03/2027
PLAZO ACUMULADO:	10 MESES

VALOR INICIAL	$ 4.833.792.020,67
VALOR ADICIONES	
VALOR ACUMULADO	
PROGRAMA TRABAJO	1

OBJETO DEL CONTRATO: **"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033"**

ANEXO 16 PLAN DE TRABAJO - INICIO DE OBRA

DETALLE DE FLUJO DE INVERSIONES

ITEM O CAPITULO	ACTIVIDAD SEGUN PROGRAMA DE OBRA	UNIDAD	APU CON AIU ($)	CANTIDAD CONTRATO	FACTOR DE TIEMPO	PRESUPUESTO (millones de $)	%		PERIODOS DE PROGRAMACIÓN
								FRACCION PROG INICIAL	20/04/2026
								FRACCION PROG FINAL	26/04/2026
	AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS								
	AJUSTE ESTUDIOS Y DISEÑOS				28	18,00	0,37	P	
									0,05
	Localizacion con GPS - Puntos Georefenrenciados	U	1.500.000,00	1,00	2	1,50	0,031		0,02
	Revisión y concepto de Estudio Topográfico	U	3.000.000,00	1,00	4	3,00	0,062		0,02
	Revisión y concepto de Estudio de Suelos y Geotecnico	U	4.000.000,00	1,00	4	4,00	0,083		0,02
	Revisión y concepto de Estudio y Diseño Geométrico	U	2.250.000,00	1,00	6	2,25	0,047		
	Revisión y concepto de Estudio y Diseño de Pavimento	U	2.250.000,00	1,00	6	2,25	0,047		
	Revisión y concepto de Estudio Hidrologico e Hidraulico	U	5.000.000,00	1,00	6	5,00	0,103		
								E	
	OBRA PLACA HUELLA								
	TRAMO 4 - L=210.00 m - Pr8+290 a Pr8+500								
1	PRELIMINARES				22	108,14	2,24	P	
									0,07
	Excavación sin clasificar en material común a nivel de subrasante	M3	18.156,86	182,03	6	3,31	0,07		0,01
	Terraplen para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m	M3	256.213,65	168,18	5	43,09	0,89		
	Conformación de la subrasante	M2	2.388,20	1.119,66	3	2,67	0,06		
	Relleno compactado con material de prestamo (Sub Base granular) para la conformacion de terraplenes	M3	474.590,12	72,95	4	34,62	0,72		
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CAPITULO Y/O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN								
	Recubrimiento con geotextil no tejido	M2	20.180,86	1.082,15	2	21,84	0,45		
	Excavación mecanica en material rocoso	M3	43.913,06	17,32	1	0,76	0,02		0,02
	Demolición de rocas de sobretamaños	U	1.230.480,99	1,50	1	1,85	0,04		0,04
								E	
2	PLACA HUELLA				61	678,87	14,04	P	
									0,28
	Subbase Granular extendida y compactada	M3	473.854,24	166,44	6	78,87	1,63		
	Excavaciones varias manual sin clasificar	M3	36.080,49	69,80	6	2,52	0,05		
	Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m	ML	160.418,32	376,51	6	60,40	1,25		
	Placa Huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2	279.604,29	462,81	6	129,40	2,68		
	Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.175x0.55 m	ML	220.808,54	421,68	6	93,11	1,93		
	Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m	ML	198.204,38	392,35	6	77,77	1,61		
	Piedra Pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2	202.345,75	319,14	6	64,58	1,34		
	Acero de refuerzo de 60.000 psi para placas, riostras, bordillos, alcantarillas	KG	10.487,09	12.787,16	10	134,10	2,77		0,28
	Solado en Concreto Clase F (2.000 psi)	M2	99.683,71	86,60	6	8,63	0,18		
	Sello de juntas, incluye corte	ML	20.263,56	486,00	2	9,85	0,20		
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CAPITULO Y/O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN								
	Zona de cuce en concreto reforzado. Según Diseño	M2	279.604,29	70,28	1,00	19,65	0,41		
								E	
3	OBRAS DE ARTE				30	40,76	0,84	P	
									0,16
	Relleno compactado con material de sub-base granular	M3	436.148,45	59,00	4	25,73	0,53		
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CAPITULO Y/O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN								
	Tuberia corrugada PVC D=36"	ML	2.879.987,97	0,00	2	0,00	0,00		
	Filtro con material filtrante en triturado de 1". Dimensiones de 0.60x0.60m. Paredes revestidas con geotextil	ML	354.515,73	0,00	3	0,00	0,00		
	Aliviadero para descole de cunetas en concreto de 21 MPA espesor según diseño	ML	439.937,28	12,14	3	5,34	0,11		
	Alcantantarilla - Caja y estructura de entrega en Concreto Clase D (3.000 psi)	M3	1.936.574,86	0,00	3	0,00	0,00		
	Ataguias de costales con suelo para control de erosión	U	91.257,20	0,00	1	0,00	0,00		
	Acometida de agua de la toma al sitio de Obra por 10 meses de trabajo	ML	27.911,92	269,32	1	7,52	0,16		0,16
	Bombeo de aguas por escorrentías e inundaciones	Hr	57.944,67	37,40	10	2,17	0,04		
	Limpieza de alcantarillas existentes	U	349.864,87	0,00	1	0,00	0,00		
	Demolición de estructuras de concreto reforzado	M3	267.947,86	0,00	1	0,00	0,00		
	Remoción de alcantarillas	ML	105.582,10	0,00	1	0,00	0,00		
								E	
4	SEÑALIZACIÓN VIAL				2	1,99	0,04	P	
									0,00
	Suministro e instalacion de señalizacion vertical	UND	993.831,75	2,00	2	1,99	0,04		
								E	
5	RETIRO DE SOBRANTES				10	10,74	0,22	P	
									0,02
	Disposicion final de material en (Escombrera municipal y/o sitio establecido por municipio)	M3-KM	1.784,77	6.018,67	10	10,74	0,22		0,02
								E	

| | | | | | | | | |

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE TRABAJO DE OBRA
MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS - REGIMEN PRIVADO

CODIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	1 de
FECHA	22/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: CONVENIO No. 4363 DE 2024. ENC - INVIAS, BENEFICIARIO - MUNICIPIO DE TIBU (NDS), CONTRIBUYENTES - MEDICAL DUARTE ZF SAS Y DUMIAN MEDICAL SAS. PARA EL MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TIBU. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. CODIGO BPIN 20240214000033

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÚCUTA

REGIMEN CONTRACTUAL: PRIVADO (MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS)

CONTRATO PRIVADO DE OBRA No.
001 -2025
CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
0754 DE 2026
CONTRATISTA:
ARA INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL:	10 MESES
FECHA DE INICIO:	20/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/05/2026
FECHA DE REINICIO:	22/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/03/2027
PLAZO ACUMULADO:	10 MESES

VALOR INICIAL	$ 4.833.792.020,67
VALOR ADICIONES	
VALOR ACUMULADO	
PROGRAMA TRABAJO	1

OBJETO DEL CONTRATO: **"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033"**

ANEXO 16 PLAN DE TRABAJO - INICIO DE OBRA

DETALLE DE FLUJO DE INVERSIONES

ITEM O CAPITULO	ACTIVIDAD SEGUN PROGRAMA DE OBRA	UNIDAD	APU CON AIU ($)	CANTIDAD CONTRATO	FACTOR DE TIEMPO	PRESUPUESTO (millones de $)	%		PERIODOS DE PROGRAMACIÓN
								FRACCION PROG INICIAL	20/04/2026
								FRACCION PROG FINAL	26/04/2026
	TRAMO 3 - L=99,5 m - Pr7+342,78 a Pr7+437,78								-
1	PRELIMINARES				12	48,92	1,01	P	
									0,00
	Excavación sin clasificar en material común a nivel de subrasante	M3	18.156,86	82,35	3	1,50	0,03		
	Terraplen para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m	M3	256.213,65	76,08	2	19,49	0,40		
	Conformación de la subrasante	M2	2.388,20	506,51	1	1,21	0,03		
	Relleno compactado con material de prestamo (Sub Base granular) para la conformacion de terraplenes	M3	474.590,12	33,01	2	15,67	0,32		
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CAPITULO Y/O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN								
	Recubrimiento con geotextil no tejido	M2	20.180,86	489,55	2	9,88	0,20		
	Excavación mecanica en material rocoso	M3	43.913,06	7,84	1	0,34	0,01		
	Demolición de rocas de sobretamaños	U	1.230.480,99	0,68	1	0,84	0,02		
								E	
2	PLACA HUELLA				33	287,17	5,94	P	
									0,00
	Subbase Granular extendida y compactada	M3	473.854,24	75,29	3	35,68	0,74		
	Excavaciones varias manual sin clasificar	M3	36.080,49	31,57	3	1,14	0,02		
	Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m	ML	160.418,32	170,33	3	27,32	0,57		
	Placa Huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2	279.604,29	209,37	3	58,54	1,21		
	Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.175x0.55 m	ML	220.808,54	190,76	3	42,12	0,87		
	Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m	ML	198.204,38	177,49	5	35,18	0,73		
	Piedra Pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2	202.345,75	79,79	3	16,15	0,33		
	Acero de refuerzo de 60.000 psi para placas, riostras, bordillos, alcantarillas	KG	10.487,09	5.784,68	3	60,66	1,25		
	Solado en Concreto Clase F (2.000 psi)	M2	99.683,71	39,18	3	3,91	0,08		
	Sello de juntas, incluye corte	ML	20.263,56	319,25	3	6,47	0,13		
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CAPITULO Y/O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN								
	Zona de cuce en concreto reforzado. Según Diseño	M2	279.604,29	0,00	1	0,00	-		
								E	
3	OBRAS DE ARTE				25	55,33	1,14	P	
									0,00
	Relleno compactado con material de sub-base granular	M3	436.148,45	27,36	4	11,93	0,25		
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CAPITULO Y/O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN								
	Tuberia corrugada PVC D=36"	ML	2.879.987,97	0,00	1	0,00	0,00		
	Filtro con material filtrante en triturado de 1". Dimensiones de 0.60x0.60m. Paredes revestidas con geotextil	ML	354.515,73	95,00	2	33,68	0,70		
	Aliviadero para descole de cunetas en concreto de 21 MPA espesor según diseño	ML	439.937,28	12,14	3	5,34	0,11		
	Alcantantarilla - Caja y estructura de entrega en Concreto Clase D (3.000 psi)	M3	1.936.574,86	0,00	3	0,00	0,00		
	Ataguias de costales con suelo para control de erosión	U	91.257,20	0,00	1	0,00	0,00		
	Acometida de agua de la toma al sitio de Obra por 10 meses de trabajo	ML	27.911,92	121,84	1	3,40	0,07		
	Bombeo de aguas por escorrentías e inundaciones	Hr	57.944,67	16,92	7	0,98	0,02		
	Limpieza de alcantarillas existentes	U	349.864,87	0,00	1	0,00	0,00		
	Demolición de estructuras de concreto reforzado	M3	267.947,86	0,00	1	0,00	0,00		
	Remoción de alcantarillas	ML	105.582,10	0,00	1	0,00	0,00		
								E	
4	SEÑALIZACIÓN VIAL				2	1,99	0,04	P	
									0,00
	Suministro e instalacion de señalizacion vertifical	UND	993.831,75	2,00	2	1,99	0,04		
5	RETIRO DE SOBRANTES				8	4,86	0,10	P	
									0,00
	Disposicion final de material en (Escombrera municipal y/o sitio establecido por municipio)	M3-KM	1.784,77	2.722,74	8	4,86	0,10		
								E	
	TRAMO 2 - L=419.96 m - Pr5+435 a Pr5+854,96								-
1	PRELIMINARES				22	216,25	4,47	P	
									0,00
	Excavación sin clasificar en material común a nivel de subrasante	M3	18.156,86	364,03	4	6,61	0,14		
	Terraplen para mejoramiento extendido y compactado e=0,15m	M3	256.213,65	336,34	4	86,17	1,78		
	Conformación de la subrasante	M2	2.388,20	2.239,10	4	5,35	0,11		
	Relleno compactado con material de prestamo (Sub Base granular) para la conformacion de terraplenes	M3	474.590,12	145,91	4	69,25	1,43		
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CAPITULO Y/O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN								
	Recubrimiento con geotextil no tejido	M2	20.180,86	2.164,10	4	43,67	0,90		
	Excavación mecanica en material rocoso	M3	43.913,06	34,65	1	1,52	0,03		
	Demolición de rocas de sobretamaños	U	1.230.480,99	2,99	1	3,68	0,08		
								E	

27/04/2026	4/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	1/06/2026	8/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	6/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	3/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	2/11/2026	9/11/2026	16/11/2026	23/11/2026	30/11/2026	7/12/2026	14/12/2026	21/12/2026	28/12/2026	4/01/2027	11/01/2027	18/01/2027	25/01/2027	1/02/2027	8/02/2027	15/02/2027	22/02/2027	1/03/2027	8/03/2027	15/03/2027
3/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	7/06/2026	14/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	5/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	26/07/2026	2/08/2026	9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026	8/11/2026	15/11/2026	22/11/2026	29/11/2026	6/12/2026	13/12/2026	20/12/2026	27/12/2026	3/01/2027	10/01/2027	17/01/2027	24/01/2027	31/01/2027	7/02/2027	14/02/2027	21/02/2027	28/02/2027	7/03/2027	14/03/2027	22/03/2027
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	0,48	0,52	0,22	0,22	1,96	2,00	2,28	0,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	-
																				0,01	0,01	0,01																							
																				0,20	0,20																									
																					0,025																									
																				0,16	0,16																									
																				0,10	0,10																									
																			0,01																											
																			0,02																											
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15	1,88	1,88	1,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																								0,25	0,25	0,25																				
																								0,01	0,01	0,01																				
																								0,19	0,19	0,19																				
																								0,40	0,40	0,40																				
																								0,29	0,29	0,29																				
																						0,15	0,15	0,15	0,15	0,15																				
																								0,11	0,11	0,11																				
																								0,42	0,42	0,42																				
																								0,03	0,03	0,03																				
																								0,04	0,04	0,04																				
																									0,00																						
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,10	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																						0,06	0,06	0,06	0,06																					
																					0,00																									
																										0,35	0,35																			
																									0,04	0,04	0,04																			
																			0,07																											
																					0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003																			
																			0,00																											
																			0,00																											
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	
																																											0,02	0,02	
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01																				
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,46	0,03	0,52	0,93	1,51	1,19	1,52	2,18	1,59	1,59	1,59	1,59	1,59	2,41	1,59	3,36	3,40	3,94	3,92	-	-	-	-	-	-	0,04	0,04	-
														0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,00	0,03	0,51	1,09	1,09	1,06	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																					0,034	0,034	0,034	0,034																					
																						0,45	0,45	0,45	0,45																					
																						0,03	0,03	0,03	0,03																					
																							0,36	0,36	0,36	0,36																					
																							0,23	0,23	0,23	0,23																					
																			0,03																											
																			0,08																											

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE TRABAJO DE OBRA
MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS - REGIMEN PRIVADO

CODIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	1 de
FECHA	22/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: CONVENIO No. 4363 DE 2024. ENC - INVIAS, BENEFICIARIO - MUNICIPIO DE TIBU (NDS), CONTRIBUYENTES - MEDICAL DUARTE ZF SAS Y DUMIAN MEDICAL SAS. PARA EL MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TIBU. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. CODIGO BPIN 20240214000033

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÚCUTA

REGIMEN CONTRACTUAL: PRIVADO (MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS)

CONTRATO PRIVADO DE OBRA No.
001 -2025
CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
0754 DE 2026
CONTRATISTA:
ARA INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL:	10 MESES
FECHA DE INICIO:	20/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/05/2026
FECHA DE REINICIO:	22/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/03/2027
PLAZO ACUMULADO:	10 MESES

VALOR INICIAL	$ 4.833.792.020,67
VALOR ADICIONES	
VALOR ACUMULADO	
PROGRAMA TRABAJO	1

OBJETO DEL CONTRATO: **"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033"**

ANEXO 16 PLAN DE TRABAJO - INICIO DE OBRA

DETALLE DE FLUJO DE INVERSIONES

ITEM O CAPITULO	ACTIVIDAD SEGUN PROGRAMA DE OBRA	UNIDAD	APU CON AIU ($)	CANTIDAD CONTRATO	FACTOR DE TIEMPO	PRESUPUESTO (millones de $)	%		PERIODOS DE PROGRAMACIÓN
								FRACCION PROG INICIAL	20/04/2026	27/04/2026	4/05/2026	11/05/2026	18/05/2026	25/05/2026	1/06/2026	8/06/2026	15/06/2026	22/06/2026	29/06/2026	6/07/2026	13/07/2026	20/07/2026	27/07/2026	3/08/2026	10/08/2026	17/08/2026	24/08/2026	31/08/2026	7/09/2026	14/09/2026	21/09/2026	28/09/2026	5/10/2026	12/10/2026	19/10/2026	26/10/2026	2/11/2026	9/11/2026	16/11/2026	23/11/2026	30/11/2026	7/12/2026	14/12/2026	21/12/2026	28/12/2026	4/01/2027	11/01/2027	18/01/2027	25/01/2027	1/02/2027	8/02/2027	15/02/2027	22/02/2027	1/03/2027	8/03/2027	15/03/2027
								FRACCION PROG FINAL	26/04/2026	3/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	7/06/2026	14/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	5/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	26/07/2026	2/08/2026	9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026	8/11/2026	15/11/2026	22/11/2026	29/11/2026	6/12/2026	13/12/2026	20/12/2026	27/12/2026	3/01/2027	10/01/2027	17/01/2027	24/01/2027	31/01/2027	7/02/2027	14/02/2027	21/02/2027	28/02/2027	7/03/2027	14/03/2027	22/03/2027
2	PLACA HUELLA				96	1330,52	27,52	P																																													
																								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	1,56	2,38	1,56	3,33	3,33	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subbase Granular extendida y compactada	M3	473.854,24	332,84	12	157,72	3,26																												0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,272	0,27										
	Excavaciones varias manual sin clasificar	M3	36.080,49	139,58	12	5,04	0,10																												0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01										
	Viga riostra en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.20x0.30 m	ML	160.418,32	752,95	12	120,79	2,50																												0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21										
	Placa Huella en Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2	279.604,29	925,53	12	258,78	5,35																												0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45										
	Bordillo en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.175x0.55 m	ML	220.808,54	843,29	4	186,21	3,85																																				0,96	0,96	0,96	0,96										
	Cuneta en Concreto Clase D (3.000 psi). Dimensiones de 0.55x0.15 m	ML	198.204,38	784,62	4	155,52	3,22																																				0,80	0,80	0,80	0,80										
	Piedra Pegada sobre placa de Concreto Clase D (3.000 psi). Espesor e=0.15 m	M2	202.345,75	490,61	12	99,27	2,05																												0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17										
	Acero de refuerzo de 60.000 psi para placas, riostras, bordillos, alcantarillas	KG	10.487,09	25.571,89	13	268,17	5,55																												0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43										
	Solado en Concreto Clase F (2.000 psi)	M2	99.683,71	173,19	12	17,26	0,36																												0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03										
	Sello de juntas, incluye corte	ML	20.263,56	1.108,92	2	22,47	0,46																																								0,23	0,23										
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CAPITULO Y/O CAMBIO DE ESPECIFICACION																																																											
	Zona de cuce en concreto reforzado. Según Diseño	M2	279.604,29	140,54	1	39,30	0,81																																									0,813											
								E																																																					
3	OBRAS DE ARTE				34	119,12	2,46	P																																																										
																								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,01	0,46	0,39	0,39	0,07	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Relleno compactado con material de sub-base granular	M3	436.148,45	140,56	4	61,31	1,27																		

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA
PLAN DE TRABAJO DE OBRA
MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS - REGIMEN PRIVADO

CODIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
VERSION	1
PÁGINA	1 de
FECHA	22/07/2026

UNIDAD EJECUTORA: CONVENIO No. 4363 DE 2024. ENC - INVIAS, BENEFICIARIO - MUNICIPIO DE TIBU (NDS), CONTRIBUYENTES - MEDICAL DUARTE ZF SAS Y DUMIAN MEDICAL SAS. PARA EL MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA DEL MUNICIPIO DE TIBU. DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. CODIGO BPIN 20240214000033

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÚCUTA

REGIMEN CONTRACTUAL: PRIVADO (MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS)

CONTRATO PRIVADO DE OBRA No.
001 -2025
CONTRATISTA:
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
0754 DE 2026
CONTRATISTA:
ARA INGENIERIA SAS

PLAZO INICIAL:	10 MESES
FECHA DE INICIO:	20/04/2026
FECHA DE SUSPENSIÓN:	20/05/2026
FECHA DE REINICIO:	22/06/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN:	18/03/2027
PLAZO ACUMULADO:	10 MESES

VALOR INICIAL	$ 4.833.792.020,67
VALOR ADICIONES	
VALOR ACUMULADO	
PROGRAMA TRABAJO	1

OBJETO DEL CONTRATO: **"MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033"**

ANEXO 16 PLAN DE TRABAJO - INICIO DE OBRA

DETALLE DE FLUJO DE INVERSIONES

ITEM O CAPITULO	ACTIVIDAD SEGUN PROGRAMA DE OBRA	UNIDAD	APU CON AIU ($)	CANTIDAD CONTRATO	FACTOR DE TIEMPO	PRESUPUESTO (millones de $)	%		PERIODOS DE PROGRAMACIÓN
								FRACCION PROG INICIAL	20/04/2026
								FRACCION PROG FINAL	26/04/2026
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CAPITULO Y/O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN								
	Zona de cuce en concreto reforzado. Según Diseño	M2	279.604,29	140,54	1	39,30	0,81	E	
3	OBRAS DE ARTE				39	286,69	5,93	P	
	Relleno compactado con material de sub-base granular	M3	436.148,45	176,68	4	77,06	1,59		
	ACTIVIDADES NO PREVISTAS EN EL CAPITULO Y/O CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN								
	Tubería corrugada PVC D=36"	ML	2.879.987,97	18,00	2	51,84	1,07		
	Filtro con material filtrante en triturado de 1". Dimensiones de 0.60x0.60m. Paredes revestidas con geotextil	ML	354.515,73	270,00	3	95,72	1,98		
	Aliviadero para descole de cunetas en concreto de 21 MPA espesor según diseño	ML	439.937,28	0,00	0	0,00	0,00		
	Alcantarilla - Caja y estructura de entrega en Concreto Clase D (3.000 psi)	M3	1.936.574,86	15,51	4	30,04	0,62		
	Ataguias de costales con suelo para control de erosión	U	91.257,20	150,00	2	13,69	0,28		
	Acometida de agua de la toma al sitio de Obra por 10 meses de trabajo	ML	27.911,92	510,24	1	14,24	0,29		
	Bombeo de aguas por escorrentías e inundaciones	Hr	57.944,67	70,87	15	4,11	0,08		
	Limpieza de alcantarillas existentes	U	349.864,87	0,00	0	0,00	0,00		
	Demolición de estructuras de concreto reforzado	M3	267.947,86	0,00	0	0,00	0,00		
	Remoción de alcantarillas	ML	105.582,10	0,00	0	0,00	0,00		
								E	
4	SEÑALIZACIÓN VIAL				2	5,96	0,12	P	
	Suministro e instalacion de señalizacion vertifical	UND	993.831,75	6,00	2	5,96	0,12		
								E	
5	RETIRO DE SOBRANTES				15	20,35	0,42	P	
	Disposicion final de material en (Escombrera municipal y/o sitio establecido por municipio)	M3-KM	1.784,77	11.402,52	15	20,35	0,42		
								E	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL								
	PMA				32	89,01	1,84	P	
	Plan de Manejo Ambiental	U	89.006.067,85	1,00	32	89,01	1,84		
								E	
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO								
	PMT				32	17,26	0,36	P	
	Plan de Manejo de Transito	U	17.258.998,40	1,00	32	17,26	0,36		
								E	
	CARACTERIZACION VIAL								
	CARACTERIZACION DE LA VIA				4	4,77	0,10	P	
	Caracterización de la vía	U	4.773.313,58	1,00	4	4,77	0,10		
								E	
	TOTAL DEL PROYECTO				501	4833,89	100,00	SP	0,00
								SPA	0,00
								SE	0,00
								SEA	0,00

	27/04/2026	3/05/2026	10/05/2026	17/05/2026	24/05/2026	31/05/2026	7/06/2026	14/06/2026	21/06/2026	28/06/2026	5/07/2026	12/07/2026	19/07/2026	26/07/2026	2/08/2026	9/08/2026	16/08/2026	23/08/2026	30/08/2026	6/09/2026	13/09/2026	20/09/2026	27/09/2026	4/10/2026	11/10/2026	18/10/2026	25/10/2026	1/11/2026	8/11/2026	15/11/2026	22/11/2026	29/11/2026	6/12/2026	13/12/2026	20/12/2026	27/12/2026	3/01/2027	10/01/2027	17/01/2027	24/01/2027	31/01/2027	7/02/2027	14/02/2027	21/02/2027	28/02/2027	7/03/2027	14/03/2027	22/03/2027
																																						0,813										
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,54	1,08	0,70	0,56	0,56	0,16	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,66	0,66	0,66	0,00	
																													0,40	0,40	0,40	0,40																
																												0,54	0,54																					
																																													0,66	0,66	0,66		
																														0,16	0,16	0,16	0,16															
																													0,14	0,14																			
																											0,29																						
																												0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06		
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06		
																											0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
																											0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03						
															0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	-
															0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
															0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	
															0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-
															0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
															0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	
															-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02	0,02	0,02	0,02	-
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	
																																													0,02	0,02	0,02	0,02	
SP	0,00	0,05	0,05	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,03	0,59	0,92	1,12	0,89	2,67	3,10	2,66	3,59	3,34	3,92	3,26	3,58	4,99	2,67	3,80	3,82	3,68	3,63	4,35	3,38	5,15	5,19	5,73	6,62	3,57	3,47	3,60	3,57	0,88	0,75	0,90	0,24	
SPA	0,00	0,05	0,10	0,17	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,24	0,27	0,31	0,34	0,37	0,96	1,88	3,00	3,90	6,56	9,66	12,32	15,91	19,25	23,17	26,43	30,01	35,00	37,67	41,47	45,29	48,98	52,60	56,96	60,34	65,49	70,68	76,41	83,03	86,60	90,06	93,66	97,23	98,11	98,87	99,76	100,00	
SE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0,023 0,363

MES	PROG	EJECUT
0	0,00	0,00
1	0,37	0,20
2	0,37	0,38
3	4,28	4,30
4	17,34	
5	34,29	
6	49,49	
7	68,46	
8	90,06	
9	98,87	
10	100,00	



CURVA DE TRABAJO

CONVENCIONES:

SP	SEMANAL PROGRAMADA
SPA	SEMANAL ACUMULADA
SE	SEMANAL EJECUTADA
SEA	EJECUTADA ACUMULADA

OBSERVACIONES:
Este documento se formula para el acta de reinicio de obra No. 1, sujeto a revisión de resultados ajuste E&D

ING. SAUL ALFONSO GOMEZ ANGARITA
Contratista de obra

ING. JOSE ALBERTO ROJAS
Director de Interventoria

PEDRO CALEB RODRIGUEZ IBARRA
Coordinador de Gerencia

ANEXO 11: Acta comité de obra
MEPI-MN1-IN-14-FR-1

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 6/08/2026
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 1
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 001-2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU,DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0754-2026
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
Primer comité de obra semanal a realizar.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
• Inicio de obra. • Contratación de personal de obra. • Contratación de maquinaria amarilla para inicios.

FECHA: 6/08/2026
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA
Se le pide al contratista de obra agilizar lo más pronto posible la ejecución de las obras para la realización de la obra de placa huella, ya que estaría incurriendo en un retraso a la programación de obra emitida por el contratista. La comunidad aprobó la realización del proyecto presentado por el contratista y permite la ejecución de dicha obra, la interventoría pide los pasos a seguir en la contratación de los maestros y mano de obra no calificada en la zona, para dar inicio a obra. En la programación emitida por el contratista indica el movimiento de tierra para las nivelaciones del terreno y requiere maquinaria pesada para dar inicio, dicha maquinaria aún no se ve en el lugar de trabajo.
Se informa a la interventoria que :
El contratista ya ha instalado en la zona parte de su equipo tecnico a saber: Residente de obra, trabajador social y profesional Siso. En la actualidad se desarrollan las actas de vecindad como primera actividad.
Asi mismo ya se recibio un camion con materiales y equipos que se utilizaran en obra como herramientas, mezcladora, canguro, tanques, plantas, vibrador, estibas, mangueras etc
Ya llego tambien la comision de tpografia quien empezo labores de replanteo de los tramos para implantar los diseños en el plano con la informacion actual del terreno. A la fecha se hizo levantamiento y nivelacion de tramos 3 y 4
En la zona se hacen contactos con volqueteros y transportadores para definir precios y oferta de vehiculos para este trabajo.
Se tomaron muestras de materiales que se enviaron al laboratorio. Esto son materiales que se encuentran en la zona y se quiere comprobar si nos pueden servir como el material para mejoramiento, subbase etc.
Se recibieron cotizaciones de mano de Obra y se evalua conjuntamente la persona que nos puede colaborar como maestro de obra. Se selecciona al señor Ramon Rivera
Se reciben hojas de vida de aspirantes de la zona a oficiales y obreros para trabajar en la placa huella. Se revisan con el maestro
Una vez la comision de topografia termine la nivelacion de los tramos empezamos con la maquinaria los trabajos de excavacion y conformacion de subrasante.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
Inicio de obra.	28/07/2026	Residente de obra
Recepción de hojas de vida del personal de obra.	1/08/2026- 15/08/2026	Trabajador Social - Siso
Contratación de maquinaria pesada.	13/08/2026	Residente de obra

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 13/08/2026
(Día / Mes / Año)

FECHA: 6/08/2026 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alexis Rodriguez Baron	RESIDENTE INTERVENTORIA	ARA INGENIERIA SAS	
Chirley Karina Rivera Calvo	PROFESIONAL SOCIAL	ARA INGENIERIA SAS	
Yenifer Liseth Orozco	PROFESIONAL SST	ARA INGENIERIA SAS	
Gladys Teresa Landazabal Granados	RESIDENTE OBRA	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	
Jennifer Katherine Hernandez Dias	PROFESIONAL SST	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	
Diego andres Medellin Diaz	PROFESIONAL SOCIAL	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA: 13/08/2026
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 2
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 001-2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU,DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0754-2026
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

Segundo comité de obra semanal a realizar, nos encontramos reunidos el día 13 de agosto del presente año para dar apertura a los avances en la ejecución de la obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

- Inicio de obra.
- Contratación de maquinaria amarilla para inicios.
- verificasion de PMT en campo.

FECHA: 13/08/2026 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

se inician labores en campo en el tramo 4 de la placa huella con excavaciones y nivelacion.

se le pide al contratista remitir las actas de vecindad realizadas para que la interventoria realice la revison correspondiente.

Debido a que iniciaron trabajos con maquinaria pesada se le solicita el contratista en viar la documentacion correspondiente.

Devido a las nivelaciones que se estan realizando se recomienda realizar compactacion a cota de rasante antes de iniciar con el material de mejoramiento.

Se informa a la interventoria que la maquinaria empezo a trabajar hoy en la excavacion, ancho de via y conformacion de subrasante del tramo 4. Estos trabajos se iniciaron con retroexcavadora debido a que la motoniveladora y el vibrocompactador estaran llegando la proxima semana por compromisos ya adquiridos con el equipo en la zona. Ya se ha solicitado al proveedor de la maquinaria la documentacion correspondiente y ellos se comprometen a enviarlo la proxima semana.

Con referencia a las actas de vecindad ya se tiene previsto enviar la informacion requerida una vez se complete la informacion faltante debido a que los dueños de predios pendientes no estan en la zona y hay que esperarlos.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Actas de vecindad	19/08/2026	Trabajador social
Documentacion de maquinaria pesada	20/08/2026	Residente de obra

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 20/08/2026 (Día / Mes / Año)






NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alexis Rodríguez Barón	RESIDENTE INTERVENTORIA	ARA INGENIERIA SAS	
Chirley Karina Rivera Calvo	PROFESIONAL SOCIAL	ARA INGENIERIA SAS	
Yenifer Liseth Orozco	PROFESIONAL SST	ARA INGENIERIA SAS	
Gladys Teresa Landazabal Granados	RESIDENTE OBRA	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	
Jennifer Katherine Hernandez Díaz	PROFESIONAL SST	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	
Diego Andrés Medellín Díaz	PROFESIONAL SOCIAL	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE COMITÉ DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 3

FECHA: 20/08/2026
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 001-2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU,DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0754-2026
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
tercer comité de obra semanal a realizar, nos encontramos reunidos el día 20 de agosto del presente año para dar apertura a los avances en la ejecución de la obra.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA
• Inicio de construcción de placa huella y alcantarillas. • Densidades al terreno de sub-rasante. • Entrega completa de actas de vecindad. • Documentación pertinente de la maquinaria que ha ingresado a la intervención de la obra.

FECHA: 20/08/2026 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Teniendo en cuneta que ya se inicio obra de ejecucion en el tramo 4 del proyecto caño victoria, de acuerdo a la programacion remitida y aprobada por esta interventoria, el contratista empieza a tener un atrado del 2% de la ejecucion. Se le pide la contratacion urgente de mano de obra no calificada para dar inicio a los trabajos de placa huella.

Debido a que se ha relizado nivelacones con moto niveladora y se ha removido una capa en la sub-rasante, se le pide al contratista realizar densidades a este mismo, a pesar que se evidencia una compactacion con un vibrocompactador, es necesario que certifique un laboratorio, que la estructura narutal este debidamente compactado para su porterior mejoramiento.

Se recibio parte de la documentacion de las actas de vecindad, pero aun hace falta realizar su totalidad, se le pide al contratista remitir las actas faltantes a esta interventoria.

se evidencia ingreso de nueva maquinaria amarilla a la obra, especificamente en el tramo 4, se pide al contratista remitir la documentacion correspondiente a esta" planilla de seguridad a los conductores, preoperacionales de la maqinari y documentacion de la maquinaria" para ser avalado por la interventoria.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Actas de vecindad completas	27/08/2026	
Documentacion de maquinaria pesada	28/08/2026	
Densidades en campo	31/08/2026	

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 27/08/2026 (Día / Mes / Año)

FECHA: 20/08/2026 (Día / Mes / Año)







NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alexis Rodríguez Barón	RESIDENTE INTERVENTORIA	ARA INGENIERIA SAS	
Chirley Karina Rivera Calvo	PROFESIONAL SOCIAL	ARA INGENIERIA SAS	
Yenifer Liseth Orozco	PROFESIONAL SST	ARA INGENIERIA SAS	
Gladys Teresa Landazabal Granados	RESIDENTE OBRA	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	
Jennifer Katherine Hernandez Díaz	PROFESIONAL SST	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	
Diego Andrés Medellín Díaz	PROFESIONAL SOCIAL	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

FECHA: 27/08/2026
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. 4
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 001-2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU,DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0754-2026
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
visita interventoria segridad y salud en el trabajo seguimiento de actividades, al siso contratista

seguimiento sst contratista
• Seguimiento periódico a la ejecución de obra. • Se pide al contratista suministrar los resultados de los ensayos de laboratorio. • Revisión de documentación SST al contratista y a recomendaciones que se habían dado la visita anterior.

FECHA: 27/08/2026 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Técnico: se ha realizado densidades al tramo 3 y 4 a la espera que entreguen resultados de laboratorio.
Se está iniciando un atraso del 2% de acuerdo a la programación de obra, se pide tener un rendimiento mayor para evitar un futuro atraso considerable.

SST: en visita realizada por parte de la interventoría en SST se da inicio a la revisión de la papelería formatos y demás documentación del contratista. Entre la documentación revisada se encuentra: formatos de ATS para máquinas y herramientas de mano (palas, picas etc.) encuesta de perfil sociodemográfico, encuesta de movilidad sentida, inducción y reinducción, políticas sst, listado de asistencia diario. plan de emergencia. pre operacionales de máquinas y herramientas.
debido a que la obra ya está empezando también se le pidió a SST contratista: botiquín de primeros auxilios (fijo y portátil) puntos ecológicos (canecas verde, azul y gris) puntos de hidratación ya que estamos en una zona muy calurosa y debemos evitar un golpe de calor o alguna enfermedad por las altas temperaturas. dotación de los trabajadores. EPP (guantes, cascos. lentes etc.)
se dejó como recomendación realizar la inducción de los trabajadores y pausas activas antes de ingresar a las labores (calistenia) charlas de seguridad en los frentes de trabajo.
se va evidenciando el ingreso de más trabajadores.
personal en obra: obreros 3. maestro: 1, oficial: 1. maquinistas: 3 (retro, vibro, motoniveladora), topógrafo: 1, cadenero: 1. contratista: Ing. residente, social, siso.
recomendaciones: se recomienda al contratista cumplir con las recomendaciones dadas por interventoría.

El residente de obra del contratrista manifiesta que los resultados de las densidades se daran a conocer una vez el laboratorio de suelos envie los resultados correspondientes.

Con referencia a las demas solicitudes nuestra profesional Siso esta gestionando todos y cada uno de los requerimientos hechos por la interventoria a fin de dar cumplimiento a estos aspectos antes de iniciar de lleno de todas las actividades con personal de obra.

Se esta preparando una induccion para los trabajadores para la proxima semana.
Igualmente se informa que estamos recopilando la informacion con referencia a las tallas de los trabajadores para coordinar el envio y entrega

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
entrega de resutados de las densidades del tramo 3 y 4.	Cuando se entreguen por parte del laboratorio	residente de obra
induccion a los trabajadores	Proxima semana	sst obra
documentacion diaria	15 de sep	sst obra
realizar adecuacion de puntos	18/09/2026	sst obra
epp, dotacion	18/09/2026	sst obra
orden y aseo	todos los viernes en la tarde	sst obra

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 3/08/2026 (Día / Mes / Año)




NOTAS:

1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.

2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Alexis Rodríguez Barón	RESIDENTE INTERVENTORIA	ARA INGENIERIA SAS	
Chirley Karina Rivera Calvo	PROFESIONAL SOCIAL	ARA INGENIERIA SAS	
Yenifer Liseth Orozco	PROFESIONAL SST	ARA INGENIERIA SAS	
Gladys Teresa Landazabal Granados	RESIDENTE OBRA	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	
Jennifer Katherine Hernandez Díaz	PROFESIONAL SST	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	
Diego Andrés Medellín Díaz	PROFESIONAL SOCIAL	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

ANEXO 12: Actas de reunión
MEPI-MN-IN-14-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/08/2026 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 3
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. 001-2025
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU,DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 0754-2026
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Reunión de seguimiento contractual del convenio No 4363 de 2024, para conocer el avance de las obligaciones técnicas, sociales y administrativas del contrato de obra objeto del proyecto, que se ejecuta en la via terciaria a la vereda Caño Victoria del municipio de Tibu, Norte de Santander.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- La comunidad aceptó parámetros técnicos de los estudios y diseños presentadpos por el contratista de obra.
- El anticipo del contrato de Interventoria no se ha tramitado por parte de la fiducia, tiene cuatro (4) meses en tramite.
- tramite de actas de costos del contrato de interventoria pendiente de pago, debido a que en estas se amortiza el anticipo no desembolsado.
- Necesidad de corregir los documentos del PGEOM presentado por el contratista de obra.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Resultado de la socialización comunitaria:
El contratista informó que con la socialización realizada se logró que la comunidad entendiera los parámetros técnicos del proyecto, incluyendo el límite de 28 toneladas del peso maximo del vehiculo de diseño C3 y por lo tanto la comunidad firmó la segunda acta de socialización, lo que permitió avanzar en la aceptación social del proyecto.

Avances técnicos, materiales y actos administrativos:
Se revisaron hallazgos técnicos: evaluación de material presentado por el contratista de obra: material de relleno (apto como relleno, no como subbase) y propuesta de mezcla de suelos para base, compra y traslado de tuberías para alcantarillas, adquisición de señalización y equipos, y envío del acta de modificación de obra y del plan de trabajo reajustado a la interventoría.

A**ctas de vecindad, PGEOM y logística operativa:**
Se reportó levantamiento y consolidación de actas de vecindad, la realización de videos en predios sin vivienda, la entrega próxima del plan social y actas a la interventoría, el envío del PGEOM para análisis, contactos con transportistas y proveedores de material pétreo y la planificación del abastecimiento de agua con tanques, mangueras y bomba.

Información de topografía en terreno
Se informó que en terreno ya está la comisión de topografía, se realizó el levantamiento inicial del tramo cuatro y se definieron anchos y nivelaciones; con esos datos se producirán las carteras de corte y relleno necesarias antes del inicio.

Estado del anticipo y trámites asociados
Se explicó que la documentación requerida para el desembolso del anticipo del contrato de interventoría ya fue presentada en su totalidad ante la fiducia por parte de la gerencia del proyecto OXI. Por lo tanto la demora presentada es responsabilidad de la fiducia, de quienes se espera lo desembolsen lo antes posible y poder asi, tambien tramitar las tres actas de costos pendientes para pago, las cuales ya fueron aprobadas por el supervisor. La SVR recomienda, que si el desembolso del anticipo no se realiza en los proximos dias, se tramiten dichas sin amortizar el anticipo, para que no se vea afectada la interventoria.

COMPROMISOS PACTADOS	**FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)**	**RESPONSABLES**
No se establecieron compromisos.		

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE REUNIÓN**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 3/08/2026 (Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 7/09/2026 (Dia / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.


LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:


NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
PEDRO RODRIGUEZ IBARRA	GERENTE PROYECTO	MUNICIPIO DE TIBU	ASISTENCIA VIRTUAL
ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO	SUPERVISOR	DT NSA - INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL
ADRIAN JOSE ARIAS	APOYO A LA SUPERVISION	SVR - INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL
JOSE ALBERTO ROJAS	DIRECTOR INTERVENTORIA	ARA INGENIERIA SAS	ASISTENCIA VIRTUAL
EMEL ATUESTA ROJAS	SECRETARIA DE VIAS	MUNICIPIO DE TIBU	ASISTENCIA VIRTUAL
KERLY CUELLAR OBREGON	REPRESENTANTE LEGAL	ARA INGENIERIA SAS	ASISTENCIA VIRTUAL
SAUL GOMEZ ANGARITA	DIRECTOR DE OBRA Y R/L CONTRATISTA	U. T. PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	ASISTENCIA VIRTUAL
ALEXIS RODRIGUEZ BARON	RESIDENTE INTERVENTORIA	ARA INGENIERIA SAS	ASISTENCIA VIRTUAL
HEILYN GAITAN VARGAS	ING. CONTROL DE PROYECTOS	U.T.PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	ASISTENCIA VIRTUAL
CLAUDIA PATRICIA GUERRERO	COORDINADORA PROYECTOS OXI	SVR - INVIAS	ASISTENCIA VIRTUAL
SANDRA MONTAÑES	DIREC. ADMINISTRATIVO	ARA INGENIERIA SAS	ASISTENCIA VIRTUAL
GLADYS TERESA LANDAZABAL GRAN/	RESIDENTE OBRA	U.T.PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	ASISTENCIA VIRTUAL
DIEGO ANDRES MEDELLIN DIAZ	SOCIAL DE OBRA	U.T.PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	ASISTENCIA VIRTUAL

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	3/08/2026
	(Día / Mes / Año)

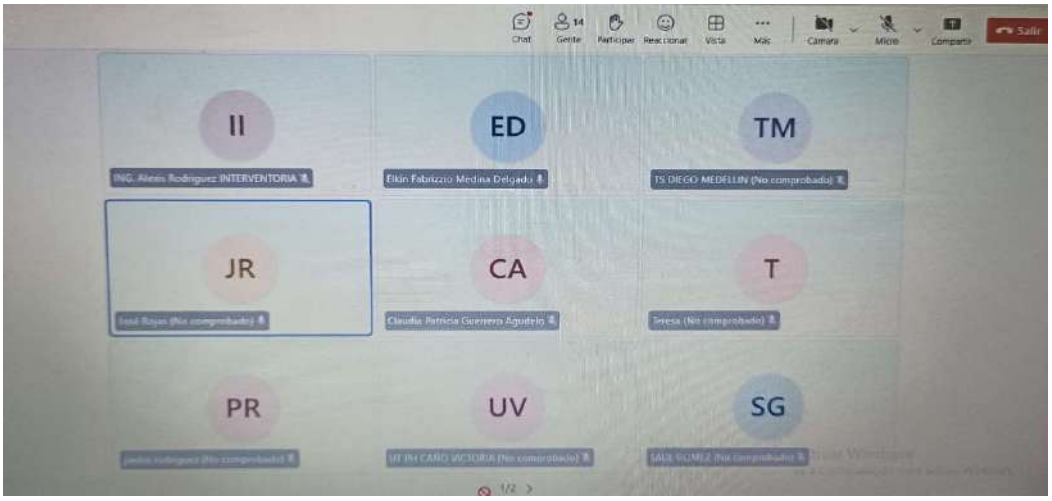

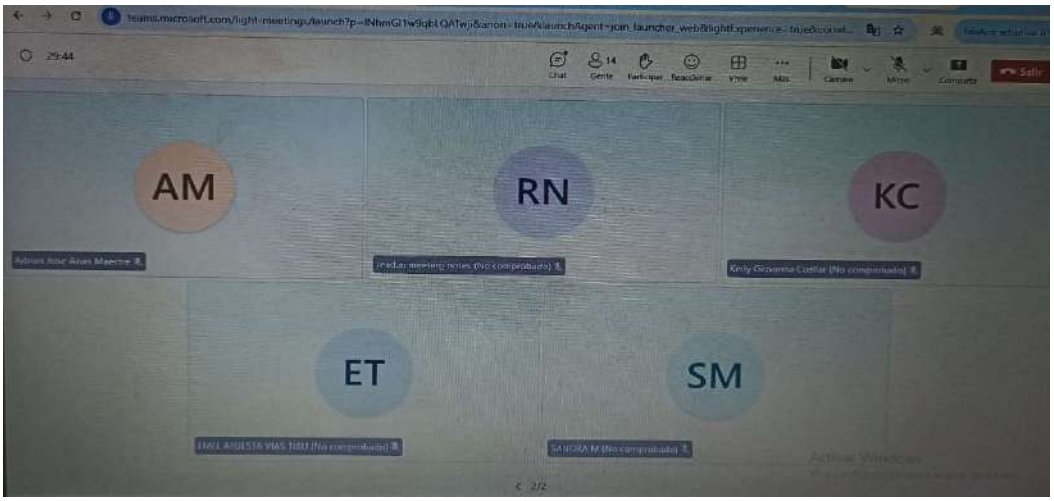

ANEXO 13: Informe social interventoría.

INFORME MENSUAL COMPONENTE SOCIAL No 01

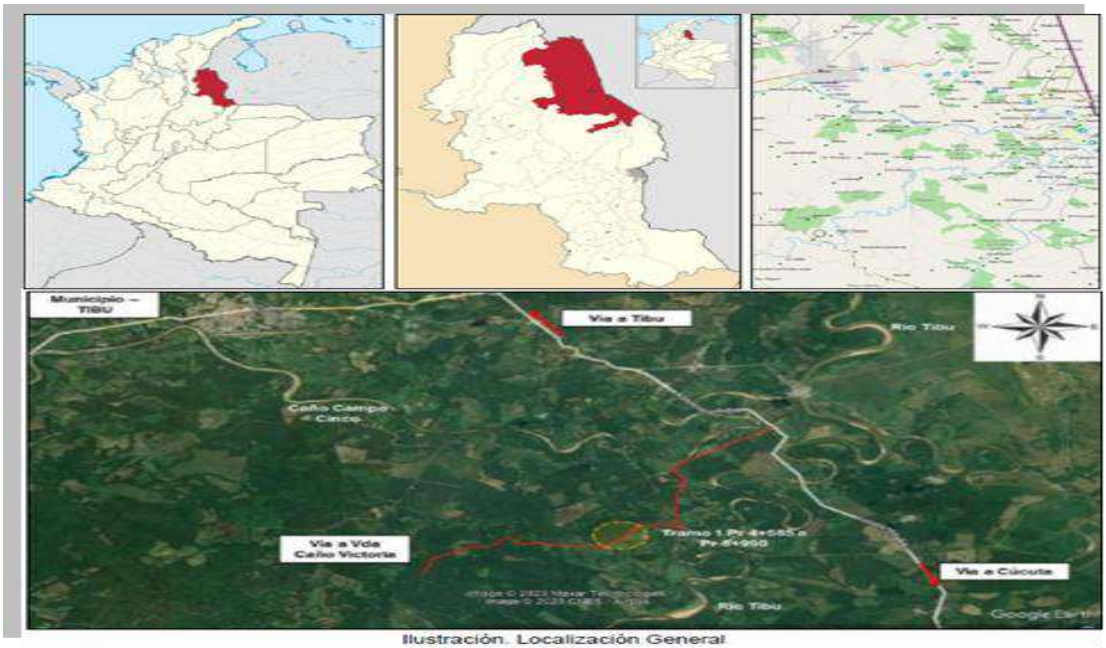


Ilustración. Localización General

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"

CONTRATO DE OBRA: No 001-2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. LOCALIZACIÓN

3. ALCANCE SOCIAL

3.1 NORMATIVIDAD

4. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD
4.1 OBJETIVO GENERAL
4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

5. PROGRAMA DE INFORMACION Y DIVULGACIÓN
5.1 OBJETIVO GENERAL
5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

6. PROGRAMA DE MANEJO DE INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS Y SERVICIOS PÚBLICOS
6.1 OBJETIVO GENERAL
6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

7. PROGRAMA DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.
7.1 OBJETIVO GENERAL
7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

8. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.
8.1 OBJETIVO GENERAL
8.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

9. CONCLUSIONES

1. INTRODUCCIÓN

Las actividades objeto del presente contrato se ejecutarán en la vereda Caño Victoria Norte, zona rural ubicada en el municipio del Tibú, en la subregión del Catatumbo, departamento de Norte de Santander. Es una comunidad campesina dedicada a labores agrícolas y de conservación ambiental, caracterizada por el desarrollo de proyectos viales terciarios en la región. Colinda con sectores como Caño Victoria Sur y otras veredas de la zona norte del municipio. Se destacan proyectos de mejoramiento vial rural con la instalación de placa-huellas en tramos críticos para facilitar la movilidad de la comunidad y el transporte de productos; en el área se han promovido iniciativas locales de inventario de especies nativas y conservación de fuentes hídricas y afluentes como el caño Victoria. Como gran parte de la zona rural de Tibú y el Catatumbo, la vereda se encuentra en una región históricamente afectada por dinámicas de conflicto armado y programas de sustitución o presencia de economías ilícitas en el departamento.

El objetivo de este informe es describir las actividades desarrolladas por el componente social de la interventoría y el contratista, ofreciendo un análisis sobre el impacto, beneficios y los riesgos asociados con la implementación del contrato anteriormente descrito, El presente informe está comprendido en el periodo del 01 al 31 de agosto de 2026.

Para cumplir con este objetivo se realizará la supervisión y el acompañamiento a los siguientes programas con los cuales deberá cumplir con su desarrollo el contratista:

- Programa de atención a la comunidad.
- Programa de información y divulgación.
- Programa de manejo de infraestructura de predios y servicios públicos.
- Programa de cultura vial y participación comunitaria.
- Programa de contratación de mano de obra.

2. LOCALIZACIÓN

El municipio se halla ubicado la parte región oriental con un aproximado de 2.696 kilómetros cuadrados, su temperatura entre 32°C su cabecera municipal esta localizada a los 8°38´24N72°44´17"0. Limita con el norte y oriente con Venezuela, al sur con Cúcuta y Sardinata y al occidente con Teorama, El Tarra y San Calixto. Ubicado en el valle del rio Catatumbo y sus afluentes, el área municipal es de 2.737. km² y limita al Norte y al Este con la Republica de Venezuela, al sur con Cúcuta y Sardinata y al

Oeste con san Calixto, El Tarra y Teorama. Cuenta con los corregimientos y centros poblados de Barco la silla, Campo Dos, Campo Giles, La Gabarra, La Llana, Paccelly, Tres Bocas y Versalles, además de caseríos y asentamientos humanos que se han desarrollado con la dinámica de la migración.

3. ALCANCE SOCIAL

El plan de gestión social se implementa en la ejecución de todas las actividades relacionadas con el objeto del contrato "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO". Este plan busca socializar con las personas y partes interesadas en cada etapa del proyecto, asegurando que la comunidad reciba la información necesaria y apropiada para su adecuada participación junto con el contratista: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA.

3.1 NORMATIVIDAD

- Constitución política de 1991, art: 01, 02, 13, 49, 95, 79, 103, 104, 105, 310 y 365.
- Ley 134 de 1994, por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana.
- Decreto 1429 de 1995 reglamentario de la ley 142 de 1994 (control social).
- Ley 472 de 1998 por medio de la cual reglamentan las acciones populares y de grupo.
- Directiva presidencial No. 10 de 2002 para que la comunidad en general realice una eficiente participación y control social a la gestión administrativa.
- Ley 850 de 2003 por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas.
- Ley 1098 de 2006 código de infancia y adolescencia.
- Ley 1618 de 2013 ejercicio de las personas con discapacidad.
- ISO 26000 guía de responsabilidad social.

4. PROGRAMA DE ATENCION A LA COMUNIDAD

El programa de atención a la comunidad está diseñado para brindar un servicio de atención adecuado que permita atender oportunamente las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y sugerencias) presentadas durante la ejecución de cada etapa del proyecto,

garantizando así la participación ciudadana basado en el derecho que tiene todo ciudadano de obtener respuesta oportuna a sus solicitudes y requerimientos.

4.1 Objetivo general

Recibir, atender y proporcionar respuestas oportunas a todas las inquietudes y solicitudes que las autoridades y la comunidad planteen en relación con el proyecto.

4.2 Objetivos específicos

- Fomentar la participación de la comunidad en los programas o actividades vinculadas al proyecto.

- Sensibilizar a los actores que participan en la ejecución de la obra sobre la responsabilidad que se tiene al intervenir el espacio público, socializando las políticas y las medidas diseñadas para la adecuada intervención de este y el respeto a su uso.

ACTIVIDADES A EJECUTAR	
Recepcion, seguimiento y cierre de PQRS.	0
Atención a la comunidad, instituciones y lideres comunales.	2 veces por semana

Para dar cumplimiento a lo anterior, el componente social del contratista debe contar con buzón de sugerencias, cartelera informativa y un espacio adecuado para brindar atención oportuna a la comunidad.

Durante el mes de agosto se realizaron las adecuaciones necesarias para la instalación del punto físico de atención a la comunidad, quedando debidamente señalizado y en condiciones para atender cualquier solicitud, queja o sugerencia por parte de la comunidad del área de influencia, además cuenta con una cartelera informativa.
La apertura del punto de atención fue realizada en conjunto con el profesional social del del contratista y se informó a la comunidad con un volante compartido por el grupo de

WhatsApp, donde se indica que los días lunes y miércoles se realizará atención en el horario comprendido entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m.



Punto de atención al usuario – Cartelera informativa.



Buzón de sugerencias.



Apertura del buzón de sugerencias.



Volante compartido por el grupo de whatsApp

5. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN

Este programa busca informar y promover los servicios disponibles, orientados al desarrollo y bienestar de los residentes de la vereda situados en los tramos donde se desarrollará el proyecto, estableciendo una comunicación efectiva entre las instituciones, entidades y comunidad involucrada, garantizando la participación y el intercambio de información relevante para el éxito del mismo.

5.1 Objetivo general

Promover la divulgación de las actividades proyectadas por el contratista, orientadas al desarrollo y bienestar de los residentes de la vereda, buscando establecer una comunicación efectiva entre las instituciones y comunidades que tendrán relación en con la ejecución del contrato.

5.2 Objetivos específicos

- Difundir información o material de interés para la comunidad.
- Mantener actualizada la información y líneas de atención.

- Mantener informada a la comunidad de los avances de las obras.
- Informar de los cierres viales de manera oportuna cuando haya lugar.

ACTIVIDADES A EJECUTAR	
Reunión de socialización.	
Reunión mensual de seguimiento.	
Divulgación por redes sociales (invitación).	5

Se creó un grupo de WhatsApp donde se comparte información de interés para la comunidad del AID, con el fin de mantenerlos informados sobre las novedades y demás situaciones que se presenten a lo largo del desarrollo del proyecto.

El 18 de agosto se llevó a cabo una reunión con algunos miembros de la JAC, el maestro de obra, el área técnica y social, para concertar el tema de contratación de mano de obra local, esto porque no se han recibido suficientes hojas de vida del área de influencia directa del proyecto.



Socialización del proyecto ante la comunidad.



Volante compartido por grupo de WhatsApp.



Invitación taller de cultura vial.



Volante compartido por grupo de WhatsApp.



Volante compartido por grupo de WhatsApp.

6. PROGRAMA DE MANEJO DE INFRAESTUCTURA DE PREDIOS Y DE SERVICIOS PUBLICOS

Las actas de vecindad se elaboran de forma preventiva con el objetivo de prevenir conflictos entre la comunidad y el contratista durante y después de la ejecución de la obra; estas acciones son fundamentales para minimizar el impacto en la comunidad, ya que aseguran que los residentes estén informados y se consideren sus necesidades y preocupaciones. Las actas de vecindad incluyen información sobre el estado del predio antes de cualquier intervención en el espacio público, así como observaciones generales, un registro fotográfico del avance de la obra y otros detalles relevantes.

6.1 Objetivo general

Evitar conflictos con los miembros de las comunidades en el área de influencia directa del proyecto, debido a posibles daños o afectaciones en las edificaciones cercanas como resultado del paso y uso de maquinaria.

6.2 Objetivos específicos

- Realizar una evaluación del estado y condiciones del terreno y el predio previo a la ejecución de las obras.
- Fomentar una comunicación continua y efectiva entre los usuarios y el contratista facilitando el reporte de cualquier inconveniente que pueda surgir.

ACTIVIDADES A EJECUTAR	
Levantamiento de actas de vecindad.	2
Cierre de actas de vecindad.	

Durante el mes de agosto se realizaron dos (2) actas de vecindad que no pudieron ser realizadas en el mes de julio debido a que no fue posible contactar a sus propietarios, éstas sumadas a las del mes anterior darían diez (10), quedando una pendiente por realizar ya que el propietario del predio no se encuentra en la zona, para un total de 11 actas de vecindad.

7. PROGRAMA DE CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA

En el contexto de fomentar la cultura vial se implementará un programa destinado a sensibilizar a la población educativa, comunidad en general, lideres del AID y a los miembros del comité de participación comunitaria en actitudes que conduzcan a la sostenibilidad de la obra, a la gestión integral de la biodiversidad de acuerdo a las características ambientales del territorio y así evitar accidentes durante el proceso de ejecución de as actividades del objeto del contrato.

7.1 Objetivo general

Este programa tiene como objetivo informar y educar a la comunidad en general sobre la prevención de accidentes, el respeto por las normas de tránsito y la promoción de una movilidad segura.

7.2 Objetivos específicos

- Sensibilización sobre el cuidado y mantenimiento de la infraestructura vial.
- Información y educación en prevención de accidentes.
- Promoción del respeto por las normas de tránsito.
- Fomento de una movilidad vial responsable y segura.

ACTIVIDADES A EJECUTAR	
Capacitación mensual con las comunidades del AID.	1

Durante el mes según lo establecido en el cronograma, el 20 de agosto se realizó un taller sobre cultura víal dirigido a la comunidad del área de influencia directa del proyecto.

Teniendo en cuenta que la ejecución de cualquier obra genera cambios temporales en las condiciones habituales de movilidad de la comunidad, debido a la presencia de maquinaria, vehículos de transporte, materiales, trabajadores y posibles restricciones o modificaciones en la circulación; es importante brindar a la comunidad información clara sobre las medidas de prevención que deben adoptarse durante el desarrollo de las actividades constructivas, promoviendo comportamientos seguros entre peatones, motociclistas, conductores, estudiantes y demás usuarios de la vía.

Este taller busca fortalecer la cultura de prevención y corresponsabilidad comunitaria, contribuyendo a reducir situaciones de riesgo y accidentes durante la ejecución del proyecto, además de sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de adoptar comportamientos seguros y responsables durante la movilización por la vía intervenida, especialmente frente a la presencia de maquinaria, vehículos y actividades propias de la construcción de la placa huella.



Taller de seguridad vial.

8. PROGRAMA DE CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA.

Como medida social de manejo y mitigación de impactos el contratista debe fomentar la vinculación de mano de obra no calificada (MONC) y mano de obra calificada (MOC) procedente del área de influencia directa e indirecta del proyecto.

8.1 Objetivo general

Fomentar el desarrollo social a través de la generación de empleo formal para los residentes de la zona.

8.2 Objetivos específicos

- Incrementar la empleabilidad de los residentes de la zona.
- Optimizar la calidad de vida de los residentes mediante la integración laboral de trabajadores tanto calificados como no calificados del área de influencia.

En el marco del proceso de vinculación de mano de obra para el desarrollo del proyecto, se han recibido 34 hojas de vida de personas residentes en la vereda donde se ejecutan las actividades. No obstante, durante el proceso de revisión y selección se ha identificado que algunos de los postulantes no cumplen con los requisitos establecidos para los cargos requeridos, principalmente en lo relacionado con la experiencia laboral y la disponibilidad de tiempo para atender las necesidades del proyecto.

En atención a lo anterior, y con el propósito de garantizar la disponibilidad del personal requerido y dar continuidad a las actividades programadas, se ha ampliado el proceso de convocatoria a habitantes de veredas cercanas y, de manera complementaria, al casco urbano del municipio. Esta medida busca contar con un mayor número de postulantes que cumplan con los perfiles, experiencia y disponibilidad requeridos, manteniendo como criterio de priorización, en la medida de lo posible, la vinculación de mano de obra del área de influencia del proyecto.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El contratista se compromete a implementar el plan de gestión social que tiene como objetivo mitigar el impacto negativo de las obras en la comunidad. Este plan resalta la importancia de incluir a la comunidad del área de influencia lo que permitirá que sus perspectivas e intereses sean considerados en la ejecución de las actividades programadas.

La estrategia se basa en un enfoque participativo que busca fomentar su empoderamiento y corresponsabilidad en el proceso, a través de diálogos y la identificación de realidades locales, garantizando un desarrollo mas sostenible y alineado con los principios de inclusión social.



CHIRLEY KARINA RIVERA C.
TRABAJADORA SOCIAL
C.C 1.093.910.022

ANEXO 14: Informe SST interventoría.

INFORME DE INTERVENTORIA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

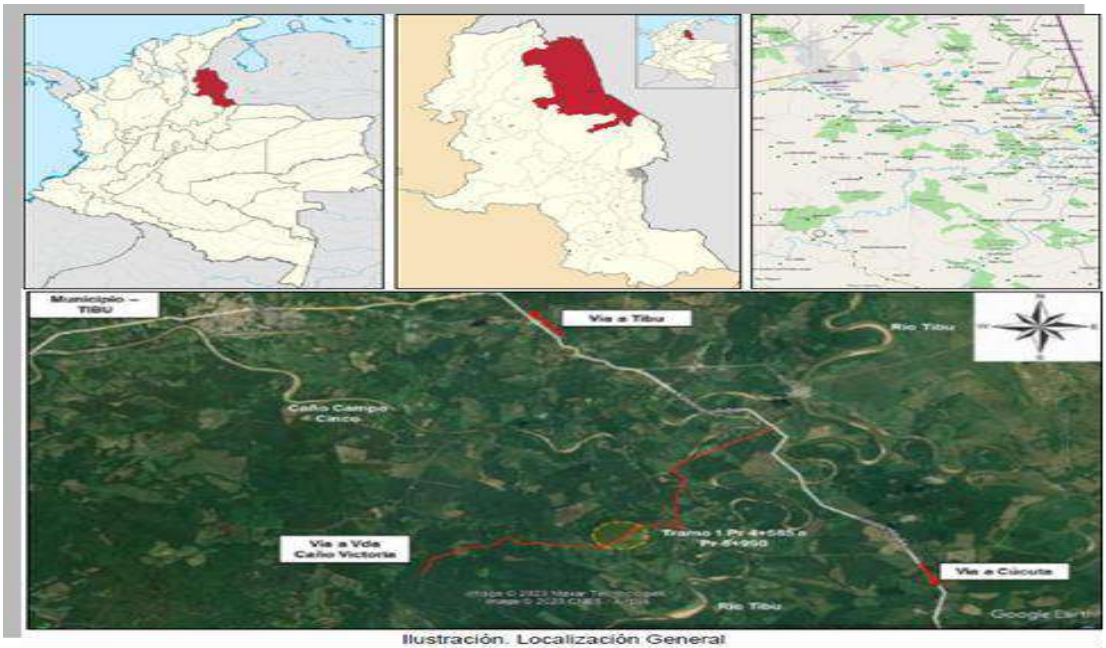


Ilustración. Localización General

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO”

CONTRATO DE OBRA: No 001-2025

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

OBJETO: MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER identificado con BPIN 20240214000033

TABLA DE CONTENIDO

1.INTRODUCCIÓN

2.DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
2.2. IMAGEN, No.1

3. INFORME N° 2 MES DE AGOSTO
4. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES
5. PERSONAL EN OBRA

6. INSPECCION MAQUINAS Y HERRAMIENTAS
6.1 DOCUMENTACION DE MAQUINARIA

7. INDUCCION Y REINDUCCION
8. CAPACITACIONES
9. ENTREGA EPP
10. CONSLUSIONES Y OBSERVACIONES

1. INTRODUCCIÓN

En el presente informe se relacionan las actividades realizadas en el área de **seguridad y salud en el trabajo**, correspondientes a la, INTERVENTORIA **MES DE AGOSTO INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER,**
IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO.

El objeto es aplicar normas y procedimientos, destinados a proteger el ambiente de trabajo, así como mantener la calidad de vida laboral, disminuir la tasa de ausentismo por enfermedad, prevenir la accidentalidad y mortalidad, mejorar las condiciones laborales que conlleva al bienestar físico, mental y social de los trabajadores esto con el fin optimizar el rendimiento y aumento de la productividad.

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.1 Localización

Las obras objeto del presente contrato se ejecutarán en el municipio del Tibú, el cual se halla ubicado la parte región oriental con un aproximado de 2.696 kilómetros cuadrados, su temperatura entre 32°C su cabecera municipal esta localizada a los

8°38´24N72°44´17”0. Limita con el norte y oriente con Venezuela, al sur con Cúcuta y Sardinata y al occidente con Teorama, El Tarra y San Calixto.

Ubicado en el valle del rio Catatumbo y sus afluentes, el área municipal es de 2.737. km² y limita al Norte y al Este con la Republica de Venezuela, al sur con Cúcuta y Sardinata y al Oeste con san Calixto, El Tarra y Teorama. Cuenta con los corregimientos y centros poblados de Barco la silla, Campo Dos, Campo Giles, La Gabarra, La Llana, Paccelly, Tres Bocas y Versalles, además de caseríos y asentamientos humanos que se han desarrollado con la dinámica de la migración.

Es una zona ondulada con cotas de altura que fluctúan entre los 600 m.s.n.m, en la parte baja de Talipa y Manantial y 1.700 m.s.n.m, en los cerros de Tabor y la Palestina, El municipio de Tibú se encuentra enmarcado dentro de la cuenca del Catatumbo que constituye una depresión estructural entre las serranías de Perijá al occidente y los Andes de Mérida el S-W. en forma general el fallamiento predominante es de tipo inverso y algunas estructuras de cabalgamiento que han moldeado el relieve de la zona. Entre las principales estructuras se encuentra: falla de carbonera, falla de leoncito, anticlinal de petrolera, anticlinal de sardinata, anticlinal y sinclinal de Tibú, anticlinal y sinclinal rio de oro y caracol, etc., por su ubicación geográfica y geológica de la zona de estudio su desarrollo tectónico estructural está relacionado con la deformación y levantamiento de la cordillera oriental colombiana, particularmente durante la denominada orogénesis andina.

La zona del proyecto se localiza en la vía que comunica al municipio de Tibú con la vereda Caño Victoria, ubicado en la zona sur oriental de la zona rural del municipio de Tibú departamento Norte de Santander como se puede observar en la siguiente imagen:



Ilustración. Localización Específica tramos del proyecto.



Ilustración. Localización Específica tramos del proyecto.

Localización General del Municipio de TIBU

3. SEGUNDO INFORME DEL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. MES DE AGOSTO 2026

ARA INGENIERIA SAS en su deber como interventoría da a conocer actividades para desarrollo en campo y exigencias legales en SST, donde se da a conocer al contratista que debe cumplir a cabalidad con lo que se le pida.

A continuación, se relaciona el personal en campo por parte del contratista



FORMATO ASISTENCIA QUINCENAL DEL PERSONAL DE OBRA				CÓDIGO: FT-SST-01															
UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA				PAGINA 1 DE 1															
CONTROL DE ASISTENCIA																			
DATOS DEL TRABAJADOR				AGOSTO Q2															
NOMBRES	APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM	LUN
				16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GLADYS TERESA	LANDASABAL GRANADOS	60281641	ING RESIDENTE			1	1	1	1	1		1	1	1	1				
DIEGO ANDRES	MEDELLIN DIAZ	10933787385	SOCIAL			1	1	1	1	1		1	1	1	1				
JENNIFER KATHERINE	HERNANDEZ DIAZ	1093921671	SISO			1	1	1	1	1				1	1				
ANDRES JULIAN	LANZZIANO ARAQUE	1005036022	TOPOGRAFO			1	1	1	1			1	1	1	1				
JESUS ALFONSO	MALDONADO HERNNDEZ	1090458183	CADENERO			1	1	1	1			1	1	1	1				
RAUL ALFONSO	PADILLA MARTELO	72278962	OPERADOR RETROCARGADOR				1	1	1			1	1	1	1				
JULIO	SARRIA	70078772	OPERADOR MOTONIVELADORA					1	1			1	1	1	1				
JUAN	DURAN TUTA	1093908593	OPERADOR VIBROCONPACTADOR					1	1			1	1	1	1				
JESUS RAMON	RIVERA OVALLOS	13268883	MAESTRO											1	1				
LUIS LEONARDO	CASTRO CORREA	1093911792	OFICIAL											1	1				
CAMILO ANDRES	DIAZ VEGA	1091667002	ASISTENTE DE LABORATORIO											1					
			TOTAL	0	0	5	6	8	8	3	0	7	7	11	10	0	0	0	0

4. EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO

El contratista hace entrega de los exámenes médicos ocupaciones al personal ingresado en obra estos se realizaron el mes de agosto, a los trabajadores al maestro al oficial



Certificado de Aptitud Laboral
Ingreso

Fecha: 22/Ago/2026. Hora: 00:00:00 a.m.
Apellido: RIVERA OVALLOS
Nombre: JESUS RAMON
Tipo Doc: CC
Nro Identidad: 15208883
HC: # 32167
Edad: 69 años
Sexo: Masculino
Nacim: 18/Mar/1900
Empresa: Particular
Emp. Usuaria: PARTICULAR
Cargo: MAESTRO DE OBRA
Direccion: BARRIO LOS PINOS
Telefono: 3106367950 Celular: 3106367950 Email: Estado Civil: Casado
Ciudad: Norte de Santander - Tibú
EPS: COOSALUD ARL: POSITIVA AFP: PORVENIR
Rh: O+

Examenes Realizados
Osteomuscular | Normal | RX Lumbosacra

Concepto
CON RESTRICCIONES PARA EL CARGO A DESEMPEÑAR

Recomendaciones
S.V.E.
* Corrección Óptica Permanente
Estilo de Vida Saludable
* Dieta
* Ejercicio Regular
* Estilo De Vida Saludable
* Mantener adecuada higiene postural

Medicas
* Control Periodico Por Pyp Por Eps
* Control Optometrico anual
Laborales
* Uso de Elementos de Protección Personal
* Seguir normas de higiene y seguridad en el trabajo

Otras: REALIZAR LAS ACTIVIDADES LABORALES ADOPTANDO UNA ADECUADA POSTURA. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES. DESARROLLAR Y MANTENER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. CONTINUAR MANEJO POR EPS DIETA Y EJERCICIO REGULAR. CONTROL OPTOMETRICO ANUAL.PACIENTE CON HALLAZGOS RADIOGRAFICOS ANORMALES SE SUGIERE EVITAR LEVANTAMIENTO DE PESO POR ENCIMA DE LIMITE PERMISIBLE. ADECUADA MANIPULACION DE CARGAS SEGUN NORMAS DE ICERGONOMIA MANEJO POR SU EPS

Observaciones
RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA: ANORMAL.

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Para dar cumplimiento a la resolución 2346 del 2007 emanada del ministerio de protección social, el trabajador, cuyos datos y firma constan en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas este a disposición del personal encargado de la vigilancia de salud de su empresa.

Los Hallazgos fueron consignados en historia clínica ocupacional que desarrolla los contenidos establecidos en la resolución 2346 de 2007

Notas:
1) Archivo este informe en las hojas de vida del trabajo en el área de recursos humanos
2) El contenido de la historia clínica ocupacional tiene carácter confidencial y su custodia está regulada por la resolución 1918 del 5 de Junio de 2009 del cual transcribimos a continuación algunos apartes:
"La custodia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional estará a cargo del prestador de servicios de salud ocupacional que la genere en el curso de la atención cumpliendo los requisitos y procedimientos de archivo conforme a las normas legales vigentes para la historia clínica".
"En ningún caso los empleadores podrán tener, conservar o anexar copia de las evaluaciones médicas ocupacionales y de la historia clínica ocupacional a la hoja de vida del trabajador"
3) Este examen no reemplaza el realizado por Industrial para poder de ustedes



Certificado de Aptitud Laboral
Ingreso

Fecha: 22/Ago/2026. Hora: 00:00:00 a.m.
Apellido: CASTRO CORREA
Nombre: LUIS LEONARDO
Tipo Doc: CC
Nro Identidad: 1093011792
HC: # 32105
Edad: 35 años
Sexo: Masculino
Nacim: 02/Abr/1991
Empresa: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA
Cargo: OFICIAL DE OBRA
Direccion: BARRIO LA CEIBA
Telefono: 3146159788 Celular: 3146159788 Email: Estado Civil: Union Libre
Ciudad: Norte de Santander - Tibú
EPS: NUEVA EPS ARL: Sin Definir AFP: Sin Definir
Rh: O+

Examenes Realizados
RX de Columna | Osteomuscular | Normal

Concepto
SIN RESTRICCIONES PARA EL CARGO A DESEMPEÑAR

Recomendaciones
S.V.E.
Estilo de Vida Saludable
* Pausas Activas
* Estilo De Vida Saludable
* Mantener adecuada higiene postural

Medicas
Laborales
* Uso de Elementos de Protección Personal
* Seguir normas de higiene y seguridad en el trabajo

Otras: REALIZAR LAS ACTIVIDADES LABORALES ADOPTANDO UNA ADECUADA POSTURA. REPORTAR ACCIDENTES O INCIDENTES. DESARROLLAR Y MANTENER UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. SEGUIR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Observaciones
RADIOGRAFIA DE COLUMNA LUMBOSACRA: NORMAL

CONSENTIMIENTO INFORMADO
Para dar cumplimiento a la resolución 2346 del 2007 emanada del ministerio de protección social, el trabajador, cuyos datos y firma constan en este documento, presta su consentimiento para someterse a las pruebas médicas y complementarias necesarias para valorar su aptitud laboral, conforme a los riesgos en su puesto de trabajo, y a que el contenido y resultado de las mismas este a disposición del personal encargado de la vigilancia de salud de su empresa

Los Hallazgos fueron consignados en historia clínica ocupacional que desarrolla los contenidos establecidos en la resolución 2346 de 2007

Angela Margarita Alvarez Pino
Medico Profesional

LUIS LEONARDO CASTRO CORREA
CC 1093011792

MAESTRO Y OFICIAL

5. PERSONAL ACTIVO EN OBRA

El personal que se encuentra activo en campo por parte del contratista:

- PERSONAL QUE INGRESA: 11
- RETIRADOS: 0
- PERSONAL ACTIVO: 11
-

SEGURIDAD SOCIAL

El contratista nos hace entrega de la seguridad social del personal

ASOPAGOS s.a.

PAGADA

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 38177863
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2026-08-03

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	901982531	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	E menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CALLE 11A # 1E-135 PISO3 EDIF.ALTAMIRA	DEPARTAMENTO	NORTE DE SANTAD	MUNICIPIO	CUCUTA
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	INES8AK@OUTLOOK.COM	TELÉFONO	6075714823
FAX	0	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	13468198	PRIMER APELLIDO	GOMEZ	SEGUNDO APELLIDO	ANGARITA
PRIMER NOMBRE	SAUL	SEGUNDO NOMBRE	ALFONSO		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Ano: 2026	Mes: 07	Ano: 2026	Mes: 08	Único
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
6		$20.725.500		38177863

IDENTIFICACION DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Extranjero obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-13468198	01	No	No	No	54	1	5422001	Fijo	GOMEZ ANGARITA SAUL ALFONSO	$7.000.000
CC-1093921671	01	No	No	No	54	1	5422001	Fijo	HERNANDEZ DIAZ JENNIFER KATHERINE	$1.750.905
CC-60281641	01	S	No	No	54	1	5422001	Fijo	LANDAZABAL GRANADOS GLADYS TERESA	$4.023.690
CC-1093787385	01	No	No	No	54	1	5422001	Fijo	MEDELLIN DIAZ DIEGO ANDRES	$2.200.000
CC-13452583	01	No	No	No	54	1	5422001	Fijo	TINOCO ROMERO JESUS ALBERTO	$1.750.905
CC-60299473	01	No	No	No	54	1	5422001	Fijo	TINOCO ROMERO NIRCY	$4.000.000

NOVEDADES

Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TAE	TAP	TAF	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VSN	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 13468198																												0		
CC - 1093921671																												0		
CC - 60281641																												0		
CC - 1093787385																												0		
CC - 13452583																												0		
CC - 60299473																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 13468198	COLPENSIONES	30	$7.000.000	0.1600000	$1.120.000	$0	$0	$1.120.000	$0	$0	$0
CC - 1093921671	COLPENSIONES	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 60281641	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 1093787385	PORVENIR	30	$2.200.000	0.1600000	$352.000	$0	$0	$352.000	$0	$0	$0
CC - 13452583	PROTECCION	30	$1.750.905	0.1600000	$280.200	$0	$0	$280.200	$0	$0	$0
CC - 60299473	COLPENSIONES	30	$4.000.000	0.1600000	$640.000	$0	$0	$640.000	$0	$0	$0

6. INSPECCION A MAQUINAS Y HERRAMIENTAS

Se relacionan las inspecciones de herramientas y maquinas del contratista en obra, las cuales son supervisadas con el objetivo de que se encuentren en buenas condiciones y no lleguen a causar algún daño al trabajador.








27/8/26 11:04 a. m.
Google

6.1 DOCUMENTACION MAQUINARIA

Se pide la siguiente documentación de la maquinaria al contratista:

- Tarjeta de propiedad de las maquinas
- Hoja de vida de las maquinas
- Póliza
- Inspecciones a la maquina

Al operador se le pide la siguiente documentación:

- Curso de operador de maquinaria
- Seguridad social
- Hoja de vida

Anexo la documentación entregada
Motoniveladora:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 1118741

No. DE REGISTRO	MARCA	LINEA	AÑO MODELO
MC756832	CATERPILLAR	120G	1985

TIPO DE MAQUINARIA	CLASE	No. SERIE
CONSTRUCCION	MOTONIVELADORA	*87V07466*

COLOR(ES)	No. MOTOR	RODAJE
AMARILLO	07Z11223	NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
11485 Kg	3330 mm	2410 mm	7930 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): SIPS SERVICIOS INDUSTRIALES PETROL
IDENTIFICACIÓN: NIT 900722754

LOCATARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
IDENTIFICACIÓN
LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR: DPTO ADTVO TTOyTTE MCPAL CUCUTA

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
29/08/2025	29/08/2025	******

ORIGEN | DEC. IMPORTACIÓN | FECHA DE LEVANTE



PAGADA
RUNT

COMPROBANTE ÚNICO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN
EXPEDICIÓN 25/02/2025 FECHA DE PAGO 20/03/2025 Nro. 600000000097465734
DEPENDENCIA STRIA TTO DPTAL NTE SANTANDER/EL ZULIA CÓDIGO 54261001
DATOS SOLICITANTE
NOMBRES / EMPRESA JOSE LUIS MUÑOZ MONTAÑEZ
TIPO DOCUMENTO Cédula Ciudadanía NÚMERO DOCUMENTO 13.463.224
Señor usuario: Una vez usted ha efectuado el pago, usted tiene 60 días para hacer uso del mismo; después de este tiempo usted deberá solicitar el reembolso del dinero ante el RUNT y Ministerio de Transporte.

DETALLE

DETALLE DERECHOS MINISTERIO DE TRANSPORTE

Código EV	Cantidad	Descripción
201	1	Tarjeta de registro Maquinaria Agricola

DETALLE DERECHOS RUNT

Concepto	Cantidad	Descripción
310	1	TRAMITE DE TRASPASO DE RNMA

TOTAL DERECHOS RUNT $ 4.900,00
TOTAL DERECHOS MT $ 34.300,00
VALOR TOTAL A PAGAR DERECHOS RUNT Y MT $ 39.200,00

RETROEXCAVADORA:


TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 141001

No. DE REGISTRO MC038547 | MARCA CATERPILLAR | LINEA 420D | AÑO MODELO 2004

TIPO DE MAQUINARIA CONSTRUCCION | CLASE RETROEXCAVADORA | No. SERIE CAT0420DJFDP15530

COLOR(ES) AMARILLO | No. MOTOR 7BJ31528 | RODAJE NEUMATICOS

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS
PESO 9645 Kg | ALTO 2200 mm | ANCHO 2300 mm | LARGO 5000 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S) SILVA BARON TULIO | IDENTIFICACIÓN C.C. 88.174.962


LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) | IDENTIFICACIÓN

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR STRIA TTEYTTO ENVIGADO

FECHA REGISTRO 03-05-2016 | FECHA EXPEDICIÓN 21-11-2024 | FECHA VENCIMIENTO ****** | FECHA DE LEVANTE


2012

482012000297342-5

MC038547


RASTREO SIGLO XXI

NIT. 900238725-7

lunes, 10 de marzo de 2025

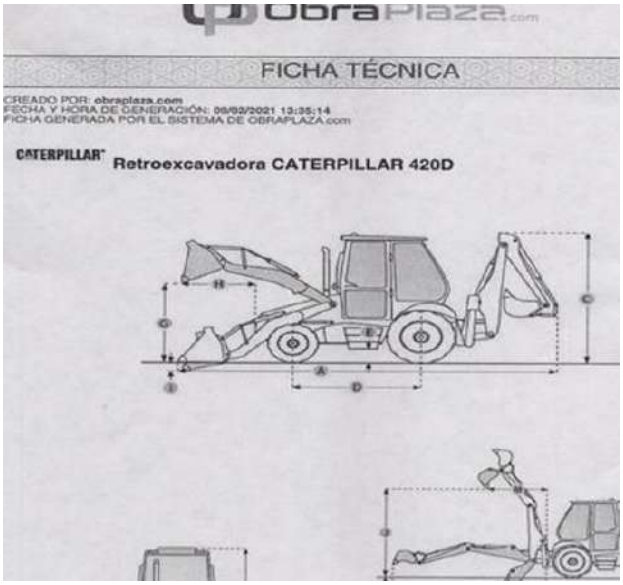
Rastreo Siglo XXI SAS,

CERTIFICA

Que, la empresa: SIPS SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS SILVA ,identificada con NIT 900722754 cuenta con la prestación de nuestro servicio de monitoreo satelital, en la máquina de las siguientes

caracteristicas:
Marca: CATERPILLAR
Color: AMARILLO
Referencia: 420D
Motor: 7BJ31528
Nº Serial Maquinaria: CAT0420DJFDP15530
N° de Chasis: C16327
Año 2004
ID: 6507
Serie Terminal : SG116016678354
Serial Dispositivo Gps: 868789020678354

Este documento se expide en Medellín, el lunes, 10 de marzo de 2025 a petición del solicitan


ObraPlaza.com

FICHA TÉCNICA

CREADO POR: obraplaza.com
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 09/02/2021 13:35:14
FICHA GENERADA POR EL SISTEMA DE OBRAPLAZA.com

CATERPILLAR Retroexcavadora CATERPILLAR 420D

Capacidad de tanque de combustible	128 Lt
Radio de giro	535 cm
Tamaño de llanta delantera 4x2	11Lx16, 12PR/12.5
Tamaño de llanta delantera 4x4	11Lx16, 12PR/12.5
Tamaño de llanta trasera 4x2	19.5x24, 10PR
Tamaño de llanta trasera 4x4	19.5x24, 10PR
Desplazamiento de motor	4 Lt
Marca de motor	Caterpillar
Modelo	3054T
Número de cilindros	4
Potencia bruta	88 Hp
Potencia neta	85 Hp
Revoluciones del motor	2200 rpm
Número de marchas adelante	4
Número de marchas de reversa	4
Tipo de transmisión	Power shuttle
Velocidad máxima adelante	32.8 Km/h
Velocidad máxima de reversa	32.8 Km/h
Alcance desde altura de carga - Extendido	75.1 cm
Alcance máximo - Extendido	667,5 cm
Altura de carga - Extendido	417.5 cm
Flujo de la bomba hidraulica	163 Lt/m
Fuerza de excavación del cucharón - Extendido	565 Kg



MINISTERIO DE TRANSPORTE

RUNT

MINISTERIO DE TRANSPORTE

GUÍA DE MOVILIZACIÓN O TRÁNSITO DE LA MAQUINARIA

ENTIDAD PORTAL WEB

NRO. de GUIA 365158

LA MOVILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA POR LAS VÍAS DEL TERRITORIO NACIONAL SE EFECTUARÁ ENTRE LAS 6:00 Y LAS 18:00, PARA LO CUAL DEBERÁ CONTAR CON UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN QUE LE PERMITA VERSE DURANTE CUALQUIERA OTROS VEHÍCULOS, PEATONES Y OBSTÁCULOS. CUANDO LA MOVILIZACIÓN SE EFECTÚE ENTRE LAS 18:00 Y LAS 6:00 DEBERÁ LLEVAR ENCENDIDO UN DISPOSITIVO DE COLOR AMBAR EN LA PARTE DELANTERA Y TRASERA DEL EQUIPO. ESTO CUMPLE LA CONDICIÓN DE VISIBILIDAD RECOMENDABLE COMO MÁXIMA.

NRO.TARJETA DE REGISTRO DE LA MAQUINARIA: 73051	TIPO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: Cédula Ciudadanía	NUMERO DOCUMENTO DEL SOLICITANTE: 71117044
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL SOLICITANTE: ALZATE GIRALDO HERNANDO ANDRES		NRO. UNICO DE IDENTIFICACION DE LA MAQUINARIA: MC038547
VIN: NA	CHASIS: C16327	MOTOR: 78J31528
SERIE: CAT0429DJFDP15530	SUBPARTIDA ARANCELARIA 8429510000	IDENTIFICACIÓN DEL GPS: SG1160164878334
EMPRESA DE HABILITACIÓN DEL GPS: RASTREO SIGLO XXI S.A.S	FECHA DE EXPEDICION: 12/11/2022	FECHA DE VENCIMIENTO: 11/12/2022
ORIGEN: Antioquia - EL CARMEN DE VIBORAL	DESTINO: Norte de Santander - CUCUTA	
DESCRIPCION DE LA RUTA: EL CARMEN DE VIBORAL-DORADAL-PUERTO BOYACA-BUCARAMANGA-PAMPLONA-CUCUTA VIAS NACIONALES, MUNICIPALES,		
COLOR: AMARILLO	USO: Movimiento de tierra	FIRMA FUNCIONARIO

VIBROCOMPACTADOR



MINISTERIO DE TRANSPORTE

TARJETA DE REGISTRO DE MAQUINARIA

No. 125024

No. DE REGISTRO: MC620992	MARCA: WAKER	LINEA: D880	AÑO MODELO: 1992
TIPO DE MAQUINARIA: CONSTRUCCION	CLASE: VIBROCOMPACTADORA	No. SERIE: 541D155A	
COLOR(ES): AMARILLO	No. MOTOR: 5043-7101	RODAJE: NEUMATICOS Y CILINDROS	

PESO Y MEDIDAS SIN ACCESORIOS

PESO	ALTO	ANCHO	LARGO
10600 Kg	2780 mm	1852 mm	4910 mm

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S): SIPS SERVICIOS INDUSTRIALES PETROL

IDENTIFICACION: NIT 900 722 754

LOCATARIO APELLIDO(S) NOMBRE(S) IDENTIFICACION

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

ORGANISMO DE TRÁNSITO EXPEDIDOR

STRIA MCPAL TTOYTTE GIRON

FECHA REGISTRO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA VENCIMIENTO
07-03-2023	18-12-2023	******



Gobernación de Norte de Santander

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

RECIBO OFICIAL DE PAGO

Contribuyente	GRUPO EMPRESARIAL H & B S.A.S.			Identificación	901566563-2
Matrícula	999	Tipo Acto		Tipo Contribuyente	RECIBO PAGO
Número	80 01_901566563	Notaría	00 DE CUCUTA	Fecha Acto	02/01/2023 20235300174
Fecha	13/01/2023			Fecha Vencimiento	03/03/2023

Concepto	Base Liquidacion	Valor Impuesto
NOMBRAMIENTOS	1	$154
TASA SISTEMATIZACION DPTO.		$39
TOTAL		193

Gobernación de Norte de Santander

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL

RECIBO OFICIAL DE PAGO

Contribuyente	GRUPO EMPRESARIAL H & B S.A.S.			Identificación	901566563-2
Matrícula	999	Tipo Acto		Tipo Contribuyente	RECIBO PAGO
Número	80 01_901566563	Notaría	00 DE CUCUTA	Fecha Acto	02/01/2023 20235300174
Fecha	13/01/2023			Fecha Vencimiento	03/03/2023

Concepto	Base Liquidacion	Valor Impuesto
NOMBRAMIENTOS	1	$154
TASA SISTEMATIZACION DPTO.		$39
TOTAL		193



MINISTERIO DE TRANSPORTE

RUNT

COMPROBANTE ÚNICO DE PAGO Y LIQUIDACIÓN

EXPEDICIÓN 07/03/2023 FECHA DE PAGO 31/03/2023 Nro. 6000000000077891060

DEPENDENCIA STRIA MCPAL TTOyTTE GIRON CÓDIGO 68307000

DATOS SOLICITANTE

NOMBRES / EMPRESA CARLOS ANDRES QUINTERO ULLOA

TIPO DOCUMENTO Cédula Ciudadanía NÚMERO DOCUMENTO 80.026.337

Señor usuario: Una vez usted ha efectua pago, usted tiene 60 días para hacer u mismo; después de este tiempo usted d solicitar el reembolso del dinero ante el y Ministerio de Transporte.

DETALLE

DETALLE DERECHOS MINISTERIO DE TRANSPORTE			DETALLE DERECHOS RUNT		
Código EV	Cantidad	Descripción	Concepto	Cantidad	Descripción
201	1	Tarjeta de registro Maquinaria Amarilla	124	1	Tramite Registro Inicial

Banco Popular 07 MAR 2023 126 RECIBIDO POR CAJA

TOTAL DERECHOS RUNT $ 15.900,00

RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista tener lista toda la documentación faltante próxima visita.

7. INDUCCION Y REINDUCCION

La inducción y reinducción en el personal, son procesos sistemáticos que se realizan al ingreso del personal en el caso de la inducción, y a lo largo del vincula laboral de los trabajadores con la organización según las actividades de entrenamiento.

Se deben realizar actividades correspondientes al personal, puede ser de forma individual o de forma grupal. Esto se hace con el fin de dar inicio a las labores para las cuales fueron contratados y de esta forma garantizar que tengan el conocimiento y la responsabilidad para ejecutar un trabajo seguro.

Los temas que se deben tratar en la inducción son:

- Políticas de seguridad y salud en el trabajo
- Política prevención de consumo alcohol y drogas
- Reglamento de higiene y seguridad industrial
- Reglamento interno de trabajo
- Copasst
- Cocola
- Preparación y respuesta ante emergencia
- Todo lo relacionado con el puesto de trabajo
- Funciones a realizar
- Peligros y riesgos relacionados a la labor

8. CAPACITACIONES EN SST

Las capacitaciones del personal, son procesos sistemáticos que se realizan a lo largo del vínculo laboral según las necesidades que se tengan.
Lo anterior debe estar establecido en el programa de capacitación, entrenamiento, inducción y reinducción

Todos los días se debe hacer la charla de 5 minutos a los trabajadores junto con las pausas activas antes de empezar la jornada.

Temas de charlas 5 minutos:

- Protección contra caídas
- Equipos de protección personal
- Uso adecuado de epp
- Manejo de herramientas

- Orden y aseo limpieza en puesto de trabajo


9. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Se debe hacer entrega de elementos de protección personal a los trabajadores ya que estos requieren de ellos para empezar con su labor.

Durante el transcurso del mes de julio y el mes de agosto no se realiza entrega de EPP por parte del contratista.

10. CONCLUSIONES Y OBSERVACIONES

El contratista se compromete a implementar las actividades en seguridad y salud en el trabajo ya que estas tienen como objetivo mitigar el riesgo y evitar accidentes en los trabajadores.
Con esto implementamos un ambiente laboral justo y buenas condiciones para el personal de colaboradores.
También se compromete a realizar e implementar formatos y estilos de vida saludables pausas activas para evitar y mitigar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores diariamente.



YENIFER LISETH OROZCO CALVO
PROFESIONAL SST

ANEXO 15: Informe especialista y profesionales

INFORME AMBIENTAL N.2

CONTRATO DE OBRA No. 001-2025, MEDICAL DUARTE ZF SAS Y LA UNIÓN TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA – NIT 901982531 – 0

OBJETO DE CONTRATO: MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VERED CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN N.o 20240214000033 EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO”

PERIODO: 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026
CUCUTA, 01 DE SEPTIEMBRE 2026

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 0754-2026

1. INTRODUCCION

El proyecto "Mejoramiento en la vía terciaria a la vereda Caño Victoria, municipio de Tibú, departamento de Norte de Santander", identificado con código BPIN N.º 20240214000033, se ejecuta en el marco del mecanismo de Obras por Impuestos, con viabilidad otorgada por el Ministerio de Transporte y bajo los lineamientos del Plan de Manejo Ambiental (PMA), el Apéndice Socioambiental y la metodología AIKA del INVIAS.

Durante el periodo correspondiente al mes de agosto de 2026, el proyecto avanzó a la etapa de mejoramiento y ejecución de obras, iniciando actividades constructivas en los tramos intervenidos. El presente informe consolida el seguimiento ambiental realizado por la Interventoría sobre las medidas de manejo implementadas, el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y los avances en la gestión de permisos y autorizaciones ambientales requeridas.

2. Actividades en el periodo

A continuación, se describen las actividades desarrolladas en campo y su correspondiente verificación desde el componente ambiental:

2.1 Tramo 4

- Instalación de geotextil: Se verificó la correcta extensión del material sobre la superficie preparada, conforme a especificaciones técnicas y a las medidas establecidas en el PMA, garantizando su adecuada colocación sin afectar áreas aledañas.
- Construcción de terraplén de mejoramiento: Se ejecutó la capa de mejoramiento con espesor de 15 cm, procediéndose posteriormente a su compactación

conforme a los requerimientos técnicos. La Interventoría verificó que el material utilizado se mantuvo dentro del área de obra, evitando dispersión y afectación a zonas de vegetación cercanas, en cumplimiento del PMA.

2.2 Tramo 1

- Instalación de tubería de alcantarilla: Se instaló tubería corrugada de PVC de 36 pulgadas como obra de drenaje. La Interventoría verificó que durante la excavación, manipulación e instalación se evitaron afectaciones innecesarias al suelo y a la vegetación aledaña, cumpliendo con las medidas de protección de cauces y escorrentía superficial contempladas en el PMA.

2.3 Tramo 3

En proceso de inicio de actividades de mejoramiento.

3. GESTIÓN AMBIENTAL Y MEDIDAS DE MANEJO IMPLEMENTADAS

3.1. Manejo de residuos sólidos

Se verificó la instalación adecuada de contenedores para la recolección y disposición temporal de residuos sólidos generados por el personal de obra, debidamente ubicados en zona habilitada y señalizada, conforme a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

3.2. Unidades sanitarias y manejo de aguas residuales

Se cuenta con autorización formal de uso de instalaciones sanitarias, expedida el 03 de septiembre de 2026 por la propietaria del predio "San Pablo", ubicado en las coordenadas

geográficas 8°34′02,3″ N – 72°42′02,8″ O, vereda Caño Victoria. Las instalaciones comprenden: 2 unidades sanitarias, 1 ducha y 1 lavamanos, con sistema de tratamiento mediante pozo séptico, autorizadas para uso de hasta 20 trabajadores simultáneamente durante la jornada laboral. El documento se encuentra archivado y verificado por la Interventoría, dando cumplimiento a las medidas sanitarias del PMA.

3.3. Recurso hídrico y abastecimiento de agua

El suministro de agua para la obra será aportado por la comunidad, proveniente de una finca cercana al área del proyecto. Se encuentra pendiente de entrega la certificación escrita de dicha fuente que acredite su procedencia y autorización de uso. La Interventoría requiere este documento para su revisión y aprobación previa, en cumplimiento de las disposiciones del PMA y la normativa ambiental vigente.

3.4. Control de emisiones y material particulado

Se implementó un sistema de riego e irrigación sobre las superficies de trabajo y vías de acceso, con el fin de mitigar la generación de material particulado y polvo, reduciendo afectaciones a la vegetación y a la comunidad cercana, conforme a las medidas de protección atmosférica establecidas en el PMA.

3.5. Fuentes de materiales

Se encuentra en trámite la obtención del permiso de explotación de la fuente de materiales que abastecerá la obra. La Interventoría reitera que ningún material podrá extraerse o utilizarse sin contar previamente con la autorización expedida por la autoridad ambiental competente, de conformidad con la normativa vigente y las disposiciones del PMA.

4. CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA

Durante el mes de agosto de 2026, el proyecto avanzó a la etapa de ejecución de obras, con actividades en los tramos 1 y 4, consistentes en instalación de alcantarilla de 36 pulgadas, extensión de geotextil y construcción de capa de mejoramiento de 15 cm con su respectiva compactación.

Las medidas de manejo ambiental verificadas, contenedores de residuos, sistema de riego para control de material particulado y unidades sanitarias con autorización vigente y pozo séptico, se ajustan a lo establecido en el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y en la normativa vigente.

Persisten aspectos que requieren atención inmediata por parte del Contratista:

- Entrega de la certificación de la fuente de abastecimiento de agua, que acredite su procedencia y autorización de uso.
- Obtención del permiso de explotación de fuentes de materiales antes de cualquier extracción o ingreso de material a la obra.
- Complementación del plan de disposición final de RCD y escombros, indicando sitio autorizado y soportes correspondientes, conforme al PMA.

La Interventoría reitera que el cumplimiento de los requisitos ambientales es previo y obligatorio para el desarrollo de las actividades constructivas, en concordancia con el Anexo Técnico, el Plan de Manejo Ambiental (PMA).

REGISTRO FOTOGRAFICO

















Realizó

TATIANA CARVAJALINO CARRANZA
Ingeniera Ambiental
MAT: 121021-0505938
Profesional Ambiental cto. 0754-2026
Interventoría-ARA INGENIERIA SAS

ANEXO 16: Equipos y vehículos contrato de interventoría
MEPI-MN1-IN-15-FR-5

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/08/2026
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: AGOSTO

PROYECTO: INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 0754-2026 **INTERVENTORÍA:** ARA INGENIERIA S.A.S

CONTRATO DE OBRA No. 001-2025 **CONTRATISTA:** UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTO	placa: ZQL86F; CC: 197 cc; MODELO: 2022; MARCA: AKT	I	I	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:
1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND

Firma
Nombre: ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.: 68202-75786 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

ANEXO 17: Personal, control aportes y seguridad social contrato de interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-7

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-7
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

FECHA: **16- septiembre-2026** (Dia / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **0754-2026** INTERVENTOR: **ARA INGENIERIA S.A.S**

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: **agosto 01 a agosto 31 de 2026** PROYECTO: **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

CONTRATO DE OBRA No.: **001-2025** CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO LA VICTORIA**

NOMBRE ARL: **AXA COLPATRIA** NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: **COLSUBSIDIO**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salario / Honorarios	Dias del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	% Dedicación en el mes	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	I. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO	79.442.593	Director de Interventoría	$ 1.430.800,00			X							X			X					X	X						X					X	20,00%	ARA INGENIERIA S.A.S	$ 1.430.800,00	$ 99.583,68	V	SANITAS	93803069	$ 57.232,00	COLPENSIONES	93803069	$ 228.928,00	$ 132.000,00			
2	JHONNY ALEXIS RODRIGUEZ BARON	1.115.854.311	Residente de interventoria	$ 5.365.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100,00%	ARA INGENIERIA S.A.S	$ 5.365.000,00	$ 373.404,00	V	NUEVA EPS	93803069	$ 214.600,00	PORVENIR	93803069	$ 858.400,00	$ 171.700,00			
3	Chirley Karina Rivera Calvo	1.093.910.022	profesional social	$ 1.946.000,00			X	X			X			X	X			X				X	X			X			X	X			X	X	X	X	50,00%	CHIRLEY KARINA RIVERA CALVO	$ 1.946.000,00	$ 135.441,60	V	NUEVA EPS	6023972921	$ 243.250,00	PORVENIR	6023972921	$ 311.360,00				
4	Yenifer Liseth Orozco	1.093.904.154	profesional SST	$ 1.946.000,00			X	X			X			X	X			X				X	X			X			X	X			X	X	X	X	50,00%	Yenifer Liseth Orozco	$ 1.946.000,00	$ 135.441,60	V	NUEVA EPS	8642411548	$ 243.250,00	PORVENIR	8642411548	$ 311.360,00				
5	TATIANA CARVAJALINO CARRANZA	1.091.534.538	Profesinal Ambiental	$ 778.400,00			X							X			X					X	X						X						X	20,00%	ARA INGENIERIA S.A.S	$ 778.400,00	$ 54.176,64	V	Sanitas EPS	93803069	$ 31.136,00	PROTECCION	93803069	$ 124.544,00	$ 70.100			
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				$ 11.466.200,00																																													

El Interventor adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 9 del presente formato.

NOTAS:

1. El Interventor debe relacionar el personal profesional (incluido los especialistas), técnico, auxiliar y administrativo utilizado durante el mes para la ejecución del contrato. Solo se reconoce el pago del personal efectivamente utilizado y relacionado. Este formato es soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva.
2. El Interventor debe justificar en la casilla "Observaciones" los días no laborados por el personal cuando no este tiempo completo.
3. Es responsabilidad de la Interventoria diligenciar en el presente formato la disponibilidad del personal exigido contractualmente; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique y con la verificación efectuada por la supervisión del contrato en las visitas realizadas y los documentos soportes de novedades.
4. Es responsabilidad del Supervisor del contrato de Interventoria verificar la disponibilidad del personal, así como que el personal profesional esté debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
5. En el evento en que el Interventor no cumpla con la disponibilidad del personal requerido, el Supervisor del contrato de Interventoria debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
6. El Interventor es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Consultor o por uno de los integrantes del Consultir en el caso de Consorcio o Unión Temporal.
7. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
8. El Supervisor del contrato de Interventoria es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Interventoria
9. El Interventor es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la consultoría, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual presentará la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual debe relacionar los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
10. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los dias que prestó el servicio.

Firma
Nombre: **KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON**
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S

Firma
Nombre: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO**
Supervisor del Contrato de Interventoria
Matrícula No. **68202-75786 STD**

Original: Informe mensual. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Dirección Territorial.

Escriba el texto aquí

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1093910022
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CHIRLEY KARINA RIVERA CALVO
CIUDAD/MUNICIPIO:	TIBU	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 8A 12 78 BRR LOS PINOS	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Investigaciones y desarrollo experimental en el c
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**6034176991**		TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2026
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/01		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		615941561	

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
SUBTOTALES:										**$ 320.000**	**$ 0**	**$ 320.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.000	$ 0	$ 0	$ 250.000
SUBTOTALES:													**$ 250.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 250.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 19.500	$ 19.500	$ 0	$ 0	$ 19.500
SUBTOTALES:									**$ 19.500**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 19.500**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES								
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1093910022	RIVERA CALVO CHIRLEY KARINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 2.000.000				NO	R-19																230301-PORVENIR	30	$ 2.000.000	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 320.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 2.000.000	$ 250.000	$ 0	$ 250.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	12	$ 800.000	109391002	$ 19.500		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 589.500

Planilla Pagada

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS	CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94861114	08/09/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	Y	$0	$271.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	271.000				271.000	1	300	271.300			2.710	271.300	2

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	0	0	0
Pensión	0	0	0
Riesgos Laborales	1	271.000	271.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	1	271.000	271.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS	CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94861114	08/09/2026	2	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	Y	$0	$271.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excenuado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1093904154	OROZCO CALVO YENIFER LISETH	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-4	1.946.000	30	5	135.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CC 1093910022	RIVERA CALVO CHIRLEY KARINA	59	0			N																		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	14-4	1.946.000	30	5	135.500		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS	CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 cot		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94439886		11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$42,809,715	$12.770.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	320.000	0		0		0	0	0	0	320.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	783.500	0		0		0	0	0	0	783.500	7
EPS010	EPS Sura	800088702-2	80.000	0		0		0	0	0	0	80.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	529.100	0		0		0	0	0	0	529.100	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1
230301	Porvenir	800224808-8	4.407.800	0	0	79.400	79.400	0	0		4.566.600	6
231001	Colfondos	800227940-6	1.080.200	0	0	0	0	0	0		1.080.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.081.600	0	0	0	0	0	0		1.081.600	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	2.336.200				2.336.200	0	0	2.336.200			23.362	2.336.200	11

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	532.000	0	0	532.000	3
CCF37	Comfanorte	890500516-3	1.180.600	0	0	1.180.600	8

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	1.712.600	1.712.600
Pensión	4	7.008.600	7.008.600
Riesgos Laborales	1	2.336.200	2.336.200
CCF	2	1.712.600	1.712.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	11	12.770.000	12.770.000

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	coor.admon.araing@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 cot			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94439886		11	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-09	2026-08	E	$42,809,715	$12.770.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1007391647	VILLEGAS AMAYA MONICA ALEJANDRA	1	0			S																	25-14	3.460.000	30	553.600	0	0	0	0	EPS005	3.460.000	30	138.400	14-4	3.460.000	30	5	240.900	CCF37	3.460.000	30	138.400	0	0	0	0	0
2	CC 1020803022	NAVARRO CAMACHO LIZ YESENIA	1	0			S																	230301	2.000.000	30	320.000	0	0	0	0	EPS010	2.000.000	30	80.000	14-4	2.000.000	30	1	10.500	CCF22	2.000.000	30	80.000	0	0	0	0	0
3	CC 1091534538	CARVAJALINO CARRANZA TATIANA	1	0			S																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
4	CC 1091653811	ASCANIO CONTRERAS FABRIANY MAURICIO	1	0			S																	231001	5.000.000	30	800.000	0	0	0	0	EPS005	5.000.000	30	200.000	14-4	5.000.000	30	5	348.000	CCF37	5.000.000	30	200.000	0	0	0	0	0
5	CC 1091673492	RINCON ALBA MARIA ALEJANDRA	1	0			S																	230301	2.570.000	30	411.200	0	0	0	0	EPS005	2.570.000	30	102.800	14-4	2.570.000	30	5	178.900	CCF37	2.570.000	30	102.800	0	0	0	0	0
6	CC 115854311	RODRIGUEZ BARON JHONNY ALEXIS	1	0			S																	230301	5.365.000	30	858.400	0	0	0	0	EPS037	5.365.000	30	214.600	14-4	5.365.000	30	5	373.500	CCF37	5.365.000	30	214.600	0	0	0	0	0
7	CC 13175991	GUERRERO LOBO EDISON	1	0			S																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0
8	CC 13363313	REYES ALVAREZ RAFAEL DAVID	1	0			S																	230301	7.862.000	30	1.258.000	0	0	39.400	39.400	EPS037	7.862.000	30	314.500	14-4	7.862.000	30	5	547.200	CCF37	7.862.000	30	314.500	0	0	0	0	0
9	CC 52904861	CUELLAR OBREGON KERLY GIOVANNA	1	0			S																	230301	8.000.000	30	1.280.000	0	0	40.000	40.000	EPS002	8.000.000	30	320.000	14-4	8.000.000	30	1	41.800	CCF22	8.000.000	30	320.000	0	0	0	0	0
10	CC 79442593	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	1	0			S																	25-14	3.300.000	30	528.000	0	0	0	0	EPS005	3.300.000	30	132.000	14-4	3.300.000	30	5	229.700	CCF22	3.300.000	30	132.000	0	0	0	0	0
11	CC 88143608	RODRIGUEZ BAYONA WILSON ALONSO	1	0			S																	231001	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	70.100	14-4	1.750.905	30	5	121.900	CCF37	1.750.905	30	70.100	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1093904154	0	JENIFER LISETH OROZCO CALVO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-377	MANANZA 13 LOTE 5 LOS ALMENDROS		5674017			SANTIAGOMALDONAOROZCO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	8642676778	I	2026-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	554.700	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8602393217	2026-09-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1093904154	OROZCO CALVO YENIFER LISETH	1.946.000																	0			30	30	0	0	PORVENIR-230301	1.946.000	311.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.946.000	243.300	SIN CCF-SINCCF	0	0	0	0	0,00000	0	0	0	0	0	03	0	554.700	N	0

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1093904154	0	JENIFER LISETH OROZCO CALVO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	0121	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
54-377	MANANZA 13 LOTE 5 LOS ALMENDROS		5674017			SANTIAGOMALDONAOROZCO@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	8642676778	I	2026-09-01	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	554.700	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	8602393217	2026-09-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.946.000	1.946.000	0	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	311.400	0	0	0	311.400
PORVENIR	230301	800224808	8	1	311.400	0	0	0	311.400
EPS(Administradoras: 1)				1	243.300	0	0	0	243.300
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	243.300	0	0	0	243.300
Gran Total					554.700	0	0	0	554.700

ANEXO 18: Informe financiero y presupuestal contrato interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-9

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1
		FECHA	**16-septiembre-2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES**

DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER**

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: **0754-2026**

INTERVENTOR: **ARA INGENIERIA S.A.S**

MES INFORME MENSUAL: **agosto 01 a agosto 31 de 2026**

PROYECTO: **INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"**

CONTRATO DE OBRA No: **001-2025**

CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO LA VICTORIA**

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2026		CTO 0754-2026	IMPUESTOS	FIDUCIARIA POPULAR SA	PRINCIPAL	$ 452.084.151,00	$ 452.084.151,00
TOTAL						$ 452.084.151,00	$ 452.084.151,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 452.084.151,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
										$ 452.084.151,00		Contrato Inicial
	ANTICIPO	$ 113.970.794,00		$ 113.970.794,00			$ 113.970.794,00		$ 113.970.794,00	$ 338.113.357,00		Anticipo Radicado Abril 2026
01	Abril 20 a Abril 30 de 2026	$ 2.805.206,00	$ 532.989,14	$ 3.338.195,14	$ 841.562,00	$ 2.496.633,14	$ 113.129.232,00		$ 2.496.633,14	$ 335.616.723,86		ACTA 01
02	Mayo 01 a Mayo 21 de 2026	$ 6.822.292,00	$ 1.296.235,48	$ 8.118.527,48	$ 2.046.688,00	$ 6.071.839,48	$ 111.082.544,00		$ 6.071.839,48	$ 329.544.884,38		ACTA 02
03	Junio 22 a Junio 30 de 2026	$ 4.839.148,00	$ 919.438,12	$ 5.758.586,12	$ 1.451.745,00	$ 4.306.841,12	$ 109.630.799,00		$ 4.306.841,12	$ 325.238.043,26		ACTA 03
04	julio 01 a julio 31 de 2026	$ 27.246.464,00	$ 5.176.828,16	$ 32.423.292,16	$ 8.173.940,00	$ 24.249.352,16	$ 101.456.859,00		$ 24.249.352,16	$ 300.988.691,10		ACTA 04
05	agosto 01 a agosto 31 de 2026	$ 29.617.182,00	$ 5.627.264,58	$ 35.244.446,58	$ 8.885.155,00	$ 26.359.291,58	$ 92.571.704,00		$ 26.359.291,58	$ 274.629.399,52		ACTA 05
TOTALES		**$ 71.330.292,00**	**$ 13.552.755,48**	**$ 84.883.047,48**					**$ 63.483.957,48**	**$ 274.629.399,52**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Consultoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

Escriba el texto aquí

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
* COSTOS DE PERSONAL	$ 27.060.232,00	$ 5.141.444,08	$ 32.201.676,08
* OTROS COSTOS DIRECTOS	$ 2.556.950,00	$ 485.820,50	$ 3.042.770,50
VALOR TOTAL	**$ 29.617.182,00**	**$ 5.627.264,58**	**$ 35.244.446,58**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: **KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON**
Representante Legal
ARA INGENIERIA S.A.S

Firma
Nombre: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO**
Supervisor del Contrato
Matrícula N°: **68202-75786 STD**

Original: Informe mensual. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Dirección Territorial.

ANEXO 19: Seguimiento garantías contrato de interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-13

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/08/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0754-2026 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERIA S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO:

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"

FECHA DE INICIO: 20/04/2026

PLAZO INICIAL: 10 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20/02/2027 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 452.084.151,00

VALOR ACUMULADO: $ 452.084.151,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10,00%	$ 45.208.415,10	26	1	2026	26	5	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30,0%	$ 135.625.245,30	26	1	2026	26	5	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	$ 90.416.830,20	26	1	2026	26	11	2029
Calidad del servicio	30,00%	$ 135.625.245,30	26	1	2026	26	11	2031

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 520-47-994000055536

Certificado de modificación o anexo No.: 2

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 45.208.415,10	20	4	2026	22	9	2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	25%	$ 113.970.794,00	20	4	2026	22	9	2027
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 90.416.830,20	20	4	2026	22	3	2030
Calidad del servicio	30%	$ 135.625.245,30	22	3	2027	22	3	2032

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 520-47-994000055536

Certificado de modificación o anexo No.: 7
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND

Firma
Nombre: ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-75786 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 20: Seguimiento al plan de calidad contrato interventoría MEPI-MN1-IN-15-FR-15

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 2

FECHA: 31/08/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0754-2026 (Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:
INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S

FECHA DE INICIO: 20/04/2026 (Indicar día, mes y año) **PLAZO INICIAL:** 10 MESES **FECHA DE VENCIMIENTO:** 20/02/2027 (Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No: 001-2025 (Indicar número y año)

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ------ NO ------ APROBADO: SI ------ NO X VERSIÓN No. ..... FECHA DE VERSIÓN: .....

OBSERVACIONES:
no se han iniciado actividades fisicas, se encuentra en gestion de creacion a las necesidades del proyecto

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ------ NO X No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: ..... FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: .....

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI ------ NO X No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ..... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: .....

OBSERVACIONES:
N/A

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ------ NO X APROBADO: ------ NO X FECHA DE APROBACIÓN: .....

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: _ _ _ _ _ _ _ No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: .....

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ------ NO X

OBSERVACIONES:
hasta la fecha no se ha realizado ensayos de laboratorio por parte del contratista, la obra se encuentra aun en actividades preliminares.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autrocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: NO **No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:** NO

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: NO **No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:** NO

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: NO

OBSERVACIONES:
hasta el presente cierre no se han recibido ni quejas ni reclamos .

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: NO **No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:** NA

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: NO **No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:** NA

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: NO **No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:** NA

OBSERVACIONES:
hasta el presente cierre no se han recibido ni quejas ni reclamos .

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

no se contempla en este periodo debido a que no se ha iniciado actividades fisicas del proyecto PLACA HUELLA de la VERDE CAÑO VICTORIA.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de la Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-45905 CND

Firma

Nombre: JHONNY ALEXIS RODRIGUEZ BARON
Rsidente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 54202-373127 NTS

Firma

Nombre: ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-75786 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 21: Acta de modificación de costos
MEPI-MN1-IN-9-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA
ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 2

FECHA: 23/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NORTE DE SANTANDER **ACTA No:** 1

POR ACTUALIZACIÓN DE SUELDOS Y TARIFAS [ ]
POR CONTRATO ADICIONAL EN VALOR [ ]
POR PRÓRROGA [ ]
POR EFECTO DE LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO [ ]
POR NECESIDADES DEL CONTRATO [X]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 0754 de 2026

OBJETO:
INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN NO. 20240214000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO".

INTERVENTOR: ARA INGENIERIA S.A.S
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORÍA: ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO
RESOLUCIÓN No.: 525 DE 27/02/2026 (Indicar día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No: 001-2025 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA

PLAZO INICIAL: 10 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20/04/2026 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 22/05/2026 (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 452.084.151,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 452.084.151,00

PLAZO ACUMULADO: 10 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 22/03/2027 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 22/06/2026 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**:

No. de ORDEN	CANT.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		MODIFICACIONES				EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA, Acta de Costos Anterior		CONDICIONES ACTUALIZADAS	
									CONDICIONES ACTA ANTERIOR		PRESENTES					
		CONCEPTO	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR TOTAL	COSTO MENSUAL	PRIMA REGIONAL	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO (H / Mes)	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO (H / Mes)	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL														
		Director de Interventoría	$ 7.154.000,00		2,00	$ 14.308.000,00					+	0,25	$ 1.788.500,00			2,25	$ 16.096.500,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.365.000,00		10,00	$ 53.650.000,00					-	0,97	$ (5.204.050,00)			9,03	$ 48.445.950,00
		Profesional Social	$ 3.892.000,00		5,00	$ 19.460.000,00					-	0,35	$ (1.362.200,00)			4,65	$ 18.097.800,00
		Profesional Ambiental	$ 3.892.000,00		2,00	$ 7.784.000,00					-	0,10	$ (389.200,00)			1,90	$ 7.394.800,00
		Profesional SST	$ 3.892.000,00		5,00	$ 19.460.000,00					-	0,35	$ (1.362.200,00)			4,65	$ 18.097.800,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)	$ 19.131.495,00														
		Especialista en Pavimentos y/o Vías	$ 6.207.000,00		1,00	$ 6.207.000,00										1,00	$ 6.207.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 6.207.000,00		0,10	$ 620.700,00										0,10	$ 620.700,00
		Especialista Ambiental	$ 6.207.000,00		0,30	$ 1.862.100,00										0,30	$ 1.862.100,00
		Especialista en Geología y/o Geotecnia	$ 6.207.000,00		0,48	$ 2.993.295,00										0,48	$ 2.993.295,00
		Especialista en Hidráulica y/o Hidrología	$ 6.207.000,00		0,10	$ 620.700,00										0,10	$ 620.700,00
		Especialista SIG	$ 6.207.000,00		0,10	$ 620.700,00										0,10	$ 620.700,00
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.207.000,00		1,00	$ 6.207.000,00										1,00	$ 6.207.000,00
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 133.793.495,00**							**$ (6.529.150,00)**				**$ 127.264.345,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36							2,36				2,36
		TOTAL COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL (A)				**$ 315.752.648,00**							**$ (15.408.794,00)**				**$ 300.343.854,00**

No. de ORDEN	CANT.	CONCEPTO	COSTO	UNIDAD	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR TOTAL	COSTO	UNIDAD DE PAGO	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	+ -	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS															
		VIÁTICOS															
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 224.000,00	Dia	10,00	$ 2.240.000					+	8	$ 1.792.000,00			18,00	$ 4.032.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA															
		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., Incluye combustible y SOAT)	$ 684.000,00	Mes	10,00	$ 6.840.000					-	0,97	$ (663.480,00)			9,03	$ 6.176.520,00
		Trabajo de topografia (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.522.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 32.610.000					+	0,20	$ 1.335.464,00			5,20	$ 33.945.464,00
		Ensayos de laboratorios (suelos, pavimentos, concretos, etc)	$ 568.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 5.680.000					-	0,70	$ (397.600,00)			9,30	$ 5.282.400,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.157.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 5.785.000					+	4,03	$ 4.662.710,00			9,03	$ 10.447.710,00
		OTROS COSTOS															
		Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	$ 1.262.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 6.310.000					+	4,00	$ 5.048.000,00			9,00	$ 11.358.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 421.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 2.105.000					+	5,10	$ 2.147.100,00			10,10	$ 4.252.100,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 316.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 1.580.000					+	5,10	$ 1.611.600,00			10,10	$ 3.191.600,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 1.000.000					-	1,27	$ (127.000,00)			8,73	$ 873.000,00
		Ajuste al peso y/o valor remanente															
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 64.150.000,00**							**$ 15.408.794,00**		$ -		**$ 79.558.794,00**
		* Valor total básico (C) = (A) + (B)				**$ 379.902.648,00**							$ -		$ -		**$ 379.902.648,00**
		* Provisión para ajustes y frente adicional (D)															
		* Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				**$ 379.902.648,00**							$ -		$ -		**$ 379.902.648,00**
		* IVA (F) = (E) * (% IVA)				**$ 72.181.503,00**							**$ -**		**$ -**		**$ 72.181.503,00**
		* **Costo Total = (E) + (F)**				**$ 452.084.151,00**							**$ -**		**$ -**		**$ 452.084.151,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE MODIFICACIÓN DE COSTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-9-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	2 de 2

FECHA: 23/06/2026 (Día / Mes / Año)

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
VALOR TOTAL CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:	$ 379.902.648,00	$ 72.181.503,00	$ 452.084.151,00
VALOR EJECUTADO ACUMULADO (HASTA EL MES ANTERIOR):	$ -	$ -	$ -
VALOR PRESENTE ACTA DE MODIFICACIÓN (ADICIÓN):			$ -
SALDO POR EJECUTAR DEL CONTRATO:	$ 379.902.648,00	$ 72.181.503,00	$ 452.084.151,00

PLAZO EN MESES	
INICIAL	10
ADICIONAL	
ACUMULADO	1
FALTANTE	9

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, prórroga o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, prórroga o modificación y la fecha de suscripción:
Se realizan modificaciones con distribucion de cantidades de algunos items del contrato de Interventoria No 0754 de 2026, con el fin de poder cumplir con el correcto control y seguimiento del contrato de obra objeto de la interventoria. Dicha modificacion no requirió adicion de recursos.

NOTAS:

1. En caso de requerirse recursos que no estén previstos contractualmente, o cuando se trate de frentes adicionales de trabajo, el Interventor debe realizar la redistribución de recursos incluyendo las nuevas dedicaciones y presentar la solicitud debidamente justificada al Supervisor del Contrato de Interventoría para su trámite, tomando como referencia para los costos del personal las exigencias del pliego de condiciones y sus anexos en relación con la experiencia de los especialistas y para otros costos distintos las exigencias del pliego y los soportes a que haya lugar. En caso de ser aceptada se diligencia el Acta de Modificación de Costos para su aprobación.
2. "Ajuste al peso y/o Valor Remanente", el Valor Remanente corresponde a los recursos que pueden ser redistribuidos de acuerdo con las necesidades del proyecto, manteniendo el valor total del contrato.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta los que en ella intervinieron,

Firma
Nombre: KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
Representante Legal ARA INGENIERIA S.A.S.

Firma
Nombre: ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:068202-75786STD

Firma:
Nombre:
Titular Gerencia:
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: Denice Bibiana Acero Vargas
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 15202-093568

Revisión:

Director Territorial — Nombre: LEONEL VALERO ESCALANTE — Matrícula Profesional No.: 54202-088055 NTS — Firma: Firmado digitalmente por VALERO ESCALANTE LEONEL (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: — Matrícula Profesional No.: — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 22: Reprogramación plan de cargas
MEPI-MN1-IN-9-FR-2

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

CÓDIGO	MEP6-MN1-IN-9-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	23/06/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER**

PLAN DE CARGAS INICIAL X
REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS No. **01** (La numeración se debe llevar de forma consecutiva conforme al Acta de Modificación de Costos respectiva)
PLAN DE CARGAS FINAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **0754-2026**

OBJETO: **INTERVENTORÍA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VÍA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBÚ, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CÓDIGO BPIN NO. 20240214000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO".**

INTERVENTOR: **ARA INGENIERIA S.A.S.**
SUPERVISOR DE CONTRATO INTERVENTORIA: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO**
RESOLUCIÓN No.: **0525** DE **27-febrero-26** (Indicar el día/mes/año)
CONTRATO DE OBRA No.: **001-2025** CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA**

PLAZO INICIAL: **10.0** MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **20-abril-26** (Indicar día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: **22-mayo-26** (Indicar la suspensión mas reciente con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** $ **452.084.151,00** (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** $ **452.084.151,00**

PLAZO ACUMULADO: **10.0** MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **22-marzo-27** (Incluidas las suspensiones. Indicar día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: **22-junio-26** (Indicar día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** $ -

	Cantidad	CARGO / OFICIO	CONDICIONES INICIALES SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA				ACTUALIZACIÓN COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTA ANTERIOR No. __ de fecha _____		AÑO 2026														AÑO 2027						TOTAL	
											ACTA 01 20 Abril - 30 Abril de 2026		ACTA 02 01 Mayo - 21 de Mayo de 2026		ACTA 03 22 de Junio - 30 de Junio de 2026		ACTA 04 Julio de 2026		ACTA 05 Agosto de 2026		ACTA 06 Septiembre de 2026		ACTA 07 Octubre de 2026		ACTA 08 Noviembre de 2026		ACTA 09 Diciembre de 2026		ACTA 10 Enero de 2027		ACTA 11 Febrero de 2027		ACTA 12 Marzo 01 - Marzo 22 de 2027			
			Costos de Personal	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Horas-Mes)	Valor Total ($)	Costos de Personal	Prima Regional	Participación (h-mes)	Valor Total ($)	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL																																
		Director de Interventoría	$ 7.154.000,00		2,00	$ 14.308.000,00					0,15	1.073.100,00	0,20	1.430.800,00	0,10	715.400,00	0,20	1.430.800,00	0,20	1.430.800,00	0,20	1.430.800,00	0,20	1.430.800,00	0,20	1.430.800,00	0,20	1.430.800,00	0,20	1.430.800,00	0,20	1.430.800,00	2,25	16.096.500,00
		Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.365.000,00		10,00	$ 53.650.000,00					-	-	-	-	0,30	1.609.500,00	1,00	5.365.000,00	1,00	5.365.000,00	1,00	5.365.000,00	1,00	5.365.000,00	1,00	5.365.000,00	1,00	5.365.000,00	1,00	5.365.000,00	1,00	5.365.000,00	0,73	3.916.450,00	9,03	48.445.950,00
		Profesional Social	$ 3.892.000,00		5,00	$ 19.460.000,00					-	-	-	-	0,15	583.800,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	4,65	18.097.800,00
		Profesional Ambiental	$ 3.892.000,00		2,00	$ 7.784.000,00					-	-	-	-	0,10	389.200,00	0,20	778.400,00	0,20	778.400,00	0,20	778.400,00	0,20	778.400,00	0,20	778.400,00	0,20	778.400,00	0,20	778.400,00	0,20	778.400,00	0,20	778.400,00	1,90	7.394.800,00
		Profesional SST	$ 3.892.000,00		5,00	$ 19.460.000,00					-	-	-	-	0,15	583.800,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	0,50	1.946.000,00	4,65	18.097.800,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS (conforman esta bolsa los especialistas de amarillo)				$ 19.131.495,00																												
		Especialista en Pavimentos v/o Vías	$ 6.207.000,00		1,00	$ 6.207.000,00							0,20	1.241.400,00	0,20	1.241.400,00	0,30	1.862.100,00	0,30	1.862.100,00														1,00	6.207.000,00
		Especialista en Estructuras	$ 6.207.000,00		0,10	$ 620.700,00					-	-	-	-	0,10	620.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	620.700,00
		Especialista Ambiental	$ 6.207.000,00		0,30	$ 1.862.100,00					-	-	-	-	0,15	931.050,00	0,15	931.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,30	1.862.100,00
		Especialista en Geología v/o Geotecnia	$ 6.207.000,00		0,48	$ 2.993.295,00					-	-	-	-	0,20	1.241.400,00	0,28	1.751.895,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,48	2.993.295,00
		Especialista en Hidráulica y/o Hidrología	$ 6.207.000,00		0,10	$ 620.700,00					-	-	-	-	0,10	620.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	620.700,00
		Especialista SIG	$ 6.207.000,00		0,10	$ 620.700,00					-	-	-	-	0,10	620.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,10	620.700,00
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.207.000,00		1,00	$ 6.207.000,00					-	-	-	-	0,20	1.241.400,00	0,30	1.862.100,00	0,30	1.862.100,00	0,20	1.241.400,00													1,00	6.207.000,00
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 133.793.495,00					$	1.073.100,00	$	2.672.200,00	$	10.399.850,00	$	17.873.345,00	$	15.190.400,00	$	12.707.600,00	$	11.466.200,00	$	11.466.200,00	$	11.466.200,00	$	11.466.200,00	$	11.466.200,00	$	11.466.200,00	$	10.017.650,00	$	127.264.345,00
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,36					$	2,36	$	2,36	$	2,36	$	2,36	$	2,36	$	2,36	$	2,36	$	2,36	$	2,36	$	2,36	$	2,36	$	2,36	$	2,36	$	2,36
		SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				$ 315.752.648,00					$	2.532.516,00	$	6.306.392,00	$	24.541.758,00	$	42.181.894,00	$	35.849.344,00	$	29.989.936,00	$	27.060.232,00	$	27.060.232,00	$	27.060.232,00	$	27.060.232,00	$	27.060.232,00	$	27.060.232,00	$	23.641.654,00	$	300.343.854,00

No. de Orden	Cantidad	CONCEPTO	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total ($)	AÑO 2026														AÑO 2027						TOTAL	
											ACTA 01 20 Abril - 30 Abril de 2026		ACTA 02 01 Mayo - 21 de Mayo de 2026		ACTA 03 22 de Junio - 30 de Junio de 2026		ACTA 04 Julio de 2026		ACTA 05 Agosto de 2026		ACTA 06 Septiembre de 2026		ACTA 07 Octubre de 2026		ACTA 08 Noviembre de 2026		ACTA 09 Diciembre de 2026		ACTA 10 Enero de 2027		ACTA 11 Febrero de 2027		ACTA 12 Marzo 01 - Marzo 22 de 2027			
											H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR	H-M	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS																																
		VIATICOS																																
		Viaticos Director y/o Especialistas	$ 224.000,00	DIA	10,00	$ 2.240.000,00						-		-		-	2,00	448.000,00	2,00	448.000,00	2,00	448.000,00	2,00	448.000,00	2,00	448.000,00	2,00	448.000,00	2,00	448.000,00	2,00	448.000,00	2,00	448.000,00	18,01	4.032.000,00
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA																																
		Motocicletas (150 cc o mayor, cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato., incluye combustible y SOAT).	$ 684.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 6.840.000,00					-	-	-	-	0,30	205.200,00	1,00	684.000,00	1,00	684.000,00	1,00	684.000,00	1,00	684.000,00	1,00	684.000,00	1,00	684.000,00	1,00	684.000,00	1,00	684.000,00	1,00	684.000,00	0,03	6.176.520,00
		Trabajo de topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.522.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 32.610.000,00					-	-	-	-	-	-	1,00	6.522.000,00			1,00	6.522.000,00		-	1,00	6.522.000,00		-	1,00	6.522.000,00	1,00	6.522.000,00	0,20	1.335.464,00	5,20	33.945.464,00
		Ensayos de laboratorios (suelos, pavimentos, concretos, etc)	$ 568.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 5.680.000,00					-	-	-	-	0,30	170.400,00	1,00	568.000,00	1,00	568.000,00	1,00	568.000,00	1,00	568.000,00	1,00	568.000,00	1,00	568.000,00	1,00	568.000,00	1,00	568.000,00	1,00	568.000,00	9,30	5.282.400,00
		Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.157.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 5.785.000,00					-	-	-	-	0,30	347.100,00	1,00	1.157.000,00	1,00	1.157.000,00	1,00	1.157.000,00	1,00	1.157.000,00	1,00	1.157.000,00	1,00	1.157.000,00	1,00	1.157.000,00	1,00	1.157.000,00	0,73	844.610,00	9,03	10.447.710,00
		OTROS COSTOS																																
		Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	$ 1.262.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 6.310.000,00						-		-		-	1,00	1.262.000,00	1,00	1.262.000,00	1,00	1.262.000,00	1,00	1.262.000,00	1,00	1.262.000,00	1,00	1.262.000,00	1,00	1.262.000,00	1,00	1.262.000,00	1,00	1.262.000,00	9,00	11.358.000,00
		Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 421.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 2.105.000,00					0,37	155.770,00	0,70	294.700,00	0,30	126.300,00	1,00	421.000,00	1,00	421.000,00	1,00	421.000,00	1,00	421.000,00	1,00	421.000,00	1,00	421.000,00	1,00	421.000,00	1,00	421.000,00	0,73	307.330,00	10,10	4.252.100,00
		Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 316.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 1.580.000,00					0,37	116.920,00	0,70	221.200,00	0,30	94.800,00	1,00	316.000,00	1,00	316.000,00	1,00	316.000,00	1,00	316.000,00	1,00	316.000,00	1,00	316.000,00	1,00	316.000,00	1,00	316.000,00	0,73	230.680,00	10,10	3.191.600,00
		Veeduría Técnica Comunitaria	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 1.000.000,00					-	-	-	-	-	-	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	100.000,00	0,73	73.000,00	8,73	873.000,00
		AJUSTE AL PESO Y/O VALOR REMANENTE																																
	=	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (9) + (8)				$ 64.150.000,00					$	272.690,00	$	515.900,00	$	943.800,00	$	11.478.800,00	$	4.956.800,00	$	11.478.800,00	$	4.956.800,00	$	11.478.800,00	$	4.956.800,00	$	11.478.800,00	$	11.478.800,00	$	5.568.404,00	$	79.558.794,00	
	=	SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) + (C)				$ 379.902.648,00					$	2.805.206,00	$	6.822.292,00	$	25.485.558,00	$	53.659.894,00	$	40.805.344,00	$	41.467.936,00	$	32.016.232,00	$	38.538.232,00	$	32.016.232,00	$	38.538.232,00	$	38.538.232,00	$	29.210.858,00	$	379.902.648,00	
	+	IVA = 19% * (E) + (F)				$ 72.181.503,00					$	532.989,00	$	1.296.235,00	$	4.842.256,00	$	10.195.228,00	$	7.753.015,00	$	7.878.908,00	$	6.083.084,00	$	7.322.264,00	$	6.083.084,00	$	7.322.264,00	$	7.322.264,00	$	5.549.911,06	$	72.181.503,00	
	=	**COSTO TOTAL = (E) + (F)**				$ 452.084.151,00					$	3.338.195,00	$	8.118.527,00	$	30.327.814,00	$	63.854.322,00	$	48.558.359,00	$	49.346.844,00	$	38.099.316,00	$	45.860.496,00	$	38.099.316,00	$	45.860.496,00	$	45.860.496,00	$	34.759.969,00	$	452.084.151,00	

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

N/A

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (cuarto trimestre). Se debe indicar la justificación de la modificación. Cuando la causal corresponda a una adición, reinicio o modificación del contrato debe indicarse así mismo el número de la adición, reinicio o modificación y la fecha de suscripción.
Se realiza reprogramación al Plan de Cargas inicial con distribucion de cantidades de algunos items del contrato de Interventoria No 0754 de 2026, con el fin de poder cumplir con el correcto control y seguimiento del contrato de obra objeto de la interventoria. Dicha modificacion no requirió adicion de recursos.

NOTAS:

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de interventoría.
4. En los eventos de suspención del plazo contractual, el periodo real de suspención debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.
5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Para constancia de lo anterior se firma el presente Plan de Cargas

Firma:
Nombre: KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON
Representante Legal ARA INGENIERIA S.A.S.

Firma:
Nombre: ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 68202-75786 STD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 23: Acta de costos
MEPI-MN1-IN-8-FR-1

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PUBLICA
ACTA DE COSTOS

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-8-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1
FECHA	**miércoles, 16 de septiembre de 2026** (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: **SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES** DIRECCIÓN TERRITORIAL: **NORTE DE SANTANDER** ACTA Nº: **05** VALOR BÁSICO ACTA: **$ 29.617.182**

ACTA FINAL ☐ PERIODO: **agosto 01 a agosto 31 de 2026**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **0754-2026**

OBJETO:

INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 2024021400000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"

INTERVENTOR: **ARA INGENIERIA S.A.S**

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO**

CONTRATISTA: **UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO LA VICTORIA** CONTRATO DE OBRA Nº: **001-2025**

PLAZO INICIAL: **10,0** (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: **20-abril-2026** (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: **22/05/2026** (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A):** **$ 452.084.151,00** (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B):** **$ 452.084.151,00**

PLAZO ACUMULADO: **10,0** (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: **20-febrero-2027** (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: **22/06/2026** (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B):** **$ -**

No. de Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha : 23-07-2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN (H/M) - CANTIDAD	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Interventoría	$ 7.154.000,00	$ -	2,00	$ 14.308.000,00			2,25	$ 16.096.500,00	0,20	$ 1.430.800,00	0,85	$ 6.080.900,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría	$ 5.365.000,00	$ -	10,00	$ 53.650.000,00			9,03	$ 48.445.950,00	1,00	$ 5.365.000,00	1,83	$ 9.817.950,00
3	1	Profesional Social	$ 3.892.000,00	$ -	5,00	$ 19.460.000,00			4,65	$ 18.097.800,00	0,50	$ 1.946.000,00	1,00	$ 3.892.000,00
4	1	Profesional Ambiental	$ 3.892.000,00	$ -	2,00	$ 7.784.000,00			1,90	$ 7.394.800,00	0,20	$ 778.400,00	0,40	$ 1.556.800,00
5	1	Profesional SST	$ 3.892.000,00	$ -	5,00	$ 19.460.000,00			4,65	$ 18.097.800,00	0,50	$ 1.946.000,00	1,00	$ 3.892.000,00
		MONTO AGOTABLE DE ESPECIALISTAS				**$ 19.131.495,00**							0,00	$ -
		Especialista en Pavimentos y/o Vias	$ 6.207.000,00			$ -			1,00	$ 6.207.000,00		$ -	0,40	$ 2.482.800,00
		Especialista en Estructuras	$ 6.207.000,00			$ -			0,10	$ 620.700,00		$ -	0,00	$ -
		Especialista Ambiental	$ 6.207.000,00			$ -			0,30	$ 1.862.100,00		$ -	0,00	$ -
		Especialista en Geología y/o Geotecnica	$ 6.207.000,00			$ -			0,48	$ 2.993.295,00		$ -	0,00	$ -
		Especialista en Hidráulica y/o Hidrología	$ 6.207.000,00			$ -			0,10	$ 620.700,00		$ -	0,00	$ -
		Especialista SIG	$ 6.207.000,00			$ -			0,10	$ 620.700,00		$ -	0,00	$ -
		Especialista en Diseño Geométrico	$ 6.207.000,00			$ -			1,00	$ 6.207.000,00		$ -	0,00	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 133.793.495,00**				**$ 127.264.345,00**		**$ 11.466.200,00**		**$ 27.722.450,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				$ 2,36				$ 2,36		$ 2,36		$ 2,36
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 315.752.648,00**				**$ 300.343.854,00**		**$ 27.060.232,00**		**$ 65.424.982,00**

N°	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)*					ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. 1 de fecha : 23-07-2026		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
		VIATICOS												
	1	Viáticos Directo y/o especialistas	$ 224.000,00	Dia	10,00	$ 2.240.000,00			18,00	$ 4.032.000,00		$ -		$ -
		COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA												
	1	Motocicletas (150 cc o mayor cuyo modelo sea hasta seis (6) años anteriores al año de suscripción del contrato, incluye peajes y combustible)	$ 684.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 6.840.000,00			9,03	$ 6.176.520,00	1,00	$ 684.000,00	1,87	$ 1.279.080,00
	1	Trabajo de Topografía (incluye personal, equipo y transporte)	$ 6.522.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 32.610.000,00			5,20	$ 33.945.464,00		$ -		$ -
	1	Ensayos de laboratorios (suelos, pavimentos, concretos, etc)	$ 568.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 5.680.000,00			9,30	$ 5.282.400,00		$ -		$ -
	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y servicios públicos)	$ 1.157.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 5.785.000,00			9,03	$ 10.447.710,00	1,00	$ 1.157.000,00	1,87	$ 2.163.590,00
		OTROS COSTOS												
	1	Transportes aéreos y/o terrestres y/o marítimos y/o fluviales (incluye peajes y combustible)	$ 1.262.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 6.310.000,00			9,00	$ 11.358.000,00		$ -		$ -
	1	Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografías, videos, etc.	$ 421.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 2.105.000,00			10,10	$ 4.252.100,00	0,95	$ 399.950,00	3,32	$ 1.397.720,00
	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax, correo, internet, etc)	$ 316.000,00	Según comprobante por mes	5,00	$ 1.580.000,00			10,10	$ 3.191.600,00	1,00	$ 316.000,00	3,37	$ 1.064.920,00
	1	Veeduría Técnica Comunitaria	$ 100.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 1.000.000,00			8,73	$ 873.000,00		$ -		$ -
		Ajuste por Acta de modificación				$								
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 64.150.000,00**				**$ 79.558.794,00**		**$ 2.556.950,00**		**$ 5.905.310,00**
	*	**SUBTOTAL COSTOS BASICOS**				**$ 379.902.648,00**				**$ 379.902.648,00**		**$ 29.617.182,00**		**$ 71.330.292,00**
	*	IVA = 19%				$ 72.181.503,00				$ 72.181.503,00		$ 5.627.264,58		$ 13.552.755,48
	*	**COSTO TOTAL**				**$ 452.084.151,00**				**$ 452.084.151,00**		**$ 35.244.446,58**		**$ 84.883.047,48**

* Estos concentos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

ANTICIPO	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 113.970.794,00	30,0%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 8.885.155,00	2,3%
Valor Amortizado Acumulado	$ 21.399.090,00	5,6%
Valor Saldo por Amortizar	$ 92.571.704,00	24,4%

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 29.617.182,00**

VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: **$ 20.732.027,00**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: **$ 26.359.291,58** (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: **Veintiséis millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y un pesos con cincuenta y ocho centavos**

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
* Personal	$ 27.060.232,00	$ 5.141.444,08	$ 32.201.676,08
* Otros Costos Directos	$ 2.556.950,00	$ 485.820,50	$ 3.042.770,50
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 29.617.182,00	$ 5.627.264,58	$ 35.244.446,58

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Supervisor del contrato de interventoria se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de "Observaciones" del presente formato.
2. El Supervisor del contrato de interventoría certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Interventor, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Interventor de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Supervisor del contrato de interventoría asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el Interventor.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Interventor después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social integral, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría y cumplir con la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
7. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma:
Nombre: **KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGON**
Representante Legal
Interventoría **ARA INGENIERIA S.A.S**

Firma:
Nombre: **ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO**
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional Nº: **68202-75786 STD**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

ANEXO 24: Relación de la correspondencia

RELACION DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO	**INTERVENTORIA**
NUMERO CONTRATO	**0754-2026**
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA
INTERVENTOR	**ARA INGENIERIA SAS**
SUPERVISOR	ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO
PERIODO	01 al 31 de AGOSTP 2026

FECHA	RADICADO	ASUNTO	ENVIO	RECIBE	MEDIO DE ENVIO
4/08/2026	ARA –003– ADM	INFORME SEMANAL N° 10, CTO 0754-2026	Ara Ingenieria SAS	Ing Elkin, Ing Cristian.	correo electronico
10/08/2026		SOLICITUD PLAN DE GESTION SOCIAL	Ara Ingenieria SAS	Ing saul, Ing Elkin	correo electronico
10/08/2026		INFORME SEMANAL N° 11	Ara Ingenieria SAS	Ing Elkin , Ing Cristian.	correo electronico
11/08/2026		Excel acta N°4 para su revisión y visto bueno.	Ara Ingenieria SAS	Ing Elkin	correo electronico
18/08/2026	ARA-004-ADM	INFORME SEMANAL 13	Ara Ingenieria SAS	ing.ELKIN	correo electronico
19/08/2026	ARA-005-ADM	GA - Solicitud de información Ambiental.	Ara Ingenieria SAS	ing. Saul; ing. Elkin	correo electronico
20/08/2026	ARA-006-ADM	INFORME MENSUAL N°4 Y ACTA DE COSTOS N°4	Ara Ingenieria SAS	Ing Elkin , Ing Cristian.	correo electronico
24/08/2026	ARA-007-ADM	GT. INFORME SEMANAL N°14	Ara Ingenieria SAS	Ing Elkin , Ing Cristian.	correo electronico
31/08/2026	ARA-008-ADM	GT. informe semanal N°15	Ara Ingenieria SAS	Ing Elkin , Ing Cristian.	correo electronico

FIRMA
NOMBRE **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**
CARGO **DIRECTOR INTERVENTORIA**

RELACION DE CORRESPONDENCIA INTERVENTORIA

TIPO DE CONTRATO	**INTERVENTORIA**
NUMERO CONTRATO	**0754-2026**
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL PARA EL PROYECTO "MEJORAMIENTO EN LA VIA TERCIARIA A LA VEREDA CAÑO VICTORIA, MUNICIPIO DE TIBU, DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER, IDENTIFICADO CON CODIGO BPIN No 202402140000033, EN EL MARCO DEL MECANISMO DE OBRAS POR IMPUESTOS DE QUE TRATA EL ARTICULO 800-1 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO"
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL PLACA HUELLA CAÑO VICTORIA
INTERVENTOR	**ARA INGENIERIA SAS**
SUPERVISOR	ELKIN FABRIZZIO MEDINA DELGADO
PERIODO	01 al 31 de AGOSTP 2026

FECHA	RADICADO	ASUNTO	ENVIO	RECIBE	MEDIO DE ENVIO
3/08/2026	35 03082026	Carta Remisión a Interventoría PGIO de la PH Caño Victoria	Unión Temporal Placa Huella Caño Victoria	ARA Ingeniería S.A.S	correo
3/08/2026	36 03082026	Carta Remisión a Interventoría Plan de trabajo ajustado al AMO#1	Unión Temporal Placa Huella Caño Victoria	ARA Ingeniería S.A.S	correo
4/08/2026	Sin referencia	AMO#1 y Plan de Trabajo corregida la fecha de inicio	Unión Temporal Placa Huella Caño Victoria	ARA Ingeniería S.A.S	correo
5/08/2026	37 05082026	Carta Remisión a Interventoría Informe Mensual de Obra No. 1 correspondiente al mes de julio de 2026.	Unión Temporal Placa Huella Caño Victoria	ARA Ingeniería S.A.S	correo
5/08/2026	(38) 37 05082026	Carta Remisión a Interventoría Informe Técnico de caracterización de Materiales para mejoramiento de la PH Caño Victoria	Unión Temporal Placa Huella Caño Victoria	ARA Ingeniería S.A.S	correo
10/08/2026	39 10082026	Carta de remisión a la Interventoría del Plan de Gestión Social de Obra	Unión Temporal Placa Huella Caño Victoria	ARA Ingeniería S.A.S	correo
13/08/2026	40 13082026	CARTA DE REMISIÓN A LA INTERVENTORIA de respuesta al oficio ARA-003-ADM del 10 de agosto de 2026.	Unión Temporal Placa Huella Caño Victoria	ARA Ingeniería S.A.S	correo
13/08/2026	41 13082026	REMISIÓN A SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL_Solicitud de permiso de intervención en vía pública terciaria – Vereda Caño Victoria	Unión Temporal Placa Huella Caño Victoria	ARA Ingeniería S.A.S	correo
14/08/2026	43 14082026	REMISIÓN INTERVENTORÍA de Actas de vecindad y predial	Unión Temporal Placa Huella Caño Victoria	ARA Ingeniería S.A.S	correo
28/08/2026	44 28082026	REMISIÓN INTERVENTORÍA Actas de vecindad inicial y predial.	Unión Temporal Placa Huella Caño Victoria	ARA Ingeniería S.A.S	correo

FIRMA
NOMBRE **JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO**
CARGO **DIRECTOR INTERVENTORIA**

ANEXO 25: registro fotográfico y video del avance de las obras.

REGISTRO FOTOGRAFICO AVANCE DE LA OBRA

- comisión topográfica tramo 4.





- Almacenamiento de la herramienta menor del contratista; tramo 3.





- Chequeo con comisión topográfica tramo 2.



- Llega a obra tubería de 36 “ PVC.





- nivelación a cota de ub-rasante con maquinaria pesada-





- señalización PMT en tramo 4.





- Compactación en sub-rasante con vibro-compactador.



- Llega a obra más suministros para la intervención de la placa huella.






27 ago 2026 10:17:41 a. m.
8°34'46"N 72°42'1"W


27 ago 2026 10:36:11 a. m.
8°34'48"N 72°42'1"W

- Se realiza nivelacion a cota de sub-rasante con motoniveladora.






27 ago 2026 10:16:46 a. m.
8°34'46"N 72°42'0"W


27 ago 2026 10:16:32 a. m.
8°34'46"N 72°42'1"W

- llega a obra truturado de ¾ “



- Nivelacion con motoniveladora en tramo 3.





- Copactacion con vibro compactador en tramo3.



- Llega a obra acero de refuerzo, en zona de acopio tramo 3.





- Toma de densidades a sub-razante. Tramo 3 y 4.





- Instalacion de geotextil 1600 tramo 4





Instalacion de material de releno e=15 cm tramo 4.





- Intalacion de tuberia para alcantarilla de 36” tramo 1.






CAT



ANEXO 26: Registro fotográfico de las actividades ambientales sociales prediales y de sostenibilidad

REGISTRO FOTOGRAFICO AREA SOCIAL AGOSTO

- **VISITA AL PUNTO DE ATENCION:**











- REUNION CON AREA TECNICA Y SOCIAL PARA CONTRATACION DE MANO DE OBRA:




martes, 18 agosto 2026 04:17p. m.
8.58537206N 72.67070366W
#Caño Victoria #Tibú
Google


martes, 18 agosto 2026 04:54p. m.
8.58544377N 72.67068236W
#Caño Victoria #Tibú
Google

- TALLER SEGURIDAD VIAL:





- INSTALACION VALLA:



ANEXO 27: Bitácora del mes de julio 2026

29 de Julio 2026
continua la realizacion de la cota de vecindad en el sector
se realiza toma de muestra de material que se utilizara para
el mejoramiento de la vecindad

Residente de interventoria Residente de obra

30 de Julio 2026.
se realiza cota de vecindad, se realiza visita tecnica en la desvios
que esta realizando la comunidad, para poder iniciar los trabajos
en la via, llega a obra material y equipos para el proyecto.
mezcladora, equipos, planta, tanque, semaforos, baños, tanque;
camilla etc.

Residente de interventoria Residente de obra

31 de Julio 2026.
llega comision de topografia por parte del contratista, se realiza
recorrido y ubicacion de mojones del proyecto de placa huella en la
vereda Cano Victoria

Residente de interventoria Residente de obra

03 de agosto 2026
Clima: Soleado durante el dia lluvia durante la noche
equipos: . equipo topografico
Personal: obra residente, social, siso, cadenero y topografo
Personal inter: residente, social y sst.
Actividades: Se realizaron de terreno natural del tramo 4, trabajo
de oficina, control de tramo 4.

Residente inter. Residente obra

04- agosto-26
Clima: Soleado - llovio durant la noche
Equipo: topografico
Personal obra: Residente, social, SISO, cadenero y topografo
Personal interv: Residente
Actividades: Replanteo de tramo 3 y estacado de anchos de via.

Residente interv Residente obra

05- agosto-26
Clima: Soleado - llovio durant la noche
Equipo: topografico
Personal de obra: Residente, social, SISO, cadenero y topografo
Personal interv: Residente
Actividades: Nivelacion terreno natural tramo 03 y trabajo de oficina, corte tramo 03

Residente intl. Residente obra

06- agosto-26
Clima: Soleado
Equipo: topografico
Personal de obra: Residente, social, SISO, cadenero y topografo
Personal de intl: Residente
Actividades: Se realiza trabajos topografico en tramo 3, replanteo 200 ml.

Residente intl Residente obra

10-agos-26
Clima: Soleado.
Equipo: Topografico
Personal Obra: Residente, Social, Siso, Cadenero y topografico
Personal Interventoria: Residente.
Actividades: Se realiza replanteo, anchos de via en el tramo 2
Abscisado tramo 2.

Residente interv. Residente obra

11-agos-26
Clima: Soleado
Equipo: Topografico
Personal obra: Residente, Social, Siso, Cadenero y topografo.
Personal interv: ~~Ele Katerine Reff~~ Residente
Actividades: Se realiza replanteo, Abscisado de la via tramo 2
700 ml, llega a obra tubella 36" 4uni de 6,5 mts; llega a
obra geotextil 1600 tegido y tubella perforada para filtro.

Residente interv. Residente obra

12-agos-26
Clima: Soleado.
Equipo: Topografico
Personal de obra: Residente, Social, Siso, Cadenero y topografo.
Personal interv: Residente, siso. y social
Actividades: Se realiza replanteo, Absesisado de la via tramo 2.
700 ml.

Residente interv. Residente obra

13-08-26

Clima: Soleado - lluvias de 4-6 de la tarde

Equipo: Topografico; retro cargador 420D

Personal obra: Residente, sst, SISO, cadenero, topografo

Personal inter: Residente, siso, sst.

Actividades: llega a obra retro-cargador 420D de inicio a las labores de Nivelacion y conformacion de la Subrasante del tramo 4.

Se realiza señalizacion "PMT" en el inicio y final del tramo 4

Se realiza "10 X 0,4 X 5" m movimiento de tierra para la Nivelacion a cota de Subrasante

Residente inter — Residente obra

14-08-26

Clima: Soleado — lluvias durante la noche

Equipo: topografico; Retro-cargador 420D

Personal de obra: Residente; sst; social; Cadenero; topografo.

Personal intel: Residente

Actividades: Continuan los trabajos de conformacion y excavacion con retrocargador, esta compuesto con comision topografica tiene. rendimiento de "30 X 0,15 X 5" m³

El personal social realiza encuestas para Caracterizacion de la poblacion de la Vereda.

Residente intel — Residente obra

18-08-26

Clima: Soleado.

Equipo: Topografico; Retro-Cargador 420D.

Personal obra: Residente; sst; social; cadenero; topografo; conductor.

Personal intel: Residente.

Actividades: Continuan los trabajos de nivelacion con maquinaria retro-cargador 420D, compuesto con comision topografica

con un rendimiento de "20 x 0,25 x 5" m³, se presenta fallo en el inicio del tramo 4. Por parte de la interventoria solicita maquina "vibro-compactador". debido a que la rasante esta quedando suelta y se requiere que este debidamente compactada

Residente inter — Residente obra

19-08-26

Clima: Soleado.

Equipo: Topografico; Retro-Cargador 420D

Personal obra: Residente; SST; social; Cadenero; topografo; conductor.

Personal inter: Residente.

Actividades: Continuan los trabajos de nivelacion con maquinaria retro-cargador 420D acompañado con comision topografica, con un rendimiento de "35 x 5 x 0,15" m³. tramo 4.

El social continua realizando encuestas para caracterizacion de la poblacion de la vereda Caño victoria"

Residente inter — Residente obra

20-08-26

Clima: Soleado — lluvias durante la noche

Equipo: Topografico; retrocargador; vibro-compactador; motoniveladora

Personal obra: Residente; SST; Social; Cadenero; topografo; 3 conductores

Personal inter: Residente.

Actividades: Continuan los trabajos con maquinaria motoniveladora retrocargador y vibrocompactador de 8 ton, nivelaciones a cota de sub-rasante, acompañado con comision topografica. estos trabajos se estan ejecutando en el tramo 4 se realiza un rendimiento de "65 x 5 x 0,15" m³.

llega a obra pesa calles y avisos de desvios; se realiza taller de seguridad vial, acerca de la señalizacion instalada.

Residente inter — Residente obra

21-8-26

Clima: Soleado

Equipo: Topografico; retrocargador 420D; vibro compactador; motoniveladora

Personal obra: Residente; SST; social; cadenero; topografo; 3 conductores

Personal Interv: Residente.

Actividades: Continuan los trabajos con motoniveladora, retrocargador, vibro-compactador en el tramo 4. Se realizo "50 x 5 x 0,5" m^3 de nivelacion, conformacion de sub-rasante y ancho de via, acompañado con topografia; se instalan pase calles en los costados del tramo 4.

Residente Interv — Residente obra

24-8-26

Clima: Soleado. — llovio durante la noche

Equipo: Topografico; retrocargador 420D; vibro compactador; motoniveladora

Personal obra: Residente; SST; social; cadenero; topografo; 3 conductores

Personal Interv: Residente; SST; social.

Actividades: Se inicio excavacion y ancho de via en sub-rasante en tramo 3. No se trabajo con maquinaria durante la jornada de la mañana debido a que el suelo se encontraba saturado agua por llovias durante la noche; se realizo compactacion al tramo 4 con vibro-compactador; llega a obra triturado 3/4"

Residente Interv — Residente obra

25-08-26

Clima: Soleado

Equipo: Topografico; retrocargador 420D; vibro compactador; motoniveladora

Personal obra: Residente; SST; social; cadenero; topografo; 3 conductores

Personal Interv: Residente:

Actividades: retrocargador 420D realiza acondicionamiento en el area del tramo 1 para recepcion de material; se compacta la sub-rasante del tramo 3; la motoniveladora se alista trabajos del comite del trabajo de la comunidad; el tramo 3 esta en espera para

líder:

realiza densidades en tramo 3 y 4; llega a obra ing. ambiental del contratista ing. luis Aranda Avila.

Residente intei. Residente obra

26-08-26

Clima: Soleado.

Equipo: topografico; retrocargador; vibro compactador; motoniveladora

Personal obra: 1Residente; SST; social; Cadenero; topografo; 3 conductores

Personal interv: Residente.

Actividades: se realiza densidades de la sub-rasante en el tramo 3 y 4; llega a obra hierro 1/2" y 1/4". estribos 3/8" y 1/4" 35 ton; se pide al contratista retiri el material de tirado y el hierro de la intemperie; se realiza Nivelacion del tramo 2 con comision topografica

Residente intei Residente obra

27-08-26

Clima: soleado

Equipo: topografico; retrocargador; vibro compactador; motoniveladora.

Personal de obra: Residente; SST; social; cadenero; topografo; 3 conductores 1maestro; 1 oficial.

Personal intei: Residente.; SST; SOCial.

Actividades: se hace rectificacion de niveles en inicio de tramo 2 y se instala geotextil en el tramo 4 100 mL

Residente intei Residente obra

28-08-26

Clima: soleada

Equipo: topografico; retrocargador; vibro compactador; motoniveladora

Personal obra: topografo; residente; SST; social; cadenero; 3 conductores 1maestro; 1 oficial

Personal intei: Residente.

Actividades: se da charla a la comunidad para la instalacion

del tubo que será utilizado para una alcantarilla en el tramo 2 el día lunes; se continúa la instalación de geotextil en tramo 4 110 m L; se realiza desrol. en tramo 3.

Residente inti — Residente obra

31-08-26

clima: Soleado

Equipos topográfico; retrocargador; rodillo compactador; motoniveladora cargador.

Personal obras: Residente; SST; social; topografo; cadenero; 3 conductores oficial; 3 obreros

Personal interventoría: Residente.

Actividades: El día sabado se inicia la instalación del material de mejoramiento en el tramo 4, llega a obra triturado 3/4" 27 m³; se instala tubería de 36" de la alcantarilla en el tramo 2, se realiza excavación mecánica con pajonte y se compacta con rana en los alrededores hasta la parte superior del tubo K4+775. la motoniveladora realiza trabajos de extendido d. material de mejoramiento en tramo 4

Residente inter — Residente obra

31-08-26
