8. MEMORIA DE CANTIDADES DEL ACTA PARCIAL N° 3

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
25	ANLLY VANNESA CARVAJAL ACOSTA - 4844	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²) para toda la unidad habitacional								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

Página 1

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
46	CONSUELO OCHOA ARENAS - 4734	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 	m2	0,00	HABITACIÓN 1					0,00
				HABITACIÓN 2					0,00
				HALL					0,00
				SALÓN SOCIAL					0,00
				SALÓN SOCIAL					0,00
				PUERTAS					0,00
				COCINA					0,00
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,99				9,99
				HALL	1,48				1,48
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	451,52	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)					0,00
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)					0,00
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

Página 2

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
49	LUZ GLADIS ARCILA GIRALDO - 5452	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-1	PICADO O RAYADO DE PISO 	ml	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	GK	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,76	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 3

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Nº	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL. EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
52	HERMINDA VERGARA PUERTA - 4643	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 		3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 4

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
70	BLANCA ELENA JIMENEZ ALAGUANA - 4532	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		24,85	HABITACIÓN 1					0,00
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		24,85	HABITACIÓN 1					0,00
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		30,40	HABITACIÓN 1					0,00
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

NP-5 — TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5)  — 2293,98

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
ARENA (M3)	1,15	1400,00			1614,26
CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	0,99	364,00			361,82
CERÁMICA PISO (X cajas)	13,93	15,00			208,90
CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,25	15,00			18,79
PEGACOR	24,85	3,15			78,28
BOQUILLA	24,85	0,48			11,93

Página 5

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL. EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
86	OLGA MONTENEGRO - 4831	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,58	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,58	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 		3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 6

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
89	RUBI NELLY PEREZ - 5123	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 7

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
92	CARMEN VICTORIA RODRIGUEZ CUPAJITA - 3623	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 8

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
95	MIREYA HURTATIS - 5421	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 9

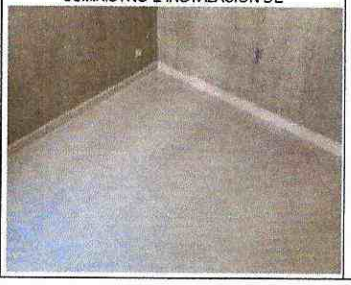
POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
119	ANA LILIANA FERREIRA YARA - 3221	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 11

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
120	LUZ CIEL CARVAJAL VELEZ - 4932	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 		3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 12

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 569 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
123	FLOR ALBA MUR OROZCO - 3642	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 		3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 13

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
128	LUZ ASTRID ABELLANEDA YARA - 5132	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 		31,23	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA					0,00
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		31,23	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA					0,00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		35,40	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA					0,00
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 		2881,19	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,45	1400			2028,70
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,25	364,00			454,71
				CERÁMICA PISO (X cajas)	17,50	15,00			262,54
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,46	15,00			21,88
				PEGACOR	31,23	3,15			98,37
				BOQUILLA	31,23	0,48			14,99

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

Página 14

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 588 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL. EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
148	MARIA RUTH BELTRAN QUINTERO - 5332	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,48				1,48
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 		3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 15

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
164	MARTHA LUCIA QUINTERO JAIME - 4934	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 		3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERAMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 16

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
181	MARIA HILDA GUAR ULTENGO - 3521	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ML	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 17

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 588 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
186	MARIA ARGENIS CARRILLO - 5333	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-1	PICADO O RAYADO DE PISO 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ML	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,48				1,48
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,98	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 18

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
196	EDWIN LEONEL CHIA - 2424	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ML	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 19

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
210	NIDIA PEREZ HERRERA - 3841	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ML	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,99				9,99
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,98	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 20

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
212	LUCELLY ASCENSIO - 5041	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²), para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ML	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 21

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
122	JOSE WILFER VALERO CHIA - 4552	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²) para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ML	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 22

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
35	OMAYRA PRADA - 1944	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ML	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 23

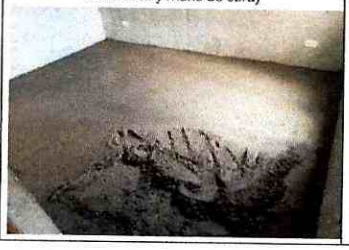
POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
223	GESSICA XIHOMARA GARCIA MUÑOZ - 6144	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ML	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 24

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 588 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
48	MARIA ODILIA RAMIREZ DE ALZATE - 3651	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ML	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 25

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
253	ERIKA MARCELA SANCHEZ VASQUEZ - 3754	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Cerarnico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 		3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 26

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
72	ARNULFO SALAZAR RODRIGUEZ - 3854	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 27

NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 		3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

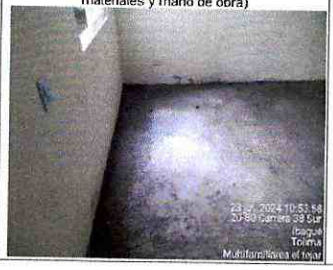
POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL. EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
5	LUZ MARINA BOCANEGRA VILLADA - 4131		
INTERVENCION No	MODALIDAD 2	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
		INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 		3280,96						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
PEGACOR	35,33	3,15			111,29
BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 28

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL. EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
42	JOSE DAIRO SILVA - 4513	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 29

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
254	EDELIA CECILIA CONDE GONZALEZ - 4824	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 30

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
145	MARIA LIBIA JARAMILLO - 4611	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 31

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
167	LUZ MARY TOVAR ALVIS - 4632	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 		3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 32

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
136	LUZ AMPARO SIERRA GARCIA - 5234		
INTERVENCION No	MODALIDAD 2	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
		INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 		35.33	HABITACIÓN 1	2.95	3.55			10.47
				HABITACIÓN 2	2.95	2.40			7.08
				HALL	1.56	0.90			1.40
				SALÓN SOCIAL	3.93	2.75			10.81
				SALÓN SOCIAL	2.10	0.60			1.26
				PUERTAS	2.60	0.08			0.21
				COCINA	2.10	1.95			4.10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35.33	HABITACIÓN 1	2.95	3.55			10.47
				HABITACIÓN 2	2.95	2.40			7.08
				HALL	1.56	0.90			1.40
				SALÓN SOCIAL	3.93	2.75			10.81
				SALÓN SOCIAL	2.10	0.60			1.26
				PUERTAS	2.60	0.08			0.21
				COCINA	2.10	1.95			4.10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42.50	HABITACIÓN 1	12.10				12.10
				HABITACIÓN 2	9.98				9.98
				HALL	1.46				1.46
				SALÓN SOCIAL	11.86				11.86
				COCINA	7.10				7.10

NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 		3260.96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1.64	1400			2295.04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1.41	364.00			514.40
				CERAMICA PISO (X cajas)	19.80	15.00			297.00
				CERAMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1.75	15.00			26.27
				PEGACOR	35.33	3.15			111.29
				BOQUILLA	35.33	0.48			16.96

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

Página 33

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 588 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
138	LUZ AMPARO SIERRA GARCIA - 5234		
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
		INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 		35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 		42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

NP-5 — TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5)  — 3260,96

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
CERAMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
PEGACOR	35,33	3,15			111,29
BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

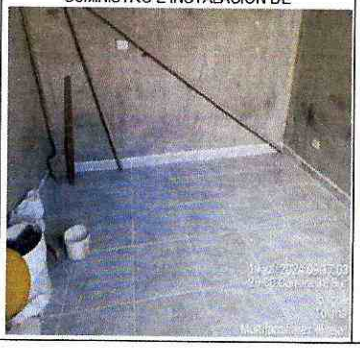
POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

Página 33

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

252	DIANA MARGARITA JARAMILLO CHAGUALA - 3324	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR
		CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 35

POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
287	FABIOLA CANO CABRERA - 0131	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,80	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,80	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
PEGACOR	35,33	3,15			111,29
BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 36

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
268	MARTHA MENDEZ CASTIBLANCO - 0133	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
PEGACOR	35,33	3,15			111,29
BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 37

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

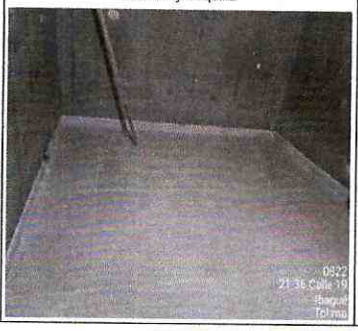
Nº	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 668 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
78	SOL MARINA BERNAL - 0343	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41.0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3280,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 38

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA								Código: F-IP-172
284	JOSE EUSTACIO BONILLA RODRIGUEZ - 0822								Versión: 2
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2			CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS				
				INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S				
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²) para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 39

POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:

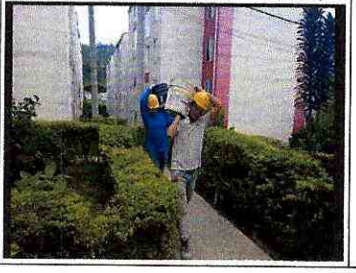
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
272	EMILCE GALINDO GUALTERO - 1042	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²), para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,60	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 40

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 588 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
292	MARTHA LICENIA CAMPOS RAMIREZ - 1252	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	m2	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,98	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 41

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
280	MARTHA OTILIA CEBALLOS LARREA - 1314	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 	m2	28,25	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	0,00	0,00			0,00
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	28,25	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	0,00	0,00			0,00
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ml	32,52	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	0,00				0,00
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 42

POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
155	NANCY MIKENA VERA CUEVA - 1433	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41.0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,98						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
PEGACOR	35,33	3,15			111,29
BOQUILLA	36,33	0,48			16,96

Página 43

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
294	FRANCELINA MORENO GUTIERREZ - 1434	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²) para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,58	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,98

Página 44

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
289	DIANA MAYERLY MONTOYA GALEANO - 1624	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 45

POR EL CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES

RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:

Firma:

Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME

RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
299	RIGOBERTO PIRAQUIVE TELLEZ - 2133	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,88				11,88
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
PEGACOR	35,33	3,15			111,29
BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 47

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 688 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
262	LUCERO ALBAN BARRAGAN - 2152	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

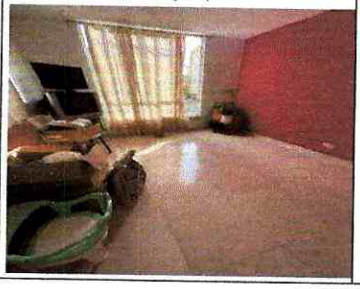
Página 48

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL. EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
265	NELLY FORRERO BELTRAN - 2223	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	m2	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 49

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
263	ANDREA MENDEZ MARIN - 3053	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²). para								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 50

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
154	MARIA CENOBIA TABORDA - 3441	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 51

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVAREZ TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

12. MEMORIA DE CANTIDADES DEL ACTA PARCIAL N° 4

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
118	HECTOR VIDAL RUBIO - 0111	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10 ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	m2	78,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	m2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP-2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-6	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	und	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 1

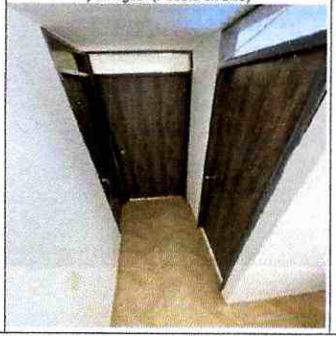
POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
307	DISNEY MATAJUDIOS BORJA - 0122	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	m2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	m2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP-2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-6	Suministro e intalacion de Puerta en RH espesor 3.8 cm, H: 2.00 m y ancho entre 0.60m - 0.90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas (Puesta en sitio) 	und	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 2

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
59	MEDARDO SANCHEZ GUZMAN - 2524	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10 ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	m2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	m2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALON SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP-2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-6	Suministro e Instalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 4

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
74	JOSE IGIDIO BRAVO CPRRALES - 0831	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	14,57	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	0,00	2,40			0,00
				HALL	0,00	0,90			0,00
				SALÓN SOCIAL	0,00	2,75			0,00
				SALÓN SOCIAL	0,00	0,60			0,00
				PUERTAS	0,00	0,08			0,00
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	14,57	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	0,00	2,40			0,00
				HALL	0,00	0,90			0,00
				SALÓN SOCIAL	0,00	2,75			0,00
				SALÓN SOCIAL	0,00	0,60			0,00
				PUERTAS	0,00	0,08			0,00
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	19,20	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	0,00				0,00
				HALL	0,00				0,00
				SALÓN SOCIAL	0,00				0,00
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	1345,90	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	0,68	1400,00			946,47
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	0,58	364,00			212,14
				CERAMICA PISO (X cajas)	8,17	15,00			122,55
				CERAMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	0,79	15,00			11,85
				PEGACOR	14,57	3,15			45,90
				BOQUILLA	14,57	0,48			6,99
NP-8	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	1,00	HABITACION 1				1,00	1,00

Página 5

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
274	RUBBY STELLA GONZALEZ HURTADO - 2652	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 6

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
330	OLGA LUCIA SOTO CASTIBLANCO - 1742	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	31,23	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	0,00	1,95			0,00
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	31,23	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	0,00	1,95			0,00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	35,40	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	0,00				0,00
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	KG	2881,19	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,45	1400			2030,00
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,25	364,0			453,43
				CERÁMICA PISO (X cajas)	17,50	15,00			262,50
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,46	15,00			21,90
				PEGACOR	31,23	3,15			98,37
				BOQUILLA	31,23	0,48			14,99

Página 7

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
276	ANA OFELIA GUZMAN ZAMORA - 2011	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²) para toda la unidad habitacional								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	17,55	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	0,00	0,90			0,00
				SALÓN SOCIAL	0,00	2,75			0,00
				SALÓN SOCIAL	0,00	0,60			0,00
				PUERTAS	0,00	0,08			0,00
				COCINA	0,00	1,95			0,00
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	17,55	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	0,00	0,90			0,00
				SALÓN SOCIAL	0,00	2,75			0,00
				SALÓN SOCIAL	0,00	0,60			0,00
				PUERTAS	0,00	0,08			0,00
				COCINA	0,00	1,95			0,00
NP-2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	22,08	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	0,00				0,00
				SALÓN SOCIAL	0,00				0,00
				COCINA	0,00				0,00
NP-6	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACION 1				1,00	3,00

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

Página 8

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
329	ELIZABETH YARA MARTINEZ - 2541	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	kg	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
297	LIGIA PEREZ BUSTOS - 2752	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	kg	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 11

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
277	SANDRA LILILIANA CARDENAS - 2821	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

Página 70

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
267	LUZ STELLA VARGAS - 4724	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
320	JOHN EDINSON NOGUERA - 3454	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	kg	3260,96						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
PEGACOR	35,33	3,15			111,29
BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

Página 13

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
316	OFELIA MARGOTH GALINDO - 4024	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 14

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
331	LINA JOHANA GOMEZ - 4953		
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
		INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2.10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	kg	3260,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
269	LEMNY JOHANA CUELLAR PASTRANA- 5154	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCIÓN No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

Página 16

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	kg	3280,96	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1,64	1400,00			2295,04
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1,41	364,00			514,40
				CERÁMICA PISO (X cajas)	19,80	15,00			297,00
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1,75	15,00			26,27
				PEGACOR	35,33	3,15			111,29
				BOQUILLA	35,33	0,48			16,96

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
386	YOLIMA ESTELA LISCANO HERNANDEZ - 5223	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 17

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS. PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
324	LORENA PATRICIA SANCHEZ MEJIA- 5222	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 18

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
275	NAYIETH MENDEZ VARGAS -4524	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ML	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 19

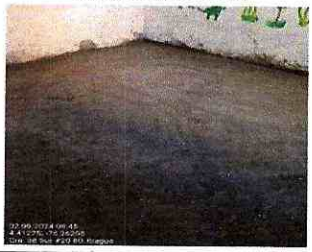
POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
286	LORENZA GUTIERREZ - 4812	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	M2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ML	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 20

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
77	JANETH TRUJILLO PEÑA - 0141	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10 ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	78,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm. H: 2.00 m y ancho entre 0,60m - 0,80m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	2,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	66,34	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
				VINILO (galón)	7,64	6,00			45,84
				ESTUCO (MP)	10,00	2,05			20,50

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

Página 22

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

153	ERIBERTO ALARCON LEYTON - 0124				CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES					
INTERVENCION No	MODALIDAD 10			CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS					
				INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-4	Adherencia Estuco 	UND	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 24

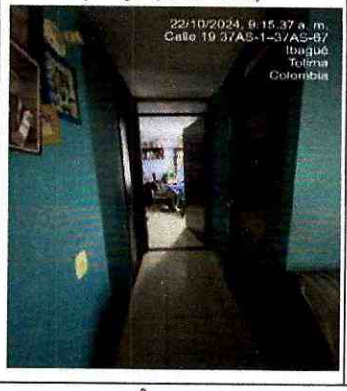
POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
304	SANDRA PATRICIA RUIZ TOVAR - 0142	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 25

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
59	RODOLFO VARGAS RODRIGUEZ - 0223	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10° ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
2.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	49,20	HABITACIÓN 1	12.10		2.30	1.00	27.83
				VENTANA 1 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				VENTANA ALTA (-)		0.40	0.40	-1.00	-0.16
				HABITACIÓN 2	9.98		2.30	1.00	22.95
				VENTANA 2 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				HALL	0.60		2.30	1.00	1.38
2.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	49,20	HABITACIÓN 1	12.10		2.30	1.00	27.83
				VENTANA 1 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				VENTANA ALTA (-)		0.40	0.40	-1.00	-0.16
				HABITACIÓN 2	9.98		2.30	1.00	22.95
				VENTANA 2 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				HALL	0.60		2.30	1.00	1.38
				VANO VENTANA COCINA (-)		0.70	2.30	-1.00	-1.61
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1.00	BAÑO				1.00	1.00
NP-4	Adherencia Estuco 	UND	49,20	HABITACIÓN 1	12.10		2.30	1.00	27.83
				VENTANA 1 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				VENTANA ALTA (-)		0.40	0.40	-1.00	-0.16
				HABITACIÓN 2	9.98		2.30	1.00	22.95
				VENTANA 2 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				HALL	0.60		2.30	1.00	1.38
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor 3,8 cm, H 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0.90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3.00	HABITACIÓN 1				1.00	1.00
				HABITACIÓN 2				1.00	1.00
				BAÑO				1.00	1.00

Página 26

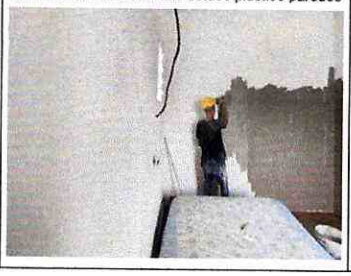
POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 588 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
64	FLOR MARIA BERMUNEZ VARGAS - 0313	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS

10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	69,50	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	8,83		2,30	1,00	20,31
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 28

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
243	DIANA MARCELA GIL CUARTAS - 0312	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	5,00	HABITACIÓN 1	1,00		1,00	1,00	1,00
				HABITACIÓN 2	1,00		1,00	1,00	1,00
				HALL	1,00		1,00	1,00	1,00
				SALÓN SOCIAL	2,00		1,00	1,00	2,00
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	5,00	HABITACIÓN 1	1,00		1,00	1,00	1,00
				HABITACIÓN 2	1,00		1,00	1,00	1,00
				HALL	1,00		1,00	1,00	1,00
				SALÓN SOCIAL	2,00		1,00	1,00	2,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor 3,8 cm, H. 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 30

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
247	ALBA MAYORLY GARZON HORTA - 0321	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	78,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	20,00	HABITACIÓN 1	4,00		2,00	1,00	8,00
				HABITACIÓN 2	2,00		2,00	1,00	4,00
				HALL	2,00		2,00	1,00	4,00
				SALÓN SOCIAL	2,00		2,00	1,00	4,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 31

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
31	ORLANDA GONZALEZ MORA - 0454	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	66,34						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
VINILO (galón)	7,64	6,00			45,84
ESTUCO (M²)	10,00	2,05			20,50

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
65	JANETH TRUJILLO PEÑA - 0443	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	76.47	HABITACIÓN 1	12.10		2.30	1.00	27.83
				VENTANA 1 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				VENTANA ALTA (-)		0.40	0.40	-1.00	-0.16
				HABITACIÓN 2	9.98		2.30	1.00	22.95
				VENTANA 2 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				HALL	1.77		2.30	1.00	4.07
				SALÓN SOCIAL	11.86		2.30	1.00	27.28
				VENTANA 3 (-)		1.50	1.80	-1.00	-2.70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plastico paredes 	M2	5.00	HABITACIÓN 1	1.00		1.00	1.00	1.00
				HABITACIÓN 2	1.00		1.00	1.00	1.00
				HALL	1.00		1.00	1.00	1.00
				SALÓN SOCIAL	2.00		1.00	1.00	2.00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1.00	BAÑO				1.00	1.00
NP 3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3.8 cm, H 2.00 m y ancho entre 0.60m - 0.90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas (Puesta en sitio) 	UND	3.00	HABITACION 1				1.00	1.00
				HABITACIÓN 2				1.00	1.00
				BAÑO				1.00	1.00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	56.09	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
				VINILO (galón)	7.64	6.00			45.84
				ESTUCO (M²)	5.00	2.05			10.25

Página 33
Página 34

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
151	ANA CIDELIA DELGADO - 0424		
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
		INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	69,50	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	8,83		2,30	1,00	20,31
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Porno+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 35

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Nº	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
182	GILMA BALENCIA LOPEZ - 0553	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10. ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm. H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Porno+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	66,34						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
VINILO (galón)	7,64	6,00			45,84
ESTUCO (M²)	10,00	2,05			20,50

Página 36

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
176	JOSE ADONAY VELASQUEZ VERA - 0511	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3.8 cm, H: 2.00 m y ancho entre 0.60m - 0.90m variable + Marco+ chapa Porno+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 37

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
202	NANCY OSPINA GUERRERO - 0513		
INTERVENCIÓN No.	MODALIDAD 10	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
		INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 38

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
143	MARIA EFIGENIA CALDERON BROCHERO - 0314	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
2,1,1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
2,1,2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 29

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

1.

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
12	SANDRA PATRICIA MAHECHA ACOSTA - 0652	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	88,34						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
VINILO (galón)	7,64	6,00			45,84
ESTUCO (M²)	10,00	2,05			20,50

Página 41

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
179	BELSAR ROJAS GALEANO - 0641	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	78,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,96		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	66,34	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
				VINILO (galón)	7,64	6,00			45,84
				ESTUCO (M²)	10,00	2,05			20,50

Página 43

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
34	VICTOR MANUEL VARGAS BONLLA - 1912	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2,1,1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
2,1,2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	35,33	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA	2,10	1,95			4,10
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	m2	42,50	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,46				1,46
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
				COCINA	7,10				7,10

Página 45

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
291	ROMULO MILCIADES PENCUE ORTIZ- 4434	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
2	MODALIDAD 2: Pisos completos (41,0 m²): para toda la unidad habitacional								
2.1.1	Alistado de piso con mortero 1:4, e=4 cm (Incluye materiales y mano de obra) 	m2	31,23	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA					0,00
2.1.2	Suministro e instalación de Piso Ceramico incluye aditivos y boquilla 	m2	31,23	HABITACIÓN 1	2,95	3,55			10,47
				HABITACIÓN 2	2,95	2,40			7,08
				HALL	1,56	0,90			1,40
				SALÓN SOCIAL	3,93	2,75			10,81
				SALÓN SOCIAL	2,10	0,60			1,26
				PUERTAS	2,60	0,08			0,21
				COCINA					0,00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA 	ml	35,40	HABITACIÓN 1	12,10				12,10
				HABITACIÓN 2	9,98				9,98
				HALL	1,48				1,48
				SALÓN SOCIAL	11,86				11,86
NP-5	TRASIEGO DE MATERIALES (PISO 3, 4 Y 5) 	kg	2881,19	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg)* UND			TOTAL
				ARENA (M3)	1.45	1400			2028,70
				CEMENTO (X M3 DE MORTERO)	1.25	364,00			454,71
				CERÁMICA PISO (X cajas)	17.50	15,00			262,54
				CERÁMICA GUARDAESCOBAS (X cajas)	1.46	15,00			21,88
				PEGACOR	31,23	3,15			98,37
				BOQUILLA	31,23	0,48			14,99

Página 46

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
23	BETTY YANED MORENO CORREA - 0352	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	ANCHO	ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	5,00	HABITACIÓN 1	2,00		1,00	1,00	2,00
				HABITACIÓN 2	1,00		1,00	1,00	1,00
				HALL	1,00		1,00	1,00	1,00
				SALÓN SOCIAL	1,00		1,00	1,00	1,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	56,09						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
VINILO (galón)	7,64	6,00			45,84
ESTUCO (M²)	5,00	2,05			10,25

Página 47

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP- 172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
97	ROSALBA GARCIA ACOSTA - 0731	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	78,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Traslego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	68,34						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
VINILO (galón)	7,64	6,00			45,84
ESTUCO (M²)	10,00	2,05			20,50

Página 48

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
326	MARIA AIDE MORALES - 1454	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 2	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerte en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	66,34	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
				VINILO (galón)	7,64	6,00			45,84
				ESTUCO (M²)	10,00	2,05			20,50

Página 49

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA
189	INGRID GISELY TORRES - 1623	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor. 3,8 cm, H 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0.90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 50

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA
270	ESPERANZA TRIANA CULMA - 1722	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 51


POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
176	LEIDY JOHANA MIRANDA MALAGON - 1734	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10 ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10 1 1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
10 1 2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
				VANO VENTANA COCINA (-)		0,70	2,30	-1,00	-1,61
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-4	Adherencia Estuco 	UND	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm. H. 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 52

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
237	LUZ OFELIA GALVIS CHAVEZ - 0543	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCIÓN No	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10 ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalacion de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALON SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor 3,8 cm, H. 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	66,34						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
VINILO (galón)	7,64	6,00			45,84
ESTUCO (M²)	10,00	2,05			20,50

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

Página 39

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
75	LLAMIRED GUARNIZO OYOLA - 1952	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S A S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
				VANO VENTANA COCINA (-)			0,70	2,30	-1,00	-1,61
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-4	Adherencia Estuco 	UND	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	267,67	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
				VINILO (galón)	2,46	6,00			14,77
				ESTUCO (M²)	49,20	2,05			100,86
				PEGACOR (M²)	49,20	3,09			152,04

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

Página 53

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
28	LILIA GARZON FLOREZ - 2013	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	47,82	HABITACIÓN 1	12.10		2.30	1.00	27.83
				VENTANA 1 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				VENTANA ALTA (-)		0.40	0.40	-1.00	-0.16
				HABITACIÓN 2	9.98		2.30	1.00	22.95
				VENTANA 2 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				HALL	0.00		2.30	1.00	0.00
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	47,82	HABITACIÓN 1	12.10		2.30	1.00	27.83
				VENTANA 1 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				VENTANA ALTA (-)		0.40	0.40	-1.00	-0.16
				HABITACIÓN 2	9.98		2.30	1.00	22.95
				VENTANA 2 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				HALL	0,00		2,30	1,00	0,00
				VANO VENTANA COCINA (-)		0,70	2,30	-1,00	-1,61
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-4	Adherencia Estuco 	UND	47,82	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,00		2,30	1,00	0,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0.60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

Página 54

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 588 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA
290	MARTHA RUBY RATINA OLAYA - 2542	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

Página 55

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	20,00	HABITACIÓN 1	4,00		2,00	1,00	8,00
				HABITACIÓN 2	2,00		2,00	1,00	4,00
				HALL	2,00		2,00	1,00	4,00
				SALÓN SOCIAL	2,00		2,00	1,00	4,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H. 2.00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Traslego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	86,84						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
VINILO (galón)	7,64	6,00			45,84
ESTUCO (M²)	20,00	2,05			41,00

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA
290	MARTHA RUBY RATINA OLAYA - 2542	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	20,00	HABITACIÓN 1	4,00		2,00	1,00	8,00
				HABITACIÓN 2	2,00		2,00	1,00	4,00
				HALL	2,00		2,00	1,00	4,00
				SALÓN SOCIAL	2,00		2,00	1,00	4,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalación de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	86,84	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
				VINILO (galón)	7,64	6,00			45,84
				ESTUCO (M²)	20,00	2,05			41,00

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

Página 55

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Pagina 5

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS NUCLEOS FAMILIARES EL TEJAR DE LA
199	JOSE ORLANDO PERDOMO - 2543	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3.8 cm, H: 2.00 m y ancho entre 0.60m - 0.90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 588 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
251	HECTOR SANCHEZ - 2644	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S.

Página 57

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
				VANO VENTANA COCINA (-)		0,70	2,30	-1,00	-1,61
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-4	Adherencia Estuco 	UND	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	267,67	ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
				VINILO (galón)	2,46	6,00			14,77
				ESTUCO (M²)	49,20	2,05			100,86
				PEGACOR (M²)	49,20	3,09			152,04

Página 58

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL, EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
245	YURIKA PATRICIA SANCHEZ - 2642	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
10.1.2	Suministro e instalación de estucó plástico paredes 	M2	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
				VANO VENTANA COCINA (-)		0,70	2,30	-1,00	-1,61
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-4	Adherencia Estuco 	UND	49,20	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	0,60		2,30	1,00	1,38
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00
NP-5	Trasiego de materiales (Pisos 3,4 y 5) 	KG	267,67						

ITEM	CANTIDAD	PESO (Kg) * UND			TOTAL
VINILO (galón)	2,46	6,00			14,77
ESTUCO (M²)	49,20	2,05			100,86
PEGACOR (M²)	49,20	3,09			152,04

Página 59

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA CIUDAD DE IBAGUE-TOLIMA
328	CARMEN JULIA MUÑOZ MONTOYA - 2711	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA LARGO	MEDIDA ANCHO	MEDIDA ALTO	No. UNIDADES	SUBTOTAL
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre estuco 	M2	56,66	HABITACIÓN 1	12.10		2.30	1.00	27.83
				VENTANA 1 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				VENTANA ALTA (-)		0.40	0.40	-1.00	-0.16
				HABITACIÓN 2	9.98		2.30	1.00	22.95
				VENTANA 2 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				HALL	3.84		2.30	1.00	8.83
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	40,10	HABITACIÓN 1	12.10		2.30	1.00	27.83
				VENTANA 1 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				VENTANA ALTA (-)		0.40	0.40	-1.00	-0.16
				HABITACIÓN 2	5.00		1.00		5.00
				VENTANA 2 (-)					0.00
				HALL	3.84		2.30	1.00	8.83
				VANO VENTANA COCINA (-)		0.70	2.30	-1.00	-1.61
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-4	Adherencia Estuco 	UND	33,72	HABITACIÓN 1	12.10		2.30	1.00	27.83
				VENTANA 1 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				VENTANA ALTA (-)		0.40	0.40	-1.00	-0.16
				HABITACIÓN 2					0.00
				VENTANA 2 (-)					0.00
				HALL	3.24		2.30	1.00	7.45
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Porno+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1.00	1.00
				HABITACIÓN 2				1.00	1.00
				BAÑO				1.00	1.00

Página 60

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA
16	SALVADOR GARCIA LOPEZ - 2714	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING. SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12.10		2.30	1.00	27.83
				VENTANA 1 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				VENTANA ALTA (-)		0.40	0.40	-1.00	-0.16
				HABITACIÓN 2	9.98		2.30	1.00	22.95
				VENTANA 2 (-)		1.00	1.40	-1.00	-1.40
				HALL	1.77		2.30	1.00	4.07
				SALÓN SOCIAL	11.86		2.30	1.00	27.28
				VENTANA 3 (-)		1.50	1.80	-1.00	-2.70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	49,27	HABITACIÓN 1	9.55		2.20	1.00	21.01
				HABITACIÓN 2	6.20		2.20	1.00	13.64
				HALL	2.10		2.20	1.00	4.62
				SALÓN SOCIAL	10.00		1.00	1.00	10.00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1.00	1.00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3.8 cm. H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas. (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1.00	1.00
				HABITACIÓN 2				1.00	1.00
				BAÑO				1.00	1.00

Página 61

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

PROSPERIDAD SOCIAL	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA	Código: F-IP-172
	PROCESO: Implementación de Políticas, Programas y Proyectos	Versión: 2

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

N°	BENEFICIARIO	OBJETO:	CONTRATAR LAS OBRAS EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 568 FIP DE 2022 CONSISTENTE EN OBRAS LOCATIVAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA FOCALIZADAS Y PRIORIZADAS POR PROSPERIDAD SOCIAL EN LOS MULTIFAMILIARES EL TEJAR DE LA
171	MARIA ANTONIA TAVERA LIZCANO - 1442	CONTRATISTA:	BIOCIVIL ING SAS
INTERVENCION No.	MODALIDAD 10	INTERVENTOR:	MEDINA&RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S

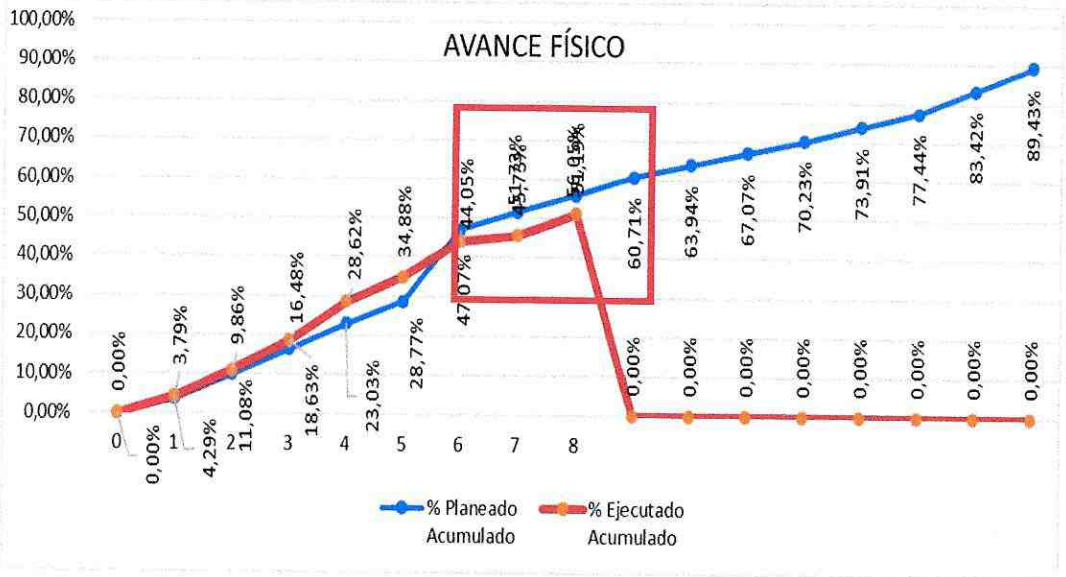
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	LOCALIZACION	MEDIDA			No. UNIDADES	SUBTOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
10	MODALIDAD 10: ESTUCO, VINILO Y PUERTAS								
10.1.1	Suministro e instalación de Vinilo 3 manos sobre 	M2	76,47	HABITACIÓN 1	12,10		2,30	1,00	27,83
				VENTANA 1 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				VENTANA ALTA (-)		0,40	0,40	-1,00	-0,16
				HABITACIÓN 2	9,98		2,30	1,00	22,95
				VENTANA 2 (-)		1,00	1,40	-1,00	-1,40
				HALL	1,77		2,30	1,00	4,07
				SALÓN SOCIAL	11,86		2,30	1,00	27,28
				VENTANA 3 (-)		1,50	1,80	-1,00	-2,70
10.1.2	Suministro e instalación de estuco plástico paredes 	M2	10,00	HABITACIÓN 1	3,00		1,00	1,00	3,00
				HABITACIÓN 2	2,00		1,00	1,00	2,00
				HALL	2,00		1,00	1,00	2,00
				SALÓN SOCIAL	3,00		1,00	1,00	3,00
NP2	DESMONTE DE PUERTA 	UND	1,00	BAÑO				1,00	1,00
NP-3	Suministro e Intalacion de Puerta en RH espesor: 3,8 cm, H: 2,00 m y ancho entre 0,60m - 0,90m variable + Marco+ chapa Pomo+ Bisagras de 3X3" zincadas y omegas (Puesta en sitio) 	UND	3,00	HABITACIÓN 1				1,00	1,00
				HABITACIÓN 2				1,00	1,00
				BAÑO				1,00	1,00

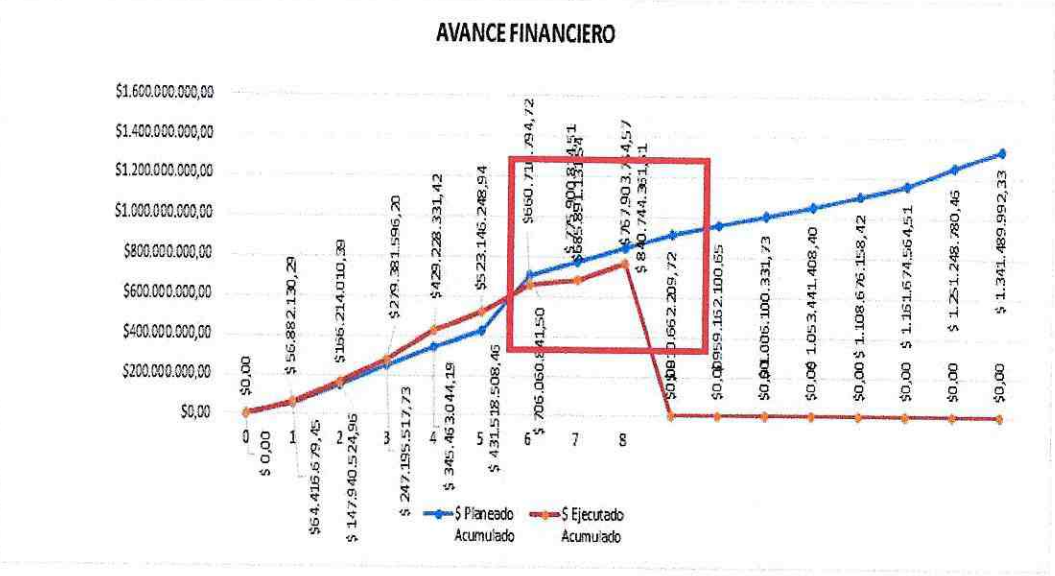
Página 62

POR EL CONTRATISTA:
Firma:
Nombre: ING. OSCAR JULIO ALVARES TORRES
RESIDENTE DE OBRA CONTRATISTA

POR LA INTERVENTORÍA:
Firma:
Nombre: ARQ. ALVARO CAMELO JACOME
RESIDENTE DE OBRA INTERVENTORÍA

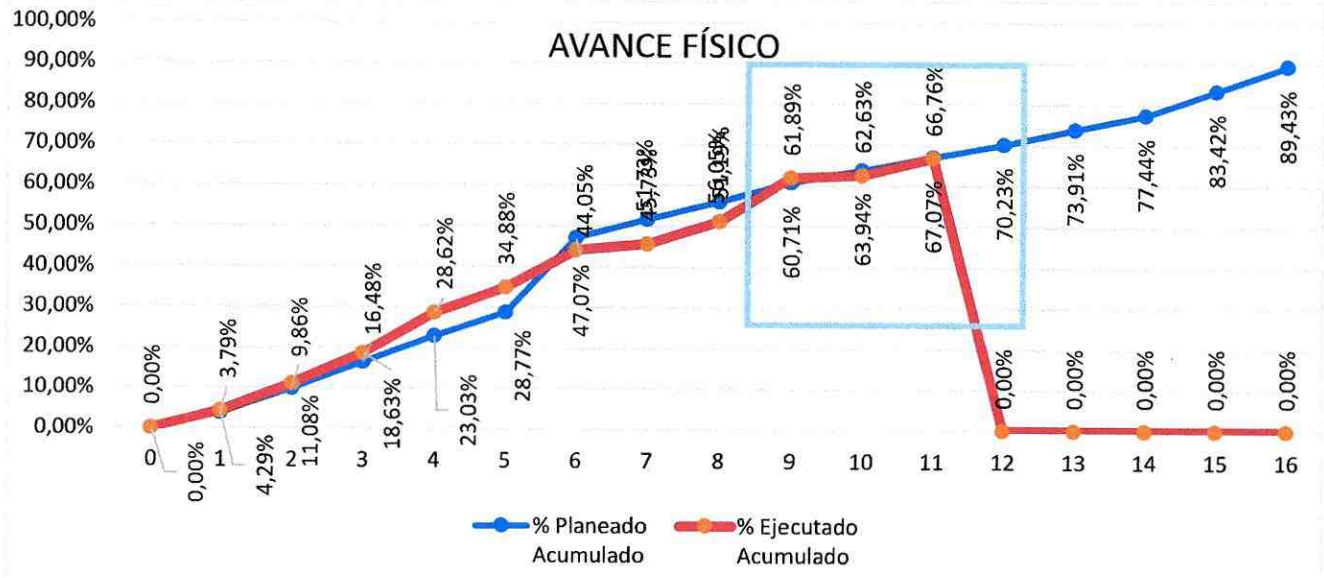
12. DESCRIPCION DEL AVANCE DE OBRA PROGRAMADA



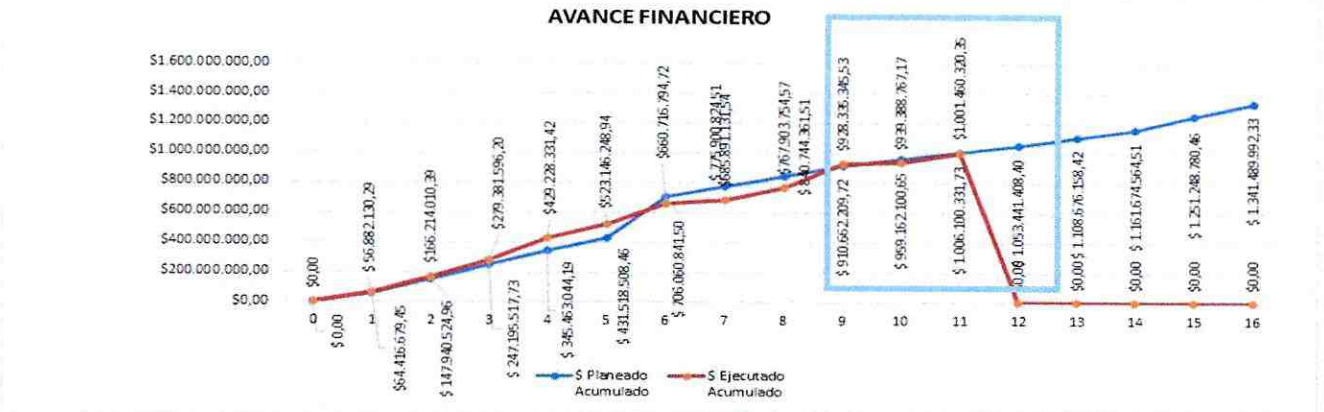


Se estipula en la programación de obra un 56,05% de avance físico para el segundo mes con un valor igual a: $767'903.754,57; estos valores equivales aproximadamente a 51 intervenciones incluyen del 1 al 7 de agosto, septiembre 1 corresponde al 30 y del 1 al 15 del mes de Octubre cuenta con 22 días de ejecución. Por lo anterior, se toma la semana 2 dentro de Octubre en este informe.

13. DESCRIPCION DEL AVANCE DE OBRA EJECUTADA



Se lleva a la fecha en ejecución en obra un 66,76% de avance físico para fin de mes de Octubre con un valor



igual a: $1'007.460,320,76; incluyendo las 57 intervenciones del acta # 4 a fin del mes de Octubre. Para las dos actas se necesitaron 103 intervenciones, quedando pendiente el 33.24% de obra por finalizar el 100%.

14. BITÁCORA POR CONTRATISTA E INTERVENTORIA
