

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
0			**MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COM-PLEMENTARIAS EN EL BARRIO PALMAS CENTRO POBLADO PUERTO OLAYA DEL MUNICIPIO DE CIMITARRA,**	**45 días**	**mié 28/10/26**	**mié 16/12/26**	
1							
2			**PRELIMINARES**	**45 días**	**mié 28/10**	**mié 16/12/26**	
3			Comision topografica	4,5 días	mié 28/10	mar 3/11/26	
4			Excavación sin retiro, en material comun y/o	11 días	mar 3/11/26	lun 16/11/26	3
5			Suministro e instalacion de arenilla para sentar tuberia	7 días	jue 5/11/26	jue 12/11/26	4CC+2 días
6			Relleno material seleccionado, compactado ejecutado con máquina	12 días	vie 27/11/26	jue 10/12/26	13;16;17
7			Retiro y disposición de material sobrante	5 días	jue 10/12/26	mié 16/12/26	6
8			**TUBERÍA**	**14 días**	**sáb 7/11/**	**lun 23/11/26**	
9			Suministro e instalacion Tuberia de PVC de 8 "	10 días	sáb 7/11/26	mié 18/11/26	5CC+2 días
10			Suministro e instalacion tuberia de PVC de 6 "	4 días	mié 11/11/26	lun 16/11/26	9CC+3 días
11			Suministro e instalacion Silla yee 8-6	4 días	mié 18/11/26	lun 23/11/26	10;9
12			**CAJAS Y POZOS DE INSPECCION**	**20 días**	**jue 5/11/26**	**vie 27/11/26**	
13			Cajas de inspeccion de 0,80 x 0,80	8 días	mié 18/11/26	vie 27/11/26	11CC
14			Concreto de 3500 psi para base, cañuelas y cilindro pozo de inspeccion y estructuras	10 días	jue 5/11/26	lun 16/11/26	4CC+2 días
15			Mamposteria en ladrillo para pozo de inspeccion	6 días	mar 17/11/26	lun 23/11/26	14
16			Suministro e instalación de corona y tapa en hierro fundido para pozo de	2 días	lun 23/11/26	mié 25/11/26	15
17			Suministro e instalacion de charnela Ø 8"	2 días	lun 16/11/26	mar 17/11/26	10

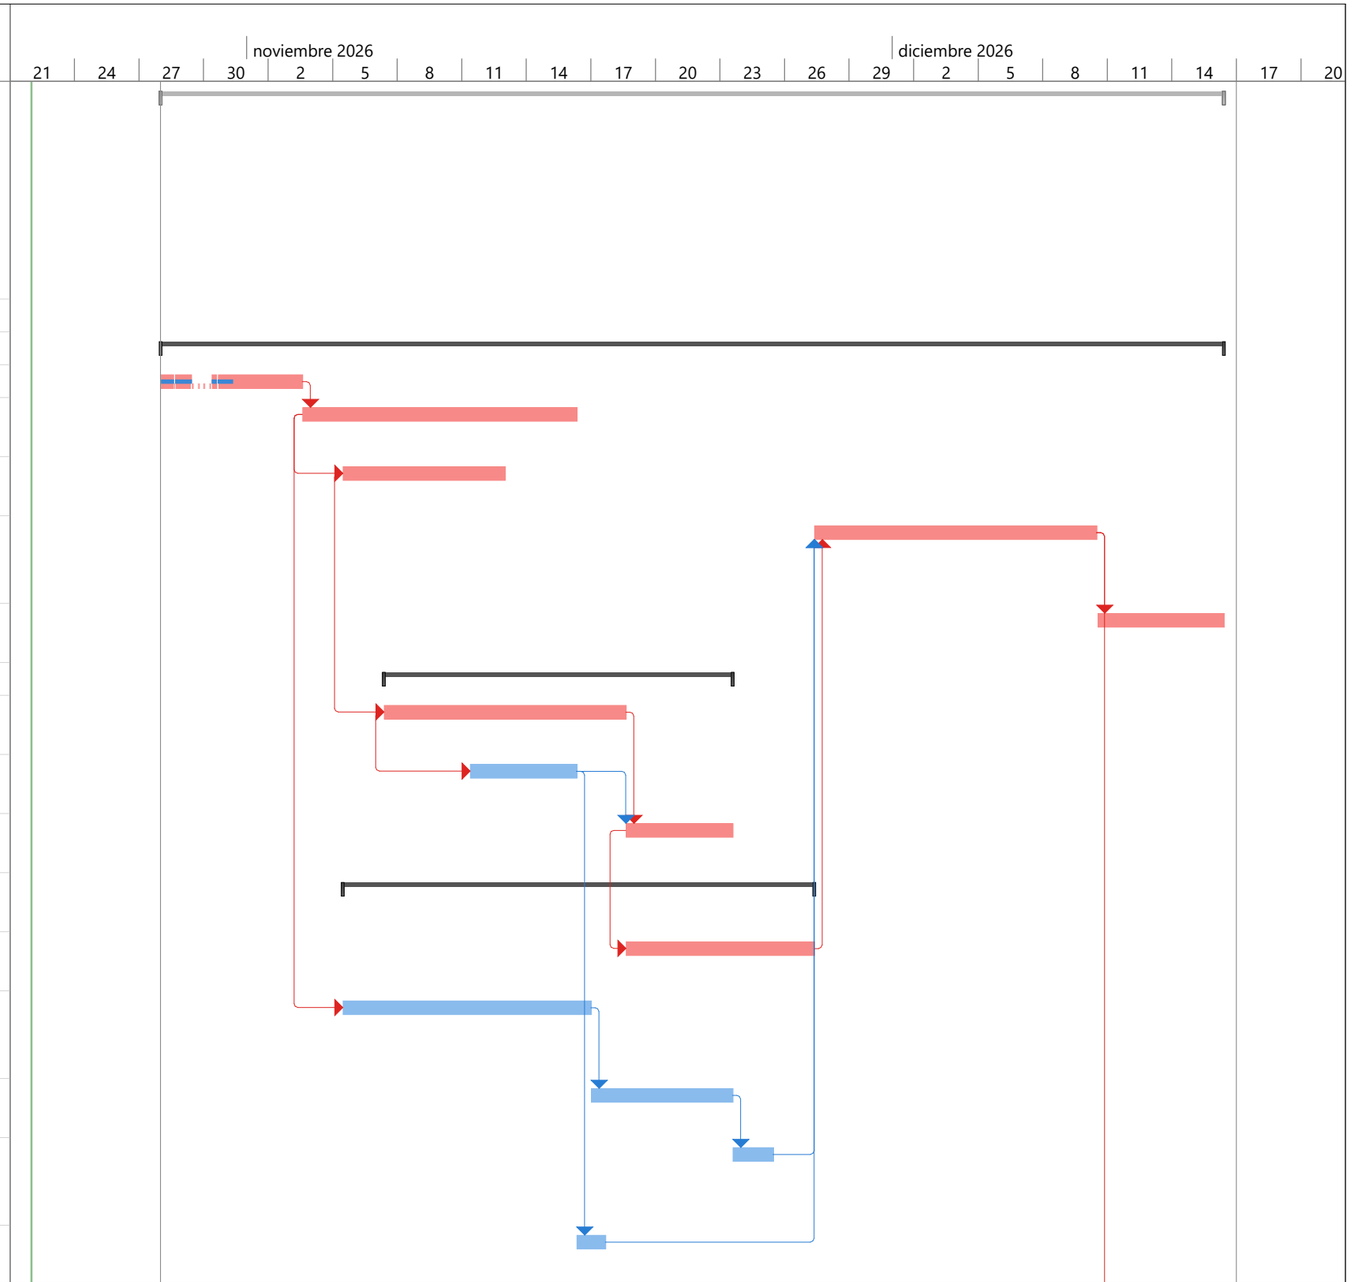

Proyecto: MEJORAMIENTO Y C
Fecha: jue 22/10/26

Tarea	Tarea inactiva	Informe de resumen manual	Hito externo	Progreso manual	
División	Hito inactivo	Resumen manual	Fecha límite		
Hito	Resumen inactivo	solo el comienzo	Tareas críticas		
Resumen	Tarea manual	solo fin	División crítica		
Resumen del proyecto	solo duración	Tareas externas	Progreso		

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
18			**MANTENIMIENTO PTAR Y REDES**	**43 días**	**mié 28/10/26**	**lun 14/12/26**	
19			suministro, instalacion y puesta en funcionamiento sistema de bombeo del tanque subterraneo al tanque elevado de aireacion (inc. Bombas, tuberia conduccion, estructura de izaje de bombas para mantenimiento)	25,5 días	sáb 31/10/26	sáb 28/11/26	21
20			Limpieza red de alcantarillado (inc. Pozos y sumideros)	3 días	jue 10/12/26	lun 14/12/26	19;6
21			Retiro de lodos y tratamiento (inc. Excavacion)	4 días	mié 28/10/26	sáb 31/10/26	

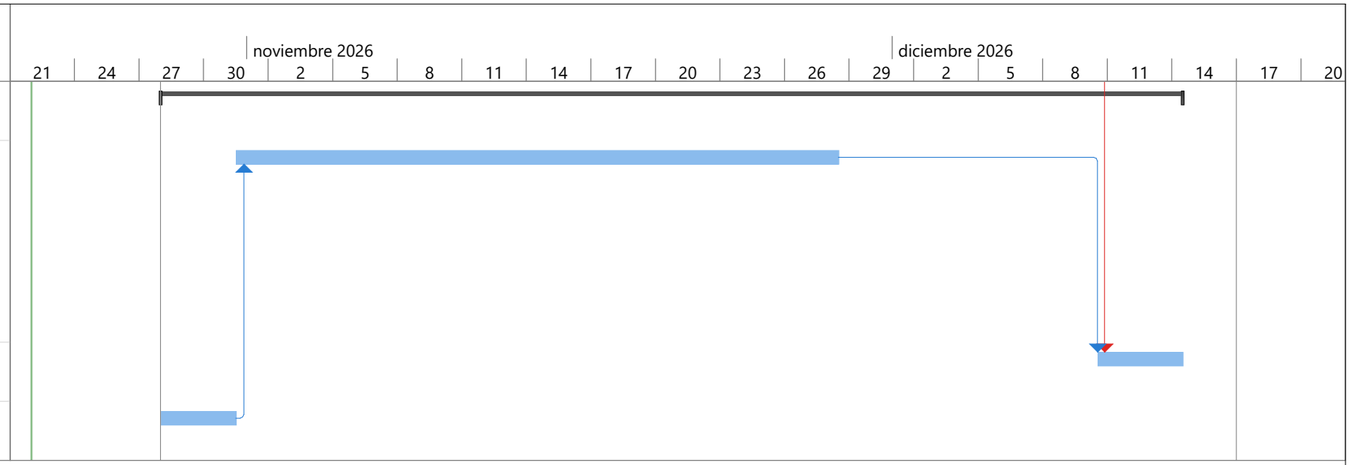

Proyecto: MEJORAMIENTO Y C
Fecha: jue 22/10/26

Tarea
División
Hito
Resumen
Resumen del proyecto
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
solo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
solo el comienzo
solo fin
Tareas externas
Hito externo
Fecha límite
Tareas críticas
División crítica
Progreso
Progreso manual
