NIT. 901320986-8

JSK-ICCU-**316**-180

Bogotá D.C. 17 de octubre de 2026

Señores
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA ICCU
contactenos@iccu.gov.co

Atn: Ing. SANDRA ROCÍO CASTILLO
sandra.castillo@iccu.gov.co
Directora de Caminos

Atn: Ing. SANDRA CASTAÑEDA
sandra.castaneda@iccu.gov.co
Apoyo a la Supervisión
Ciudad

Ref. Contrato 316 de 2026 - "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA".

Asunto: Remisión de informe semanal N°8

Cordial saludo.

Por medio de la presente, se remite el Informe Semanal N° 8, correspondiente al periodo de ejecución del contrato ICCU-CTO-316-2026 del 29 de septiembre al 05 de octubre de 2026.

Cordialmente,

VLADIMIR POLO PAZ
Director del Proyecto

C.C: Oficina

Elaboró: Ing. Angie Castro-Residente de interventoría
Revisó: Dra. María Isabel del Rio Pájaro

Anexo: 6 Folios

ICCU	**FORMATO**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-034
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN**	1
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA	**FECHA**	29/10/2025

PERIODO DE INFORME SEMANAL

JESAK	JESAK SAS	**FECHA**	martes, 6 de octubre de 2026	**SEMANA No.**	**8**	DEL	29-sep-26	AL	5-oct-26

1. INFORMACIÓN GENERAL



OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL AL PROYECTO " MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR EL CORZO HASTA EL MUNICIPIO DE BOJACÁ, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"
LOCALIZACIÓN PROYECTO	Municipio de Bojacá, Cundinamarca.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**	
CONTRATO No.:	ICCU-CTO-316-2026	**CONTRATO No.:**	ICCU-CTO-0319-2026
PLAZO INICIAL:	5 meses	**PLAZO INICIAL:**	5 meses
CONTRATISTA:	JESAK SAS	**CONTRATISTA:**	UNIÓN TEMPORAL PROYECTOS INTEGRALES 2025.
FECHA DE INICIACIÓN:	11 de agosto de 2026	**FECHA DE INICIACIÓN:**	11 de agosto de 2026
***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A	***FECHA DE SUSPENSIÓN:**	N.A
***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A	***FECHA DE REINICIACIÓN:**	N.A
FECHA DE TERMINACIÓN:	10 de enero de 2027	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	10 de enero de 2027
PLAZO ACTUALIZADO:	150	**PLAZO ACTUALIZADO:**	150
PLAZO TRANSCURRIDO:	55 días (36,67%)	**PLAZO TRANSCURRIDO:**	55 días (36,67%)
VALOR INICIAL :	$ 264.284.125	**VALOR INICIAL :**	$ 2.218.687.216
VALOR ADICION:	$ -	**VALOR ADICION:**	$ -
VALOR ACTUALIZADO:	$ 264.284.125	**VALOR ACTUALIZADO:**	$ 2.218.687.216
VALOR PAGADO:	$ -	**VALOR PAGADO:**	$ -
VALOR POR PAGAR:	$ 264.284.125	**VALOR POR PAGAR:**	$ 2.218.687.216
VALOR ANTICIPO:	$ 52.856.825	**VALOR ANTICIPO:**	$ 443.737.443,20
SUPERVISOR:	Ing. Sandra Rocio Castillo Gonzalez	**SUPERVISOR:**	JESAK SAS

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones, reinicios y adiciones.

2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Durante el período correspondiente al presente informe, se adelantaron las siguientes actividades:

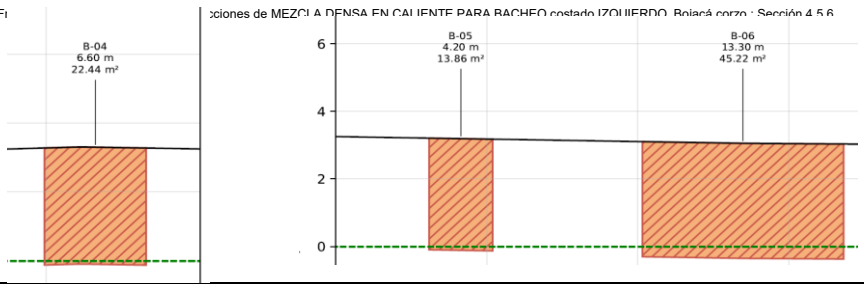29 de septiembre de 2026	Frente 1: Instalación de SBG Sector Cunetas Fente 2: Instalación de BG para la actividade de Bacheo Se realiza levantamiento por parte de la comisión de topografía de interventoría en el frente 2 Asfalto , donde se realiza la medición Altimetrica y planimetrica sobre los 300 metros, donde se instalará la carpeta asfaltica En el Frente 2 No se autoriza la instalación de asfalto hasta no contar con las densidades de la BG
30 de septiembre de 2026	*Frente 1 Cunetas :Toma de densidades por parte del laboratorío del contratista PSI en la BG costado izquierdo Bojaca -Corzo 1.Material Afirmado K0+500 Densidad 98,7% 2.Material SBG K0+165 Densidad 99,9% 3..Material SBG K0+270 Densidad 96,0% *Frente 2 Asfalto, costado derecho Bojacá-Corzo Toma de densidades por parte del laboratorío del contratista PSI 1.Material BG K4+760 Densidad 101% 2.Material BG K4+970 Densidad 100,2% Por lo anterior la interventoría autoriza la instalación de la mezcla asfaltica costado derecho Bojacá Corzo Se realiza recorrido de obra presencial con la supervisión del ICCU en compañia del contratista e interventoría
01 de octubre de 2026	Frente 2: Se realiza excavación , lleno y compactación de material de BG en las zonas de Bacheo Costado Bojacá corzo Frente 1 Cunetas : Se continua con la instalación y compactación de material de afirmado y subbase
2 de octubre de 2026	Frente 1 Cunetas : Por parte de interventoría , el laboratorio Concrelab toma densidades a la capa SBG así: 1.Material SBG K0+165 Densidad 96,9% 2.Material SBG K0+250 Densidad 94,3% 3.Material SBG K0+340 Densidad 91,8% Por lo anterior la interventoría se libera el tramo del K0+220 A K0+300 Se debe recompactar la SBG del K0+220 AL K0+300 Del k0+300 en adelante el contratista debe tomar densidades nuevamente Frente 2Asfalto: Por parte de interventoría , el laboratorio Concrelab toma densidades a la capa BG así: 1.Material BG K4+790 Densidad 97,3% 2.Material BG K4+880 Densidad 101,8% Se realiza comité de Obra presencial N°7 con todos los componentes.
3 de octubre de 2026	Se presentan lluvias en horas de la noche. Perfilación de la zona de cunetas previo instalación de formaleta para vaciado del concreto
4 de octubre de 2026	Día Domingo . Sin Actividad
5 de octubre de 2026	Frente 2:Se realiza Las siguientes 2 secciones de MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO costado Derecho Bojacá corzo : Sección 16 y 17  Fr cciones de MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO costado IZQUIERDO Bojacá corzo : Sección 4,5,6 

3. CONTROL DE EJECUCIÓN

3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA

No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)	Programado			Real Ejecutado			Días desfase al inicio de la	Días desfase al final de la actividad
		Fecha Inicial programada por actividad	Fecha Final programad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1.1	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR(INCLUYE RETIRO DESOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	25-ago-26	15-dic-26	113	8-sep-26	30-dic-26	114	-14	-15
1,4	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL(INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	15-oct-26	15-dic-26	62			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2,1	RAJÓN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE	1-nov-26	30-nov-26	30			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2,2	AFIRMADO	1-nov-26	30-nov-26	30			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2,3	SUB BASE GRANULAR	1-sep-26	22-dic-26	113	24-sep-26	15-ene-27	114	-23	-24
2,4	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1	22-sep-26	31-oct-26	40			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2.5	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	22-sep-26	31-oct-26	40			no iniciado	no iniciado	no iniciado
2.8	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA BACHEO (INCLUYE CEMENTO ASFÁLTICO)	22-sep-26	31-oct-26	40	30-sep-26	9-nov-26	41	-8	-9
2.9	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	8-sep-26	15-dic-26	99	8-sep-26	16-dic-26	100	0	-1
3.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 3500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	15-oct-26	5-ene-27	83			pendiente	no iniciado	no iniciado

Plazo del proyecto: 134 días

** Por favor registre las fechas reales de inicio y terminación de la actividad crítica

3.2. CONTROL DE PROGRAMACION


AVANCE FISICO DEL CONTRATO

	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)
Acumulado anterior	14,47%	5,90%	-8,57%
Durante el periodo	6,21%	1,44%	-4,77%
Acumulado Actual	20,68%	7,34%	-13,34%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO

DURACIÓN (DÍAS)	DIAS TRANSCURRI.	DIAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DIAS
150	56,00	94,00	-20,01

GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO

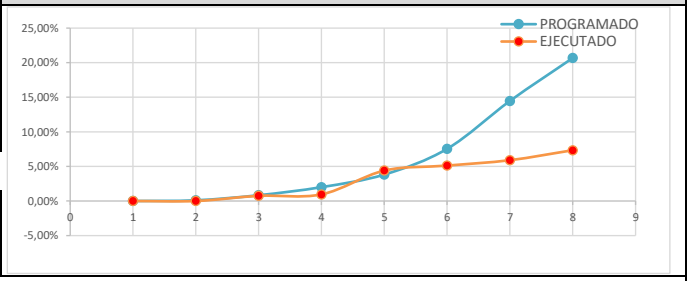

3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO


AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	$ 321.042.951	$ 130.941.868	40,79%
Durante el periodo	$ 137.783.351	$ 31.957.881	23,19%
Acumulado Actual	$ 458.826.303	$ 162.899.749	35,50%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

64,50%

GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO




AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO

	ACUMULADO PROGRAMADO ($) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO ($) MILLONES	INDICADOR (%)
Acumulado anterior	no se ha tramitado		0%

AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO

0%

GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO



4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO

* El día 02-10-2026 se asiste de manera presencial al Comité Integral de oBra CTO ICCU (comité integral 7), se realiza recirrido de verificación en obra. La interventoría realiza verificación y recorrido en los frentes de obra activos hace seguimiento al contratista se verificó la implementación de las siguientes medidas ambientales: En el frente 1 de cunetas se cuenta con batería sanitarias, y en buenas condicones de aseo y limpieza. Se cuenta con Punto Ecológico para la selección en la fuente, se cuenta con el punto de Hidratación y las instalaciones se encuentran en excelentes condicones de aseo y limpieza. **Kit de emergrencias** y demás ofertados en el PAGA aprobado por la interventoría, en el capamento del contrtista se evidenció la implementación el kit de emergencias ambientales y los puntos ecológicos, el punto de hidratación, el sertvicio sanitario.

5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO

1. Plan de Gestión Social: No aplica.
2. Comité de seguimiento Integral: Se llevó a cabo el 02 de octubre de 2026, de manera presencial.
3. Valla informativa: No se encuentra la valla instalada, el contratista indicó que se afectó por condiciones climaticas y realizará nuevamente la instalación, sin embargo no define una fecha para el cumplimiento de este item.
4.Programa MONC: Mujeres - 3 trabajadores con un cumplimiento de 14.29% , Población vulnerable - 1 trabajador con un cumplimiento de 5% , Local - 10 trabajadores con un cumplimiento de 47.62%
5. Programa de comunidades étnicas: Se solicitó al contratista en comité de seguimiento gestionar la petición ante la autoridad local del minucipio.
6. Programa de infraestructura y predios: Se encuentra pendiente la devolución de 3 actas de vecindad y se programo el acercamiento a los predios con intervención en los accesos para brindarles la información.
7. Programa atención a la comunidad: Se cumple con la atención a la ciudadanía en el horario establecido y canales disponibles para tal fin.
*PQRS: No se presentan PQRS hasta la fecha.
*Oficina de atención a la ciudadanía: Durante verificación de la oficina de atención, se solicitó la instalación de los planos según lo establecido.
*Buzones de sugerencias: Contratista instala 1 en la oficina de atención y se encuentra pendiente la ubicación de 1.
8. Programa de información y divulgación: Cuenta con 2 PSI instalados.
9. Programa participación, gobernanza e inclusión social: El 2 de octubre de 2026 se llevó a cabo el 1° comité de participación ciudadana donde se inscribieron 3 ciudadanos al comité.
10. Programa cultura vial y participación comunitaria: No aplica para el periodo.
11. Programa inclusión social con perspectiva de género y de transversalización: Se desarrolló la sensibilización sobre violencias de género el 02 de octubre de 2026 en el marco del 1° comité de participación ciudadana.
12. Reportes: Se encuentra pendiente la atención por parte del contratista al informe mensual No. 1 V2. El 05 de octubre de 2026 se realiza mesa de trabajo para revisión del informe.

6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO

* El día 29 de septiembre de 2026 mediante correo electrónico se solcita al contratista lo sigueinte:
1. En el frente 2 (asfalto) no tienen Baños, no están cumpliendo con PMT, en cada frente deben estar 2 paleteros.
Se solicita implementar los procedimientos y programas definidos en el SGSST de manera inmediata como son las unidades sanitarias para el personal del frente de obra .Se deberá garantizar e instalar baño en una proporción de 1 por cada quince trabajadores diferenciados por género de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.
2. Se requiere la implementación del segundo auxiliar de tránsito con elementos necesarios y pertinentes de paleta, pito y demás elementos requeridos para el desarrollo de su labor. .
* El día 05 de octubre de 2026 mediante correo electrónico dirigido al contratista s se remite lo siguiente: Una vez revisada y verificada la documentación remitida se evidencia el cumplimiento de ,los requisitos establecidos, por lo cual la interventoría emite el Concepto de aprobación de ingreso para el colaborador.
Topógrafo DAVID MAURICIO PEREZ ACOSTA., a partir del día 05/10/2026.
Mediante comunicado JSK-ICCU-316-150 - Rta. Doc. ingreso cuadrilla asfalto se aprobó el ingreso de la cuadrilla de asfalto
Respecto del traslado de la maquinaria pavimentadora, la Interventoría recordó al contratista que deberá cumplir con los procedimientos de seguridad, señalización, acompañamiento y demás requisitos establecidos en la normativa vigente y en su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Par lo cual el día 3 de Octubre de 2026 el contratista realizó la respectiva notificación por correo electrónico
El contratista deberá informar a la Interventoría la hora prevista para el traslado, llegada y posterior retiro de la maquinaria, con el fin de facilitar el seguimiento correspondiente.
*El personal operativo en obra porta los EPP correspondientes, los pagos de las planillas de SEGURIDAD SOCIAL del personal activo se encuentran vigentes.
* Se adjunta la plantilla de insumos del contratista en la cual se adjunta la realción de personal y demás procedimientos de su gentión SST-MA realizada durante la semana

7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD

Para los Materiales granulares que se estan instalando en Obra se tiene:

*AFIRMADO _ Proctor: 1949 kg/m3 | Humedad: 10,8%
SBG _ Proctor: 2006 kg/m3 | Humedad: 9,1%
*BASE GRANULAR _ Proctor: 1,826 gr/cm³ | Humedad: 9,6%

La Interventoría dejó constancia en el comité Integral Virtual N°6 que los resultados de densidad correspondientes a muestras tomadas el 12 de septiembre de 2026 fueron entregados posteriormente el día 24 de septiembre de 2026, situación que afectó la oportunidad de la validación y la secuencia constructiva

8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Registre la situación problemática identificada y describa las causas que estan originando dicha situación, correspondientes a los siguientes aspectos:

8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)

Durante la semana se continuó con actividades relacionadas con corte y perfilación de excavaciones, demolición de carpeta asfáltica y preparación del frente para la instalación de base granular y posterior ejecución de carpeta asfáltica.

La Interventoría reiteró la necesidad de que las actividades se ejecuten conforme a la programación vigente y que cualquier situación que afecte la secuencia constructiva sea informada y sustentada oportunamente..

8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Anticipo: la interventoría mediante oficio JESAK 145 el día 25 de septiembre envía al ICCU debidamente aprobado el Plan de Inversión del anticipo del contrato ICCU 319-2026, incluyendo la contribución especial.

8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Respecto a la ejecición financiera del contrato tenemos al corte 05 de octubre un acomulado ejecutado de $162.899.749 vs un acomulado programado del $458.826.303 lo que guenera que actualmente solamente el contratista ha ejecutado el 35,50% de lo que presento en su flujo de inversión

8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS

Mediante oficio JSK-ICCU-316-109 del día 10 de septiembre de 2026 la interventoría realiza la SOLICITUD DE CARACTERIZACIÓN, DISEÑO Y CONTROL DE CALIDAD PARA MATERIAL DE BASE GRANULAR-SUB BASE GRANULAR Y AFIRMADO y mediante oficio 108-ICCU-PI2025 del día 14de septiembre el contratista entrega lo solicitado

8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)

Para el presente reporte no se presentaron novedades ambientales en obra, sin embargo; se indocó al contratista que cuando El material que llega a los frentes de obra intervenidos una vez sea descargado por las volquetas debe permanecer confinado, cubierto totalmente con material impermeable y señalizado

8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)

Se evidenció el Uso de Equipos de Protección Personal (EPP), en la oficina del contratita se verificó Señalización y áreas seguras, Respecto a la maquinaria y equipos se evidenció el formato de INSPECCIÓN PRE-OPERACIONAL DE LOS VEHICULOS.
*Como medida preventiva la interventoría solicitó al contratista realizar una capacitación en SEGURIDAD VIAL EN ESPECIAL PARA los auxiliares de Tránsito quienes se encuentran expuestos a riesgos altos por el factor de la movilidad en la vía y adicionalmente restringir el uso del CELULAR a ellos en el horario laboral. Igualemnte se solicitó al contratista la implementación de servisio sanitario para el personal del frente 2 (ASFALTO)

8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)

Durante el periodo del presente informe no se tuvieron problemáticas desde el componente SST

8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)

*Se encuentra pendiente la instalación de 1 buzon de sugerencia.
*Valla informativa: Contratista no cuenta con la valla. Tampoco informa la fecha para el cumplimiento de esta obligación.

9. PLAN DE ACCION RESULTADO DEL ANALISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAIZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
La Interventoría reiteró la necesidad de que las actividades se ejecuten conforme a la programación vigente y que cualquier situación que afecte la secuencia constructiva sea informada y sustentada oportunamente.	Contratista	Continuamente

10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES

A la fecha no se presentan actividades no previstas ni mayores cantidades

11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

La Interventoría y el contratista acompañaron a un recorrido de obra a la entidad el día 30 de sertiembre de 2026. Se solicita al contratista garantizar la instalación dek PMT en excavaciones abiertas , particularmente en el frente 1 de cunetas.

12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA



Comité presencial integral N°7 el día 02 de octubre de 2026



Frente 1 Cunetas: Se realiza instalación de SBG



Se inicia con el Corte de Carpeta Asfaltica Frente 2 K5 , costado derecho Bojacá -Corzo



Toma de densidades por parte del laboratorio PSI en la BG costado Derecho Bojaca -Corzo



Recorrido de Obra y visita en oficiina de la interventoría por parte de la supervisión del ICCU



Toma de densidades por parte del Labotatorio CONCRELAB de interventoría -Frente 1 cunetas Material SBG y Frente 2 BG



Oficina de atención al ciudadano y Buzon de sugerencias



1° comité de participación ciudadana y sensibilización violencia de género

VLADIMIR POLO PAZ
Director de Interventoría
JESAK SAS

INSUMOS SEMANALES COMPONENTE A&SST

CONTRATO ICCU-CTO-0319-2025

SEMANA	**8**
PERIODO	**29 AL 5 OCTUBRE 2026**

Frentes de obra activos durante el periodo

No.	Frente de Obra	Fecha de inicio	Estado	Actividad
1	EXCAVACION DE CUNETAS VIA BOJACA - EL CORZO	10/09/2026	Activo	Excavación

Personal activo durante el periodo

No.	Nombre	Documento identificacion	Cargo	Contratista / Subcontratista
1	BAEZA NAVARRO WUENDY VANESA	1.030.667.619	ESPECIALISTA AMBIENTAL	UT PROYECTOS INTEGRALES
2	TORRES HERNANDEZ JOSE RAFAEL	1.049.636.006	RESIDENTE DE OBRA	UT PROYECTOS INTEGRALES
3	ROSA ELBA RICO ARAQUE	52.420.498	RESIDENTE SOCIAL	UT PROYECTOS INTEGRALES
4	CRISTIAN CAMILO PULIDO FONSECA	1.030.631.543	INSPECTOR VIAL	UT PROYECTOS INTEGRALES
5	CARLOS EDUARDO PULIDO GOMEZ	7.182.124	DIRECTOR DE OBRA	INDEPENDIENTE
6	CRISTIAN CAMILO BARRERA BARBOSA	1.052.390.143	ASESOR ESTRUCTURAL	UT PROYECTOS INTEGRALES
7	NANCY JOHANA PULIDO GOMEZ	52.183.623	RESIDENTE SST	CONSTRUCCIONES
8	JUAN JOSE BERNAL SORACA	1.049.631.335	MAESTRO DE OBRA	UT PROYECTOS INTEGRALES
9	CIRO ANTONIO SANCHEZ FORERO	97.601.789	AYUDANTE DE OBRA	UT PROYECTOS INTEGRALES
10	ANDRES FELIPE SORACA	1.053.349.019	AYUDANTE DE OBRA	UT PROYECTOS INTEGRALES
11	JOSÉ HILDEBRANDO GARCIA SANCHEZ	6.772.897	AYUDANTE DE OBRA	UT PROYECTOS INTEGRALES
12	ANDERSON LEONEL FONSECA CAÑON	80.756.206	AYUDANTE DE OBRA	UT PROYECTOS INTEGRALES
13	LAURA MARCELA MUÑOZ VASQUEZ	1.022.372.559	AUXILIAR DE TRANSITO Y OBRA	UT PROYECTOS INTEGRALES
14	KEVIN JULIAN GUZMAN VASQUEZ	102.878.533	AUXILIAR DE TRANSITO Y OBRA	UT PROYECTOS INTEGRALES
15	ALDEMAR MOLINA SUAREZ	11.510.358	OPERARIO DE VOLQUETA	JEPAC SAS
16	JOSE ALEXANDER DIAZ SEVILLA	11.366.176	OPERARIO DE MINICARGADOR	JEPAC SAS
17	FREDY ARMANDO ALARCON	7.320.718	OPERADOR DE FINISHER	LEEGS
18	JOSE RAUL GUERRERO	3.006.866	AYUDANTE DE OBRA EN ASFALTO	LEEGS
19	FRANCISCO FRANCO VERGARA	79.909.717	AYUDANTE DE OBRA EN ASFALTO	LEEGS
20	ESTEBAN ANDRES FRANCO	107.481.287	AYUDANTE DE OBRA EN ASFALTO	LEEGS
21	JORGE ALBERTO PIRA CASAS	11.439.090	CONDUCTOR VOLQUETA SENCILLA	LEEGS
22	JAGUI CASTILLO ROMERO	1.074.184.155	CONDUCTOR VOLQUETA DOBLE TROQUE	LEEGS
23	DAVID MAURICIO PEREZ ACOSTA	1.056.930.645	TOPOGRAFO	TOPOGRAFO

Maquinaria empleada durante el periodo

No.	MÁQUINA	MODELO	OPERADOR	Contratista / Subcontratista
1	Volqueta	CHEVROLET	ALDEMAR MOLINA SUAREZ	JEPAC SAS
2	Mini cargador	BOBCAT	JOSE ALEXANDER DIAZ SEVILLA	JEPAC SAS
3	Excavadora	BOBCAT	EDGAR ORLANDO DIAZ SEVILLA	JEPAC SAS
4	Finisher	TEREX	FREDDY ARMANDO ALARCON	LEEGS
5				

Vehículos empleados durante el periodo

No.	VOLQUETAS	TIPO	PLACA	MODELO	CONDUCTOR	Contratista / Subcontratista
1	Volqueta	Sencilla	XAB807	CHEVROLET	ALDEMAR MOLINA SUAREZ	JEPAC SAS

Accidentes / Incidentes presentados durante el periodo

No.	Tipo de Evento	Fecha	Descripción	Nombre Trabajador	Cargo
	NO SE PRESENTARON AT/IT DURANTE ESTE PERIODO				

No.	Nombre Trabajador	Cargo	Fecha Prueba	Fecha Resultado	Resultado	Inicio Aislamiento
	NO SE PRESENTARON CASOS DE COVID DURANTE ESTE PERIODO					

No.	ACTIVIDAD	

1	INSPECCION PRE OPERACIONAL MAQUINARIA (MINICARGADOR, MINI RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR)	
2	CHARLAS DIARIAS DE SEGURIDAD	
3	29 DE Septiembre, CAPACITACION AMBIENTAL (USO EFICIENTE Y AHORRO DE AGUA, PROTOCOLO ANTE FENOMENOS NATURALES: LLUVIAS Y TORMENAS)	
