Corponor


PRESUPUESTO DE OBRA

PROYECTO 5.1.2. FORTALECIMIENTO DE BUENAS PRACTICAS PRODUCTIVAS Y NEGOCIOS VERDES. INSTALACIÓN DE ÁREAS PARA EL ALMACENAMIENTO TEMPORAL ADECUADO DE ENVASES POST CONSUMO DE PLAGUICIDAS.

PRESUPUESTO GENERAL

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	localización y replanteo, manual	m2	10.9	$ 4,406	$ 47,981.0
2	descapote manual, espesor 5 cm	m2	10.9	$ 6,336	$ 68,999.0
3	Caseta de almacenamiento agroquimicos tipo desarmable de 3x3x1,9. incluye antepiso 3.5x3.5 en concreto de 17.5 mpa e 10cm, sistema de puerta con apertura hacia el exterior, Se requiere la informacion corporativa mediante aplicación técnica de pintura de alta resistencia sobre la cara frontal de la estructura.	UND	1.0	$ 4,596,094	$ 4,596,094.0

TOTAL COSTOS DIRECTOS X CASETA		**$**	**4,713,074.0**
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 4 CASETAS		**$**	**18,852,296.0**
ADMINISTRACION	25%	$	4,713,074.0
IMPREVISTOS	1%	$	188,523.0
UTILIDAD	6%	$	1,131,138.0
IVA SOBRE UTILIDAD	19%	$	214,916.0
TOTAL COSTOS INDIRECTOS		**$**	**6,247,651.0**
TOTAL COSTOS DE OBRA 2 CASETAS		**$**	**25,099,947.0**

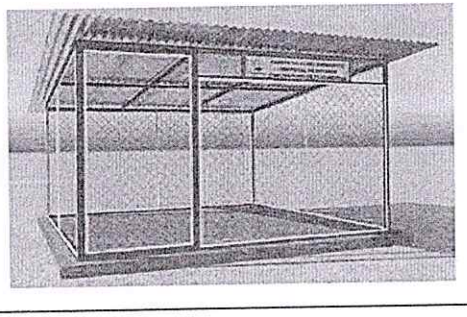

JAVIER ENRIQUE TRUJILLO CAMACHO
T.P. NO. 54202-087063 NTS

LUIS CARLOS CARVAJALINO RODRIGUEZ
JEFE OFICINA DE GESTION DE PROYECTOS
