
Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo
1	**PUERTO RICO**	**676 días**	**mié 1/07/26**	**mié 31/01/29**		**$ 83,771,928,117.00**
2	Inicio	0 días	mié 1/07/26	mié 1/07/26		$ 0.00
3	**CONTRATO DE OBRA PUENTE PUERTO RICO**	**588 días**	**mié 1/07/26**	**vie 29/09/28**		**$ 78,160,095,705.00**
4	**PUENTE**	**522 días**	**jue 1/10/26**	**vie 29/09/28**		**$ 64,275,576,018.00**
5	**PRELIMINARES**	**115 días**	**jue 1/10/26**	**mié 1/03/27**		**$ 1,560,188,052.00**
6	DESMONTE Y LIMPIEZA EN BOSQUE	20 días	jue 1/10/26	mié 28/10/26	60	$ 1,256,952.00
7	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE BARCAZAS PARA MAQUINARIA PESADA	92 días	mar 3/11/26	mié 10/03/27	11CC+20 días	$ 1,052,198,700.00
8	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE REMOLCADOR	92 días	mar 3/11/26	mié 10/03/27	7CC	$ 506,732,400.00
9	**CONCRETOS**	**474 días**	**mar 6/10/26**	**vie 28/07/28**		**$ 24,397,329,110.00**
10	SOLADO, LIMPIEZA EN CONCRETO 13.8 MPa (2000 PSI)	12 días	mié 26/04/28	jue 11/05/28	15CC-3 días	$ 9,252,720.00
11	CONSTRUCCIÓN PILOTE PREEXCAVADO FUNDIDO IN SITU D= 1.60 M CONCRETO TREMIE 27.6 MPa - 4000 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	134 días	mar 6/10/26	vie 9/04/27	6CC+3 días	$ 6,421,374,965.00
12	PILAS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	15 días	lun 22/03/27	vie 9/04/27	11FC-15 días	$ 214,964,610.00
13	DADOS DE PILAS EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	48 días	lun 12/04/27	mié 16/06/27	12	$ 1,380,561,600.00
14	COLUMNA EN CONCRETO 34.5 MPa (5000 PSI) PREMEZCLADO ACELERADO A 3 DIAS. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	20 días	jue 20/05/27	mié 16/06/27	13FC-20 días	$ 214,353,113.00
15	COLUMNAS, VIGAS O ESTRIBOS EN CONCRETO 27.6 MPa (4000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	50 días	lun 1/05/28	vie 7/07/28	19FF	$ 847,173,242.00
16	ANDENES, PUENTES BOX COULVERT CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	45 días	lun 29/05/28	vie 28/07/28	19FF+15 días	$ 519,746,745.00
17	TUBO PVC 100 MM (4") DREN. SIN FILTRO	7 días	jue 29/06/28	vie 7/07/28	15FF	$ 12,129,025.00
18	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO 4000 PSI SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	7 días	lun 10/07/28	mar 18/07/28	19	$ 61,045,397.00
19	VIGA CAJON VOLADIZOS DE PUENTES EN CONCRETO 42 MPA (6000 PSI). SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	270 días	lun 28/06/27	vie 7/07/28	26	$ 14,716,718,693.00
20	**ACEROS Y ELEMENTOS DE CONEXION**	**522 días**	**jue 1/10/26**	**vie 29/09/28**		**$ 37,729,354,655.00**
21	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	410 días	jue 1/10/26	mié 26/04/28	6CC	$ 14,230,467,237.00
22	ESTRUCTURAS EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (FABRICACIÓN, MONTAJE Y PINTURA)	60 días	lun 10/07/28	vie 29/09/28	19FF+60 días	$ 2,496,032,904.00
23	ACERO DE PREESFUERZO. TORONES DE TENSIONAMIENTO. INCLUYE BOCIN, DUCTO, PLATINA, ANCLAJE	270 días	lun 28/06/27	vie 7/07/28	19CC	$ 9,091,951,264.00
24	SUMINISTRO E INSTALACIÓNREF R A, MOVIMIENTO +/- 100MM	3 días	lun 31/07/28	mié 2/08/28	52FC+1 día	$ 190,124,535.00
25	ACERO DE REFUERZO ASTM A36 PARA CAMISA NO RECUPERABLE	180 días	jue 1/10/26	mié 9/06/27	21CC	$ 11,536,957,575.00
26	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 85X85X15 CM DUREZA 60 INCLUYE 6 LAMINAS METALICAS REFUERZO 1/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7 días	jue 17/06/27	vie 25/06/27	14	$ 122,075,808.00
27	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO SIMPLE 30X20X3 CM , SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7 días	lun 10/07/28	mar 18/07/28	15	$ 1,711,404.00
28	APOYO ELASTOMÉRICO EN NEOPRENO 70X70X18 CM DUREZA 60 INCLUYE 7 LAMINAS METALICAS REFUERZO 1/8" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7 días	lun 10/07/28	mar 18/07/28	15	$ 60,033,928.00
29	**SEÑALIZACIÓN**	**7 días**	**mar 8/08/28**	**mié 16/08/28**		**$ 127,934,833.00**
30	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7 días	mar 8/08/28	mié 16/08/28	52FC+7 días	$ 38,432,793.00
31	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP-40) RECTANGULO DE 90 X 30 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7 días	mar 8/08/28	mié 16/08/28	52FC+7 días	$ 968,350.00
32	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA (SR) CIRCULO Ø 75 CM PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7 días	mar 8/08/28	mié 16/08/28	52FC+7 días	$ 11,209,356.00
33	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA (SP) CUADRADO DE 60 X 60 CM CON PARAL EN ANGULO 2"X2" DE 1/4", SUMINISTRO E INSTALACIÓN	7 días	mar 8/08/28	mié 16/08/28	52FC+7 días	$ 6,717,084.00
34	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA CON RESINA TERMOPLASTICA (ML) A=0.12 M INCLUYE SUMINISTRO, MICROESFERAS Y APLICACIÓN CON EQUIPO	7 días	mar 8/08/28	mié 16/08/28	52FC+7 días	$ 70,607,250.00
35	**OBRAS ELECTRICAS**	**30 días**	**mar 8/08/28**	**lun 18/09/28**		**$ 460,780,368.00**
36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SOLAR CON LUMINARIA LED DE 100W; INCLUYE PANEL FOTOVOLTAICO DE 450W, DOS BATERIAS DE LITIO DE 75Ah, POSTE METALICO DE 12 M X 510 KG, CONTROLADOR DE CARGA Y ACCESORIOS PARA MONTAJE. NO INCLUYE CIMENTACIÓN	30 días	mar 8/08/28	lun 18/09/28	52FC+7 días	$ 460,780,368.00
37	**OBRAS DE PROTECCIÓN**	**64 días**	**jue 1/05/28**	**mar 8/08/28**		**$ 5,162,010,228.00**
38	BOLSACRETO	50 días	mié 31/05/28	mar 8/08/28	40CC+7 días	$ 2,499,707,655.00
39	ACERO DE REFUERZO FY=420 MPA (4200 KGF/CM2, 60.000 PSI) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE	49 días	jue 1/06/28	mar 8/08/28	38CC+1 día	$ 83,781,845.00
40	GEOTEXTIL NT 2000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	1 día	lun 22/05/28	lun 22/05/28	41CC+7 días	$ 265,389,388.00
41	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	42 días	jue 11/05/28	vie 7/07/28	44FC+1 día	$ 2,313,131,340.00
42	**VIA**	**64 días**	**lun 1/05/28**	**jue 27/07/28**		**$ 7,845,942,505.00**
43	**EXCAVACIONES Y RELLENOS**	**62 días**	**lun 1/05/28**	**mar 25/07/28**		**$ 7,289,335,352.00**
44	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	7 días	lun 1/05/28	mar 9/05/28	18FC-57 días	$ 380,658.00
45	TERRAPLENES CON MATERIAL MIXTO DE RIO SIN PROCESAR TMAX 3" (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACION, HUMEDECIDO Y COMPACTACION)	50 días	vie 5/05/28	jue 13/07/28	44CC+4 días	$ 4,626,534,232.00
46	TERRAPLENES CON PRESTAMO LATERAL. NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	50 días	vie 5/05/28	jue 13/07/28	44CC+4 días	$ 1,050,628,498.00
47	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	1 día	jue 25/05/28	jue 25/05/28	41CC+10 días	$ 434,702,280.00
48	SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	7 días	vie 14/07/28	lun 24/07/28	45;46FF+1 día	$ 751,990,152.00
49	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR	7 días	lun 17/07/28	mar 25/07/28	48FF+1 día	$ 425,099,532.00
50	**CARPETA ASFALTICA**	**8 días**	**mar 18/07/28**	**jue 27/07/28**		**$ 556,607,153.00**
51	RIEGO DE IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 O CRL-1	7 días	mar 18/07/28	mié 26/07/28	49FF+1 día	$ 96,365,724.00
52	MEZCLA DENSA EN CALIENTE TIPO MDC-19 INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN	7 días	mié 19/07/28	jue 27/07/28	51FF+1 día	$ 460,241,429.00
53	**SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**	**522 días**	**jue 1/10/26**	**vie 29/09/28**		**$ 149,611,816.00**
54	Presupuesto SST	522 días	jue 1/10/26	vie 29/09/28	60	$ 149,611,816.00
55	**PLAN DE GESTION AMBIENTAL O PLAN DE ADAPTACION A LA GUIA AMBIENTAL**	**522 días**	**jue 1/10/26**	**vie 29/09/28**		**$ 398,326,681.00**
56	Presupuesto PAGA	522 días	jue 1/10/26	vie 29/09/28	60	$ 398,326,681.00
57	**PLAN DE MANEJO DE TRANSITO**	**522 días**	**jue 1/10/26**	**vie 29/09/28**		**$ 257,226,457.00**
58	Presupuesto PMT	522 días	jue 1/10/26	vie 29/09/28	60	$ 257,226,457.00
59	**OTROS BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES A LA OBRA PÚBLICA**	**66 días**	**mié 1/07/26**	**mié 30/09/26**		**$ 71,400,000.00**
60	Gastos adicionales	66 días	mié 1/07/26	mié 30/09/26	2CC	$ 71,400,000.00
61	**INTERVENTORIA**	**522 días**	**jue 1/10/26**	**vie 29/09/28**		**$ 5,062,352,412.00**
62	Interventoria	522 días	jue 1/10/26	vie 29/09/28	64CC	$ 5,062,352,412.00
63	**APOYO A LA GESTIÓN Y SEGUIMIENTO/ APOYO A LA SUPERVISIÓN**	**610 días**	**jue 1/10/26**	**mié 31/01/29**		**$ 424,480,000.00**
64	Apoyo a la supervisión	610 días	jue 1/10/26	mié 31/01/29	59	$ 424,480,000.00
65	**GASTOS DE LEGALIZACION ASOCIADOS AL PROYECTO**	**23 días**	**mié 1/07/26**	**vie 31/07/26**		**$ 125,000,000.00**
66	Gastos de legalización	23 días	mié 1/07/26	vie 31/07/26	2CC	$ 125,000,000.00

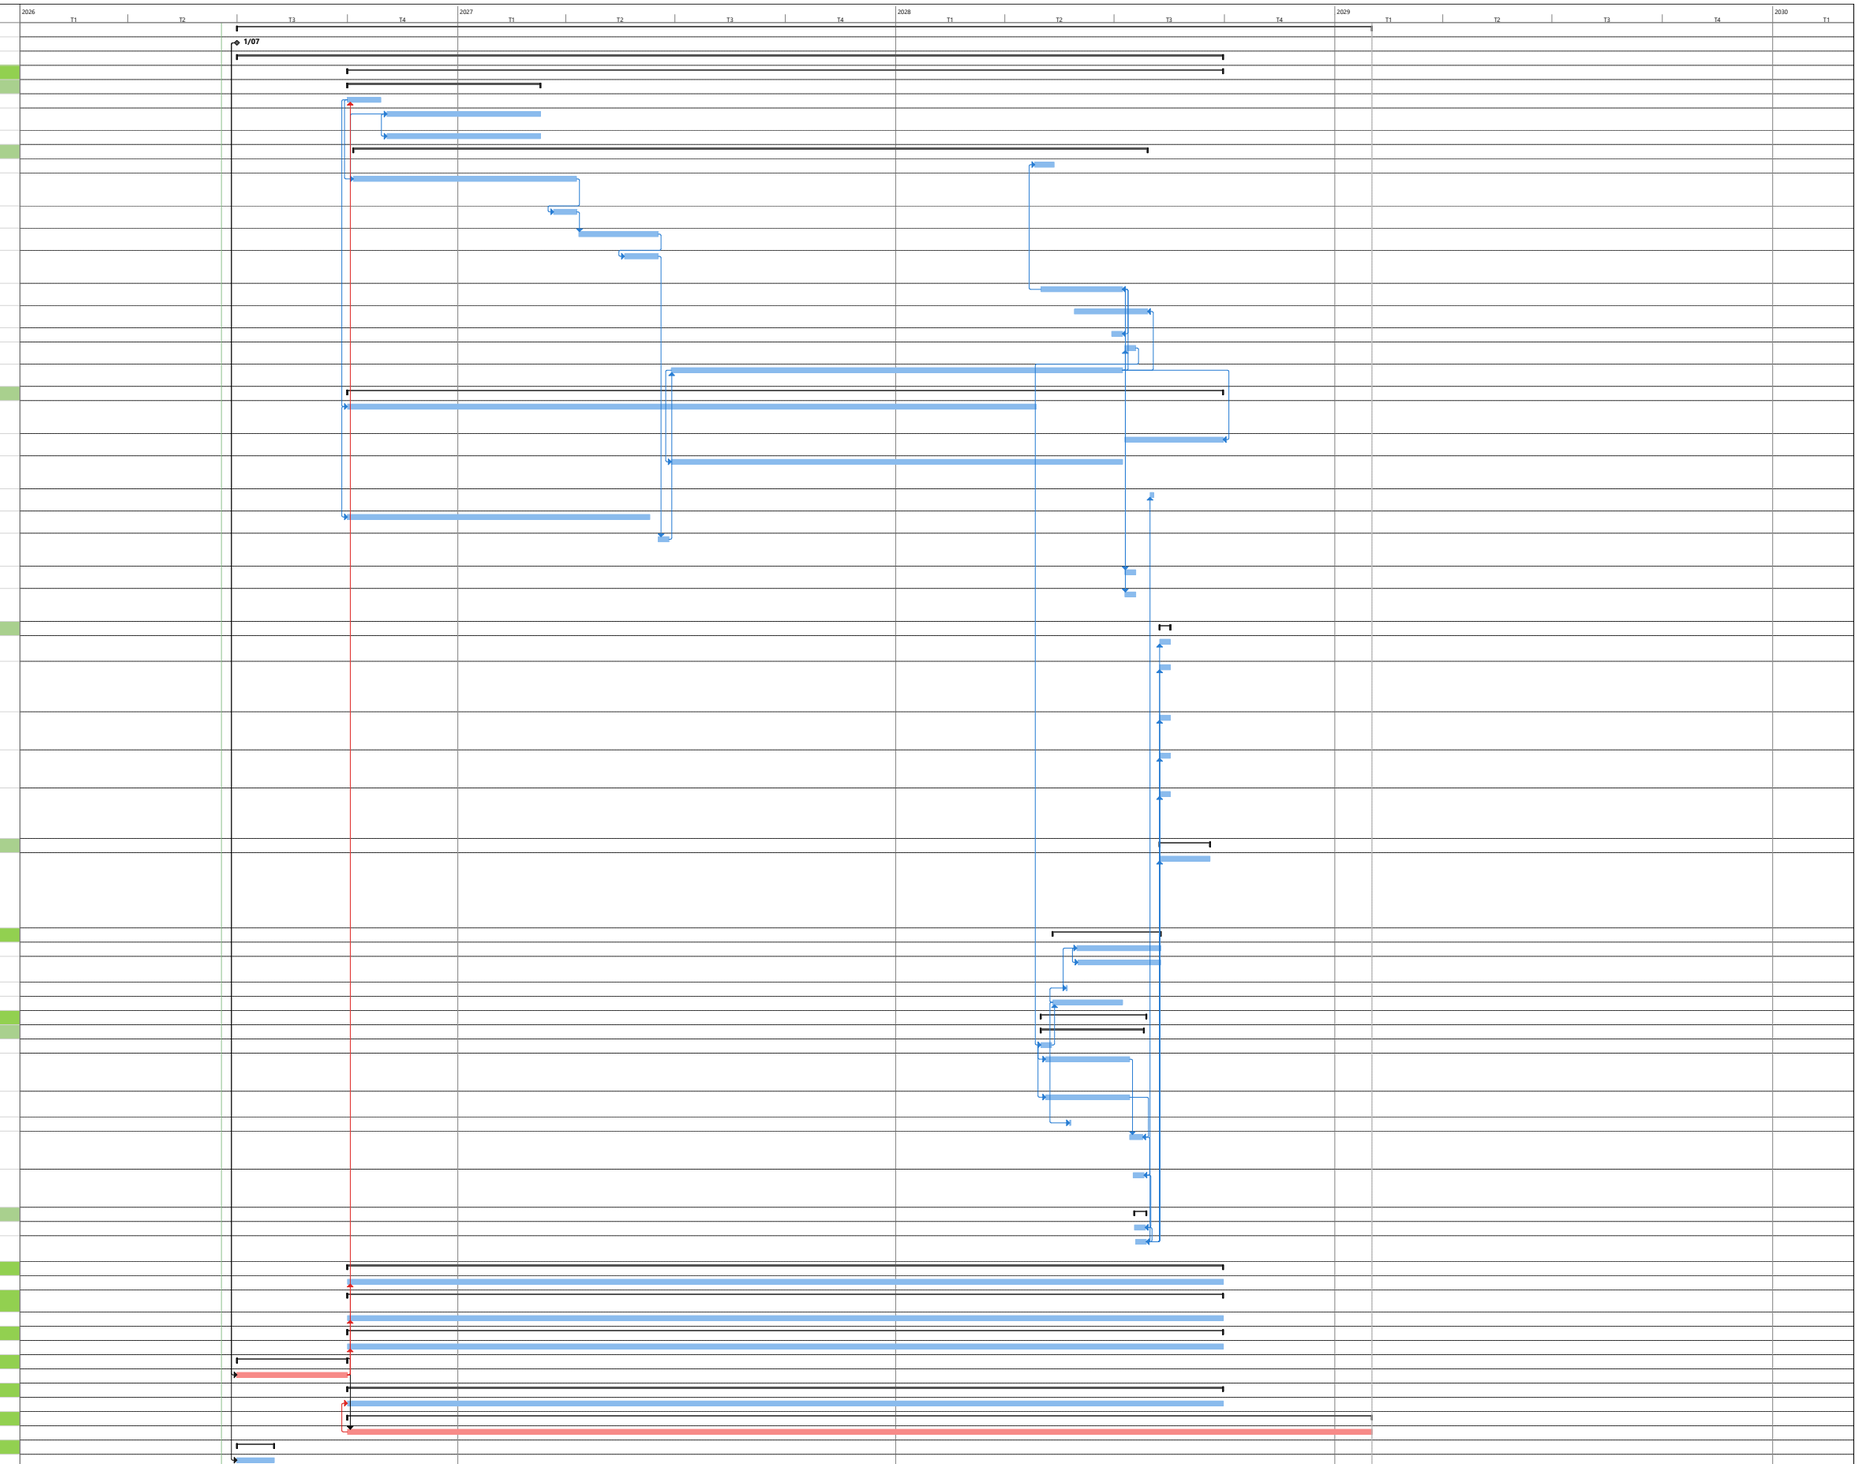

Proyecto: PROGRAMACION_PU
Fecha: jue 18/06/26

Tarea · Hito · Resumen del proyecto · Hito inactivo · Tarea manual · Informe de resumen manual · solo el comienzo · Tareas externas · Fecha límite · División crítica · Progreso manual
División · Resumen · Tarea inactiva · Resumen inactivo · solo duración · Resumen manual · solo fin · Hito externo · Tareas críticas · Progreso
