CONTRATO-IE-RUFINO-SUR-028 DE 2026

INFORME DE AVANCE No.1

FECHA DE CORTE 13/10/26 - 23/10/26

El presente documento correspondiente a la primera fase del proyecto de adecuación, nivelación, ampliación de una franja perimetral de tres metros en la longitudinal de la cancha, drenaje y engramado con grama natural trenzada de la cancha de fútbol de la Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur, incluyendo preparación del terreno, sustrato de tierra negra, control de malezas y riego inicial de establecimiento, ejecutado por la empresa Struc Group S.A.S en el contrato No. 028 de 2026.

Cliente / Razón Social:	Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur
Dirección / Ciudad:	B/ Acacias, Cll 48 entre Cra 25 y 26, Armenia, Quindío
Teléfono conmutador:	606 731 2270
Página web:	www.ierufinosur.edu.co
Objeto:	Adecuación y engramado de cancha de fútbol

DATOS DEL CONTRATISTA

Proponente / Razón Social:	STRUC GROUP S.A.S.
NIT:	902.087.850-1
Dirección Comercial:	Avenida Bolívar 14 No. 11 Norte-109, Torre EPIC
Correo / Teléfono:	info@struc.com.co / 302 356 8798
Representante Legal:	Daniela Mosquera Toro / CC 1.152.207.769

CONTENIDO

DEL ACTA DE AVANCE DE OBRA No.1

1. Resumen Ejecutivo.

2. Ejecución de la Primera Fase.

3. Control de Calidad.

4. Registros Fotográficos.

5. Firma del Acta.

1. RESUMEN

EJECUTIVO DEL INFORME

Durante el periodo del 13.10.2026 al 23.10.2026, correspondiente a los primeros diez días de ejecución, se desarrolló la Fase 1 de la obra de adecuación, nivelación, ampliación de una franja perimetral de 3 m en la longitudinal, drenaje y engramado de la cancha de fútbol de la I.E. Rufino José Cuervo Sur

La Fase 1 comprendió el replanteo y la señalización del frente de obra, el retiro de material vegetal, la fumigación con herbicida de uso agrícola con registro ICA, la escarificación y preparación del terreno, la nivelación manual y con mini cargador, la ampliación de la franja perimetral de 3 m y la organización de pendientes de escorrentía superficial para evitar encharcamientos. El terreno queda conformado a rasante y pendientes definidas, condición previa para extender el sustrato de tierra negra y sembrar la grama natural trenzada.

Las actividades se ejecutaron con frente de obra señalizado, personal con EPP y afiliación vigente a seguridad social y ARL, y fumigación en horarios sin presencia de estudiantes. No se reportan incidentes ni accidentes de trabajo en el periodo.

VALOR AGREGADO: sin costo adicional para la Institución, se incluyó la nivelación de cuatrocientos cincuenta metros cuadrados (450 m²) de un costado de la cancha existente.

2. EJECUCIÓN

DE LA PRIMERA FASE

ITEM	ACTIVIDAD	(%)	ESTADO	OBSERVACIONES
1	REUNIÓN INICIAL, REPLANTEO DEL ÁREA DE JUEGO	100%	TERMINADO	CANCHA COMPLETA
2	AISLAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN DE OBRA	100%	TERMINADO	PERÍMETRO
3	RETIRO DE MATERIAL VEGETAL, ESCOMBROS Y OTROS ELEMENTOS	100%	TERMINADO	CANCHA COMPLETA Y PERÍMETRO
4	FUMIGACIÓN PARA CONTROL DE MALEZAS	100%	TERMINADO	CANCHA COMPLETA
5	ESCARIFICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL TERRENO	100%	TERMINADO	CANCHA COMPLETA
6	NIVELACIÓN MANUAL Y CON MINICARGADOR	100%	TERMINADO	CANCHA COMPLETA
7	AMPLIACIÓN DE FRANJA PERIMETRAL DE 3 M EN LA LONGITUDINAL	100%	TERMINADO	PERÍMETRO DE LA CANCHA
8	CONFORMACIÓN DE RASANTE, PENDIENTES DE ESCORRENTÍA Y DRENAJE	100%	TERMINADO	CANCHA COMPLETA

3. CONTROL

DE CALIDAD

VERIFICACIÓN	CRITERIO	CUMPLE	FIRMA
REPLANTEO Y COTAS DE NIVELACIÓN	COTAS DE PROYECTO DEFINIDAS ANTES DE INICIAR EL MOVIMIENTO DE TIERRAS	SI	
RETIRO TOTAL DE MATERIAL VEGETAL Y ELEMENTOS EXTRAÑOS	SUPERFICIE LIBRE DE RAÍCES, PIEDRAS Y ESCOMBROS	SI	
EFICACIA DE LA FUMIGACIÓN	AUSENCIA DE REBROTE VISIBLE ANTES DE LA SIEMBRA, SE PROGRAMA FUMIGACIÓN ADICIONAL 8 DÍAS DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN DE LA GRAMA	SI	
RASANTE Y PLANITUD DE LA SUPERFICIE	SUPERFICIE UNIFORME, SIN DEPRESIONES NI PROTUBERANCIAS	SI	

PENDIENTES DE ESCORRENTÍA	PENDIENTE SUAVE CONTINÚA HACIA PUNTOS DE EVACUACIÓN, SIN ZONAS DE EMPOZAMIENTO	SI	INGENIERA CIVIL DANIELA MOSQUERA TORO M.P. COPNIA 131037-0714092 QND RL STRUC GROUP S.A.S.
FRANJA PERIMETRAL DE 3 M	CONTINUIDAD DE COTA CON EL ÁREA DE JUEGO	SI	INGENIERA CIVIL DANIELA MOSQUERA TORO M.P. COPNIA 131037-0714092 QND RL STRUC GROUP S.A.S.

4. REGISTROS

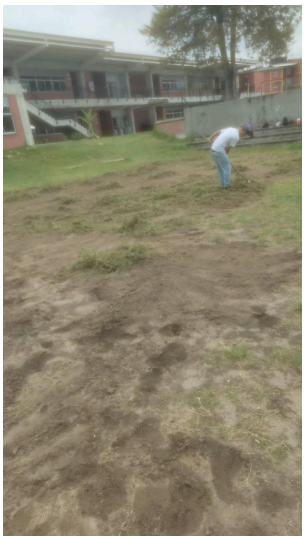
FOTOGRÁFICOS DE OBRA





STRUC. Institución edu. Rufino Sur Instalación de grama Armenia, Quindío 8/10/2026	STRUC. Institución edu. Rufino Sur Instalación de grama Armenia, Quindío 7/10/2026
	STRUC. Institución edu. Rufino Sur Instalación de grama Armenia, Quindío 8/10/2026

STRUC. Institución edu. Rufino Sur Instalación de grama Armenia, Quindío 10/10/2026	
	STRUC. Institución edu. Rufino Sur Instalación de grama Armenia, Quindío 10/10/2026

5. FIRMA

DEL INFORME

El contratista deja en constancia que durante el periodo comprendido entre el 13.10.2026 y el 23.10.2026, se ejecutó la Fase 1 de la obra de adecuación, nivelación, ampliación de una franja perimetral de 3 m en la longitudinal, drenaje y engramado de la cancha de fútbol de la Institución Educativa Rufino José Cuervo Sur, conforme a lo descrito en el presente Informe de Avance de Obra No. 1 y a su registro fotográfico. Con la firma se da por recibido y verificado el avance reportado, sin perjuicio de la verificación final y la entrega a satisfacción de la obra una vez concluidas las fases pendientes.

INGENIERA CIVIL
DANIELA MOSQUERA TORO
M.P. COPNIA 131037-0714092 QND
RL STRUC GROUP S.A.S.
