BITÁCORA DIARIA DE OBRA

FRENTE BISUM — BATALLÓN DE INFANTERÍA N.º 39 “SUMAPAZ”

Contrato	SGSC-LP-OB-451-2026
Contratista	TECMON TECNOLOGÍAS NACIONALES S.A.S.
Contratante	Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Gobierno y Seguridad Ciudadana
Periodo de la bitácora	30 de septiembre al 13 de octubre de 2026

FECHA	Miércoles 30 de septiembre de 2026
JORNADA	Jornada completa

Actividades ejecutadas: Se efectuó el reconocimiento inicial de las áreas de intervención del rancho, cocinas y comedores. Se verificaron las condiciones existentes de cielos rasos, pisos, acabados de pintura, carpintería metálica, ventanas y cortinas enrollables. Se organizaron las actividades iniciales y se identificaron las zonas que requerían desmontes, mantenimiento y adecuación, priorizando las áreas conforme a las condiciones observadas en campo.

FECHA	Jueves 1 de octubre de 2026
JORNADA	Jornada completa

Actividades ejecutadas: Se iniciaron actividades preparatorias en las zonas priorizadas. Se adelantó el desmonte de los elementos de cielo raso previstos para intervención, con acopio, cargue y retiro del material desmontado. Se revisaron las superficies y elementos de soporte para establecer las condiciones requeridas para la instalación del nuevo cielo raso en PVC y la continuidad de los trabajos.

FECHA	Viernes 2 de octubre de 2026
JORNADA	Jornada completa

Actividades ejecutadas: Se continuó con las actividades de desmonte y preparación de las áreas de cielo raso en el rancho y zonas relacionadas. Se realizaron verificaciones de medidas y superficies para la instalación de cielo raso en PVC blanco, incluyendo la revisión de la perfilería y estructura de soporte. Se avanzó en la organización de las áreas de trabajo y en el retiro de residuos generados por las actividades ejecutadas.

FECHA	Sábado 3 de octubre de 2026
JORNADA	Media jornada

Actividades ejecutadas: Se adelantaron labores de preparación y adecuación de las superficies de cielo raso y se continuó con la organización del material y de las áreas intervenidas. Se efectuó limpieza general de las zonas de trabajo y retiro de residuos producto de los desmontes, dejando las áreas en condiciones para dar continuidad a las actividades durante la siguiente semana.

FECHA	Lunes 5 de octubre de 2026
JORNADA	Jornada completa

Actividades ejecutadas: Se dio continuidad a la instalación de cielo raso en PVC blanco en las áreas previstas, incluyendo el montaje de la perfilería y estructura de soporte conforme a las especificaciones del ítem. Se verificó la alineación y nivelación de los elementos instalados y se realizaron ajustes necesarios para asegurar la adecuada conformación del cielo raso.

FECHA	Martes 6 de octubre de 2026
JORNADA	Jornada completa

Actividades ejecutadas: Se continuó con la instalación y ajuste de cielo raso en PVC en las áreas de intervención. De manera complementaria, se adelantó la preparación de superficies para las actividades de estuco y pintura, pintura epóxica y vinilo, según el tipo de superficie y acabado requerido. Se revisaron las zonas de encuentro y remates para facilitar la continuidad de los acabados.

FECHA	Miércoles 7 de octubre de 2026
JORNADA	Jornada completa

Actividades ejecutadas: Se avanzó en las actividades de preparación y aplicación de acabados de pintura en las superficies contempladas. Se realizaron trabajos de estuco y pintura en las áreas correspondientes, así como preparación de superficies destinadas a pintura epóxica y vinilo sobre pañete. Las actividades se desarrollaron por sectores para permitir el control de la aplicación y la protección de las áreas adyacentes.

FECHA	Jueves 8 de octubre de 2026
JORNADA	Jornada completa

Actividades ejecutadas: Se continuó con los acabados de pintura y la revisión de las superficies intervenidas. Asimismo, se adelantaron labores de mantenimiento de carpintería metálica en puertas y ventanas, que comprendieron actividades de desmontaje cuando fue requerido, limpieza, remoción de pintura deteriorada, lijado y preparación para la aplicación de anticorrosivo y esmalte. Se verificaron las condiciones de los elementos antes de su reinstalación o ajuste.

FECHA	Viernes 9 de octubre de 2026
JORNADA	Jornada completa

Actividades ejecutadas: Se dio continuidad al mantenimiento de puertas y ventanas metálicas, incluyendo la preparación y aplicación de los recubrimientos previstos. Se adelantaron actividades relacionadas con la instalación de malla angeo en los elementos de ventana contemplados, verificando su fijación y ajuste. También se efectuó revisión de las cortinas enrollables de cocina y mantenimiento de sus mecanismos, limpieza, lubricación y ajuste de tensores, según las necesidades identificadas.

FECHA	Sábado 10 de octubre de 2026
JORNADA	Media jornada

Actividades ejecutadas: Se realizaron actividades de remate y revisión de los elementos de carpintería metálica y de los acabados ejecutados durante la semana. Se verificaron los ajustes de las cortinas enrollables intervenidas y se efectuó limpieza y organización de las zonas de trabajo. Se revisaron los pendientes para la continuidad de las actividades eléctricas, de acabados y de intervención en baños.

FECHA	Lunes 12 de octubre de 2026
JORNADA	Jornada completa

Actividades ejecutadas: Se adelantaron actividades de intervención en las áreas interiores de baños, incluyendo labores de demolición de baldosa de piso y desmonte de cielo raso donde estaba previsto, con cargue y retiro de los residuos generados. Se inició o continuó la preparación de superficies para las actividades posteriores de adecuación y enchape de paredes, según el alcance ejecutado y las condiciones encontradas en sitio. Se mantuvo control sobre la delimitación y limpieza de las zonas intervenidas.

FECHA	Martes 13 de octubre de 2026
JORNADA	Jornada completa

Actividades ejecutadas: Se dio continuidad a las actividades de adecuación y acabados del frente, incluyendo revisión de las áreas de cielo raso, pintura, carpintería metálica, pisos y baños. Se verificaron las cantidades ejecutadas acumuladas consignadas en las memorias de obra, incluyendo las actividades de baldosa de grano de mármol y guardaescoba, instalaciones eléctricas de tomacorrientes y luminarias LED, y demás ítems reportados en las memorias. Se identificaron los aspectos que requieren seguimiento y conciliación de cantidades con la interventoría.

Contratista:



CARLOS EDUARDO MARCIGLIA FERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA

FRENTE BAMAR —BATALLÓN DE ALTA MONTAÑA N.º 01 TC. ANTONIO ARREDONDO

1 3

CONTRATO 565C-LP-OB-451-2026
PERIODO DE ENISION 14 de octubre de 2026

BITACORA DE OBRA BAMAR
Dia 30 de Septiembre de 2026

ACTIVIDADES
Reconocimiento de frente de trabajo y aplicacion y referenciacion de item del proceso preliminar de las actividades:

1 de octubre de 2026
ACTIVIDADES
Demarcacion de sitio de trabajo e inicio de actividades de demolicion del area de comedor y cielo raso de la alacena o cuarto de mercado.

2 de octubre de 2026
- Escavacion mecánica para area de gaviones y retiro en volqueta de escavacion
- Inicio de construcción de area de mesones parte posterior en la alacena.

3 de octubre de 2026
- Recomposicion manual de area de gaviones e inicio de construcciones de gaviones.
- Fundicion de segundo nivel de meson parte posterior.

4 de octubre de 2026
- Terminacion de primera hilera de gaviones.
- Desmonte de teja de area de alojamiento

5 de octubre de 2026
- Inicio de segundo nivel de gaviones
- Construcción de meson en concreto en el area de la cocina

6 de octubre de 2026
(De) Montaje de teja de ref contractual en [illegible], y continuacion de Construccion de gaviones

7 de octubre de 2026
Construcción de cielo raso en área de alacena y continuación del montaje de la teja en alojamiento

8 de octubre de 2026
Terminación de segundo nivel de gaviones y construcción de área de cielo raso en alojamiento oficial.

9 de octubre de 2026
Terminación del cielo raso en área de alojamiento oficial, y construcción de área lateral de gaviones.

10 de octubre de 2026
- Terminación de cubierta de alojamiento.
- Demolición de cubierta del área del archivo.
- Terminación de segunda capa de gaviones de la parte lateral

11 de octubre de 2026
Mantenimiento y pintura de estructura metálica del área del archivo y terminación de estremo izquierdo de gavión.


12 de octubre de 2026
- Reforzamiento de estructura de cubierta de archivo y extensión de resebo en área de comedor
- (Descofrado) Desencofrado de mesón.

13 de octubre de 2026
Extensión y compactación de resebo área del comedor, aplicación segunda mano de pintura de la estructura del archivo.

14 de octubre de 2026
- Nivelación y compactación de resebo de área del Comedor
- Terminación y detalles de gaviones

TCL K70 Power 4G
Inspire Greatness

FRENTE BICOL— BATALLÓN DE INFANTERÍA AEROTRANSPORTADO N.º 28 "COLOMBIA"

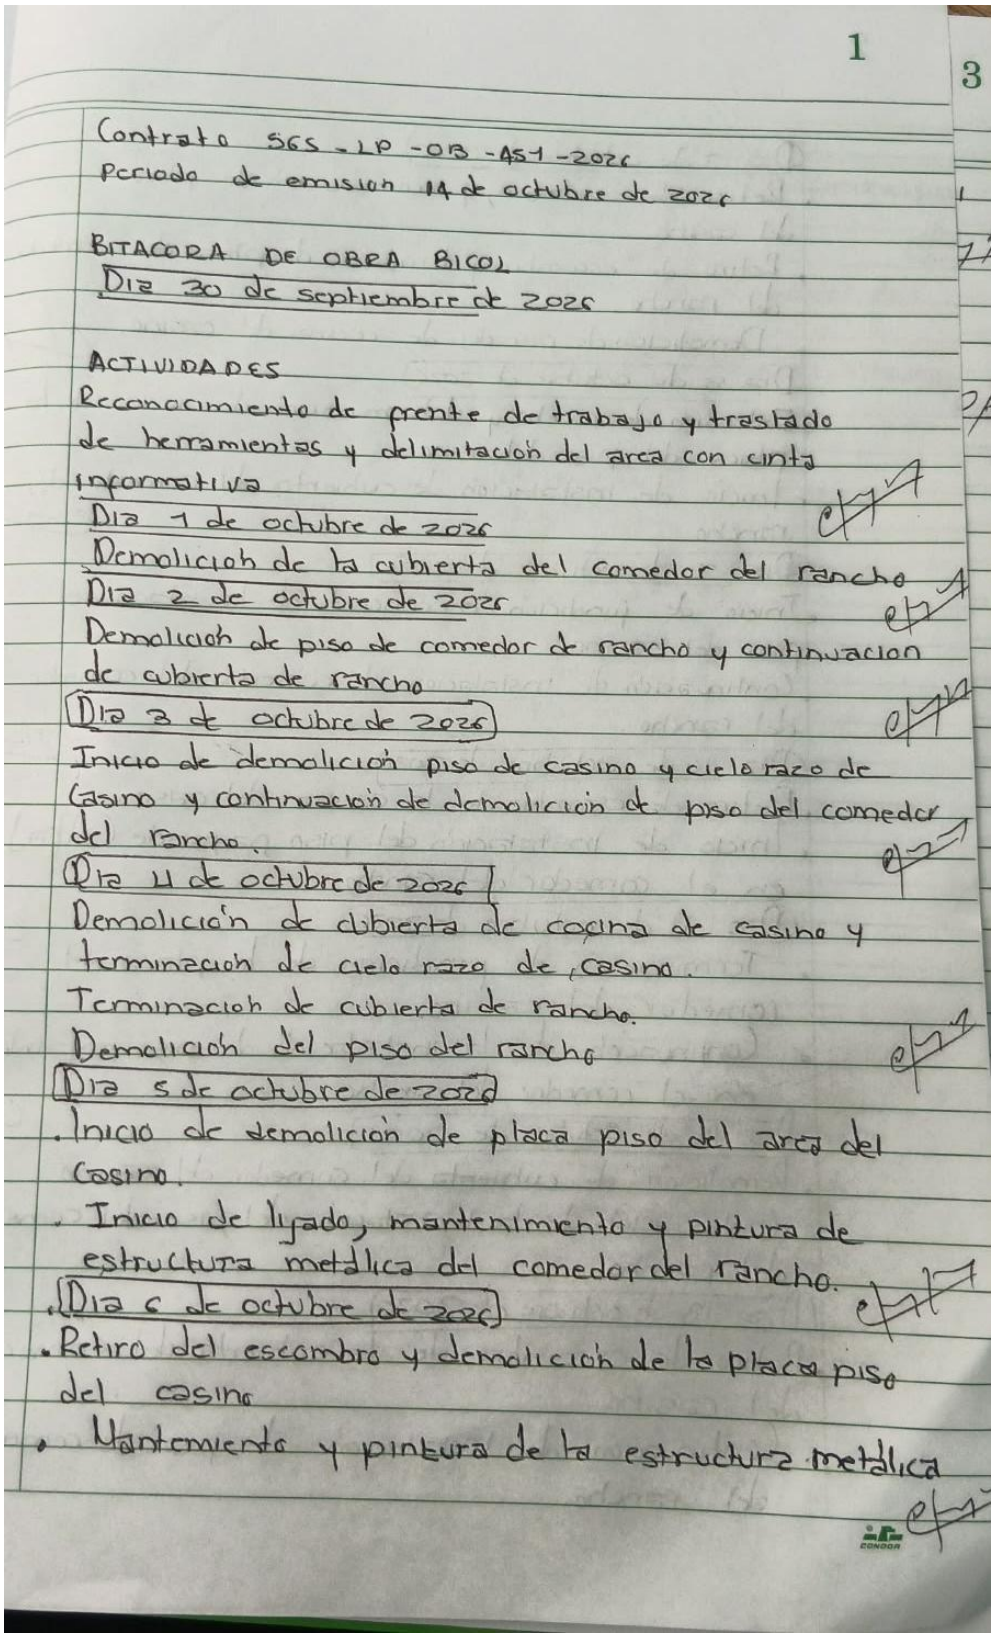

1

3

Contrato SGS - LP - OB - AST - 2026
Periodo de emision 14 de octubre de 2026

BITACORA DE OBRA BICOL
Dia 30 de septiembre de 2026

ACTIVIDADES
Reconocimiento de frente de trabajo y traslado de herramientas y delimitacion del area con cinta informativa
Dia 1 de octubre de 2026
Demolicion de la cubierta del comedor del rancho
Dia 2 de octubre de 2026
Demolicion de piso de comedor de rancho y continuacion de cubierta de rancho
Dia 3 de octubre de 2026
Inicio de demolicion piso de casino y cielo raso de casino y continuacion de demolicion de piso del comedor del rancho.
Dia 4 de octubre de 2026
Demolicion de cubierta de cocina de casino y terminacion de cielo raso de casino.
Terminacion de cubierta de rancho.
Demolicion del piso del rancho
Dia 5 de octubre de 2026
. Inicio de demolicion de placa piso del area del casino.
. Inicio de lijado, mantenimiento y pintura de estructura metalica del comedor del rancho.
. Dia 6 de octubre de 2026
. Retiro del escombro y demolicion de la placa piso del casino
. Mantenimiento y pintura de la estructura metalica

Día 7 de octubre de 2026
- Retiro de escombro, y recomposición de placa del casino.
- Retiro de escombro y limpieza de placa del corredor del rancho.
- Demolición de paredes de cocina del casino.

Día 8 de octubre de 2026
- Extensión de recebo y determinación de niveles de la placa del piso del casino.
- Inicio de instalación de cubierta del corredor del rancho.


Día 9 de octubre de 2026
Inicio de fundición en concreto de la placa del piso del casino.
Continuación de instalación de cubierta del corredor del rancho.

Día 10 de octubre de 2026
Retiro de escombro de la cocina del casino.
Inicio de instalación del piso parqande (Alfa) en el comedor del rancho.

Día 11 de octubre de 2026
Terminación de fundición de la placa del comedor del casino.
Continuación de la instalación de piso parqande en el comedor del rancho.

Día 12 de octubre de 2026
Demolición de cubierta del comedor del casino
Continuación de la instalación del piso del comedor del rancho

Día 13 de octubre de 2026
Retiro de escombro de la cubierta del comedor del casino
Continuación de instalación de piso de comedor del rancho.

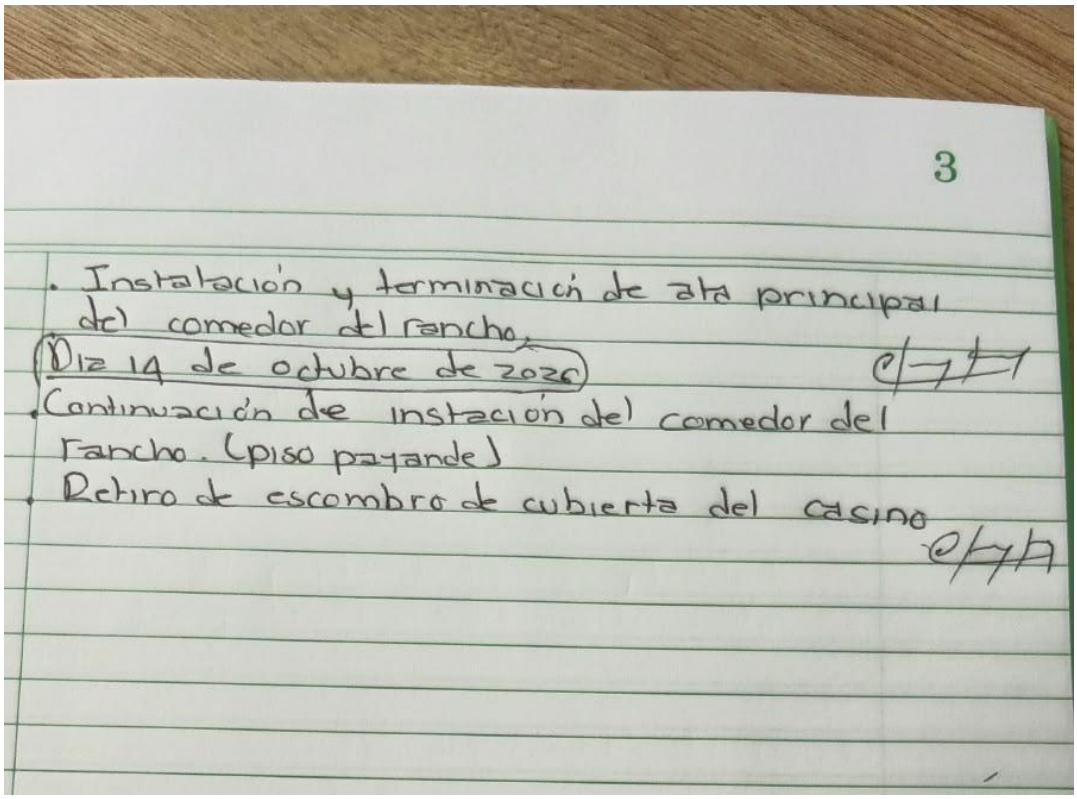

Contratista:

CARLOS EDUARDO MARCIGLIA FERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA
