	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión	2
		Vigencia	31/12/2020

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	05/03/2021	**PERIODO REPORTADO DEL:**	01/02/2021	**AL:**	28/02/2021
CONTRATO Nº	147-00-A-COFAC-DIFRA-2020	**CONTRATISTA**	CARLOS VERGARA NEGRETE		
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUÁREZ – CALI - VALLE DEL CAUCA				
FECHA DE INICIO	15/12/2020	**FECHA DE TERMINACIÓN**	14/12/2021		

VALOR INICIAL	$ 790,607,197.14	**VALOR ADICIONAL** (Si aplica)	$ -	**VALOR REDUCCIÓN** (Si aplica)	$ -	**VALOR TOTAL**	$ 790,607,197.14
			0				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE APROBÓ POR AMBAS PARTES EN LA PLATAFORMA SECOP II EL DIA 06-NOV-2020, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO MEDIANTE CRP No. 545420 del 12-NOV-2020 Y NUMERO DE POLIZA No.75-44-101108836 QUE CONTEMPLA LOS SIGUIENTES MECANISMOS DE COBERTURA: Cumplimiento del contrato: Desde 06/11/2020 hasta 31/08/2022 por valor de $237.182.159,10; Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales: Desde 06/11/2020 hasta 10/12/2024 por valor de $39.530.359,85 Calidad del servicio: Desde 06/11/2020 hasta 06/11/2025 por valor de $395.303.598,50.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA


Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
				EQUIPOS DE OFICINA (PC, IMPRESORA, PAPELERIA, ETC)	1	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	1	50	50	SI	S/N
						RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	1	100	100	SI	S/N
						SISO	1	100	100	SI	Verificacion de personal en obra
						TOPOGRAFÍA	2	25	25	SI	Localizacion y replanteo
						TOTAL	5				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
Semana 1	3.20%	**5.37%**	**2.94%**	**2.43%**
Semana 2	3.47%			
Semana 3	4.21%			
Semana 4	5.37%			
Semana 5				

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**2.94%**
EJECUTADO		**5.37%**

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SIENDO ACCESORIO DEL CONTRATO DE OBRA SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES DE AVANCE QUE ESTE ULTIMO (LEY 1474 DE 2011 ART. 84 Y 85 / DERECHO CIVIL - Principios - PRINCIPIO DEL DERECHO CIVIL - Lo accesorio sigue a lo principal) .

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	365	76	289
Proyección	356	76	280

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	APROBADAS POR INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO CVN-FAC147-003-2020 DEL 15-DIC-2020
ACTAS DE VECINDAD	SI	SI	SI	VERIFICADAS Y APROBADAS POR LA INTERVENTORÍA
PRESENTACION HOJA DE VIDA INTERVENTORIA	SI	SI	SI	APROBADAS POR LA SUPERVISIÓN (FORMATO-JELOG-FR-078), DURANTE EL LAPSO SE PRESENTO DOS SOLICITUDES DE CAMBIOS DE PROFESIONALES (DIRECTOR Y AUX DE INGENIERIA).
PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO CVN-FAC147-003-2020 DEL 15-DIC-2020
PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	SI	SI	SI	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO CVN-FAC147-003-2020 DEL 15-DIC-2020 Y ACTUALIZADO MEDIANTE OFICIO CVN-FAC147-030-2020 DEL 02-FEB-2021
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CONTRATISTA	SI	SI	SI	ENTREGADO Y APROBADO POR INTERVENTORIA
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE OBRA	SI	SI	SI	APROBADO POR LA INTERVENTORÍA MEDIANTE OFICIO CVN-FAC147-003-2020 DEL 15-DIC-2020
INFORME MENSUAL DE OBRA	SI	SI	SI	INTERVENTORIA DA CUMPLIMIENTO A ESTA OBLIGACIÓN, ENVIADO EL INFORME MENSUAL EL DIA 04-MAR-2021 DE ACUERDO A LOS ANEXOS SOLICITADOS EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo se realizaron las asiguientes actividades y se tramitaron los siguienets documentos:
*Mediante Oficio CVN-FAC147-030-2020 del 02-feb-2021 la interventoria aprueba la modificación ITEM 3 del Plan de Inversión del Anticipo", por lo que este plan es actualizado.
* Teniendo en cuenta ordenes impartidas por CAF, mediante oficios FAC-S-2021-004047-CE del 15-FEB-2021 y FAC-S-2021--004054-CE del 17-FEB-2021, se citan a los representantes legales de obra e interventoría el dia 20 de febrero de 2021 en el sitio de la sobras para reunion de carcter gerencial en el que se notificará a esas partes la importancia y relevancia que tiene el proyecto a nivel FAC y nacional.
*Teniendo en cuenta la reunion antes mencionada, se asiste por parte de esta superviison a cambio el dia 20-feb-2021 y se realiza comite de obra, se destacan los temas tratados referente a la adquisicion temparana de los equipos de comunicaciones por parte del contratista para evitar demoras en los procesos de importacion y nacionalizacion, lo anterior teniendo en cuenta que el capitulo electrico y de comunicaciones equivale aproximadamente 40% del valor del contrato (se anexa acta del comite).
* Con el animo de preveer el ingreso del futuro personal obrero del proyecto, la intervenoria radica en medio fisico y en original a la EMAVI, los estudios de seguridad del personal operativo que va a participar en el proyecto para actividades futuras. Lo anterior mediante oficio CVN-FAC147-036-2021 del 23-feb-2021.
* de acuerdo a las politicas financieras de la FAC, mediante correo electronico de fecha 26 de febrero de 2021, se notifica a la interventoria las fechas de solicitud de PAC y posterior entrega de documentacion para el PAC de abril, lo anterior teniendo en cuenta que segun las formas de pago de los contratos de obra e inetrventoria, enmarcan como corte parcial el primer cuatrimestre del 2021.
* Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, referente a la importancia del capitulo electrico y de comunicaciones del proyecto, se programa reunion virtual con el personal de estructuradores del area de voz y datos de la FAC con los asesores en comunicacones de la obra e interventoria, por lo anterior se envia correo el 02 de marzo a la interventoria en la que se notifica d ela reunion para el dia viernes 05 de marzo de 2021, esta reunion virtual tiene como unico objetivo dejar completa claridad del alcance de los capitulos de voz y datos contratados de tal forma que los contratistas entiendan los equipos por adquirir, sus referencias y caracteristicas, las cuales deben ser compatibles a lo ya existente en la FAC.
* mediante oficio N°CVN-FAC147-041-2020 04MAR2021 se envia por medio de correo electronico el informe mensual del contrato de obra, lo anterior en cumplimiento de las obligaciones contractuales d ela interventoria.
* Durante el periodo, la interventoria reporto las siguientes actividades en obra: 1. El contratista continúa con la figuración del acero de columnas y pantallas del bloaue A , se instala formaletas metalicas para columna A2, pantalla A3 y muros del ascensor en el Bloque A. 2.- Para el presente periodo el consytructor inició con las excavaciones para tuberia de 4" sanitarias , excavacion de 2 caja de inspeccion, para conexiones de los baños en el bloque A. Posterior a esto,. se instaló las tiuberías bajo las especificaciones técnicas para el proyecto. 3. El constructor terminó con las excavacion para tuberia de 2" pvc de presion, que van desde cuarto técnico hasta el punto de conexión en bloque A. 4. El constructor inició con el vaciado de base en concreto del tanque de abastecimiento de agua potable, la interventoría solicitó la corrección de refuerzo en un área de dicho tanque por falta de acero de refuerzo. 5. Se realiza fundida de vigas de cimiento en el bloque B o cuarto técnico, antes de dichas fundidas la interventoría inspeccionó las densidades a los rellenos en ésta área, dando resultados del 100% de compactación. 6. Se tuvo en obra de presencia de profesional de telcomunicaciones de la FAC, en donde indicó cuidados en una de las redes existentes que atraviezan ekl área de influencia del proyecto. 7. Se Termina con el relleno con material seleccionado en las excavaciones de las zapatas faltantes en el proyecto, tales como las zapatas n. A2 y A3, debido a la presencia de tubería de red de aguas combinadas en el punto. 8. Se realiza fundida pedestal para columna A2 y pantalla A3 correspondiente al b loque A. 9.El contratista realizó todos las acciones encaminadas al cumplimiento del PAPSO, INFORMES MENSUAL DE OBRA, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE CALIDAD, CERRAMIENTOS, PLAN SST.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

* Actividades propias de las obligaciones del contrato de interventoria / entrega de la documentacion necesaria para incluir las actividades planeadas en el contrato, lo anterior de acuerdo a lo descrito en el estudio previo del mismo.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 790,607,197.14	$ 790,607,197.14	$ 42,455,606.49	5.37%	$ 748,151,590.65	95%
Adiciones	N/A	$ 0.00				
Reducciones		$ 0.00				
TOTAL	$ 790,607,197.14	$ 790,607,197.14				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 790,607,197.14	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0.00	
VALOR TOTAL	$ 790,607,197.14	
ANTICIPO	$ 0.00	
PRIMER PAGO PARCIAL PAC DICIEMBRE Y/O CXP 2020	$ 9,282,000.00	TRAMITADO
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 781,325,197.14	POR EJECUTAR Y TRAMITAR


12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

* En la actualidad esta en apliacacion los protocolos de bioseguridad por la emergencia de salud pública generada por el Coronavirus – COVID-19, el cual el 11 de marzo de 2020 la organización Mundial de la Salud – OMS declaró como una pandemia (Epidemia que se ha extendido a varios países o continentes, que generalmente afecta a un gran número de personas. OMS), por lo que el desarrollo de las funciones de la interventoria se esta repartiendo entre teletrabajo y visita al sitio de las obras (de acuerdo a las prioridades tecnicas y actividades que se estan ejecutando en obra).

* Se anexa al presente informe los soportes de pago de salud, pension, riesgos, etc, del grupo de interventoria que esta ingresando a la EMAVI.

13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

Se anexa reporte avalado por inetrventoría



Capitán **YESID TOVAR BAREÑO**
Supervisor Contrato de Interventoria No. 147-00-A-COFAC-DIFRA-2020.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		**S/N**
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		**S/N**
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		**S/N**
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)	**X**		**VERIFICACION DEL EQUIPO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA INTERVENTORIA**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		**S/N**
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y	**X**		**CONTRATISTA DA CUMPLIMIENTO A LOS PLANES PROPUESTOS, SE DESTACA EL PLAN**

	parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato			**DE MANEJO AMBIENTAL, SISO Y DE COVID-19**
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		**DE ACUERDO A DEDICACIONES DE PROFESIONALES E INFORMES TECNICOS ENTREGADOS**
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		**OFICIOS ENVIADOS DESCRITO EN INFORMES DE SUPERVISION**
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		**S/N**
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		**S/N**
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o			**N/A**

	novedades presentadas en la ejecución del mismo			
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			**N/A, CONTRATO AUN ESTA EN EJECUCIÓN**



CT. YESID TOVAR BARENO
Supervisor de contrato

Santiago de Cali., 2 de febrero de 2021 Cód. **CVN-FAC147-030-2020**

Señores:
Consorcio Obras Espacial CALI.
Atn. Arq. Ever José Salgado Salgado.
Representante Legal.
Cr. 52A No. 123B – 10 Barrio Batan.
PBX. (1) 7038345.
Cel. 3135118994.
Bogotá D.C.

Ref.**, Contrato Electrónico de Obra No.143-00-A-COFAC-DIFRA-2020, cuyo Objeto es LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ – CALI. – VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: Aprobación a la modificación ITEM 3 del Plan de Inversión del Anticipo".

Respetado Arquitecto Salgado**,**

Acusamos recibo de su comunicado N. COEC-09-29-01-2021 de fecha 29 de enero del cursante, en donde usted solicita la aprobación a la modificación del asunto con el fin de adquirir por medio de compras maquinarias para la ejecución del proyecto que nos ocupa. Por todo lo anterior, y una vez verificado la documentación adjunta a dicho comunicado, la firma CARLOS VERGARA NEGRETE en sus funciones contractuales **APRUEBA** la modificación solicitada, y requiere la notificación oficial a las oficinas de la Fiduciaria Bogotá.

Atentamente,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C

Anexos: oficio n. COEC-09-29-01-2021
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPOACTUALIZADO 29 ENERO.

cc. CT HECTOR YESID TOVAR BAREÑO Supervisor Principal FAC.

CONSORCIO OBRAS ESPACIAL CALI
NIT 901.427.730-0

Bogotá D. C., Enero 29 de 2021

COEC-09-29-01-2021

Señores
CARLOS VERGARA NEGRETE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
INTERVENTORIA CONTRATO
Carrera 56 No. 153-15 interior 1 Oficina 3026
Teléfono: (1) 3007441
Email: cvn.fac147@gmail.com
La ciudad

Referencia: CONTRATO 143-00-A-COFAC-DIFRA-2020 CUYO OBJETO ES LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION MARCO FIDEL SUAREZ – CALI- VALLE DEL CAUCA

Asunto: **SOLICITUD CAMBIO DE PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO**

Respetados señores:

Estamos solicitando su aprobación para realizar el cambio en el rubro del plan de inversión del anticipo correspondiente al ITEM 3 el cual está actualmente como "ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA" para cambiarlo por "COMPRA Y ALQUILER DE EQUIPO Y MAQUINARIA" toda vez que la maquinaria que se necesita corresponde a maquinaria y herramienta menor la cual es de rápida y fácil depreciación

Agradecemos atención y quedamos atentos a cualquier inquietud

EVER JOSÉ SALGADO SALGADO
C.C. No. 7´917.558 de Cartagena
Representante legal
CONSORCIO OBRAS ESPACIAL CALI

Fuerza Aérea Colombiana	**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**	CONSORCIO OBRAS ESPACIAL CALI

PROGRAMACIÓN INICIAL	X	FECHA	25 NOVIEMBRE DE 2020
REPROGRAMACIÓN			
CONTRATO Nº.	143-00-A-COFAC-DIFRA-2020		
OBJETO	"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LEL MANTENIMIENTO MAYOR Y ADECUACION DE LOS ALOJAMIENTOS DE CADETES UBICADOS EN LA BASE AEREA MARCO FIDEL SUAREZ CALI VALLE DEL CAUCA"		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$		7.261.542.854,55
CONTRATISTA	CONSORCIO OBRAS ESPACIAL CALI		
R.L. CONTRATISTA	ARQUITECTO EVER JOSÉ SALGADO SALGADO		
INTERVENTOR	INGENIERO CARLOS VERGARA NEGRETE		
R.L. INTERVENTORÍA	INGENIERO CARLOS VERGARA NEGRETE		
PLAZO	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	50%		$3.630.771.427,27

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Compra de Materiales, Accesorios y Repuestos	2.178.462.856,36	60,00%
2	Gastos de instalacion	72.615.428,55	2,00%
3	Compra y Alquiler de Equipos y Maquinaria	181.538.571,36	5,00%
4	Gastos de Transporte	72.615.428,55	2,00%
5	Pagos de Salarios y Jornales	181.538.571,36	5,00%
6	Subcontratos de Mano de Obra e Instalación	944.000.571,09	26,00%
		3.630.771.427,27	100,00%

Nota:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Solo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

Firma

Nombre: ARQ. EVER SALGADO SALGADO

R.L CONSORCIO OBRAS ESPACIAL CALI

CONTRATISTA

Firma

Nombre: ING CARLOS VERGARA NEGRETE

R.L ING. CARLOS VERGARA NEGRETE

INTERVENTORIA

Bogotá D.C., 04 de marzo de 2021 **Cód. CVN-FAC147-041-2020**

Señores:
Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana.
CT. Héctor Yesid Tovar Bareño.
Subdirección de Seguimiento y Control.
Dirección de Infraestructura – DIFRA.
Supervisor Principal.
Cr. 13 No. 66 – 47.
Tel. 3159800 Ext. 050-2949.
Bogotá D.C.

Ref.**, Contrato Electrónico de Interventoría No.147-00-A-COFAC-DIFRA-2020, cuyo Objeto es contratar en nombre de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Fuerza Aérea Colombiana LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMNISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ – CALI. – VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: Remisión Informe Mensual N. 03, comprendido entre los días 01 hasta el 28 de febrero de 2021.

Respetado Capitán Tovar**,**

Por medio del presente nos permitimos adjuntar informe mensual de obra N. 03, comprendido entre los días 01 hasta 28 de febrero del cursante. Todo esto para los fines pertinentes, hasta que se radiquen en sus oficinas.

Atentamente,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C
Anexos: Informe de mensual N,03

Remisión de Informe Mensual de Interventoría N. 3 FAC-CALI

CVN INGENIERIA & ARQUITECTURA FAC-CALI <cvn.fac147@gmail.com>

Jue 4/03/2021 10:04 PM

Para: CT. HECTOR YESID TOVAR BAREÑO <HECTOR.TOVAR@FAC.MIL.CO>; MY. FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ <FABIO.ROBLES@FAC.MIL.CO>; MY. JORGE ANTONIO GARZON ROJAS <JORGE.GARZON@FAC.MIL.CO>
CC: jaeg-ab@hotmail.com <jaeg-ab@hotmail.com>; marcela_1696@hotmail.com <marcela_1696@hotmail.com>; Arq Fabian Rada <fabianrada@hotmail.com>; ing.carlos Vergara <ing.carlosvergara@hotmail.com>

1 archivos adjuntos (365 KB)

Oficio N°CVN-FAC147-041-2020 (Remisión Informe mensual 03.).pdf;

Buenas Noches
CT TOVAR.
SUPERVISOR FAC

Adjuntamos al presente lo del asunto, para su conocimiento y fines pertinentes.

sin más.
--

EQUIPO DE INTERVENTORÍA
CARLOS VERGARA NEGRETE

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

- **INFORME TECNICO MENSUAL No.3 DE INTERVENTO…**
- **INFORME MENSUAL N.3 SST y Ambiental (TOMO IV)….**
- **INFORME MENSUAL N. 3 SST y Ambiental (TOMO I).pdf**
- **INFORME MENSUAL N. 3 SST y Ambiental (TOMO II)….**
- **INFORME MENSUAL N. 3 SST y Ambiental (TOMO III)...**
- **INFORME MENSUAL N. 3 SST y Ambiental (TOMO V)….**
- **INFORME TECNICO MENSUAL No.3 DE INTERVENTO…**

Re: Reunion area TICS proyecto edificio del espacio

CVN INGENIERIA & ARQUITECTURA FAC-CALI <cvn.fac147@gmail.com>

Jue 4/03/2021 2:33 PM

Para: CT. HECTOR YESID TOVAR BAREÑO <HECTOR.TOVAR@FAC.MIL.CO>
CC: TE. DIEGO ALBERTO NOGUERA GIRALDO <DIEGO.NOGUERA@FAC.MIL.CO>; TE. YULI FERNANDA CARDENAS TORRES <YULI.CARDENAS@FAC.MIL.CO>; gerencia@salgado.com.co <gerencia@salgado.com.co>; sas.consultorias@gmail.com <sas.consultorias@gmail.com>; Cubo Aerospacial <cuboaerospacial@gmail.com>; ever jose salgado salgado <everjsal2006@yahoo.es>; jaeg-ab@hotmail.com <jaeg-ab@hotmail.com>; marcela_1696@hotmail.com <marcela_1696@hotmail.com>; Arq Fabian Rada <fabianrada@hotmail.com>; ing.carlos Vergara <ing.carlosvergara@hotmail.com>

Buenas Tardes.
CT TOVAR
SUPERVISOR-FAC

Dando respuesta a su solicitud, se relacionan los profesionales que estarán en comité virtual el día de mañana:

CONTRATISTA.
Ing. Rafael González. e-mail: rafaeldavidgm@outlook,com (Estará en representación de Ing. Emerson Escamilla Murte, que por razones personales no podrá asistir a la reunión)
Arq. Silvio Soto/ Ing Yudy Gutiérrez e-mail: cuboaerospacial@gmail.com.

INTERVENTORÍA.
Ing. Carlos Montiel. e-mail: carlosmmontiel@gmail.com
Ing. Diego Oviedo. e-mail: ingenierodiegooviedo@gmail.com (profesional de apoyo por parte de la interventoría.
Arq. Fabian Rada/ Arq Alexander Palacio: e-mail: cvn.fac147@gmail.com.

Sin más.

slds.

El mar, 2 de mar. de 2021 a la(s) 15:18, CT. HECTOR YESID TOVAR BAREÑO (HECTOR.TOVAR@fac.mil.co) escribió:

> Sres Interventoría
> Buenas tardes
>
> Teniendo en cuenta que el componente de voz y datos del proyecto corresponde a un 40% aproximado del valor del proyecto, se solicita se envíe por este medio los correos electrónicos del Ingeniero Carlos Montiel Petro (interventoría) y del ingeniero de sistemas /telecomunicaciones del contratista.
>
> Lo anterior, con el ánimo de programar una reunión el próximo viernes 05-marzo-2021 en horas de la mañana en la que participaran los estructuradores técnicos de esta área y en la que se pretende dejar

completamente claro el alcance de los equipos y actividades por realizar en cuanto a voz y datos se refiere.

Cordialmente,

Capitán Yesid Tovar Bareño
Subdirección de Seguimiento y Control
Dirección de Infraestructura – DIFRA
Cr. 13 No. 66 – 47 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3159800 Ext. 050-2949
hector.tovar@fac.mil.co

--

EQUIPO DE INTERVENTORÍA
CARLOS VERGARA NEGRETE

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

Solicitud y tramite pago contrato de obra e interventoria PAC ABRIL

CT. HECTOR YESID TOVAR BAREÑO <HECTOR.TOVAR@FAC.MIL.CO>

Vie 26/02/2021 2:51 PM

Para: ALEXANDER PALACIO <cvn.fac147@gmail.com>

Sres interventoría
Buenas tardes

Me permito enviar la información relacionada por el departamento financiero de la FAC, respecto al pago en el mes de abril de los contratos de obra e interventoría:

Buenos tardes, señores Ordenadores del Gasto, Supervisores de contratos y personal que interviene en la ejecución presupuestal: Respetuosamente me permito solicitar a los señores Supervisores relacionados, se confirme a la Dirección de Gestión y Seguimiento Administrativo (DIGES) a más tardar **el día lunes 01-MARZO-2021 a las 15:00 horas**, los valores respectivos para el trámite de PAC para el mes de ABRIL/2021, dicha solicitud de PAC debe ser enviada al correo hector.tovar@fac.mil.co.

Así mismo, me permito solicitar se allegue con **PLAZO 10-MARZO-2021 a las 14:00 horas la** documentación Digital para pago que soporta el PAC de ABRIL/21 solicitado por el personal de supervisores e interventores.

Cordialmente,

Capitán Yesid Tovar Bareño
Subdirección de Seguimiento y Control
Dirección de Infraestructura - DIFRA
Cr. 13 No. 66 - 47 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3159800 Ext. 050-2949
hector.tovar@fac.mil.co

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRAS	Versión N°:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Acta Consecutivo No.	07	Lugar y Fecha	Campamento de Obra – Edificio Espacial FAC - Cali
Asunto	Comité de Seguimiento de avance de Obra		
Oficina Productora	Supervisión FAC.		
Hora Inicio	03:20 p.m.	Hora Finalización	04:20 p.m.
Ausentes	Ninguno		

Orden del día:

1. Reunión Gerencial.
2. Equipos.
3. Entrega del 50% del anticipo, para la compra del componente de los equipos, del componente eléctrico y del componente de telemática.
4. Pagos.
5. Varios.
6. Compromisos.

Desarrollo:

En el día de hoy, 20 de febrero de 2021, se dieron cita en las instalaciones Administrativas de la EMAVI, los Altos Directivos de las FAC, El Segundo Comandante, el Comando de apoyo a la Fuerza, y el Generador del gasto – El Director de DIFRA junto a los Representantes Legales tanto de la Interventoría y el Consorcio Obras Espacial Cali, para llevar una reunión gerencial, dónde se indicó que el Arq. Ever Salgado – Representante Legal del Consorcio, se compromete a mantener la programación y avance de la obra, hasta el final de la fecha acordada en el Acta de inicio.

En el presente día, se reúnen en la obra, el Supervisor de la FAC – CT. Tovar, el Representante Legal de la Interventoría – Ing. Carlos Vergara, el Residente de la Interventoría – Arq. Alexander Palacio, el Residente SST de Interventoría – Técn. S.O. Jhovanny Escobar; el Representante Legal del Consorcio – Arq. Ever Salgado, la Directora de Obra – Ing. Yudy Gutiérrez y el Residente SST de Obra – Tecn. SST Alberto Jaraba.

Dá inicio al presente comité del seguimiento de obra, siendo las 03:26 p.m.; El CT. Tovar, quién precisa en los equipos, la parte eléctrica y la parte de telemática en general.

- Equipos con IVA: 12%
- Equipos sin IVA: 12%
- Eléctrico: 12%
- Telemática: 12%

El equivalente al 40% del contrato. Son unos $2.800.000.000.

A lo anterior, interviene el Residente de Interventoría, quién expresa que se debe tener muy en cuenta los tiempos que se requieren, a saber: La instalación, la puesta en marcha y las capacitaciones correspondientes para el manejo, el control y las recomendaciones adheridas a los mantenimientos respectivos.

El CT. Tovar, pregunta que, a hoy; se le ha entregado el 50% del anticipo al Contratista, con más de $3.500.000.000, qué equipos ha comprado?, o ha separado (pre facturado) para la obra?. La Interventoría en cabeza de su Representante Legal, le dá información que a la fecha se encuentra en la parte de cotizaciones, asiste el Residente de la Interventoría, que no hay ninguna operación todavía. El CT Tovar, pregunta que, ¿Según el flujo de inversión, en qué semana el Contratista debe comprar los equipos correspondientes?. La Interventoría indica que está estimado en la última semana del mes de marzo del año en curso. El CT Tovar, insiste en realizar control, y le indica a la Interventoría que lleve a cabalidad esos

controles, expresa que el Consorcio deberá entregar para esa fecha estimada, finales de marzo, las facturas y la trazabilidad de cada uno de los equipos y demás, aportando la información de qué lugar o sitio internacional, fueron adquiridos.

También indica el El CT Tovar que, a la fecha, y con el anticipo entregado, no quiere excusas ni pretextos cómo la subida del dólar, que aún no se le ha entregado el anticipo para la compra al Contratista, ni que lo cotizado ahora fue de equis valor y para el día de la compra se lo subieron a otro tanto. Deben mitigar el riesgo por esos posibles problemas. Deben de relacionar toda la información desde finales de marzo, ya que es de conocimiento de todos que son de los ítems que más pesan en la obra. Por lo anterior, la intención real de entregar el anticipo es, precisamente para la compra de los equipos.

Hace la claridad El CT Tovar, que desde ya se revise ítem por ítem de las cámaras y de los equipos que deben tener software compatible – integrado. Ya que, por experiencia en otro proyecto, se presentó que: "Compraron las cámaras de seguridad, venía con un software que duró sólo 8 días; y no se tuvo en cuenta que el software debería ser por un mayor tiempo, para que fuera éste, funcional y eficaz". No quiere tener ambigüedades. Dependiendo de la revisión, se le entregue la claridad y la certeza al Supervisor de la FAC, evitando así, posibles problemas a futuro y quizás, algunos reprocesos que harían atrasar la entrega posterior.

El Representante legal de la Interventoría, indica a lo anterior que se recibe la directriz por parte del Supervisor de la FAC, se organizaran las órdenes correspondientes para prevenir dicho riesgo. Buscando la manera de que la obra fluya, teniendo en cuenta la necesidad de la FAC. También previendo la compra de los equipos.

En medio del comité, se le requiere al CT. Tovar, qué posibilidades hay de tener contacto con el Asesor Estructural de la FAC, ya que, en el momento, tanto el Contratista e Interventoría, se ha tenido muchos inconvenientes con respecto a las cotizaciones de los proveedores que satisfaga al Cliente en cuánto a los proveedores de los equipos, según las especificaciones adquiridas. El CT. Tovar, realiza comunicación directa con dicho asesor de la FAC; autorizando que se comparta el número del contacto, para futuras comunicaciones directas, y solucionar de una forma más eficaz, algunos impases presentados.

- PAGOS: EL CT. Tovar, identifica que, para la primera semana del próximo mes de marzo se tendrá que realizar la primera facturación cuatrimestral con el valor exacto que se necesita separar en el PAC, ya que se ha dicho que debe ser utilizado (gastado) en su totalidad. La Interventoría, afirma lo dicho y es aceptado.


- VARIOS: El Residente de la Interventoría expone que, en el tema técnico se está madurando las especificaciones técnicas y el detalle en el método constructivo del filtro francés normal - perimetral, en ninguno de los planos se ha encontrado. Se hará una nueva revisión, a ver si de pronto se nos ha pasado. Hasta el momento haría falta definir la tubería perforada. Sin embargo, se hace la claridad que, si no se encuentra, se realizará el requerimiento pertinente al Supervisor del Contrato.

- A la fecha, llevamos cero reportes de casos confirmados y/o sospechosos por Covid-19.

- Se lleva también, un índice de cero reportes por accidentes y de enfermedades laborales.

Se dá cierre del presente comité, siendo las 04:20 p.m. sin contratiempos.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRAS	Versión N°:	2
		Vigencia:	07-05-2020

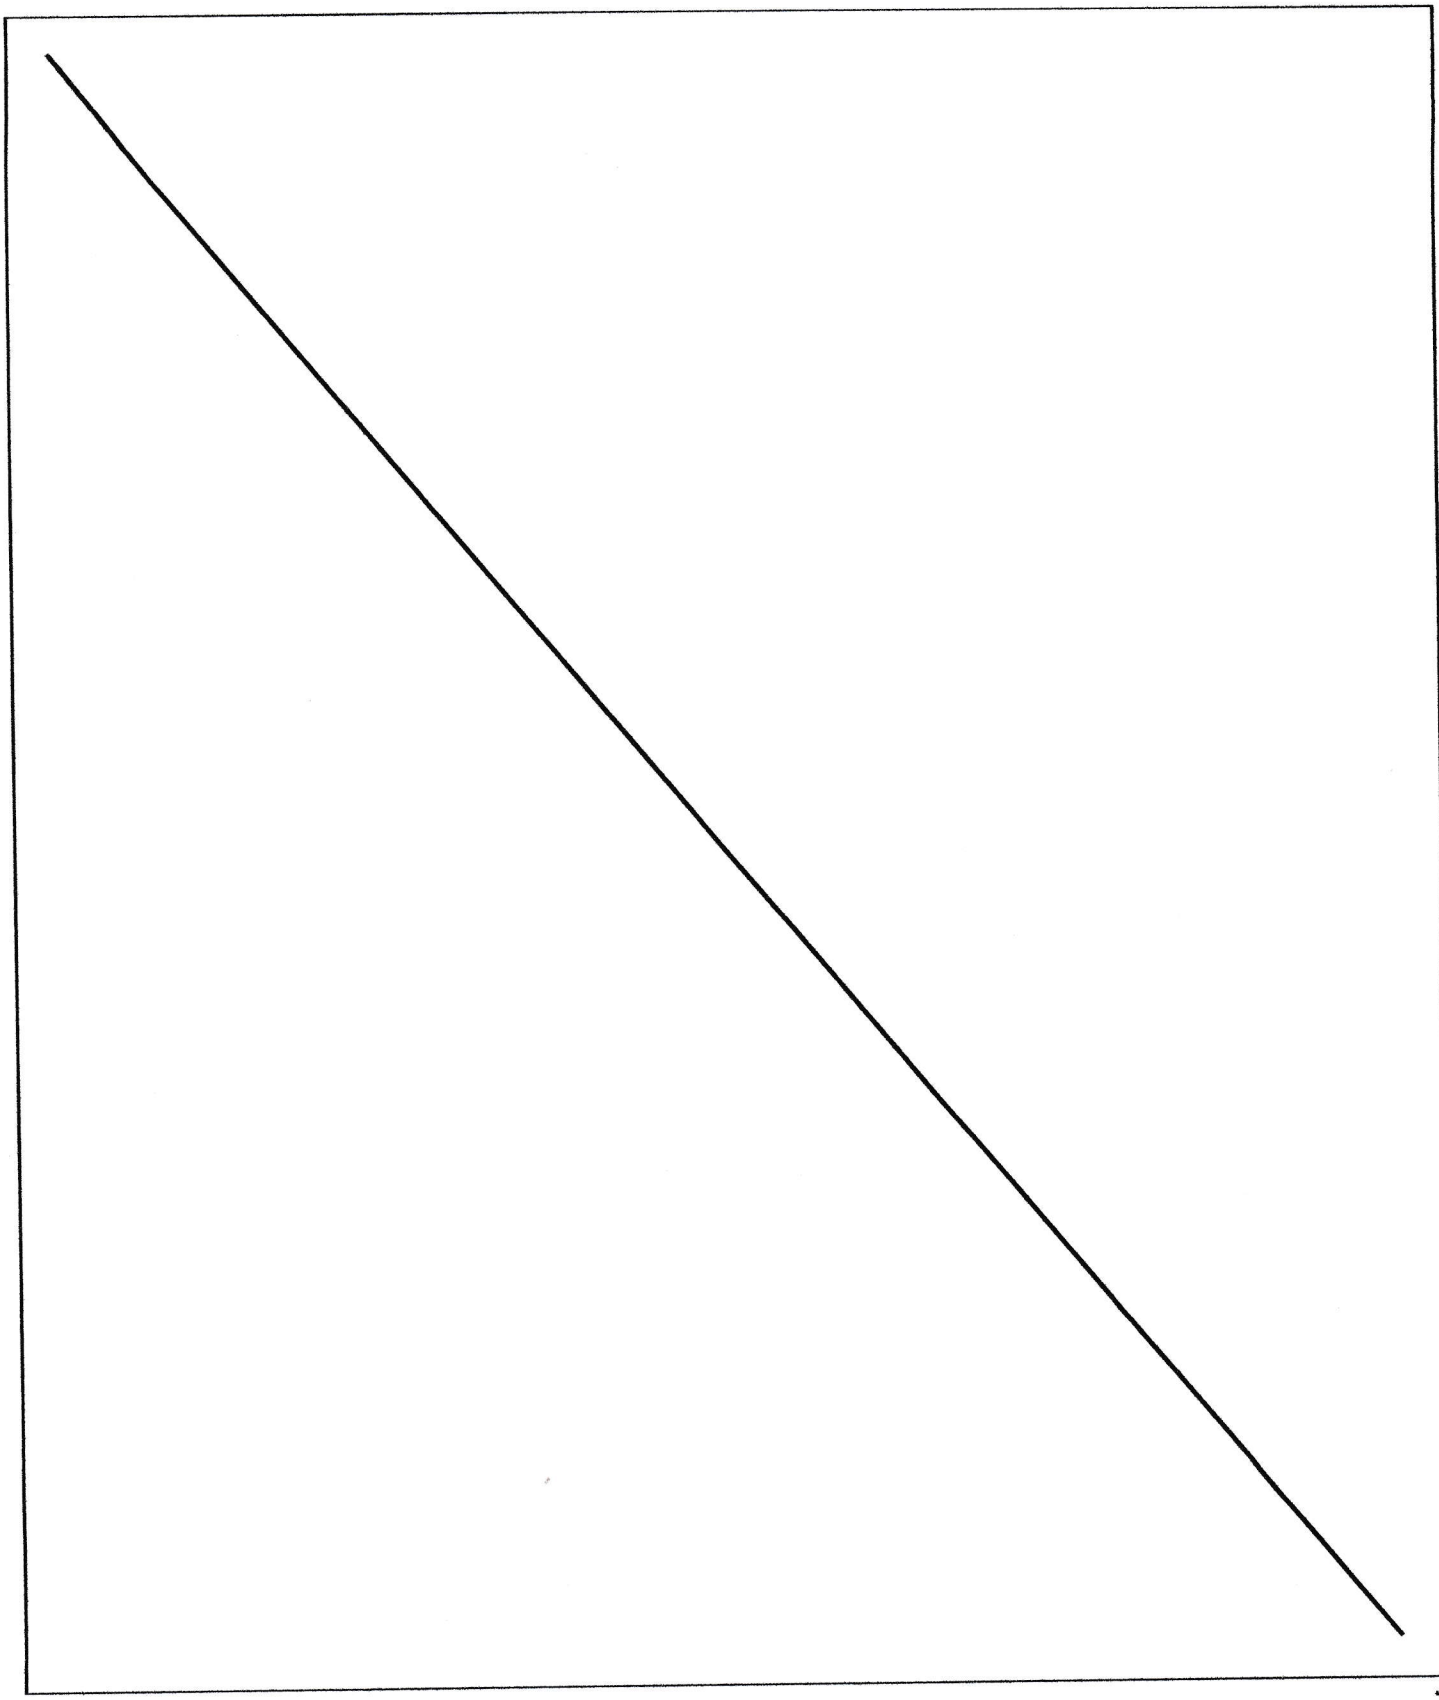

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE OBRAS	Versión N°:	2
		Vigencia:	07-05-2020

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**
Relacionar toda la información a la Interventoría, lo encontrado y lo relacionado a la compra de los equipos, junto al software que lo integran.	Consorcio Obras Espacial Cali	26 de marzo de 2021
Relacionar toda la información al Supervisor del Contrato, lo encontrado y lo relacionado a la compra de los equipos, junto al software que lo integran.	Interventoría Carlos Vergara Negrete	29 de marzo de 2021
Solicita las especificaciones técnicas y el detalle en el método constructivo del filtro francés normal – perimetral.	Interventoría Carlos Vergara Negrete	06 de marzo de 2021

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema	Seguimiento a los compromisos		
Fecha - Hora		**Lugar**	Obra Edificio Espacial.

FIRMAS,

Anexo.

Elaboró: Residente SST de Interventoría-Jhovanny Andrés Escobar Grajales
Revisó: Residente de Interventoría-Arq. Alexander Palacio Rodríguez.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CARLOS VERGARA NEGRETE Ingeniería & Arquitectura
	LISTADO DE ASISTENCIA	

Asistentes a comité N°: 07. **Fecha:** 20 de febrero/2021

N°	Nombre	Correo Electrónico y/o N° Telefónico	Cargo	Firma
1	Yuly Esperanza Gutierrez Ortegon	yulygutierrez@gmail.com	Directora Obra	
2	Edwar Jose Sabalo	Edwarsd2006@yahoo.es	Contratista	
3	ALEXANDER PALACIO R	cvn.fac147@gmail.com	RES. INTERVENTORIA	
4	Carlos Vergara Negrete	ing.carlosvergara@hotmail.com	RL Interventoría	
5	CT. Tovar Barrero Yesid	hector.tovar@fac.mil.co	Supervisor STO Interventoría	
6	Alberto Jacoba mercado	alberto.jacobamercado@hotmail.com	Inspector SST - Sobado	
7	Jhovanny A. Escobar G.	cvn.fac147@gmail.com	Residente HSE Interventoría	

La seguridad es de todos | Mindefensa | COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES | FUERZA AÉREA COLOMBIANA ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2021-004047-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-004047-CE del 15 de febrero de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DIFRA

Señor
EVER JOSE SALGADO SALGADO
Representante legal
Consorcio Obras Espacial Cali
Bogotá, D.C.

Contraseña:psPTPVjEmL

Asunto: Solicitud asistencia reunión.


Referencias:

1.Contrato 143-00-A-COFAC-DIFRA-2020, Construcción del edificio del espacio en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez – Cali - Valle del Cauca.

Me permito informar al señor Representante Legal Consorcio obra espacial Cali, que se requiere de su presencia el día sábado 20 de febrero de 2021 en el lugar de ejecución del proyecto (EMAVI), para una reunión de carácter gerencial con presencia del Señor Mayor General Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor FAC y el señor Mayor General Comandante Apoyo a la Fuerza, respecto a la oportuna ejecución del contrato de la referencia.

Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado por el señor Mayor General Comandante Apoyo a la Fuerza.

Amablemente,



Teniente Coronel WILLIAM ALEXANDER BELLO GOMEZ
Director Infraestructura

Anexo: N/A

Elaboró CT. TOVAR / SUCEC Revisó: MY. SALAS / SUCEC Aprobó

Reunion area TICS proyecto edificio del espacio

CT. HECTOR YESID TOVAR BAREÑO <HECTOR.TOVAR@FAC.MIL.CO>

Mar 2/03/2021 3:18 PM

Para: ALEXANDER PALACIO <cvn.fac147@gmail.com>
CC: TE. DIEGO ALBERTO NOGUERA GIRALDO <DIEGO.NOGUERA@FAC.MIL.CO>; TE. YULI FERNANDA CARDENAS TORRES <YULI.CARDENAS@FAC.MIL.CO>

Sres Interventoría
Buenas tardes

Teniendo en cuenta que el componente de voz y datos del proyecto corresponde a un 40% aproximado del valor del proyecto, se solicita se envíe por este medio los correos electrónicos del Ingeniero Carlos Montiel Petro (interventoría) y del ingeniero de sistemas /telecomunicaciones del contratista.

Lo anterior, con el ánimo de programar una reunión el próximo viernes 05-marzo-2021 en horas de la mañana en la que participaran los estructuradores técnicos de esta área y en la que se pretende dejar **completamente claro** el alcance de los equipos y actividades por realizar en cuanto a voz y datos se refiere.

Cordialmente,

Capitán Yesid Tovar Bareño
Subdirección de Seguimiento y Control
Dirección de Infraestructura - DIFRA
Cr. 13 No. 66 - 47 Bogotá D.C. Colombia
Tel. 3159800 Ext. 050-2949
hector.tovar@fac.mil.co

CARLOS VERGARA NEGRETE
Ingeniería & Arquitectura

Santiago de Cali, 23 de febrero de 2021 **Cód. CVN-FAC147-036-2021**

Señores:
Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea Colombiana.
Atn. CT Héctor Yesid Tovar Bareño.
Subdirección de Infraestructura – DIFRA.
Supervisor Principal.
Cr. 13 No. 66 - 47.
Tel. 3159800 EXT. 050-2949.
Bogotá D.C.

Ref., **Contrato Electrónico de Interventoría No.147-00-A-COFAC-DIFRA-2020, cuyo Objeto es contratar en nombre de la Nación- Ministerio de Defensa Nacional- Fuerza Aérea Colombiana LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA DE LA OBRA PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ – CALI VALLE DEL CAUCA.**

Asunto: Entrega de la documentación requerida para el estudio de seguridad del personal de la Obra Edificio el Espacio – FAC Cali.

Respetado CT Tovar,

Cordial saludo, la presente es con el fin de entregar la documentación requerida, con la subsanación pendiente (en el nuevo formato – versiones actualizadas) para el estudio, revisión y aprobación de seguridad del personal del Contratista de la Obra Edificio el Espacio – FAC Cali. Diligenciados en los respectivos formatos (OA-JIN-FR-108 versión No.2 y OA-JIN-FR-035 versión No.4) respectivamente.

A continuación, relaciono el listado de las personas para su debido estudio.

Personal del Consorcio Obras Espacial Cali.

1	GUTIERREZ ORTEGON	YUDY ESPERANZA	52540194	DIRECTORA DE OBRA
2	SOTO LAGARES	SILVIO ANTONIO	7385032	RESIDENTE DE OBRA
3	JARABA MERCADO	ALBERTO ANTONIO	9146894	INSPECTOR RESIDENTE SST
4	BOLAÑOS CORTÉS	MAUREN DAYANA	1144211419	AUXILIAR ADMINISTRATIVA
5	VALERO DIAZ	DARWIN	73180220	ALMACENISTA
6	JOHAN ALEXIS	RAMIREZ COGOLLO	1113664517	CONDUCTOR DE MINICARGADOR
7	SERNA MONTAÑO	SIGIFREDO	16508474	MAESTRO PLOMERIA
8	SERNA VALENCIA	HAROLD ENRIQUE	1007784302	AYUDANTE PLOMERO

Oficina Principal
Dirección: Carrera 9 No. 62B-06, Montería – Córdoba
Telefax: (4) 7894734, Celular: 310 654 1925
E – mail: contratoscvn@gmail.com

Oficina Bogotá
Dirección: Carrera 56 No. 153-15 Interior 1 Oficina 302, Bta.
Teléfono: (1) 3007441, Celular- 3187952682
E-mail: cvn.fac147@gmail.com

9	CARDONA GALLEGO	AIDA XIMENA	1081409746	AUXILIAR DE SUBCONTRATISTA
10	PARRA RAGA	CECILIO	4799576	OFICIAL
11	MENA ROBLEDO	JULIO	4799724	OFICIAL
12	REYES URREA	ALEX HERNAN	10347356	AYUDANTE
13	JARAMILLO MURILLO	JOEL	1077633662	AYUDANTE
14	VALENCIA SANCHEZ	SABINO	11812433	AYUDANTE
15	ORDOÑEZ MOSQUERA	YEISSON STEVEN	1023923427	AYUDANTE
16	PEREA MENA	JHON FREDY	1077438986	AYUDANTE
17	GOMEZ DIAZ	JOSE	1050781796	AYUDANTE
18	SANTOS RIVAS	MIGUEL	1077422062	OFICIAL

Adicionalmente, se relaciona el siguiente personal que cuenta con el estudio de seguridad radicado en la obra de Alojamientos Cadetes. Actualmente, se encuentran laborando en el frente del Consorcio Obras Espacial Cali.

1	PALACIOS HURTADO	ROSINO	1193472743	AYUDANTE DE OBRA	FAC-S-2020-179970-CL	15/12/2020
2	CORDOBA CORDOBA	KEVIN ANDRES	1077480397	AYUDANTE DE OBRA	FAC-S-2020-179970-CL	20/12/2020
3	VALOIS ARBOLEDA	BRAYAN ANDRES	1007648599	AYUDANTE DE OBRA	FAC-S-2020-179970-CL	23/12/2020
4	CUESTA MOSQUERA	JHON JAMES	1001025159	AYUDANTE DE OBRA	FAC-S-2020-184339-CL	16/12/2020
5	SUÁREZ	CARLOS ANDRES	1111774832	AYUDANTE DE OBRA	FAC-S-2020-184339-CL	16/12/2020

Los cuáles serán entregados de manera física en las oficinas del CT Jhon Henao.

Sin otro particular.

Atentamente,

CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
C.C. No. 79.508.558 de Bogotá D.C
Anexos: 160 hojas.

La seguridad es de todos | Mindefensa

COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2021-004054-CE
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2021-004054-CE del 17 de febrero de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DIFRA

Señor
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
Representante legal
Monteria Córdoba

Contraseña:dLrJIVcAOg

Asunto: Solicitud asistencia a reunión.

Referencias:

1.Contrato 147-00-A-COFAC-DIFRA-2020, Interventoría para la construcción del edificio del espacio en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez – Cali - Valle del Cauca.

Me permito informar al señor Carlos Arturo Vergara Negrete Representante Legal de la interventoría, que se requiere de su presencia el día sábado 20 de febrero de 2021 en el lugar de ejecución del proyecto (EMAVI), para una reunión de carácter gerencial con presencia del Señor Mayor General Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor FAC y el señor Mayor General Comandante Apoyo a la Fuerza, respecto a la oportuna ejecución del contrato de la referencia.

Lo anterior, en cumplimiento de lo ordenado por el señor Mayor General Comandante Apoyo a la Fuerza.

Amablemente,



Teniente Coronel WILLIAM ALEXANDER BELLO GOMEZ
Director Infraestructura

Anexo: N/A
Copia: TC POVEDA / OFAES; Copia: CT CARO / ESINS; Copia: MY GARZON / SUTEP

Elaboró CT. TOVAR / SUCEC Revisó: MY. LOPEZ / SUCEC Aprobó

CARLOS VERGARA NEGRETE Ingeniería & Arquitectura	**CONTROL ESTADO DEL TIEMPO**	CARLOS VERGARA NEGRETE Ingeniería & Arquitectura

CONTRATO ELECTRONICO INTERVENTORIA No.	147-00-A-COFAC-DIFRA-2020
OBJETO:	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA CONTABLE Y JURIDICA DE LA OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO EL ESPACIO EN LA ESCUELA MILITAR DE AVIACIÓN MARCO FIDEL SUAREZ – CALI. – VALLE DEL CAUCA.
CONTRATISTA INTERVENTORIA:	CARLOS VERGARA NEGRETE
CONTRATISTA OBRA CIVIL:	CONSORCIO OBRA ESPACIAL CALI
SUPERVISOR	FAC

PERÍODO DE CONTROL	**DESDE:**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**HASTA:**	**DIA**	**MES**	**AÑO**
		1	FEBERO	2021		28	FEBRERO	2021


MESES	**ENERO**																									
DIAS	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**
MAÑANA	DS	DS	DS	DS	LLM	DS	DFD	DS	LLM	DS	DS	DN	DS	DFD	LLM	DS	DS	DS	DN	DS	DFD	DS	DN	DS	DS	DS	DN	DFD
TARDE	DS	DS	DS	DS	LLM	DS	DFD	DS	DN	LLM	DS	DN	DS	DFD	DN	DS	DS	DS	DN	DS	DFD	DN	DS	DS	DS	DN	DN	DFD

CONVENCIÓN

DESCRIPCIÓN	**ABREVIADO**	**COLORES**
DÍA SOLEADO	DS	
DÍA NUBLADO	DN	
LLUVIAS FUERTES	LLF	
LLUVIAS MODERADAS	LLM	
DÍAS FESTIVOS Y DOMINICALES	DFD	

TOTALES

DESCRIPCIÓN	**N° DÍAS**	**PORCENTAJE**
DÍA SOLEADO	16	57,14%
DÍA NUBLADO	5,5	19,64%
LLUVIAS FUERTES	0	0,00%
LLUVIAS MODERADAS	2,5	8,93%
DÍAS FESTIVOS Y DOMINICALES	4	14,29%
TOTALES	**28**	**100,00%**

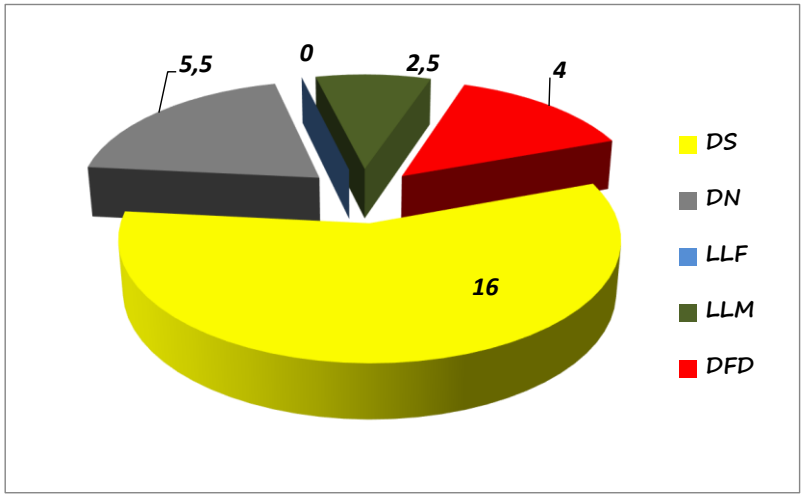

OBSERVACIONES:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

NOMBRE: ARQ. ALEXANDER PALACIO

FIRMA

E – mail: contratosevn@gmail.com
Dirección: Carrera 9 No. 62B-06, Montería – Córdoba
Telefax: (4) 7861269, Celular: 310 654 1925

Silvio A Soto Lagares
Arquitecto
M.P-A23802008-7385032
Residente de obra

Fecha: 31 de enero de 2021: Domingo
Dia No laboral.

Silvio A Soto Lagares
Arquitecto
M.P-A23802008-7385032
Residente de obra

Fecha: 01 de febrero de 2021 - Lunes
Personal: 1 Residente de Obra, 1 Residente SST, 1 Auxiliar Administrativo, 1 Almacenista, 1 Maestro General, 2 Oficiales 8 Ayudantes, 1 Conductor de vehiculo, 1 Conductor de mini-cargador. 1 Residente de Interventoría, 1 Auxiliar Ingeniera de Interventoría y 1 Residente SST de Interventoría.
Actividades realizadas: Amarre y figurado de acero, excavación de man hall, Formaleta de pedestales Eje 2 0, Eje B 2 y Eje A1.
Horario: 07:00 a.m a 17:00 hrs.
Clima: Soleado-mañana Tarde: Soleado.

SST - Se le requiere al contratista mejorar la señalización de las excavaciones de las cámaras de inspección.
Se ha requerido que se haga reposición a los trabajadores (operativos) los guantes industriales en las diferentes actividades.

Residente HSE Interventor.

El contratista OBRAS ESPACIAL cali acata y mejora la señalización de dos excavaciones de pozos de inspección.

Silvio A Soto Lagares
Arquitecto
M.P A23802008-7385032
Residente de obra

Escaneado con CamScanner

Fecha: 02 de febrero de 2021 - Martes

Personal: 1 Director de Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente SST de obra, 1 Auxiliar Administrativa, 1 Almacenista, 1 Maestro General, 2 Oficiales, 9 Ayudantes, 1 Conductor de vehículo, 1 Conductor de mini cargador. 1 Residente de Interventoría, 1 Auxiliar Ingeniera de Interventoría y 1 Residente HSE de Interventoría.

Actividades Realizadas: Se inicia excavación para tanque de almacenamiento, Se inica excavación para tubería de 4" hidraulica. Se continua con armado de acero (Bloque B). Se instala Formaleta en el pozo Inspección proyectado # 1.

Clima: mañana: Soleado Tarde: Soleado

LA INTERVENTORIA SOLICITA AL CONTRATISTA GARANTIZAR LOS MATERIALES CONSTRUCTIVOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE Y DE RCI. TENER EN OBRA TODO EL ACERO DE REFUERZO Y PROGRAMADO CONCRETO PARA EL MARTES.

Interventoría

Silvio A. Soto Lagares
Arquitecto
M.P. A23802008 7385032
Residente de OBRA.

Fecha: 03 de febrero de 2021 - Miercoles

Personal: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 residente de SST, 1 topógrafo de obra, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro general, 2 oficiales, 9 ayudantes, 1 conductor de mini-cargador, 1 conductor de retroexcavadora, 1 residente de interventoria, 1 auxiliar Ingeniera de interventoría, 1 residente HSE de interventoria.

Horario: 7:00 Am - 17:00 hrs

Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado

Actividades realizadas: Fundida de pedestales columna A_2, A_3, B_2, D_2 - Se inica excavación para tubería novafort de 18" sobre el eje A. Se extiende arena y se instala tubería Nova-Fort de 18", se

Escaneado con CamScanner

Continua armado de acero para Bloque A.

Silvio A. Soto Lagares
Arquitecto
M.P A23802008-7385032

Fecha: 04 de Febrero de 2021 - Jueves
Personal: 1 residente de obra, 1 residente de SST, 1 Topógrafo de obra, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro general, 2 oficiales, 9 ayudantes, 1 conductor de minicargador, 1 conductor de retroexcavadora, 1 residente de interventoría, 1 residente HSE de interventoría.
Horario: 7:00 AM - 17 hrs
Clima: Mañana: soleado Tarde: Soleado

En el día de ayer, 03 de febrero/2021. Se recibe la visita del personal de la EMAVI, con el fin de hacer una revisión a la Obra, avance vs programado. Generaron directrices y recordación al seguimiento y control de Bioseguridad.

Residente SST Interventor

En el día de hoy, 04 de Febrero/2021. Se recibe visita de parte de Sanidad de la EMAVI, revisando todo el seguimiento al Protocolo de Bioseguridad qué se está implementado en la Obra. De momento, no se reciben observaciones ni recomendaciones.

Residente SST Interventor.

Actividades realizadas: Excavación pozo inspección #2, Continuación excavación de tanque de almacenamiento, Continuan con excavación para tubería de 18" novafort. Se verifica niveles para capa de drenaje, se realiza aplicación de la misma, Se instala tubería 18" novafort, Instalación tubería de presión 4".

Escaneado con CamScanner

Fecha: 05 de febrero de 2021 - Viernes
Personal: 1 residente de obra, 1 residente SST, 1 Topógrafo de obra, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro general, 2 oficiales, 9 ayudantes, 1 Conductor de minicargador, 1 Conductor de retroexcavadora, 1 residente de interventoria, 1 auxiliar Ingeniera de interventoria, 1 residente HSE de interventoria.
Horario: 7:00 Am a 17:00 hrs
Clima: Mañana: lluvia moderada de 7:00am a 9:00am el resto de la mañana soleado, Tarde: Soleada hasta las 16:15pm, lluvia madera de 16:15 a 17:00 hrs
Actividades realizadas: Instalación de tubería de presión de 1" y relleno para la excavación de la tubería de 1", Continuación de Instalación de tubería 18" aguas combinadas, Verificación de niveles para Instalación de dicha tubería, Armado de acero para Bloque A, Terminación de excavación para tanque de almacenamiento, Periferia tanque de almacenamiento, Retiro de material Sobrante Proveniente de la excavación, Suministro de material (sub-base granular, arena, y material petreo).

Silvio A. Soto Lagares
Arquitecto
M.P A23802008-7385032
Res. [illegible] OBRA

Fecha: 06 de febrero de 2021 - Sabado
Personal: 1 residente de obra, 1 residente de SST, 1 Topógrafo de obra, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro general, 2 oficiales, 9 Ayudantes, 1 conductor de minicargador, 1 conductor de retroexcavadora, 1 residente de interventoria, 1 auxiliar Ingeniera de interventoria, 1 residente HSE de interventoria.
Horario: 7:00am
Clima: mañana: soleado Tarde: soleada
Actividades realizadas: Fundición muro de poto de

Escaneado con CamScanner

Inspección, Continuación Instalación tubería 18" aguas combinadas, Verificación de niveles por parte del topógrafo para instalación de dicha tubería, Compactación de subrasante del terreno donde se construirá el tanque agua contra incendio, Cuarto de equipo, Tanque agua), Compactación de subrasante del terreno donde se Construirá el Bloque A, Se inicia relleno Compactado Bloque A

Silvio A. Soto Lagares
Arquitecto
M.P A23802008-7385032
Res de Obra

Fecha: 07 de Febrero de 2021 - Domingo
Personal: 1 residente de obra, 1 maestro general, 1 Topógrafo de obra, 1 almacenista, 10 ayudantes, 1 Conductor de minicargador, 1 residente de interventoria.
Horario: 7:00Am - 13:00hrs
Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Actividades realizadas: Continuación de instalación de tubería 18" aguas combinadas, Verificación de niveles por parte del topógrafo para instalación de dicha tubería, Desencofrado del pozo de inspección, Continuación relleno Compactado Bloque A, Instalación de geotextil Bloque A.

Silvio A. Soto Lagares
Arquitecto
M.P 423802008-7385032
Res Obra

Fecha: 08 de Febrero de 2021 - Lunes
Personal: 1 residente de obra, 1 residente de SST, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro general, 2 oficiales, 9 Ayudantes, 1 Conductor de minicargador, 1 residente de interventoría, 1 auxiliar Ingeniera de interventoría, 1 residente SST de interventoría.
Horario: 7:00am - 17:00 hrs.

Escaneado con CamScanner

Clima: Mañana: Mañana soleado, Tarde Nublada.

Se le solicita al contratista, mejorar el aseo en la parte externa de la obra (específicamente) zona del concreto estampado - previo ingreso a la obra).

Entregar copia de los certificados de Alturas (personal que hacen actividades (+) a 1.5 m). Vigente.

Realizar reposición del jabón del lavamanos del campamento.

Actividades realizadas: Se extiende arena para tubería de 18" aguas combinadas, se funde foso de Inspección # 2 y se toma prueba de ensayo de dicho concreto, Se continua con recebo Compactado (Bloque A), Se retira de la obra el material sobrante proviniente de la excavación.

Silvio A Soto Lagares
Arquitecto
M.P A23802008-7385032
Ra. obra

Fecha: 09 de Febrero de 2021 - Martes
Personal: 1 residente de obra, 1 residente de SST, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro general, 2 oficiales, 9 ayudantes, 1 conductor de minicargador, 1 conductor de vehículo, 1 residente de interventoría, 1 auxiliar Ingeniera de interventoría, 1 residente HSE de interventoría.
Horario: 7:00am - 17:00 hrs
Clima: Mañana: lluvia Moderada Tarde: Nublado.
Actividades realizadas: Continuan con resebo Compactado (Bloque A), Se continua extendiendo arena para tubería de 18" aguas combinadas, Se retira de la obra el material sobrante proviniente de la excavación.

Escaneado con CamScanner

* La interventoría solicita al constructor la entrega de la ficha requerimiento para adición presupuestal para las actividades faltantes en el proyecto. Es de recordar, que dicha solicitud fue requerida al contratista el día 21 de enero de 2021.

* A la fecha, nos encontramos a la espera de la realización de ensayo de densidad al material de relleno compactado en el bloque A.


Fecha: 10 de febrero de 2021 - Miercoles
Personal: 1 residente de obra, 1 residente SST, 1 auxiliar administrativo, 1 Almacenista, 1 maestro general, 2 oficiales, 15 ayudantes, 1 conductor de minicargador, 1 conductor de vehiculo, 1 residente de interventoria, 1 auxiliar Ingeniera de interventoria, 1 residente HSE de interventoria
Horario: 7:00AM - 17:00 hrs
Clima: Mañana: Soleada. Tarde: Lluvia moderada de 13:42 a 14:01 el resto de la tarde fue nublado
Nota del Contratista obras Espacial. cali:
- Se suministra tubos para el lavado de manos.
- Se socializa certificado de trabajo en alturas del personal que esta realizando estas actividades

Silvio A. Soto Lagares
Arquitecto
M.P A23802008-7385032
Res. OBRA


Actividades realizadas: Se inica Figurado de acero para viga de amarre (Bloque A), Compactación de subrasante del terreno (Bloque B), Inicio de recebo compactado (Bloque B), antes del recebo compactado se realiza instalación de geotextil en Bloque B, Inicio de relleno

Escaneado con CamScanner

Para tubería de 18" aguas combinadas.



Fecha: 11 de Febrero de 2021 – Jueves
Personal: 1 residente de obra, 1 residente de SST, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro general, 1 oficial, 15 ayudantes, 1 conductor de minicargador, 1 conductor de vehículo, 1 residente de interventoría, 1 auxiliar Ingeniera de interventoría, 1 residente HSE de interventoría
Horario: 7:00am – 17:00 hrs
Clima: Mañana: Soleada Tarde: Soleado
Actividades realizadas: Continuación de recebo Compactado Bloque B, Armado de formaleta Para viga de cimentación, Continua configurado de acero viga y columna Bloque A, Continua relleno de tubería 18" agua combinadas.



Fecha: 12 de Febrero de 2021 – Viernes
Personal: 1 residente de obra, 1 residente de SST, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro general, 1 oficial, 17 ayudantes, 1 conductor de minicargador, 1 Conductor Vehículo, 1 ~~Ingeniera~~ residente de interventoría, 1 auxiliar Ingeniera de interventoría, 1 residente HSE de interventoría
Horario: 7:00 Am – 17:00 hrs.
Clima: Mañana: nublada Tarde: Parcialmente nublado
Actividades realizadas: Se continúa configurado de acero para columna del bloque A. Continúan con armado de formaleta metálica en viga de cimentación bloque A, se punde viga de cimentación para el bloque A.

Escaneado con CamScanner

En la noche del día de ayer 11 de Febrero de 2021. Se presentaron lluvias prolongadas en la zona del proyecto. Lo cual impidió el inicio de las actividades del día de hoy como por ejemplo: La continuación del recebo compactado del bloque B; también se suspendió la actividad del recebo de la tubería de 18" aguas combinadas.

Fecha: 13 de febrero de 2021 - Sábado.
Personal: 1 Residente de Obra, 1 Residente SSI, 1 Auxiliar Administrativo, 1 Almacenista, 1 Maestro General, 2 Oficiales, 13 Ayudantes, 1 Conductor de minicargador, 1 Conductor de vehículo. 1 Residente de Interventoría, 1 Auxiliar Ingeniera de Interventoría y 1 Residente SSI de Interventoría.
Horario: 07:00 a.m hasta las 13:00 hrs.
Clima: Mañana Soleada. Tarde: soleada
Actividades realizados: Se ejecutan vaciados de pedestales del Bloque B. El Contratista realiza jornada de aseo general de la Obra.
SST:
+Se le solicita al contratista: Disponer de una escalera certificada. Acorde para el ascenso y el descenso de los trabajadores en el área del tanque.

+Se le solicita nuevamente; las bolsas acordes en el punto ecológico para su separación y disposición por colores.

+Se recibe visita del personal de la EHAVI, Supervisor del Centinela. Quién toma registro fotográfico del personal que está laborando con color verde (camiseta) en la obra. Se le recuerda al Contratista tener mayor compromiso con el personal operativo. Ya que en repetidas ocasiones se le ha reiterado... "Todo el personal debe portar la camiseta de color gris en el

Escaneado con CamScanner

desarrollo de las actividades" para el proyecto Edificio Espacial Cali.

- Continúa el punto perdiente. Ubicación del plano de evacuación en el campamento de obra; para el conocimiento de todos.

Residente SST Interventor.

Fecha: 14 de febrero de 2021 - Domingo
Día NO Laboral.

Fecha: 15 de febrero de 2021 - Lunes
Personal: 1 Residente de Obra, 1 Residente SST de Obra, 1 Auxiliar Administrativo, 1 Almacenista, 1 Maestro General 2 Oficiales, 15 Ayudantes, 1 Conductor de minicargador, 1 Conductor de vehículo. 1 Residente de Interventoría, 1 Residente SST de Interventoría, 1 Auxiliar Ingeniera de Interventoría.
Horario: 07:00 a.m hasta las 17:00 hrs.
Clima: Mañana - Lluvia prolongada Tarde: Nublada.
En la noche del día de ayer 14 de febrero de 2021, se presentaron lluvias fuertes y prolongadas en la zona del proyecto, lo cual impidió el inicio normal de las actividades del día de hoy como por ejemplo: El relleno del bloque A. y el armado pigurado en el Bloque B.

SST:
- Se solicita que se haga el debido control al uso de los guantes (en actividades del vaciado de concreto), personal operativo.

- Nuevamente se solicita, que el personal operativo labore

Escaneado con CamScanner

Se hace acompañamiento al ingreso por la otra área (ruta plan B) para llegar al punto de la obra. Ingresan: Vehículo con placa WZH525 con el acero. y Vehículo con placa BDI 318 con los equipos y maquinaria.

- Se realiza acompañamiento al orden, limpieza y aseo en la parte externa (concreto estampado y vía en asfalto) por donde transitó los vehículos anteriormente relacionados, ya que a pesar que el personal operativo y el compromiso del Consorcio, realizó manualmente retiro del barro adherido a las llantas, quedó una pequeña parte en la vía de la ruta B. Quedando bien, generando un impacto positivo, al proyecto.

- Se realiza la trazabilidad de la entrega de los EPP al personal operativo.

Fecha: 17 de Febrero de 2021 - Miercoles
Personal: 1 residente de obra, 1 residente de SST, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 2 oficiales, 14 Ayudantes, 1 Conductor de minicargador, 1 Conductor de vehículo, 1 residente de interventoría, 1 auxiliar Ingeniera de Interventoría, 1 residente HSE de interventoria
Horario: 7:00 a
Clima: Mañana: Soleada tarde: Soleado
Actividades realizadas: Se continuan con excavación manual Tanque de agua incendio, Cuarto de equipo, Tanque agua, Se dese realiza desencofrado de la viga de amarre fundida en el dia de ayer Bloque A, Se inicia Armado de acero para el tanque de almacenamiento, y se realiza Conexión de la tuberia para las redes de 18" aguas combinadas.

Escaneado con CamScanner

JUE Fecha: Jueves - 18 de Febrero de 2021
Personal: 1 residente de obra, 1 residente de SST, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 2 oficiales, 13 ayudantes, 1 conductor de minicargador, 1 Conductor de vehículo, 1 residente de interventoría, 1 auxiliar Ingeniera de interventoría, 1 residente HSE de interventoría.
Horario: ~~Mañana~~ 7:00 Am a 17:00 hrs
Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado.
Actividades realizadas: Se termina excavación manual en el tanque de almacenamiento, Se realiza Perfilado del tanque de almacenamiento, Se continua Con relleno Compactado para la tubería de 18" aguas combinadas, Excavación para retiro de tubería en cemento de 8" de aguas combinadas las cuales intersectaba las zapatas A2 y A3 del Bloque a construir, Instalación de geotextil (tanque de agua contra incendio, Cuarto de equipo y tanque de agua)

SST:
- Se recibe la planilla de SS paga del personal: Aux. administrativo y del Almacenista del Consorcio.


- Se realiza jornada de aseo y limpieza a la obra.

INTERV.

Fecha: 19 de febrero de 2021 - Viernes
Personal: 1 directora de obra, 1 residente de obras, 1 residente de SST de obra, 1 Topógrafo de obra, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 14 Ayudantes, 1 conductor de minicargador, 1 conductor de vehículo, 1 representante legal de interventoría, 1 ~~au~~ residente de interventoria, 1 auxiliar Ingeniera de interventoria, 1 residente HSE de interventoria.

Escaneado con CamScanner

1 coordinadora del SIG de interventoria, 1 auditor interno de Icontec.
Horario: 7:00am - 13:00 hrs
Clima: M[illegible] Parcialmente Nublado Tarde Parcialmente [illegible]

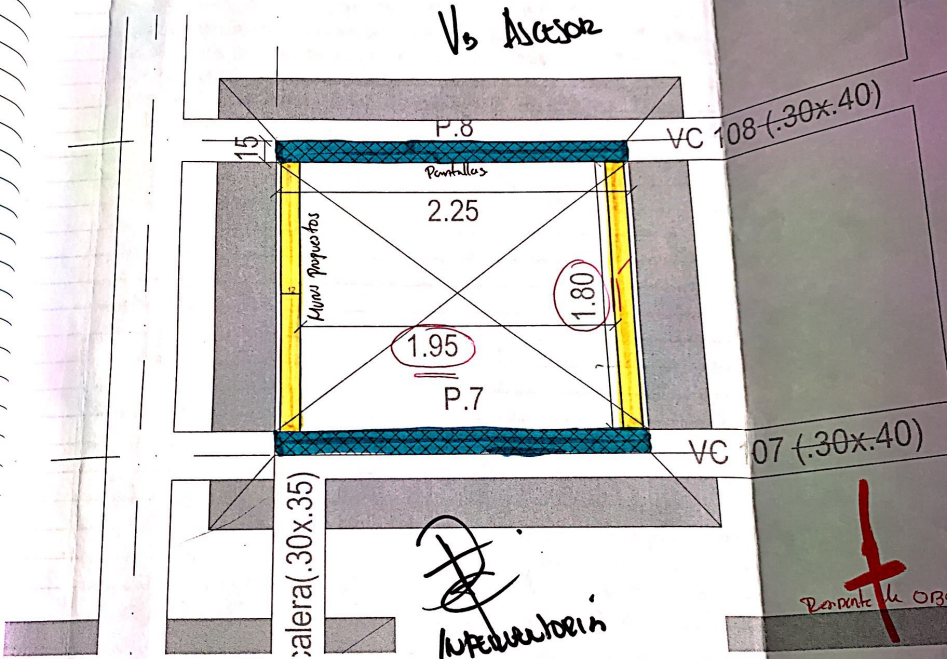

Actividades realizadas: Excavación para zapatas A_2 A_3 (Bloque A), Retiro de tubería de 18" aguas combinadas la cual intersectaba las zapatas A_2 y A_3 del Bloque A, Inicio de recebo Compactado (tanque de agua incendio, cuarto de equipo y tanque de agua), Armado de

Escaneado con CamScanner

de acero para tanque de almacenamiento y Columna y pantalla (Bloque A), Recebo Compactado para tubería de 18" agua combinada, Fundida de solado de limpieza Zapata A_2 A_3 (Bloque A) Suministro de varilla de 3/4

✓ NUEVAMENTE SE LE RECUERDA AL CONTRATISTA GARANTIZAR LOS MATERIALES, EQUIPOS, COMBUSTIBLE, Y DEMÁS ACCESORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRESENTE PERIODO.

- SST:

En el día de hoy se recibe auditoría Interna de la firma ICONTEC para la empresa de Carlos Vergara Negrete. Se solicita lo siguiente: Al Contratista,

1. Capacitar al personal en la separación de los residuos generados y acopiados en el punto ecológico.

2. Reponer la señalización de evacuación (en general de toda la Obra) por una más durable - Plástica o en p.v.c. Ubicar en cada área del campamento y containers, el plano de evacuación.

3. Se solicita al Contratista, certificar a las Brigadas de emergencias.

4. Preparar un simulacro ambiental y de evacuación y/o rescate en alturas. Para ser realizado en el mes de marzo de 2021.

5. Se le solicita al Consorcio. Adecuar una zona de aislamiento: Implementación en los protocolos de Bioseguridad. Espacio donde se mediará un caso

Escaneado con CamScanner

"posible-sospechoso por Covid-19". Este espacio debe contener lo siguiente:

- Guantes estériles ó quirúrgicos.
- Una mesa - una silla - que esté bajo techo.
- Tapabocas
- Alcohol
- Gel antibacterial
- Bolsa roja

- Se le solicita al Contratista, tener un kit antiderrames. Por posibles derrames de las existentencias mínimas en la obra de: Gasolina y ACPM.

Residente HSE Interventor.

El contratista deja constancia que se está realizando capacitación en manejo residuos le cual se deja constancia en las respectivas actas

Fecha: 20 de febrero de 2021 - Sábado
Personal: 1 Representante Legal de Obra, 1 Directora de Obra, 1 Residente de Obra, 1 Residente SST de Obra, 1 Topógrafo de Obra, 1 Auxiliar Administrativo, 1 Almacenista, 1 Maestro de Obra, 2 Oficiales, 12 Ayudantes, 1 Conductor de minicargador. 1 Representante Legal de Interventoría, 1 Residente HSE de Interventoría y 1 Residente de Interventoría.
Horario: 07:00 a.m. a 13:00 hrs.
Clima: Mañana - Soleada. Tarde: Soleada.
Actividades realizadas: El Topógrafo de la obra, realiza la verificación de los ejes del bloque A. Se recibe material para la obra (acero y cemento). Se realiza fundida en concreto con PSI de 4500 para las columnas de los ejes B3 y B4 y de la pantalla C4.

- Se recibe visita de los Altos mandos de la FAC.
- Se realiza el comité de seguimiento a la Obra, con la asistencia del T. Tovar Supervisor de la FAC y los

Escaneado con CamScanner

Representantes Legales tanto de la Interventoría como del Consorcio.

Domingo: 21 de Febrero/2021 - NO Laboral.
Fecha: 22 de Febrero/2021 - Lunes
Personal: 1 Directora de obra, 1 Residente SST de obra; 1 Auxiliar administrativo, 1 Almacenista, 1 Maestro de Obra, 2 Oficiales, 14 Ayudantes, 1 conductor de minicargador. 1 Residente de Interventoría, 1 Residente SST de Interventoría, 1 Aux Ing. de Interventoría.
Horario: 07:00 a.m a 17:00 hrs.
Clima: Mañana - Soleada Tarde: Nublada
Actividades realizadas: Desencofrado de las formaletas de las columnas y de la pantallas fundidas. Relleno de material seleccionado en Zapatas Bloque B. Instalación de acero de refuerzo para columnas C_1, D_1 y B_1.

* La Interventoría manifiesta su inconformidad en el acabado de las columnas vaciadas B_3, D_3, C_3. Teniendo en cuenta que presentaron hormigueos en la parte inferior de cada una. Se solicitó al Constructor tomar las acciones pertinentes para mejorar éste acabado, Respecto al tema contratista manifiesta que se retiran dichas formaletas y son cambiadas por unas mejor estado

SST:
- Se solicita hacer una investigación del incidente presentado el día viernes 19 de febrero de 2021. En el área del solado de la zapata A3 con el operativo Ayudante Yeison Steven Ordoñez. Quién en presencia de la Aux. Ing. de Interventoría se resbaló en ésta área.

- Siendo las 03:20 p.m. Se detienen actividades, por lluvia prolongada.

Escaneado con CamScanner

- Se reinician actividades, siendo las 4:15 p.m.
- Se continúan las actividades del armado y figurado de acero.

- El Residente SST de obra, realiza reposición de EPP (guantes de carnaza). al personal operativo.
Técnico constructivo.
- Se continúa con recebo compactado para tubería de 18" aguas combinadas. (Recebo compactado proveniente de la excavación).
- Se continúa recebo compactado (Tanque de agua incendio, cuarto de equipo y tanque de agua).

Fecha: 23 de Febrero del 2021 – MARTES
Personal: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 residente de SST de obra, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 12 ayudantes, 1 conductor de minicargador, 1 residente de interventoría, 1 auxiliar Ingeniera de interventoría, 1 residente HSE de Interventoría.
Horario: 7:00 a.m – 17:00 hrs
Clima: Mañana: Nublado Tarde: Soleada
Actividades Realizadas: Desencofrado de la columna B3, C3 y Pantalla 4, Se termina recebo compactado (Tanque de almacenamiento), Se termina recebo compactado proveniente de la excavación para tubería de 18" aguas combinadas, Se realiza localización y replanteo para tubería de PVC de 2" y así mismo se inicia excavación de dicha tubería, Se realiza encofrado para pantalla y columna Bloque A, Se continua figurado de acero para tanque de almacenamiento, y Se ~~Armado~~ realiza armado de acero para columna y pantalla Bloque A.

Escaneado con CamScanner

Fecha: 25 de Febrero de 2021 - Jueves
Personal: 1 directora de obra, 1 residente de obra, 1 residente de SST de obra, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 12 Ayudantes, 1 conductor de minicargador, 1 residente de interventoría, 1 residente HSE de interventoría, 1 auxiliar Ingeniera de interventoría.
Horario: 7:00 am a 17.00 hrs
Clima: Mañana: Soleado Tarde: Soleado
Actividades realizadas: Se continua con excavación para tubería de 2", Continuan con figurado de acero de pantalla y columnas (Sensor) (Bloque A), realizan excavación para Bomba y continuan figurando acero para tanque de almacenamiento, Se inica excavación para tubería de 8".

Residente de Obra

Fecha: 26 de Febrero de 2021 - Viernes.
Personal: 1 directora de obra, 1 residente de obra, 1 residente de SST de obra, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 11 Ayudantes, 1 conductor de minicargador, 1 residente de interventoría, 1 residente HSE de interventoría, 1 auxiliar Ingeniera de interventoría.
Horario: 7:00 am a 17:00 hrs
Clima: Mañana. Soleado Tarde: parcialmente nublado.

SST:
- Se reporta el primer Accidente Laboral - AL, de un ayudante en el área del tanque de incendio. Se golpéa el dedo pulgar de la mano derecha. Se remitió por medio de la ARL SURA, quién fue atendido normalmente. Se le requiere al Contratista, evidenciar el FURAT y la respectiva

Escaneado con CamScanner

investigación del AL en los tiempos establecidos. (15 días).

- El Contratista acata la recomendación de limpieza inmediata en el costado sur de la obra. Por derrame mínimo de concreto en el concreto estampado de la EHAUI.

- Se le requiere al contratista, mejorar la organización en los vaciados de concreto. Ya que se evidencia Falta de guantes latex negro industrial, aptos para el manejo del concreto.

- Se le solicita al contratista organizar las varillas que se encuentran en la obra en un burro, puesto que se encuentra en el suelo. Dicha solicitud se le ha realizado al contratista en varias ocasiones verbalmente y a la fecha no han realizado la subsanación.

Actividades realizadas: Se realiza revisión de niveles de formaleta en columna y pantalla Bloque A ~~Fecha: Actividades~~ por parte de la interventoría, Se continua con excavación para tubería de 8", Se realiza fundida de columna C_1, B_1 y D_2 y pantalla D_1, A_1, B_2 y C_2, ~~fundida~~ de zapata A_2 A_3 en el Bloque A.

Residente obra.

Fecha: 27 de febrero de 2021 - Sabado
Personal: 1 residente de obra, 1 residente de SST de obra, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 11 ayudantes, 1 Conductor de minicargador, 1 residente de interventoria, 1 residente HSE de interventoria, 1 auxiliar Ingeniera de interventoría.

Escaneado con CamScanner

Horario: 7:00Am a 13 hrs
Clima: Mañana: Nublado Tarde: Nublado
Actividades realizadas: Se continua Con figurado de acero en el tanque de almacenamiento, se continua Con excavación para tubería de 8", se desencofra columnas y pantallas en el Bloque A.

Residente de obra.

Fecha: 28 de Febrero de 2021 - Domingo
Dia no laboral.

Fecha: 01 de Marzo de 2021 - Lunes
Personal: 1 residente de obra, 1 residente SST de obra, 1 auxiliar administrativo, 1 almacenista, 1 maestro de obra, 2 oficiales, 14 Ayudantes, 1 conductor de minicargador, 1 residente de interventoria, 1 residente HSE de interventoria, 1 auxiliar Ingeniera de interventoria.
Clima: Mañana: Lluvia moderada Tarde: Lluvia moderada
Horario: 7:00 Am a 17:00 hrs.
Actividades realizadas: En el dia de hoy tuvimos lluvias moderadas durante el transcurso del dia las cuales no afectaron las actividades programada en el dia. Se realizan actividades, Continuación figurado de acero en el tanque de almacenamiento para muro y parrilla, Inician armado de Formaleta para muro del ascensor, Fundida de pedestal A_2 y A_3 (Bloque A). y termina desencofrado de columnas y pantallas (Bloque A).

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 4547915
DESDE FEBRERO 2021 HASTA FEBRERO 2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79508558
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7846589
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	4547915
APELLLIDOS:	ESCOBAR GRAJALES	NOMBRES:	JHOVANNY ANDRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALI	DEPARTAMENTO:	VALLE
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7779455490	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2021	FECHA DE PAGO:	11/02/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.250.000																	230201-PROTECCION	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF56-COMFENALCO VALLE	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 387.000

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 78076762
DESDE ENERO 2021 HASTA MARZO 2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79508558		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA		
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7846589		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78076762		
APELLLIDOS:	FIGUEROA VEGA	NOMBRES:	CARLOS ALFONSO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA		
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

PLANILLA No:	7779449822	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2021	FECHA DE PAGO:	11/02/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
$ 908.526																	231001-COLFONDOS	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.526	79508558	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF16-COMFACOR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 281.500

PLANILLA No:	7776088438	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	diciembre - 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	enero - 2021	FECHA DE PAGO:	07/01/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
$ 877.803																	231001-COLFONDOS	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-11 - ARL SURA	30	$ 877.803	79508558	$ 61.100	30	$ 877.803	CCF16-COMFACOR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 272.000

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 11036554
DESDE FEBRERO 2021 HASTA FEBRERO 2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79508558
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7846589
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	11036554
APELLLIDOS:	PALACIO RODRIGUEZ	NOMBRES:	ALEXANDER AUGUSTO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7779455490	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2021	FECHA DE PAGO:	11/02/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES									
																	PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
$ 1.500.000																		230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	79508558	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF21-CAFAM	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 464.400

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1063174281
DESDE FEBRERO 2021 HASTA FEBRERO 2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79508558
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7846589
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1063174281
APELLLIDOS:	RAMOS ARTEAGA	NOMBRES:	CARMEN MARCELA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7779455490	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2021	FECHA DE PAGO:	11/02/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP				CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 1.250.000																		230201-PROTECCION	30	$ 1.250.000	$ 200.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 200.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.250.000	$ 50.000	$ 0	$ 50.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.250.000	79508558	$ 87.000	30	$ 1.250.000	CCF16-COMFACOR	$ 50.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 387.000

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 15030184
DESDE FEBRERO 2021 HASTA FEBRERO 2021

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79508558		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARTURO		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA		
DIRECCIÓN:	KR 52 A NO 14 17 BR MONTE VERDE	TELÉFONO:	7846589		
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de edificios no residenciales.		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	15030184		
APELLLIDOS:	RADA SEGURA	NOMBRES:	FABIAN MIGUEL		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

PLANILLA No:	7779455490	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2021	FECHA DE PAGO:	11/02/2021	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	ÚNICO

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES								
																	PENSIÓN									SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 1.500.000																		230201-PROTECCION	30	$ 1.500.000	$ 240.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.500.000	79508558	$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF21-CAFAM	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 464.400

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____
