PAVIMENTOS ABURRÁ
Calle 43 BB # 120 B - 151
Agregados San Javier
Cel. 301 332 8781
PBX. 604 501 1820
Medellín - Colombia

Medellín, 13 de octubre 2026

EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL-EAEP

NIT 901.537.748-4

DEBE A

PAVIMENTOS ABURRA S.A.S
NIT 901.363.993-4

POR CONCEPTO DE:	ANTICIPO RELACIONADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CD-047-2026 QUE TIENE POR OBJETO: ***PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL SECTOR DOS, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA*.**
LA SUMA DE:	SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($786.807.962)

Claudia Osorio G

CLAUDIA LUCIA OSORIO GOMEZ
C.C 47.737.572
Representante legal
PAVIMENTOS ABURRA S.A.S

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

A QUIEN INTERESE


Por medio de la presente hacemos constar que la empresa **PAVIMENTOS ABURRA SAS** con Nit 901363993-4 posee en el Banco Davivienda, Oficina Exito Colombia

CUENTA DE AHORROS

Número	**108900918823**
Denominación de cuenta	**CONTRATO 47**
Fecha de apertura	**28/09/2026**
Estado	**Vigente**

Esta solicitud se expide a solicitud del interesado a los 30 días del mes de Septiembre de 2026

Cordialmente,



DANIEL TABARES
Director Comercial oficina Exito Colombia

Calle 43 BB # 120 B - 151
Agregados San Javier
Cel. 301 332 8781
PBX. 604 501 1820
Medellín - Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES

PARAFISCALES - ***Artículo 50 de la Ley 789 de 2002***

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito revisor fiscal de la sociedad **PAVIMENTOS ABURRA S.A.S** identificada con NIT No. 901.363.993-4, Certifica: que la mencionada sociedad ha efectuado el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, incluyendo los pagos relativos al FIC. Correspondientes a la nómina de los últimos seis (6) meses en los cuales se ha causado la obligación de efectuar dichos pagos.

Dado en Medellín., el trece (13) del mes de octubre de dos mil veintiséis (2026).

Cordialmente,



_____

SANDRA BIBIANA BETANCUR RODRIGUEZ
TP 119038-T
C.C 43.626.813
REVISOR FISCAL
PAVIMENTOS ABURRA S.A.S

Calle 43 BB # 120 B - 151
Agregados San Javier
Cel. 301 332 8781
PBX. 604 501 1820
Medellín - Colombia

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO N. °: **CD-047-2026**

OBJETO DEL CONTRATO:

PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS EN EL SECTOR DOS, PRIMERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 MESES

VALOR DEL CONTRATO:

DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/L ($2.960.894.832,00) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES.

VALOR DEL ANTICIPO: El valor de SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SIETE MIL NOVESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($786.807.962).

CONTRATISTA: PAVIMENTOS ABURRA S.A.S

NIT: 901.363.993-4

En la siguiente tabla se listan los ítems en los cuales se programa invertir el anticipo:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE %
1	Pago de salarios y jornales	$31.472.318,48	4%
2	Compra de materiales y accesorios	$755.335.643,52	96%
TOTAL			**100%**


Para constancia de lo anterior, se firma el presente plan de inversión del anticipo, a los trece (13) días del mes de octubre de 2026.

Claudia Osorio G

CLAUDIA LUCIA OSORIO GOMEZ
C.C 43.737.572
REPRESENTANTE LEGAL
PAVIMENTOS ABURRA S.A.S

PAVIMENTOS ABURRÁ
Calle 43 BB # 120 B - 151
Agregados San Javier
Cel. 301 332 8781
PBX. 604 501 1820
Medellín - Colombia

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin
1		**INICIO DEL PROYECTO EL PEÑOL**			**135 días**	**vie 2/10/26**	**jue 8/04/27**
2		**ACTIVIDADES PRELIMINARES**			**14 días**	**vie 2/10/26**	**mié 21/10/26**
3		Localización, trazado y replanteo con equipos de precision	dia	9,00	9 días	vie 2/10/26	mié 14/10/26
4		Cerramiento en tela verde provisional en zona de trabajo	ml	946,00	14 días	vie 2/10/26	mié 21/10/26
5		**DEMOLICIONES**			**15 días**	**jue 22/10/26**	**mié 11/11/26**
6		Demolición de pisos, andenes, cunetas y bordillos de concreto, en cualquier espesor. Incluye retiro de malla de refuerzo si existe, cargue, transporte y disposicion de los materiales provinientes de la demolicion.	m3	310,64	15 días	jue 22/10/26	mié 11/11/26
7		Demolicion de pavimento asfaltico, de cualquier espesor. Incluye corte con cortadora según trazado y cargue, transporte y disposicion final de escombros	m3	528,13	6 días	jue 22/10/26	jue 29/10/26
8		Corte de asfalto	ml	45,00	1 día	jue 22/10/26	jue 22/10/26
9		**EXCAVACIONES**			**28 días**	**jue 5/11/26**	**lun 14/12/26**
10		Excavación mecanica de material común. Incluye cargue, transporte y disposición final del material sobrante.	m3	2.232,52	28 días	jue 5/11/26	lun 14/12/26
11		**ESTRUCTURA EN CONCRETO**			**74 días**	**jue 29/10/26**	**mar 9/02/27**
12		Suministro, transporte e instalacion de bordillo barrera de 15x35x80cm prefabricado, incluye mortero de pega	ml	970,05	22 días	jue 12/11/26	vie 11/12/26
13		Suministro, transporte e instalacion de andenes en adoquin en tableta de 40x40cm, color por definir. Incluye estructura de soporte (entresuelo base granular e= 0,25 compactado hasta obtener una densidad minima del 95% de la obtenida en el ensayo proctor m	m2	2.097,83	42 días	lun 14/12/26	mar 9/02/27
14		Concreto Clase D (21MPa). Andenes E=0,15m. Incluye estructura de soporte (entresuelo s= 0,15, arenilla e= 0,05). La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto pendientado y llaneado, vaciado alternado (en cuadros no superiore	m2	216,00	16 días	lun 14/12/26	lun 4/01/27
15		Concreto Clase D (21MPa). Viga de confinamiento E=0,20m. La actividad consiste en el suministro, transporte y colocación de concreto, acero de refuerzo, curado y todo lo necesario para su correcta construccion y funcionamiento. las excavaciones y/o descap	m3	7,20	2 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26
16		Suministro transporte e instalacion de guia tactil de 40x40cm	ml	970,05	21 días	mar 5/01/27	mar 2/02/27
17		Suministro, transporte e instalacion de tableta alerta de 40x40cm	m2	42	1,5 días	mar 5/01/27	mié 6/01/27
18		Construccion de pompeyano en concreto	m2	35,00	2,5 días	mié 30/12/26	vie 1/01/27
19		Construccion de losa en concreto de 21Mpa de 15cm para acceso vehicular sobre anden, incluye rampa de acceso	m2	18,40	1,5 días	mar 5/01/27	mié 6/01/27
20		Suministro, transporte y colocación de Concreto en obra Clase F (14MP	m3	10,00	1,5 días	lun 14/12/26	mar 15/12/26
21		Construcción de ANILLOS para MH en concreto de 21 Mpa. con sección cuadrada al exterior. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, lleno compactado con canguro, tapa según especificaciones de EPM. Según diseño.	und	9,00	2 días	jue 29/10/26	vie 30/10/26
22		**ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO**			**63 días**	**vie 2/10/26**	**mar 29/12/26**
23		Suministro, transporte e instalación de Geomalla Biaxial para refuerzo de capas granulares. No incluye hierro para fijacion que se pagara en su respectivo item	m2	4.513,00	5 días	lun 14/12/26	vie 18/12/26
24		Suministro, colocacion, conformacion y compactacion de Subbase granular, no incluye transporte. Compacatacion hasta obtener una densidad minima del 95% de la obtenida en el ensayo proctor modificado	m3	781,60	5 días	lun 14/12/26	vie 18/12/26
25		Suministro y colocación de base granular BG-38, reacomodado con medios mecánicos y compactado al 98% mínimo del ensayo del proctor modificado. Incluye escarificada con moto niveladora y compactada con vibro. Segun norma INVIAS. No incluye transporte	m3	952,58	7 días	lun 21/12/26	mar 29/12/26
26		Suministro, y aplicación de MEZCLA ASFÁLTICA en caliente tipo MDC-19 que cumpla con el Articulo 450-22 de la norma INVIAS 2022, Incluye colocacion con terminadora (finisher) compactacion y terminacion de bordes. No incluye imprimacion ni transporte. Su me	m3	381,03	4 días	vie 2/10/26	mié 7/10/26
27		Suministro, transporte y aplicación de emulsion asfaltica cationica de rompimiento lento C.R.L. para imprimacion de superficie a pavimentar según las normas de construccion de pavimentos INVIAS 411-22. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacio	m2	3.810,33	4 días	vie 2/10/26	mié 7/10/26
28		**TRANSPORTE DE MATERIAL**			**1 día**	**mié 7/10/26**	**mié 7/10/26**
29		Transporte desde el sitio de provision de los materiales de base granular y de mezcla asfaltica, hasta el sitio de las obras.	m3/km	52.392,04	1 día	mié 7/10/26	mié 7/10/26
30		**SEÑALIZACIÓN VIAL**			**131 días**	**jue 8/10/26**	**jue 8/04/27**
31		Suministro, transporte y aplicación de pintura acrilica en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para linea de demarcacion en pavimento	ml	1.083,57	3 días	jue 29/10/26	lun 2/11/26
32		Suministro, transporte e instalación de señal vertical de 60 cm X 60 cm en lámina galvanizada calibre 16, reflectivo tipo IX, estructura metálica tipo pedestal compuesta por un paral en ángulo de 2"x2"x1/4" y brazo en ángulo de 2"x2"x1/8".	und	25,00	2 días	jue 8/10/26	vie 9/10/26
33		Suministro, transporte y aplicación de pintura plástico en frio reflectorizada con microesferas de vidrio para resaltos, zonas escolares y otras areas. Incluye tecto, pictograma y todo lo necesario para su correcta instalacion.	m2	415,00	46 días	jue 29/10/26	jue 31/12/26
34		Pintura plástico-acrílica para pisos, antideslizante, impermeable, para pisos de concreto de alto tráfico, de alta dureza, adherencia, flexibilidad. 16 tonos de color diferentes (por definir tonos RAL o RGB). Resistente a la abrasión severa, a agentes con	m2	497,50	42 días	mié 10/02/27	jue 8/04/27
35		**OBRAS DE DRENAJE**			**7 días**	**jue 5/11/26**	**vie 13/11/26**
36		Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 21Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta	und	18,00	2 días	jue 5/11/26	vie 6/11/26
37		Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT, con un DIÁMETRO DE 12". Incluye suministro y transporte de los materiales, bocas, accesorios, acondicionador de superficie y adhesivo Novafort y todos los elementos necesarios para su correcta	ml	126,00	7 días	jue 5/11/26	vie 13/11/26
38		**MOBILIARIO**			**12 días**	**mié 10/02/27**	**jue 25/02/27**
39		Suministro transporte e instalacion de totem informativo en estructura metalica con dimensiones h= 2,40m, con vista isometrica triangular con lados de L=0,90m, con marco perimetral metalico según diseño, panel para grafica en vinilo laminado, base metalic	und	12,00	12 días	mié 10/02/27	jue 25/02/27

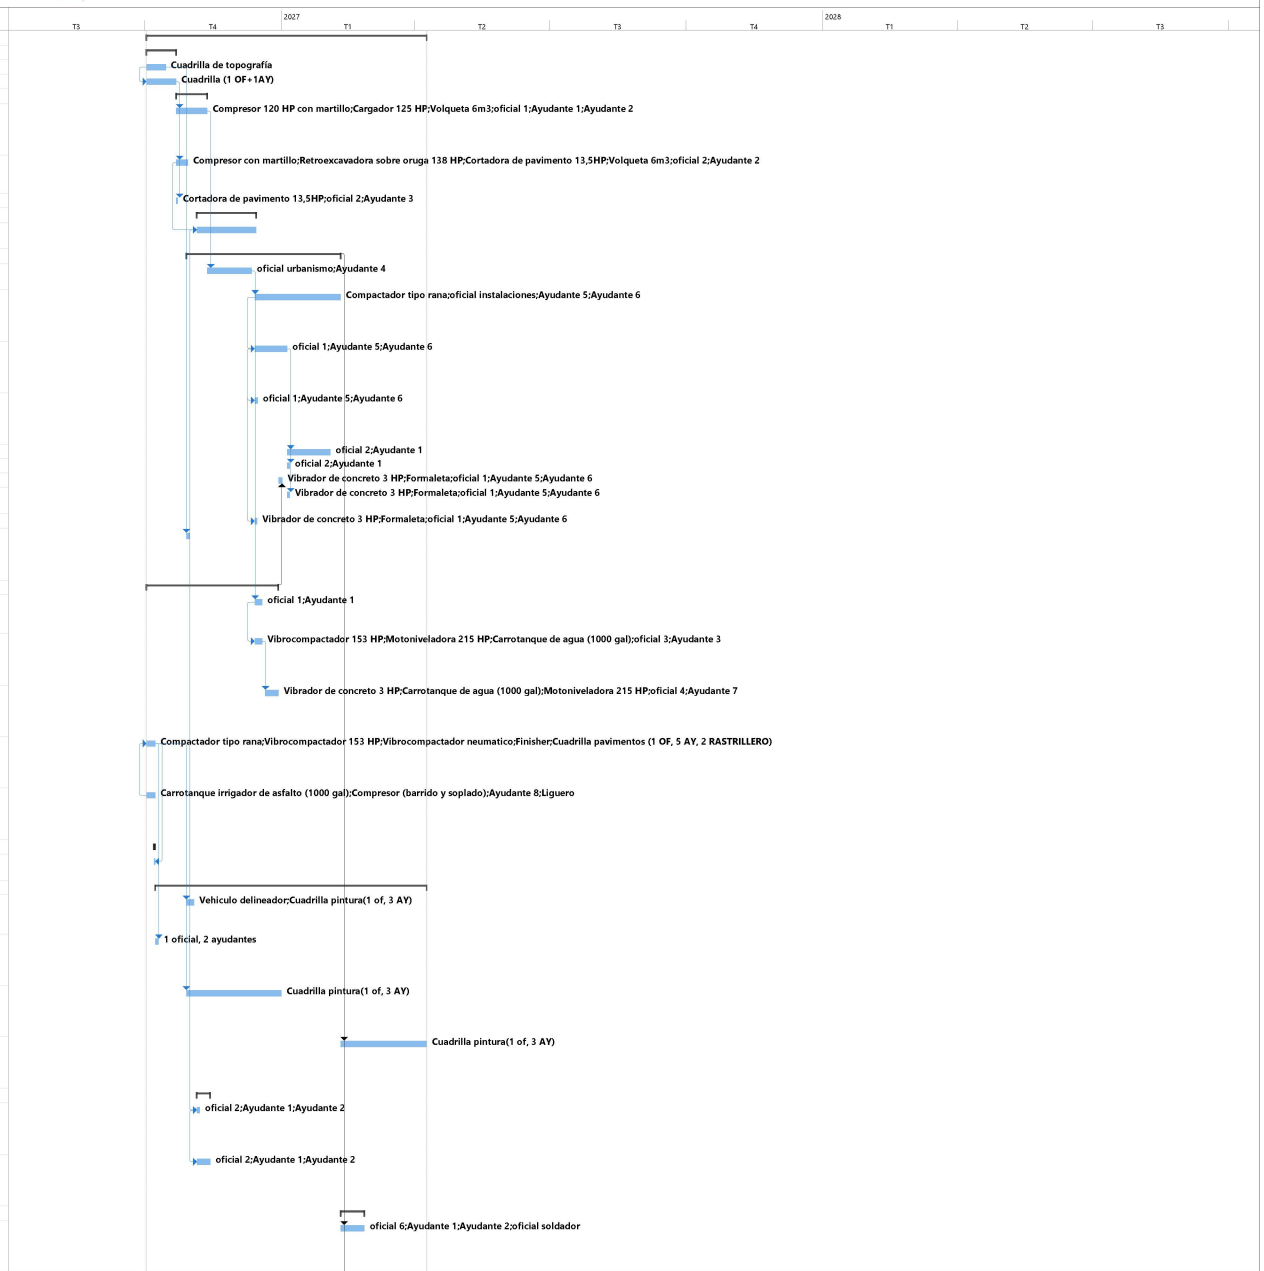

Proyecto: PROGRAMACIÓN EL
Fecha: vie 2/10/26

Tarea · División · Hito · Resumen · Resumen del proyecto · Tarea inactiva · Hito inactivo · Resumen inactivo · Tarea manual · solo duración · Informe de resumen manual · Resumen manual · solo el comienzo · solo fin · Tareas externas · Hito externo · Fecha límite · Progreso · Progreso manual

PAVIMENTOS ABURRÁ
Calle 43 BB # 120 B - 151
Agregados San Javier
Cel. 301 332 8781
PBX. 604 501 1820
Medellín - Colombia

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Unidad	Cantidad	Duración	Comienzo	Fin
40		Suministro, transporte e instalacion de bancas en concreto prefabricado según diseño arquitectonico	und	10,00	10 días	mié 10/02/27	mar 23/02/27
41		Suministro transporte e instalacion de jardineras en concreto prefabricado de 1,0x0,4x0,4 m	und	100,00	7 días	mié 10/02/27	jue 18/02/27
42		**FIN DEL PROYECTO**			0 días	vie 2/10/26	vie 2/10/26



Proyecto: PROGRAMACIÓN EL
Fecha: vie 2/10/26

Tarea | Hito | Resumen del proyecto | Hito inactivo | Tarea manual | Informe de resumen manual | solo el comienzo | Tareas externas | Fecha límite | Progreso manual
División | Resumen | Tarea inactiva | Resumen inactivo | solo duración | Resumen manual | solo fin | Hito externo | Progreso
