ACTA No. 1			
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: Identificación y sustentación de la necesidad para Contratar la construcción de la cubierta de la cancha deportiva del Centro de Formación Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, ubicado en el municipio de Garzón			
CIUDAD Y FECHA:	Septiembre, 04 del 2026	**HORA INICIO:** 10:00am	**HORA FIN:** 12:00am
LUGAR Y/O ENLACE:	Oficina de Infraestructura	**DIRECCIÓN / REGIONAL / CENTRO:** Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila.	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Identificación de la necesidad de intervención de la cancha deportiva existente.
2. Revisión de las condiciones actuales y antecedentes de las obras ejecutadas.
3. Presentación de la solución proyectada.
4. Definición de acciones.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Sustentar la necesidad de construir la cubierta de la cancha deportiva existente, con el propósito de mejorar sus condiciones de protección, seguridad, funcionalidad y aprovechamiento.
2. Analizar las condiciones existentes y establecer las intervenciones requeridas para completar y poner en funcionamiento el escenario deportivo.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En el marco de las funciones institucionales del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, se realizó el análisis de la necesidad de intervenir la cancha deportiva existente del Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, ubicada en el municipio de Garzón.

Actualmente, la cancha cuenta con una placa de concreto destinada al desarrollo de actividades deportivas, recreativas, formativas e institucionales. Sin embargo, el escenario se encuentra descubierto y expuesto a las condiciones climáticas, principalmente a la lluvia y a la radiación solar, lo que limita su aprovechamiento y las condiciones de protección y comodidad para los usuarios. Adicionalmente, presenta desgaste en los acabados y demarcaciones deportivas.

1. Condiciones existentes y antecedentes

En el área objeto de intervención existen elementos de cimentación ejecutados durante las vigencias 2021 y 2022, correspondientes a doce (12) zapatas, doce (12) pedestales, vigas de cimentación y demás elementos asociados a las graderías. Estas obras hicieron parte de un proceso contractual anterior cuyo alcance contemplaba la construcción de la cubierta de la cancha deportiva, las graderías

y las obras complementarias; sin embargo, dicho proceso contractual no fue culminado, por lo que los elementos construidos permanecieron expuestos a la intemperie durante un periodo prolongado.

En consideración a lo anterior, el 18 de febrero de 2026, la Dirección General solicitó la revisión técnica de los elementos existentes al ingeniero civil especialista en estructuras David Leal, con el propósito de realizar una inspección visual y determinar, de manera preliminar, las condiciones de conservación y la viabilidad de utilizar dichas estructuras como parte del sistema estructural requerido para continuar con el proyecto de construcción de la cubierta.

Como resultado de la inspección realizada, se emitió un informe técnico en el cual se concluyó lo siguiente:
"Los elementos de cimentación y pedestales evaluados presentan, en términos generales, un estado adecuado de conservación, sin evidencias de afectaciones que comprometan su capacidad estructural de manera inmediata.

El nivel de afectación identificado corresponde principalmente a condiciones de deterioro superficial y deficiencias puntuales de carácter constructivo, asociadas en gran medida a la exposición prolongada de la estructura a la intemperie y a la falta de protección posterior a su ejecución.

Se identifican, no obstante, situaciones localizadas que requieren intervención, particularmente en lo relacionado con el deterioro de pernos de anclaje y deficiencias de nivelación, las cuales deben ser corregidas para garantizar la correcta funcionalidad del sistema estructural proyectado.

En este sentido, se concluye que la estructura evaluada es potencialmente apta para su uso previsto, siempre y cuando se implementen de manera oportuna las acciones correctivas y preventivas recomendadas. La no atención de estas condiciones podría derivar en un incremento progresivo del nivel de afectación y en la necesidad de intervenciones de mayor complejidad en etapas posteriores del proyecto."

De acuerdo con las conclusiones del informe y con el fin de contar con los elementos técnicos necesarios para garantizar la seguridad, estabilidad y correcta funcionalidad de la estructura proyectada, en la mesa de trabajo realizada el 3 de agosto de 2026 se determinó fundamental incluir dentro de las actividades del proceso la evaluación técnica de los elementos estructurales existentes, mediante los estudios y ensayos de laboratorio patológico que resulten técnicamente necesarios. Lo anterior permitirá establecer con mayor precisión el estado actual de las estructuras, verificar sus condiciones de servicio y determinar las intervenciones y acciones correctivas que, de ser requeridas, deberán ejecutarse antes o durante la construcción de la nueva cubierta.

Para atender esta necesidad, el recurso presupuestal correspondiente fue solicitado el 9 de julio de 2026, mediante el radicado No. 41-9-2026-019276, ante la Dirección de Planeación y Direccionamiento Corporativo.

Posteriormente, el 27 de julio de 2026, se recibió la comunicación mediante la cual se informó la asignación de los recursos requeridos, así:


CONCEPTO INTERNO SENA	VALOR A DISMINUIR	VALOR A AUMENTAR	OBSERVACION	COMUNICACIÓN
ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES		$1.553.699.057,00	ASIGNACIÓN DE RECURSOS: Asignación de recursos por valor de $ 1.553.699.057 para (Contratar la cubierta de la cancha deportiva del Centro de Formación Agroempresarial y Desarrollo del Huila, ubicado en el municipio de Garzón). Según el comunicado enviado por el subdirector (E) en radicado No. 41-9-2026-019276 NIS 2026-02-297621 de fecha 7/9/2026 4:09:01 PM	CPE No. 01-9-2026-065015 DEL 23-0 2026 DIRECCION ADMNINISTRATIVA FINANCIERA
ADECUACIONES Y CONSTRUCCIONES		$155.369.906,00	ASIGNACIÓN DE RECURSOS: Asignación de recursos por valor de $ 155.369.906 para (Contratar la Interventoria del proceso construcción de la cubierta de la cancha deportiva del Centro de Formación Agroempresarial y Desarrollo del Huila, ubicado en el municipio de Garzón). Según el comunicado enviado por el subdirector (E) en radicado No. 41-9-2026-019329 NIS 2026-02-299155 de fecha 7/10/2026 10:50:19 AM	CPE No. 01-9-2026-065015 DEL 23-0 2026 DIRECCION ADMNINISTRATIVA FINANCIERA

2. Solución proyectada

La intervención comprende la construcción integral de la cubierta de la cancha deportiva existente y las obras complementarias necesarias para su adecuado funcionamiento.

Se contempla la evaluación y adecuación de los elementos existentes, la ejecución de cimentaciones y elementos de apoyo requeridos, el suministro, fabricación y montaje de la estructura metálica, instalación de la cubierta termoacústica, sistema de drenaje y manejo de aguas lluvias, intervenciones de acabado en la cancha y construcción de graderías, instalaciones eléctricas, sistema de protección contra descargas atmosféricas, cerramiento contra impacto, equipamiento deportivo, acabados y demás actividades necesarias para la entrega y puesta en funcionamiento del escenario.

El proyecto cuenta con los estudios, diseños, planos, memorias de cálculo y demás documentos técnicos correspondientes, así como con Licencia Urbanística de Construcción en modalidad de obra nueva No. 01-URB-004755-E-2026, previamente tramitada por la Entidad ante la Administración Municipal de Garzón, como soporte para la ejecución de la intervención.

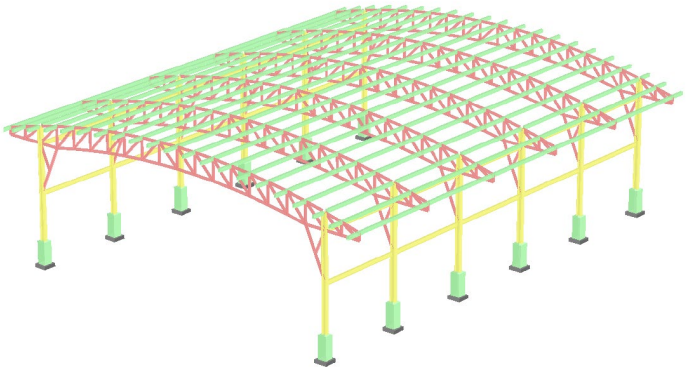

Actividades de la intervención

41_9525_256 Contratar la cubierta de la cancha deportiva del Centro de Formación Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, ubicado en el municipio de Garzón			
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT
1	PRELIMINARES Y DEMOLICIÓN		

1,1	Suministro, transporte e instalación de cerramiento provisional h=2,10 m. en lona verde, incluye parales de soporte.	M	140,00
1,2	Localización, trazado y replanteo.	M2	867,20
1,3	Evaluación técnica de los elementos estructurales existentes de la cancha deportiva, mediante la ejecución de ensayos y estudios de diagnóstico que permitan determinar su estado, características y condiciones de conservación, así como establecer su aptitud para ser incorporados a la solución estructural proyectada. Incluye la toma de muestras, ejecución de ensayos, análisis e interpretación de resultados, elaboración de informes y emisión del concepto técnico correspondiente, incluyendo las recomendaciones de intervención, reparación, reforzamiento, sustitución o reconstrucción a que haya lugar.	GLOBAL	1,00
1,4	Demolición, retiro y disposición de placa de concreto con espesor <20cm (en piso), incluye cargue y retiro de escombros a lugar autorizado.	M2	50,00
1,5	Desmonte /retiro, transporte y disposición, Desmote/retiro de malla contra impacto con altura aproximada de 5m. Incluye retiro de escombros a lugar autorizado, andamio certificado, línea de vida elementos de protección personal y personal certificado para realizar actividad.	M	55,00
1,6	Excavación manual, retiro y disposición de material de suelo, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado.	M3	17,00
1,7	Suministro, transporte, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de relleno en material seleccionado para estructuras, compactación mecánica, espesor de 30cm (compactación igual o superior al 90% del proctor modificado)	M3	15,00
1,8	Demolición, retiro y disposición de Zapatas, incluye cargue y retiro de escombros a lugar autorizado.	M3	0,10
1,9	Demolición, retiro y disposición de Vigas de cimentación, incluye cargue y retiro de escombros a lugar autorizado.	M3	0,10
1,10.	Demolición, retiro y disposición de Pedestales, incluye cargue y retiro de escombros a lugar autorizado.	M3	0,10
			Subtotal
2	CIMENTACIÓN		
2,1	Suministro, transporte y reparación de grietas en concreto mediante inyección de sellador epóxico.	M	50,00
2,2	Suministro, transporte e instalación de perno para anclaje en pedestal L=1.0 m diámetro 3/4" incluye tuercas y arandelas diam 3/4"; mediante la instalación de anclajes postinstalados con resina epóxica, garantizando así condiciones adecuadas de adherencia y transferencia de cargas.	UND	48,00
2,3	Suministro, transporte y nivelación mediante aplicación de grouting de nivelación sobre pedestales, concreto fluido.	M3	0,17
2,4	Suministro, transporte y construcción de Zapatas, en concreto con resistencia de 4000 psi, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución.	M3	0,10
2,5	Suministro, transporte y construcción de Viga de cimentación, en concreto con resistencia de 4000 psi, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución.	M3	0,10
2,6	Suministro, transporte y construcción de Pedestales, en concreto con resistencia de 4000 psi, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución.	M3	0,10
2,7	Suministro, transporte, figurado e instalación de Acero de refuerzo 60000 psi, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución.	KG	0,10
2,8	Suministro, transporte y construcción de Solado, en concreto con resistencia de 2000 psi de 5cm de espesor, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución.	M2	0,10
			Subtotal
3	ESTRUCTURA METÁLICA		
3,1	Suministro, transporte, fabricación e instalación de estructura metálica para cubiertas. NormaNSR10 título F. Perfilería ASTM A572 GR50 Y ASTM A37, ASTM A500 grado C para tubería, A36 para ángulos ASTM F1554 GRADO 105 conexiones a momentos o rígidas A-325, conexiones correas SAEGRADOS. Soldadura E70XX. INC cerchas, correas, tensores, anclajes, ángulos y accesorios, limpieza SSPC-SP3, primer anticorrosiva epóxico y acabado en pintura con acabado poliuretano. El ítem contempla el suministro e instalación de todos los elementos de fijación, accesorios y remates requeridos para su correcta ejecución; así como andamio certificado, línea de vida, elementos de protección personal y personal certificado para trabajo en alturas. Incluye retiro de escombros a sitio autorizado.	KG	28993,24
			Subtotal
4	CUBIERTA Y DRENAJE DE AGUAS		

4,1	Suministro, transporte e instalación de teja termoacústica tipo sándwich en aluzinc calibre 26 espesor 0.46 mm. Aislamiento en poliuretano de (30 mm, alta densidad 38Kg / m3). Incluye remate lateral, remate frontal y trasero, remaches, tornillos y todo lo necesario para su correcta instalación. Color a definir. El ítem contempla andamio certificado, línea de vida, elementos de protección personal y personal certificado para trabajo en alturas. La instalación sobre estructura metálica a una altura aproximada de 10 metros. Incluye retiro de escombros a sitio autorizado.	M2	883,84
4,2	Suministro, transporte, fabricación e instalación de canal metálica (Desarrollo=108 cm) en lámina galvanizada calibre 18. Canal con acabado primer anticorrosiva epóxico y acabado en pintura con acabado poliuretano. El ítem contempla el suministro e instalación de soportes, soscos, refuerzos, gárgolas de rebose, elementos de fijación, accesorios y remates requeridos para su correcta ejecución; así como andamio certificado, línea de vida, elementos de protección personal y personal certificado para trabajo en alturas. Incluye retiro de escombros a sitio autorizado. Ver figurado en planos de drenajes.	M	64,00
4,3	Suministro, transporte, e instalación de bajantes de aguas lluvias en tubería PVC de 4". El ítem contempla el suministro e instalación de todos los elementos de fijación, accesorios y remates requeridos para su correcta ejecución; así como andamio certificado, línea de vida, elementos de protección personal y personal certificado para trabajo en alturas. Incluye retiro de escombros a sitio autorizado.	M	83,20
4,4	Suministro, transporte, extendido, nivelación, humedecimiento y compactación de base granular compactada (compactación igual o superior al 90% del proctor modificado)	M3	6,37
4,5	Suministro, transporte, e instalación de tubería pvc-s 6" - Conducción aguas lluvias. Incluye cama base de arena.	M	34,40
4,6	Suministro, transporte, e instalación de tubería pvc-s 8" - Conducción aguas lluvias. Incluye cama base de arena.	M	50,34
4,7	Suministro, transporte, e instalación de tragante de aguas lluvias 4".	UND	8,00
4,8	Suministro, transporte y construcción de caja de inspección 40x40, con altura entre 46cm y 75cm. Con tapa en concreto reforzado, muros en ladrillo recocido, pañete impermeabilizado, con placa base en concreto reforzado y cañuela Smin=15% en concreto.	UND	5,00
4,9	Suministro, transporte y construcción de cárcamo en concreto ancho =0.4m, alto=0.85m y largo=2,80m con rejilla prefabricada.	UND	1,00
4,10.	Suministro, transporte y construcción de caja de paso en mampostería 60x60cm, con altura de 87cm. Con tapa en concreto reforzado, muros en ladrillo recocido, pañete impermeabilizado, con placa base en concreto reforzado y cañuela Smin=15% en concreto.	UND	1,00
			Subtotal
5	PLACA CANCHA		
5,1	Suministro, transporte y construcción de placa en concreto de 4000 PSI incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución (espesor de acuerdo con diseño)	M3	6,00
5,2	Suministro, transporte, figurado e instalación de Acero de refuerzo 60000 psi, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución.	KG	699,17
5,3	Suministro, transporte y aplicación de sellado de juntas de dilatación losa de piso con polietileno N°6 perforado, lámina de icopor de 1cm y sellador elástico de poliuretano.	M	7,28
5,4	Suministro, transporte y aplicación de junta de placa de contrapiso de 1cm con cordón y sellador elástico de poliuretano.	M	28,44
5,5	Suministro, transporte y aplicación de capa de imprimación a una capa con producto imprimante epóxico bicomponente, base de agua con cargas, libre de disolventes, para recubrimiento especial en espacios y pisos de instalaciones recreativas (canchas deportivas) (Sikafloor 154 W 40 o similar). Incluye la mezcla, preparación y aplicación del producto, lijado, limpieza y acondicionamiento previo de la superficie, así como las demás actividades necesarias para garantizar la correcta adherencia y acabado de las capas posteriores del sistema.	M2	776,00
5,6	Suministro, transporte y aplicación de capa base a dos capas con recubrimiento acrílico monocomponente para la regularización, en capa fina, con adición de áridos seleccionados, especial en espacios y pisos de instalaciones recreativas (canchas deportivas) (Sikafloor 2030 o similar), de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. Incluye homogenización, aplicación y demás actividades necesarias para la correcta ejecución del sistema. Color a definir.	M2	776,00
5,7	Suministro, transporte y aplicación de capa de sellado a dos capas con recubrimiento acrílico de acabado o sello decorativo, base agua, monocomponente, especial en espacios y pisos de instalaciones recreativas (canchas deportivas) (Sikafloor 2020 o similar), de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. Incluye homogenización,	M2	776,00

	aplicación y demás actividades necesarias para la correcta ejecución del sistema. Color a definir.		
5,8	Suministro, transporte y aplicación de demarcación de líneas con recubrimiento acrílico de acabado o sello decorativo, base agua, monocomponente, especial en espacios y pisos de instalaciones recreativas (canchas deportivas) (Sikafloor 2020 o similar), de acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. Incluye homogenización, aplicación y demás actividades necesarias para la correcta ejecución del sistema. Color blanco.	M	506,02
			Subtotal
6	GRADERÍAS		
6,1	Suministro, transporte y construcción de viga de cimentación en concreto de 4000 psi.	M3	0,10
6,2	Suministro, transporte, figurado e instalación de Acero de refuerzo 60000 psi, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución.	KG	373,90
6,3	Suministro, transporte y construcción de Solado, en concreto con resistencia de 2000 psi de 5cm de espesor, incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución.	M2	0,10
6,4	Suministro, transporte y construcción placas para gradería en concreto a la vista de 4000 psi	M3	4,22
6,5	Suministro, transporte, figurado e instalación de refuerzo en malla electrosoldada de Ø6,5mm con abertura de 0.15m en ambos sentidos. Incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución.	KG	173,32
6,6	Suministro, transporte y construcción de mampostería en bloque estructural. Incluye todas las actividades, materiales y equipo necesario para su ejecución.	M2	75,80
			Subtotal
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
7,1	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Led Sylvania High Bay 100W CW GC350 EMERG P37937, en doble altura, incluye accesorios para su instalación, conexión de red eléctrica por techo.	UND	9,00
7,2	Suministro, transporte e instalación de Luminaria Led Sylvania Aplique Emergencia P26848, en doble altura, incluye accesorios para su instalación, conexión de red eléctrica por techo.	UND	9,00
7,3	Suministro, transporte e instalación de caja de control de iluminación, tipo intemperie. Incluye temporizador digital, contactor de 3 polos, elementos de fijación, accesorios y remates requeridos para su correcta ejecución.	UND	1,00
7,4	Suministro, transporte e instalación de Punto eléctrico tomacorriente doble 110v inc. Alambre No 10 y tubería IMC 3/4" para ubicación de puntos eléctricos de sobreponer, marcar tuvo IMC con pintura naranja.	UND	4,00
7,5	Suministro, transporte e instalación de tablero bifásico de 8 circuitos con puerta cerrada y espacio para totalizador, Incluye breaker monopolar, bipolar, con espacio para totalizador.	UND	1,00
7,6	Suministro, transporte e instalación de tablero bifásico de 12 circuitos con puerta cerrada y espacio para totalizador, Incluye breaker monopolar, bipolar.	UND	1,00
7,7	Suministro, transporte e instalación de sistema de puesta a tierra del tablero bifásico de 8 circuitos. Incluye accesorios y elementos para instalación.	UND	1,00
7,8	Suministro, transporte e instalación de sistema de protección contra descargas eléctricas atmosféricas (SPDA). incluye accesorios y elementos para instalación.	UND	1,00
7,9	Suministro, transporte e instalación de caja en mampostería 30x30x60 cm interno para SPDA, Marco en ángulo de hierro, tapa en concreto de 3000 psi con malla electrosoldada y base de gravilla.	UND	6,00
7,10.	Suministro, transporte e instalación de caja en mampostería 60x60x80 cm interno, Marco en ángulo de hierro, tapa en concreto de 3000 psi con malla electrosoldada y base de gravilla.	UND	1,00
			Subtotal
8	EQUIPAMENTO DEPORTIVO		
8,1	Suministro, transporte e instalación de cerramiento contra impacto tipo IDRD de 5,00 m de altura, conformado por estructura principal en tubo galvanizado de 3" calibre 90, ASTM A500 Grado C, ángulo de 1-1/2" calibre 1/8", malla eslabonada de 2" calibre 10 HG en la parte superior y varilla redonda lisa de Ø3/4" con separación de 14 cm entre ejes en la parte inferior. Incluye platinas de acero CR de 3/4" calibre 1/8", lámina CR calibre 1/8" con acabado en pintura electrostática tipo TGIC, camisas, riostras, diagonales, elementos de fijación, anclajes, tapones, remates, soldaduras y demás elementos necesarios. Incluye viga de amarre, pilotes y cimentación en concreto de 3.000 psi, según planos. Incluye	M	60,00

	andamio certificado, línea de vida, elementos de protección personal y personal certificado para trabajo en alturas.		
8,2	Suministro, transporte e instalación de juego de tableros de baloncesto y arquerías de microfútbol para cancha deportiva, conformado por estructura metálica fija fabricada en tubo redondo tipo “aguas negras” de 3", con marcos para baloncesto en ángulo de 1 1/2", altura total de 3,10 m, tablero en acrílico transparente demarcado de 1,80 x 1,20 m, aro metálico fabricado en varilla de 5/8" con malla. Incluye arquerías metálicas para microfútbol con sus respectivas mallas, elementos de fijación y anclaje, desmonte del tablero existente, cargue, transporte, descargue, armado, montaje, nivelación, fijación y todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00
			Subtotal
9	ASEO		
9,1	Aseo final de obra. Incluye suministro de personal, herramientas, equipos e insumos necesarios para la limpieza general, recolección, cargue, transporte y disposición de escombros, residuos y materiales sobrantes, dejando las áreas intervenidas en condiciones óptimas para su entrega.	M2	883,00
			Subtotal

3. Necesidad y conveniencia de la contratación

Teniendo en cuenta el alcance y las características técnicas de la intervención, el Centro de Formación no cuenta con los recursos humanos, equipos, maquinaria y demás medios necesarios para ejecutar directamente la totalidad de las actividades requeridas.

Por lo anterior, se considera conveniente adelantar la contratación de un tercero que cuente con la capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera necesaria para ejecutar integralmente las obras, garantizando la adecuada articulación con la infraestructura existente y la entrega de un escenario seguro, funcional y protegido para el desarrollo de las actividades institucionales.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis realizado durante la reunión, se concluye que existe la necesidad de adelantar la intervención del escenario deportivo, para lo cual se determina:

1. Garantizar condiciones adecuadas de protección, seguridad, funcionalidad y confort para los usuarios del escenario.
2. Mejorar el aprovechamiento de la cancha para el desarrollo de actividades deportivas, recreativas, formativas, culturales, institucionales y de bienestar.
3. Evaluar técnicamente los elementos de cimentación ejecutados previamente, con el fin de determinar su condición y aptitud para ser incorporados a la solución proyectada.
4. Ejecutar las obras de cimentación, estructura, cubierta, drenaje, instalaciones, acabados, equipamiento deportivo y demás componentes requeridos para completar y poner en funcionamiento el escenario.

5. Dar cumplimiento a los estudios, diseños, especificaciones técnicas y demás documentos que soportan la intervención, así como a la Licencia Urbanística de Construcción en modalidad de obra nueva previamente tramitada por la Entidad.
6. Optimizar el aprovechamiento de las obras de infraestructura existentes que resulten técnicamente viables, evitando su pérdida y garantizando su adecuada integración a la solución proyectada.

En conclusión, se considera técnica y funcionalmente procedente adelantar la intervención prevista, atendiendo las condiciones existentes del escenario y los documentos técnicos que soportan la solución proyectada.

ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Remitir el acta para ser parte integral a la Subdirección.	07 de septiembre de 2026	Lorena María Gutiérrez Quintero	Firmado digitalmente por Lorena Maria Gutierrez Quintero

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA / EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Lorena María Gutiérrez Quintero	Coordinadora del Grupo de Apoyo Administrativo	SI	No aplica	Firmado digitalmente por Lorena Maria Gutierrez Quintero
John Edinson Avendaño Tao	Profesional de Gestión de la Infraestructura y Logística	SI	No aplica	
Laura Sofia Silva Mora	Arquitecta	SI	No aplica	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

1. Radicación de pago de Licencia Urbanística de Obra Nueva No. 01-URB-004755-E-2026.

2. CDP 6126


SENA
