ALCALDÍA DE ORITO
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

INFORME DE VISITA

SOLICITADA POR:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
FECHA:	10 de abril de 2026.
DIRECCIÓN:	"FASE 2 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR - MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.."

ASUNTO:	INSPECCIÓN OCULAR PARA VERIFICAR EL ESTADO Y MEJORAS A LA INFRAESTRUCTURA de la FASE 2 "CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR - MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."
EFECTUADO POR:	Secretaría de INFRAESTRUCTURA Inspector Secretaria de Infraestructura Municipal "Oscar David Matabanchoy Solarte".

INFORME DE VISITA

La visita se realizó el día 07 de abril del 2026, a la CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR del municipio de orito departamento del putumayo, donde cuenta con una estructura construida en primera fase, se contó con la presencia de la secretaria de salud y desarrollo social, ingeniero Alejandro Samboni jefe de banco de proyectos y por el inspector de obra de la Secretaría de Infraestructura de la alcaldía municipal del municipio de orito departamento del putumayo.

La visita es programada para la revisar la estructura existente y proceder para realizar una inversión de FASE 2 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR - MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO."

Realizada la inspección ocular se verifica que la estructura existente se encuentra construida en material, cuenta con sus respetivas zapata, vigas de cimiento, columnas , vigas aéreas, y parte de la cubierta con su estructura metálica, la secretaria de salud y desarrollo social manifiesta que es indispensable realizar una inversión a estas área para contar con un lugar más amplio para la atención del adulto mayor y así brindar una cobertura mayor a la atención del adulto mayor ya que la CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR actualmente no cuenta con suficiente espacio, al presente se presta el servicio a 11 personas mayores.

Por esta razón se identifican las siguientes necesidades:

- Terminación de la cubierta.
- relleno.
- Placa de pisos
- Mampostería, pañete y pintura.
- Manejo de las aguas lluvias.
- Instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas.
- Carpintería metálica, puertas y ventanas.
- Acabados como, enchapes, cielo Razo.
- Y demás obras para su correcto funcionamiento.

UBICACIÓN

CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR



PUNTO DE GEOREFERENCIA:

N: 0°39'42.62" **W: 76°52'27.00"**

REGISTRO FOTOGRÁFICO: FASE 2 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR.

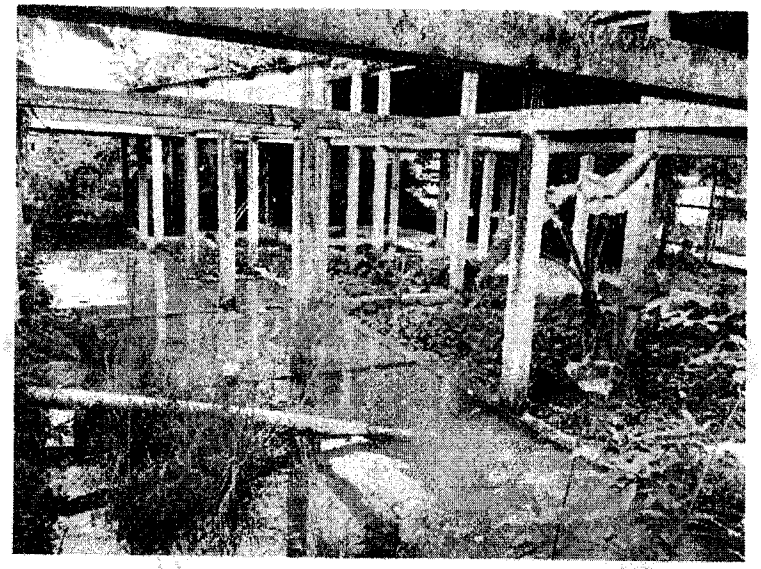


Imagen N°1 estructura existente.

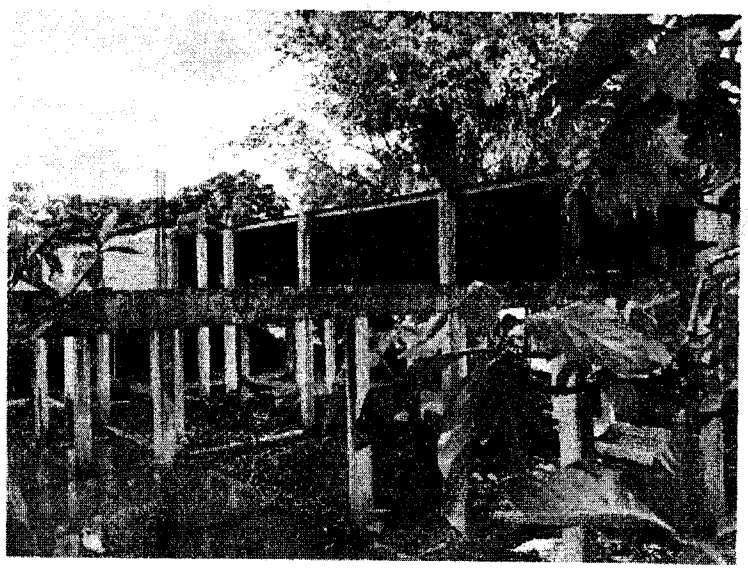


Imagen N°2 Falta completar cubierta.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: FASE 2 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR.

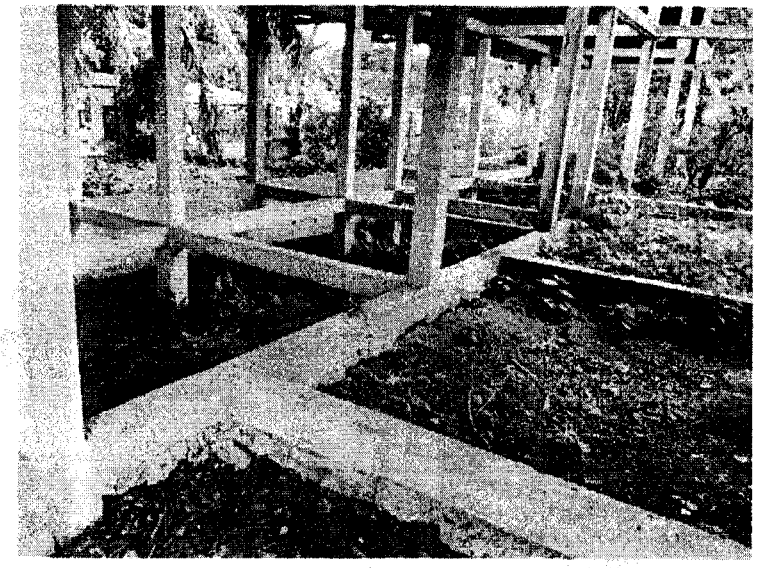


Imagen N°3 relleno pisos.



Imagen N°4 Manejo de aguas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO: FASE 2 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA EL ADULTO MAYOR.



Imagen N°5 obras, mampostería, pañetes, pintura etc.

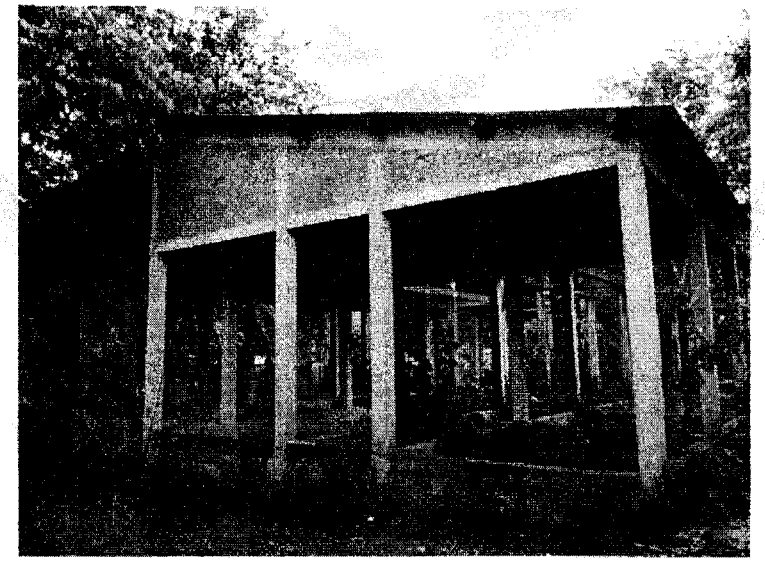


Imagen N°6 y demás obras que se requiera para su correcta función.

HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES:

1. Realizada la visita e inspección ocular se identifica la necesidad de realizar una segunda fase de ejecución esto con el fin de realizar avances en su terminación y poner en funcionamiento esta importante infraestructura a la atención de nuestros adultos mayores.

2. La CASA CENTRO DE PROTECCIÓN ADULTO MAYOR presta actualmente el servicio a 11adultos mayores y se ve la necesidad de su terminación para ampliar la cobertura en atención y mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.

Oscar Matabanchoy

OSCAR DAVID MATABANCHOY SOLARTE
Inspector
Secretaría de Infraestructura Municipal

Secretaría de INFRAESTRUCTURA
