ALCALDÍA MUNICIPAL

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN, SEDE ESCUELA AGUA LINDA EN LA VEREDA AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA

Dirección: Carrera 4 N0. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 3
2. OBJETIVOS 4
2.1. OBJETIVO GENERAL 4
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 4
3. METODOLOGÍA 5
3.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA 5
3.2. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA SOBRE EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE 5
3.3. ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO Y LA LINEA BASE AMBIENTAL 5
3.4. DISEÑO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 5
4. ALCANCE 6
5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 6
5.1. LOCALIZACIÓN 6
5.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 7
5.3. ACTIVIDADES DE OBRA 7
6. LINEA BASE 25
6.1. COMPONENTE FISICO 25
COMPONENTE BIOTICO 28
Flora 28
Fauna 28
COMPONENTE SOCIO-ECONOMICO 28
7. USO DE LOS RECURSOS NATURALES 31
8. EVALUACIÓN AMBIENTAL 31
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 32
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS 33
Metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales 33
8.1. RESULTADO Y PRIORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS 37
9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 38
10. PLAN DE CONTINGENCIAS 45
11. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 46
12. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL 47
13. JUSTIFICACIÓN DE LA MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL 48

Dirección: Carrera 4 N0. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

1. INTRODUCCIÓN

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) del contrato "**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN, SEDE ESCUELA AGUA LINDA EN LA VEREDA AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**", se establece como el principal instrumento técnico ambiental orientado a la prevención, mitigación, compensación y control de los posibles impactos derivados de la ejecución del proyecto. Su propósito es garantizar una gestión ambiental integral que permita el desarrollo de las actividades bajo criterios de sostenibilidad, orden y responsabilidad dentro del área de influencia del municipio de Cravo Norte, Arauca.

Para lograr este objetivo, el PMA contempla la identificación y evaluación de impactos ambientales generados por cada frente de trabajo. Este proceso se fundamenta en la recopilación y análisis de información sobre las características ambientales del entorno y las actividades a desarrollar. Los impactos identificados serán evaluados a través de una matriz de aspectos e impactos ambientales, aplicando la metodología EPM, con el fin de establecer el nivel de significancia y priorización de cada efecto ambiental detectado.

Con base en dicha evaluación, se procederá a la formulación de programas de manejo ambiental, en los cuales se definirán de manera técnica y detallada las medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación aplicables en cada etapa del contrato. Estos programas estarán articulados con mecanismos de control, monitoreo y seguimiento, lo que garantizará la eficacia de las medidas implementadas y la reducción de los riesgos ambientales asociados al desarrollo del proyecto.

Es necesario resaltar que el contratista deberá dar cumplimiento estricto a la normatividad ambiental vigente y a los procedimientos técnicos contemplados en este PMA. En este sentido, el plan se constituye en una herramienta de planificación, gestión y control que acompañará todas las fases del contrato hasta su finalización, asegurando que las medidas de manejo ambiental definidas se apliquen en su totalidad y, de ser requerido, se complementen con acciones adicionales para responder a nuevas condiciones o impactos no previstos.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Formular el Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el contrato "**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN, SEDE ESCUELA AGUA LINDA EN LA VEREDA AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**", orientado a establecer las medidas necesarias de prevención, mitigación, corrección y compensación de los posibles impactos ambientales negativos que se generen durante las diferentes fases del proyecto (antes, durante y después de su ejecución).

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Caracterizar el área de influencia del contrato, mediante la descripción detallada de sus componentes físicos, bióticos y antrópicos, con el fin de contar con una línea base ambiental que sirva como referencia para la gestión del proyecto.
- Identificar y analizar la normativa ambiental aplicable, incluyendo los requerimientos legislativos, regulatorios y técnicos, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes durante todas las fases del contrato.
- Formular y diseñar el plan de seguimiento y monitoreo del Plan de Manejo Ambiental (PMA), estableciendo indicadores, metodologías y frecuencias de evaluación que permitan verificar la eficacia de las medidas implementadas.
- Asegurar la incorporación de medidas de manejo ambiental (MMA) en el desarrollo del contrato, orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos ambientales negativos sobre el área intervenida.
- Fortalecer los mecanismos de comunicación y participación, promoviendo la interacción efectiva entre el contratista, la comunidad y las entidades competentes, con el fin de garantizar la articulación institucional y la apropiación social de las acciones ambientales.

Dirección: Carrera 4 N0. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

3. METODOLOGÍA

3.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN PRIMARIA

Recolección de información primaria mediante, visitas de inspección ocular al área de influencia del contrato, levantamiento de información de campo y análisis de calidad de los recursos naturales a aprovechar, con el fin de identificar los impactos y efectos ambientales en los diferentes componentes (agua, aire, suelo, social, cultural, económico).

3.2. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN SECUNDARIA SOBRE EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

- Recolección de información secundaria con base en el Plan de Desarrollo Municipal y Esquema de Ordenamiento Territorial, del municipio de Cravo Norte.
- Evaluación de información disponible sobre control ambiental para la implementación de obras de infraestructura y desarrollo vial.
- Evaluación información técnica del proyecto

3.3. ELABORACIÓN DEL DIAGNOSTICO Y LA LINEA BASE AMBIENTAL

Este diagnóstico en la recopilación y análisis de la información obtenida en la primera etapa identificando el área de influencia ambiental, los impactos y efectos ambientales y valorándolos de manera cualitativa y cuantitativa por medio de alguna de las metodologías establecidas para tal fin. Esta etapa permitirá definir de manera clara los programas a desarrollar en el plan de manejo.

3.4. DISEÑO DE MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

El plan de manejo ambiental se desarrollará a través de planes, los cuales contemplan medidas de prevención, mitigación, corrección, compensación y control de impactos.
Con cada uno de estos programas establecen las medidas a seguir durante el desarrollo de las diversas actividades, serán presentados a través de una serie de fichas técnicas las cuales contiene lo siguientes ítems:

- Objetivos
- Meta
- Impactos a manejar
- Tipo de medida
- Cronograma de ejecución
- Costos
- Periodo a ejecutar
- Acciones a desarrollar
- Indicador de cumplimiento

4. ALCANCE

El presente Plan de Manejo Ambiental aplica para el control y la gestión ambiental de las actividades que se desarrollen durante la ejecución del contrato "**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN, SEDE ESCUELA AGUA LINDA EN LA VEREDA AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA**".

Este es un instrumento para la toma de decisiones sobre proyectos, obras o actividades que requieren Licencia Ambiental o tramite de permisos ambientales menores para el aprovechamiento de los recursos naturales, con base en el cual se definen las correspondientes medidas de prevención, corrección, compensación y mitigación de los impactos ambientales que generará el contrato. En tal sentido, el alcance involucra:

- Delimitar las áreas de influencia directa e indirecta del proyecto, describiendo la línea base ambiental de las mismas.
- Identificar, cuantificar y evaluar los impactos ambientales generados por el proyecto, estableciendo el carácter y la magnitud de los mismos.
- Realizar las recomendaciones y ajustes a los diseños teniendo en cuenta las áreas de protección ambiental.
- Establecer los cronogramas, costos, asignación de recursos y responsabilidades de las medidas de manejo y control ambiental diseñadas.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO


5.1. LOCALIZACIÓN

Localización General: el proyecto se localiza en el área rural del Municipio de Cravo Norte, este municipio pertenece a la región Orinoquía en el Departamento de Arauca. Los límites del municipio son los siguientes:

El Municipio de Cravo Norte presenta la siguiente delimitación:


Por el norte con el municipio de Arauca
Por el sur con el Departamento de Casanare
Por el occidente con el municipio de Puerto Rondón
Por el oriente con la República Bolivariana de Venezuela

Ilustración 1 Ubicación geográfica municipio de Cravo Norte

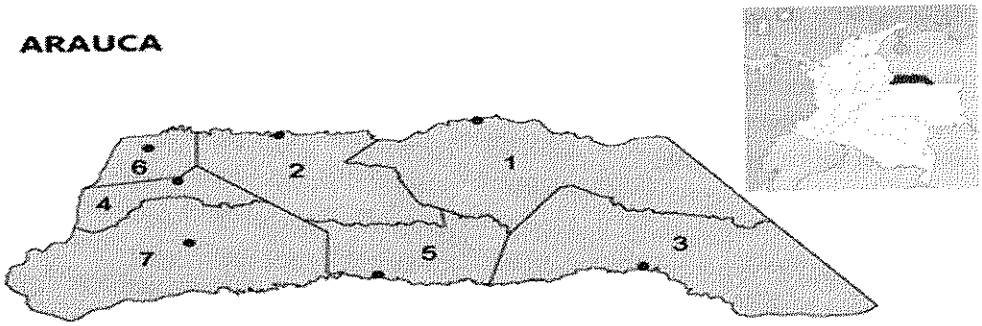

1. Arauca	2. Arauquita	3. Cravo Norte	4. Fortul	5.Puerto Rondón	6. Saravena	7. Tame

Ilustración 2 Imagen Satelital del Municipio

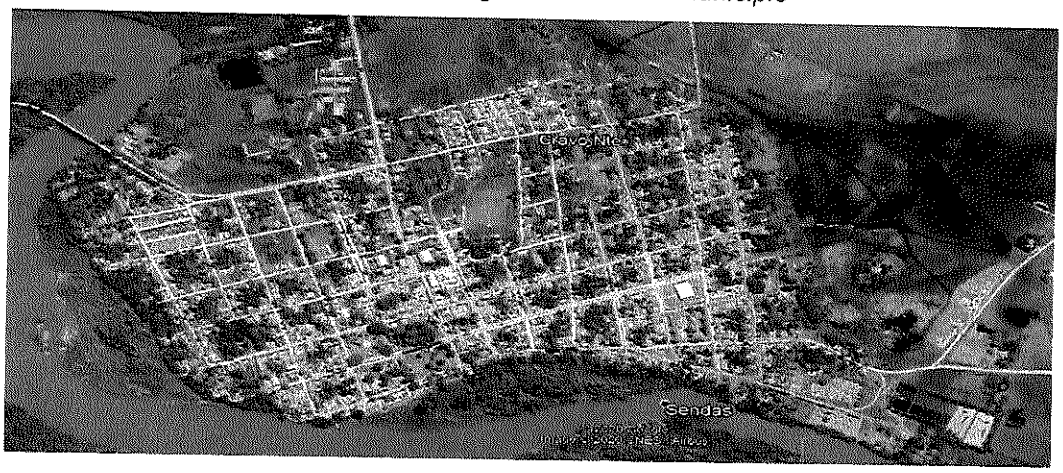

5.2. DESCRIPCIÓN GENERAL

El proyecto consiste en realizar el **"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN, SEDE ESCUELA AGUA LINDA EN LA VEREDA AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA"**, es importante resaltar que en el transcurso de todas las actividades que se ejecuten se deben cumplir con todas las normas ambientales aplicables a este tipo de proyectos.

5.3. ACTIVIDADES DE OBRA

Tabla 1 Actividades de obra

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CONDICIONES PRE-CONTRACTUALES			
		UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	**PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS**				**$ 6.080.446,99**
1.01	LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL	M2	52,40	$ 2.127,00	$ 111.454,80
1.02	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	0,48	$ 68.156,00	$ 32.919,35
1.03	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (COMPACTADO)	M3	10,51	$ 73.693,00	$ 774.366,04
1.04	DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN ADBESTO CEMENTO-FIBROCEMENTO	M2	142,80	$ 21.302,00	$ 3.041.925,60

1.05	DESMONTE COLUMNA METALICA EXISTENTE	ML	24,20	$ 30.700,00	$ 742.940,00
1.06	DESMONTE DE CORREAS METALICAS DE 3*1+1/2 PULG.	ML	112,00	$ 10.223,00	$ 1.144.976,00
1.07	DESMONTE DE VENTANA EXISTENTE	M2	7,56	$ 30.670,00	$ 231.865,20
2.00	**CIMENTACIÓN**				**$ 13.444.758,24**
2.01	SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0,05	M2	4,83	$ 97.888,00	$ 472.799,04
2.02	VIGA PERIMETRAL PLACA CIMENTAC 0.15*0.3	ML	32,20	$ 128.192,00	$ 4.127.782,40
2.03	PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.08 M.	M2	52,40	$ 168.782,00	$ 8.844.176,80
3.00	**MAMPOSTERIA Y ACABADOS**				**$ 13.551.151,86**
3.01	MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCION	M2	10,01	$ 79.021,00	$ 790.842,17
3.02	VIGA AEREA DE 0.15*0.20 M.EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO	ML	3,80	$ 138.097,00	$ 524.768,60
3.03	PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.-INCLUYE APLICACION	M2	22,02	$ 39.302,00	$ 865.272,83
3.04	PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE O ESTUCO A 3 MANOS-INCLUYE APLICACION	M2	22,02	$ 25.664,00	$ 565.018,62
3.05	ESCARIFICACION PISO EN CEMENTO	M2	62,64	$ 30.670,00	$ 1.921.168,80
3.06	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=0.02 M.-INCLUYE INSTALACION	M2	62,64	$ 40.421,00	$ 2.531.971,44
3.07	PISO EN TABLON DE GRES ARTESANAL	M2	62,64	$ 85.685,00	$ 5.367.308,40
3.08	MESON EN CONCRETO 3000 PSI 0.60 M, E=0.08 M ACABADO EN GRANITO PULIDO	ML	3,00	$ 328.267,00	$ 984.801,00
4.00	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**				**$ 4.280.316,00**
4.01	LAVAPLATOS DOBLE ACERO INOX. CON BANDEJA-INCLUYE INSTALACION	UND	1,00	$ 848.915,00	$ 848.915,00
4.02	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG.-INCLUYE INSTALACION	UND	2,00	$ 85.678,00	$ 171.356,00
4.03	PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 3 PULG.-INCLUYE INSTALACION	UND	1,00	$ 117.623,00	$ 117.623,00
4.04	TUBERIA PVC-SANITARIA 2 PULG.-INCLUYE INSTALACION	ML	12,00	$ 64.900,00	$ 778.800,00
4.05	TUBERIA PVC-SANITARIA 3 PULG.-INCLUYE INSTALACION	ML	12,00	$ 65.612,00	$ 787.344,00
4.06	PUNTO HIDRAULICO EN TUBERIA PVC RDE 13.5 315 PSI 1/2 PULG.	UND	3,00	$ 61.648,00	$ 184.944,00
4.07	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION 3/4 PULG.-INCLUYE INSTALACION	UND	1,00	$ 66.550,00	$ 66.550,00

4.08	RED DE DISTRIBUCION EN TUBERIA PVC RDE 13.5 315 PSI 1/2 PULG.	ML	8,00	$ 25.340,00	$ 202.720,00
4.09	RED DE DISTRIBUCION EN TUBERIA PVC RDE 21 200 PSI 3/4 PULG.	ML	12,00	$ 28.548,00	$ 342.576,00
4.10	LAVAMANOS BLANCO DE 1 LLAVE-INCLUYE GRIFERIA E INSTALACION	UND	1,00	$ 217.872,00	$ 217.872,00
4.11	KIT DE VALVULA SENCILLA ORINAL (Incluye suministro e instalación)	UND	1,00	$ 150.057,00	$ 150.057,00
4.12	ACCESORIOS PARA SANITARIO-INCLUYE INSTALACION	UND	4,00	$ 59.867,00	$ 239.468,00
4.13	LLAVE DE PASO DE 1/2 PULG	UND	2,00	$ 56.112,00	$ 112.224,00
4.14	LLAVE DE PASO DE 3/4 PULG	UND	1,00	$ 59.867,00	$ 59.867,00
5.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 9.257.089,05**
5.01	SALIDA PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE TIPO GFCI-SIN CABLEADO	UND	1,00	$ 375.296,00	$ 375.296,00
5.02	SALIDA PUNTO ELECTRICO ILUMINACION- SIN CABLEADO	UND	5,00	$ 409.623,00	$ 2.048.115,00
5.03	SALIDA PUNTO ELECTRICO-TOMACORRIENTE 110 V. -INCLUYE M.O. - SIN CABLEADO	UND	5,00	$ 110.803,00	$ 554.015,00
5.04	EXTRACTOR DE AIRE 14 PULG. INCLUYE INSTALACION	UND	1,00	$ 883.583,00	$ 883.583,00
5.05	ADECUACION ACOMETIDA ELECTRICA SOLAR	ML	11,15	$ 456.107,00	$ 5.085.593,05
5.06	TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS CO BRAKERS- INCLUYE INSTALACION	UND	1,00	$ 310.487,00	$ 310.487,00
6.00	**ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA**				**$ 51.872.905,77**
6.01	CORREA EN TUBO 3x1+1/2pulg. REF. CON VARILLA DE 1/2 PULG.-INCLUYE ORNAMENTACION E INSTALACION	ML	144,00	$ 136.802,00	$ 19.699.488,00
6.02	CORREA EN TUBO RECTANGULAR 3x 1+1/2pulg.INCLUYE PINTURA CONSTRUCCION E INSTALACION	ML	75,36	$ 78.377,00	$ 5.906.490,72
6.03	CUBIERTA EN LAMINA DE ZINC INDUSTRIAL ARQUITECTONICO (Incluye suministro e instalación)	M2	195,20	$ 78.360,00	$ 15.295.872,00
6.04	CABALLETE EN LAMINA DE ZINC ARQUITECTONICO INCLUYE INSTALACION	ML	16,00	$ 49.968,00	$ 799.488,00
6.05	PUERTA EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 18 CON ANTICORROSIVO Y CERRADURA-INCLUYE ORNAMENTACION E INSTALACION	M2	2,00	$ 472.739,00	$ 945.478,00
6.06	MANTENIMIENTO DE VENTANA INCLUYE INST. VIDRIO	M2	8,32	$ 187.178,00	$ 1.556.572,25

6.07	COLUMNA METALICA EN TUBERIA ESTRUCTURAL DE HIERRO CUADRADO DE 100*100 MM. Y 4 MM DE ESPESOR	ML	35,20	$ 217.884,00	$ 7.669.516,80
				SUBTOTAL DE OBRA FISICA	**$ 98.486.667,91**
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	GLB	1,00	$ 985.311,09	$ 985.311,09
				TOTAL DE LA OBRA FISICA	**$ 99.471.979,00**
				VALOR TOTAL DEL PROYECTO	**$ 99.471.979,00**

DESCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTAR:

1,00 PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

1,01 LOCALIZACION Y REPLANTEO MANUAL

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2)

Descripción. Este ítem se refiere a ubicar y marcar en el terreno o superficie de construcción los ejes principales, paralelos y perpendiculares señalados en el plano del proyecto, así como los linderos del mismo; también se referencian los niveles generales de la obra.

MATERIALES. PUNTILLA 1+ 1/2 A 3 PULG. ESTACA DE MADERA H=50CM. HILO - PITA

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor

MANO DE OBRA. OBRERO. OFICIAL

1,02 EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN

Unidad de medida: Metro cubico (M3)

Descripción. Este ítem se refiere a los movimientos de tierra mediante el proceso de excavar y retirar volúmenes de tierra manualmente u otros materiales para la conformación de espacios donde serán alojadas secciones correspondientes a sistemas sanitarios según planos de proyecto.

MATERIALES. N/A

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. OBRERO (01)

1,03 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO (COMPACTADO)

Unidad de medida: Metro cubico (M3)

Descripción. Este ítem se refiere al suministro y transporte mecánico, conformación y compactación manual por capas, de material seleccionado autorizados por la supervisión y/o interventoría para la

realización del relleno de zanjas cuyas fundaciones e instalaciones subterráneas hayan sido previamente revisadas por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES. MATERIAL COMUN

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O. RANA VIBROCOMPACTADORA 8 HP

MANO DE OBRA. OBRERO (01)

1,04 DESMONTE DE CUBIERTA EXISTENTE EN ADBESTO CEMENTO-FIBROCEMENTO

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2)

DESCRIPCIÓN. Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para desmontar todos los elementos que constituyen la cubierta como son las tejas de asbesto y/o asbesto cemento. La ejecución del ítem implica el cumplimiento estricto de la normativa para trabajos con material cancerígeno (R.D. 396/2006 o normativa local equivalente).

MATERIALES. MATERIAL COMUN

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O. ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.

MANO DE OBRA. OBRERO. OFICIAL

1,05 DESMONTE COLUMNA METALICA EXISTENTE

Unidad de medida: Metro Lineal (ML)

DESCRIPCIÓN: Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para el desmonte de columnas metálicas existentes, específicamente del perfil rectangular indicado (4" x4"), que forman parte de la estructura soporte. Incluye el desmantelamiento de todos los elementos que las constituyen: perfiles, tubos, abrazaderas, accesorios, soldaduras, anclajes y conexiones. También comprende el descuelgue, acopio temporal, cargue, retiro y disposición final de los escombros y materiales sobrantes generados durante la operación, en sitios autorizados.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O. CORTADORA DE METAL. PULIDORA.

MANO DE OBRA. SOLDADORAYUDANTE DE SOLDADURA

1,06 DESMONTE DE CORREAS METALICAS DE 3*1+1/2 PULG.

Unidad de medida: Metro Lineal (ML)

DESCRIPCIÓN. Este ítem se refiere a los trabajos necesarios para el desmonte de correas metálicas existentes, específicamente del perfil indicado (3" x 1 1/2"), que forman parte de la estructura de cubierta o soporte. Incluye el desmantelamiento de todos los elementos que las constituyen: perfiles, tubos, abrazaderas, accesorios, soldaduras, anclajes y conexiones. También comprende el descuelgue, acopio temporal, cargue, retiro y disposición final de los escombros y materiales sobrantes generados durante la operación, en sitios autorizados.

MATERIALES. N/A

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. OBRERO 2,00

1,07 DESMONTE DE VENTANA EXISTENTE

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2)

DESCRIPCIÓN. Este ítem corresponde al desmonte controlado de todos los elementos que constituyen la ventana, perfilería metálica y demás accesorios que lo constituyen. El retiro de estos elementos se realizará aplicando las mayores normas de seguridad y con el cuidado necesario para no afectar los elementos ni las instalaciones existentes en el muro. Dependiendo del estado y de la naturaleza de los elementos a desmontar, se establecerá el plan de trabajo, los medios a utilizar, el destino y la localización de los mismos para su posterior disposición. Aquellos elementos que se encuentren en buen estado y que no vayan a ser reubicados o reinstalados deberán entregarse al Contratante y/o el Interventor y/o supervisor debidamente ordenados e inventariados.

MATERIALES. N/A

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. OBRERO

2,00 CIMENTACIÓN

2,01 SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0,05

1.1. SOLADO EN CONCRETO DE 2500 PSI E=0,05

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2)

Descripción. Este ítem se refiere a la aplicación de solado (concreto pobre) en la excavación, y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir la cimentación, dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros, el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES. CONCRETO 1:2:4 (2500 PSI)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. OBRERO OFICIAL

2,02 VIGA PERIMETRAL PLACA CIMENTAC 0.15*0.3

Unidad de medida: Metro lineal (ML)

Descripción. Este ítem se refiere a elaboración de las vigas que enlazan las columnas a nivel de cimentación. En el caso de cimentación en concreto ciclópeo, las vigas se ubican sobre el cimiento y se construyen en concreto y se refuerzan con el hierro indicado en los planos estructurales de cimentación.

Dirección: Carrera 4 NO. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

MATERIALES. CONCRETO 1:2:3 (3000 PSI). VARILLA DE 1/4 A 3/8, 37000 PSI

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O. VIBRADOR ELECTRICO. FORMALETA METALICA DE 1*0.25

MANO DE OBRA. OFI CIAL (01). OBRERO (01)

2,03 PLACA DE PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA ANDEN E=0.08 M.

Unidad de medida: Metro cuadrado (M2)

Descripción. Este ítem se refiere a la aplicación de concreto de 3000 PSI con espesor de 8 cm que se utiliza sobre la rasante para su nivelación y preparación de superficies para su posible revestimiento cerámico o de madera que dará la terminación del piso, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES.

- FORMALETA DE MADERA 3 USOS
- MALLA ELECTROSOLDADA 5MM 15*15
- CONCRETO 1:2:3 (3000 PSI)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O. VIBRADOR ELECTRICO.

MANO DE OBRA. OFCIAL (01). OBRERO (02)

3,00 MAMPOSTERIA Y ACABADOS

3,01 MURO EN BLOQUE Nº 5 - E=0.10 M.-INCLUYE CONSTRUCCION

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2)

Descripción. Este ítem se refiere a la construcción o levantar muros a base de bloque No. 5 cocinado. Actualmente se unen utilizando un mortero de cemento y arena con un poco de agua, en las proporciones adecuadas.

MATERIALES. BLOQUE NUMERO 5. MORTERO 1:4

EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor 10% M.O
- ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.

MANO DE OBRA. OFCIAL (01). OBRERO (01)

3,02 VIGA AEREA DE 0.15*0.20 M.EN CONCRETO 3000 PSI REFORZADO

Unidad de medida: Metro lineal (ML)

Descripción. Este ítem se refiere a elaboración de las vigas que enlazan las columnas a nivel de cimentación y estructural. En el caso de cimentación en concreto ciclópeo, las columnas deben llevar zapatas y se ubican sobre el cimiento y se construyen en concreto y se refuerzan con el hierro indicado en los planos estructurales de cimentación.

MATERIALES.

- FORMALETA DE MADERA 3 USOS

- VARILLA DE 1/4 A 3/8, 37000 PSI
- ACERO DE REFUERZO GRADO 60.000 PSI (FY=4200 KG/CM2)
- CONCRETO 1:2:3 (3000 PSI)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor 10% M.O
- ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.
- VIBRADOR ELECTRICO.

MANO DE OBRA. OFCIAL (01). OBRERO (02)

3,03 PAÑETE LISO SOBRE MURO MORTERO 1:4 E=0.02 M.-INCLUYE APLICACION

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2)

Descripción. Este ítem se refiere a la aplicación del acabado liso sobre las superficies de mampostería con una o varias capas de mezcla de arena lavada fina y cemento, llamada mortero, y cuyo fin es el de emparejar la superficie que va a recibir un tipo de acabado tal como pinturas, forros entre otras; dándole así mayor resistencia y estabilidad a los muros. Este proceso también es llamado revoque o repello el cual incluye materiales, equipo y retiro de residuos generados, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES. MORTERO 1:4

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

TRANSPORTE. N.A

MANO DE OBRA. OBRERO (01). OFICIAL (01)

3,04 PINTURA EN VINILO SOBRE PAÑETE O ESTUCO A 3 MANOS-INCLUYE APLICACION

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2)

Descripción. Este ítem se refiere a la aplicación de un acabado en pintura sobre el pañete, para dar una mejor terminación y apariencia a las paredes, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES. PINTURA VINILO TIPO 1.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. OBRERO (01). OFICIAL (01).

3,05 ESCARIFICACION PISO EN CEMENTO

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2)

Descripción. Este ítem se refiere a la demolición o escarificación sobre el piso en concreto para su posterior nivelación y preparación de superficies para su posible revestimiento cerámico o de madera que dará la terminación del piso, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría.

Dirección: Carrera 4 N0. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

MATERIALES. N/A

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. OBRERO (02)

3,06 ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E=0.02 M.-INCLUYE INSTALACION

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2)

Descripción. Este ítem se refiere a la aplicación de mortero que se utiliza sobre el piso para su nivelación y preparación de superficies para su posible revestimiento cerámico o de madera que dará la terminación del piso, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES. MORTERO 1:3

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. OBRERO (02). OFICIAL (01)

3,07 PISO EN TABLON DE GRES ARTESANAL

Unidad de medida: Metro cuadrado (m2)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación del revestimiento en tablón de gres sobre el piso previamente prealistado y afinado a nivel, la instalación de esta cerámica permite la terminación del piso obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la supervisión y/o interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría..

MATERIALES.

- TABLON DE GRES LISO VITRIFICADO
- ESTOPA BLANCA PARA LIMPEZA
- MORTERO 1:3

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. OBRERO (01). OFICIAL (01).

3,08 MESON EN CONCRETO 3000 PSI 0.60 M, E=0.08 M ACABADO EN GRANITO PULIDO

Unidad de medida: Metro lineal (ML)

Descripción. Este ítem se refiere a elaboración de mesón en concreto de 3000 PSI con espesor de 8 cm con acabado en granito pulido a nivel de uso. Se debe incrustar a los muros existentes se construyen en concreto y se refuerzan con el hierro adecuado.

MATERIALES.

- FORMALETA DE MADERA 3 USOS
- GRANITO GRIS
- CEMENTO BLANCO
- ESTOPA BLANCA PARA LIMPEZA
- ALAMBRE NEGRO #18 PAZ DE RIO-CAL.17

- ACERO DE REFUERZO GRADO 60.000 PSI (FY=4200 KG/CM2)
- CERA LIQUIDA PARA PISOS
- CONCRETO 1:2:3 (3000 PSI)

EQUIPO Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor 10% M.O
- PULIDORA MANUAL DE GRANITO

MANO DE OBRA. OFCIAL (01). OBRERO (01)

4,00 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

4,01 LAVAPLATOS DOBLE ACERO INOX. CON BANDEJA-INCLUYE INSTALACION

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación de lavaplatos doble acero inoxidable con bandeja incluyendo accesorios, grifería, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría.

MATERIALES.
- SIFON EN P GRIVAL
- LAVAPLATOS EN ACERO INOX. DOBLE POCE.80*43 +CANASTILLA+SIFON DOBLE+ESCURRIDOR
- GRIFERIA PARA LAVAPLATOS MONOCONTROL CROMO

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. FONTANERO (01). AYUDANTE DE FONTANERIA (01).

4,02 PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 2 PULG.-INCLUYE INSTALACION

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación de punto sanitario incluyendo accesorios y tuberías. Estas instalaciones se hará de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría.; el montaje de punto sanitario se harán con tubería sanitaria de 2".

MATERIALES.
- TUBERIA PVC SANITARIA 2 PULG.
- CODO 90° CXE PVC SANIT. 2 PULG.
- LIMPIADOR REMOVEDOR
- SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. FONTANERO (01). AYUDANTE DE FONTANERIA (02)

4,03 PUNTO SANITARIO TUBERIA PVC 3 PULG.-INCLUYE INSTALACION

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación de punto sanitario incluyendo accesorios y tuberías. Estas instalaciones se hará de acuerdo con los planos hidrosanitarios y a los detalles arquitectónicos; el montaje de punto sanitario se harán con tubería sanitaria de 3".

MATERIALES.

- TUBERIA PVC SANITARIA 3 PULG.
- CODO 90° CXC PVC SANIT. 3 PULG.
- LIMPIADOR REMOVEDOR
- SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN..

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. FONTANERO (01). AYUDANTE DE FONTANERIA (02).

4,04 TUBERIA PVC-SANITARIA 2 PULG.-INCLUYE INSTALACION

Unidad de medida: Metro Lineal (ML)

Descripción. Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC sanitaria de diámetros 2" indicados en los planos para la correspondiente salida de aguas negras, incluye accesorios, zanjado y relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría.

MATERIALES.

- SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.
- TUBERIA PVC SANITARIA 2 PULG.
- UNIÓN DE PRESIÓN PVC DE 2 PULG DE SOLDAR

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. FONTANERO (01). AYUDANTE DE FONTANERIA (02).

4,05 TUBERIA PVC-SANITARIA 3 PULG.-INCLUYE INSTALACION

Unidad de medida: Metro Lineal (ML)

Descripción. Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC sanitaria de diámetros 3" indicados en los planos para la correspondiente salida de aguas negras, incluye accesorios, zanjado y relleno conveniente para la implementación de la tubería, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría.

MATERIALES.

- TUBERIA PVC SANITARIA 3 PULG.
- UNION PVC SANITARIA DE 3 PULG.
- LIMPIADOR REMOVEDOR
- SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. FONTANERO (01). AYUDANTE DE FONTANERIA (02).

4,06 PUNTO HIDRAULICO EN TUBERIA PVC RDE 13.5 315 PSI 1/2 PULG.

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación de punto hidráulico incluyendo accesorios y tuberías. Estas instalaciones se hará de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las

especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría; el montaje de punto hidráulico se harán con tubería potable de 1/2".

MATERIALES.
- TUBERIA PVC RDE 13.5-315 PSI 1/2 PULG.
- ADAPTADOR MACHO PVC 1/2 PULG.
- CODO 90° PVC PRESION 1/2 PULG.
- LIMPIADOR REMOVEDOR
- SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. AYUDANTE DE FONTANERIA. FONTANERO.

4,07 PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION 3/4 PULG.-INCLUYE INSTALACION

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación de punto hidráulico incluyendo accesorios y tuberías. Estas instalaciones se harán de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría; el montaje de punto hidráulico se hará con tubería potable de 3/4".

MATERIALES.
- TUBERIA PVC RDE 21-200 PSI 3/4 PULG. EXT. LISO
- CODO 90° PVC PRESION 3/4 PULG.
- ADAPTADOR HEMBRA PVC DE 3/4 PULG.
- LIMPIADOR REMOVEDOR
- SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN..

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. AYUDANTE DE FONTANERIA. FONTANERO

4,08 RED DE DISTRIBUCION EN TUBERIA PVC RDE 13.5 315 PSI 1/2 PULG.

Unidad de medida: Metro Lineal (ML)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación de red de suministro CPVC RDE 13.5 315 PSI incluyendo accesorios y tuberías. Estas instalaciones se harán de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría; el montaje de punto hidráulico se hará con tubería potable de 1/2".

MATERIALES.
- TUBERIA PVC RDE 13.5-315 PSI 1/2 PULG.
- UNION PVC DE PRESION DE 1/2 PULG.DE SOLDAR
- LIMPIADOR REMOVEDOR
- SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN..

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. FONTANERO (01). AYUDANTE DE FONTANERIA (01)

4,09 RED DE DISTRIBUCION EN TUBERIA PVC RDE 21 200 PSI 3/4 PULG.

Unidad de medida: Metro Lineal (ML)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación de red de suministro CPVC RDE 21 200 PSI incluyendo accesorios y tuberías. Estas instalaciones se harán de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría; el montaje de punto hidráulico se hará con tubería potable de 3/4".

MATERIALES.

- CODO 90° PVC PRESION 3/4 PULG.
- UNION PVC DE PRESION DE 3/4 PULG.DE SOLDAR
- SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.
- TUBERIA PVC RDE 21-200 PSI 3/4 PULG. EXT. LISO
- LIMPIADOR REMOVEDOR.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. FONTANERO (01). AYUDANTE DE FONTANERIA (01)

4,10 LAVAMANOS BLANCO DE 1 LLAVE-INCLUYE GRIFERIA E INSTALACION

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación y suministro de lavamanos incluyendo accesorios, grifería, tuberías de conexión y desagüe. Estas instalaciones se harán de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría; el montaje de lavamanos se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2".

MATERIALES. LAVAMANOS BLANCO 1 LLAVE DE COLGAR. GRIFERIA LAVAMANOS BLANCO UNA LLAVE

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. OBRERO. OFICIAL ESPECIALIZADO

4,11 KIT DE VALVULA SENCILLA ORINAL (Incluye suministro e instalación)

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación de kit de válvula sencilla para orinal incluyendo accesorios. Estas instalaciones se harán de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría; el montaje de sanitarios se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2".

MATERIALES. KIT DE VALVULA SENCILLA ORINAL

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. AYUDANTE DE FONTANERIA. OFICIAL ESPECIALIZADO

4,12 ACCESORIOS PARA SANITARIO-INCLUYE INSTALACION

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación de accesorios para sanitario incluyendo accesorios. Estas instalaciones se harán de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría; el montaje de sanitarios se hará con acoflex de doble tuerca y con válvula de regulación rosca hembra de 1/2".

MATERIALES. ACCESORIOS PARA SANITARIO

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. AYUDANTE DE FONTANERIA. OFICIAL ESPECIALIZADO

4,13 LLAVE DE PASO DE 1/2 PULG

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación de llave de paso de 1/2 pulgada incluyendo accesorios y tuberías. Estas instalaciones se hará de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría; el montaje de punto hidráulico se harán con tubería potable de 1/2".

MATERIALES.

- LLAVE DE PASO LISA 1/2 PULG.
- LIMPIADOR REMOVEDOR
- SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. AYUDANTE DE FONTANERIA. FONTANERO

4,14 LLAVE DE PASO DE 3/4 PULG

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación de llave de paso de 3/4 pulgada incluyendo accesorios y tuberías. Estas instalaciones se hará de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la supervisión y/o Interventoría; el montaje de punto hidráulico se harán con tubería potable de 3/4".

MATERIALES.

- LLAVE DE PASO LISA 3/4 PULG.
- LIMPIADOR REMOVEDOR
- SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. AYUDANTE DE FONTANERIA. FONTANERO

5,00 INSTALACIONES ELECTRICAS

5,01 SALIDA PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE TIPO GFCI-SIN CABLEADO

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico o energético tipo GFCI sin cableado, que posteriormente llevara una toma eléctrica doble o sencilla, o un interruptor eléctrico instalado, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES.

- TUBERIA CONDUIT PVC 1/2 PULG.TIPO L.
- CAJA DE 4*2 GALVANIZADA

- BOQUILLA 1/2 PULG. + TUERCA
- CURVA CONDUIT PVC 1/2 PULG.CXE 90
- TOMACORRIENTE DOBLE TIPO GFCI CON POLO A TIERRA 125V-20A.CLICKME BLANCO CON TAPA INCLUIDA
- SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.
- MORTERO 1:4°

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. AYUDANTE DE ELECTRICIDAD (01). TECNICO ELECTRICISTA (01).

5,02 SALIDA PUNTO ELECTRICO ILUMINACION- SIN CABLEADO

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico o energético sin cableado, que posteriormente llevara una toma eléctrica doble o sencilla, o un interruptor eléctrico instalado, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES.

- TUBERIA CONDUIT PVC 3/4 PULG.TIPO L.
- PLAFON DE PORCELANA
- CAJA DE 4*2 GALVANIZADA
- CAJA OCTAGONAL GALVANIZADA
- INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO
- ABRAZADERA 1/2 PULG. DOBLE ALA
- TERMINAL CONDUIT PVC 3/4 PULG.
- CURVA CONDUIT PVC 3/4 PULG.CXE 90°
- SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4 GLN.
- MORTERO 1:4

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. AYUDANTE DE ELECTRICIDAD (02). TECNICO ELECTRICISTA (01).

5,03 SALIDA PUNTO ELECTRICO-TOMACORRIENTE 110 V. -INCLUYE M.O. - SIN CABLEADO

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere al suministro e instalación de los elementos necesarios para alistar un punto eléctrico o energético sin cableado, que posteriormente llevara una toma eléctrica doble o sencilla, o un interruptor eléctrico instalado, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES.

- CAJA DE 4*2 GALVANIZADA
- CURVA CONDUIT PVC 1/2 PULG.CXE 90
- TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA
- ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT PVC DE 1/2
- TUBERIA CONDUIT PVC 1/2 PULG.TIPO L.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. AYUDANTE DE ELECTRICIDAD (01). TECNICO ELECTRICISTA (01).

5,04 EXTRACTOR DE AIRE 14 PULG. INCLUYE INSTALACION

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere al suministro e instalación de extractor de aire de 14 pulgadas de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES. EXTRACTOR DE AIRE 14 PULG. ASPA METAL. Y PROTECTOR.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. OBRERO. OFICIAL ESPECIALIZADO

5,05 ADECUACION ACOMETIDA ELECTRICA SOLAR

Unidad de medida: Metro Lineal (ML)

Descripción. Este ítem se refiere a la adecuación de la acometida de la red eléctrica solar que posteriormente llevara unas instalaciones eléctricas, de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES. N/A

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. AYUDANTE DE ELECTRICIDAD (03). TECNICO ELECTRICISTA (01).

5,06 TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS CO BRAKERS- INCLUYE INSTALACION

Unidad de medida: Unidad (Und)

Descripción. Este ítem se refiere al suministro e instalación de tablero monofásico necesarios para el control de energía en una edificación, todos los elementos a instalar deben cumplir con la norma RETIE y de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES.

- AUTOMATICO 20 A.
- TABLERO DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICO 4 CIRCUITOS

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. AYUDANTE DE ELECTRICIDAD (01). TECNICO ELECTRICISTA (01).

6,00 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA

6,01 CORREA EN TUBO 3x1+1/2pulg. REF. CON VARILLA DE 1/2 PULG.-INCLUYE ORNAMENTACION E INSTALACION

Unidad de medida: Metro Lineal (ML)

Descripción. Este ítem se refiere a la construcción de la estructura para cubierta con correas de acero y reforzada con varilla grado 60.000 psi, que soportara las fuerzas ejercidas por la cubierta y las producidas por vientos o terremotos. Estas correas deberán ir muy bien anclados o soldados para el óptimo funcionamiento de la estructura.

MATERIALES.

- TUBERIA RECTANGULAR DE 3X1+1/2 PULG.CAL.18(76*38*2MM.) ESTRUCTURAL HR50
- SOLDADURA 6013X1/8 PULG.
- ACERO DE REFUERZO GRADO 60.000 PSI (FY=4200 KG/CM2)
- ANTICORROSIVO GRIS
- LIJA

EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor 10% M.O
- ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.
- EQUIPO DE SOLDADURA

MANO DE OBRA. OBRERO. SOLDADOR.

6,02 CORREA EN TUBO RECTANGULAR 3x 1+1/2pulg.INCLUYE PINTURA CONSTRUCCION E INSTALACION

Unidad de medida: Metro Lineal (ML)

Descripción. Este ítem se refiere a la construcción de la estructura para cubierta con correas de acero, que soportara las fuerzas ejercidas por la cubierta y las producidas por vientos o terremotos. Estas correas deberán ir muy bien anclados o soldados para el óptimo funcionamiento de la estructura.

MATERIALES.

- TUBERIA RECTANGULAR DE 3X1+1/2 PULG.CAL.18(76*38*2MM.) ESTRUCTURAL HR50
- SOLDADURA 6013X1/8 PULG.
- ACERO DE REFUERZO GRADO 60.000 PSI (FY=4200 KG/CM2)
- ANTICORROSIVO GRIS
- LIJA

EQUIPO Y HERRAMIENTAS.

- Herramienta menor 10% M.O
- ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.
- EQUIPO DE SOLDADURA

MANO DE OBRA. OBRERO. SOLDADOR.

6,03 CUBIERTA EN LAMINA DE ZINC INDUSTRIAL ARQUITECTONICO (Incluye suministro e instalación)

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2)

Descripción. Este ítem se refiere al suministro e instalación de cubierta en lámina de zinc industrial arquitectónico para el cubrimiento de la parte superior de la edificación a la que previamente se le ha realizado una estructura para la colocación de la cubierta, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes

de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

MATERIALES.
- TEJA DE ZINC ARQUITECTÓNICO GALVANIZADO (G60) CAL.30-A=0.73 M.
- AMARRE DE TUERCA

EQUIPO Y HERRAMIENTAS.
- Herramienta menor 10% M.O
- ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.

MANO DE OBRA. OFICIAL (01). OBRERO (02)

6,04 CABALLETE EN LAMINA DE ZINC ARQUITECTONICO INCLUYE INSTALACION

Unidad de medida: Metro Lineal (ML)

Descripción. Este ítem se refiere al suministro e instalación de caballete en lámina de zinc industrial arquitectónico para el cubrimiento de la parte superior de la edificación a la que previamente se le ha realizado una estructura para la colocación de la cubierta, estas instalaciones deben ejecutarse con las normas de seguridad en alturas, tomando las precauciones necesarias para evitar accidentes de los trabajadores o terceras personas, y daños a las obras que se construyen en propiedades vecinas.

MATERIALES.
- TEJA DE ZINC ARQUITECTÓNICO GALVANIZADO (G60) CAL.30-A=0.73 M.
- AMARRE DE TUERCA

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O. ANDAMIO TUBULAR SECC. 1.50X1.50X2.20 M.

MANO DE OBRA. OFICIAL (01). OBRERO (02)

6,05 PUERTA EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 18 CON ANTICORROSIVO Y CERRADURA-INCLUYE ORNAMENTACION E INSTALACION

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2)

Descripción. Este ítem se refiere a la instalación de puertas en lámina cold rolled calibre 18 de acero en los vanos dispuestos en la construcción de muros para la posterior colocación de puertas, esto con el fin cerrar recintos cuando se es deseado, Estas instalaciones se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES.
- PUERTA EN LAMINA DOBLADA CALIBRE 18 E=0.10 INCLUYE MARCO
- CHAPA PARA PUERTA METALICA
- MORTERO 1:4

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O

MANO DE OBRA. OBRERO. OFICIAL.

6,06 MANTENIMIENTO DE VENTANA INCLUYE INST. VIDRIO

Unidad de medida: Metros cuadrados (M2)

Descripción. Este ítem se refiere al mantenimiento de la ventana incluye la instalación de vidrio y manijas en los vanos dispuestos en la construcción de muros para la posterior colocación de ventana, esto con el fin cerrar recintos cuando se es deseado, Estas instalaciones se hará de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la supervisión y/o interventoría.

MATERIALES.

- SOLDADURA 6013X1/8 PULG.
- DISOLVENTE THINNER
- PINTURA ESMALTE LINEA CLASICA
- LIJA
- ANTICORROSIVO GRIS
- SILICONA
- VIDRIO LISO BLANCO 4 M M.
- MANIJA DE VENTANA ROJA

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O. EQUIPO DE SOLDADURA. COMPRESOR ATLAS COPCO.

MANO DE OBRA. AYUDANTE DE SOLDADURA. SOLDADOR. VIDRIERO.

6,07 COLUMNA METALICA EN TUBERIA ESTRUCTURAL DE HIERRO CUADRADO DE 100*100 MM. Y 4 MM DE ESPESOR

Unidad de medida: Metro Lineal (ML)

Descripción. Este ítem se refiere a la construcción de la estructura para soporte con tubería de acero, que soportara las fuerzas ejercidas por la cubierta y las producidas por vientos o terremotos. Estas columnas deberán ir muy bien anclados o soldados para el óptimo funcionamiento de la estructura

MATERIALES.

- TUBERIA METALICA CUADRADO ESTRUCTURAL DE 100*100 MM*4 MM.
- VARILLA DE 1/2
- SOLDADURA 6013X1/8 PULG.
- ANTICORROSIVO GRIS
- DISOLVENTE THINNER
- LIJA
- ESMALTE SUPER SINTETICO

EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Herramienta menor 10% M.O. EQUIPO DE SOLDADURA.

MANO DE OBRA. SOLDADOR. OFICIAL. OBRERO.

MITIGACIÓN AMBIENTAL

6. LINEA BASE

6.1. COMPONENTE FISICO

- **Climatología:** La incidencia climatológica del Municipio de Cravo Norte pertenece al tipo AW, o sea clima de sabana con lluvias cenitales periódicas, según Whilheim Koppen. En el Municipio se presenta un clima tropical, con un régimen de lluvias denominado monomodal,

con dos períodos bien definidos durante el año, uno de lluvias entre abril y octubre y otro de sequía entre noviembre y marzo. En el área de estudio no se encuentran estaciones climatológicas para la toma de datos. Predomina un clima seco. Para estos aspectos físicos se tomaron como referencia el EOT y POMCA del rio Cravo Norte.

- **Precipitación**: La pluviosidad es de 1.532 mm anual, con mayores precipitaciones entre abril y agosto cuando llueven 269 mm. En la época seca del mes de enero se tiene una mínima de lluvias de 7.8 mm. Zona de vida. Según el estudio de Bosques de Colombia, la zona de vida para el municipio de Cravo Norte corresponde a la clasificación Bs-T "Bosque seco Tropical". Precipitación promedio anual 1532 mm.

- **Temperatura:** La distribución de la temperatura varía de acuerdo a las estaciones invierno – verano, los meses con valores máximos coinciden con la época seca, los cuales se presentan de diciembre a marzo y los valores de mínimas temperaturas se presentan en la época húmeda. La temperatura media mensual promedio es de 25.9 oC.

- **Humedad Relativa:** La humedad relativa en el Municipio de Cravo Norte, presenta un comportamiento relativamente homogéneo con alguna variación tendiente a la disminución en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, en época seca, cuando las altas temperaturas y las bajas precipitaciones coinciden. El mayor valor de humedad relativa se registra en los meses de julio a agosto mientras que el valor mínimo se registra en enero y febrero. El valor promedio de humedad relativa en la zona es de 77 %.

- **Balance Hídrico:** En el Municipio se presenta una estacionalidad hídrica en la que entre los meses de abril a noviembre hay exceso de agua, la cual se pierde por escorrentía, infiltración y otra parte permanece en forma de lámina sobre la superficie anegando completamente la sabana. En el mes de diciembre la evaporación es mayor a la precipitación, pero no se presenta déficit porque existe buena cantidad de agua almacenada en el suelo, que sirve de sustento de la flora durante el período seco.

- **Hidrografía:** Los principales ríos que irrigan el Municipio nacen en las estribaciones de la Sierra Nevada del Cocuy en la cordillera oriental y son: El Casanare, Cravo Norte, Ele y Cinaruco, que nace en los raudales del Agua Limón y la Erica. También se destaca el río Meta sobre el extremo suroriental del municipio, marcando el límite entre los Departamentos de Arauca y Vichada. Lagunas como: Samuco, Cinaruquito, Juriepe, Feletera, Aeropuerto, Mochuelo y caños como: Samuco, Cinaruquito, Juriepe, Juriepito, Los Manantiales, Cumare y Caño El Medio, entre otros.

  El Municipio de Cravo Norte posee un gran potencial hídrico con influencia de las cuencas de los ríos Casanare, Limón y Caño Negro. El Caño El Medio enriquece las aguas del Rio Cravo, que a su vez toma las aguas del Caño Cumare y es tributario del Casanare. Dada su gran importancia para el transporte, es necesario establecer convenios con el Departamento del Casanare para su protección y conservación.

  La cuenca del Rio Limón y Caño Negro tiene influencia directa sobre los Municipios de Arauca, Arauquita, Cravo Norte y Fortul; donde el complejo petrolero de Caño Limón, la construcción de vías y la actividad colonizadora ha alterado y modificado la cuenca hasta tal punto que hay que definir nuevos límites por la dinámica introducida de la acción antrópica.

El río Limón y Caño Negro sirven de regulación entre las dos grandes cuencas la del Arauca y la del Casanare. El complejo Caño Limón construyó sus instalaciones en el área de la Laguna del Lipa, taponando el curso del río Bayonero y Caño Limón ocasionando la destrucción de la laguna y pérdida de la biodiversidad, problema que ha influido directamente sobre el Rio Cravo Norte por la reducción del caudal hídrico.

- **Geología:** De acuerdo con el estudio de Ingeominas de 1997 y de lo plasmado en el POMCA del rio Cravo Norte, la zona de interés, se encuentra dentro de la provincia fisiográfica de la Megacuenca de Sedimentación de los Llanos Orientales y en esta se incluye la subprovincia de la Llanura Aluvial.

  La subprovincia de los Llanos Orientales en la cuenca del río Cravo Norte, se extiende desde una altura de 225 m.s.n.m en el Piedemonte Llanero hasta la desembocadura en el río Casanare, a una altura de 94 m.s.n.m. aproximadamente. Está conformada por depósitos continentales acumulados desde el Holoceno hasta la actualidad, como resultado de la actividad erosiva–deposicional desde el levantamiento de la Cordillera Oriental.

- **Geomorfología:** La zona que comprende el municipio de Cravo norte, corresponde a las unidades morfoestructurales denominadas Llanura Aluvial de desborde y Valles Aluviales.

Tabla 2 Sistema jerarquizado de análisis fisiográfico para la zona del Municipio de Cravo Norte

PROVINCIA FISIOGRÁFICA	SUBPROVINCIA FISIOGRÁFICA	GRAN PAISAJE	PAISAJE	SUBPAISAJE	UNIDAD GEOMORFOLÓGICA
MEGACUENCA DE SEDIMENTACIÓN DE LA ORINOQUÍA	Llanura aluvial	Planicie aluvial de desborde	Llanura de Inundación	Basínes	Ba
				Diques o albardones	Da
				Orillares	Or
				Meandros abandonados	Ma
				Cauces abandonados	Ca
		Llanura eólica	Plano eólico	Dunas o médanos	Em
				Escarceos	Ee

Fuente: Pomca Cravo Norte

Llanura Aluvial de Desborde. Este paisaje de relieve plano está constituido por los sedimentos blandos de origen cluvio-deltáico (arcilla, arenas y limos), del Pleistoceno y Holoceno, provenientes de la cordillera y depósitos en una extensión cuenca de relleno progresivo.

Dirección: Carrera 4 NO. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

Plano Aluvial con cobertura Eólica Localizada. Comprende aproximadamente 115.200 Has, un 19.5% de la superficie total del municipio, conformada por materiales de origen fluvial, dando origen a diques, bancos y napas de desborde con presencia de zurales, caños y bajos.

Esta zona geomorfológica ubicada hacia el oriente tiene como eje central hídrico el río Cinaruco, en el cual depositan las aguas los ríos Juriepe, Los Araguatos, Las Matas y Caño Mocho. Presenta características de suelos inundables exceptuando las áreas próximas a los caños. Las partes bajas absorben y filtran el agua mientras que las partes altas no se inundan porque tiene buen drenaje. Las inundaciones se presentan por niveles freáticos altos.

Plano Aluvial con cobertura Eólica Generalizada. Es el tipo de relieve más generalizado en el Municipio con una extensión de 433.239 Has aproximadamente, correspondiente al 73.5% de la superficie total. Forma un plano afectado por procesos eólicos, limos y arenas de 40 a 80 cm de espesor que han recubierto los aluviones finos, caracterizada por la secuencia de esteros y caños.

Médanos o Dunas. Constituidos por espesos mantos eólicos de arena (20 a 40 mts de altura) cubiertos por sabanas naturales y en algunas zonas por relictos de bosque, con pendientes del 3 hasta el 12% y un área de 11.700 Has aproximadamente que corresponde a un 5% de la superficie total.

Valles Aluviales. Es el tipo de paisaje menos extenso 2% de la superficie total, localizado a lo largo de los principales ríos, formando un complejo de orillares y napas como resultado de los frecuentes cambios en el curso de los ríos, tal como ocurre con los ríos Arauca y Casanare que se desbordan en época de invierno cambiando su curso e inundando grandes áreas.

COMPONENTE BIOTICO

Flora

El municipio de Cravo Norte por sus características térmicas y climáticas presentan un conjunto innumerable de especies faunísticas, de origen Orinocense y andino, con presencia de amazónico debido a la existencia de corredores biogeográficos como bosques de galería, Matorrales en la región de sabana y bosques protectores.

Cuenta con especies maderables predominantes en la región que son requeridas para suplir la demanda local y se utilizan para el levantamiento y mantenimiento de corrales, cercas, potreros, depósitos, etc. Según su uso podemos mencionar algunas especies de mayor relevancia tales como el congrio, flor amarillo, cañafístola, aceite, zaque - zaque, algarrobo, guarataro, trompillo, laurel, candalai, vara blanca y anoncillo.

Fauna

Las propiedades de los suelos, la caracterización de los ríos y demás sistemas naturales del Municipio de Cravo Norte, albergan especies tales como el chigüiro, patos, cachicamos, venados, lapas, babillas, galápagos, reptiles y aves sobresalientes en el medio como las conocidas con los nombre de turpial, azulejos, pajuil, guacamaya roja y azul, loro real, caricare, el chiriguare, lechuza, el cardenal, el cascabelito, paloma, perdiz, gallito de raudal, arrocerito, chupa flor, mirla blanca, arrendajo, torito, etc.

COMPONENTE SOCIO-ECONOMICO

División Político-Administrativa

Dirección: Carrera 4 N0. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

En el área rural está compuesta por dieciocho (18) veredas, que se describen en la siguiente tabla al igual que código de identificación.

Tabla 3. Veredas Municipio de Cravo Norte

CÓDIGO DE LA VEREDA	NOMBRE DE LA VEREDA
81220001	Samuco
81220002	El Aeropuerto
81220004	San José
81220005	Agualinda
81220006	Los Caballos
81220007	Campo Abierto
81220008	Cumare
81220009	Veladero
81220010	San Rafael
81220011	Los Laureles
81220012	El Corozo
81220013	Buenos Aires
81220014	Los Pasados
81220015	Cinaruco
81220016	Juriepe
81220017	Lejanías de Juriepe
81220018	La Esperanza
81220019	Santa María la Virgen

Fuente: EOT Cravo Norte

El área rural está compuesta por siete (7) barrios, conocidos con los nombres de: El Progreso, el Centro, el 20 de julio, el Triunfo, el Estero, Villa Llano y la Unión.

Población

Dirección: Carrera 4 NO. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

La población del municipio de Cravo Norte según decreto de categorización para el año 2021 es de 4.042 habitantes, los cuales se distribuyen en 2.813 habitantes en el área rural y 1229 habitantes en el área rural.

Servicios públicos

Acueducto

Este servicio lo presta la empresa EL JAGUEY E.S.P, el agua es captada del rio Cravo Norte a través de una barcaza, de allí es bombeada a la planta de tratamiento de agua potable PTAP, que es de tipo convencional y se compone de los siguientes procesos; floculación, sedimentación, filtración y desinfección, una vez tratada, esta es transportada al tanque de almacenamiento para su posterior distribución, a la población del casco urbano. La cobertura en el área rural es del 98%; mientras que en el área rural no existen redes de acueducto, por lo tanto, son utilizados sistemas alternos como pozos profundos "puntillos" y filtros para el tratamiento de estas.

Alcantarillado

Este servicio es operado por la empresa El Jagüey, para el tratamiento de las aguas residuales, se cuenta con un sistema compuesto por la red sanitaria, estaciones de bombeo, y el sistema de tratamiento el cual tiene las siguientes estructuras; Cámara de llegada, desarenadores, canaleta parshall, laguna anaerobia, facultativa y maduración, el vertimiento de las aguas ya tratadas son vertidas al rio Casanare. El servicio de alcantarillado tiene una cobertura en el área rural del 90 %, en el área rural se cuenta con sistemas alternos como pozos sépticos.

Aseo.

Para este componente el Municipio cuenta con un carro compactador, para la recolección de los residuos sólidos, y para su disposición final se cuenta con el relleno sanitario el samuco, operado por la empresa EL JAGUEY, en el casco urbano se cuenta con una cobertura del 90% y en área rural no se presta el servicio, allí los residuos son dispuestos al aire libre, quemados o enterrados.

Vías de comunicación

Aéreas:

Actualmente no existe una ruta constante, pero se cuenta con un aeropuerto habilitado por la Aero civil. Se cuenta con servicio expreso desde la ciudad de Arauca y Yopal

Terrestres:

La ruta Cravo Norte – Arauca es la vía principal, con extensión de 142 kilómetros, la cual está construida a nivel de terraplén y parcialmente a nivel granular. Actualmente, el municipio cuenta con una (1) línea de buseta intermunicipal, que presta el servicio de transporte de personas y carga, con una ruta diaria en temporada de invierno y dos rutas en temporada de verano.

La carretera Cravo Norte – Puerto Rondón con extensión de 130 kilómetros la cual se halla construida parcialmente a nivel de terraplén, sólo transitable en época de verano.

Dirección: Carrera 4 NO. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

Las vías rurales son en algunas veredas inexistentes, el traslado hacia la cabecera municipal se hace por caminos de herradura o trochas.

Fluviales:

Se realiza a través de los cauces de los ríos Cravo Norte en época de invierno hacia las veredas aledañas. Los ríos Meta y Casanare navegables durante todo el año, existiendo comunicación con Puerto López (Meta) y época de invierno por el Casanare arriba surge la ruta Cravo Norte - Puerto Rondón.

Sector Económico.

El municipio de Cravo norte es netamente ganadero, base fundamental de la economía y el renglón más importante en la generación de ingresos de las familias Craveñas.

Ganadería.

La actividad económica más importante es la explotación ganadera, conformada básicamente por ganado vacuno en las modalidades de cría y levante, con animales criollos cruzados con Cebú, su alimentación básica son las gramíneas propias de la región. La población bovina se calcula en 44.700 reses, para 1998, en un 99% predomina el cruce criollo y cebú, en los últimos dos años se han incorporado a la región razas como: Angus, Simmental, Charolais y Pardo Suizo.

En un 100% la ganadería del municipio es de tipo extensivo y su alimentación se basa en el consumo de pastos naturales. Entre las gramíneas naturales más comunes se determinan la Guaratara, la Carretera, La Lamedora. Los pastos artificiales más predominantes en la zona son: la Brachiaria, Decumbens y Humidícola. Como fuente de suplemento mineral se utiliza la sal mineralizada.

Agricultura.

La agricultura no es significativa en la economía del Municipio, es de subsistencia, se encuentra localizada en las vegas de los ríos y caños y al pie de los bosques de galería, donde los suelos presentan algún grado de fertilidad y el transporte de los productos es factible. El manejo de los cultivos es de tipo tradicional, no hay vocación ni tradición.

La producción agrícola del Municipio está representada en cultivos como yuca, plátano, maíz, caña panelera, y algunos frutales como cítricos, piña, guanábana y papaya y en pequeñas cantidades se siembra tabaco.

7. USO DE LOS RECURSOS NATURALES

De acuerdo a lo establecido en las actividades propias del contrato, no se hace necesario de que durante la etapa de limpieza de vías y mejoramiento de parques requiera utilizar o aprovechar una serie de recursos naturales renovables, por lo tanto, la empresa de servicios públicos JAGUEY SA ESP y/o firma contratista para la ejecución del proyecto no requiere tramitar y/o obtener previamente licencia ambiental y/o permisos ambientales.

8. EVALUACIÓN AMBIENTAL

Es importante mencionar que a cada actividad se le asocian los determinados impactos y a su vez se contemplan las medidas de manejo para su prevención, control, mitigación y/o compensación: a continuación, se relaciona la matriz de actividades, impactos y manejos.

Dirección: Carrera 4 NO. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

Cuando se realizan los estudios de evaluación de impacto ambiental para cualquier obra o proyecto, se deben definir previamente aspectos como: contenido y alcance del estudio, requerimientos de información, metodología de identificación y evaluación de impactos; y los resultados esperados, cuya definición depende de las características y magnitud del proyecto y de las condiciones medioambientales que pueden resultar afectadas.

En el cuadro que se describe a continuación, se relacionan los impactos generales que serán generados por las actividades del contrato:

Tabla 4 Impactos Generales

COMPONENTE	ELEMENTO	IMPACTO
Atmosférico	Calidad del Aire	Alteración en la atmosfera
Biótico	Vegetación	Afectación de la biodiversidad
		Alteración del suelo
Socioeconómico	Social	Generación de expectativas.
		Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes
	Económico	Demanda de bienes y Servicios
		Demanda de mano de obra

Una vez analizadas las actividades del proyecto, se identificaron y enumeraron los posibles impactos a generarse durante la ejecución del proyecto, los cuales se describen a continuación:

Componente Atmosférico: La contaminación del aire puede definirse como la presencia de uno o más contaminantes en la atmosfera exterior, en cantidades y duración tal que puede ser (o tienden a ser) nocivos para la vida del hombre, plantas o animales o para la propiedad de los materiales, o que pueden interferir con el uso y disfrute de la vida o propiedad o con la realización del trabajo. Esta definición se refiere al aire exterior o ambiente en comparación con el aire interior. Las fuentes de contaminación pueden clasificarse desde distintas perspectivas en el desarrollo del proyecto se presentan como:

- ✓ **Alteración en la atmosfera.** La limpieza de vías y mejoramiento de parques Durante el corte, barrido o limpieza, se puede levantar polvo y partículas que afectan la calidad del aire local.

Componente Biótico: Muchos proyectos y actividades pueden causar impactos no deseables en los ecosistemas terrestres o acuáticos, en el proceso de ejecución se destaca:

- ✓ **Afectación de la biodiversidad:** Si no se planifica bien, puede haber destrucción de hábitats de fauna pequeña (insectos, reptiles) y especies vegetales nativas.
- ✓ **Alteración del suelo:** En algunos casos, el corte excesivo puede dejar el suelo expuesto a erosión por viento y lluvia.

Componente Socioeconómico: Generalmente en los proyectos donde se involucran comunidades y se afectan de algún modo su entorno diario, se presentan discusiones y expectativas relacionadas

Dirección: Carrera 4 N0. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

con el desarrollo y ejecución del proyecto, a su vez es de anotar que prima en bienestar común sobre el bienestar individual. Dentro de esto se destaca:

- ✓ **Generación de empleo**. Se generan expectativas dentro de la población profesional y no profesional que está capacitada para el desarrollo de estos trabajos.
- ✓ **Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio**. Sin lugar a dudas, el diseño, la construcción, de un centro de recreación y de deportes genera expectativas positivas en la comunidad.
- ✓ **Demanda de Bienes y Servicios.** Se demandará servicios y bienes que comprenden: servicios calificados, servicios no calificados, herramientas, etc.
- ✓ **Demanda de Mano de Obra**. Durante las etapas de limpieza de vías y mejoramiento de parques del contrato se producirá la demanda temporal de una cantidad determinada de personas para atender los diferentes frentes de acción que éste requiere.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS

La evaluación ambiental de la zona de influencia directa busca establecer los impactos generados por la ejecución de cada una de las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto.

Metodología de identificación y evaluación de impactos ambientales

La metodología utilizada para la identificación y evaluación de impactos ambientales del proyecto fue la Metodología de EPM – Arboleda. La evaluación consiste en la elaboración de un proceso cualitativo y cuantitativo, donde el primero tiene lugar mediante una descripción considerando el escenario con proyecto, según sea el medio y sus respectivos componentes los afectados. En el segundo caso, la calificación se da a través de diferentes criterios desarrollados en una ficha de impactos, tales como Probabilidad de Ocurrencia, Magnitud Relativa, Nivel de vulnerabilidad, Duración y Factor de Incidencia No Cuantificable que resultan en la Calificación de Importancia.

La metodología mencionada propone una expresión o índice para valorar los impactos, denominado "Calificación ambiental" (Ca). La calificación ambiental se obtiene a partir de cinco criterios o factores característicos de cada impacto, que se describen en la siguiente tabla.

Tabla 5 Criterios para evaluar impactos ambientales

CRITERIO	CALIFICACIÓN	ESCALA	SIGNFICADO
CLASE (C)	POSITIVO	P	El efecto mejora el estado actual del recurso afectado
	NEGATIVO	N	El efecto deteriora el estado actual del recurso afectado
PRESENCIA (P)	CIERTO	1	Existe absoluta certeza de que el impacto se presente
	PROBABLE	0,8 - 0,9	Es probable hasta en un 50% que el impacto se dé
	INCIERTO	0,4 - 0,7	Es poco probable que el impacto se presente

	IMPOSIBLE	0,1 - 0,3	Es casi imposible que se dé pero podría presentarse
EVOLUCIÓN (E)	MUY RAPIDO	1	Menos de un día
	RAPIDO	0,8 - 0,9	De un día a un mes
	MEDIO	0,6 - 0,7	De un mes a seis meses
	LENTO	0,4 - 0,5	De seis meses a un año
	MUY LENTO	0,1 - 0,3	Más de un año
MAGNITUD (M)	MUY SEVERO	1	Daños permanentes al ambiente
	SEVERO	0,8 - 0,9	Daños serios pero temporales al ambiente
	MEDIANAMENTE SEVERO	0,5 - 0,7	Daños menores pero permanentes al ambiente
	LIGERAMENTE SEVERO	0,3 - 0,4	Daños menores al ambiente
	NADA SEVERO	0,1 - 0,2	Ningún daño al ambiente
DURACIÓN (D)	MUY LARGA	1	Más de un año
	LARGA	0,8 - 0,9	De seis meses a un año
	MODERADA	0,5 - 0,7	De un mes a seis meses
	CORTA	0,3 - 0,4	De un día a un mes
	MUY CORTA	0,1 - 0,2	Menos de un día
CLASIFICACIÓN AMBIENTAL (Ca)	MUY ALTO	8-10	Muy alta repercusión sobre el entorno
	ALTO	6-8	Alta repercusión sobre el entorno
	MEDIO	4-6	Media repercusión sobre el entorno
	BAJO	2-4	Baja repercusión sobre el entorno
	MUY BAJO	0-2	Muy baja repercusión sobre el entorno

La calificación ambiental (Ca) es la expresión de la acción conjugada de los criterios con los cuales se calificó el impacto ambiental y representa la gravedad o importancia de la afectación que este está causando. Se calcula por medio de la siguiente ecuación, la cual fue desarrollada por un grupo que se encarga de las evaluaciones ambientales en EPM.

$$Ca = C(P[7.0 * E * M + 3.0 * D])$$

Donde:

Ca = Calificación Ambiental
C = Clase
P = Presencia
E = Evolución
M = Magnitud
D = Duración

El valor numérico que arroja la ecuación se convierte luego en una expresión que indica la importancia del impacto asignándole unos rangos de calificación de acuerdo con los resultados numéricos obtenidos, de la siguiente manera:

RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES

A continuación, se relaciona tabla con el resultado de la valoración de los impactos ambientales ocasionados por las actividades del proyecto. La valoración se clasifica por colores, los cuales separan por niveles de afectación, siendo el rojo oscuro el más alto

Tabla 6 Rangos de calificación de impacto ambiental

CRITERIO	RANGO	VALOR
CALIFICACIÓN AMBIENTAL	MUY ALTA	8,1 - 10
	ALTA	6,1 - 8,0
	MEDIA	4,1 - 6,0
	BAJA	2,1 - 4,0
	MUY BAJA	0,1 - 2,0

Tabla 7 Matriz de evaluación y valoración de impactos

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES											
FECHA DE ACTUALIZACIÓN NOVIEMBRE DE 2026	NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN, SEDE ESCUELA AGUA LINDA EN LA VEREDA AGUA LINDA EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA									
ETAPA/ACTIVIDAD	ASPECTO AMBIENTAL	IMPACTO AMBIENTAL	C	P	a	E	M	b	D	CA

PRELIMINARES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	Generación de residuos sólidos	Contaminación al suelo	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
		Contaminación al agua	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Generación de emisión de Ruido	Contaminación por ruido	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Generación de polvo y material particulado	Contaminación atmosférica	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Alteración del suelo	Erosión del suelo	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
CIMENTACIÓN	Generación de residuos sólidos	Contaminación al suelo	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
		Contaminación al agua	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Generación de emisión de Ruido	Contaminación por ruido	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Generación de polvo y material particulado	Contaminación atmosférica	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Alteración del suelo	Erosión del suelo	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
MAMPOSTERIA Y ACABADOS	Generación de residuos sólidos	Contaminación al suelo	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
		Contaminación al agua	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Generación de emisión de Ruido	Contaminación por ruido	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Generación de polvo y material particulado	Contaminación atmosférica	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Alteración del suelo	Erosión del suelo	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	Generación de residuos sólidos	Contaminación al suelo	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
		Contaminación al agua	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76

Dirección: Carrera 4 NO. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

	Generación de emisión de Ruido	Contaminación por ruido	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Generación de polvo y material particulado	Contaminación atmosférica	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Alteración del suelo	Erosión del suelo	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
INSTALACIONES ELECTRICAS	Generación de residuos sólidos	Contaminación al suelo	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
		Contaminación al agua	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Generación de emisión de Ruido	Contaminación por ruido	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Generación de polvo y material particulado	Contaminación atmosférica	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Alteración del suelo	Erosión del suelo	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA	Generación de residuos sólidos	Contaminación al suelo	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
		Contaminación al agua	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Generación de emisión de Ruido	Contaminación por ruido	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Generación de polvo y material particulado	Contaminación atmosférica	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
	Alteración del suelo	Erosión del suelo	N	0,5	7	0,4	0,4	3	0,4	1,76
CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA	Beneficio económico	Generación de empleo	P	1	7	1	1	3	0,4	8,2

8.1. RESULTADO Y PRIORIZACIÓN DE LOS IMPACTOS

Luego de la evaluación de los impactos ambientales identificados, se puede observar que los más significativos y de mayor importancia o de importancia muy alta, afectarán de manera positiva el componente socioeconómico, manifestándose en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del área de influencia mediante la generación de empleo. Por otro lado, los impactos negativos de importancia alta y media corresponden a los que se generarán por la ejecución del contrato sobre los recursos suelo, atmosfera y la contaminación por ruido. El recurso suelo se ve afectado por la generación de residuos sólidos, de igual forma se espera impacto en la atmosfera

debido a la generación de material particulado y también se pueden llegar a tener afectaciones mínimas por el ruido de las guadañas.

Este impacto es temporal y de una magnitud baja. Se puede concluir que, con relación a la evaluación de impactos ambientales establecidos para la ejecución del contrato, se identificaron los impactos ambientales más significativos, los cuales se enuncian a continuación:

- Contaminación por ruido
- Contaminación a la atmosfera
- Contaminación al suelo

Los principales impactos a mitigar, corregir y prevenir son los relacionados con la alteración del recurso suelo por posible erosión , generación de material particulado ya que durante el corte, barrido y limpieza, se puede levantar polvo y partículas que afectan la calidad del aire local y la generación de ruido ya que el uso de guadañas produce niveles de ruido que pueden afectar la fauna local y la comunidad; estos impactos serán contrarrestados con los componentes positivos del contrato que son la mejora de la calidad de vida y condiciones de las vías y los parque en las áreas de influencia una vez culminado y, por la generación de empleo.

9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Con base a la matriz de evaluación de aspectos e impactos ambientales se formularon los programas de manejo ambiental, donde se establecerán las medidas para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles efectos o impactos ambientales negativos causados por el desarrollo de la ejecución del contrato.

- **Medidas de prevención.**

Son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que puede generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- **Medidas de mitigación.**

Son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente.

- **Medidas de corrección.**

Son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad.

- **Medidas de compensación.**

Son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, las localidades y el entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos.

Dirección: Carrera 4 N0. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

Tabla 9. Programas Manejo Ambiental

FICHA N°	DESCRIPCIÓN
FMA-01	CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL
FMA-02	INFORMACION A LA COMUNIDAD LOCAL
FMA-03	GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
FMA-04	CONTROL DE RUIDO Y AIRE
FMA- 05	EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Estas medidas son detalladas en el Plan de Manejo Ambiental mediante la elaboración de fichas de fácil aplicación para los programas propuestos, estas fichas contienen lo siguiente:

- Objetivos
- Meta
- Impactos a manejar
- Tipo de medida
- Cronograma de ejecución
- Costos
- Periodo a ejecutar
- Acciones a desarrollar
- Indicador de cumplimiento

Tabla 8 Información a la comunidad

FICHA No. 1: CONTRATACIÓN MANO DE OBRA LOCAL								**CÓDIGO: F-01**
OBJETO	• Identificar mecanismos que faciliten la contratación de personal • Hacer partícipe directo a la comunidad en el desarrollo del contrato.							
META				**IMPACTO A MANEJAR**				
Realizará la contratación de personal en el área de influencia directa del contrato que permita generar empleo en la población.				• Garantizar la generación de empleo • Mejoramiento en la calidad de vida.				
TIPO DE MEDIDA								
CONTROL	**X**		**PREVENCIÓN**			**MITIGACIÓN**		**CORRECCIÓN**
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN								
Durante las etapas del proyecto								
COSTOS								
Incluido en el presupuesto de la ejecución								
PERIODO A EJECUTAR								
Antes del inicio de la obra y durante la ejecución de esta								
ACCIONES A DESARROLLAR	• El contratista deberá entregar soportes de la vinculación a la Seguridad Social de cada trabajador. • De acuerdo con el plazo estipulado en cada contrato, el Contratista entregará un informe sobre el número de							

	empleados totales y los que corresponden a mano de obra local. De esta forma se podrá medir periódicamente el cumplimiento del programa de contratación. • Realizar una charla de inducción o capacitación para el personal contratado, de tal manera que las personas vinculadas conozcan la naturaleza y riesgos del trabajo, así como las medidas de protección tanto de su integridad física como de las herramientas de trabajo y sobre la protección de los recursos naturales.
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	• Registros de personal vinculado (formato de convocatoria, EPS, ARL, pago de parafiscales y demás). • Registros de inducción, capacitación y entrenamiento del personal.

Tabla 9 Contratación mano de obra

FICHA No. 2: INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD LOCAL								**CÓDIGO: F-02**	
OBJETO	Brindar información y respuesta oportuna a las solicitudes y quejas de la comunidad, para generar confianza, evitar rechazo por desconocimiento de los beneficios del contrato. En todos los casos la comunidad deberá estar plenamente de acuerdo con los términos y condiciones del contrato.								
META				**IMPACTO A CONTROLAR**					
Dar respuesta al 100% de las inquietudes de la comunidad en el periodo de ejecución.				• Alteración de las actividades cotidianas • Conflictos con comunidades e instituciones • Desinformación • Expectativas de la comunidad • Posible deterioro ambiental por la construcción de la obra • Quejas de la comunidad					
TIPO DE MEDIDA									
CONTROL	**X**		**PREVENCIÓN**	**X**		**MITIGACIÓN**	**X**	**CORRECCIÓN**	**X**
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN									
Durante las etapas del proyecto									
COSTOS									
Incluido en el presupuesto de la ejecución									
PERIODO A EJECUTAR									
Antes del inicio de la obra y durante la ejecución de esta									
ACCIONES A DESARROLLAR				• Responder a posibles incertidumbres y reclamos de la comunidad. • Informar sobre el proceso de selección de personal.					
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO				• Acta de socialización.					

Dirección: Carrera 4 NO. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

Tabla 12 Gestión Integral De Residuos Sólidos

FICHA No. 3: MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS	**CÓDIGO: F-03**
OBJETO	Asegurar la adecuada gestión de los residuos sólidos generados, reduciendo su impacto ambiental, promoviendo la separación en la fuente, el aprovechamiento y la disposición final responsable, durante el tiempo de ejecución del contrato.

META	**IMPACTO A CONTROLAR**
• Ejecutar el 100% de las medidas previstas para el cumplimiento del proyecto. • Separa en la fuente el 100% de los residuos generados. • Reciclar y/o reutilizar por lo menos del 60% de los residuos sólidos generados en la obra.	• Contaminación del agua • Contaminación del aire • Contaminación del suelo • Pérdida de suelo • Afectación de la cobertura vegetal • Alteración de la calidad visual • Proliferación de vectores • Afectación a la salud pública. • Aumento de emisiones por transporte de residuos.

TIPO DE MEDIDA											
CONTROL	X		**PREVENCIÓN**	X		**MITIGACIÓN**	X		**CORRECCIÓN**	X	

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Durante las etapas del proyecto
COSTOS
Incluido en el presupuesto de la ejecución
PERIODO A EJECUTAR
Antes del inicio de la obra y durante la ejecución de esta

ACCIONES A DESARROLLAR	Los residuos sólidos generados durante la ejecución del contrato se debe realizar el siguiente procedimiento: **Clasificación de los residuos sólidos** Se debe realizar una clasificación de los residuos teniendo en cuenta la siguiente clasificación: Grupo 1: Residuos no reciclables Grupo 2: Residuos Reciclables Grupo 3: Residuos orgánicos **Recolección para el grupo 1,2 y 3** El contratista debe colocar en el sitio de la obra los recipientes necesarios y adecuados y demarcados para la recolección de los residuos sólidos una vez clasificados. Almacenamiento temporal para el grupo 1,2 y 3 Residuos no aprovechables: Como su nombre los indica son residuos que no tienen ningún

	valor y van normalmente a los rellenos sanitarios; deberán ser almacenados hasta que la empresa prestadora del servicio los recoja para su disposición final, el tiempo de almacenaje no debe ser mayor a 3 días. Residuos reciclables: corresponden a este grupo materiales como el vidrio, aluminio, papeles, metales, plásticos, cauchos, madera y chatarra, que deben ser recolectados y almacenados en un área definida y protegida de los cambios climáticos, hasta que tengan un volumen considerable para que sean recolectados por los recicladores autorizados o comercializados por el contratista. Residuos orgánicos: Son desechos biodegradables de origen vegetal o animal que pueden descomponerse en la naturaleza sin demasiada dificultad y transformarse en otro tipo de materia orgánica. Disposición final para el grupo 1,2 y 3 • Los residuos sólidos ordinarios no requieren ningún manejo especial y pueden ser entregados a la empresa recolectora en las mismas condiciones de los residuos orgánicos. • Los residuos reciclables pueden ser reutilizados o transformados, entre ellos están: el papel, cartón, plástico, vidrio y metal siempre y cuando estén limpios y secos.
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	• Registros fotográficos • Informes de cumplimiento ambiental

Tabla 13 Control De Ruido y Aire

FICHA No. 4: CONTROL DE RUIDO Y AIRE	**CÓDIGO: F-04**
OBJETO	Control de la contaminación acústica y atmosférica generada por las actividades de la organización, protegiendo la salud de los trabajadores, la comunidad y el entorno natural.
META	**IMPACTO**
Disminuir en un 80% los niveles de ruido durante la ejecución del contrato.	• Contaminación del aire y afectación de la calidad del aire local. • Afectación de la salud (ruido excesivo, enfermedades respiratorias). • Alteración de la fauna sensible al ruido.

	• Quejas de la comunidad por ruido y emisiones.
TIPO DE MEDIDA	
CONTROL X **PREVENCIÓN** x **MITIGACIÓN** x **CORRECCIÓN** x	
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	
Durante las etapas del proyecto	
COSTOS	
Incluido en el presupuesto de la ejecución	
PERIODO A EJECUTAR	
Antes del inicio de la obra y durante la ejecución de esta	
ACCIONES A DESARROLLAR	• Los vehículos para el transporte de los residuos deben contar con platones o contenedores adecuados y en buen estado. • El material transportado no puede sobrepasar los bordes superiores más bajos del contenedor o platón. Las compuertas de cargue y descargue deben permanecer, durante el transporte, debidamente cerradas y aseguradas. • Evitar el sobrecargue de las volquetas. • Controlar la velocidad y la carga de los camiones, para evitar la caída de materiales cuyo funcionamiento genera excesivos niveles de ruido (sobre los 75 dB) deberán ser reparados y retornarán a los sitios de obra una vez cumplan con los niveles admisibles. • Los equipos potencialmente generadores de ruido, que estén al servicio del contrato, deben estar en perfecto estado, de tal modo que se garanticen los niveles permisibles de ruido. • Las personas que estén en contacto directo con estos equipos deben contar con los implementos de protección necesarios. • Las actividades generadoras de ruido, deben desarrollarse en un horario que causen el menor malestar posible a la población aledaña.
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	• Registro fotográfico. • Informes de cumplimiento.

Dirección: Carrera 4 N0. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co

Tabla 14 Educación y capacitación ambiental

FICHA No. 5: EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN AMBIENTAL	**CÓDIGO: F-05**
OBJETO	Implementar acciones de educación, capacitación, sensibilización y comunicación ambiental dirigidas al personal vinculado a la ejecución del proyecto, contratistas, comunidad y demás actores del área de influencia directa, con el propósito de fortalecer el conocimiento y la aplicación de buenas prácticas ambientales relacionadas con el manejo adecuado de residuos sólidos, uso eficiente y ahorro del agua, protección del suelo y de los recursos naturales, prevención de impactos ambientales y manejo adecuado de las áreas intervenidas durante la ejecución de las obras.

META	**IMPACTO**
• Cumplimiento de capacitaciones (N.° de capacitaciones realizadas / N.° de capacitaciones programadas × 100). • Cobertura de capacitación al personal (N.° de trabajadores capacitados / N.° total de trabajadores vinculados × 100). • Cobertura de sensibilización comunitaria (N.° de actividades realizadas / N.° de actividades programadas × 100)	• Manejo inadecuado de residuos sólidos. • Disposición inadecuada de residuos en espacios públicos. • Contaminación del suelo por residuos y materiales. • Afectación de cuerpos de agua o sistemas de drenaje por disposición inadecuada de residuos y sedimentos. • Desperdicio o uso ineficiente del recurso hídrico. • Afectación de la cobertura vegetal. • Generación de material particulado y ruido. • Alteración temporal del entorno y del espacio público. • Conflictos o molestias a la comunidad derivados de las actividades constructivas. • Falta de conocimiento sobre las medidas ambientales establecidas para el proyecto.

TIPO DE MEDIDA												
CONTROL	**X**		**PREVENCIÓN**	**X**		**MITIGACIÓN**	**x**		**CORRECCIÓN**	**x**		

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
Durante las etapas del proyecto
COSTOS
Incluido en el presupuesto de la ejecución
PERIODO A EJECUTAR
Antes del inicio de la obra y durante la ejecución de esta

ACCIONES A DESARROLLAR	• Realizar jornadas de capacitación dirigidas al personal vinculado al proyecto, antes y durante la ejecución de las actividades constructivas, sobre las obligaciones ambientales aplicables, medidas de manejo establecidas en el PMA, prevención de impactos, manejo de residuos, uso eficiente del agua, protección del suelo, flora y fauna, manejo de materiales y atención de contingencias. • Capacitar al personal y a la comunidad sobre la correcta separación de

	residuos en la fuente, utilizando el código nacional de colores establecido en la Resolución 2184 de 2019: verde para residuos orgánicos aprovechables, blanco para residuos aprovechables y negro para residuos no aprovechables. • Informar a la comunidad del área de influencia sobre las principales actividades del proyecto, posibles impactos ambientales, medidas preventivas y canales establecidos para comunicar inquietudes, quejas o situaciones relacionadas con la ejecución de las obras. • Implementar material informativo, señalización, carteleras u otros medios de comunicación ambiental en los sitios de trabajo, de acuerdo con las condiciones y necesidades del proyecto.
REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	• Registro fotográfico. • Listados de asistencia. • Actas de capacitación. • Material utilizado durante las jornadas. • Presentaciones o material pedagógico. • Evidencia de entrega de material informativo, cuando aplique. • Evaluaciones o formatos de verificación, cuando se considere necesario. • Informes de capacitación y sensibilización. • Registro de las observaciones o compromisos adquiridos.

10. PLAN DE CONTINGENCIAS

Describe la evaluación de los riesgos generados tanto por el contrato sobre el medio ambiente, que puede suceder durante las diferentes actividades de este, con base en los análisis de riesgo, se establece los lineamientos del plan de contingencia. Dentro de los objetivos del plan de contingencia se tiene:

- Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles contingencias generadas en la ejecución del proyecto.
- Determinar los riesgos potenciales que se podrían generar por acciones naturales o por intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de tomar acciones de prevención y control.
- Identificar todas las instituciones tanto privadas como estatales presentes en el área de influencia de la obra, que pueden ofrecer sus servicios de apoyo logístico.
- Minimizar los impactos que se puedan generar hacia la comunidad y su área de influencia

El Plan de contingencia se basará en un sistema oportuno de detección oportuna estrechamente relacionada con el monitoreo y seguimiento de las actividades y estará encaminado en corregir de manera rápida y eficiente las deficiencias que se presenten.

10.1. IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES EMERGENCIAS

Durante el desarrollo del contrato, es factible que se puedan presentar algunas emergencias, entre ellas se destacan:

- Incendio
- Explosión
- Accidentes de Tránsito
- Terrorismo
- Tormenta eléctrica
- Accidentes de trabajo

10.2. ESTRATEGIAS DE CONTROL O MEDIDAS DE CONTROL A IMPLEMENTAR

Con las estrategias de control se busca prevenir contingencias, durante el desarrollo del contrato. Las medidas de control deben considerar las diversas actividades además de reforzar las medidas establecidas por el HSEQ. Dentro de las medidas a implementar se deben considerar los siguientes aspectos:

- Capacitación del personal
- Sistema de disposición de residuos

PLAN DE CONTINGENCIA

PLAN DE CONTINGENCIA		
POSIBLES EMERGENCIAS	**PREVENCION**	**ATENCION**
Accidentalidad de trabajadores por manipulación inadecuada de herramientas.	Capacitar a los trabajadores de la obra, acerca del funcionamiento correcto de las herramientas.	• Brindar primeros auxilios en el lugar del accidente. • Traslado al centro de salud más cercano.
Accidentes vehiculares.	Asegurar a los trabajadores.	• Brindar primeros auxilios en el lugar del accidente. • Traslado al centro de salud más cercano.

El contratista deberá adicionalmente dotar a todos los trabajadores del proyecto de los elementos de seguridad industrial y de salud ocupacional necesarios.

11. PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Seguimiento

El seguimiento es el conjunto de decisiones y actividades planificadas destinadas a velar por el cumplimiento de las metas establecidas en las fichas propuestas, verificando el cumplimiento de la

ejecución de las medidas de manejo ambiental propuestas, esta responsabilidad es de la interventoría. Se debe hacer seguimiento a:

- Cumplimiento de las metas propuestas para cada guía de este contrato o sobre aquellas que los contratistas decidan anexar, valorándolas a través de la evaluación de estas.
- La ejecución de cada una de las medidas propuestas, su eficiencia y eficacia, la frecuencia para este seguimiento deben ser definidas por el interventor.

Monitoreos

Se entiende por monitoreo a la observación, medición y evaluación respectiva y continua de información sobre salud y/o medio ambiente, o datos técnicos con propósitos definidos, de acuerdo con esquemas preestablecidos en el espacio y el tiempo y utilizando métodos comparativos para inferir y reunir información.

La necesidad de realizar monitoreo o no, debe ser definido por los contratistas y el interventor y/o supervisor, de acuerdo con las características ambientales y sociales del área donde se desarrollarán las obras y debe quedar consignado en un acta.

Los Monitoreos se ejecutan para:

- Tener una línea base de la calidad o estado de cada uno de los recursos naturales susceptibles de ser afectados por las actividades constructivas y tener un punto de referencia
- Verificar que el contrato se ejecuta sin dañar el ambiente
- Demostrar que se está cumpliendo con la normatividad ambiental vigente
- Verificar la efectividad y eficiencia de las acciones ambientales propuestas

12. COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

El monto destinado para mitigación ambiental deberá invertirse tal como se detalla a continuación.

MONTO TOTAL DEL PROYECTO: **$ 99.471.979,00**

MONTO DESTINADO PARA CONTROL AMBIENTAL: **$ 985.311,09**

Detalle de la inversión del monto de control ambiental:

DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro, transporte y entrega de puntos ecológicos de tres (3) puestos, identificado conforme al código nacional de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente (verde, blanco y negro), destinado a su instalación y utilización en el área de influencia directa del proyecto.	UNIDAD	2	$ 338.905,62	**$ 677.811,24**

				
Suministro y entrega de material vegetal ornamental (plantas IXORAS) a la sede educativa localizada en el área de influencia del proyecto.	UNIDAD	45	$ 6.833,33	**$ 307.499,85**
			TOTAL	**$ 985.311,09**

13. JUSTIFICACIÓN DE LA MITIGACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL

1. El suministro de tres puntos ecológicos de tres (3) puestos, se establece como una medida de manejo ambiental orientada a fortalecer la separación de residuos sólidos en la fuente, prevenir su disposición inadecuada y promover prácticas de manejo integral de residuos dentro del área de influencia directa del proyecto. La implementación de recipientes diferenciados permitirá facilitar la clasificación de los residuos orgánicos aprovechables, residuos aprovechables y residuos no aprovechables generados durante las actividades del proyecto, favoreciendo su posterior recolección, aprovechamiento y disposición conforme a las condiciones establecidas en la normativa vigente. Esta medida se fundamenta en la Resolución 2184 de 2019, expedida conjuntamente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, mediante la cual se adoptó a nivel nacional el código de colores para la separación de residuos sólidos en la fuente: verde para residuos orgánicos aprovechables, blanco para residuos aprovechables y negro para residuos no aprovechables. Asimismo, la Ley 142 de 1994, en el marco del régimen de los servicios públicos domiciliarios, establece disposiciones relacionadas con el servicio público de aseo y contempla la protección de los recursos naturales y el cumplimiento de la función ecológica de quienes desarrollan actividades relacionadas con los servicios públicos. En este sentido, el suministro, transporte y entrega del punto ecológico en el área de influencia directa del proyecto constituye una acción preventiva y de control ambiental que contribuye a mejorar las condiciones de manejo de los residuos, reducir la posibilidad de contaminación del suelo y otros componentes ambientales y fortalecer la cultura de separación en la fuente entre la comunidad y/o personal vinculado a las actividades del proyecto.

- Constitución Política de 1991 – artículos 79 y 80. Establece el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber estatal de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental. Sirve como fundamento constitucional de las medidas preventivas incorporadas en el PMA.
- Ley 99 de 1993. Establece los principios generales de la política ambiental colombiana y orienta la gestión ambiental hacia la prevención y control del deterioro ambiental.
- Decreto 1077 de 2015 – art. 2.3.2.2.2.2.16. Establece como obligación de los usuarios del servicio público de aseo realizar la separación de residuos en la fuente, además de su adecuado almacenamiento y presentación.

- Decreto 1077 de 2015 – art. 2.3.2.5.2.1.1. Establece la obligación de presentar los residuos aprovechables separados en la fuente para su posterior aprovechamiento y entrega al prestador correspondiente.
- Decreto 1077 de 2015 – art. 2.3.2.2.3.92. Establece la gestión diferencial de residuos aprovechables y no aprovechables y contempla el desarrollo de programas de separación en la fuente cuando sea viable el aprovechamiento.
- Resolución 2184 de 2019 – art. 4. Adopta el código nacional de colores: verde para orgánicos aprovechables, blanco para aprovechables y negro para no aprovechables.
- Resolución 754 de 2014. Establece la metodología para formular, implementar, evaluar, hacer seguimiento, controlar y actualizar los PGIRS, instrumento territorial relacionado con la gestión integral de residuos.

2. La actividad de suministro y entrega de material vegetal ornamental (plantas del género *Ixora*) a la sede educativa rural ubicada en el área de influencia del proyecto se fundamenta en la Ley 1549 de 2012, particularmente en sus artículos 1, 2, 7 y 8, relacionados con el fortalecimiento de la educación ambiental, la participación activa de la comunidad y la incorporación de los Proyectos Ambientales Escolares (PRAE) en los procesos formativos. De manera complementaria, se articula con los principios de desarrollo sostenible y protección ambiental establecidos en el artículo 1 de la Ley 99 de 1993. En este sentido, la actividad busca promover el mejoramiento paisajístico de los espacios escolares y fortalecer la sensibilización, la participación y la apropiación ambiental mediante la siembra, el cuidado y el sostenimiento del material vegetal por parte del docente y los estudiantes, en concordancia con los objetivos y medidas de manejo establecidos para el proyecto.

- Ley 99 de 1993. Especialmente los principios de desarrollo sostenible y protección de la biodiversidad

- Decreto 1076 de 2015. Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible

El supervisor del proyecto verificará el cumplimiento de los ítems contemplados en las medidas de manejo ambiental.

JHON JAIRO RODRIGUEZ MIJARES
INGENIERO AMBIENTAL
PROFESIONAL DE APOYO CPS 126-2026

Dirección: Carrera 4 N0. 2-62, 812010 Teléfono: 315 222 3159 E-mail: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co Web: www.cravonorte-arauca.gov.co
