ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PUBLICA
CONTRATO No. Y FECHA:	SVIV SAMC 004 DE 2026 de fecha 16 de junio de 2026
CONTRATISTA: Nit o C.C. No.	CONSORCIO AGUAS CLARAS R/L GEOVANNY ORTIZ PÉREZ NIT: 88.282.468-2
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
VALOR INICIAL:	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($156.421.842,00)
VALOR ADICIONAL:	SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($73.291.243,00)
VALOR FINAL:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($229.713.085,00)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CD0724 (28/04/2026)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIONAL	CD1349 (04/09/2026)
RUBRO	2.3.2..01.01.001.03.19.40.006 Optimización de sistemas de alcantarillados del municipio
REGISTRO PRESUPUESTAL	RP1051 (22/07/2026)
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL	RP1390 (9/09/2026)
PLAZO INICIAL:	2 meses
PRORROGA	1 mes
FECHA DE INICIO	29 DE JULIO DEL 2026
FECHA DE TERMINACION FINAL	19 DE OCTUBRE 2026
SUPERVISOR	Olger Neil Sepúlveda Sepúlveda

En las instalaciones de la alcaldía municipal de Ocaña se reunieron, el ingeniero GUSTAVO CASTILLA VERGEL Secretario de Vías Infraestructura y Vivienda, el ingeniero OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA Profesional Área de Vías y Carreteables, Supervisor del Contrato y GEOVANNY ORTIZ PÉREZ como representante legal del Contratista, CONSORCIO AGUAS CLARAS, para suscribir la presente acta, con los siguientes detalles:

RESUMEN DE ACTAS

DESCRIPCIÓN - PERIODO	VALOR
Presente Acta de Recibo Final	$229.713.085,00

RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CONSORICIO AGUAS CLARAS

Ítems	**Mes de agosto-septiembre 2026**	**Mes de septiembre-octubre 2026**
Entidad de aporte en línea	Aportes en línea	Aportes en línea
Empresa de pensiones	**PORVENIR COLPENSIONES PROTECCIÓN**	**PORVENIR COLPENSIONES PROTECCIÓN**
Valor	$ 1.933.800	$ 1.251.800
Empresa administradora de salud	**COMFAORIENTE COOSALUD MOVILIDAD NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD PROTEGER SANITAS**	**COMFAORIENTE COOSALUD MOVILIDAD NUEVA EPS NUEVA EPS MOVILIDAD SANITAS**
Valor	$ 1.510.900	$ 977.900
Administradora de riesgos profesionales	**COLPATRIA ARP**	**COLPATRIA ARP**
Valor	$ 841.700	$ 544.700
Cajas de compensación	**COMFAORIENTE**	**COMFAORIENTE**
Valor	$ 483.900	$ 313.300
ICBF	**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**	**INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**
Valor	$ 362.900	$ 235.200
SENA	**SENA**	**SENA**
Valor	$ 242.400	$ 157.100
Valor total de cotización	$ 5.375.600	$ 3.480.000
N° de Planilla	**9510912366**	**9512705803**
PIN o Clave	636550186	**741458103**
Entidad financiera	-	-
Periodo Cotización	agosto-septiembre 2026	septiembre-octubre 2026
Fecha de pago	08 de septiembre de 2026	15 de octubre de 2026
Valor de estampillas	Descontado por la secretaria de hacienda	Descontado por la secretaria de hacienda

REPRESENTANTE LEGAL

Ítems	**Mes de julio 2026**	**Mes de agosto 2026**	**Mes de septiembre 2026**	**Mes de octubre 2026**
Entidad de aporte en línea	SOI	SOI	SOI	SOI

Empresa de pensiones	**COLPENSIONES**	**COLPENSIONES**	**COLPENSIONES**	**COLPENSIONES**
Valor	$ 320.000	$ 560.000	$ 560.000	$ 512.000
Empresa administradora de salud	**SANITAS**	**SANITAS**	**SANITAS**	**SANITAS**
Valor	$ 250.000	$ 437.500	$ 437.500	$ 400.000
Administradora de riesgos profesionales	**POSITIVA**	**POSITIVA**	**POSITIVA**	**POSITIVA**
Valor	$ 10.500	$ 18.300	$ 18.300	$ 16.800
Valor total de cotización	$ 580.500	$ 1.015.800	$ 1.015.800	$ 928.800
N° de Planilla	**6027080693**	**6031764297**	**6034174180**	**6040326839**
PIN o Clave	558180760	615884585	737896193	818369981
Entidad financiera	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA	BANCOLOMBIA
Periodo Cotización	julio 2026	agosto 2026	septiembre 2026	Octubre 2026
Fecha de pago	11 de agosto de 2026	01 de septiembre de 2026	14 de octubre de 2026	10 de noviembre 2026
Valor de estampillas	Descontado por la secretaria de hacienda	Descontado por la secretaria de hacienda	Descontado por la secretaria de hacienda	Descontado por la secretaria de hacienda

GARANTÍAS

Que el contratista, constituyó las pólizas de garantía única de seguro a favor de la entidad territorial con la compañía Seguros del Estado S.A. así: póliza de cumplimiento Anexo 6 No. 56-44-101013719 y de responsabilidad civil extracontractual No. 56-40-101005872 Anexo 3, con los siguientes amparos.

AMPAROS	SMLMV	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
			DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
Cumplimiento Del Contrato	10%	$22.971.308,50	29	07	2026	28	02	2027
Pago De Salarios, Prestaciones Sociales Legales E Indemnizaciones	5%	$22.971.308,50	29	07	2026	29	10	2029
Estabilidad y calidad de la obra	10%	$22.971.308,50	19	10	2026	19	10	2031
Responsabilidad Civil Extracontractual	200	$350.181.000	29	07	2026	31	10	2026

ANEXOS

Se anexa el cuadro de cantidades ejecutadas en periodo de ejecución comprendido entre el periodo 29 de julio de 2026 al 19 de octubre de 2026. Certificamos que la información relativa a la ejecución fue debidamente soportada y adjuntada a la presente acta.

Valor a pagar en la presente acta DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE. ($229.713.085,00)

Para constancia de lo anterior se firma a los 09 días del mes de noviembre del 2026

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA
Profesional Universitario Área de vías
SUPERVISOR

GEOVANNY ORTIZ PÉREZ
R/L CONSORCIO AGUAS CLARAS
CONTRATISTA

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario Vías, Infraestructura Y Vivienda

Alcaldía de Ocaña

REPUBLICA DE COLOMBIA

Alcaldía de Ocaña

Ocaña, Norte de Santander

Gobierno de Colombia

ACTA DE RECIBO FINAL

Acta No.:	1	**Corte:**	29 de junio de 2026	**Hasta:**	19 de octubre de 2026	**Fecha del Acta:**	lunes, 19 de octubre de 2026
Contrato No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026	**Valor inicial:**	$ 156.421.842,00	**Adiciones:**	$ 73.291.243,00	**Valor Total del Contrato:**	$ 229.713.085,00
Fecha Iniciación:	29 de julio de 2026	**Contratista:** CONSORCIO AGUAS CLARAS				**Representante Legal:** GEOVANNY ORTIZ PÉREZ	
Fecha de Terminación inicial	29 de septiembre de 2026	**Objeto:**					
Plazo total (incluye suspensiones y prorrogas):	TRES (03) MESES	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER					
Suspensiones (Dias):	0 Dias						
Prorroga (meses):	UN (01) MES						
Fecha de Terminación Final:	19 de Octubre de 2026	**Interventor:** N/A				**Supervisor:** OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA	

CONDICIONES CONTRACTUALES								OBRA EJECUTADA							
ITEM	COMPONENTE DE OBRAS CIVILES			CONTRATO INICIAL		CONDICIONES ACTUALES Modificación No. 2 (05-10-2026)		Acumulado Acta Anterior		Presente Acta			Acumulado Presente Acta		% Obra
	DESCRIPCIÓN	UND	VR. UNITARIO	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	% Ejec.	CANTIDAD	VR. PARCIAL	Ejecutado
1,0	**EJECUTAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
APU1	Localización y replanteo	ml	$ 6.278,00	138,00	$ 866.364,00	246,00	$ 1.544.388,00	0,00	$ -	246,00	$ 1.544.388,00	100,0%	246,00	$ 1.544.388,00	100,0%
2,0	**REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RELLENOS**														
APU3	Excavación mecánica	m3	$ 29.686,00	124,20	$ 3.687.001,20	357,42	$ 10.610.370,12	0,00	$ -	357,42	$ 10.610.370,12	100,0%	357,42	$ 10.610.370,12	100,0%
APU4	Excavación manual	m3	$ 94.887,00	92,68	$ 8.794.127,16	111,25	$ 10.555.818,28	0,00	$ -	111,25	$ 10.555.818,28	100,0%	111,25	$ 10.555.818,28	100,0%
APU5	Retiro de escombros	m3	$ 33.457,00	216,88	$ 7.256.154,16	585,83	$ 19.600.114,31	0,00	$ -	585,83	$ 19.600.114,31	100,0%	585,83	$ 19.600.114,31	100,0%
APU6	Suministro e instalación de recebo compactado alcantarillado	m3	$ 87.990,00	167,65	$ 14.751.523,50	345,05	$ 30.360.949,50	0,00	$ -	345,05	$ 30.360.949,50	100,0%	345,05	$ 30.360.949,50	100,0%
3,0	**REPONER LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO**														
APU7	Extracción de redes de alcantarillados existentes	ml	$ 15.814,00	230,00	$ 3.637.220,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		0,00	$ -	
APU8	Suministro e instalación de colchón de arena	m3	$ 123.832,00	41,40	$ 5.126.644,80	69,36	$ 8.588.987,52	0,00	$ -	69,36	$ 8.588.987,52	100,0%	69,36	$ 8.588.987,52	100,0%
APU9	Construcción pozo de inspección	Und	$ 3.548.329,00	3,00	$ 10.644.987,00	9,00	$ 31.934.961,00	0,00	$ -	9,00	$ 31.934.961,00	100,0%	9,00	$ 31.934.961,00	100,0%
APU10	Acople sellado de red principal a pozo de inspección existente	Und	$ 288.589,00	1,00	$ 288.589,00	1,00	$ 288.589,00	0,00	$ -	1,00	$ 288.589,00	100,0%	1,00	$ 288.589,00	100,0%
APU11	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 6"	ml	$ 97.488,00	230,00	$ 22.422.240,00	395,22	$ 38.529.207,36	0,00	$ -	395,22	$ 38.529.207,36	100,0%	395,22	$ 38.529.207,36	100,0%
APU12	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 4"	ml	$ 41.157,00	133,00	$ 5.473.881,00	67,50	$ 2.778.097,50	0,00	$ -	67,50	$ 2.778.097,50	100,0%	67,50	$ 2.778.097,50	100,0%
APU13	Suministro e instalación de silla Yee 6" a 4"	Und	$ 257.271,00	38,00	$ 9.776.298,00	15,00	$ 3.859.065,00	0,00	$ -	15,00	$ 3.859.065,00	100,0%	15,00	$ 3.859.065,00	100,0%
APU14	Caja de inspección sanitaria 60X60X60CM. Incluye tapa	Und	$ 615.938,00	38,00	$ 23.405.644,00	17,00	$ 10.470.946,00	0,00	$ -	17,00	$ 10.470.946,00	100,0%	17,00	$ 10.470.946,00	100,0%
4,0	**Terminación y adecuación del sistema de alcantarillado**														
APU11	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 8"	ml	$ 97.488,00	18,00	$ 1.754.784,00	18,00	$ 1.754.784,00	0,00	$ -	18,00	$ 1.754.784,00	100,0%	18,00	$ 1.754.784,00	100,0%
APU14	Caja de inspección sanitaria 60X60X60CM. Incluye tapa	Und	$ 615.938,00	1,00	$ 615.938,00	1,00	$ 615.938,00	0,00	$ -	1,00	$ 615.938,00	100,0%	1,00	$ 615.938,00	100,0%
5,0	**ITEMS NO PREVISTOS**														
APU15	Concreto para atraque y revestimiento de tubería	m3	$ 926.765,00	0,00	$ -	2,73	$ 2.532.848,75	0,00	$ -	2,73	$ 2.532.848,75	100,0%	2,73	$ 2.532.848,75	100,0%

COSTO DIRECTO		$ 118.501.395,82	$ 174.025.064,34	$ -	$ 174.025.064,34	100,0%	$ 174.025.064,34	100,0%
Administración (%)	26%	$ 30.810.362,91	$ 45.246.516,73	$ -	$ 45.246.516,73		$ 45.246.516,73	
Imprevistos (%)	1%	$ 1.185.013,96	$ 1.740.250,64	$ -	$ 1.740.250,64		$ 1.740.250,64	
Utilidades (%)	5%	$ 5.925.069,79	$ 8.701.253,22	$ -	$ 8.701.253,22		$ 8.701.253,22	
TOTAL COSTOS DE OBRA		**$ 156.421.842,00**	**$ 229.713.085,00**	**$ -**	**$ 229.713.085,00**		**$ 229.713.085,00**	

RETENCIÓN PARA LIQUIDACIÓN (0,00%)	
TOTAL A FACTURAR PRESENTE ACTA	**$ 229.713.085,00**

SON: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

TOTAL A PAGAR ACTA SIN DESCUENTOS DE LEY **$ 229.713.085,00**

RESUMEN CONTRATO		
Valor contrato	**$ 229.713.085,00**	
Valor Acta No. 1		$ 0,00
Valor Acta No. 2		$ 0,00
Valor Acta No. 3		$ 0,00
Saldo Contrato		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 229.713.085,00**	**$ 0,00**

RESUMEN ANTICIPO		
Valor Anticipo	**N/A**	
Amortización Acta No. 1		
Amortización Acta No. 2		
Amortización Acta No. 3		
Saldo Anticipo		$ 0,00
SUMAS IGUALES	**$ 0,00**	**$ 0,00**

Firman los que en ella intervienen a los 19 dias del mes de octubre del 2026;

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vias, Infraestructura y Vivienda

GEOVANNY ORTIZ PÉREZ
R.L. CONSORCIO AGUAS CLARAS
Contratista

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

Alcaldía de Ocaña

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

Gobierno de Colombia

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

CAPITULO	**1**	**EJECUTAR ACTIVIDADES PRELIMINARES**	**PERIODO COBRO:**	**Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026**
ITEM	**APU1**	**Localización y Replanteo**	**Unidad:**	**m2**

			Medidas				Totales		Registro Fotográfico
Fecha medición	**Frente**	**Observaciones**	**Long. (m)**	**Ancho (m)**	**Prof. (m)**	**Cant.**	**Total medidas (m2)**	**Acumulado medidas (m2)**	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P1-P2	41,2	0,6		1	24,72	24,72	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P2-P3	33,7	0,6		1	20,22	44,94	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P3-P4	51,5	0,6		1	30,9	75,84	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P4-P5	48,5	0,6		1	29,1	104,94	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P5-P6	50,7	0,6		1	30,42	135,36	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P6-P7	6	0,6		1	3,6	138,96	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P7-P8	68,6	0,6		1	41,16	180,12	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P8-P9	54,2	0,6		1	32,52	212,64	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" P9 - DESCARGA	18	0,6		1	10,8	223,44	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" P6 - C1	26	0,6		1	15,6	239,04	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" C1 - C2	4,5	0,6		1	2,7	241,74	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" CASA ALEDAÑA AL CEMENTERIO	18	0,25		1	4,5	246,24	





TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	**246**
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	**0**
ACUMULADO TOTAL	**246**

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

Alcaldía de Ocaña

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

Gobierno de Colombia

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

CAPITULO	2	REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS	PERIODO COBRO:	Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026	
ITEM	APU3	Excavación mecánica	Unidad:	m3	

			Medidas				Totales		Registro Fotográfico
Fecha medición	Frente	Observaciones	Long. (m)	Ancho (m)	Prof. (m)	Cant.	Total medidas (m3)	Acumulado medidas (m3)	
	FRENTE 1	PZ-1	1,8	1,8	1,8	1	5,832	5,832	
	FRENTE 1	PZ-2	1,8	1,8	1,8	1	5,832	11,664	
	FRENTE 1	PZ-3	1,8	1,8	1,8	1	5,832	17,496	
	FRENTE 1	PZ-4	1,8	1,8	2	1	6,48	23,976	
	FRENTE 1	PZ-5	1,8	1,8	2	1	6,48	30,456	
	FRENTE 1	PZ-6	1,8	1,8	3	1	9,72	40,176	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P1-P2	39,4	0,6	1,75	1	41,37	81,546	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P2-P3	31,9	0,6	1,75	1	33,495	115,041	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P3-P4	49,7	0,6	1,85	1	55,167	170,208	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P4-P5	46,7	0,6	1,95	1	54,639	224,847	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P5-P6	48,9	0,6	2	1	58,68	283,527	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P6-P7	4,2	0,6	1,65	1	4,158	287,685	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P7-P8	66,8	0,6	1,65	1	66,132	353,817	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" P4-P8 CONEXION A ALACANTARILLADO EXISTENTE	4	0,6	1,5	1	3,6	357,417	





TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	357,42
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	0
ACUMULADO TOTAL	357,42

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPULVEDA
Supervisor


MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

CAPITULO	**2**	**REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS**	**PERIODO COBRO:**	**Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026**
ITEM	**APU4**	**Excavación manual**	**Unidad:**	**m3**

			Medidas				Totales		Registro Fotográfico
Fecha medición	**Frente**	**Observaciones**	**Long. (m)**	**Ancho (m)**	**Prof. (m)**	**Cant.**	**Total medidas (m3)**	**Acumulado medidas (m3)**	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P8-P9	52,4	0,6	1,35	1	42,444	42,444	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P9-DESCARGA	17,1	0,6	1,35	1	13,851	56,295	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" P6 - C1	24,2	0,6	0,6	1	8,712	65,007	
	FRENTE 1	PZ-7	1,7	1,7	1,4	1	4,046	69,053	
	FRENTE 1	PZ-8	1,7	1,7	1,4	1	4,046	73,099	
	FRENTE 1	PZ-9	1,7	1,7	1,4	1	4,046	77,145	
	FRENTE 1	CAJAS SANTARIAS PARA CONEXIÓN DE 25 VIVIENDAS (C1 y C2)	0,8	0,8	0,8	2	1,024	78,169	
	FRENTE 1	CAJAS SANTARIAS PARA CONEXIÓN DE DOMICILIARIAS	0,8	0,8	0,8	14	7,168	85,337	
	FRENTE 1	ACOMETIDAS 4"	4,1	0,45	1	14	25,91	111,25	
		0							

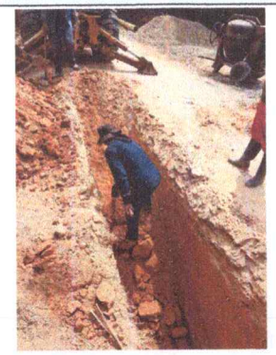



TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	**111,25**
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	**0**
ACUMULADO TOTAL	**111,25**

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

CAPITULO	**2**	**REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS**	**PERIODO COBRO:**	**Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026**	
ITEM	**APU5**	**Retiro de escombros**	**Unidad:**	**m3**	

			Medidas				Totales		Registro Fotográfico
Fecha medición	**Frente**	**Observaciones**	**Vol (m3)**	**%Exp**	**Prof. (m)**	**Cant.**	**Total medidas (m3)**	**Acumulado medidas (m3)**	
	FRENTE 1	EXCAVACIÓN MECÁNICA	357,42	25%		1	446,775	446,775	
	FRENTE 1	EXCAVACIÓN MANUAL	111,243996	25%		1	139,0549955	585,8299955	

TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	**585,83**
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	**0**
ACUMULADO TOTAL	**585,83**

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

Alcaldía de Ocaña

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

Gobierno de Colombia

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

CAPITULO	**2**	**REALIZAR LOS MOVIMIENTOS DE TIERRA Y RELLENOS**	**PERIODO COBRO:**	**Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026**
ITEM	**APU6**	**Suministro e instalación de recebo compactado alcantarillado**	**Unidad:**	**m3**

			Medidas				Totales		
Fecha medición	**Frente**	**Observaciones**	**Long. (m)**	**Ancho (m)**	**Prof. (m)**	**Cant.**	**Total medidas (m3)**	**Acumulado medidas (m3)**	**Registro Fotográfico**
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P1-P2	39,40	0,60	1,75	1	41,37	41,37	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P2-P3	31,90	0,60	1,75	1	33,495	74,865	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P3-P4	49,70	0,60	1,85	1	55,167	130,032	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P4-P5	46,70	0,60	1,95	1	54,639	184,671	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P5-P6	48,90	0,60	2,00	1	58,68	243,351	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P6-P7	4,20	0,60	1,65	1	4,158	247,509	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P7-P8	66,80	0,60	1,65	1	66,132	313,641	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P8-P9	52,40	0,60	1,35	1	42,444	356,085	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P9-DESCARGA	17,10	0,60	1,35	1	13,851	369,936	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P6-C1	24,20	0,60	0,60	1	8,712	378,648	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" P4-P8 CONEXION A ALACANTARILLADO EXISTENTE	4,00	0,60	1,50	1	3,6	382,248	
		Long Total Tubería Instalada	385,30						
		Se resta Capa de arena (h:0,34m)	385,30	0,6	0,34	-1	-78,6012	303,6468	
	FRENTE 1	ACOMETIDAS 4"	4,1	0,5	1	15	30,75	334,3968	
	FRENTE 1	ACOMETIDAS 4" CASA ARLEY TRAMO P7-P8	27	0,5	0,789	1	10,6515	345,0483	





TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	**345,05**
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	**0**
ACUMULADO TOTAL	**345,05**

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

Alcaldía de Ocaña

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

Gobierno de Colombia

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

CAPITULO	**3**	**REPONER LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO**	**PERIODO COBRO:**	**Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026**
ITEM	**APU8**	**Suministro e instalación de colchón de arena**	**Unidad:**	**m3**

			Medidas				Totales		Registro Fotográfico
Fecha medición	**Frente**	**Observaciones**	**Long. (m)**	**Ancho (m)**	**Prof. (m)**	**Cant.**	**Total medidas (m3)**	**Acumulado medidas (m3)**	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P1-P2	39,4	0,6	0,34	1	8,0376	8,0376	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P2-P3	31,9	0,6	0,34	1	6,5076	14,5452	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P3-P4	49,7	0,6	0,34	1	10,1388	24,684	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P4-P5	46,7	0,6	0,34	1	9,5268	34,2108	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P5-P6	48,9	0,6	0,34	1	9,9756	44,1864	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P6-P7	4,2	0,6	0,34	1	0,8568	45,0432	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P7-P8	66,8	0,6	0,34	1	13,6272	58,6704	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P8-P9	52,4	0,6	0,34	1	10,6896	69,36	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P9-DESCARGA	17,1	0,6	0,34	1	3,4884	72,8484	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P6-C1	24,2	0,6	0,34	1	4,9368	77,7852	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" P4-P8 CONEXION A ALCANTARILLADO EXISTENTE	4	0,6	0,34	1	0,816	78,6012	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" CASA ALEDAÑA AL CEMENTERIO	18	0,6	0,317	1	3,4236	82,0248	
		Long Total Tubería Instalada	403,30						
		Se resta Area sección del tubo (0,0314m2)	403,30	0,0314		-1	-12,66362	69,36	





TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	**69,36**
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	**0**
ACUMULADO TOTAL	**69,36**

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

CAPITULO	3	**REPONER LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO**	**PERIODO COBRO:**	**Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026**	
ITEM	APU9	**Construcción pozo de inspección**	**Unidad:**	**Und**	

			Medidas				Totales		
Fecha medición	**Frente**	**Observaciones**	**Long. (m)**	**Ancho (m)**	**Prof. (m)**	**Cant.**	**Total medidas (Und)**	**Acumulado medidas (Und)**	**Registro Fotográfico**
	FRENTE 1	P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9				9	9	9	







TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	9	Notas:
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	0	
ACUMULADO TOTAL	9	

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

CAPITULO	3	REPONER LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PERIODO COBRO:	Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026
ITEM	APU10	Acople sellado de red principal a pozo de inspección existente	Unidad:	Und

			Medidas				Totales		
Fecha medición	Frente	Observaciones	Long. (m)	Ancho (m)	Prof. (m)	Cant.	Total medidas (Und)	Acumulado medidas (Und)	Registro Fotográfico
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL con P2				1	1	1	

TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	1
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	0
ACUMULADO TOTAL	1

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

Alcaldía de Ocaña

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

Gobierno de Colombia

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vias y Carreteables

CAPITULO	**3**	**REPONER LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO**	**PERIODO COBRO:**	**Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026**	
ITEM	**APU11**	**Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 8"**	**Unidad:**	**Ml**	

			Medidas				Totales		Registro Fotográfico
Fecha medición	**Frente**	**Observaciones**	**Long. (m)**	**Ancho (m)**	**Prof. (m)**	**Cant.**	**Total medidas (ml)**	**Acumulado medidas (ml)**	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P1-P2	40			1	40	40	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P2-P3	32,55			1	32,55	72,55	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P3-P4	50,4			1	50,4	122,95	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P4-P5	47,31			1	47,31	170,26	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P5-P6	49,51			1	49,51	219,77	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P6-P7	4,8			1	4,8	224,57	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P7-P8	67,4			1	67,4	291,97	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P8-P9	53			1	53	344,97	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P9-DESCARGA	17,4			1	17,4	362,37	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL P6-C1	24,95			1	24,95	387,32	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" PRINCIPAL C1-C2	3,9			1	3,9	391,22	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" P4-P8 CONEXION A ALACANTARILLADO EXISTENTE	4			1	4	395,22	







TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	**395,22**
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	**0**
ACUMULADO TOTAL	**395,22**

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

CAPITULO	3	REPONER LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PERIODO COBRO:	Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026
ITEM	APU12	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 4"	Unidad:	Ml

			Medidas				Totales		Registro Fotográfico
Fecha medición	Frente	Observaciones	Long. (m)	Ancho (m)	Prof. (m)	Cant.	Total medidas (ml)	Acumulado medidas (ml)	
	FRENTE 1	ACOMETIDAS 4"	4			14	56	56	
	FRENTE 1	ACOMETIDAS 4" CASA ARLEY TRAMO P7-P8	11,5			1	11,5	67,5	





TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	67,5
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	0
ACUMULADO TOTAL	67,5

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS


OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vias y Carreteables

CAPITULO	3	**REPONER LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO**	**PERIODO COBRO:**	Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026	
ITEM	APU13	**Suministro e instalación de silla Yee 8" a 4"**	**Unidad:**	Und	

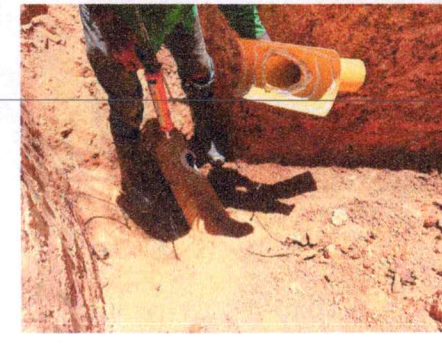			Medidas				Totales		Registro Fotográfico
Fecha medición	**Frente**	**Observaciones**	**Long. (m)**	**Ancho (m)**	**Prof. (m)**	**Cant.**	**Total medidas (Und)**	**Acumulado medidas (Und)**	
	FRENTE 1	ACOMETIDAS 4"				14	14	14	
	FRENTE 1	ACOMETIDAS 4" CASA ARLEY TRAMO P7-P8				1	1	15	

TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	**15**
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	**0**
ACUMULADO TOTAL	**15**

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

CAPITULO	3	REPONER LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	PERIODO COBRO:	Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026
ITEM	APU14	Caja de inspección sanitaria 60X60X60CM. Incluye tapa	Unidad:	Und

			Medidas				Totales		Registro Fotográfico
Fecha medición	Frente	Observaciones	Long. (m)	Ancho (m)	Prof. (m)	Cant.	Total medidas (Und)	Acumulado medidas (Und)	
	FRENTE 1	ACOMETIDAS 4"				14	14	14	
	FRENTE 1	ACOMETIDAS 4" CASA ARLEY TRAMO P7-P8				1	1	15	
	FRENTE 1	CAJAS SANTARIAS PARA CONEXIÓN DE 25 VIVIENDAS				2	2	17	
									

TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	17
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	0
ACUMULADO TOTAL	17

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

CAPITULO	4	Terminación y adecuación del sistema de alcantarillado	PERIODO COBRO:	Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026
ITEM	APU11	Suministro e instalación de tubería sanitaria PVC 8"	Unidad:	Ml

			Medidas				Totales		Registro Fotográfico
Fecha medición	Frente	Observaciones	Long. (m)	Ancho (m)	Prof. (m)	Cant.	Total medidas (ml)	Acumulado medidas (ml)	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" CASA ALEDAÑA AL CEMENTERIO	18			1	18	18	

TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	18
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	0
ACUMULADO TOTAL	18

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

Alcaldía de Ocaña

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

Gobierno de Colombia

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vias y Carreteables

CAPITULO	4	Terminación y adecuación del sistema de alcantarillado	PERIODO COBRO:	Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026
ITEM	APU14	Caja de inspección sanitaria 60X60X60CM. Incluye tapa	Unidad:	Und

			Medidas				Totales		Registro Fotográfico
Fecha medición	Frente	Observaciones	Long. (m)	Ancho (m)	Prof. (m)	Cant.	Total medidas (Und)	Acumulado medidas (Und)	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" CASA ALEDAÑA AL CEMENTERIO				1	1	1	

TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	1
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	0
ACUMULADO TOTAL	1

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPULVEDA SEPULVEDA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

PRE-ACTAS

CONTRATO No.:	SVIV SAMC 004 DE 2026
OBJETO:	OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA VEREDA CRISTO REY, CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER
CONTRATISTA:	CONSORCIO AGUAS CLARAS
SUPERVISOR:	OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPÚLVEDA, Profesional Universitario Área de Vías y Carreteables

CAPITULO	**5**	**ITEMS NO PREVISTOS**	**PERIODO COBRO:**	**Corte No. 1: Desde 27-Julio-2026 - Hasta 19-Octubre-2026**	
ITEM	**APU15**	**Concreto para atraque y revestimiento de tubería**	**Unidad:**	**m3**	

			Medidas				Totales		Registro Fotográfico
Fecha medición	**Frente**	**Observaciones**	**Long. (m)**	**Ancho (m)**	**Prof. (m)**	**Cant.**	**Total medidas (Und)**	**Acumulado medidas (Und)**	
	FRENTE 1	RED SANITARIA CONEXIÓN 25 VIVIENDAS	25	0,35	0,35	1	3,0625	3,0625	
	FRENTE 1	RED SANITARIA 8" - EMISARIO	5	0,35	0,35	1	0,6125	3,675	
		Long Total Tubería Instalada	30,00						
		Se resta Area sección del tubo (0,0314m2)	30,00	0,0314		-1	-0,942	2,733	





TOTAL ACTA DE OBRA No. 1 - ITEM APU1	**2,733**
TOTAL COBRADO ACTAS ANTERIORES	**0**
ACUMULADO TOTAL	**2,733**

Notas:

SERGIO DAVID PAREDES MANZANO
Residente de Obra
CONSORCIO AGUAS CLARAS

OLGER NEIL SEPÚLVEDA SEPULVEDA
Supervisor
