	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-019
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA	Versión	10
		Vigencia	12/03/2026

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	9/11/2026	PERIODO REPORTADO DEL:	1/10/2026	AL:	31/10/2026
CONTRATO N°	021-00-H-CACOM5-GRUAL-2026	CONTRATISTA	ALCAX INGENIERIA SAS		
OBJETO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y MEJORATIVO DE LAS INSTALACIONES AERONÁUTICAS Y NO AERONÁUTICAS DEL CACOM-5				
FECHA DE INICIO	1/06/2026	FECHA DE TERMINACIÓN	20/11/2026		

VALOR INICIAL	$ 1.748.625.166,00	VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 173.462.958,46	VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)	$ 0,00	VALOR TOTAL	$ 1.922.088.124,46

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

EL CONTRATO SE FIRMÓ EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2026, EL MISMO SE ENCUENTRA PERFECCIONADO DESDE EL 06 DE MAYO DE 2025, EL NÚMERO DE PÓLIZA VIGENTE ES EL NO. 30-44-101070061 Y 30-40-101026612 DE ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO.

A LA FECHA SE ENCUENTRAEN TRAMITADO Y PAGADO EL TERCER CORTE DE OBRA CON FECHA DE CORTE 15 OCTUBRE DE 2026, ASI MISMO, SE VIENE DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES Y ADICIONALES APROBADAS MEDIANTE MODIFICATORIO DEL 16 DE OCTUBRE, DEL CUAL SE ENCUENTRAN PUBLICADAS LAS POLIZAS.

3- CONTROL MODIFICATORIOS

MODIFICATORIO No.1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	15 Octubre de 2026
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Aclaración fecha de plazo de ejecución en plataforma de SECOP II hasta el 01 de noviembre de 2026 de acuerdo al acta de inicio
FORMA DE PAGO	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	01 Noviembre de 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.748.625.166,00

MODIFICATORIO No.2	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16 Octubre de 2026
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	Adición de recursos por valor de $173.462.903,00 , ampliación plazo de ejecución, modificación forma de pago, inclusión NPs, ajuste de garantías
FORMA DE PAGO	

PAC	VALOR PAGO	PLAZO Y/O CORTE DE EJECUCIÓN	FECHA RADICACION DE DOCUMENTOS
Noviembre	De acuerdo a facturación	15 de octubre de 2026	Cinco (05) días hábiles contados a partir del plazo de ejecución y/o corte según corresponda, para trámites administrativos, facturación, revisión y correcciones necesarias para la correspondiente gestión ante el Departamento Financiero.
Diciembre y/o cuentas por pagar		15 de noviembre de 2026	
Diciembre y/o cuentas por pagar		30 de noviembre de 2026	

PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	30 Noviembre de 2026
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.922.088.124,46

4- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicación contractual	Dedicación ejecutada	Cumplió/ No cumplió	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
		Cemento	80	Mezcladora	1	Ing. Director	1	5	7	SI	Se cumple con la dedicación exigida, teniendo en cuenta que el ingeniero civil especialista en estructuras se encuentra asignado al 100% a la obra del Salón de Soldados, garantizando su presencia permanente y participación directa en las actividades de ejecución del proyecto.
		Agregados	60	pulidora	3	Ing. Residente	1	100	100	SI	
		Cerámica	40	compresor de aire	1	Ing. Auxiliar	1	100	100	SI	
				vibro de concreto	1	Residente HSE	1	100	100	SI	
		Manto Asfaltico	10	cortadora de cerámica	1						
		Tablilla	40	hidrolavadora	2						
		Teja fibrocemento	50	planta eléctrica	1						
		Pintura coraza	2	equipo de soldadura	1						
		Pintura Vinilo	5	pluma de izaje	1						
		LAMINAS PVC	80	remachadora	1						
				cierra de mano	1						
				grafiadora de graniplas	1						
				talador	1						
				taladro inalámbrico	1						
						TOTAL	4				

5- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado mes anterior (Total)	46,30%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCION SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 19 (07/10/2026)	5,45%	59,85%	86,10%	-26,25%
Semana 20 (14/10/2026)	4,88%			
Semana 21 (21/10/2026)	2,10%			
Semana 22 (28/10/2026)	1,12%			

GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO






















GRÁFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPÍTULOS

CAPÍTULOS	AVANCE	GRÁFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. PRELIMINARES	PROGRAMADO		76,34%
	EJECUTADO		62,77%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
3. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS	PROGRAMADO		76,45%
	EJECUTADO		43,79%
4. CIMENTACIÓN	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
5. ESTRUCTURA	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%

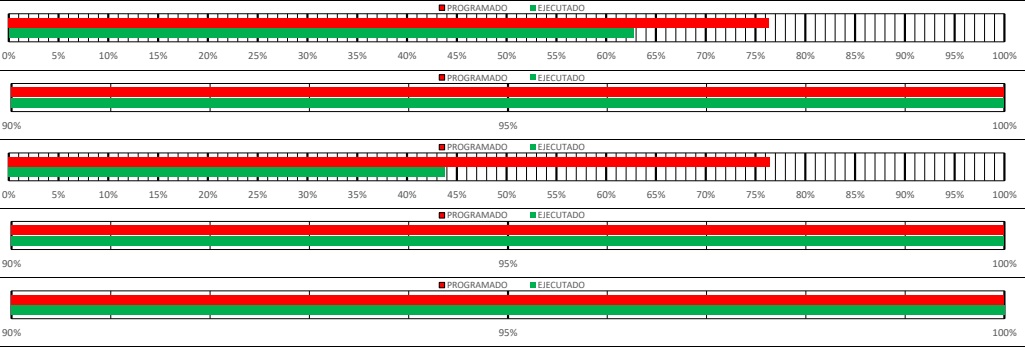

6. MAMPOSTERIA	PROGRAMADO		86,56%
	EJECUTADO		70,43%
7. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	PROGRAMADO		78,90%
	EJECUTADO		50,99%
8. INSTALACIONES ELECTRICAS	PROGRAMADO		92,45%
	EJECUTADO		77,96%
9. COMUNICACIONES: REDES, VOZ Y DATOS	PROGRAMADO		46,80%
	EJECUTADO		25,00%
10. PAÑETES	PROGRAMADO		76,40%
	EJECUTADO		41,59%
11. CIELO RASO	PROGRAMADO		87,12%
	EJECUTADO		61,35%
12. ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	PROGRAMADO		79,34%
	EJECUTADO		51,67%
13. ACABADOS DE MUROS, PINTURAS Y/O ENCHAPES	PROGRAMADO		88,34%
	EJECUTADO		76,31%
14. CARPINTERIA EN MADERA	PROGRAMADO		56,80%
	EJECUTADO		41,40%
15. CARPINTERIA METALICA	PROGRAMADO		45,50%
	EJECUTADO		25,00%
16. CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO	PROGRAMADO		47,00%
	EJECUTADO		28,00%
17. CARPINTERIA EN ACERO INOXIDABLE	PROGRAMADO		35,00%
	EJECUTADO		18,50%
18. CUBIERTAS	PROGRAMADO		99,45%
	EJECUTADO		94,25%
19. APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	PROGRAMADO		15,70%
	EJECUTADO		8,22%
20. VIDRIOS Y ESPEJOS	PROGRAMADO		48,00%
	EJECUTADO		28,00%
21. CERRADURAS	PROGRAMADO		28,00%
	EJECUTADO		12,18%
22. OBRAS GENERALES	PROGRAMADO		100,00%
	EJECUTADO		100,00%
23. URBANISMO	PROGRAMADO		76,30%
	EJECUTADO		55,85%
ACTIVIDADES ADICIONALES CONTRATO MODIFICATORIO			
1	PROGRAMADO		26,80%
	EJECUTADO		25,40%

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	173	153	20

7- REGISTRO FOTOGRÁFICO GENERAL

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Durante el Corte No. 3 se ejecutaron las actividades correspondientes a las etapas de demolición, desmonte, mantenimiento, excavación, adecuación de redes hidráulicas, construcción y acabados, de acuerdo con las especificaciones técnicas. Entre las actividades desarrolladas se encuentran la demolición de muros, placas, enchapes y cielorrasos; el desmonte de cubiertas, vidrios, aparatos sanitarios y luminarias; el mantenimiento de cubiertas y sumideros; la ejecución de excavaciones, zapatas, anclajes y placas de contrapiso; la instalación de puntos de agua fría; la conformación de alistados de piso; la instalación de enchapes, cerámicas, tejas y manto asfáltico; la aplicación de estuco y pintura tipo vinilo; el suministro e instalación de aparatos sanitarios; y la construcción de andenes en concreto estampado, conforme a las condiciones contractuales y a la supervisión de la obra.

9- ACTIVIDADES PENDIENTES DE INICIO O ATRASADAS

Actividad atrasada	Atribuible al contratista?			
Desarrollo de actividades de adecuacion Aulas GRUEA	SI		NO	X
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	
	SI		NO	

OBSERVACIONES: A pesar de contar con aprobacion de la adecuación de las aulas del GRUEA en el GRUSE, de acuerdo a la programacion establecida, se tiene un atraso debido a la proyeccion de ubicación inicial, sin embargo se vine adelantando esfuerzos con el fin de cumplir el plazo contractual y la necesidad de la entidad.

Por el tiempo pendiente de ejecucion se tiene el riesgo de poder finalizar el plazo de ejecucion con un atraso de la ejecucion, por lo cual se solicita se realice plan de contingencia con el fin de cumplir el cronograma de obra y el plazo de ejecucion establecido.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Valor Ejecutado a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+AIU+IVA	$ 1.748.625.166,00	$ 1.748.625.166,00	$ 1.150.369.742,49	59,85%	$ 771.718.381,97	40,15%
Adiciones	N/A	$ 173.462.958,46				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 1.748.625.166,00	$ 1.922.088.124,46				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 1.748.625.166,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 173.462.958,46	Adición aprobada mediante modificatorio del 16 de Octubre de 2026
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 1.922.088.124,46	
PRIMER PAGO PAC AGOSTO	$ 106.666.788,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE102 del 30 de Agosto de 2026 EQUIVALENTE AL 5,55% DE EJECUCION OP No. 342975526 del 26 de Agosto de 2026
SEGUNDO PAGO PAGO PAC AGOSTO	$ 218.910.203,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE103 del 24 de Agosto de 2026 EQUIVALENTE AL 16,94% DE EJECUCION OP No. 343941626 del 26 de Agosto de 2026
TERCER PAGO PAC OCTUBRE	$ 803.180.411,00	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No FE105 del 22 de Octubre de 2026 EQUIVALENTE AL 58,73% DE EJECUCION
TOTAL PAGADO A LA FECHA	$ 1.128.757.402,00	

12- CUMPLIMIENTO TRÁMITES Y COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS (Indicar las actividades administrativas y/o compromisos adquiridos por el Contratista durante el periodo)

ACTIVIDAD	APLICA	NO APLICA	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION SISTEMA DE GESTION	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION ORGANIGRAMA	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION ANALISIS AIU	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION ANALISIS APUS	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION CERTIFICADOS DE AFILIACION EPS Y ARL DEL PERSONAL	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION CORTE DE OBRA Y BALANCE CON FECHA 26 JUNIO	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION CORTE DE OBRA Y BALANCE CON FECHA 31 JULIO	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION CORTE DE OBRA Y BALANCE CON FECHA 15 OCTUBRE	SI		SI	SI	SI	
PRESENTACION DOCUMENTOS PARA MODIFICACION POR PRORROGA Y ADICION	SI		SI	SI	SI	

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda agilizar el tema de la adecuacion de las aulas del GRUEA con el fin de reducir de manera significativo el atraso reportado, asi mismo, se proyecte la ampliacion de la mano de obra de las actividades de carpinteria ya que la misma cuadrilla viene ejecutando de manera paralela los frentes abiertos sin adicionar mano de obra y bajando asi el rendimiento y poca finalizacion de dichos frentes, asi mismo, agilizar la adquisicion de diciones de vidrio para baños y divisiones de acero inoxidable para los baños de las aulas del GRUEA..

14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASÍ (Condiciones Climaticas):

El tiempo existente durante el período fue variable. Al inicio del mes se presentaron lloviznas de baja intensidad, mientras que durante el resto del mes predominaron condiciones de tiempo seco.

ELABORO:

CT. VANEGAS JAVIER
Supervisor Cto
Firma y Posfirma

REVISO:

Ingeniero KEVIN ESTEBAN GÓNGORA FONSECA
Residente de obra
Firma y Posfirma


15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERIODO REPORTADO (Debe incluirse en el registro fotográfico fecha, hora y lugar)




MUROS LIVIANOS



MUROS LIVIANOS



MUROS LIVIANOS



ENCHAPE Y GUARDAESCOBA



ENCHAPE Y GUARDAESCOBA




ENCHAPE Y GUARDAESCOBA



TABLERO ELECTRICO



TABLERO ELECTRICO



INSTALACION DE PUERTAS



INSTALACION DE PUERTAS



INSTALACION DE CLOSETH



INSTALACION DE CLOSETH



PLATINAS PARA ESTRUCTURA



PLATINAS PARA ESTRUCTURA



ESTRUCTURA METALICA



ESTRUCTURA METALICA

			
MAMPOSTERIA	MAMPOSTERIA	INSTALACION HIDROSANITARIA	INSTALACION HIDROSANITARIA

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ALCAX INGENIERIA – CACOM 5
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

31 DE OCTUBRE 2026

4. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INTRODUCCIÓN

En el marco de las actividades desarrolladas en el proyecto CACOM 5, desde el área de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se realizó acompañamiento y seguimiento a las labores ejecutadas por el personal contratista, con el propósito de fortalecer la prevención y el control de los riesgos presentes en los diferentes frentes de trabajo.

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de OCTUBRE de 2026, se llevaron a cabo acciones encaminadas a promover comportamientos seguros, verificar el cumplimiento de las medidas de prevención y fomentar una cultura de autocuidado entre los trabajadores. Estas actividades permitieron identificar oportunidades de mejora y realizar intervenciones oportunas frente a las condiciones de seguridad observadas.

El presente informe tiene como finalidad presentar las principales actividades realizadas desde el área de SST durante el periodo mencionado, así como las acciones de seguimiento, sensibilización y control implementadas para contribuir a la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y posibles afectaciones a la salud de los colaboradores.

OBJETIVOS

Objetivo general

Fortalecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo del personal contratista que desarrolla actividades en CACOM 5, mediante acciones de prevención, acompañamiento, seguimiento y promoción del autocuidado.

Objetivos específicos

➢ Realizar seguimiento a las condiciones de seguridad presentes en los diferentes frentes de trabajo.

➢ Promover en los trabajadores la identificación oportuna de peligros y la aplicación de medidas de control.

➢ Fomentar prácticas de autocuidado y comportamientos seguros durante el desarrollo de las actividades laborales.

➢ Verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas para la ejecución de las tareas.

➢ Desarrollar actividades de capacitación, sensibilización e intervención orientadas a la prevención de incidentes y accidentes de trabajo.

➢ Identificar oportunidades de mejora que permitan fortalecer continuamente la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

➢ Contribuir al mantenimiento de ambientes laborales seguros, saludables y adecuados para el desarrollo de las actividades.

- **ALCANCE**

Aplica para los contratistas que presten un servicio alcax ingeniería para la correspondiente verificación del cumplimiento de las actividades realizadas referente a SST y Considerando los diferentes hallazgos.


Alcax Ingeniería sas	**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ALCAX INGENIERIA – CACOM 5**
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

- **DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA**

- Nombre de la empresa: ALCAX INGENIERIA
- NIT: 901263039
- Actividad económica: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
- Denominación Obra y/o Actividad: OBRA CIVIL
- Localización: CACOM 5 RIONEGRO
- Región: ORIENTE
- Departamento: ANTIOQUIA
- Municipio: RIONEGRO

- **INGRESO DE PERSONAL.**

Tabla 1.1. Personal operativo que ingresó desde el primero (01) hasta el treinta y uno (31) de OCTUBRE del año 2026.

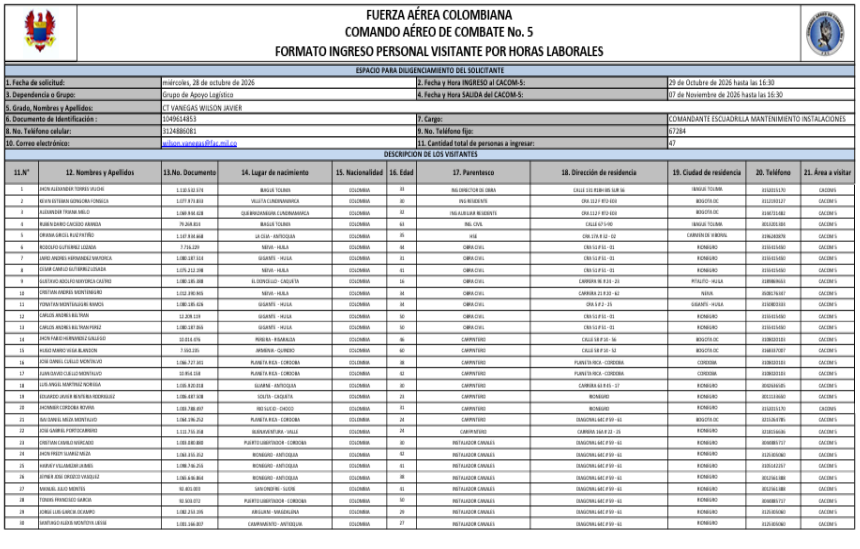


FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5
FORMATO INGRESO PERSONAL VISITANTE POR HORAS LABORALES

ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL SOLICITANTE

1. Fecha de solicitud:	miércoles, 28 de octubre de 2026	2. Fecha y Hora INGRESO al CACOM-5:	29 de Octubre de 2026 hasta las 16:30
3. Dependencia o Grupo:	Grupo de Apoyo Logístico	4. Fecha y Hora SALIDA del CACOM-5:	07 de Noviembre de 2026 hasta las 16:30
5. Grado, Nombres y Apellidos:	CT VANEGAS WILSON JAVIER		
6. Documento de Identificación :	1049614853	7. Cargo:	COMANDANTE ESCUADRILLA MANTENIMIENTO INSTALACIONES
8. No. Teléfono celular:	3124886081	9. No. Teléfono fijo:	67284
10. Correo electrónico:	wilson.vanegas@fac.mil.co	11. Cantidad total de personas a ingresar:	47

DESCRIPCION DE LOS VISITANTES

11.N°	12. Nombres y Apellidos	13.No. Documento	14. Lugar de nacimiento	15. Nacionalidad	16. Edad	17. Parentesco	18. Dirección de residencia	19. Ciudad de residencia	20. Teléfono	21. Área a visitar
1	JHON ALEXANDER TORRES VILCHIS	1.110.5.92.674	BARQUE TOLIMA	COLOMBIA	33	ING DIRECTOR DE OBRA	CALLE 131 #189 #85 SUR 56	IBAGUE TOLIMA	3152215170	CACOM5
2	KEVIN ESTEBAN GONGORA FONSECA	1.077.973.810	VILLETA CUNDINAMARCA	COLOMBIA	30	PVG RESIDENTE	CRA 112 F 972 #33	BOGOTA DC	3112205127	CACOM 5
3	ALEXANDER TIRADO MILO	1.060.9.44.628	QUEBRADANEGRA CUNDINAMARCA	COLOMBIA	32	ING AUXILIAR RESIDENTE	CRA 112 F 972 #33	BOGOTA DC	3138721682	CACOM 5
4	RUBEN DARIO CAICEDO ARANDA	79.268.816	IBAGUE TOLIMA	COLOMBIA	63	ING. CIVIL	CALLE 67 5-90	IBAGUE TOLIMA	3016305.084	CACOM 5
5	DRIANA GIRALDA RUIZ PATIÑO	1.107.8.44.668	LA CEJA - ANTIOQUIA	COLOMBIA	35	HSE	CRA 17A # 52 - 02	CARMEN DE VIBORAL	3196282870	CACOM 5
6	RODOLFO GUTIERREZ LOZADA	7.716.129	NEIVA - HUILA	COLOMBIA	68	OBRA CIVIL	CRA 5 # 8 #1 - 51	RIONEGRO	3155415450	CACOM 5
7	DAVID ANDRES HERNANDEZ VASQUEZ	1.080.187.553	GIGANTE - HUILA	COLOMBIA	31	OBRA CIVIL	CRA 5 # 8 #1 - 51	RIONEGRO	3155415450	CACOM 5
8	CESAR CAMILO GUTIERREZ LOZADA	1.075.212.298	NEIVA - HUILA	COLOMBIA	31	OBRA CIVIL	CRA 5 # 8 #1 - 51	RIONEGRO	3155415450	CACOM 5
9	GUSTAVO ADOLFO RIVEROS CASTRO	1.080.185.388	EL DONCELLO - CAQUETA	COLOMBIA	34	OBRA CIVIL	CARRERA 9E # 24 - 23	PITALITO - HUILA	3188628653	CACOM 5
10	CRISTIAN ANDRES MONTERO NO	1.012.330.965	NEIVA - HUILA	COLOMBIA	34	OBRA CIVIL	CARRERA 21 # 20 - 62	NEIVA	3508176187	CACOM 5
11	JHONATAN MONTEALEGRE RAMOS	1.080.185.426	GIGANTE - HUILA	COLOMBIA	34	OBRA CIVIL	CRA 5 # 2 - 23	GIGANTE - HUILA	3156815163	CACOM 5
12	CARLOS ANDRES BELTRAN	12.208.119	GIGANTE - HUILA	COLOMBIA	50	OBRA CIVIL	CRA 5 # 8 #1 - 51	RIONEGRO	3155415450	CACOM 5
13	CARLOS ANDRES BELTRAN PEREZ	1.080.187.063	GIGANTE - HUILA	COLOMBIA	50	OBRA CIVIL	CRA 5 # 8 #1 - 51	RIONEGRO	3155415450	CACOM 5
14	JHON FABIO HERNANDEZ GALLEGO	10.014.976	PEREIRA - RISARALDA	COLOMBIA	36	CARPINTERO	CALLE 58 # 16 - 56	BOGOTA DC	3138203101	CACOM 5
15	HUGO MARIO VIVAS ALAVISON	7.563.235	APARTADA - QUINDIO	COLOMBIA	60	CARPINTERO	CALLE 58 # 16 - 52	BOGOTA DC	3148197287	CACOM 5
16	JOSE DANIEL CUELLO MONTALVO	1.066.727.001	PLANETA RICA - CORDOBA	COLOMBIA	28	CARPINTERO	PLANETA RICA - CORDOBA	CORDOBA	3138203101	CACOM 5
17	JUAN DAVID CUELLO MONTALVO	10.954.158	PLANETA RICA - CORDOBA	COLOMBIA	42	CARPINTERO	PLANETA RICA - CORDOBA	CORDOBA	3138203101	CACOM 5
18	LUIS ANGEL MARTINEZ MORENO	1.035.9.20.818	GUAPAS - ANTIOQUIA	COLOMBIA	30	CARPINTERO	CARRERA 64 # 45 - 37	RIONEGRO	3505656585	CACOM 5
19	EDUARDO JAVIER MONTERO RODRIGUEZ	1.006.487.908	SOLITA - CAQUETA	COLOMBIA	23	CARPINTERO	RIONEGRO	RIONEGRO	3053158060	CACOM 5
20	JHONNIER CORDOBA ROMIS	1.003.746.007	RIO SUCIO - CHOCO	COLOMBIA	31	CARPINTERO	RIONEGRO	RIONEGRO	3152215170	CACOM5
21	BAYRON EL MEZA MONTALVO	1.066.596.252	PLANETA RICA - CORDOBA	COLOMBIA	24	CARPINTERO	DIAGONAL 64C # 59 - 61	BOGOTA DC	3233267785	CACOM 5
22	JOSE GABRIEL PORTOCARRERO	1.112.770.358	BUENAVENTURA - VALLE	COLOMBIA	24	CARPINTERO	CARRERA 16A # 22 - 25	RIONEGRO	3216516636	CACOM 5
23	CRISTIAN CAMILO MERCADO	1.000.330.800	PUERTO LIBERTADOR - CORDOBA	COLOMBIA	30	INSTALADOR CANALES	DIAGONAL 64C # 59 - 61	RIONEGRO	3046885717	CACOM 5
24	JHON FREDY SUAREZ MEJIA	1.061.331.352	RIONEGRO - ANTIOQUIA	COLOMBIA	43	INSTALADOR CANALES	DIAGONAL 64C # 59 - 61	RIONEGRO	3135183060	CACOM 5
25	HARVEY VILLAMIZAR LIBIAS	1.088.7.46.255	RIONEGRO - ANTIOQUIA	COLOMBIA	41	INSTALADOR CANALES	DIAGONAL 64C # 59 - 61	RIONEGRO	3135162257	CACOM 5
26	JEFFER JOSE OROZCO VASQUEZ	1.061.6.46.864	RIONEGRO - ANTIOQUIA	COLOMBIA	38	INSTALADOR CANALES	DIAGONAL 64C # 59 - 61	RIONEGRO	3052561388	CACOM 5
27	MANUEL JULIO MENTES	92.503.003	SAN ONOFRE - SUCRE	COLOMBIA	41	INSTALADOR CANALES	DIAGONAL 64C # 59 - 61	RIONEGRO	3052561388	CACOM 5
28	TOMAS FRANCISCO GARCIA	92.503.072	PUERTO LIBERTADOR - CORDOBA	COLOMBIA	50	INSTALADOR CANALES	DIAGONAL 64C # 59 - 61	RIONEGRO	3046885717	CACOM 5
29	JORGE LUIS GARCIA OCAMPO	1.082.213.296	ARIGUANI - MAGDALENA	COLOMBIA	29	INSTALADOR CANALES	DIAGONAL 64C # 59 - 61	RIONEGRO	3135183060	CACOM 5
30	SANTIAGO ALEXIS MONTOYA LEYVA	1.001.246.007	CAMPAMENTO - ANTIOQUIA	COLOMBIA	27	INSTALADOR CANALES	DIAGONAL 64C # 59 - 61	RIONEGRO	3135183060	CACOM 5

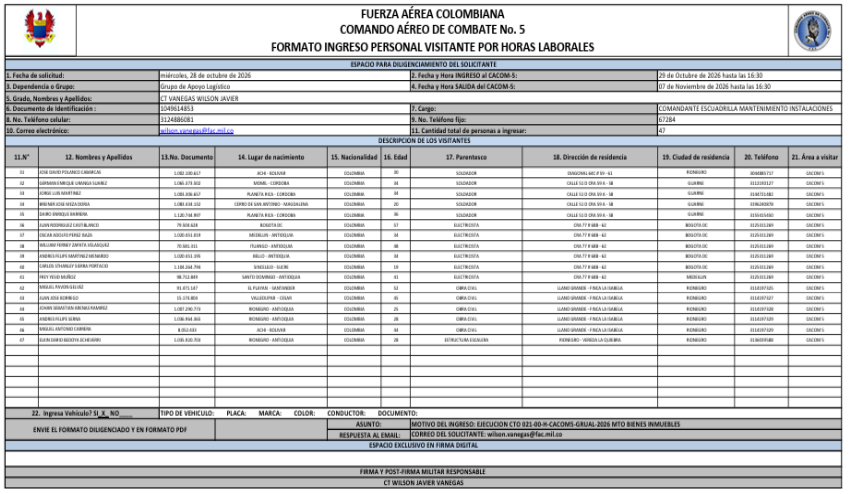

FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 5
FORMATO INGRESO PERSONAL VISITANTE POR HORAS LABORALES

ESPACIO PARA DILIGENCIAMIENTO DEL SOLICITANTE

1. Fecha de solicitud:	miércoles, 28 de octubre de 2026	2. Fecha y Hora INGRESO al CACOM-5:	29 de Octubre de 2026 hasta las 16:30
3. Dependencia o Grupo:	Grupo de Apoyo Logístico	4. Fecha y Hora SALIDA del CACOM-5:	07 de Noviembre de 2026 hasta las 16:30
5. Grado, Nombres y Apellidos:	CT VANEGAS WILSON JAVIER		
6. Documento de Identificación :	1049614853	7. Cargo:	COMANDANTE ESCUADRILLA MANTENIMIENTO INSTALACIONES
8. No. Teléfono celular:	3124886081	9. No. Teléfono fijo:	67284
10. Correo electrónico:	wilson.vanegas@fac.mil.co	11. Cantidad total de personas a ingresar:	47

DESCRIPCION DE LOS VISITANTES

11.N°	12. Nombres y Apellidos	13.No. Documento	14. Lugar de nacimiento	15. Nacionalidad	16. Edad	17. Parentesco	18. Dirección de residencia	19. Ciudad de residencia	20. Teléfono	21. Área a visitar
31	JOSE DAVID POLANCO CABARCAS	1.082.100.417	ACH - ADUANA	COLOMBIA	30	SOLDADOR	DIAGONAL 64C # 59 - 61	RIONEGRO	3046885717	CACOM 5
32	GERMAN ENRIQUE URANGA SUAREZ	1.065.273.310	MONA - CORDOBA	COLOMBIA	34	SOLDADOR	CALLE 51 D CRA 104 A - 58	GUARNE	3113335127	CACOM 5
33	JORGE LUIS MARTINEZ	1.085.836.457	PLANETA RICA - CORDOBA	COLOMBIA	34	SOLDADOR	CALLE 51 D CRA 104 A - 58	GUARNE	3148731482	CACOM 5
34	WILMER JOSE MEZA OVIEDO	1.083.434.162	CERRO DE SAN ANTONIO - MAGDALENA	COLOMBIA	20	SOLDADOR	CALLE 51 D CRA 104 A - 58	GUARNE	3196283070	CACOM 5
35	DIANO ENRIQUE BARRIOS	1.120.734.897	PLANETA RICA - CORDOBA	COLOMBIA	34	SOLDADOR	CALLE 51 D CRA 104 A - 58	GUARNE	3156435450	CACOM 5
36	JUAN RODRIGUEZ CASTILLANCO	79.504.624	BOGOTA DC	COLOMBIA	57	ELECTRICISTA	CRA 77 # 64B - 62	BOGOTA DC	3125311369	CACOM 5
37	OSCAR RODOLFO PEREZ RAZA	1.020.451.019	MEDELLIN - ANTIOQUIA	COLOMBIA	34	ELECTRICISTA	CRA 77 # 64B - 62	BOGOTA DC	3125311369	CACOM 5
38	WILLIAM FERNEY ZAPATA VELASQUEZ	70.561.151	ITUANGO - ANTIOQUIA	COLOMBIA	48	ELECTRICISTA	CRA 77 # 64B - 62	BOGOTA DC	3125311369	CACOM 5
39	ANDRES FELIPE MARTINEZ NATARENO	1.020.451.199	BELLO - ANTIOQUIA	COLOMBIA	34	ELECTRICISTA	CRA 77 # 64B - 62	BOGOTA DC	3125311369	CACOM 5
40	CARLOS STRANGUT BORRA PORTACIO	1.138.268.794	SINCELEJO - SUCRE	COLOMBIA	19	ELECTRICISTA	CRA 77 # 64B - 62	BOGOTA DC	3125311369	CACOM 5
41	FREY VELEZ MUÑOZ	98.712.889	SANTO DOMINGO - ANTIOQUIA	COLOMBIA	41	ELECTRICISTA	CRA 77 # 64B - 62	MEDELLIN	3125311369	CACOM 5
42	MIGUEL PAVON SUAREZ	91.471.147	EL PLAYON - SANTANDER	COLOMBIA	52	OBRA CIVIL	LLANO GRANDE - FINCA LA ISABELA	RIONEGRO	3114337325	CACOM 5
43	JUAN JOSE RODRIGUEZ	13.170.803	VILLAVICENCIA - CESAR	COLOMBIA	35	OBRA CIVIL	LLANO GRANDE - FINCA LA ISABELA	RIONEGRO	3114337327	CACOM 5
44	JOHAN SEBASTIAN ARENAS RAMIREZ	1.037.240.773	RIONEGRO - ANTIOQUIA	COLOMBIA	25	OBRA CIVIL	LLANO GRANDE - FINCA LA ISABELA	RIONEGRO	3114337328	CACOM 5
45	ANDRES FELIPE SERNA	1.036.964.365	RIONEGRO - ANTIOQUIA	COLOMBIA	28	OBRA CIVIL	LLANO GRANDE - FINCA LA ISABELA	RIONEGRO	3114337329	CACOM 5
46	MIGUEL ANTONIO CARRERA	8.053.631	ACH - ADUANA	COLOMBIA	64	OBRA CIVIL	LLANO GRANDE - FINCA LA ISABELA	RIONEGRO	3114337329	CACOM 5
47	JUAN DAVID MADERA ECHEVERRI	1.036.930.769	RIONEGRO - ANTIOQUIA	COLOMBIA	28	ESTRUCTURA ESCALERA	RIONEGRO - VEREDA LA CLEMENCIA	RIONEGRO	3146939580	CACOM 5

22. Ingresa Vehículo? SI_X_ NO___	TIPO DE VEHICULO:	PLACA: MARCA: COLOR:	CONDUCTOR: DOCUMENTO:
ENVIE EL FORMATO DILIGENCIADO Y EN FORMATO PDF		ASUNTO:	MOTIVO DEL INGRESO: EJECUCION CTO 021-00-N-CACOM5-GRUAL-2026 MTO BIENES INMUEBLES
		RESPUESTA AL EMAIL:	CORREO DEL SOLICITANTE: wilson.vanegas@fac.mil.co

ESPACIO EXCLUSIVO EN FIRMA DIGITAL

FIRMA Y POST-FIRMA MILITAR RESPONSABLE
CT WILSON JAVIER VANEGAS

- **EXAMÉN MÉDICO DE INGRESO OCUPACIONAL**

Anexo A 1. Exámenes médicos del personal.

Previo y durante el contrato se realizó exámenes médicos de ingreso ocupacionales con el objeto de identificar y valorar clínicamente al personal que hace parte de la Obra ejecutada en el CACOM5, y acatar desde el área de seguridad y salud en el trabajo las recomendaciones y restricciones emitidas por la entidad de salud.


Se envía certificado de exámenes médicos del personal que ingreso durante el mes


Durante el mes no se realizaron exámenes médicos


- **AFILIACIONES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL.**

Los empleados son afiliados previamente a una entidad promotora de servicios en salud contributiva, un fondo de pensiones, administradora de riesgos laborales y caja de compensación.

Se envía soportes de la afiliación del personal

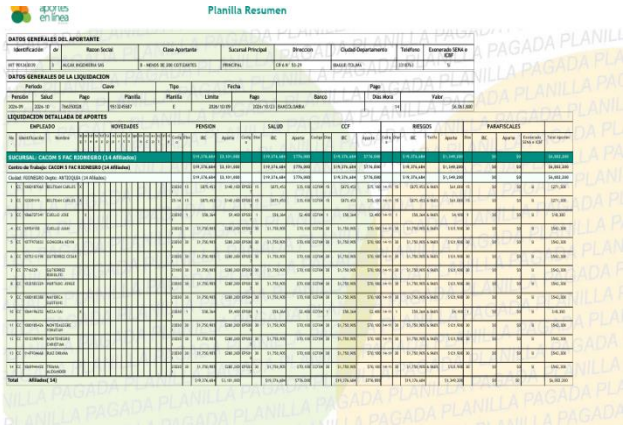
Planilla Resumen

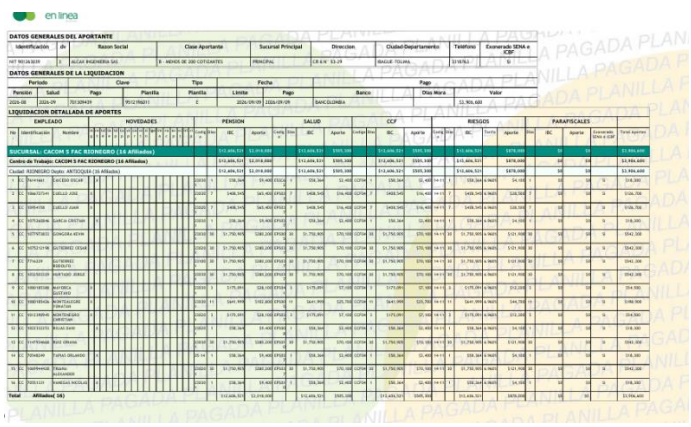

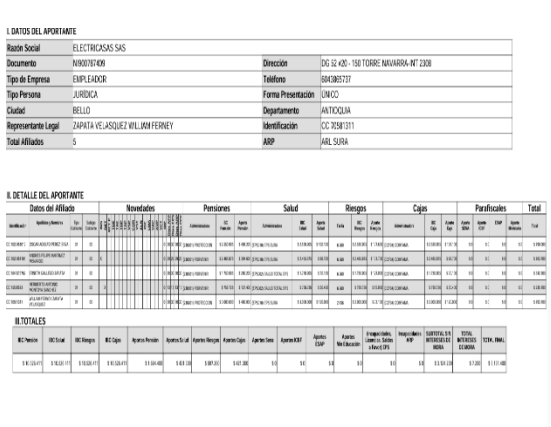

- **Tabla Personal** operativo que ingreso nuevo con sus respectivas afiliaciones a la seguridad social.

➢ **Se envía por correo las afiliaciones del personal activo en obra a la fecha**

4.8 NOVEDADES DEL PERSONAL

- Retiro

A continuación, se relacionó el personal que se retiró durante el mes de OCTUBRE 2026

EMPRESA	ID TRABAJADOR	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRE	CARGO	NOMBRE SUCURSAL	NOMBRE CENTRO TRABAJO	FECHA INGRESO	NOVEDAD	
ALCAX	C1069944428	TRIANA	MELO	ALEXANDER	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	19-05-2026	CONTINUA	
ALCAX	C8357302	GOMEZ	RENDON	CARLOS ANDRES	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	27-07-2026	RETIRADO	
ALCAX	C1075212198	GUTIERREZ	LOSADA	CESAR CAMILO	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	28-07-2026	CONTINUA	
ALCAX	C1012390945	MONTENEGRO		CHRISTIAN ANDRES	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	20-08-2026	CONTINUA	
ALCAX	C41915595	OSPINA	BARRERA	CLARA INES	SERVICIO	SEDE	NEIVA CASA 29	03-09-2026	CONTINUA	
ALCAX	C1075260846	GARCIA	RIVERA	CRISTIAN CAMILO	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	27-05-2026	RETIRADO	
ALCAX	C1022332253	ROJAS	GURRERO	DANI GONZALO	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	14-07-2026	RETIRADO	
ALCAX	C71291805	SALDARRIAGA	SANCHEZ	EDISON MAURICIO	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	28-07-2026	RETIRADO	
ALCAX	C1080185388	MAYORCA	CASTRO	GUSTAVO ADOLFO	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	20-08-2026	CONTINUA	
ALCAX	C1107509258	PEÑA	PERDOM	HEIBAR	INGENIERO	SEDE	SANTA ROSA CAUCA	18-08-2026	CONTINUA	
ALCAX	C1080187514	HERNANDEZ	MAYORC	JAIRO ANDRES	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	18-06-2026	CONTINUA	
ALCAX	C1117547338	GONZALEZ	BALENCIA	JHOELL FELIPE	REPRESENTA	SEDE	OFICINA ALCAX	04-06-2025	CONTINUA	
ALCAX	C1037600490	VILLADA	SIERRA	JORGE EDUARDO	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	28-07-2026	RETIRADO	
ALCAX	C7010764	AMAYA	LOPEZ	JOSE ALBIN	AUXILIAR	SEDE	SANTA ROSA CAUCA	31-07-2026	CONTINUA	
ALCAX	C1066727341	CUELLO	MONTALV	JOSE DANIEL	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	24-08-2026	CONTINUA	DEC
ALCAX	C10954158	CUELLO	MONTALV	JUAN DAVID	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	24-08-2026	CONTINUA	DEC
ALCAX	C1077973833	GONGORA	FONSECA	KEVIN ESTEBAN	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	11-05-2026	CONTINUA	
ALCAX	C4764065	LARA	ORTIZ	LEOVIDIER IVAN	AUXILIAR	SEDE	SANTA ROSA CAUCA	27-08-2026	CONTINUA	
ALCAX	C1061727370	ORDOÑEZ	RIASCOS	LINA MARITZA	AUXILIAR	SEDE	SANTA ROSA CAUCA	27-08-2026	CONTINUA	
ALCAX	C10300819	ZEMANATE	SILVA	LUIS GERARDO	AUXILIAR	SEDE	SANTA ROSA CAUCA	27-08-2026	CONTINUA	
ALCAX	C70551331	VANEGAS	ACEVEDO	NICOLAS GUILLERMO	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	07-07-2026	RETIRADO	
ALCAX	C1147934668	RUIZ	PATIÑO	ORIANA GRISEL	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	27-05-2026	CONTINUA	
ALCAX	C70548249	TAPIAS	CASTAÑE	ORLANDO DE J	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	29-05-2026	RETIRADO	
ALCAX	C76141661	CAICEDO	RODRIGU	OSCAR ARMANDO	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	21-07-2026	RETIRADO	
ALCAX	C7716229	GUTIERREZ	LOSADA	RODOLFO	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	19-05-2026	CONTINUA	
ALCAX	C1080185426	MONTEALEGRE	RAMOS	YONATAN	AUXILIAR	SEDE	CACOM 5 FAC	20-08-2026	CONTINUA	
ALCAX	C 1086049328	GUERRERO	TENORIO	KEVIN	STIVEN	SEDE	CACOM 5 FAC	10/09/2026	CONTINUA	DEC
ALCAX	C103590018	MARTINEZ	NORIEGA	LUIS	ANGEL	SEDE	CACOM 5 FAC	15/09/2026	CONTINUA	DEC
ALCAX	C1080187065	BELTRAN	PEREZ	CARLOS	ANDRES	SEDE PRINCIPAL	CACOM 5 FAC RIONEGRO	16/09/2026	CONTINUA	
ALCAX	C12209119	BELTRAN		CARLOS	ANDRES	SEDE PRINCIPAL	CACOM 5 FAC RIONEGRO	17/09/2026	CONTINUA	

Tabla 1.5 Personal Operativo

4.9 CONSOLIDADO DEL PERSONAL PROMEDIO QUE INGRESÓ EN EL MES DE OCTUBRE 2026

Tabla 1.6 Consolidado

AREA	HOMBRES	MUJERES	TOTAL
OPERATIVOS	11	0	11
ADMINISTRATIVOS	0	0	0
TOTAL			**11**


4.10 DISTRIBUCIÓN DEL PERSONAL DE ACUERDO CON LA ZONA DONDE HABITA EL PERSONAL.

Tabla 1.7. Perfil Sociodemográfico, personal CACOM 5


Municipio/Dpto./País Natal	Cantidad	Municipio Residente
HUILA	8	NEIVA
ANTIOQUIA	2	ENVIGADO
ANTOQUIA	9	MEDELLIN
ANTIOQUIA	7	RIONEGRO
CUNDINAMARCA	6	BOGOTA
ANTOQUIA	1	CARMEN DE VIBORAL
Total	33	


4.11 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD

Figura 1. Ausentismo por enfermedad general

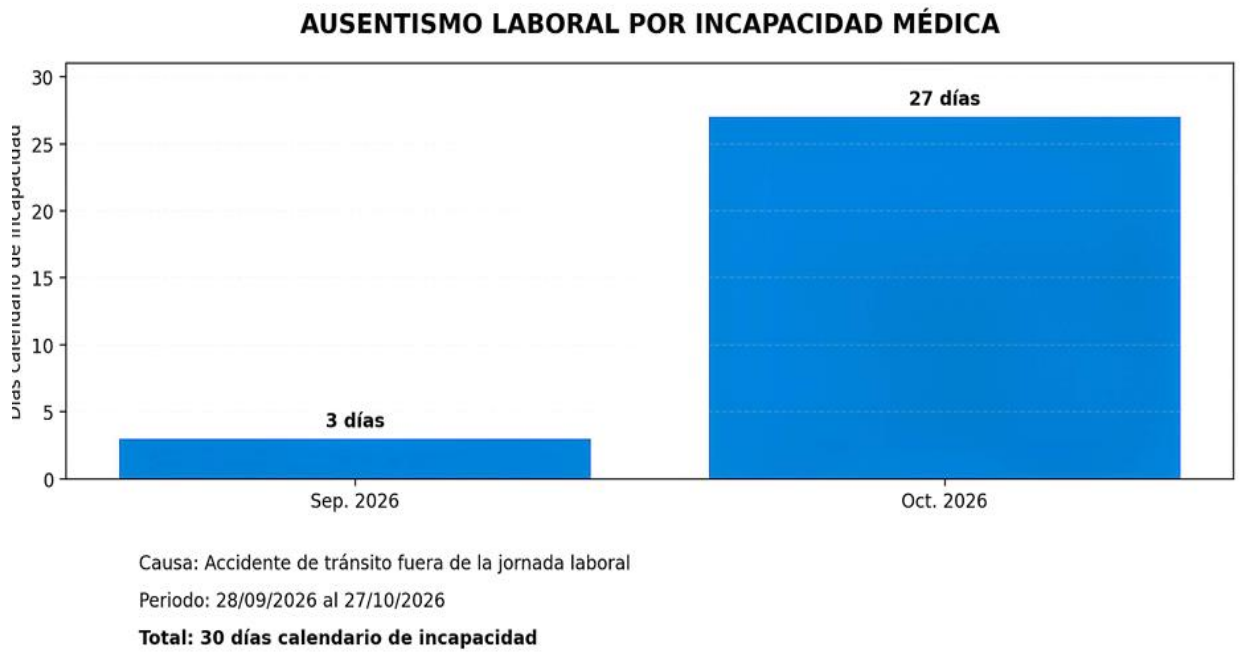

desde el primero (01) de OCTUBRE hasta el treinta y uno (31) de OCTUBRE del año 2026. se presentó 1 ausentismo por enfermedad general de origen común con un porcentaje del 9.09 % de inasistencia durante el mes de septiembre.

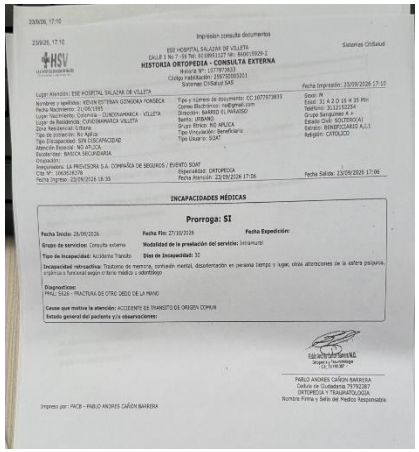



4.12 ACTIVIDADES ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

4.13 Inspección de Maquinaria y Equipo

A continuación, se evidenció mediante registro fotográfico y documentación inspecciones preoperacionales de Pulidora, Taladro, Entre otras ejecutadas durante el mes de OCTUBRE

Registro fotográfico 1. Inspección preoperacional




Fuente: Elaboración propia

Tabla 1.8. inspección de maquinaria

Fecha de inspección de maquinaria	Maquinaria
TODO EL MES	TALADRO
TODO EL MES	PULIDORA
TODO EL MES	EQUIPO DE SOLDAR

Fuente: elaboración propia

Anexo A3: Preoperacionales desde el primero (1) de OCTUBRE hasta el treinta y uno (31) de OCTUBRE del año 2026, Escanear y enviar en PDF

4.14 **ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**.

Se dotó a todo el personal con los elementos de protección personal necesarios según cada actividad, casco de seguridad, gafas de seguridad, protectores auditivos, protección respiratoria, guantes de carnaza, guantes de caucho, uniformes, botas de seguridad, línea de vida, arnés y eslinga.

Anexo A4: formatos de entrega elementos de protección personal EPP).

Registro fotográfico 2. Trabajador con EPP





Fuente: Elaboración propia

Tabla 10. Relación de ATS Generados durante el periodo.

Instalación de estructura (soldadura)
Mantenimiento de cubierta y canales
Mampostería, techo fachada revoque y pintura de muros
Carpintería en general pulida, pintura, reparación de madera.
Instalación de canales
instalación de puertas y ventanas
Anden demolición y vaciado de anden

- Se evidenciaron 7 ATS ejecutados desde el primero (1) de OCTUBRE hasta el treinta y uno (31) de OCTUBRE del año 2026. se genera semanal.

Permiso para trabajo en alturas

Se tubo acompañamiento para generar los permisos de altura por parte de los trabajadores

Registro fotográfico 3. Foto del trabajo en altura realizado





Fuente: Elaboración propia

Tabla 11. Relación a permisos emitidos.

Fecha	Descripción de la tarea	Coordinador de alturas
Instalación de canoas en barracas de oficiales	Instalación de canales en barracas de oficiales	ORIANA RUIZ

Instalación de estructura con soldadura	Estructura con soldadura	ORIANA RUIZ

Fuente: elaboración propia

Se anexó A6. Permiso y documentos del coordinador de alturas

- **PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y CAPACITACIÓN**

Por el cual se proporciona a los trabajadores al inicio de sus labores la información básica de acuerdo a sus funciones y riesgos inherentes en su área de trabajo, como prevenir accidentes e incidentes laborales todo el tema de normatividad de seguridad y salud en el trabajo, peligros a los que van a estar expuestos en sus labores, política de SST, plan de emergencia, COPASST, ARL a la que encuentran afiliados, definición de incidente, accidente, entre otros aspectos relevantes en SST.

4.15 CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO.

Registro fotográfico 4. Capacitación y entrenamiento



Fuente: Elaboración propia

Tabla 12. Relación de personal con curso de alturas y coordinador

Fecha	Nombre y apellido	Documento enviado	Cargo	Centro de entrenamiento	validación certificada
25/08/2022	ORIANA RUIZ PATIÑO	1147934668	COORDINADORA DE ALTURA	ALTURA MAMBUSCAY SAS	https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_lista.aspx
28/05/2026	ORIANA RUIZ PATIÑO	1147934668	REENTRENAMIENTO	ANSAR CENTRO DE FORMACION PARA TRABAJO EN ALTURA	https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_lista.aspx

28/05/2026	CRISTIAN CAMILO GARCIA	1075260846	REENTRENAMIENTO	ANSAR CENTRO DE FORMACION PARA TRABAJO EN ALTURA	https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_lista.aspx
26/05/2026	RODOLFO GUTIERREZ	7716229	COORDINADOR	ANSAR CENTRO DE FORMACION PARA TRABAJO EN ALTURA	https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_lista.aspx
23/05/2026	KEVIN ESTEBAN GONGORA	1077973833	TRABAJADOR AUTORIZADO	ANSAR CENTRO DE FORMACION PARA TRABAJO EN ALTURA	https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_lista.aspx
26/05/2026	ALEXANDER TRIANA	1069944428	REENTRENAMIENTO	ANSAR CENTRO DE FORMACION PARA TRABAJO EN ALTURA	https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_lista.aspx
06/12/2024	CRISTIANCAMILO MERVCADO	1003080880	TRABAJADOR AUTORIZADO	GESTION Y PREVENCION EN SALUD OCUPACIONAL.	https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_lista.aspx
05/09/2024	JHON FREDY SUAREZ MEZA	1063355352	TRABAJOR AUTORIZADO	GESTION Y PREVENCION EN SALUD OCUPACIONAL GESPRESO SAS.	https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_lista.aspx
21/08/2025	ELKIN DARIO BEDOYA ECHEVERY	1035920703	TRABAJOR AUTORIZADO	ASIST ALTURAS SAS	https://app2.mintrabajo.gov.co/CentrosEntrenamiento/consulta_lista.aspx

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ALCAX INGENIERIA – CACOM 5
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Observaciones:

- **CHARLAS DE SEGURIDAD**

Durante el mes de O se sensibilizó a los colaboradores por medio de charlas de seguridad enfocado en los siguientes temas:

- **INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES** Introducción Los objetivos de esta charla son comprender cómo se realiza la investigación de accidentes y reconocer el importante papel que juega en su prevención. Nadie quiere que ocurran accidentes, pero cuando ocurren, tenemos algunas responsabilidades importantes. Los requisitos de recolección de información y mantenimiento de registros deben cumplirse de manera oportuna. También tenemos la obligación de conducir una completa investigación de accidentes. Comprender lo que sucedió y por qué nos suministra una información valiosa, de primera mano, para prevenir de manera efectiva que los accidentes se repitan. Aunque utilicemos el término investigación de "accidentes", todas las lesiones y enfermedades ocupacionales, daños ó pérdida de propiedad y cuasi pérdidas deberían ser investigados
- **BEBER Y CONDUCIR**: El objetivo de esta charla es discutir los peligros y penalidades de beber y conducir al mismo tiempo. Todos los estados, excepto dos, tienen leyes que definen como delito conducir con una concentración de alcohol en la sangre por encima de un nivel establecido – usualmente 0.10%. Catorce estados ordenan cárcel ó servicio a la comunidad desde el primer fallo condenatorio. Beber y conducir es una combinación mortal.
- **Reforzar el uso de EPP:** Recordar la importancia, el estado el uso correcto del equipo de protección personal Antes de iniciar las actividades. (guantes, gafas de seguridad y protección auditiva).
- y líneas de vida para trabajos en altura.

Identificación de peligros y reporte de actos o condiciones inseguras.

Ergonomía y Salud, Adecuado traslado de material cargar de forma correcta cargas pesadas y cuidar la columna.

.

ANEXO A8 Constancia de charlas de seguridad ejecutadas en el mes de JUNIO 2026 (Lista de asistencia)

Registro fotográfico 5. Charlas de seguridad




Fuente: Elaboración propia

4.16 PAUSAS ACTIVAS.

5 Como medida de prevención de lesiones osteomusculares ocasionadas por posturas prolongadas, mantenidas y anti gravitacional, se ejecutó pausas activas evidenciadas en imagen. (se anexa formato de asistencia a las pausas activas).

Registro fotográfico 6. Pausas activas

		
Fuente: elaboración propia		

Relación, pausas activas ejecutadas durante el mes de AGOSTO

Se anexó A9 constancia de pausas activas realizadas.

Se señalizó área de acuerdo con los riesgos en el frente donde se ejecutó actividades.


Registro fotográfico 7. Señalización

		
	Fuente: elaboración propia	

5.8 EVALUACIÓN FACTORES DE RIESGOS.

Se realiza la valoración de los riesgos relacionados con las actividades que realiza en la obra, posterior a ello se debe determinar si los controles existentes son suficientes, si estos deben ser mejorados o si se requieren nuevos controles. Para cada uno de los riesgos se determinan unas medidas de intervención, es decir, un conjunto de actividades que se realizarán con el fin de eliminar, sustituir o minimizar un riesgo.

Registro fotográfico 10. Medidas de intervención de riesgos.

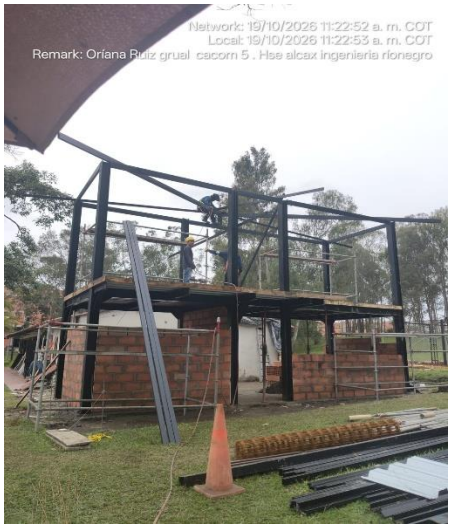	**INTERVENCION DE TRABAJO EN ALTURA**
Fuente: elaboración propia	

4.21 VIGILANCIA OCUPACIONAL

Los contratistas deben de identificar, evaluar y controlar los factores de riesgo que presentan los ambientes laborales, enfocados en intervenir en forma oportuna y preventiva en el control de las condiciones inseguras y actos inseguros en los frentes de obra, para ello se deben diligenciar la siguiente tabla con los riesgos identificados y las acciones que se realizaron para mitigar estos en el mes de agosto de 2026.

Tabla 13. Vigilancia ocupacional.

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ALCAX INGENIERIA – CACOM 5
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

TIPO DE FACTOR DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO	FECHA	OBSERVACIONES	ACCIONES REALIZADAS
Agentes Físicos	Orden y aseo	Todo el mes		Se refuerza el tema en charlas diarias de seguridad, adicional 15min antes de terminar labores se inspecciona el área verificando cumplimientos
Agentes biológicos	Microorganismo	Todo el mes	Virus bacterias por contacto por mal lavado de los alimentos no lavado de manos al estar expuestos con virus y bacterias	Lavado de manos y de alimentos
Agentes Psicosociales	Estrés por el trabajo, o mala r4elacion con los compañeros	Todo el mes	Se hace en las charlas observación sobre el respeto hacia los compañeros, sus creencias y manera de pensar	Charlas, trabajo en equipo, respeto entre compañeros
Factores Ergonómicos	Se identifican movimientos repetitivos en ejecución de las labores	Todo el mes de agosto		Pausas activas diarias
Factores Locativos	Caídas a mismo o diferente nivel	Todo el mes de agosto	Por elaboración de brechas y cajas	Se procede a señalizar el área, antes y después de ejecutar la labor
TOTAL	**5**			

4.24 EQUIPO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Registro fotográfico 15. Equipo para la atención de emergencia.





Fuente: elaboración propia

5.9 INSPECIONES.

Tabla 14. Inspecciones de seguridad.

ASPECTO INSPECCIONADO	DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO INSPECCIONADO	FECHA	RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

Servicios de bienestar y áreas comunes	Comedor.	Se cuenta con buen espacio para comer zonas verdes		
	Campamento.	Los campamentos están bien organizados y bien dotados	15/07/2026	Responsable SST – Integrante del COPASST
	Separación de residuos sólidos.	Se tiene canecas y se hace adecuada separación	15/07/2026	Responsable SST – Integrante del COPASST
	Unidades sanitarias.	La base aérea cuenta con unidades sanitarias en optimas condiciones	15/07/2026	Responsable SST – Integrante del COPASST
	Lavamanos.	Se recomienda al personal el lavado de manos antes de cada comida	15/07/2026	Responsable SST – Integrante del COPASST
	Puntos de hidratación provisionales.	Se compra hidratación botellones de agua	Todo el mes	Responsable SST – Integrante del COPASST
Áreas de Trabajo	Corte y figuración de acero.	se inspecciona las herramientas eléctricas	Varias veces al mes	Responsable SST – Integrante del COPASST
	Corte de adobe.	NA		
	Preparación de concreto.	Preoperacionales	Según necesidad	Responsable SST

	Mampostería estructural interna	NA		
	Vías de circulación y acceso.	NA		
	Excavaciones y/o movimientos de tierra	Se inspeccionan las herramientas manuales	Varias veces	Responsable sst
	Instalación de vigas aéreas.	NA		
	Mampostería en catalán	NA		
	Acabados de viviendas.	NA		
	Señalización.	Evidencias fotográficas	Todo el mes	Responsable SST-Trabajadores
	Herramientas manuales	Lista de chequeo	Todo el mes	Responsable sst y trabajadores
	Otros			
Equipos de Respuesta ante Emergencia	Botiquín	Lista de chequeo	NUEVO	Brigadista Y SST
	Camilla	Lista de chequeo	NUEVO	Responsable SST
	Extintor	Lista de chequeo	NUEVO	Brigadista
	Excavaciones	NA		

Permisos de Trabajo de Alto Riesgo	Espacios Confinados	NA		
	De Altura	E inspecciona EPCC		
	En Caliente	NA		
	De Izaje	NA		
	En Áreas Restringidas	NA		
	Sustancias peligrosas	NA		
Otros	Uso de EPP	Inspección no programada hacia cada trabajador	Todo el mes se escoge trabajadores	Responsable SST
Otros	Orden y aseo	Se inspecciona	Todo el mes	Responsable SST – Integrante del COPASST
Otros	Riesgos Generales	se hace capacitación	Todo el mes	Integrante COPASST ,SST
TOTAL	**15**			

Registro fotográfico 16. Inspecciones de seguridad.





Fuente propia

5.10 CAMPAÑAS REALIZADAS

Mínimo 1 al mes.

Higiene y hábitos saludables: Programas de pausas activas, alimentación balanceada, prevención del consumo de alcohol y drogas,

4.27 REPORTE DE ACTOS Y CONDICIONES INSEGURAS

Anexo A12. Reporte de actos y condiciones inseguras reportadas en el mes de junio del 2026.

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ALCAX INGENIERIA – CACOM 5
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Por parte de la entidad se hace la siguiente observación el día 23 de septiembre


El plan de acción se hace el mismo día.

3. INSPECCION NO PLANEADA CONTRATISTAS DE OBRA ALCAX INGENIERIA S.A.S:

El día 23 de septiembre 2026, se evidencia que el personal contratista que se encuentra realizando trabajos de mantenimiento en las cubiertas, si bien hace uso de arnés de seguridad, este no se encuentra asegurado a un punto de anclaje que soporte el peso en caso de una caída libre, representando riesgo de accidente desde una altura considerable. Así mismo, los andamios utilizados no se encuentran completos y adecuadamente armados, pues un andamio certificado debe garantizar el armado completo de las secciones en lo que tiene que ver con las partes verticales, horizontales, plataformas completas de trabajo y escaleras de acceso internas.



Teniendo en cuenta que las cubiertas de la unidad no cuentan con puntos de anclaje fijos para aseguramiento del personal, se debe hacer uso de andamios certificados como se ilustra en la siguiente imagen, por poner un ejemplo:

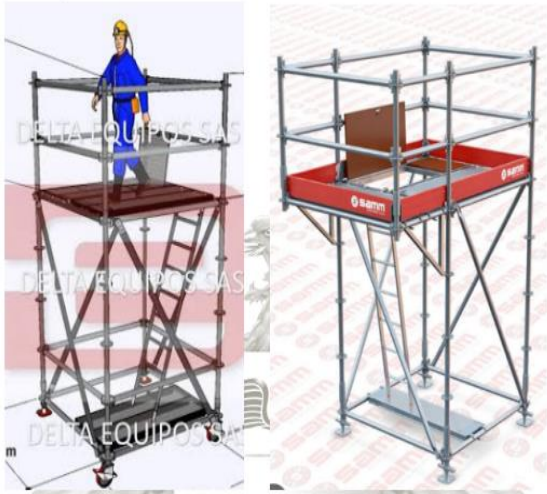



4.28 REPORTE, INVESTIGACIÓN Y ACCIONES DE MEJORA DE LOS AT Y IT

Relacionar los AT y los IT

No se registró durante el mes accidentes e incidentes			

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ALCAX INGENIERIA – CACOM 5
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Anexo A13. Reporte, investigación Incapacidad y acciones de mejora de AT y IT, escanear y enviar en PDF.

OBSERVACIONES GENERALES:



Quien envía
Residente de contratista
Oriana Ruiz

Quien aprueba y revisa

	INFORME DE GESTIÓN MENSUAL ALCAX INGENIERIA – CACOM 5
	Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

CT
Javier Vanegas
