SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA
Regional Distrito Capital | Centro de Tecnologías del Transporte (CTT)
Autopista Sur No. 4 - 53 - 54 — Soacha (Cundinamarca)

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Suministro, transporte e instalación de plataforma salvaescaleras — Centro de Tecnologías del Transporte (CTT)
Plazo: 45 días CALENDARIO contados a partir del acta de inicio (cláusula 1.5 del documento de justificación)

EDT	Actividad	Dura-ción	Inicio	Fin	Pred.	Responsable
1	**FASE 1. SUMINISTRO Y OBRA CIVIL PREVIA**	**22 cal.**	**19-oct**	**09-nov**	**—**	
2	Suministro, fabricacion y entrega de la plataforma con rieles (tramo recto/curvo)	22 cal.	19-oct	09-nov	-	Contratista
3	Adecuacion y refuerzo en descanso intermedio	5 hab.	19-oct	23-oct	-	Contratista
4	Adecuacion de punto electrico - circuito ramal dedicado	4 hab.	26-oct	29-oct	3	Contratista
5	**FASE 2. INSTALACION Y MONTAJE**	**6 hab.**	**10-nov**	**18-nov**	**—**	
6	Instalacion y montaje de rieles sobre la escalera	6 hab.	10-nov	18-nov	2, 3	Contratista
7	**FASE 3. PRUEBAS, ENTREGA Y RECIBO**	**4 hab.**	**19-nov**	**24-nov**	**—**	
8	Pruebas, puesta en marcha y capacitacion	3 hab.	19-nov	23-nov	6, 4	Contratista
9	Entrega y recibo a satisfaccion	1 hab.	24-nov	24-nov	8	Supervision / Interventoria

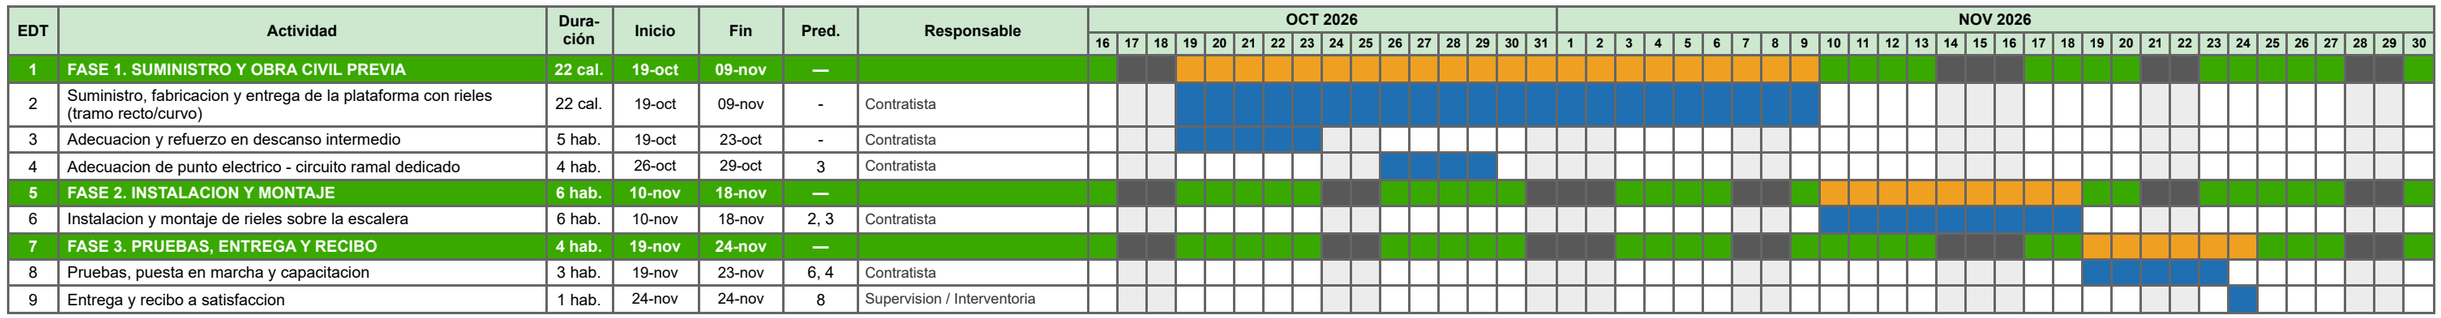

Convenciones: Fase · Actividad · Día no hábil (sábado, domingo o festivo — Ley 51 de 1983)

Fecha del acta de inicio	16-oct-2026
Inicio efectivo de actividades	19-oct-2026
Plazo contractual de ejecución	45 días CALENDARIO
Terminación programada (ruta crítica)	24-nov-2026
Vencimiento del plazo contractual	30-nov-2026
Holgura disponible	6 días calendario

1. El plazo de ejecución se expresa en **DÍAS CALENDARIO** contados a partir de la aprobación de la garantía única y del registro presupuestal. La fabricación y entrega del equipo (EDT 2) se programa en días CALENDARIO por corresponder a un proceso de fabricación y transporte ajeno a la jornada laboral de la entidad; las actividades ejecutadas en sede (EDT 3, 4, 6, 8 y 9) se programan en días hábiles.
2. **Este cronograma se encadena al cronograma de la etapa precontractual**: el inicio de actividades es posterior a la suscripción del acta de inicio prevista para el 16-oct-2026. Reemplaza la versión anterior, que programaba el inicio de obra con anterioridad al perfeccionamiento del contrato.
3. La terminación programada y la totalidad del plazo contractual se surten dentro de la vigencia fiscal 2026, sin generar reservas presupuestales.
4. Previo a cualquier perforación (EDT 3 y 6), el contratista deberá entregar la memoria de cálculo estructural de anclajes firmada por profesional con matrícula vigente, conforme a las notas 6 y 7 del plano L-03.
5. El recibo a satisfacción (EDT 9) está condicionado a la entrega de la certificación RETIE del circuito ramal instalado.

Jairo Yamid Nuñez Hernández
ELABORÓ
Ingeniero Civil — M.P. 25202-312046 CDN
Apoyo técnico

Diana Paola Zaque
REVISÓ
Coordinación — Centro de Tecnologías del Transporte (CTT)

Ferddy Niño
APROBÓ
Subdirección — Centro de Tecnologías del Transporte (CTT)
